
# 22_01_2026_REPROGRAMACIÓN DE OBRA FRANCISCO PIZARRO PRORROGA No. 02

| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO PIZARRO, MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO DEPARTAMENTO DEL NARIÑO** | **274 días** | **$ 1,436,050,707.00** | **lun 28/07/25** | **sáb 28/03/26** | | |
| 2 | | ACTA DE INICIO | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | 5CC+1 día |
| 3 | **1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | **6 días** | **$ 8,529,159.00** | **lun 28/07/25** | **sáb 2/08/25** | | |
| 4 | 1.1 | Descapote a máquina y/o manual profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado. | 3 días | $ 5,502,648.00 | mié 30/07/25 | sáb 2/08/25 | 6 | 10;25FC+2 días |
| 5 | 1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución | 2 días | $ 1,910,151.00 | mar 29/07/25 | mié 30/07/25 | 2CC+1 día | 6CC |
| 6 | 1.3 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRÁFICA | 2 días | $ 1,116,360.00 | mar 29/07/25 | mié 30/07/25 | 5CC | 4;242 |
| 7 | 1.4 | RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 8 | 1.5 | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 9 | **2** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | **274 días** | **$ 40,290,025.00** | **lun 28/07/25** | **sáb 28/03/26** | | |
| 10 | 2.1 | CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en m3 en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selec | 95 días | $ 10,013,928.00 | sáb 2/08/25 | sáb 25/10/25 | 4 | 22CC+15 días;12FC+20 días;11FC+20 días |
| 11 | 2.3 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes. | 5 días | $ 5,588,141.00 | mié 12/11/25 | lun 17/11/25 | 10FC+20 días | 242 |
| 12 | 2.4 | RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme. | 5 días | $ 24,310,915.00 | mié 12/11/25 | lun 17/11/25 | 10FC+20 días | 242 |
| 13 | 2.5 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |

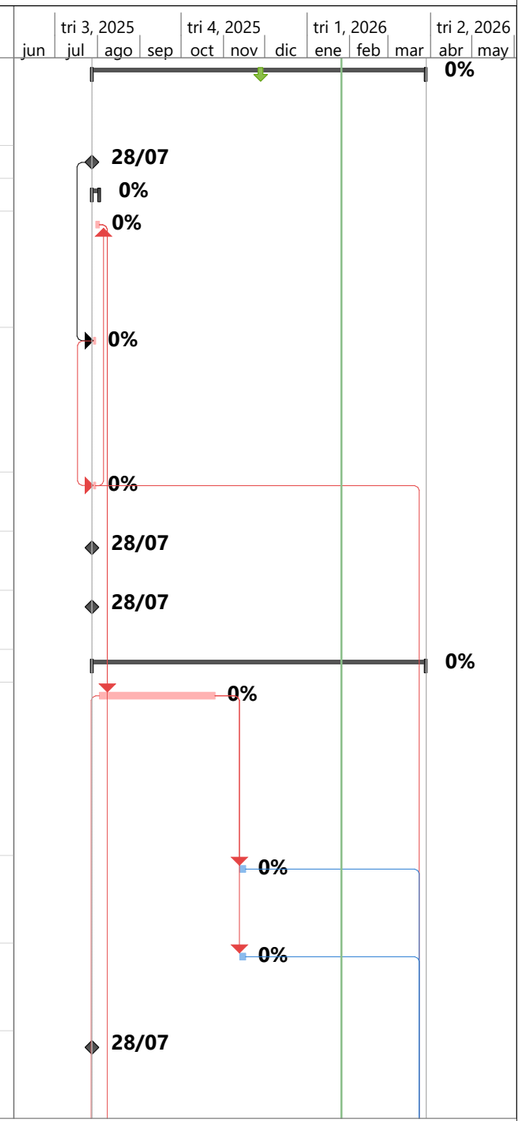



LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | | Progreso de tarea | | Línea base | | Resumen | | Tarea inactiva | | | |
| División crítica | | Tarea manual | | División de la línea base | | Resumen manual | | Hito inactivo | | | |
| Progreso de tarea crítica | | solo el comienzo | | Hito de línea base | | Resumen del proyecto | | Resumen inactivo | | | |
| Tarea | | solo fin | | Hito | | Tareas externas | | Fecha límite | | | |
| División | | solo duración | | Progreso del resumen | | Hito externo | | | | | |

22_01_2026_REPROGRAMACIÓN DE OBRA FRANCISCO PIZARRO PRORROGA No. 02


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.6 | RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 50 Km, los índices de expansión están reconocidos dentro del APU). | 1 día | $ 377,041.00 | vie 27/03/26 | sáb 28/03/26 | 221CC | 242 |
| 15 | **3** | **CIMENTACIÓN** | **253 días** | **$ 293,442,711.00** | **lun 28/07/25** | **lun 9/03/26** | | |
| 16 | 3.1 | SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales | 20 días | $ 1,937,232.00 | mar 7/10/25 | vie 24/10/25 | 23 | 18CC+2 días |
| 17 | 3.2 | CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 18 | 3,3,1 | ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización d | 15 días | $ 15,924,337.00 | jue 9/10/25 | mié 22/10/25 | 16CC+2 días;25CC+48 días | 19CC+3 días;242 |
| 19 | 3,4,1 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realiza | 25 días | $ 15,429,261.00 | sáb 11/10/25 | dom 2/11/25 | 18CC+3 días | 225;26 |
| 20 | 3.5 | Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el ítem de sellante). | 2 días | $ 253,000.00 | dom 8/03/26 | lun 9/03/26 | 165 | |
| 21 | 3.6 | Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en se | 2 días | $ 707,360.00 | dom 8/03/26 | lun 9/03/26 | 165 | 242 |

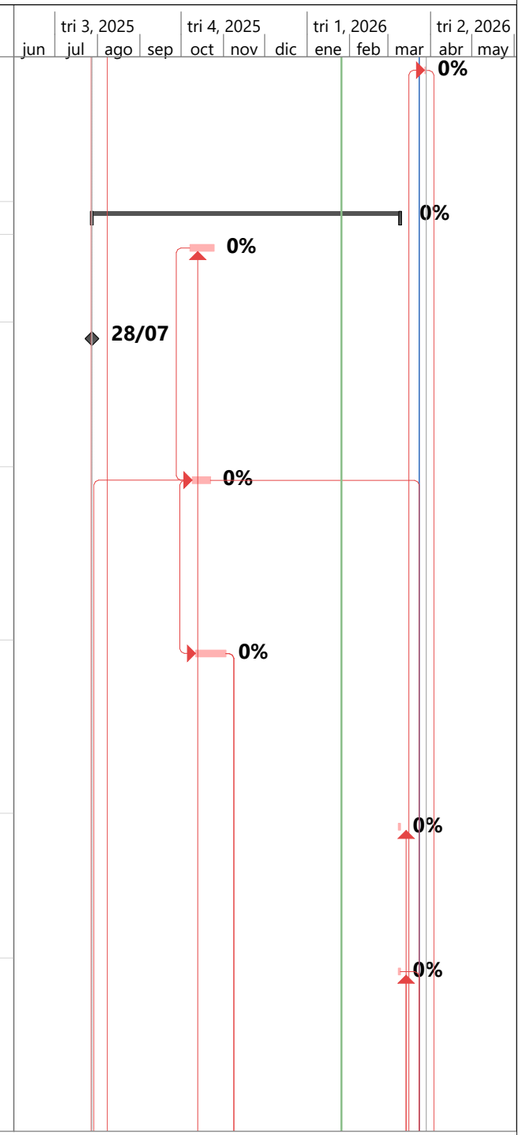


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |

| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3.7 | PILOTE CUADRADO HINCADO 25X25CM, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la r | 45 días | $ 256,044,290.00 | dom 17/08/25 | vie 26/09/25 | 10CC+15 días;25CC+15 días | 23 |
| 23 | 3.8 | Descabece de pilotes con martillo percutor, incluye cargue y retiro de sobrantes. | 12 días | $ 3,147,231.00 | vie 26/09/25 | mar 7/10/25 | 22 | 16 |
| 24 | **4** | **REFUERZO** | **178 días** | **$ 177,745,577.00** | **lun 4/08/25** | **vie 9/01/26** | | |
| 25 | 4.1 | Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU) | 150 días | $ 158,038,513.00 | lun 4/08/25 | lun 15/12/25 | 4FC+2 días | 18CC+48 días;22CC+15 días |
| 26 | 4.2 | Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU) | 14 días | $ 18,376,864.00 | dom 2/11/25 | sáb 15/11/25 | 19 | |
| 27 | 4.4 | ANCLAJES PARA VARILLA ø 1/2"ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución | 10 días | $ 1,330,200.00 | mié 31/12/25 | vie 9/01/26 | 31 | |
| 28 | **5** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **273.25 días** | **$ 20,629,179.00** | **lun 28/07/25** | **vie 27/03/26** | | |
| 29 | 5.1 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=28 Mpa (4000 PSI) e=0.10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro | 1 día | $ 1,131,785.00 | vie 27/03/26 | vie 27/03/26 | | |
| 30 | 5.2 | COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad | 12 días | $ 9,881,503.00 | sáb 15/11/25 | mar 25/11/25 | 225 | 31FC+10 días |
| 31 | 5.3 | VIGAS DE CORONACIÓN EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | 30 días | $ 7,788,911.00 | jue 4/12/25 | mié 31/12/25 | 30FC+10 días | 223FC+30 días;156FC+15 días;27;226FC+45 días;227FC+45 días;228FC+5 días;233FC+45 |

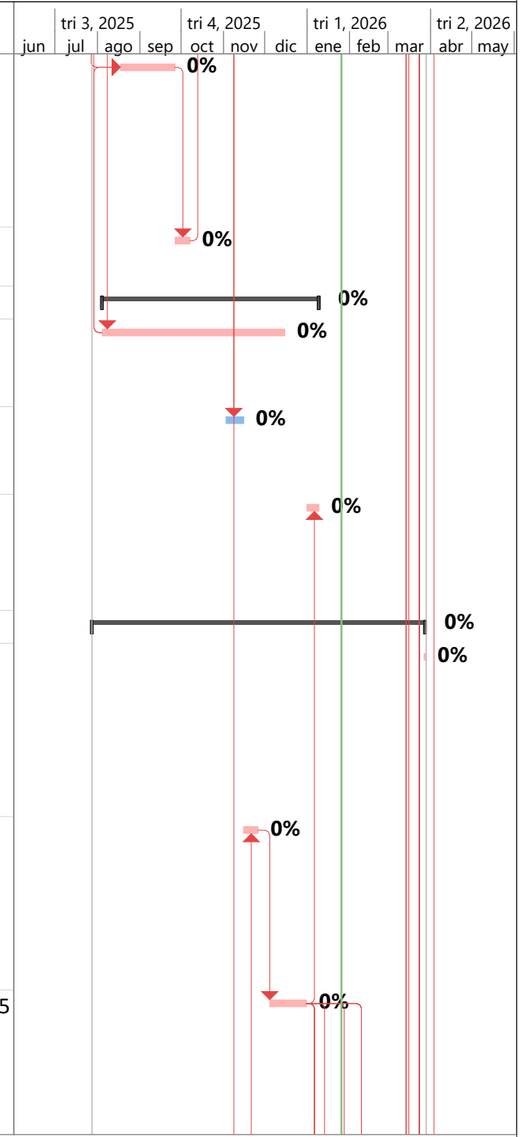



LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | | Progreso de tarea | | Línea base | | Resumen | | Tarea inactiva | |
| División crítica | | Tarea manual | | División de la línea base | | Resumen manual | | Hito inactivo | |
| Progreso de tarea crítica | | solo el comienzo | | Hito de línea base | | Resumen del proyecto | | Resumen inactivo | |
| Tarea | | solo fin | | Hito | | Tareas externas | | Fecha límite | |
| División | | solo duración | | Progreso del resumen | | Hito externo | | | |

22_01_2026_REPROGRAMACIÓN DE OBRA FRANCISCO PIZARRO PRORROGA No. 02

| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5,5,1 | PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.12) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la activi | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 33 | 5.16 | POYO EN CONCRETO REFORZADO f´c=17,5 Mpa (2500 PSI), a=0.45; e=0.08. No incluye acero de refuerzo. | 3 días | $ 1,468,773.00 | sáb 7/02/26 | mar 10/02/26 | 159 | |
| 34 | 5.24 | MORTERO TIPO S, DE RELLENO PARA DOVELAS | 10 días | $ 358,207.00 | lun 2/02/26 | mié 11/02/26 | 156CC;157CC | |
| 35 | 5.25 | Viga canal forma en H, en concreto reforzado de 3.000 PSI, incluye mortero normalizado de nivelación para pendientado, impermeabilización elástica de ángulos rectos y/o juntas, impermeabilización con mortero cementoso bicomponente de alta elasticidad , se | 0 días | $ 0.00 | vie 27/03/26 | vie 27/03/26 | | |
| 36 | **6** | **ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA** | **261 días** | **$ 15,712,680.00** | **lun 28/07/25** | **mar 17/03/26** | | |
| 37 | 6,8,1 | ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL SAPÁN 3"X6"PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta in | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 38 | 6,8,2 | ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL SAPÁN 2"X4"PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta in | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 39 | 6,8,3 | Platina Alumidi 120 ROTHOBLASS, con anclajes Vin fix pro para concreto y pasadores STA a madera o similares, (Para conexiones a elementos en concreto y entre madera) | 10 días | $ 15,712,680.00 | dom 8/03/26 | mar 17/03/26 | 185CC | |
| 40 | **7** | **REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN** | **259 días** | **$ 16,218,316.00** | **lun 28/07/25** | **dom 15/03/26** | | |
| 41 | **7.1** | **REDES SANITARIAS Y RED PLUVIAL(EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)** | **259 días** | **$ 9,169,963.00** | **lun 28/07/25** | **dom 15/03/26** | | |

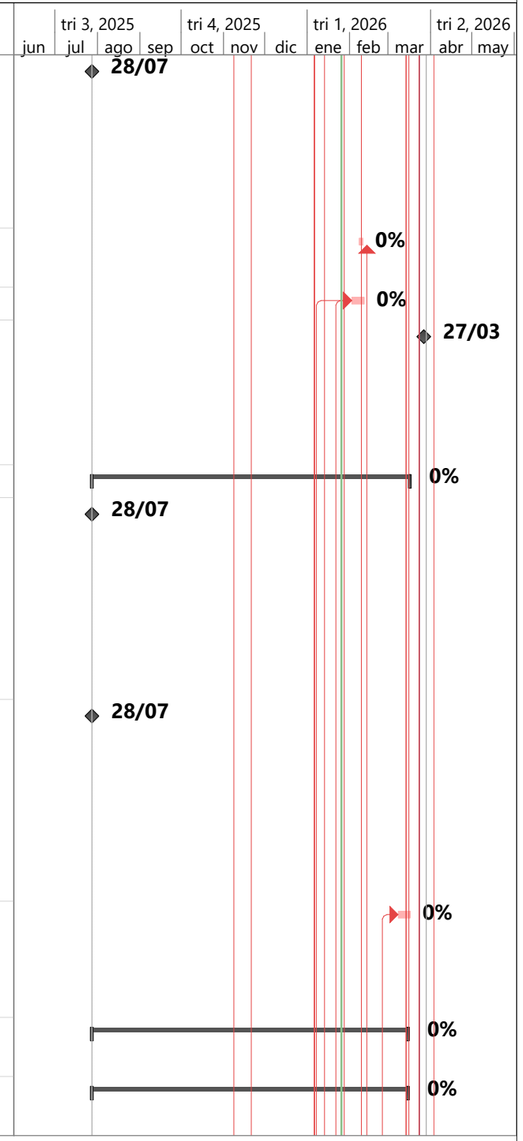



LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |

22_01_2026_REPROGRAMACIÓN DE OBRA FRANCISCO PIZARRO PRORROGA No. 02


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 7.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4"RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materi | 8 días | $ 813,145.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 43 | 7.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4"RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | 8 días | $ 1,242,035.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242 |
| 44 | 7.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1"RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | 8 días | $ 842,645.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242 |
| 45 | 7.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2"RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | 8 días | $ 479,841.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242 |
| 46 | 7.1.12 | PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"(instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). | 8 días | $ 224,688.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242;200 |
| 47 | 7.1.14 | PUNTO DE AGUA FRÍA 1"(instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). | 8 días | $ 126,537.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242 |
| 48 | 7.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4"200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | 8 días | $ 409,404.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242 |
| 49 | 7.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO DE 1"(Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | 8 días | $ 798,714.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 50 | 7.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO 1/2"(Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | 8 días | $ 79,892.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |

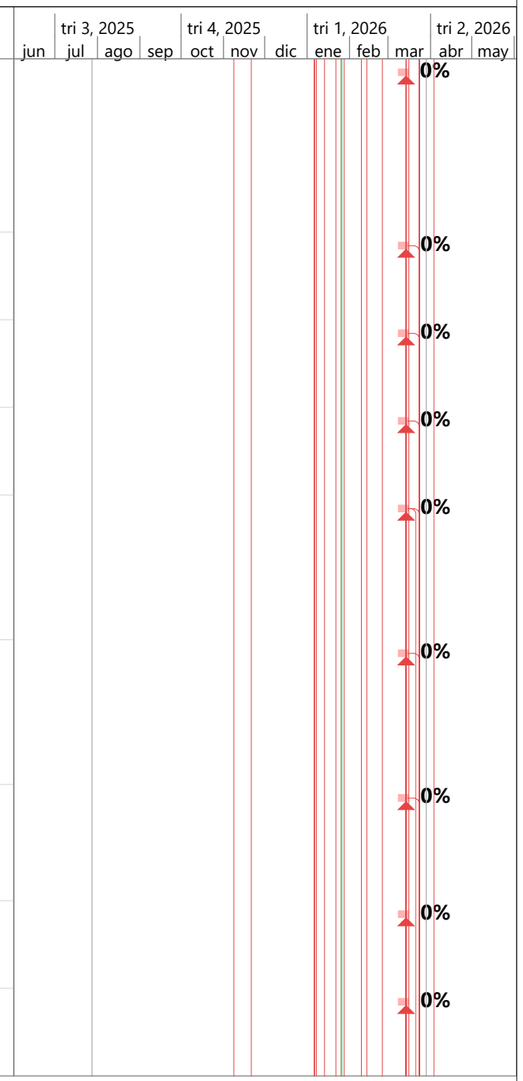


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 7.1.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye prueb | 8 días | $ 4,015,206.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 52 | 7.1.13 | PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4"(instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 53 | 7.1.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2"(manguera, solo para pocetas y jardines si se requieren) | 1 día | $ 137,856.00 | dom 8/03/26 | lun 9/03/26 | 165 | 242;200 |
| 54 | **7.2** | **REDES HIDRÁULICAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)** | **8 días** | **$ 3,437,234.00** | **dom 8/03/26** | **dom 15/03/26** | | |
| 55 | 7.2.3 | PUNTO SANITARIO PVCS ø 4"(Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su instalación) | 8 días | $ 390,055.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 56 | 7.2.1 | PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2"(Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación) | 8 días | $ 327,586.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 57 | 7.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4"(conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación) | 8 días | $ 1,489,075.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 58 | 7.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2"(Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación) | 8 días | $ 229,859.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 59 | 7.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 2"(incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación) | 8 días | $ 336,238.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242 |
| 60 | 7.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 4"(incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación) | 8 días | $ 542,710.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242 |
| 61 | 7.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2"(incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación) | 8 días | $ 121,711.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242 |

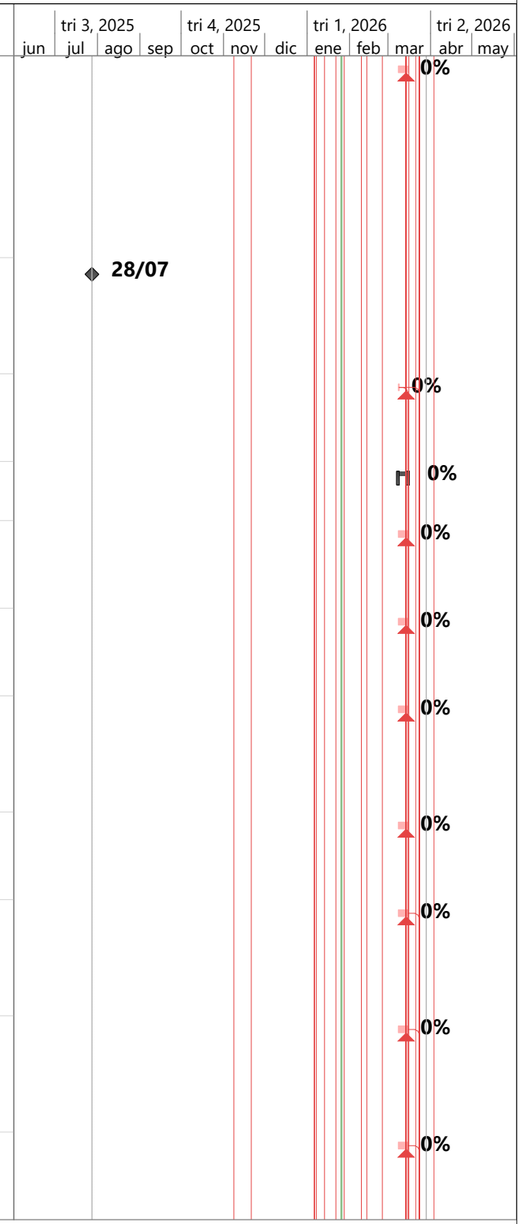


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | **7.3** | **REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)** | **259 días** | **$ 3,611,119.00** | **lun 28/07/25** | **dom 15/03/26** | | |
| 63 | 7.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 64 | 7.3.1A | PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño) | 8 días | $ 722,564.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 65 | 7.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4"(Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación) | 8 días | $ 403,992.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 66 | 7.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6"o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento. | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 67 | 7.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4"o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento. | 8 días | $ 158,158.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242 |
| 68 | 7.3.14 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.60*0.60 m (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. | 8 días | $ 570,323.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 69 | 7.3.18 | CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 70 | 7.3.19 | CAÑUELA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |

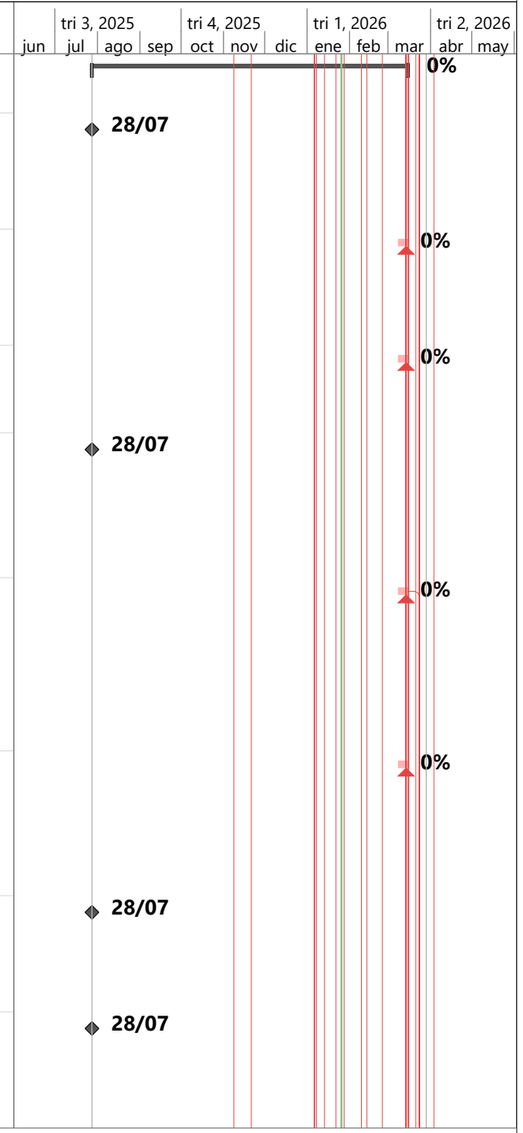


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 7.3.16 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m (ver ubicación en planos). Incluye marco y tapa de fundición de 90 x 90 cm, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. | 8 días | $ 1,756,082.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | |
| 72 | **8** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN** | **273.25 días** | **$ 119,045,058.00** | **lun 28/07/25** | **vie 27/03/26** | | |
| 73 | **8.1** | **EQUIPO DE MEDIDA** | **20 días** | **$ 353,292.00** | **dom 8/03/26** | **mié 25/03/26** | | |
| 74 | 8.1.1 | Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes | 20 días | $ 353,292.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 75 | **8.2** | **REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN** | **20 días** | **$ 5,411,840.00** | **dom 8/03/26** | **mié 25/03/26** | | |
| 76 | 8.2.1 | Suministro e instalación de tubo TDP 2"PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación | 20 días | $ 1,504,440.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 77 | 8.2.2 | Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red | 20 días | $ 1,397,680.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 78 | 8.2.3 | Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma. incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesori | 20 días | $ 2,509,720.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 79 | **8.3** | **TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES** | **20 días** | **$ 8,259,958.00** | **dom 8/03/26** | **mié 25/03/26** | **165** | |
| 80 | 8.3.1 | Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: IP | 20 días | $ 6,815,411.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |

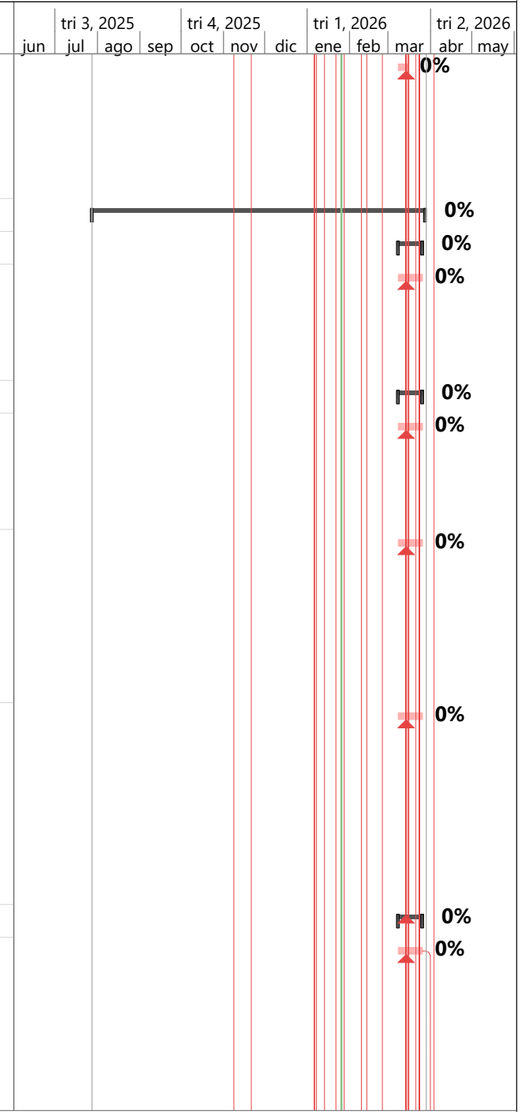


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 8.3.2 | Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 12 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) | 20 días | $ 1,038,999.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 82 | 8.3.3 | Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnetico 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA; (incluye e | 20 días | $ 405,548.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 83 | **8.4** | **ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN RCI Y BOMBAS DE SUMINISTRO** | **20 días** | **$ 11,773,296.00** | **dom 8/03/26** | **mié 25/03/26** | | |
| 84 | 8.4.1 | Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre medidor y tablero de distr | 20 días | $ 10,135,370.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 85 | 8.4.2 | Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre TGD y TN1, TGD y TN2 | 20 días | $ 646,790.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 86 | 8.4.3 | Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre TGD y TR1, TGD y TR2 | 20 días | $ 766,840.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 87 | 8.4.4 | Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada y | 20 días | $ 224,296.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 88 | **8.5** | **RED NORMAL Y REGULADA** | **20 días** | **$ 8,170,727.00** | **dom 8/03/26** | **mié 25/03/26** | | |

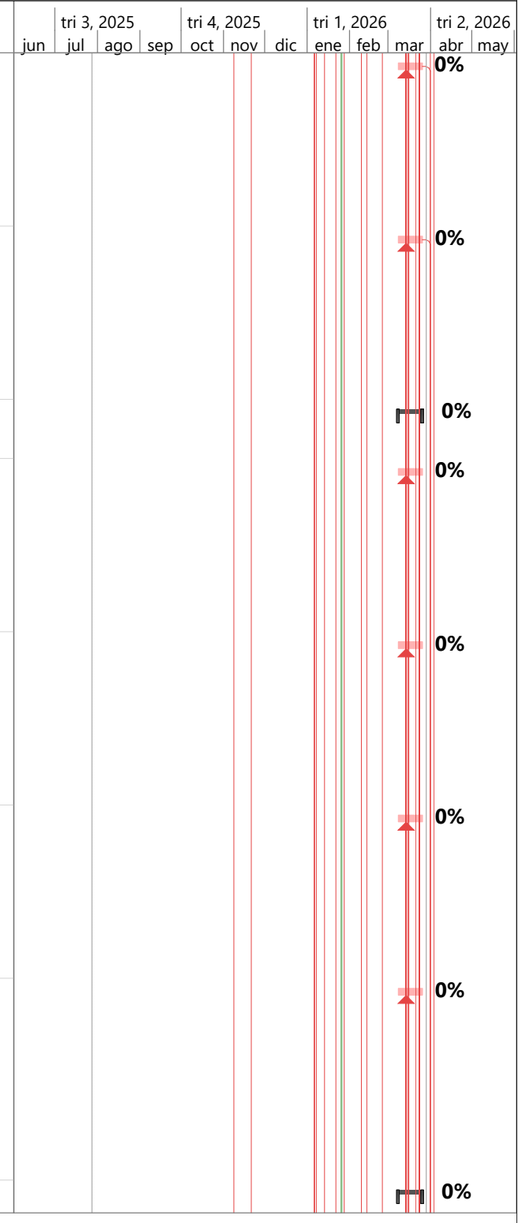


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 8.5.1 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halog | 20 días | $ 2,211,657.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 90 | 8.5.2 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AW | 20 días | $ 365,942.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 91 | 8.5.3 | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T | 20 días | $ 1,904,476.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 92 | 8.5.4 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 20A 120V, instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca tipo Tamper Resist, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (L | 20 días | $ 482,556.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 93 | 8.5.5 | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzad | 20 días | $ 582,888.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 94 | 8.5.6 | Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C | 20 días | $ 449,768.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 95 | 8.5.7 | Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C | 20 días | $ 2,173,440.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |

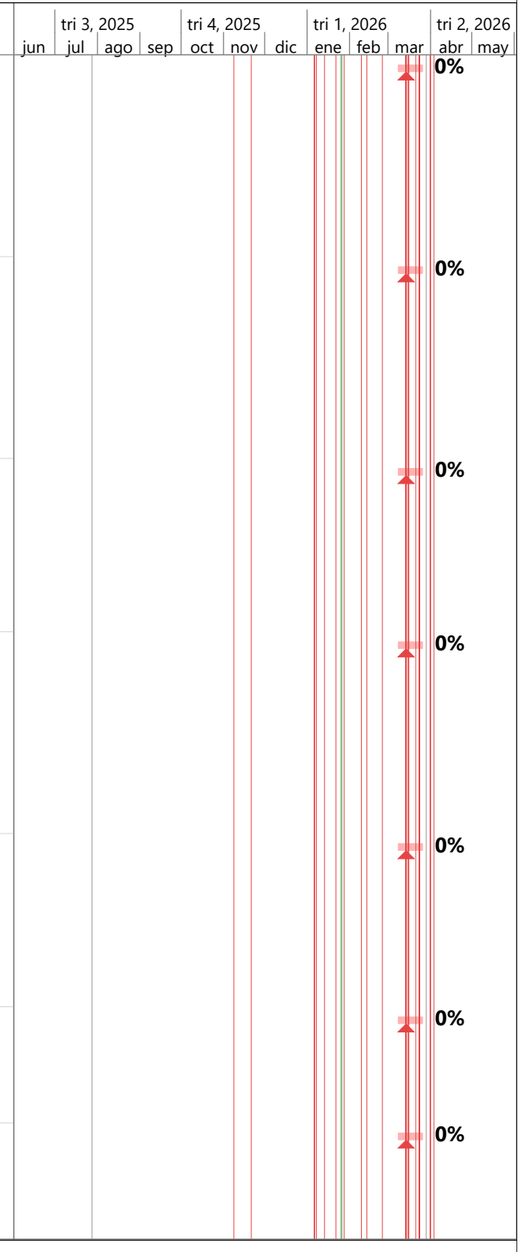


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | **8.6** | **CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA** | **20 días** | **$ 1,679,350.00** | **dom 8/03/26** | **mié 25/03/26** | | |
| 97 | 8.6.1 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su corr | 20 días | $ 627,905.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 98 | 8.6.2 | Suministro e instalación de canaleta plastica 100x45mm 2Mt, incluye accesorios de union, separador, angulos y demas accesorios para su correcta fijacion | 20 días | $ 1,051,445.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 99 | **8.7** | **ILUMINACIÓN** | **271 días** | **$ 40,760,059.00** | **lun 28/07/25** | **mié 25/03/26** | | |
| 100 | 8.7.1 | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4"e | 20 días | $ 2,227,296.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 101 | 8.7.2 | Suministro de materiales y mano de obra para nstalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería conduit PVC empotrada empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4"en techo a la vista, rega | 20 días | $ 536,889.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 102 | 8.7.3 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería | 20 días | $ 17,210,407.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 103 | 8.7.4 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4"con accesorios, cajas de pas | 20 días | $ 747,768.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |

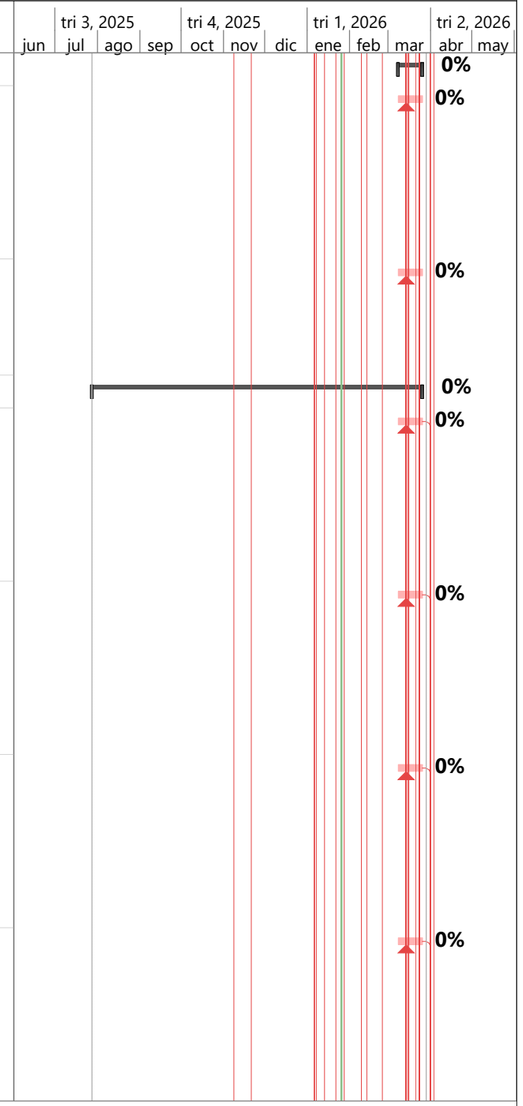


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 8.7.5 | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en muro (incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4"con accesorios, | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | 242 |
| 105 | 8.7.6 | Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m montaje para descolgar , vida útil minimo de 60.000 Horas, 60W, 5500 Lumens,de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para co | 20 días | $ 15,332,877.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 106 | 8.7.7 | Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 18 W Flujo Luminoso mínimo 1300 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas. | 20 días | $ 428,112.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 107 | 8.7.8 | Suministro e instalación de luminaria hermetica de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas. | 20 días | $ 847,850.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 108 | 8.7.9 | Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijac | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | 242 |
| 109 | 8.7.10 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED tipo aplique, mínimo 350 lúmenes, IP20, mínimo 90 minutos de autonomía | 20 días | $ 2,878,340.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 110 | 8.7.11 | Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía | 20 días | $ 550,520.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 111 | **8.8** | **ILUMINACIÓN EXTERIOR** | **20 días** | **$ 11,973,043.00** | **dom 8/03/26** | **mié 25/03/26** | | |

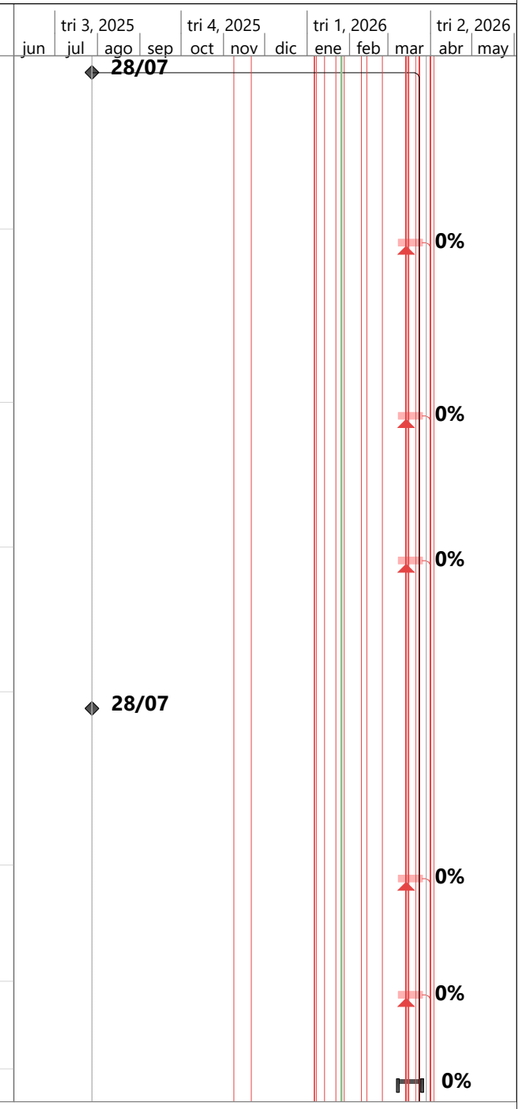


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 8.8.1 | Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN- | 20 días | $ 885,366.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 113 | 8.8.2 | Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica codensa AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, ta | 20 días | $ 1,163,673.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 114 | 8.8.3 | Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona | 20 días | $ 485,694.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 115 | 8.8.5 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2"de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación. | 20 días | $ 311,370.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 116 | 8.8.6 | Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil minimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color maximo 3000K, minimo 980 Lumens de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación | 20 días | $ 6,810,912.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 117 | 8.8.7 | Suministro e instalación de poste metalico poligonal para iluminación 3m, 150kgf,brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2"x 1.2m de avance, montaje de luminaira 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla., (incluye c | 20 días | $ 831,040.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 118 | 8.8.8 | Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil minimo de 20.000 Horas, 3W, minimo 180, , temperatura de color maximo 3000K, lumens de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación | 20 días | $ 745,656.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |

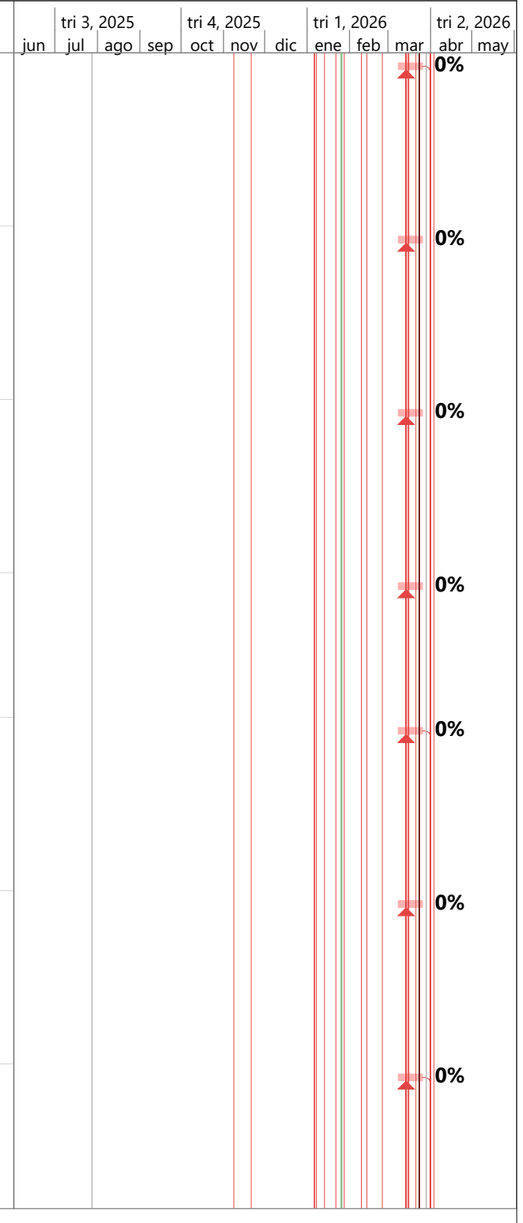


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 8.8.9 | Suministro e instalación de salida de iluminación en piso incluye caja plastica, tuberia PV 3/4"y accesorios,5m cable de cobre 3X12 THHN/THWN-2 | 20 días | $ 739,332.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | 242 |
| 120 | **8.9** | **SISTEMA DE PUESTA A TIERRA** | **271 días** | **$ 459,076.00** | **lun 28/07/25** | **mié 25/03/26** | | |
| 121 | 8.9.1 | suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo Nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 122 | 8.9.2 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero. | 20 días | $ 37,373.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 123 | 8.9.3 | suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material | 20 días | $ 276,722.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 124 | 8.9.4 | suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red | 20 días | $ 144,981.00 | dom 8/03/26 | mié 25/03/26 | 165 | |
| 125 | 8.9.5 | Suministro e instalación de tratamiento artificial | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 126 | **8.10** | **APANTALLAMIENTO** | **20 días** | **$ 17,062,950.00** | **jue 5/03/26** | **lun 23/03/26** | | |
| 127 | 8.10.1 | suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm | 20 días | $ 5,799,786.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |
| 128 | 8.10.2 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero. | 20 días | $ 224,238.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | 242 |
| 129 | 8.10.3 | suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material | 20 días | $ 1,660,332.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | 242 |
| 130 | 8.10.4 | suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red | 20 días | $ 869,886.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | 242 |
| 131 | 8.10.5 | Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en diámetro 5/8. | 20 días | $ 2,252,076.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |
| 132 | 8.10.6 | suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes | 20 días | $ 5,553,258.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |

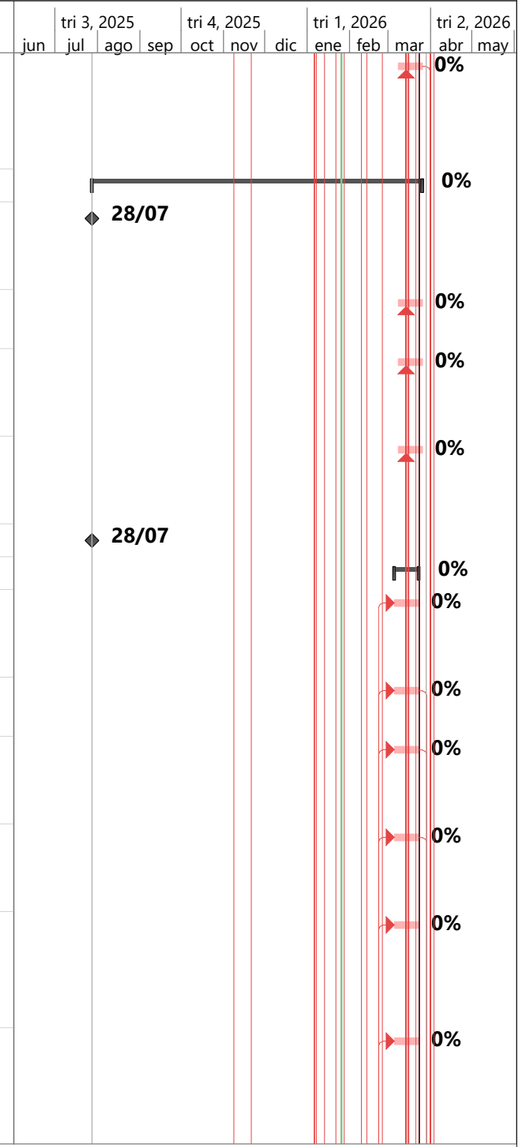


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | | Progreso de tarea | | Línea base | | Resumen | | Tarea inactiva | | | |
| División crítica | | Tarea manual | | División de la línea base | | Resumen manual | | Hito inactivo | | | |
| Progreso de tarea crítica | | solo el comienzo | | Hito de línea base | | Resumen del proyecto | | Resumen inactivo | | | |
| Tarea | | solo fin | | Hito | | Tareas externas | | Fecha límite | | | |
| División | | solo duración | | Progreso del resumen | | Hito externo | | | | | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 8.10.7 | suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación | 20 días | $ 703,374.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | 242 |
| 134 | **8.111** | **CERTIFICACIONES Y TRAMITES** | **20 días** | **$ 2,190,184.00** | **jue 5/03/26** | **lun 23/03/26** | | **242** |
| 135 | 8.11.1 | Suministro e instalación salida eléctrica en muro (2,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tuberia PVC 3/4 (nstalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios. | 20 días | $ 563,472.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |
| 136 | 8.11.4 | Suministro e instalación de ventilador de pared, minimo 3 velocidades, aspas minimo de 12", sistema conexión a 120V | 20 días | $ 1,626,712.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | 242;140;138;139;141 |
| 137 | **8.12** | **VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN** | **5.25 días** | **$ 10,951,283.00** | **lun 23/03/26** | **vie 27/03/26** | | |
| 138 | 8.12.1 | Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC | 5 días | $ 3,607,644.00 | lun 23/03/26 | vie 27/03/26 | 136 | 242 |
| 139 | 8.12.2 | Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC. | 5 días | $ 4,509,555.00 | lun 23/03/26 | vie 27/03/26 | 136 | 242 |
| 140 | 8.12.3 | Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asigandas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establ | 5 días | $ 2,047,683.00 | lun 23/03/26 | vie 27/03/26 | 136 | |
| 141 | 8.12.4 | Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión. | 5 días | $ 786,401.00 | lun 23/03/26 | vie 27/03/26 | 136 | 242 |
| 142 | **9** | **REDES ESPECIALES** | **20 días** | **$ 13,444,506.00** | **jue 5/03/26** | **lun 23/03/26** | | |
| 143 | **9.1** | **CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)** | **20 días** | **$ 13,444,506.00** | **jue 5/03/26** | **lun 23/03/26** | | |
| 144 | 9.1.1 | Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto | 20 días | $ 1,596,402.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |

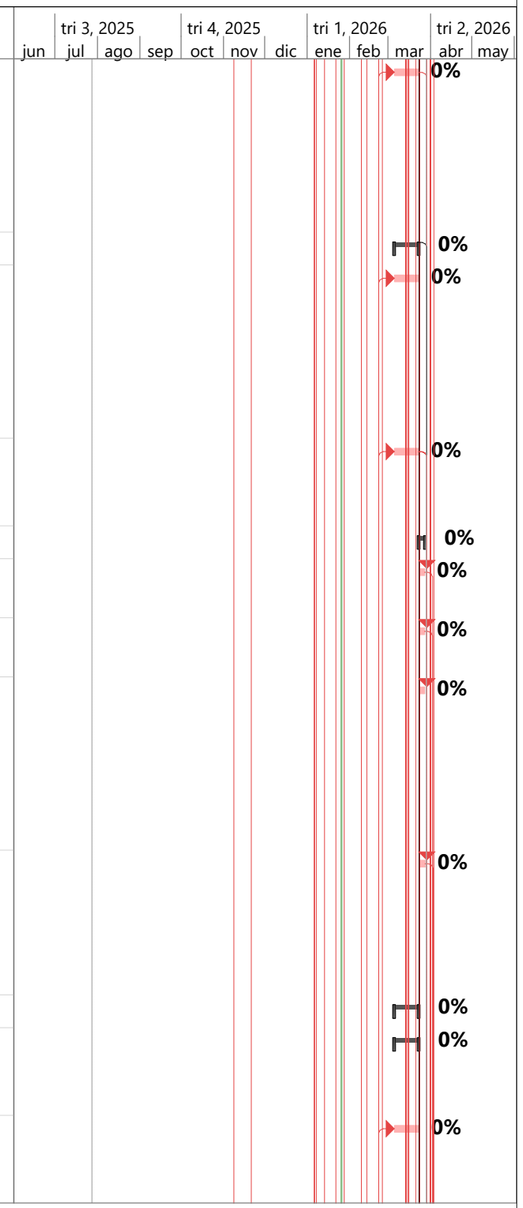


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 9.1.2 | Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH | 20 días | $ 2,096,484.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |
| 146 | 9.1.3 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS | 20 días | $ 1,159,657.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |
| 147 | 9.1.4 | Suministro e instalación de Swicth 24 puertos 10/100/1000 | 20 días | $ 643,692.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |
| 148 | 9.1.5 | Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH | 20 días | $ 647,870.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |
| 149 | 9.1.6 | Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 salida | 20 días | $ 1,017,815.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |
| 150 | 9.1.7 | Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida | 20 días | $ 2,886,853.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | 242 |
| 151 | 9.1.8 | Suministro e instalación de ACCES POINT DE USO INTERIOR (300Mbps Acces point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Boton QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de | 20 días | $ 463,200.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | 242 |
| 152 | 9.1.9 | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería conduit PVC de 3/4"; (incluye cajas de paso , curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación). | 20 días | $ 493,496.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |
| 153 | 9.1.10 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuida | 20 días | $ 1,129,537.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |

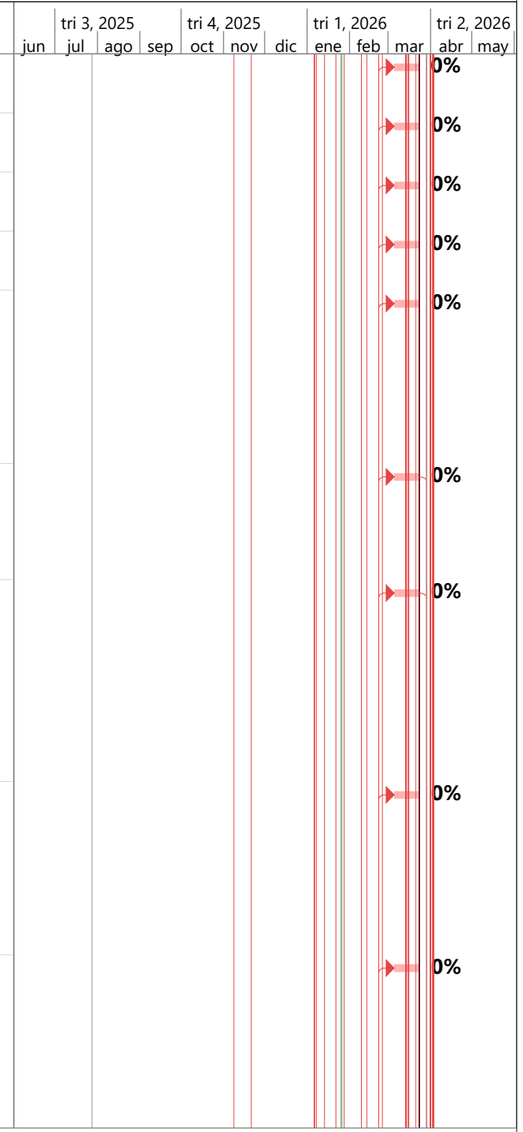


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 9.1.11 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su corr | 20 días | $ 1,309,500.00 | jue 5/03/26 | lun 23/03/26 | 165CC+2 días | |
| 155 | **10** | **MAMPOSTERÍA** | **28 días** | **$ 19,490,604.00** | **mar 13/01/26** | **sáb 7/02/26** | | |
| 156 | 10.1 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°5, Incluye suministro e instalación, grafil doble cada 4ta hilada, mortero de pega 1:3, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. | 28 días | $ 6,331,181.00 | mar 13/01/26 | sáb 7/02/26 | 31FC+15 días | 34CC;168FC+15 días;157CC+22 días;158CC+22 días;159CC+22 días;160CC+22 días |
| 157 | 10.16 | COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones y forma según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad | 6 días | $ 2,208,134.00 | lun 2/02/26 | sáb 7/02/26 | 156CC+22 días | 34CC |
| 158 | 10.17 | VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | 6 días | $ 3,696,332.00 | lun 2/02/26 | sáb 7/02/26 | 156CC+22 días | |
| 159 | 10.31 | LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro ret | 6 días | $ 1,726,408.00 | lun 2/02/26 | sáb 7/02/26 | 156CC+22 días | 33 |
| 160 | 10.32 | Muro en concreto a la vista de 3.000 PSI en concreto a la vista segun diseños, no incluye refuerzo. | 6 días | $ 5,528,549.00 | lun 2/02/26 | sáb 7/02/26 | 156CC+22 días | |
| 161 | **11** | **CUBIERTA Y CIELO RASO** | **253 días** | **$ 95,757,201.00** | **lun 28/07/25** | **lun 9/03/26** | | |
| 162 | **11.1** | **ELEMENTOS DE CUBIERTA** | **2 días** | **$ 9,189,304.00** | **dom 8/03/26** | **lun 9/03/26** | | |
| 163 | 11.1.2 | SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instal | 2 días | $ 9,189,304.00 | dom 8/03/26 | lun 9/03/26 | 165 | 242 |

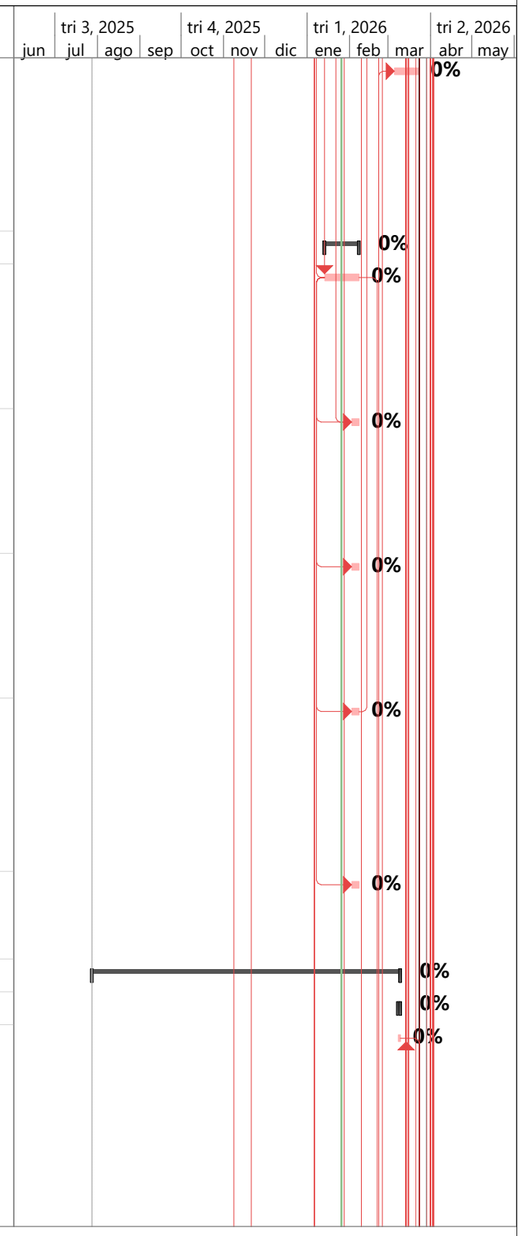


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | **11.2** | **CUBIERTA** | **251 días** | **$ 86,567,897.00** | **lun 28/07/25** | **dom 8/03/26** | | |
| 165 | 11.2.1 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. incluye caballetes, remat | 5 días | $ 86,567,897.00 | mar 3/03/26 | dom 8/03/26 | 224;223 | 163;127CC+2 días;128CC+2 días;129CC+2 días;130CC+2 días;131CC+2 días;132CC+2 días;133CC+2 |
| 166 | 11.3.1 | CIELO RASO DESCOLGADO EN LÁMINAS DE DRY WALL DE 1/2", con dilataciones, tratamiento de juntas con cinta malla. Pintura color blanco, 3 manos. | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 167 | **12** | **PAÑETES** | **15 días** | **$ 5,603,267.00** | **sáb 21/02/26** | **vie 6/03/26** | | |
| 168 | 12.1 | PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, puertas y ventanas y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación | 15 días | $ 5,603,267.00 | sáb 21/02/26 | vie 6/03/26 | 156FC+15 días | 229 |
| 169 | **13** | **ENCHAPES** | **4 días** | **$ 2,324,466.00** | **mié 11/03/26** | **dom 15/03/26** | | |
| 170 | 13.2 | MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +-0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto at | 4 días | $ 1,167,821.00 | mié 11/03/26 | dom 15/03/26 | 174 | 242 |
| 171 | 13.3 | POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de aluminio, mano de obra | 2 días | $ 244,492.00 | mié 11/03/26 | vie 13/03/26 | 174 | |
| 172 | 13.8 | ENCHAPE DE PARED/PISO EN CERÁMICA GRES NEW TABLÓN TRADICIÓN SAHARA (Dimensión mínima 30 cm X 30 cm) PARA USO INSTITUCIONAL. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca | 2 días | $ 912,153.00 | mié 11/03/26 | vie 13/03/26 | 174 | 176 |
| 173 | **14** | **BASES Y PISOS** | **9 días** | **$ 25,130,767.00** | **dom 8/03/26** | **lun 16/03/26** | | |

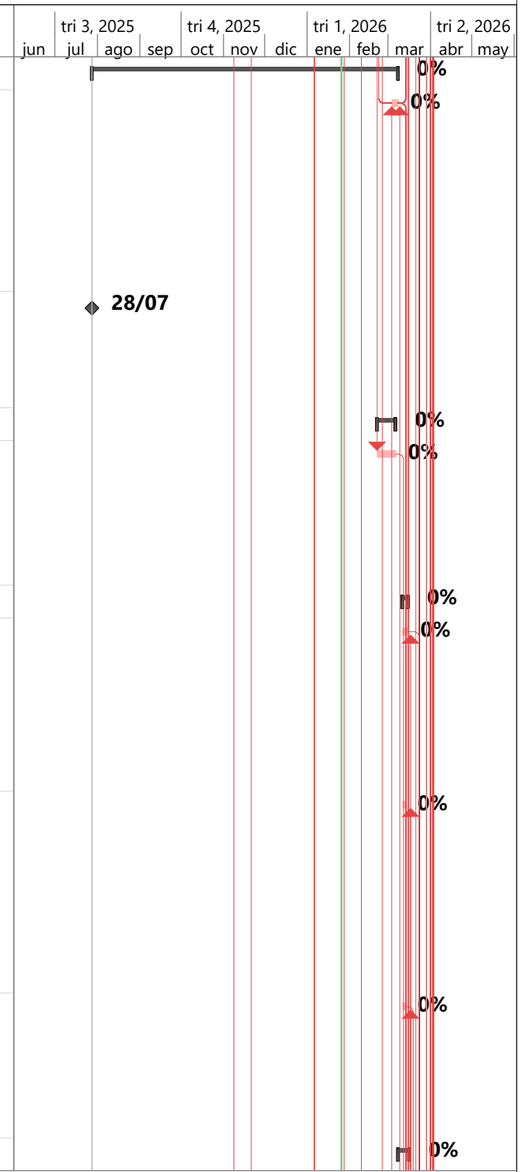


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 14.1 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, espesor 4 cm, incluye dilataciones en material flexible (según diseño), pendientado y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación | 4 días | $ 8,102,220.00 | dom 8/03/26 | mié 11/03/26 | 165 | 171;172;175;170 |
| 175 | 14.15 | ENCHAPE DE PISO/PARED EN CERÁMICA GRES NEW TABLÓN TRADICIÓN SAHARA (Dimensión mínima 30 cm X 30 cm) PARA USO INSTITUCIONAL. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca | 5 días | $ 16,143,559.00 | mié 11/03/26 | lun 16/03/26 | 174 | 181FC+5 días;182FC+5 días;183FC+5 días;191;192;193;194;19 |
| 176 | 14.16 | ZÓCALO SANITARIO EN GRES tipo Media-Caña, GRES SAHARA. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca | 3 días | $ 884,988.00 | vie 13/03/26 | lun 16/03/26 | 172 | 242 |
| 177 | **15** | **CARPINTERÍA METALICA Y DE ALUMINIO** | **268 días** | **$ 17,297,246.00** | **lun 28/07/25** | **lun 23/03/26** | | |
| 178 | **15.1** | **OTROS ELEMENTOS METÁLICOS** | **0 días** | **$ 0.00** | **lun 28/07/25** | **lun 28/07/25** | | |
| 179 | 15,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1"PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correc | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 180 | **15.3** | **PUERTAS METALICAS** | **3 días** | **$ 17,297,246.00** | **vie 20/03/26** | **lun 23/03/26** | | |
| 181 | 15.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y ESTRUCTURA EN ACERO COLD-ROLLED 4 HOJAS TIPO REJA CON PLATINAS DE 2"(3.30x2.20mts) PARA ENTRADA PRINCIPAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P-01). Incluye material, mano de obra, herramienta y demás mate | 3 días | $ 7,598,080.00 | vie 20/03/26 | lun 23/03/26 | 175FC+5 días | 188 |
| 182 | 15.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (0,9x2.20 mts.) BAÑO, COCINETA, BODEGA, ASEO, OFICINA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P-02) Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. | 3 días | $ 6,849,886.00 | vie 20/03/26 | lun 23/03/26 | 175FC+5 días | 188CC+1 día |

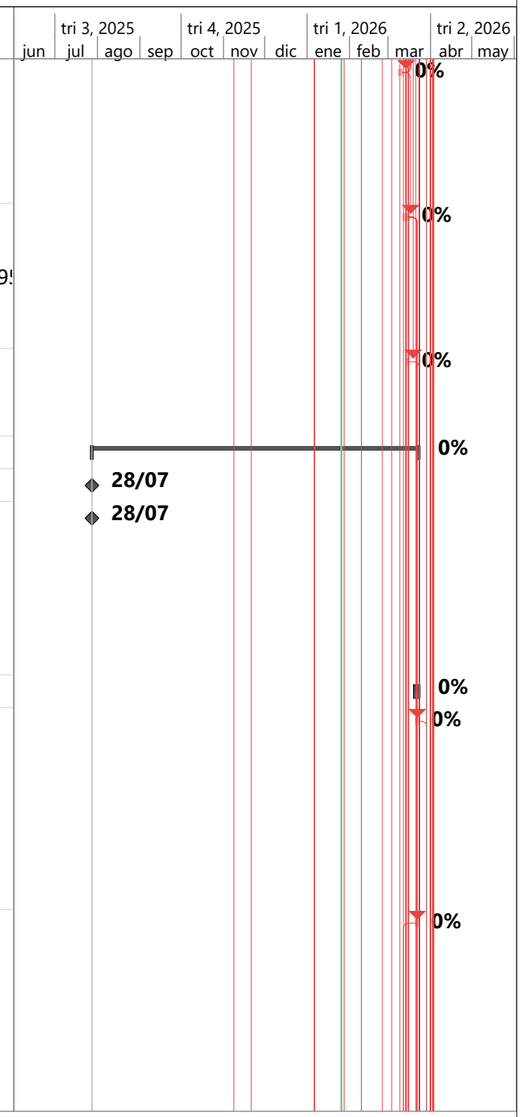


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | | Progreso de tarea | | Línea base | | Resumen | | Tarea inactiva | | | |
| División crítica | | Tarea manual | | División de la línea base | | Resumen manual | | Hito inactivo | | | |
| Progreso de tarea crítica | | solo el comienzo | | Hito de línea base | | Resumen del proyecto | | Resumen inactivo | | | |
| Tarea | | solo fin | | Hito | | Tareas externas | | Fecha límite | | | |
| División | | solo duración | | Progreso del resumen | | Hito externo | | | | | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 15.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA CON MARCO Y ESTRUCTURA EN ACERO COLD-ROLLED CON PLATINAS DE 2"(3.30x2.20mts) PARA FACHADA HACIA LA CALLE (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO R-01). Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesari | 3 días | $ 2,849,280.00 | vie 20/03/26 | lun 23/03/26 | 175FC+5 días | 187CC+1 día;188CC+1 día |
| 184 | **16** | **CARPINTERÍA DE MADERA** | **8 días** | **$ 23,495,875.00** | **dom 8/03/26** | **dom 15/03/26** | | |
| 185 | 16.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TIPO PERSIANA DE 1.37x3.30mts EN TABLA (9x4cms) EN MADERA DE PINO AMARILLO INMUNIZADO A VACÍO PRESIÓN. INCLUYE PARALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE SUJECION, PROTECCIÓN CON LACA PORO ABIERTA TIPO PROFILAN NATURAL A DOS MANOS | 8 días | $ 23,495,875.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 39CC |
| 186 | **17** | **CERRADURAS** | **4 días** | **$ 4,213,422.00** | **sáb 21/03/26** | **mié 25/03/26** | | |
| 187 | 17.1 | COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Eiffel, 2 Cierrapuertas Ref. 3005; incluye accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos | 2 días | $ 3,900,066.00 | sáb 21/03/26 | lun 23/03/26 | 183CC+1 día | 242 |
| 188 | 17.3 | CERRADURA CERROJO SENCILLO MULTIPUNTO CROMADO MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | 2 días | $ 313,356.00 | lun 23/03/26 | mié 25/03/26 | 181;182CC+1 día;183CC+1 día | 242 |
| 189 | **18** | **DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS** | **14 días** | **$ 6,618,325.00** | **dom 15/03/26** | **vie 27/03/26** | | |
| 190 | **18.1** | **APARATOS SANITARIOS** | **4 días** | **$ 2,320,154.00** | **lun 16/03/26** | **jue 19/03/26** | | |
| 191 | 18.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LINEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y | 4 días | $ 658,739.00 | lun 16/03/26 | jue 19/03/26 | 175 | |

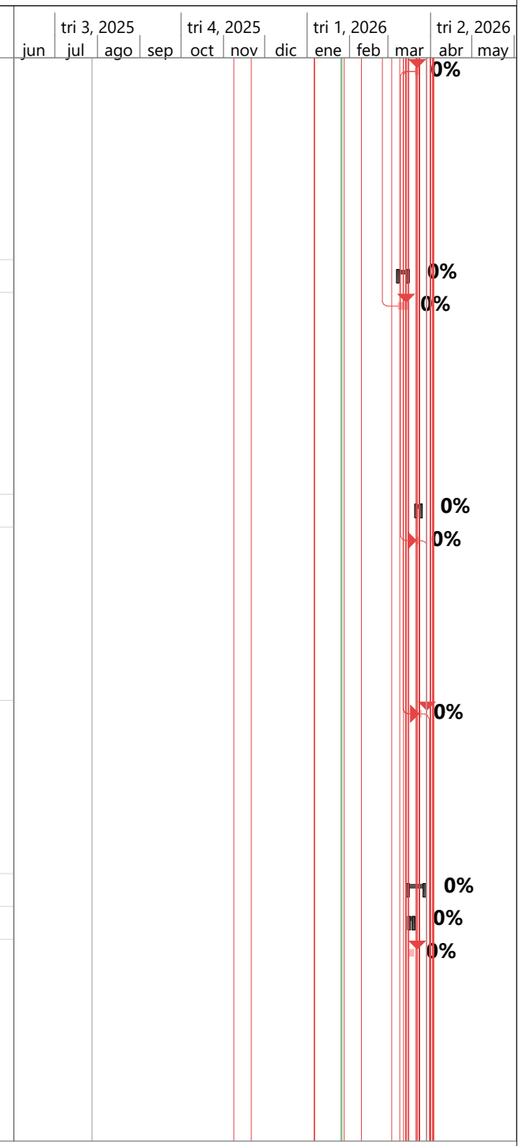


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 18.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | 4 días | $ 732,925.00 | lun 16/03/26 | jue 19/03/26 | 175 | |
| 193 | 18.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | 4 días | $ 402,088.00 | lun 16/03/26 | jue 19/03/26 | 175 | 198 |
| 194 | 18.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | 4 días | $ 363,540.00 | lun 16/03/26 | jue 19/03/26 | 175 | 197 |
| 195 | 18.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | 4 días | $ 162,862.00 | lun 16/03/26 | jue 19/03/26 | 175 | 199 |
| 196 | **18.2** | **GRIFERIA** | **6 días** | **$ 2,231,739.00** | **dom 15/03/26** | **vie 20/03/26** | | |
| 197 | 18.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | 1 día | $ 625,626.00 | jue 19/03/26 | vie 20/03/26 | 194 | 242 |
| 198 | 18.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXOMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | 1 día | $ 1,090,962.00 | jue 19/03/26 | vie 20/03/26 | 193 | 242 |

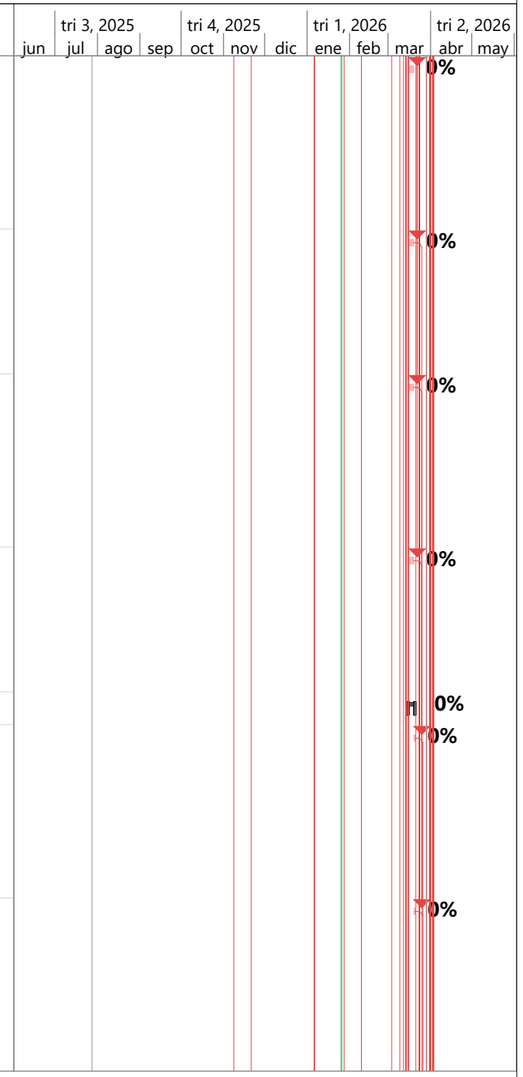


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 18.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | 1 día | $ 155,199.00 | jue 19/03/26 | vie 20/03/26 | 195 | 242;202FC+7 días;203FC+7 días;204FC+7 días;208FC+7 días;210FC+7 días;211FC+7 |
| 200 | 18.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA POCETA Y RIEGO + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | 1 día | $ 359,952.00 | dom 15/03/26 | lun 16/03/26 | 46;53 | 242 |
| 201 | **18.3** | **ACCESORIOS** | **1 día** | **$ 2,066,432.00** | **jue 26/03/26** | **vie 27/03/26** | | |
| 202 | 18.3.1 | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN"U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación. | 1 día | $ 399,046.00 | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 | 199FC+7 días | 242 |
| 203 | 18.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION Gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared en acero inoxidable, para 450 toallas plegadas en C o 600 múltifold. | 1 día | $ 482,612.00 | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 | 199FC+7 días | 242 |
| 204 | 18.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE PARED, capacidad en peso: 25 kg, dimensiones 84 cm x 54 cm x 10 cm color gris, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. | 1 día | $ 1,184,774.00 | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 | 199FC+7 días | 242 |
| 205 | **19** | **PINTURAS** | **10 días** | **$ 4,741,561.00** | **jue 12/03/26** | **sáb 21/03/26** | | |
| 206 | 19.1 | APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de | 10 días | $ 4,741,561.00 | jue 12/03/26 | sáb 21/03/26 | 229 | 242 |
| 207 | **20** | **VIDRIOS Y ESPEJOS** | **1 día** | **$ 706,110.00** | **jue 26/03/26** | **vie 27/03/26** | | |

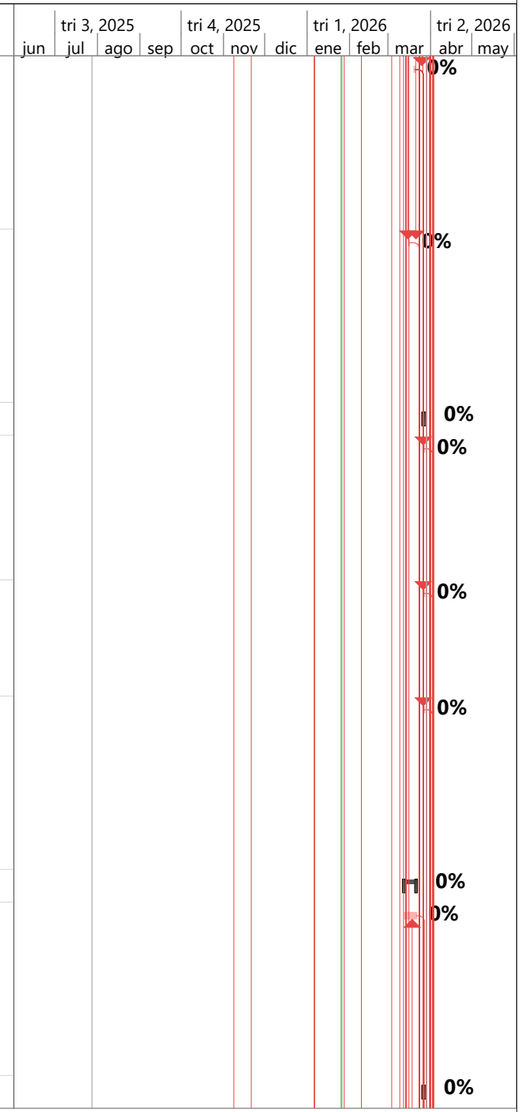


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 20.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás | 1 día | $ 706,110.00 | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 | 199FC+7 días | 242 |
| 209 | **21** | **EQUIPOS Y OTROS** | **22 días** | **$ 7,394,646.00** | **dom 8/03/26** | **vie 27/03/26** | | |
| 210 | 21.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica) | 1 día | $ 281,164.00 | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 | 199FC+7 días | |
| 211 | 21.2 | EXTINTOR MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LB INCLUYE BASE DE APOYO Y BAJO CUMPLIMIENTO DE NORMA | 1 día | $ 207,228.00 | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 | 199FC+7 días | |
| 212 | 21.3 | Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidroacumulador, arrancador montado, válvula de píe, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, manómetro, presostato y switch flotador. Tanque p | 8 días | $ 6,906,254.00 | dom 8/03/26 | dom 15/03/26 | 165 | 242 |
| 213 | **22** | **CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES** | **256 días** | **$ 7,420,308.00** | **lun 28/07/25** | **jue 12/03/26** | | |
| 214 | 22.1 | ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 1,5 veces el ancho del anden) incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. | 5 días | $ 5,429,184.00 | dom 8/03/26 | jue 12/03/26 | 165 | |
| 215 | 22.2 | BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | 0 días | $ 0.00 | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | | |
| 216 | 22.7 | BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la | 2 días | $ 1,991,124.00 | dom 8/03/26 | lun 9/03/26 | 165 | |
| 217 | **23** | **SEÑALIZACIÓN** | **1 día** | **$ 2,250,043.00** | **jue 26/03/26** | **vie 27/03/26** | | |
| 218 | 23.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS METÁLICAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO | 1 día | $ 1,417,208.00 | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 | 199FC+7 días | |

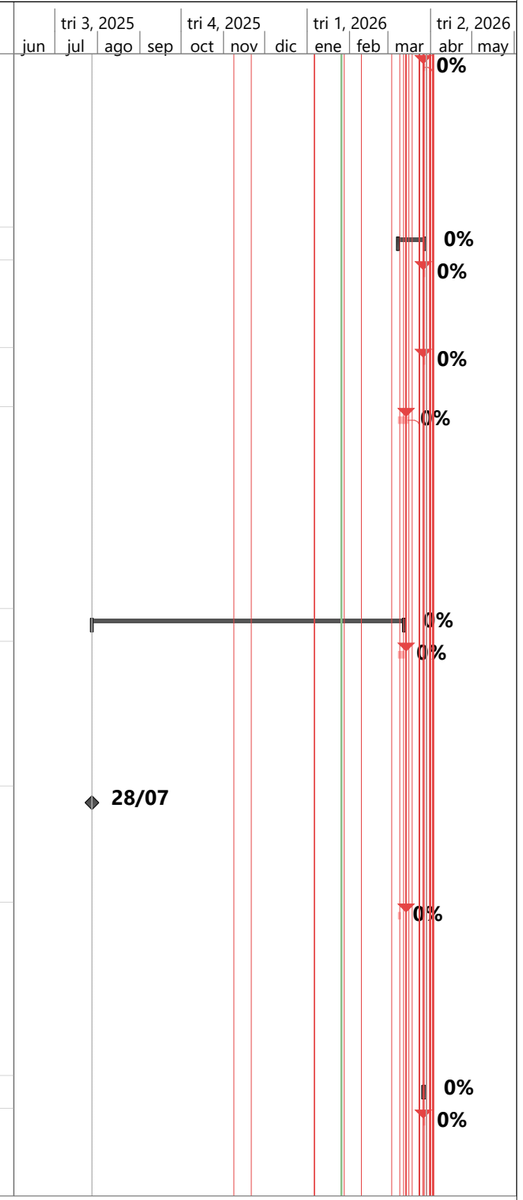


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | | Progreso de tarea | | Línea base | | Resumen | | Tarea inactiva | | | |
| División crítica | | Tarea manual | | División de la línea base | | Resumen manual | | Hito inactivo | | | |
| Progreso de tarea crítica | | solo el comienzo | | Hito de línea base | | Resumen del proyecto | | Resumen inactivo | | | |
| Tarea | | solo fin | | Hito | | Tareas externas | | Fecha límite | | | |
| División | | solo duración | | Progreso del resumen | | Hito externo | | | | | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 23.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN | 1 día | $ 832,835.00 | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 | 199FC+7 días | 242;221 |
| 220 | **25** | **ASEO GENERAL** | **1 día** | **$ 1,258,515.00** | **vie 27/03/26** | **sáb 28/03/26** | | |
| 221 | 25.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | 1 día | $ 1,258,515.00 | vie 27/03/26 | sáb 28/03/26 | 219 | 242;14CC |
| 222 | **26** | **ITEM NO PREVISTOS** | **151 días** | **$ 507,291,140.00** | **dom 2/11/25** | **mar 17/03/26** | | |
| 223 | 26.1 | ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CAIMO -CAIMITO 7CM X 15CM PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para | 28 días | $ 122,033,102.00 | mié 28/01/26 | sáb 21/02/26 | 31FC+30 días | 224CC;165 |
| 224 | 26.2 | ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CAIMO -CAIMITO 5CM X 11CM PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para | 39 días | $ 167,234,448.00 | mié 28/01/26 | mar 3/03/26 | 223CC | 165 |
| 225 | 26.3 | PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización | 14 días | $ 51,668,589.00 | dom 2/11/25 | sáb 15/11/25 | 19 | 30;242 |
| 226 | 26.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO ESTRUCTURAL CON ROSCA TOTAL ROTHOBLAAS O SIMILAR, Ø 9 MM Y LONGITUD 160 MM | 2 días | $ 5,226,750.00 | lun 9/02/26 | mié 11/02/26 | 31FC+45 días | |
| 227 | 26.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE QUIMICO EN VARILLA ø 3/8" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, Epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución | 4 días | $ 2,270,880.00 | lun 9/02/26 | vie 13/02/26 | 31FC+45 días | |
| 228 | 26.6 | VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI) impermeabilizado , forma y dimensiones según diseño, incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado, impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 y/o similar | 10 días | $ 37,609,021.00 | lun 5/01/26 | mar 13/01/26 | 31FC+5 días | 231 |
| 229 | 26.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZADOPARA MUROS EXTERIORES E INTERIORES H<=3.00 M.-INCLUYE APLICACIÓN | 7 días | $ 6,289,229.00 | vie 6/03/26 | jue 12/03/26 | 168 | 206 |

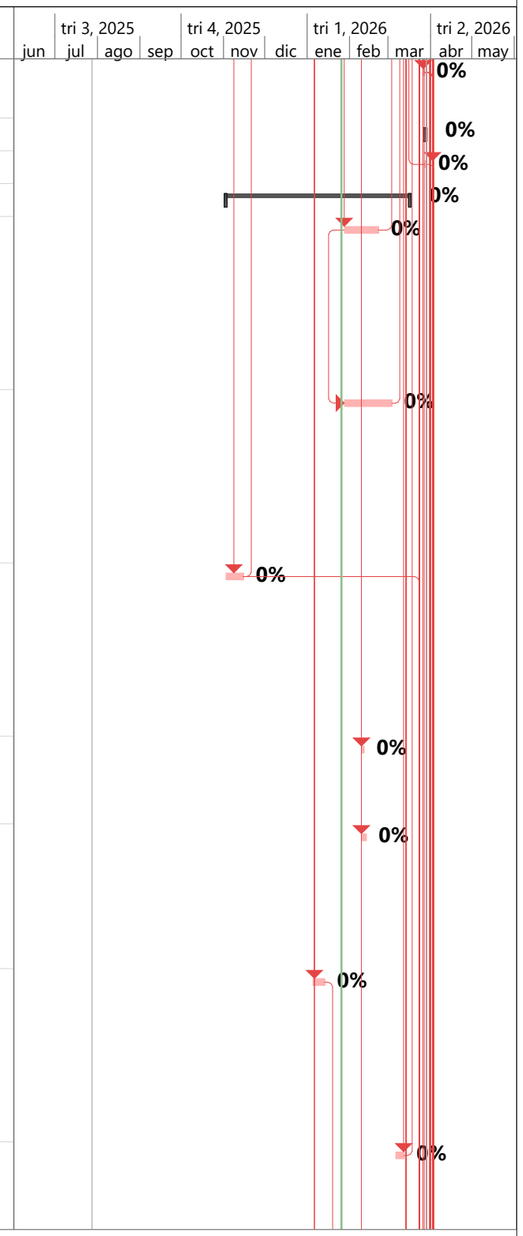


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |


| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 26.8 | CAMPO DE INFILTRACION DE 14m x 8m x 0.60 EN TUBERIA DE 4", INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTIL Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2 días | $ 36,769,188.00 | dom 8/03/26 | lun 9/03/26 | 165 | 232;239 |
| 231 | 26.9 | DEMOLICIÓN ELEMENTOS EN CONCRETO | 5 días | $ 880,965.00 | mar 13/01/26 | dom 18/01/26 | 228 | |
| 232 | 26.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA EXPANDIDA 12 CALIBRE 18 CON TERMINADO EN PINTURA EPOXIPOLIAMINA Y PUERTA DOBLE BATIENTE | 6 días | $ 24,970,367.00 | mar 10/03/26 | dom 15/03/26 | 230 | |
| 233 | 26.11 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PLATINAS 240X200X3/8", DOS PLATINAS DE 200X150X3/8" Y DOS PLATINAS DE 150X150X3/8" PARA CONEXIONES DE VIGAS DE MADERA PARA ESTRUCTURA DE MADERA | 3 días | $ 5,257,696.00 | lun 9/02/26 | jue 12/02/26 | 31FC+45 días | 234 |
| 234 | 26.12 | ENTIBADO EN MADERA PARA CONTENCIÓN DE TALUDES DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN | 5 días | $ 13,587,385.00 | jue 12/02/26 | lun 16/02/26 | 233 | |
| 235 | 26.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 5000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | 1 día | $ 4,346,220.00 | dom 8/03/26 | lun 9/03/26 | 165 | |
| 236 | 26.14 | MENSULAS EN CONCRETO DE 4000 PSI f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto | 10 días | $ 10,462,912.00 | lun 5/01/26 | mar 13/01/26 | 31FC+5 días | |
| 237 | 26.15 | SOBRESALTO EN CONCRETO DE 4000 PSI f´c=28 Mpa (4000 PSI), 0.40x0.30 mts según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto | 10 días | $ 4,645,056.00 | lun 5/01/26 | mar 13/01/26 | 31FC+5 días | |
| 238 | 26.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ANTIRRETORNO DE 4" PARA SISTEMA SANITARIO. | 1 día | $ 462,219.00 | dom 8/03/26 | lun 9/03/26 | 165 | |
| 239 | 26.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA SEGÚN DISEÑO, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario | 2 días | $ 1,317,952.00 | mar 10/03/26 | mié 11/03/26 | 230 | |
| 240 | 26.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO EN ESTRUCTURA DE MADERA Y MALLA EN ANGEO. | 1 día | $ 2,412,560.00 | dom 8/03/26 | lun 9/03/26 | 165 | |

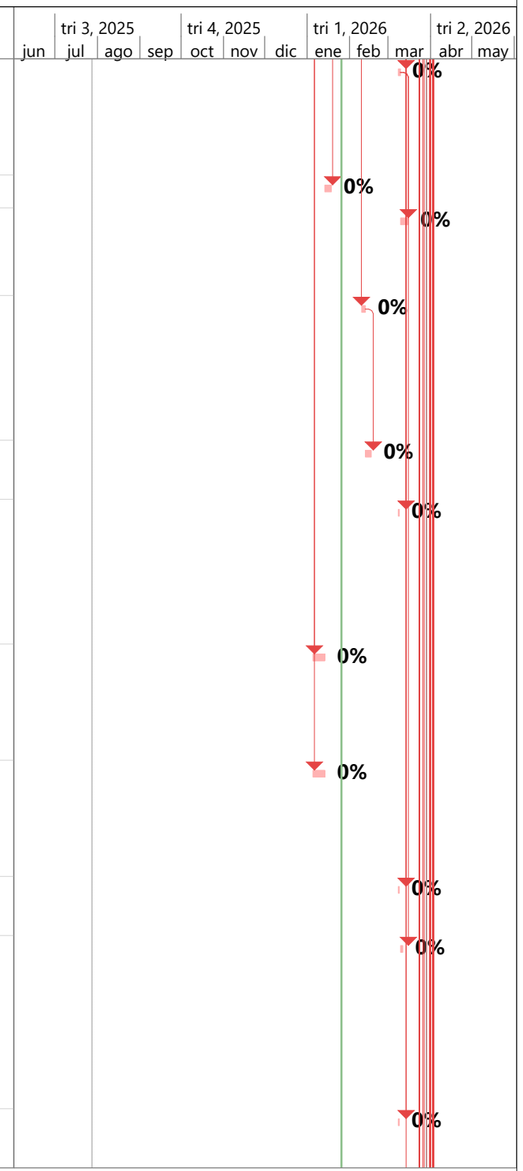


LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |

| Id | ítem | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 26.19 | CIELO RASO EN LÁMINA PVC CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 1 PULG. CAL. 26, incluye corniza e instalación. | 10 días | $ 9,846,601.00 | dom 8/03/26 | mar 17/03/26 | 165 | |
| 242 | | FIN | 0 días | $ 0.00 | sáb 28/03/26 | sáb 28/03/26 | 18;21;163;170;176;188;1 | |




LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL CONSORCIO DEPOR HD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | Progreso de tarea | Línea base | Resumen | Tarea inactiva |
| División crítica | Tarea manual | División de la línea base | Resumen manual | Hito inactivo |
| Progreso de tarea crítica | solo el comienzo | Hito de línea base | Resumen del proyecto | Resumen inactivo |
| Tarea | solo fin | Hito | Tareas externas | Fecha límite |
| División | solo duración | Progreso del resumen | Hito externo | |
