INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	ana CONSORCIO SANTA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - CENTRO DE INSTRUCCIÓN MEDELLIN (Bello)

Quincena Número: 5 Del: 16 DE DICIEMBRE DE 2025 Al: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **16**

ENTIDAD CONTRATANTE: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE: **CENTRO DE INSTRUCCIÓN MEDELLIN (Bello)** SUPERVISOR: **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,59%	97,65%
Valor básico de la Obra	$ 3.293.049,50	$ 124.388.855,00

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,94%	96,67%
Valor básico de la Obra	$ 1.200.000,00	$ 123.152.756,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Contrato No.	232 DE 2025
Valor Inicial:	$ 1.994.081.233
Valor Actualizado:	$ 1.994.081.233
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2026-02-15

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor:	CONSORCIO SANTA ANA
Contrato No.	237 DE 2025
Valor Inicial:	$ 198.297.614
Valor Actualizado:	$ 198.297.614
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2026-02-15

AVANCE

En este periodo se ha realizado las siguientes actividades:

1. Durante el período se continuo con la instalación la instalación de estructura metálica para la cubierta.

IMAGENES VISITA.

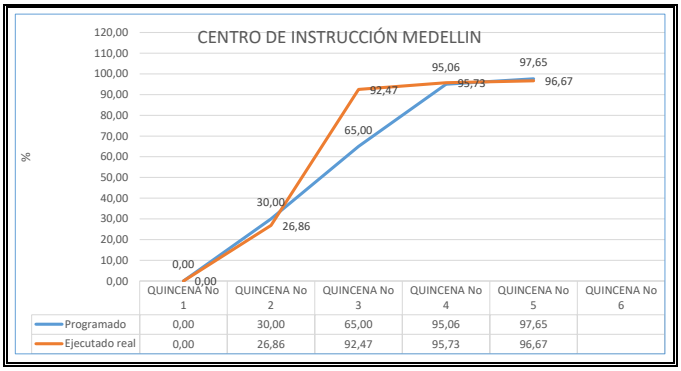



Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Se esta llevando a cabo la instalacion de las platinas de amclaje de cubierta y se dio inicio a la instalacion de columnas.





Comentario: Se esta llevando a cabo la instalacion de las platinas de amclaje de cubierta y se dio inicio a la instalacion de columnas.

Comentario: Se esta llevando a cabo la instalacion de las platinas de amclaje de cubierta y se dio inicio a la instalacion de columnas.

OBSERVACIONES

En este periodo se adelantaron las actividades establecidas en el cronograma, teniendo en cuenta que encontrandose en epoca de fin de año se presentaron algunos imprevistos en cuanto a la disponibilidad de materiales y equipos necesarios para el correcto desarrollo de las obras.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO

Matrícula No.: 25700-38998 CND
