INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA ANA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GROPE SEDE CENTRAL (Picota)

Quincena Número: 6 Del: 01 DE ENERO DE 2026 Al: 15 DE ENERO DE 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **GROPE SEDE CENTRAL PICOTA Calle 51 sur No 5F -50** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,58%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 8.136.420,50	$ 145.757.192,50

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,88%	90,94%
Valor básico de la Obra	$ 4.200.000,00	$ 132.557.193,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Contrato No.	232 DE 2025
Valor Inicial:	$ 1.994.081.233
Valor Actualizado:	$ 1.994.081.233
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2026-02-15

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO SANTA ANA
Contrato No.	237 DE 2025
Valor Inicial:	$ 198.297.614
Valor Actualizado:	$ 198.297.614
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2026-02-15

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA






AVANCE

En este periodo se ha realizado principalmente actividades de desmonte de las siguientes actividades:


1. Durante el período se continuaron con enchapes y pinturas internas esta pendiente la instalación de la carpintería metálica, puertas y ventana de Armerillo.

IMAGENES AVANCE

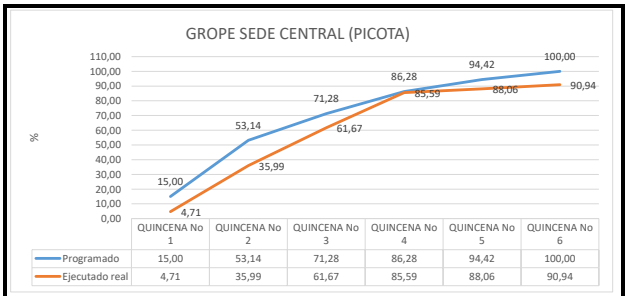

	QUINCENA No 1	QUINCENA No 2	QUINCENA No 3	QUINCENA No 4	QUINCENA No 5	QUINCENA No 6
Programado	15,00	53,14	71,28	86,28	94,42	100,00
Ejecutado real	4,71	35,99	61,67	85,59	88,06	90,94





Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Adecuacion de fachada.







Comentario: Adecuacion de fachada.

Comentario: Adecuacion de interiores.

INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA


INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GROPE SEDE CENTRAL (Picota)

Quincena Número: 6 Del: 01 DE ENERO DE 2026 Al: 15 DE ENERO DE 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **GROPE SEDE CENTRAL PICOTA Calle 51 sur No 5F -50** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**






Comentario: Adecuacion de interiores.





Comentario: Adecuacion de interiores.





Comentario: Adecuacion de interiores.





Comentario: Adecuacion de interiores.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
En este periodo se adelantaron las actividades establecidas en el cronograma, teniendo en cuenta que encontrandose en epoca de fin de año se presentaron algunos imprevistos en cuanto a la disponibilidad de materiales y equipos necesarios para el correcto desarrollo de las obras.	Firma Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO Matrícula No.: 25700-38998 CND
