INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA ANA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GRUPO DE ARMAMENTO. (Bogotá)

Quincena Número: 6 Del: 01 DE ENERO DE 2026 Al: 15 DE ENERO DE 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **GRUPO DE ARMAMENTO Carrera 56 No 18A -60** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

	QUINCENAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	0,49%		100,00%
Valor básico de la Obra	$ 800.000,00	$	$ 164.020.485,00
			0

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,38%	98,05%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 3.900.000,00	$ 160.820.485,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Contrato No.	232 DE 2025
Valor Inicial:	$ 1.994.081.233
Valor Actualizado:	$ 1.994.081.233
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	15/02/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO SANTA ANA
Contrato No.	237 DE 2025
Valor Inicial:	$ 198.297.614
Valor Actualizado:	$ 198.297.614
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	15/02/2026

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA






AVANCE

En este periodo se ha realizado las siguientes actividades:

1. En este periodo se han instalado los vidrios, la puerta metálica aún está en taller y se tiene programada su instalación el 23 de enero 2026

IMAGENES AVANCE

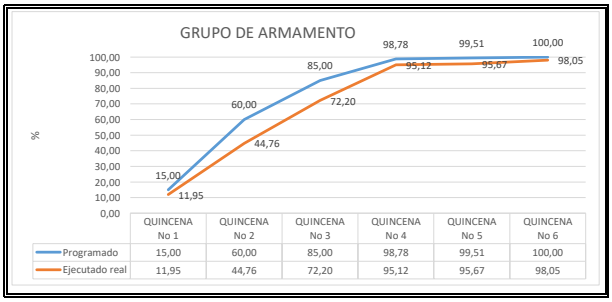

	QUINCENA No 1	QUINCENA No 2	QUINCENA No 3	QUINCENA No 4	QUINCENA No 5	QUINCENA No 6
Programado	15,00	60,00	85,00	98,78	99,51	100,00
Ejecutado real	11,95	44,76	72,20	95,12	95,67	98,05






Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Terminados y adecuacion de espacio





Comentario: Terminados y adecuacion de espacio





Comentario: Terminados y adecuacion de espacio

INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GRUPO DE ARMAMENTO. (Bogotá)

Quincena Número: 6 Del: 01 DE ENERO DE 2026 Al: 15 DE ENERO DE 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y** SEDE **DIRECCIÓN GENERAL Calle 26 No** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
En este periodo se culminaron las actividades establecidas en el cronograma, teniendo en cuenta que encontrandose en epoca de fin de año se presentaron algunos imprevistos en cuanto al fabricación e instalación de la puerta doble en segundo piso.	Firma Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO Matrícula No.: 25700-38998 CND
