INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	ana CONSORCIO SANTA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - CENTRO DE BIENESTAR Y ENTRENAMIENTO DE BINOMIOS CANINOS. (Fusagasuga)

Quincena Número: 6 Del: 01 DE ENERO DE 2026 Al: 15 DE ENERO DE 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BINOMIOS CANINOS (Fusagasuga).** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

	QUINCENAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	14,29%		42,86%
Valor básico de la Obra	$ 41.848.467,14	$	$ 125.545.401,43

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,54%	5,23%
Valor básico de la Obra	$ 4.500.000,00	$ 15.323.211,67

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Contrato No.	232 DE 2025
Valor Inicial:	$ 1.994.081.233
Valor Actualizado:	$ 1.994.081.233
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	15/02/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor:	CONSORCIO SANTA ANA
Contrato No.	237 DE 2025
Valor Inicial:	$ 198.297.614
Valor Actualizado:	$ 198.297.614
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	15/02/2026

AVANCE

En este periodo se ha realizado las siguientes actividades:

1. Durante el período evaluado se actividades de replanteo y se comenzaron las obras derivadas de los diseños

IMAGENES VISITA.

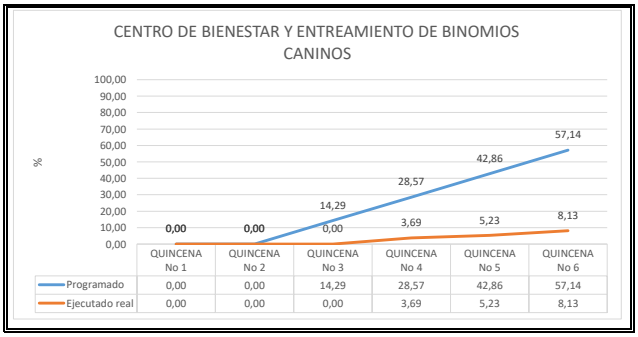



Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Se dio inicio a las actividades de nivelacion y replanteo para proceer con el inicio de las actividades de construccion.





Comentario: Se dio inicio a las actividades de nivelacion y replanteo para proceer con el inicio de las actividades de construccion.

Comentario: Se dio inicio a las actividades de nivelacion y replanteo para proceer con el inicio de las actividades de construccion.

INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - **CENTRO DE BIENESTAR Y ENTRENAMIENTO DE BINOMIOS CANINOS. (Fusagasuga)**

Quincena Número: 6 Del: 01 DE ENERO DE 2026 Al: 15 DE ENERO DE 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BINOMIOS CANINOS (Fusagasuga).** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
En este periodo se adelantaron las actividades establecidas en el cronograma, teniendo en cuenta que encontrandose en epoca de fin de año se presentaron algunos imprevistos sumados a temas de lluvia en este sector.	 Firma Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO Matrícula No.: 25700-38998 CND
