INFORME MENSUAL DE OBRA No. 04



CONTRATO DE OBRA No. 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO TULUNÍ 2025

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PERIODO 4: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
1. Antecedentes del proyecto 4
1.1 Descripción general 4
1.2 Localización 4
1.3 Alcance 4
1.4 Datos generales del contrato de Obra 5
1.5 Modificatorios y/o aclaratorios realizados al contrato 6
1.6 Pólizas contractuales 6
1.7 Seguridad social y parafiscales 8
2. Actividades contractuales 8
2.1 Informe de actividades realizadas en el mes 10
2.1 Personal y equipos 13
2.2 Tabla de programación 15
2.3 Dificultades presentadas 15
2.4 Correspondencia 15
3. Estado financiero del contrato 16
4. Registro fotográfico 16
5. Conclusiones y recomendaciones 30
6. ANEXOS 31

INTRODUCCIÓN

La Gobernación del Tolima, celebró el contrato de obra **No. 1387 del 28 de marzo de 2025**, con el contratista **CONSORCIO TULUNÍ 2025** cuyo objeto es "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**",** por un valor de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVO ($8.796.457.494,01) M/CTE. En un plazo de QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS CALENDARIO.

En este informe se presenta una recopilación de las actividades desarrolladas a lo largo de la ejecución del proyecto para el municipio de Chaparral - Tolima, durante el periodo 4 (01/09/2025 – 30/09/2025). Adicionalmente se encontrará una descripción de los aspectos más relevantes, de las dificultades e inconvenientes encontrados; al igual que la cronología del contrato, etc.

1. Antecedentes del proyecto

1.1 Descripción general

Como mecanismo de aporte al desarrollo de la comunidad del municipio de Chaparral y en pro de mejorar la calidad de vida de los habitantes, la Gobernación del Tolima realizó la gestión de recursos para ejecución del proyecto de la vía Avenida Tuluni en el municipio de Chaparral, con el objetivo de alcanzar mayor cobertura en el desarrollo de actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial urbana. Así como evitar los retrasos en los tiempos de viaje, riesgos de accidente por las vías deterioradas y también, los problemas de salud en la comunidad que allí habita.

1.2 Localización

El proyecto de ubica en la zona urbana del Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, Colombia. Específicamente en la Avenida Tuluni entre Carrera 3 y Carrera 2 Este.

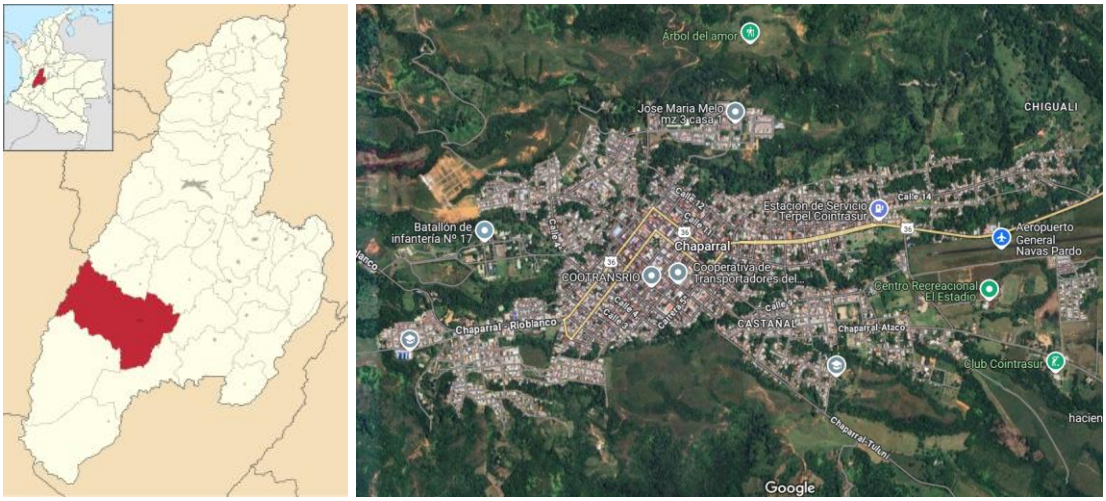


Ilustración 1. Localización del municipio de Chaparral. Fuente: Google Maps

1.3 Alcance

En la actualidad en el municipio de Chaparral habitan alrededor de 54.000 personas, de igual forma hay población flotante de los municipios cercanos de la zona. Por tal razón, el mejoramiento de las vías es de vital importancia para la comunidad por el desarrollo turístico y cultural de la región.

1.4 Datos generales del contrato de Obra

INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA	
LICITACIÓN / CONTRATO No.	LPO-143-2024 / 1387 del 28 de Mayo de 2025
OBJETO	CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025
NIT	901.941.990-2
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RICARDO ORTIGOZA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 de Marzo de 2025
TÉRMINO DEL CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	3 de Junio de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVO ($8.796.457.494,01) M/CTE. EXCENTOS DE IVA
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de Noviembre de 2026

1.5 Modificatorios y/o aclaratorios realizados al contrato

Modificatorio y/o aclaratorio No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
Modificación No. 01 Cesión del Contrato	**ACTA DE CESION DE CONTRATO DE OBRA No. 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 ENTRE LA UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAS URBANAS y CONSORCIO TULUNI 2025**
Descripción	Que teniendo como base la autorización del Ordenador del Gasto se procede a realizar la **cesión del contrato de obra no. 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025** a favor de CONSORCIO TULUNI 2025, representado legalmente por LUIS RICARDO ORTIGOZA identificado con CC. 14.225.60 de Ibagué.
Modificación No. 02	**ACLARATORIA Y MODIFICATORIA DEL ACTA DE CESIÓN DEL CONTRATO**
Descripción	La dirección de contratación al momento de la elaboración de la minuta, por un error de transcripción indicó erradamente el valor por asegurar en la garantía de responsabilidad civil extracontractual. Igualmente, el objetivo es la corrección otros aspectos donde se modifica: Cláusula 8. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, Cláusula 8. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD, Cláusula 16. Garantías, Acta de Cesión.
Modificación de cantidades	**MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 01 del 15 de agosto de 2025 balance mayores y menores.**

1.6 Pólizas contractuales

- Anexo 0. PÓLIZAS MOD. 01 CESIÓN DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
			DESDE	HASTA		
Seguros Mundial	I-100043759	Cumplimiento del contrato	11/04/2025	03/04/2027	$879.645.749,50	Modificada

Seguros Mundial	I-100043759	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización Laboral	11/04/2025	03/10/2029	$439.822.874,75	Modificada
Seguros Mundial	I-100043759	Estabilidad y calidad de la obra	03/10/2026	03/10/2031	$1.759.291.499,00	Modificada
Seguros Mundial	I-100011013	Responsabilidad civil	11/04/2025	03/10/2016	$439.822.874,75	Modificada

- Anexo 1. PÓLIZAS MOD. 002

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
			DESDE	HASTA		
Seguros Mundial	I-100043759	Cumplimiento del contrato	11/04/2025	03/04/2027	$879.645.749,50	Modificada
Seguros Mundial	I-100043759	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización Laboral	11/04/2025	03/10/2029	$439.822.874,75	Modificada
Seguros Mundial	I-100043759	Estabilidad y calidad de la obra	03/10/2026	03/10/2031	$1.759.291.499,00	Modificada
Seguros Mundial	I-100011013	Responsabilidad civil	11/04/2025	03/10/2016	$711.750.00,00	Modificada

- Anexo 2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
			DESDE	HASTA		
Seguros Mundial	I-100043759	Cumplimiento del contrato	03/06/2025	25/05/2027	$879.645.749,50	Vigente
Seguros Mundial	I-100043759	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización Laboral	03/06/2025	25/11/2029	$439.822.874,75	Vigente
Seguros Mundial	I-100043759	Estabilidad y calidad de la obra	25/11/2026	25/11/2031	$1.759.291.499,00	Vigente
Seguros Mundial	I-100011013	Responsabilidad civil	11/04/2025	25/11/2026	$711.750.00,00	Vigente

1.7 Seguridad social y parafiscales

A la fecha del presente informe se han realizado las afiliaciones de todo el personal al Sistema de Seguridad Social y se ha dado cumplimiento a todos los requerimientos de ley.

2. Actividades contractuales

El presente contrato comprende la ejecución de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PRESENTE CONTRATO
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
EXPLANACION Y CAJEO
CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)
ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 2 A 4 MTS)
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 2 A 4 MTS)
CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42, INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.
CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA
CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA
ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION
VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO
ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)
GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 16"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 18"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 24"

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6” PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 14X 6” PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 18X 6” PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 2"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". SOLDADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 2” PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 3” PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 4” PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6 X 4” PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21
SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DE 3" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21
SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DE 4" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 4". SOLDADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 6". SOLDADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 4"
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 2"
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 3"
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 4"
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 6"
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.
PAÑETE INTERIOR
CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M
CONO DE REDUCCIÒN H=065M
PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS
CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI
SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL MONOLITICO RD200V H33
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO
BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO

CEBRA PEATONAL SEGUN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL
BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO(CEBRA)
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM
ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR
MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 12" A 24"
MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 24" A 30"
DEFENSA METALICA
SECCION FINAL DEFENSA METALICA
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO
RELLENOS PARA LA RECONFORMACION DE TALUDES
CONCRETO DE 21 MPA
CONCRETO DE 14 MPA
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA
MATERIAL GRANULAR DRENANTE
FILTRO EN GEODREN 4" DE H=1.00 MTS TUBULAR INCL. EXCAVACIONES Y RETIROS
REVEGETALIZACION DE TALUDES CON CESPED Y VETIER
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION KIT DE LUMINARIA SOLAR
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO HEXAGONAL DE 10mt DE ALTURA
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).
TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).

2.1 Informe de actividades realizadas en el mes

Suministro y acopio de materiales:





En el marco del contrato de obra pública No. 1387 del 28 de Marzo de 2025, se han ejecutado las siguientes actividades contractuales:

I. Preliminares y explanaciones.

Se realizan actividades de topografía, localización y replanteo del terreno.



II. Excavaciones, cargue y transporte.

Se realizan las excavaciones a máquina para la reposición de la tubería de alcantarillado y acueducto. De igual manera, excavaciones a mano para la reposición e instalación de las domiciliarias sanitarias y cajas de inspección. Con ello, se realizan las actividades de Cargue y Transporte de materiales provenientes de las excavaciones.



III. Instalación red pluvial, alcantarillado y acueducto

Se realiza a localización y replanteo de la red pluvial, así como la red principal de alcantarillado, para proceder a su la instalación y reposición de tubería con sus respectivas domiciliarias. De igual manera, se realiza la instalción de la red de acueducto.



IV. Cajeo e instalación de la estructura de pavimento

Se avanzó en el proceso de cajeo para la instalación de la estructura de pavimento, adecuando el terreno conforme a los niveles proyectados. Se instaló capa de mejoramiento para renivelación en afirmado para garantizar una estructura estable, seguido de la instalación de base granular de 20 cm de espesor. Finalmente, se ejecutó la instalación de concreto hidráulico MR-42 con un espesor de 15 cm, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos para asegurar la durabilidad y resistencia del pavimento.



2.1 Personal y equipos

En el presente período el contratista empleó el personal que se relaciona a continuación:

CONSORCIO TULUNI 2025							
No.	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	PROCEDENCIA
1	Jose Samuel Torres Gomez	6,009,657	Almacenista	Administrativo	3/06/2025		Ibagué
2	Oscar Orlando Perez Bustamante	14,297,633	Oficial de Obra	Administrativo	3/06/2025		Ibagué
3	Jose Yesid Mendez Guzman	3,004,896	Oficial de Obra	Administrativo	15/05/2025		Ibagué
4	Luis Alberto Lozano R	14.239.870	Oficial de Obra	Administrativo	1/07/2025	10/09/2025	Ibagué
5	Henry Rico Sanabria	93.375.223	Conductor Carrotanque	Administrativo	4/07/2025		Ibagué
6	Alexander Ortigoza Leal	93.402.894	Conductor Camioneta	Administrativo	4/06/2025		Ibagué
7	Juan Carlos Moreno	93.380.415	Mecánico	Administrativo	4/06/2025		Ibagué
8	Antonio Rocha Tovar	1,110,677,267	Fontanero	Operativos	4/06/2025		Chaparral
9	Dumar Castañeda Franco	65,828,249	Vigilante	Operativos	4/06/2025		Chaparral
10	Braulia Milena Verjan Rubio	93,450,498	Controladora Vial	Operativos	4/06/2025		Chaparral
11	Ximena Lizeth Mejia Hernandez	1,106,789,065	Controladora Vial	Operativos	10/06/2025		Chaparral
12	Yamile Clavijo Vargas	65,830,491	Controladora Vial	Operativos	4/06/2025		Chaparral
13	Andrea Guzman Culma	1.030.570.210	Controladora Vial	Operativos	14/07/2025		Chaparral
14	Felipe Loaiza	1,006,131,219	Ayudante de Obra	Operativos	4/06/2025		Chaparral
15	Fredy Ariel Moreno	14,011,560	Ayudante de Obra	Operativos	9/06/2025		Chaparral
16	Fredy Ramirez Verjan	93,451,309	Ayudante de Obra	Operativos	9/06/2025		Chaparral
17	German Palomino Perez	5,888,699	Ayudante de Obra	Operativos	10/06/2025		Chaparral
18	Jhon Faber Ramirez Veran	93,448,461	Ayudante de Obra	Operativos	10/06/2025		Chaparral
19	Johan Alberto Gutierrez Nieto	1,106,782,797	Ayudante de Obra	Operativos	10/06/2025		Chaparral
20	Jose Manuel Gaitan Serrate	1,007,287,510	Ayudante de Obra	Operativos	9/06/2025		Chaparral
21	Luis Vicente Oviedo Rincon	1,005,851,365	Ayudante de Obra	Operativos	9/06/2025		Chaparral
22	Erly Prieto Rojas	14,011,015	Ayudante de Obra	Operativos	17/06/2025		Chaparral
23	Luis Orlando Acosta Dubois	93,202,621	Ayudante de Obra	Operativos	17/06/2025		Chaparral
24	Fredy Humberto Bonilla H	14,011,130	Ayudante de Obra	Operativos	17/06/2025		Chaparral
25	Albeiro Buitrago	93.453.513	Ayudante de Obra	Operativos	2/07/2025		Chaparral
26	Yilber Tique Gutierrez	1.106.780.703	Ayudante de Obra	Operativos	25/08/2025		Chaparral
27	Jose Alexander Pava	93.449.623	Ayudante de Obra	Operativos	25/08/2025		Chaparral
28	Apner Arlet Coronado Lozano	1.005.854.071	Ayudante de obra	Operativos	22/09/2025		Chaparral
PAVETOL							
No.	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	CUADRILLA	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	PROCEDENCIA
29	Juan Carlos Sabogal	14.396.312	Oficial de Obra	Concretos	2/07/2025		Ibagué
30	Jordán Cárdenas	1.002.141.164	Oficial de Obra	Concretos	5/08/2025		Ibagué
31	Yoryis Jose Cardenas	1.127.955.792	Oficial de Obra	1/08/2025	1/09/2025		Ibagué
32	Ivan Andres Marin	1.110.573.896	Ayudante de Obra	Concretos	15/07/2025	15/09/2025	Ibagué
33	Jhon Alejandro Cespedes	1.005.851.794	Ayudante de Obra	CONCRETOS	1/08/2025		Chaparral
34	Miguel Ángel Ávila	1.104.705.630	Ayudante de Obra	Concretos	1/08/2025		Chaparral
35	Rafael González Tucuma	1.193.492.957	Ayudante de Obra	Concretos	1/08/2025		Chaparral
36	Juan Carlos Borbón	1.007.287.995	Ayudante de Obra	Concretos	1/08/2025		Chaparral
37	Aldemar Piñeros	1.106.713.290	Ayudante de Obra	1/08/2025	1/09/2025		Chaparral
38	Brayan Hernandez Serrato	1.111.042.594	Ayudante de Obra	17/09/2025	17/09/2025		Chaparral
39	Brayan Steven Zamudio Guzman	1.106.752.235	Ayudante de Obra	17/09/2025	17/09/2025		Chaparral

CARGO	NOMBRE	C.C.
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ	5824544
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	RICARDO JOSÉ ORTIGOZA	
INGENIERO ESP EN PAVIMENTOS	DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ	5824544
INGENIERO ESP EN HIDRAULICA	JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR	79893182
INGENIERO ESP EN GEOTECNIA	JUAN DANIEL MOYA ROBAYO	3192972
INGENIERO ESP EN ESTRUCTURAS	JUAN DAVID CABRERA CARDONA	1110514669
INGENIERO AMBIENTAL	JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR	79893182
TOPOGRAFO	OLIVERIO RIVAS RAYO	93412391

Nota: *el personal cuenta con toda la dotación y elementos de protección requeridos para el tipo de trabajo en el marco del objeto contractual. Lo anterior validado por la interventoría.*

Por otro lado, los equipos utilizados en desarrollo de las obras en este período fueron los siguientes:

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA / PLACA	OPERADOR	OBSERVACIÓN
Excavadora Sobre Oruga	Hyundai	150LC-95	Sixto Lamaza	
Excavadora Sobre Oruga	Hitachi	LC120	Juan Camilo Sánchez	
Retroexcabadora de Llantas	Catrepillar	416E	Juan Camilo Candia	
Vobrocompactador	Dynapac	CA250D	Harodl Yate	
Motoniveladora	Volvo	6930	Henry Marín	
Carrohormigonero	Dechi	L3500	Miguel Villalobos	
Volqueta Sencilla	Chevrolet Kodiak	TBL046	José Adán Rodríguez	Trasladado
Volqueta Dobletroque	Freinghtliner	SOP507	Daniel Suarez	Retiro Conductor
Volqueta Dobletroque	Freinghtliner	SOP507	Gustavo Capera	
Conductor Carrotanque Agua	International	WFV172	Henry Rico	
Camioneta de Estacas (Combustible)	Chevrolet Dimax	ICL610	Alexander Ortigoza	
Camioneta de Estacas	Chevrolet Luv	NSI396	Jairo Salabarrieta	

Nota: *Toda la maquinaria y equipos utilizados cuentan con su respectivo manual de operación, hoja de vida y formato de mantenimiento correctivo y preventivo y preoperacional semanal. Así como cada operario de este, presenta su certificación o convalidación de aptitud del cargo.*

2.2 Tabla de programación

TABLA DE PROGRAMACIÓN CONTRATO No. 1387	
FECHA DE INICIO	**01/06/2025**
FECHA DE CORTE SEGÚN PRESENTE INFORME	**30/09/2025**
% AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**30.64%**
% AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**71.00%**
% DIFERENCIA (+) (-)	**+ 40.36% (Adelanto)**
% AVANCE DE OBRA DURANTE EL PERIODO	**24.00%**

2.3 Dificultades presentadas

En el presente periodo no se presentaron dificultades durante la ejecución del proyecto.

2.4 Correspondencia

A continuación, se presenta la correspondencia remitida por el Consorcio Tuluni 2025 durante el presente periodo y se relacionan como anexo a este informe.

Consecutivo	Fecha	Asunto	Remitente	Destinatario
CT2025 - 016	5/09/2025	Respuesta Oficio CV04-25-Ofi-013	Consorcio Tuluni 2025	CONSORCIO VÍAS 04 (Interventoría), Gobernación
CT2025 - 017	23/09/2025	Afectación a la señalización	Consorcio Tuluni 2026	CONSORCIO VÍAS 04 (Interventoría), Gobernación y Sec. Infraestructura Chaparral

3. Estado financiero del contrato

BALANCE DEL CONTRATO				
VALOR CONTRATO	$	8,796,457,494.01	$	8,796,457,494.01
VALOR ADICIÓN				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	8,796,457,494.01		
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$	2,760,329,873.73		
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$	3,038,983,316.05		
VALOR ACUMULADO EN ACTAS	$	5,799,313,189.78		
SALDO POR COBRAR	**$**	**2,997,144,304.23**		
SUMAS IGUALES	**$**	**8,796,457,494.01**	**$**	**8,796,457,494.01**
VALOR A CANCELAR			**PORCENTAJE A COBRAR**	
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$	3,038,983,316.05	**34.55%**	
TOTAL VALOR A CANCELAR PRESENTE	**$**	**3,038,983,316.05**		

4. Registro fotográfico

- **Excavaciones e instalación de la red pluvial, sanitaria y de acueducto**









- **Cajeo y mejoramiento en afirmado:**







- **Suministro e instalación de geotextil y base granular:**




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA - Pavimentación de vías urbanas
en el municipio de Chaparral
$9.612 millones
vías para Chaparral
INICIO DE OBRA














- **Instalación de filtro**





- **Instalación de pavimento en concreto MR-40:**



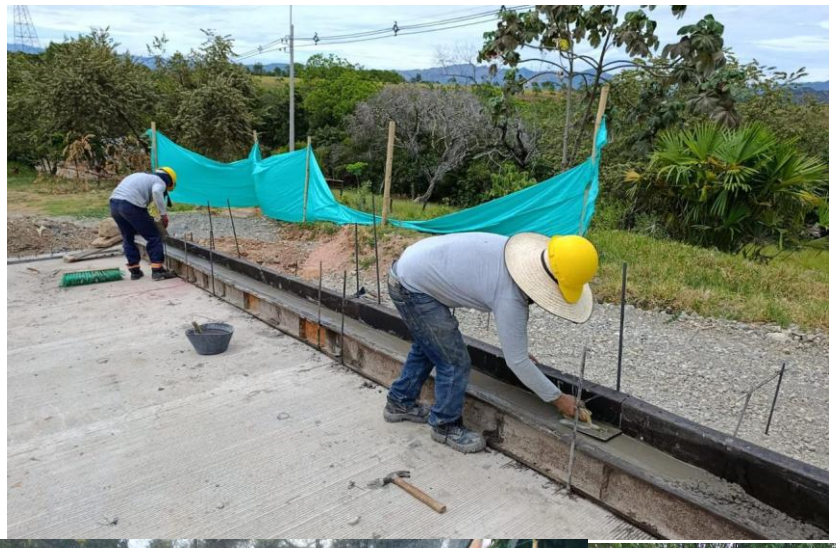


















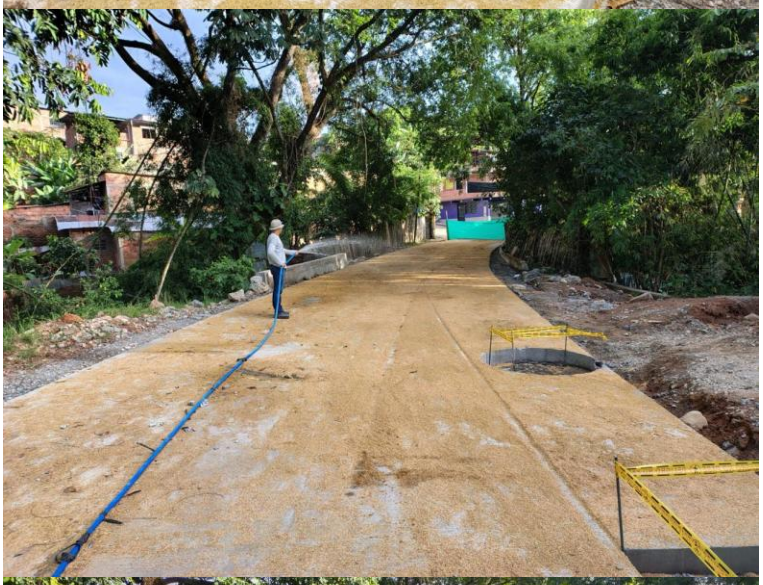








MAQUINARIA
EN LA
VIA

5. Conclusiones y recomendaciones

Las actividades del contrato se han desarrollado dentro del plazo establecido en el mismo, durante el periodo del presente informe, se ejecutaron las actividades planificadas, con un adelanto conforme al cronograma establecido, cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas y acogiéndonos estrictamente a los diseños entregados por la Gobernación del Tolima.

Se ha cumplido con la afiliación del personal contratado al sistema de seguridad social, cumpliendo todo lo relacionado a seguridad industrial y todos los requerimientos de ley.

Las actividades realizadas, como localización y replanteo, excavaciones, instalación de redes de alcantarillado y acueducto, cajeo, instalación de geotextil, base granular, concreto hidráulico, así como la ejecución del muro de contención, etc. Fueron llevadas a cabo bajo los estándares técnicos exigidos, garantizando la calidad y durabilidad de la obra.

La utilización de materiales certificados y mano de obra calificada permitió asegurar el cumplimiento de las especificaciones contractuales y técnicas, reduciendo riesgos en el desarrollo del proyecto.

Se alcanzaron los objetivos previstos para este periodo, lo que demuestra una eficiente gestión técnica, administrativa y operativa del proyecto.

Con los avances obtenidos, el proyecto se encuentra en línea con el cronograma general, garantizando que las metas finales sean alcanzadas dentro de los tiempos establecidos y en beneficio de la comunidad rural del municipio de Chaparral.

Atentamente,

Ing. RICARDO ORTIGOZA GONZÁLEZ
Rep. Legal Consorcio Tuluni 2025.

6. ANEXOS

6.1 Cronograma de actividades
6.2 Correspondencia
6.3 Laboratorios

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: CONSORCIO TULUNI 2025

FECHA DE INICIO: 3 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DE 2026

OBJETO: CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																			
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO		$ 78.586.318,20	$ 78.586.318,20 0,89%																
EXPLANACION Y CAJEO		$ 90.183.142,40	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%	$ 7.515.261,87 0,09%					
CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)		$ 121.208.490,00	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%	$ 10.100.707,50 0,11%					
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)		$ 330.020.534,00	$ 30.001.866,73 0,34%	$ 30.001.866,73 0,34%	$ 30.001.866,73 0,34%	$ 30.001.866,73 0,34%	$ 30.001.866,73 0,34%	$ 30.001.866,73 0,34%	$ 30.001.866,73 0,34%	$ 30.001.866,73 0,34%	$ 30.001.866,73 0,34%	$ 30.001.866,73 0,34%	$ 30.001.866,73 0,34%						
ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M		$ 14.937.731,20	$ 1.357.975,56 0,02%	$ 1.357.975,56 0,02%	$ 1.357.975,56 0,02%	$ 1.357.975,56 0,02%	$ 1.357.975,56 0,02%	$ 1.357.975,56 0,02%	$ 1.357.975,56 0,02%	$ 1.357.975,56 0,02%	$ 1.357.975,56 0,02%	$ 1.357.975,56 0,02%	$ 1.357.975,56 0,02%						
EXCAVACIONES																			
EXCAVACIONES		$ 305.513.335,30	$ 27.773.939,57 0,32%	$ 27.773.939,57 0,32%	$ 27.773.939,57 0,32%	$ 27.773.939,57 0,32%	$ 27.773.939,57 0,32%	$ 27.773.939,57 0,32%	$ 27.773.939,57 0,32%	$ 27.773.939,57 0,32%	$ 27.773.939,57 0,32%	$ 27.773.939,57 0,32%	$ 27.773.939,57 0,32%						
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		$ 444.455.502,50	$ 40.405.045,68 0,46%	$ 40.405.045,68 0,46%	$ 40.405.045,68 0,46%	$ 40.405.045,68 0,46%	$ 40.405.045,68 0,46%	$ 40.405.045,68 0,46%	$ 40.405.045,68 0,46%	$ 40.405.045,68 0,46%	$ 40.405.045,68 0,46%	$ 40.405.045,68 0,46%	$ 40.405.045,68 0,46%						
PAVIMENTOS HIDRAULICOS																			
PAVIMENTOS HIDRAULICOS		$ 1.514.304.307,20		$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%	$ 126.192.025,60 1,43%				
CONCRETOS																			
ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION		$ 218.319.465,00														$ 109.159.732,50 1,24%	$ 109.159.732,50 1,24%		
VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO		$ 3.896.340,00		$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%	$ 324.695,00 0,004%				
ACERO																			
ACERO		$ 371.264.605,50		$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%	$ 30.938.717,13 0,35%				
FILTROS Y DRENAJES																			
GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO		$ 123.733.575,00	$ 11.248.506,82 0,13%	$ 11.248.506,82 0,13%	$ 11.248.506,82 0,13%	$ 11.248.506,82 0,13%	$ 11.248.506,82 0,13%	$ 11.248.506,82 0,13%	$ 11.248.506,82 0,13%	$ 11.248.506,82 0,13%	$ 11.248.506,82 0,13%	$ 11.248.506,82 0,13%	$ 11.248.506,82 0,13%						
ALCANTARILLADO																			
ALCANTARILLADO		$ 954.291.745,80	$ 86.753.795,07 0,99%	$ 86.753.795,07 0,99%	$ 86.753.795,07 0,99%	$ 86.753.795,07 0,99%	$ 86.753.795,07 0,99%	$ 86.753.795,07 0,99%	$ 86.753.795,07 0,99%	$ 86.753.795,07 0,99%	$ 86.753.795,07 0,99%	$ 86.753.795,07 0,99%	$ 86.753.795,07 0,99%						
ACUEDUCTO																			
ACUEDUCTO		$ 251.712.749,41	$ 22.882.977,22 0,26%	$ 22.882.977,22 0,26%	$ 22.882.977,22 0,26%	$ 22.882.977,22 0,26%	$ 22.882.977,22 0,26%	$ 22.882.977,22 0,26%	$ 22.882.977,22 0,26%	$ 22.882.977,22 0,26%	$ 22.882.977,22 0,26%	$ 22.882.977,22 0,26%	$ 22.882.977,22 0,26%						
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO																			
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO		$ 462.224.310,00	$ 42.020.391,82 0,48%	$ 42.020.391,82 0,48%	$ 42.020.391,82 0,48%	$ 42.020.391,82 0,48%	$ 42.020.391,82 0,48%	$ 42.020.391,82 0,48%	$ 42.020.391,82 0,48%	$ 42.020.391,82 0,48%	$ 42.020.391,82 0,48%	$ 42.020.391,82 0,48%	$ 42.020.391,82 0,48%						
OBRAS ADICIONALES A LA VIA																			
SEÑALIZACIÓN		$ 158.383.170,00															$ 79.191.585,00 0,90%	$ 79.191.585,00 0,90%	
ENTIBADOS Y MANEJO DE AGUAS		$ 408.177.733,20	$ 37.107.066,65 0,42%	$ 37.107.066,65 0,42%	$ 37.107.066,65 0,42%	$ 37.107.066,65 0,42%	$ 37.107.066,65 0,42%	$ 37.107.066,65 0,42%	$ 37.107.066,65 0,42%	$ 37.107.066,65 0,42%	$ 37.107.066,65 0,42%	$ 37.107.066,65 0,42%	$ 37.107.066,65 0,42%						
ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA																			
ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA		$ 288.657.453,50		$ 72.164.363,38 0,82%	$ 72.164.363,38 0,82%	$ 72.164.363,38 0,82%	$ 72.164.363,38 0,82%												
ALUMBRADO PÚBLICO																			
ALUMBRADO PÚBLICO		$ 458.651.830,00														$ 114.662.957,50 1,30%	$ 114.662.957,50 1,30%	$ 114.662.957,50 1,30%	$ 114.662.957,50 1,30%
TRANSPORTE																			
TRANSPORTE		$ 1.960.312.746,80	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%	$ 150.793.288,22 1,71%				
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 8.558.835.085,01**	**$ 546.547.140,97**	**$ 697.580.623,89**	**$ 697.580.623,89**	**$ 697.580.623,89**	**$ 697.580.623,89**	**$ 625.416.260,51**	**$ 625.416.260,51**	**$ 625.416.260,51**	**$ 625.416.260,51**	**$ 625.416.260,51**	**$ 625.416.260,51**	**$ 325.864.695,34**	**$ 308.248.725,98**	**$ 223.822.690,03**	**$ 303.014.275,03**	**$ 193.854.542,52**	**$ 114.662.957,51**
SUBTOTAL OBRAS (NCLUYE IVA)		**$ 8.558.835.085,01**																	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$ 111.587.000,00	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%	$ 6.563.941,18 0,07%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		$ 126.035.409,00	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%	$ 7.413.847,59 0,08%
VALOR TOTAL INVERSIÓN VIA		**$ 8.796.457.494,01**																	
VALOR TOTAL		**$ 8.796.457.494,01**	**$ 560.524.929,74**	**$ 711.558.412,65**	**$ 711.558.412,65**	**$ 711.558.412,65**	**$ 711.558.412,65**	**$ 639.394.049,27**	**$ 639.394.049,27**	**$ 639.394.049,27**	**$ 639.394.049,27**	**$ 639.394.049,27**	**$ 639.394.049,27**	**$ 339.842.484,11**	**$ 322.226.514,74**	**$ 237.800.478,79**	**$ 316.992.063,80**	**$ 207.832.331,29**	**$ 128.640.746,28**
		PORCENTAJE MENSUAL	**6,37%**	**8,09%**	**8,09%**	**8,09%**	**8,09%**	**7,27%**	**7,27%**	**7,27%**	**7,27%**	**7,27%**	**7,27%**	**3,86%**	**3,66%**	**2,70%**	**3,60%**	**2,36%**	**1,46%**
		PORCENTAJE ACUMULADO	**6,37%**	**14,46%**	**22,55%**	**30,64%**	**38,73%**	**46,00%**	**53,27%**	**60,54%**	**67,80%**	**75,07%**	**82,34%**	**86,20%**	**89,87%**	**92,57%**	**96,17%**	**98,54%**	**100,00%**

INGEOCONSULTORES SAS. INGENIERIA, GEOTECNIA Y CONSULTORIA	**RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN INV. E - 414**	Código: LA-FOR-083
		Versión: 003
		Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	PAVIMENTACIÓN VIA LOCALIZADA EN LA AVENIDA TULUNÍ ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 ESTE, BARRIO TULUNÍ, MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
Dirigido a:	CONSORCIO TULUNI 2025	**Atención:**	ING. LUIS RICARDO ORTIGOZA		
Teléfonos:	3015903182-6082639103	**Dirección:**	CL 12 2 70 OF 405 ED EL MOLINO(IBAGUÉ TOLIMA)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	7 - 2025
Fecha Informe:	Ibagué, 25 de septiembre de 2025	**Informe N°**	19	**Código Obra:**	CO-3307

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

-Ref:	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo:	Requiere Intervención	Defecto del Especimen
1 - 1	29376	Carril derecho	05-08-25	12-08-25	24,1	45,0	52,4	15,2	15,2	7	31,5	75,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
1 - 2	29376	Carril derecho	05-08-25	12-08-25	24,3	45,0	53,4	15,2	15,4	7	31,3	74,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
1 - 3	29376	Carril derecho	05-08-25	02-09-25	35,8	45,0	52,0	15,1	15,3	28	47,1	112,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
1 - 4	29376	Carril derecho	05-08-25	02-09-25	34,7	45,0	52,4	15,3	15,0	28	45,4	108,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
2 - 1	29376	Carril derecho	06-08-25	13-08-25	26,3	45,0	52,0	15,2	15,1	7	34,6	82,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
2 - 2	29376	Carril derecho	06-08-25	13-08-25	25,4	45,0	52,4	15,1	15,2	7	33,6	80,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
2 - 3	29376	Carril derecho	06-08-25	03-09-25	32,8	45,0	53,2	15,2	15,2	28	42,9	102,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
2 - 4	29376	Carril derecho	06-08-25	03-09-25	33,6	45,0	52,3	15,2	15,4	28	43,4	103,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
3 - 1	29427	Placa MR 42	08-08-25	15-08-25	27,2	45,0	52,0	15,2	15,2	7	35,6	84,8%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
3 - 2	29427	Placa MR 42	08-08-25	15-08-25	27,4	45,0	52,2	15,4	15,3	7	34,7	82,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
3 - 3	29427	Placa MR 42	08-08-25	05-09-25	33,2	45,0	52,4	15,1	15,2	28	43,9	104,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
3 - 4	29427	Placa MR 42	08-08-25	05-09-25	34,4	45,0	53,3	15,4	15,2	28	43,8	104,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
4 - 1	29427	Placa MR 42	11-08-25	18-08-25	22,8	45,0	53,1	15,5	15,2	7	28,6	68,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
4 - 2	29427	Placa MR 42	11-08-25	18-08-25	23,5	45,0	53,2	15,4	15,3	7	29,7	70,7%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
4 - 3	29427	Placa MR 42	11-08-25	08-09-25	33,3	45,0	52,0	15,2	15,3	28	43,2	102,9%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
4 - 4	29427	Placa MR 42	11-08-25	08-09-25	32,5	45,0	52,0	15,2	15,3	28	42,1	100,2%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
5 - 1	29431	Placa MR 42	19-08-25	26-08-25	26,4	45,0	52,2	15,2	15,0	7	35,0	83,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
5 - 2	29431	Placa MR 42	19-08-25	26-08-25	28,4	45,0	53,2	15,4	15,2	7	36,1	86,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
5 - 3	29431	Placa MR 42	19-08-25	16-09-25	33,9	45,0	52,5	15,2	15,2	28	44,2	105,2%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
5 - 4	29431	Placa MR 42	19-08-25	16-09-25	34,2	45,0	52,0	15,3	15,4	28	43,5	103,6%	42	Imersión	Seco	E024	---	---

INGEOCONSULTORES SAS. INGENIERIA, GEOTECNIA Y CONSULTORIA	**RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN INV. E - 414**	Código: LA-FOR-083
		Versión: 003
		Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	PAVIMENTACIÓN VIA LOCALIZADA EN LA AVENIDA TULUNÍ ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 ESTE, BARRIO TULUNÍ, MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
Dirigido a:	CONSORCIO TULUNI 2025	**Atención:**	ING. LUIS RICARDO ORTIGOZA		
Teléfonos:	3015903182-6082639103	**Dirección:**	CL 12 2 70 OF 405 ED EL MOLINO(IBAGUÉ TOLIMA)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	7 - 2025
Fecha Informe:	Ibagué, 25 de septiembre de 2025	**Informe N°**	19	**Código Obra:**	CO-3307

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

-Ref:	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo:	Requiere Intervención	Defecto del Especimen
6 - 1	29484	MR 42	20-08-25	30-08-25	28,1	45,0	52,0	15,0	15,3	10	37,4	89,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
6 - 2	29484	MR 42	20-08-25	30-08-25	26,3	45,0	52,3	15,2	15,3	10	34,2	81,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
6 - 3	29484	MR 42	20-08-25	17-09-25	38,3	45,0	52,5	15,0	15,0	28	52,1	124,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
6 - 4	29484	MR 42	20-08-25	17-09-25	40,7	45,0	52,5	15,4	15,2	28	51,8	123,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
7 - 1	29484	MR 42	21-08-25	30-08-25	27,9	45,0	52,0	15,0	15,2	9	37,4	89,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
7 - 2	29484	MR 42	21-08-25	30-08-25	30,0	45,0	52,2	15,3	15,0	9	39,2	93,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
7 - 3	29484	MR 42	21-08-25	18-09-25	39,3	45,0	53,2	15,4	15,2	28	50,1	119,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
7 - 4	29484	MR 42	21-08-25	18-09-25	38,7	45,0	52,3	15,2	15,5	28	49,6	118,1%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
8 - 1	29484	MR 42	22-08-25	30-08-25	29,7	45,0	53,0	15,4	15,2	8	37,8	90,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
8 - 2	29484	MR 42	22-08-25	30-08-25	28,4	45,0	52,4	15,2	15,2	8	37,1	88,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
8 - 3	29484	MR 42	22-08-25	19-09-25	37,7	45,0	52,2	15,2	15,4	28	48,6	115,7%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
8 - 4	29484	MR 42	22-08-25	19-09-25	38,1	45,0	52,0	15,2	15,4	28	49,1	116,9%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
9 - 1	29484	MR 42	25-08-25	01-09-25	26,5	45,0	52,0	15,0	15,3	7	35,3	84,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
9 - 2	29484	MR 42	25-08-25	01-09-25	27,4	45,0	52,2	15,2	15,0	7	36,3	86,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
9 - 3	29484	MR 42	25-08-25	22-09-25	36,7	45,0	54,0	15,4	15,2	28	46,7	111,2%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
9 - 4	29484	MR 42	25-08-25	22-09-25	37,3	45,0	52,2	15,3	15,2	28	48,1	114,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
10 - 1	29484	MR 42	26-08-25	02-09-25	27,5	45,0	52,0	15,2	15,0	7	36,3	86,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
10 - 2	29484	MR 42	26-08-25	02-09-25	27,9	45,0	52,0	15,2	15,2	7	36,5	86,9%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
10 - 3	29484	MR 42	26-08-25	23-09-25	33,4	45,0	52,3	15,2	15,3	28	43,4	103,3%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
10 - 4	29484	MR 42	26-08-25	23-09-25	32,6	45,0	52,2	15,3	15,0	28	42,6	101,4%	42	Imersión	Seco	E024	---	---

INGEOCONSULTORES SAS. INGENIERIA, GEOTECNIA Y CONSULTORIA	**RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO A LA FLEXIÓN INV. E - 414**	Código: LA-FOR-083
		Versión: 003
		Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	PAVIMENTACIÓN VIA LOCALIZADA EN LA AVENIDA TULUNÍ ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 ESTE, BARRIO TULUNÍ, MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
Dirigido a:	CONSORCIO TULUNI 2025	**Atención:**	ING. LUIS RICARDO ORTIGOZA		
Teléfonos:	3015903182-6082639103	**Dirección:**	CL 12 2 70 OF 405 ED EL MOLINO(IBAGUÉ TOLIMA)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO			**Periodo Informe:**	7 - 2025
Fecha Informe:	Ibagué, 25 de septiembre de 2025	**Informe N°**	19	**Código Obra:**	CO-3307

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma y sello del Director de Laboratorio.

Muestras tomadas, referenciadas y enviadas al Laboratorio por el Contratista.

Las muestras de muestras concreto fueron falladas a edades referenciadas en el informe

-Ref:	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Vaciado	Fecha de Rotura	Lectura Prensa Kn	Luz entre Apoyos (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Edad en días	Módulo de Rotura	(%)	MR esperado a los 28 días	Curado:	Condición de humedad de ensayo	Prensa ensayo:	Requiere Intervención	Defecto del Especimen
11 - 1	29484	MR 42	27-08-25	03-09-25	28,1	45,0	52,3	15,5	15,1	7	35,6	84,8%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
11 - 2	29484	MR 42	27-08-25	03-09-25	30,2	45,0	52,2	15,3	15,4	7	38,5	91,7%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
11 - 3	29484	MR 42	27-08-25	24-09-25	36,6	45,0	52,3	15,4	15,3	28	46,3	110,2%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
11 - 4	29484	MR 42	27-08-25	24-09-25	37,1	45,0	52,0	15,3	15,2	28	47,9	114,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
12 - 1	29484	MR 42	28-08-25	04-09-25	28,9	45,0	52,4	15,2	15,2	7	37,8	90,0%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
12 - 2	29484	MR 42	28-08-25	04-09-25	29,5	45,0	53,0	15,2	15,3	7	38,3	91,2%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
12 - 3	29484	MR 42	28-08-25	25-09-25	34,7	45,0	52,3	15,4	15,3	28	43,9	104,5%	42	Imersión	Seco	E024	---	---
12 - 4	29484	MR 42	28-08-25	25-09-25	35,8	45,0	52,0	15,3	15,2	28	46,1	109,8%	42	Imersión	Seco	E024	---	---

- Fin de informe -

Revisó:	**Observaciones**	.

Ibagué, 5 de Septiembre de 2025

CT2025 -016

Señores
CONSORCIO VIAS 04
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1508 DEL 31 DE MARZO 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
Atn.: DIANA PAOLA SANTANA PARRA
Profesional SST
Ciudad: Ibagué – Tolima

REFERENCIA: **CTO 1387 DE 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**

Asunto: Respuesta Oficio CV04-25-Ofi-013 - Requerimientos y observaciones en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), para el corte N°2- (Del 01 al 31 de julio 2025).

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito dar aclaración y respuesta a la solicitud de Interventoría, de sus requerimientos, con el fin de agilizar su respuesta o subsanación de estas en el tiempo mínimo correspondiente y solicitado por ustedes de la manera más rápida y atenta.

Sin otro particular y respondiendo a su requerimiento adjuntamos para dar subsanación:

CV04-25-Ofi-013

Componente SST

DOCUMENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

- Para dar subsanación a su requerimiento del oficio en mención adjuntamos los documentos de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**.** En los Numerales A-Z y AA., haciendo claridad que el aportante del Sistema es el Ing. Ricardo Ortigoza González que a su vez es el Representante Legal del Consorcio., él lo aporta por que por ser un consorcio y no cumplir con los estándares o tiempo establecido por el ministerio de trabajo no posee el sistema.

CERTIFICACIONES (EPS, ARL, AFP, CCF) EXAMEN OCUPACIONAL DE INGRESO, INDUCCION, DOCUMENTOS HOJA DE VIDA ANTECEDENTES.

- Para dar subsanación a su requerimiento del oficio en mención adjuntamos las certificaciones y exámenes de ingreso del Personal de obra del Contratista y Subcontratistas con el fin de solucionar y empalmar las discrepancias en cuanto los datos que ustedes tienen a fin de queda acordes con todo.

- **Exámenes de ingreso:** **Germán Reyes**
  Juan Carlos Cárdenas
- **Certificación Afiliación EPS:** **Juan Carlos Sabogal**
- **Certificación Afiliación AFP:** **Juan Carlos Cárdenas**
- **Inducciones de Ingreso:** **Germán Reyes**
  Juan Carlos Cárdenas
  Henry Otoniel Marín Jaramillo
  Jhon Jairo Castañeda
  Miguel Antonio Villalobos

EXÁMENES OCUPACIONALES DE EGRESO - DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DESVINCULADO

- Para dar subsanación a su requerimiento del oficio en mención adjuntamos las certificaciones y exámenes de egreso del Personal de obra del Contratista y Subcontratistas desvinculado a este con el fin de solucionar y empalmar las discrepancias en cuanto los datos que ustedes tienen a fin de queda acordes con todo.

RELACIÓN COMPLETA DEL PERSONAL VINCULADO DE MANERA DIRECTA E INDIRECTA

- Para dar subsanación a su requerimiento del oficio en mención, en este punto damos por evidenciado que hace referencia al **COMPONENTE SOCIAL**, ya que este nombra si es de obra calificada o no, tanto del personal directo que sería el contratista (Consorcio Tulini 2025), y el indirecto que sería el subcontratista (Pavetol SAS), por lo tanto nuevamente adjunto el cuadro de relación del personal para que sea comparado con el del **COMPONENTE SOCIAL,** con el fin de solucionar y empalmar las discrepancias en cuanto los datos que ustedes tienen a fin de quedar acordes con todo.

SOPORTE DE AFILIACIÓN Y/O APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

- Para dar subsanación a su requerimiento del oficio en mención adjuntamos los soportes, certificaciones del Personal de obra faltante:

- Angela Johana Vanegas
- Juan Camilo Candia Walteros.
- Cesar Bocanegra Rodríguez

con el fin de solucionar y empalmar las discrepancias en cuanto los datos que ustedes tienen a fin de queda acordes con todo.

CAPACITACIONES INFORMES

- Para dar subsanación a su requerimiento del oficio en mención adjuntamos las capacitaciones de los informes del Personal de obra del Contratista y Subcontratistas con su respectiva corrección con el fin de solucionar y empalmar las discrepancias en cuanto los datos que ustedes tienen a fin de queda acordes con todo.

FORTALECIMIENTO PRACTICAS PAUSAS ACTIVAS

- Para dar subsanación a su requerimiento del oficio en mención adjuntamos las un plan de implementación acorde para fortalecer las prácticas de las pausas activas del Personal de obra del Contratista y Subcontratistas

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Gloria Astrid Lopez S

GLORIA ASTRID LOPEZ SANCHEZ
Profesional SST.
CONSORCIO TULUNI 2025.

Ibagué, 23 de Septiembre de 2025

CT2025 -017

Señores
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Supervisión – Neil Harold Leal Pava
Apoyo a la supervisión – Edwin Vega Montiel

Chaparral, Tolima

REFERENCIA: CONTRATO No. 1387 del 28 de Marzo de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Asunto: Afectación a la señalización.

Respetados señores,

Por medio del presente, nos permitimos informar con preocupación la afectación a la señalización oficial de la obra del contrato en referencia en el municipio de Chaparral, Tolima, contratada por la Gobernación del Tolima.

Informamos que el personal de obra evidenció que la valla informativa instalada en el municipio de Chaparral fue objeto de vandalismo mediante grafiti con mensajes alusivos a grupos armados ilegales (ver imagen adjunta). Esta alteración no solo afecta la presentación del proyecto y el buen nombre de la entidad, sino que podría generar inquietud entre la comunidad y los actores involucrados en la ejecución.

Informamos esta situación con el fin de que esa entidad esté al tanto de lo ocurrido y, si lo considera pertinente, se tomen las medidas correspondientes en el marco de sus competencias de supervisión y control.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier orientación adicional que se requiera.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cordialmente,

Ing. RICARDO ORTIGOZA GONZÁLEZ
Rep. Legal Consorcio Tuluni 2025.

C.C. CONSORCIO VÍAS 04
Interventoría
Atn: Ing. LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

C.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
ALCALDÍA DE CHAPARRAL
ALVARO FERNANDO MELENDRO MENESES – SECRETARIO DE DESPACHO

C.C. DRA. ADRIANA MAGALI MATIZ
GOBERNADORA DEL TOLIMA
