	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 N.I.T. 901.915.452-1	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**FECHA**	lunes, 26 de enero de 2026	**SEMANA No.**	**43**	DEL	**19-ene-26**	AL	**25-ene-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-220 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-139 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO YVY
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**		***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	
***FECHA DE REINICIACIÓN:**		***FECHA DE REINICIACIÓN:**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de mayo de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de mayo de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	14 meses	**PLAZO ACTUALIZADO:**	14 meses
PLAZO TRANSCURRIDO:	299 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	299 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.025	**VALOR INICIAL :**	$ 34.436.321.680
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.025	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 34.436.321.680
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ 665.708.610
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.025	**VALOR POR PAGAR:**	$ 33.770.613.070
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.805	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.330.896.504
SUPERVISOR:	Wilson Santander	**SUPERVISOR:**	Wilson Santander

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES DE ETAPA DE EJECUCIÓN AVANCE DEL 6.72%

• Alcantarillas, rocería y Mantenimiento de la rasante:

En el periodo no se registraron actividades en campo por parte del contratista. Ante esta situación se han remitido desde el periodo anterior por parte de Interventoría el comunicado ICCU-S-014-2026 Incumplimiento en el reinicio de actividades en obra y entrega de Cronograma detallado por municipio y el comunicado ICCU-S-026-2026 Respuesta al Oficio YVY-005-2026 – Aclaración sobre actividades en la Provincia de Ubaté, solicitud de programación de actividades y entrega de Cronograma detallado por municipio. En el periodo se reiteró la solicitud de inicio y presentación de cronograma al contratista con el comunicado ICCU-S-030-2026.

Por parte de Interventoría se realizaron recorridos para verificación del estado de señalización y estado de las vías en los sectores donde se venía registrando actividad por parte del contratista, se identificó lo siguiente:

UBATE: Durante la inspección realizada por la Interventoría, se identificó que en la alcantarilla No. 1 la señalización vial instalada requiere mejoras, con el fin de garantizar una adecuada advertencia a los usuarios de la vía y condiciones mínimas de seguridad vial en el sector intervenido.

SUSA: En los recorridos realizados por la Interventoría, se evidenció que en varias alcantarillas de este tramo la señalización vial instalada se encuentra caída o en condiciones inadecuadas, lo cual representa un riesgo para la seguridad vial. Así mismo, en algunas de las alcantarillas recientemente intervenidas, donde se realizó la instalación de tubería, se evidencia una pérdida parcial de la banca, situación que puede generar afectaciones a la estabilidad de la vía y riesgos para los usuarios, por lo que se requiere el reinicio oportuno de las actividades constructivas para la corrección de estas condiciones.

SIMIJACA: Se identifica en el sector donde se realizó el tramo piloto desprendimientos, los cual requiere atención inmediata para que no se continue deteriorando dicho tramo**.**

MANTA: Se identificó que en las cuatro (4) alcantarillas existentes en el tramo la señalización vial es insuficiente o inexistente, presentándose únicamente algunos elementos aislados. Así mismo, se evidenció que en algunas de las alcantarillas se realizó relleno únicamente en la parte frontal de los cabezotes, sin completar el relleno lateral entre el terreno natural y las estructuras de encoles y descoles, situación que puede impedir el adecuado funcionamiento hidráulico de las mismas, por lo que se requiere verificación por parte del contratista y el ajuste para el adecuado funcionamiento.

CHOCONTA: Se hace necesario la reanudación de las actividades de alcantarillas ya que estas se encuentran construidas de forma parcial sin ejecución de las estructuras de encoles y descoles.

En el presente periodo, en cumplimiento con lo acordado en la reunión del pasado 21 de enero de 2025, sostenida entre ICCU, Contratista e Interventoría, se remitió al contratista información referente a especificaciones, análisis técnicos y procedimientos constructivos con relación a la Imprimación reforzada y estabilización con cemento mediante comunicación ICCU-S-033-2026. Así mismo se solicitó ante el ICCU la documentación relacionada con los estabilizantes utilizados por otros contratistas para el análisis de esta información ICCU-S-031-2026.

Provincia	Mejoramiento vial	Mantenimiento alcantarillas
RIO NEGRO	Topaipí	
	Villagómez	7
	La Palma	16
	Yacopí	
ALMEIDAS	Chocontá	19
	Sesquilé	32
	Manta	43
UBATE	Ubaté	10
	Simijaca	
	Susa	31.5
	Tausa	4
		162.5

*Fuente: Interventoría

PROGRAMACION	LIMPIEZA ALCANTARILLAS	ESTADO ACTUAL
UBATÉ	15-jul-25	Iniciado
SUSA	15-jul-25	Inició 16 jul 2025 - no se ha registrado actividad desde 1 ago 2025.
TAUSA	17-sep-25	Por iniciar
SIMIJACA	29-oct-25	Se informó por el Contratista que con base al recorrido de identificación solo se encontraron dos compuertas.
CHOCONTA	30-jul-25	iniciado
SESQUILE	30-sep-25	iniciado
MANTA	15-jul-25	Inició 22 jul 2025 - En ejecución-
VILLAGOMEZ	14-ago-25	Se inició
LA PALMA	5-ago-25	Iniciado
TOPAIPI	4-ago-25	No ha iniciado
YACOPI	27-ago-25	No ha iniciado

Provincia	Municipio	Longitud ejecutada (m)
UBATÉ	Ubaté	
	Simijaca	345 m
	Susa	
	Tausa	0
	Total	345m

*Fuente: Interventoría

Provincia	Municipio	Ejecución de alcantarillas - Tubos	Notas - Estado
RIO NEGRO	Topaipí		
	Villagómez		
	La Palma	11	A la fecha se ha ejecutado la fundida (encole-descole) de la alcantarilla 11, la alcantarilla 54A y 54B.
	Yacopí		
UBATE	Ubaté	1	A la fecha se encuentra fundido en concreto el atraque y solado de la alcantarilla N° 1.
	Simijaca		
	Susa	7	A la fecha se encuentra fundido en concreto el descole y encole en la alcantarilla N° 4.
	Tausa		
ALMEIDAS	Manta	4	Se reporta que ya se completó la fundida de encoles y descoles de las alcantarillas.
	Chocontá	5	A la fecha los decoles y los encoles están conformados en tierra.
		28	

*Fuente: Interventoría

ACTIVIDADES DE ETAPA DE CARACTERIZACÍÓN

Diseños - Informe fase 2: En el periodo se emitió respuesta al último informe de diseños fase 2, presentado por el contratista mediante comunicado YVY-432-25 respondido con el ICCU-S-017-2025, en el cual persisten observaciones en cuanto a la definición de espesores y zonificación entre otras. Por lo anterior se citó por el ICCU a mesa de trabajo conjunta (contratista e Interventoría) el día 21 de enero, en la cual se tocaron temas tecnicos relacionados con las observaciones hechas por parte de la Interventoría al diseño fase II entregado por el contratista.

Igualmente, en el periodo anterior se remitió al contratista reiteración de observaciones del área de Geotécnica con el ICCU-S-006-2026 y reiteración de observaciones al tramo piloto de Simijaca con el ICCU-S-008-2026 en el periodo no se recibió respuesta por parte del contratista a estos temas.

En cuanto a laboratorios: En este periodo no se recibieron resultados respecto a los ensayos realizados con los nuevos planteamientos de fórmulas. de trabajo para los aditivos. Se informó por parte del contratista en la reunión de seguimiento semanal (acta 69) que se estaría remitiendo resultados de laboratorio con los nuevos aditivos en la semana del 19 al 23 de enero sin embargo se consultó si los resultados habían superado la resistencia esperada y se informó que por el momento no han cumplido.

Informe fase 1: Durante el presente periodo no se recibió respuesta al comunicado ICCU-S-394-2025 “Respuesta comunicado YVY-385-25 – Remisión del informe fase 1. En el cual se solicita al Contratista YVY atender las observaciones realizadas a la mayor brevedad dado que la mayoría son una reiteración, y se requiere dar pronta aprobación. En el comité de seguimiento (acta 69) se requirió al contratista para que haga entrega de este informen.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Diseños Fase II	26-may-25	30-jun-25	35	25-ago-25	En ejecución	169	245	

Plazo del proyecto:


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO - ETAPA DE CARACTERIZACION

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	100,00%	95,36%	-4,64%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	100,00%	**95,36%**	-4,64%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

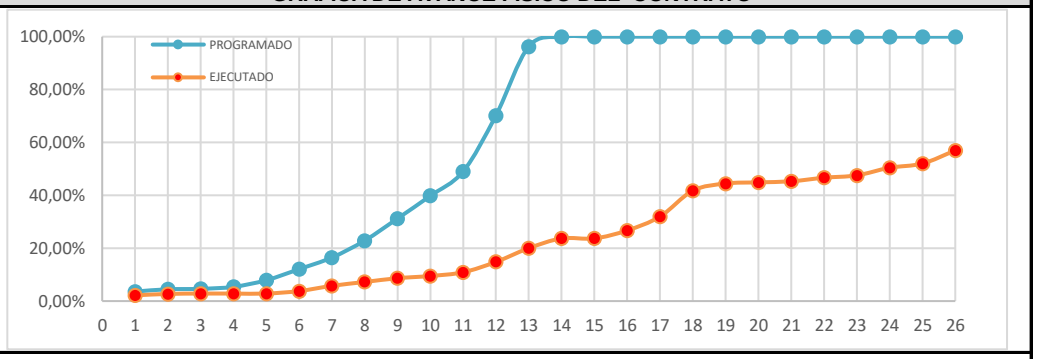

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
14 meses - 425 dias	299	126	

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2.237.676.001	$ 559.419.000	25%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 2.237.676.001	$ 559.419.000	25%

Programado: correspondiente a la etapa de caracterización valor programado básico (sin IVA).
Ejecutado: Corresponde a la cuenta del primer 25% de acuerdo a las condiciones de pago descritas en el anexo técnico del contrato. Valor básico (sin IVA).
*2da y 3ra cuenta del 25%: Respecto a la cuenta del Segundo 25% se recibió por el contratista con el YVY-395-25 y se dió respuesta el 12 de diciembre 2025 ICCU-S-381-2025 el 12 de diciembre 2025. Se debe remitir por parte del contratista los soportes solicitados para continuación del tramite, en el periodo no se ha remitido respuesta por el contratista, esto se reiteró al contratista en reunion de seguimiento semanal. Del 3er pago del 25 % el contratista a la fecha no ha completado el 100% de la Etapa de caracterización que permita tramitar el correspondiente pago.

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

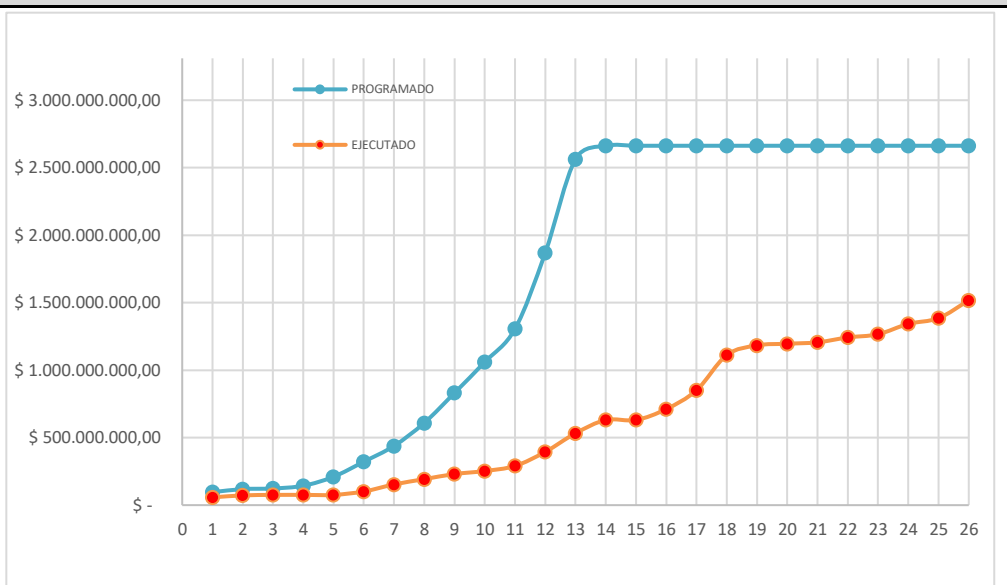


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.814.351.679	$ 1.092.910.427	11%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.814.351.679	$ 1.092.910.427	11%

A la fecha el contratista presentó solicitudes de utilización de estos recursos, la Interventoría ha realizado devolución de las ordenes presentadas que no cumplen con los documentos de soporte y aprobó las ordenes de anticipo numero 2 ítem transporte y 5 y 6 por materiales. En el trámite ante la fiducia del desembolso 6, hubo inconvenientes por presentación de formatos diferentes a los autorizados por la Interventoría, aspecto pendiente de aclaración por parte del contratista.

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

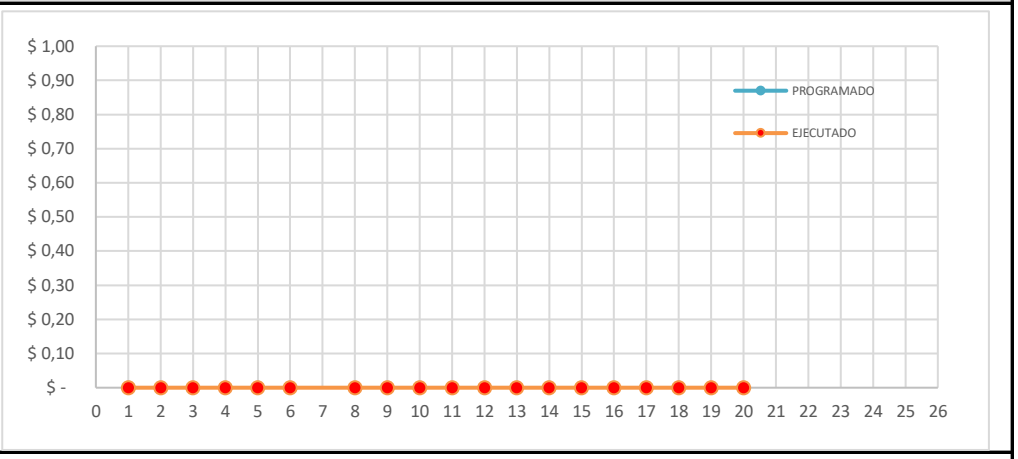

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado se adelantó la elaboración del informe mensual del componente ambiental correspondiente a diciembre de 2025
Así mismo, el 19 de enero de 2026 el contratista radicó el Plan de Adaptación y Gestión Ambiental (PAGA) de la provincia de Rionegro, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la Interventoría del componente ambiental.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento al Programa de Gestión Social en las provincias de Rionegro, Ubaté y Almeidas, evidenciándose que no hubo ejecución de obras por parte del contratista.
En Rionegro, no se desarrollaron comités ni actividades comunitarias; Contratista realizo entrega de actas de vecindad del Municiopio de la palma suscritas en los meses de noviembre y diciemre las promeras con ajustes y la segundas para revision y firma de Interventoría.sin vinculación de mano de obra.
En Ubaté, no se registraron actividades sociales ni técnicas, identificándose incumplimientos contractuales asociados a la no reactivación de frentes de obra, ausencia de cronogramas y limitada atención a la comunidad.
En Almeidas, se realizó el seguimiento a compromisos, evidenciándose retrasos en cronogramas, suspensión de actividades y sin nuevas contrataciones de personal.
De manera general, se identifican retrasos en la ejecución de las actividades del componente social y en el cumplimiento de compromisos contractuales, por lo cual la Interventoría reitera la necesidad de adoptar acciones inmediatas para reiniciar la ejecución del contrato y fortalecer la atención a la comunidad.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Se constata que el personal del contratista y subcontratista en estos momentos no está en laborando.
Por parte de las SST se va terreno y se verifica lo que tiene ver con la señalización.
Se verifica la señalización con cinta de peligro a tres filas en todas las alcantarillas en construcción, así como el material que se encuentra cerca a la vía. Para ello el área SST del contratista envía registro fotográfico de la señalización y por parte de SST interventoría se hace recorrido verificando esta información.
Se remitierón observaciones del informe correspondiente del mes de noviembre al contratista
También por parte de interventoría están haciendo revisiones y toma de medidas de las cantidades de obra ejecutadas para cada una de las alcantarillas
Se realizó la verificación de la señalización de Zumbe a la cañada de las siguientes alcantarillas; alcantarilla cruce 6, alcantarilla 91, alcantarilla cruce 5, alcantarilla cruce 4, cruce 3, alcantarilla tubo 1, alcantarilla 78, señalización de material, alcantarilla 11, alcantarrilla 14, alcantarilla 54B, alcantarilla 54 A.
Anexamos registro fotográfico de cada uno de los días.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

El contratista no ha dado cumplimiento a los compromisos establecidos con la comunidad de los Municipios de Susa y La Palma, correspondiente a la terminación de las obras de construcción de alcantarillas los cuales se habian fijado para el 5 de diciembre de 2025 (en Susa) y 20 de diciembre (en La Palma), lo cual ha ocasionado malestar por parte de la comunidad.El contrtatista sigue insistiendo en la aprobación de una suspención del contrato sin presentar argumentos que soporten sustancialmente las causales de suspención promero se argumento por epoca decembrina y elaboración de Laboratorios y ahora por problñemas administrativos y economicos.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

ETAPA DE CARACTERIZACION: El plazo de la Etapa de Caracterización terminó el pasado 30 de Junio de 2025, sin embargo, a la fecha la Interventoría emitió respuesta al último informe de diseños fase II, presentado por el contratista mediante comunicado YVY-432-25 respondido con el ICCU-S-017-2025, en el cual persisten observaciones en cuanto a la definición de espesores y zonificación entre otras. Por lo anterior el ICCU Citó a mesa de trabajo conjunta (contratista e Interventoría) el día 21 de enero, en la cual se tocaron temas tecnicos relacionados con las observaciones hechas por parte de la Interventoría al diseño fase II entregado por el contratista.
En lo que respecta al Informe Fase I sigue sin recibirse respuesta al comunicado ICCU-S-394-2025 “Respuesta comunicado YVY-385-25 – Remisión del informe fase 1. En el cual se solicita al Consorcio YVY atender las observaciones realizadas a la mayor brevedad dado que la mayoría son una reiteración, y se requiere dar pronta aprobación.
Por otra parte, está pendiente la entrega de resultados de laboratorío que el Contratista está haciendo con otro aditivo,que permita reducir costos y aumentar el alcance de las intervenciones de Mantenimiento de la rasante
El contratista PRESENTA UN AVANCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL 6,72 % y a la fecha debió ejecutar las siguientes actividades:
Municipio de Ubaté: Preliminares, Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas, Muros y Mantenimiento Rasante
Municipio de Susa: Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros y Mantenimiento Rasante.
Municipio de Tausa: Debería estar ejecutando, Explanaciones excavaciones replanteo de vía, y Alcantarillas
Municipio de Simijaca: Mantenimiento de la rasante
Municipio de Chocontá: Preliminares, Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros y debería estar ejecutando Mantenimiento Rasante,
Municipio de Sesquilé: Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros
Municipio de Manta: : Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros
Municipio de Villagómez: Preliminares, Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas, Muros y Mantenimiento Rasante
Municipio de La Palma: Se debería estar ejecutando Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros.
Municipio de Topaipí: Se debería estar ejecutando Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros.
Municipio de Yacopí: Se debería estar ejecutando Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros
El contrato a la fecha presenta un avance del 95,36% en la etapa de Caracterización, y del 6,72% en la etapa de ejecución. S elegalizó el tramite de la solicitud de prorroga del contratista por 5 meses la cual habia sido avalada por la Interventoría. La interventoría viene solicitando al contratista la preesenteción del Cronograma detallado de trabajo acorde al cronograma generral aprobado en la Prorroga No 1 realizada al contrato, sin que a la fecha esta sea entregada.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Para la ampliación del plazo contractual en Cinco (5) meses presentada por el Consorcio YVY, la interventoría realizó el correspondiente balance a los recursos existentes en el contrato de Interventoría, determinando que con los recursos existentes una vez descontando los recursos requeridos por la interventoría para la vigencia 2025, existen recursos para cubrir los costos de interventoría para el periodo que los cinco (5) meses que se requiere prorrogar el contrato. Lo anterior previo a un ajuste en el plan de cargas del personal de interventoría, incorporando mas personal de campo y rediciendo el personal de especialistas, balance que no incluye ajustes que se puedan generar por el cambio de vigencia, toda vez que el contrato inicial tenia contemplada la ejecución en la vigencia 2025 y siendo consientes que conforme el Contratista organice los frentes, se propondrá una distribución de recursos a la entidad. A la fecha seesta pendiente del aval de la entidad.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El contratista a la fecha, si bien ha ejecutado un 95,36 % de la etapa de Caracterización, de esta etapa solo ha facturado el acta de pago No 1 correspondiente al primer 25% de la etapa de Caracterización y adelantó la presentación del pago No 2 correspondiente al Segundo 25% de la etapa de caracterización; en este segundo pago, la interventoría solicitó soportes, los cuales el Contratista no ha remitido respuesta a la comunicación.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecución de las obras de construcción de alcantarillas se ha encontrato fisuramiento en algunas tuberías de PVC 36" instalada, aspi como porosidad en la estructura de cobncreto fundida en la alcantarilla de l Municipio de SUSA, se recibio respuesta por parte del contratista al tema de las fisuras.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Conforme los espesores que el Contratista ha considerado en sus diseños, se requeriría mayores cantidades del ítem de capa estabilizada, para cumplir con la longitud estimada o disminuir el alcance de esta longitud.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

A la fecha, el Contratista continua sin entregar el informe Fase II ajustado de la etapa de caracterización,en atención a las observaciones y/o efectuando las aclaraciones solicitadas, para lo cual seel pasado 21 de enero se realizó una reunión de especialistas, para lo cual se tocaron los temas referentes a las observaciones realoizadas por la interventoría y poder definir temmas de transito y espesores para la vía del Municipio de Manta.
Respecto a los atrasos en la etapa de Caracterización, la Interventoría, en su momento, radico ante el ICCU el correspondiente Informe de Presunto Incumplimiento el cual fue analizado por la entidad, procediendo al inicio del correspondiente Proceso Administrativo Sancionatorio, dentro del cual la entidad concluyó que el contratista había subsanado los incumplimientos y procedió a su archivo.
El contratista como responsable del Diseño de la Estabilización de la subrasante, y de determinar la fórmula de trabajo que garantice el cumplimiento de los parámetros establecidos y ajustados en el desarrollo del contrato por el ICCU,entregó el balance con la formula de tranbajo usando DP-STP-WAY mejorado, determinando que el alcance del proyecto se disminuye en más del 60%; para lo cual el contratista decidio adelantar nuevas pruebas con otros aditivos que le pueden dar un mejor resultado que el D-STP-WAY y con su utilización permitir reducir costos para lograr un mayor alcance en la meta física, comprometiendose a entregar resultados el pasado 19 de diciembre, sin que a la fecha haya realizado su entrega.
El contratista no adelanta trabajos en nunguna de las provincias y el personal directivo (Directores, Residentes) aun no se encuentran en campo, para lo cual no hay ningun responsable de las obras intervenidas, a pesar que se hallan comprometido el 13 de enero de 2026, a dar continuidad a los trabajos para así poder cumplir los compromisos fijados con la comunidad y cumplimiento a los cronogramas propuestos para adelantar los trabajos en estos CINCO (5) meses de prorroga.
En reunion sostenida el ´pasado 22 de enero de 2025, el contratista se comprometió a terminar la construcción de las alcantarillas en los Municipios de Susa, Manta y Choconta (19 alcantarillas en Total) para el 6 de febrero de 2026, Entrega de resultado de las últimas campañas de laboratorío emprendidas con estabilizantes para el 23 de enero de 2026 (compromiso no cumplido), entrega de APU y especificacion para estbilización con Impromación Reforzada para el 6 de febrero de 2026

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





UBATE - INSPECCION ALCANTARILLAS Y SEÑALIZACIÓN







SUSA - INSPECCION ALCANTARILLAS, SEÑALIZACIÓN Y ESTADO VÍA






SIMIJACA - ESTADO DE LA VÍA - TRAMO PILOTO







MANTA - ALCANTARILLAS Y SEÑALIZACIÓN -

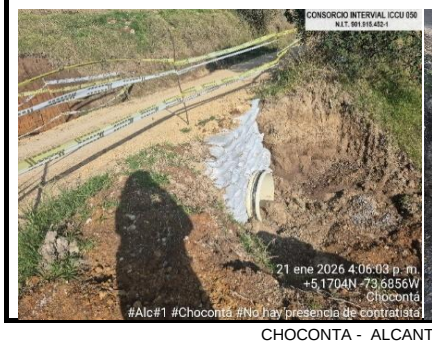



CHOCONTA - ALCANTARILLAS - ESTADO VIA





SESQUILE - ESTADO VIA





LA PALMA - ALCANTARILLAS - ESTADO VIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1

Nombre: Ing. Carlos Arturo Reina

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 2

Nombre: Ing. Edgar Mauricio Beltrán Cárdenas
