01-11-25 CORRESPONDENCIA Se termina actividades de desmonte de mobiliario ubicandolos en biblioteca segun indicaciones de los trabajadores de esta área, se realiza desmonte de guardaescobas y piso vinilico MATERAS Se realiza media caña en matera 4 para proteger perfil que no quede expuesto y pueda dañar la membrana, se retira flanche existente en matera 9 al 100%- y se realizan resanes y media caña, continua actividad de pendentado en materas 12, 13, 14 y 15 y retiro de membrana en materas 14 y 7. DAVITA Se realizan remates de guardaescobas y detalles en cordon de soldadura, posterior a esto se ingresan puestos de trabajo ubicandolos en su respectivo lugar.; se aplica con 2da mano de pintura en toda el area. CRIMINALIDAD ORGANIZADA Llega puerta faltante de oficina 3 y se realiza su respectiva instalación quedando pendiente Sandblasting. SECRETARIA DE LA CORTE Se autoriza pintar oficina, 2 cenefas de piso, donde estaba la division anterior y la segunda donde se encontraba una division de puesto de trabajo ya que al realizar el retiro quedo el detalle en el piso, igualmente el guardaescobas se cambia en tramos para detallar el corte de la division en muro. y darle continuidad. EXTINCION DE DOMINIO: Se realiza tapado de ventanas con fibrocava y drywall de oficinas colindante (2) al area a intervenir - actividad realizada este dia por temas de ruido, continuan actividades de soldadura e instalacion perfileria de cielo raso.

03-11-25 DAVITA: Se presenta personal a obra para ultimar detalles de pintura, ajuste de mobiliario para entrega de espacios a la entidad. MATERAS Se termina pendentado en materas 13, 14, 15 al 100% quedando pendiente un 20% de matera 12. EDIFICIO T GIE Se realiza desmonte de puestos de trabajo en area nueva a intervenir (9) Se retira personal de bunker sobre las 3:00 pm

04-11-25 CORRESPONDENCIA: Se continua actividades de desmonte de piso vinilico en toda la superficie, se debe retirar material bituminoso.

Powered by CamScanner

DAUITA Se hacen observaciones de pintura en muros los cuales se deben subsanar a la brevedad igualmente con el aseo para la entrega del espacio a la entidad; entra contratista a realizar arreglos, se desmonta cerramiento y se retira escombros en costillo SALA DE JUNTAS Se instala samblasting de division instalada SECRETARIA DE LA CORTE Se instala samblasting en division de vidrio LAVADO DE ACTIVOS Se realiza resane en piso de vacios en la superficie de la placa para evitar vacios en la superficie, continua con resanes y estuco en muros y cenefas de cielo raso EXTINCION DE DOMINIO Se suspenden actividades electricas por ruido, se propone realizar actividades en la noche. MATERAS Llega material para finalizar la instalacion de geotextil y membrana en materas, se hace medio corte en matera 9.

05-11-25 EDIF. # Se habilita un nuevo espacio en primer piso - Sala de Juntas - Se realiza desmonte de piso vinilico y guardaescobas al 90% en este espacio. CORRESPONDENCIA Se realiza instalacion de mastico en toda la superficie a intervenir. DAUITA Se hace la entrega a este espacio despues de haber subsanado las observaciones dadas por la entidad quedando asi el acta de entrega por parte de la entidad LAVADO DE ACTIVOS Se realiza instalacion de piso vinilico en area a intervenir EXTINCION DE DOMINIO Se avanza con actividades de cielo raso y resanado de muros. MATERAS Se realiza ~~perfi~~ instalacion de perfileria en materas 13, 14 y 15 y se instala geotextil en matera 14 y 15 Se realiza retiro de placas prefabricadas en matera 17 EDIFICIO T-GIE Se espera personal de los fics para el desmonte de cableado en cancleta de puesto de trabajo

06-11-25 Se reciben 13 oficinas en area de Unidad especial de investigacion se realiza inventario de mobiliario y levantamiento de areas de cada oficina, posterior a esto se inician desmontes de mobiliario y piso vinilico; actividad adelantada al 90%; se dejan 2 oficinas

con dos capas de mastico, se instala mastico en sala de junta primer piso edif tl; se priorizan las frentes de Unidad especial de investigacion por la premura en tiempos de entrega ya que la fecha de entrega de estas oficinas esta proyectada para el dia 11 de noviembre; SALA DE AUDIENCIAS se cuenta con demolicion de enchapes de muro y piso de baño, se autoriza suspender punto de ducha de baño LAVADO DE ACTIVOS se realiza pulido de piso para alistar superficie para instalacion de piso vinilico EXTINCION DE DOMINIO Continuan actividades de resane de muros en drywall y estructura de cielo raso; se realizan ultimos remates de estructura metalica para cielo raso. HATERNO Continuo actividades de impermeabilizacion en meteros 12, 13, 14 y 15

07-11-25 UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION se finaliza con el desmonte de piso vinilico y guardaescobas en el 100% de las oficinas, se debe hacer un destroque en la superficie de las oficinas para retirar impurezas y garantizar una buena aplicacion del mastico, se instala mastico en el total de oficinas (13) y se deja con piso vinilico bodega, oficina 1 y oficina 2. SALA DE JUNTAS - PISO 1 se instala piso vinilico en esta area CORRESPONDENCIA se realiza remate de guardaescobas e instalacion de cordon de soldadura en piso vinilico. GIE se realiza desmonte de cableado y completa de puestos de trabajo LAVADO DE ACTIVO Realiza alistado y resane de cenefas y estuco en muros de drywall EXTINCION DE DOMINIO Continuan actividades de estructura de cielo raso y detalles de cenefa perimetral

08-11-2025 Se evidencia por parte de interventoria a dos trabajadores lanzando las lonas de tierra, desde el area de plataforma al Piso 1. sin utilizar la polea, destinada para tal labor. En compañia de la. Inspectora SST, se le realizo la respectiva retroalimentacion al personal que se encuentra

realizando el tropiezo de materia al área de acopio, indicándoles el peligro que representa este tipo de actos inseguros.

Odrel Torres
Prof SST Intaw.

Continuan actividades de instalacion de piso vinilico en oficinas de unidad especial de investigación, quedan todas las oficinas (13) con piso y cordon de soldadura; se dejan 11 oficinas con guardaescobas quedando 2. pendientes, se dejan resanadas y primeriadas 6 oficinas
SALA DE JUNTAS se instala cordon de soldadura en piso y se remata guardaescobas en todo el area a intervenir; SALA DE JUNTAS 2. Se recibe sala de juntas 2 se inicia con instalacion de cerramiento, desmonte de mobiliario y retiro de piso vinilico formato 50x50 CORRESPONDENCIA Se hace montaje de laminas cielo raso. y se aplica segunda mano de pintura EXTINCION DE DOMINIO Continuan actividades de estructura y detalles de cielo raso y cerrete en drywall LAVADO DE ACTIVOS Mastro aplicado en superficie de oficinas, queda listo para pulir e instalar piso vinilico.

09-11-25 Llega personal a continuar con remates y detalles de pintura en oficinas quedando con 2 manos las primeras 6 oficinas y con primera mano y resana el restante.; personal en obra 4 operativos 1 residente de obra.

10-11-25 Se finaliza instalacion de piso vinilico en sala de juntas 1 de politicas en edificio H piso 1, sumado a esto se realizan los remates y detalles de pintura correspondientes para lograr entregar dicho espacio, Adicional en conversacion con interventoria, dan aval para intervenir la sala de juntas de politicas mas grande, donde se iniciaron actividades el dia de ayer, pero al dia de hoy personal encargado de la administracion del area, Nos solicita que no continuaramos puesto a que se levanta mucho material particulado y mucho dar a pegante

Por tal motivo se eleva esta solicitud a interventoria siempre dejando claro que esta interrupcion nos afecta con respecto al avance solicitado por supervision y adicional porque esta area se interviro siempre con el aval de la interventoria, el cerramiento de la misma area queda ejecutado desde ayer, adicional en sala de juntas en piso 1 3 se realiza la instalacion del sandblasting, quedando pendiente solamente rejillas, aunque cabe aclarar que por solicitud de la persona encargada de esta sala de juntas, se requiere una toma electrica para el TV a lo que esto se realizara para el miercoles. Adicional se ejecuta el cerramiento de gle entorno T para sacar todo el mobiliario para intervenir. Por parte de las 13 oficinas de 1 piso 2 se termina de instalar guardaescoba y cenefas exteriores finalizando 100% la instalacion de piso, asi mismo se avanza en la medida de muebles

Residente

12-11-2025 Realizando recorrido por los frentes de trabajo se evidencia en el edificio F, personal trabajando en la instalacion del superboard, sin ningun tipo de proteccion contra caidas. Se notifica de inmediato a la inspectora SST del contratista, de no subsanarse, se procedera a suspender actividades.

Juan P.
Pof. SST Interventoría.

- Se finalizan las armadas de los muebles de las oficinas de piso 1 1, esto con el fin de entregar a satisfaccion la ejecucion de estas oficinas, por parte del GIS se realiza el demonte de muro al 100% y con esto avanzar con el replanteo de la zona, en sala de juntas piso 3 1 se hace instalacion de luminarias de 60x60 (3), se hace montaje de puestos de trabajo en correspondencia, en mobras se avanza en la instalacion de geotextil en mobras 4 y 2, en sotano de F se avanza con la instalacion muros Drywall y se proigue con el trasiego de tierra de plataforma.

Residente Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

13-11-2025. La interventoria le informa al contratista de obra, que en el frente Extinción de dominio en el sótano del edificio F, pueden trabajar durante el dia y la noche, teniendo encuenta que el personal de Fiscalia en ésa area ya se encuentra en vacaciones. Esto información tambien se le socializa de manera verbal al residente de obra.

CUMPLE

Rta. interventoria.

- Se avanza en la madera ubicada frente a torre T con el retiro de los Bloques de concreto para poder intervenir la respectiva impermeabilizacion, en las maderas cuadradas de la 1 a 7 se avanza en la ultima (7) con la instalacion de membrana PVC y futura instalacion de geotextil, en SIE Torre T se avanza al 95% de construccion de muros divisorios, no se finaliza, puesto a que estamos a la espera de llegada de material electrico para la independizacion de luminarias de los futuros oficinas, ya cuando llegue el material y se instale la tuberia EMT se procede con la terminacion del muro En Sala de audiencias se avanza con la demolicion al 100% del enchape de muros y pisos, en piso 4 edificio F Ext. de dominio se sigue avanzando con la instalacion de laminas en superboard Sobre la estructura realizada al 100%, se hace instalacion de refuerzo para puertas en SIE, en F Sala de audiencias se avanza con aplicacion de pintura al 70%, F sotano se realiza el desmonte de division en vidrio intora con el respectivo muro inferior, en F piso 4 se avanza con la instalacion de cielo raso en fibra mineral dejando pendiente la instalacion de las luminarias, por parte de las 6 oficinas a intervenir en el Hall piso 2 del H solo se hace entrega de 3 en las cuales se avanza con desmonte de puertas y asi mismo de piso, las otras 3 las entregan maltrata, a lo que se expresa tanto a supervisor y interventoria que el tapso de tiempo para entrega de estas 6 ya intervenidas es muy corto y mas cuando por parte de la entidad nos entregan las ultimas 3 para el 14 y la entrega formal de nosotros es para el 14.

15-11-25. La supervisión aportó 8 trabajadores para realizar el desmonte de los puestos de trabajo. (retiro del salón al hall donde se instaló el cerramiento) en el primer piso del Ed. H. oficina Política y estrategia, todo el mobiliario de esta dependencia. Se debe aplicar pintura vinilo (una mano) a los muros que sean necesarios.

- Se determina de instalar las laminas de superboard en la estructura de piso Base (sotano) del F, Supuesto a esto por parte de la entidad se nos hace la entrega del espacio mas grande de politicas en piso 1 H, donde en compañia de interventoria se hacen las ubicaciones de los muebles para cuando se armen los puestos, esta entrega se realiza el 14, en edificio F sotano se avanza con los muros divisorios, adicional se avanza en piso 2 hall con desmonte de pisos de las primeras 3 oficinas a un 90% y como ayer se entregaron las otras 3 se avanza al 30% con desmonte pisos, sumado a esto en politicas piso 1 del H se avanza con desmonte de puestos de trabajo. Por otra parte se avanza con el retiro de chatarra del area de acopio y en explosivos se da inicio a la adecuacion de bases de los puntos a instalar a futuro.

Residente obra

17-11-25 - Se continua con el retiro del piso vinilico en politicas con los 6 operarios, adicionalmente se realiza el levantamiento de polisombra en sotano del F por requerimientos de interventoria, en sala de audiencias del F se termina la instalacion de enchape de piso y hoy se prosigue con la instalacion de enchape de muros y con aplicacion de pintura 2 da mano de pintura en oficinas hall piso 2 del H y asi mismo se avanza con la aplicacion

Norma

Powered by CamScanner

del mastico en las 6 oficinas para el dia de mañana hacer la instalacion del nuevo piso en vinilo y asi mismo se procede con la aplicacion de mastico a GIE para avanzar con mas espacios con piso en vinilo.

Residente obra

18-11-25 • Se continua con el retiro de piso en vinilo a lo que se avanza en un 40% de retiro de este piso, sumado a esto se hace el respectivo sellamiento de los sensores de Humo, esto con el fin de que al momento de hacer el destronque o retiro de sobrantes de piso, las alarmas no se activen como en bocatoma, sumado a esto se sigue avanzando con las adecuaciones de las puertas de explosivos, mampillando los filos y reforzar, en piso 4 del F se prosigue ya al 97% la instalacion de paneles de fibra de cielo raso y se instalan las respectivas luminarias, en Sotano de esta misma torre el personal se encuentra retirando el sobrante material para seguir con la construccion de muros con recubrimiento de jumbolon (Fracasa), en las 6 oficinas del Hall del piso 2 del H se prosigue con el aseo o limpieza de superficies en los pisos para la instalacion del respectivo piso en vinilo, el enchape del baño de sala de audiencias del F se finaliza quedando solo remates superiores al enchape, asi mismo en esta area se avanza con los remates de pintura de muros y de cielo raso, adicionalmente por solicitud de supervision y interventoria se hace orden del centro de acopio puesto a que la polisombra se caiga. Por otro lado se quiere dejar plasmado que presentamos ciertos atrasos con respecto al suministro de material en sitio y esto se debe a que el canino no solo toma las horas de 12pM a 2pM para el ingreso de vehiculos, sino que tambien en otros horarios diferentes a lo cual nos atrasa ese suministro por consiguiente atrasa las avances de obra

Residente

19/11/25 Se le solicita al contratista de obra, entregar el plano, Esquema y procedimiento que corresponde a la maniobra del By Pass a realizarse en los tanques que se van a impermeabilizar. Se informa que la interventoria envio observacion a la actividad AC-31 "suministro e instalación de materiales y equipos para By Pass en tanque de agua." y la fecha no se ha tenido respuesta, el cual la actividad que se está ejecutando el dia de hoy no ha sido aprobada por la interventoria (respuesta interventoria 16/11/25)




- Se continua con el desmonte de piso vinilico avanzando en un 70%, dejando para el final el retiro de la superficie blanca, en sotano del 6 se sigue avanzando con la construccion de muros en superboard con un 70% finalizado y asi mismo se va estructurando el cielo raso con un avance del 40%, adicional se avanza con la armada del andamio certificada para la maniobra del Bypass de los tanques, cabe aclarar que nos reunimos con el Sr. (Lucho) el encargado del area del cuarto de maquinas, donde por solicitud del 6 se hacen modificaciones a la propuesta que se tenia, por ende obligadamente nos toca reformular la distribucion e instalacion de tuberia y de andamios + el tanque para la RCI lo que no atrasa la ejecucion de las actividades, sumado a esto como solicitud de interventoria ya realizada, se hace un esquema de como la maniobra del Bypass quedara instalada, quedando a la espera de socializar este esquema con interventoria para su aprobacion y visto bueno, Por otro lado por solicitud de interventoria piden una instalacion de (cenefa) de piso vinilico en los dos oficinas de aplomos en la entrada

Norma

Powered by CamScanner

de las dos oficinas tal cual como se plasma a continuacion.

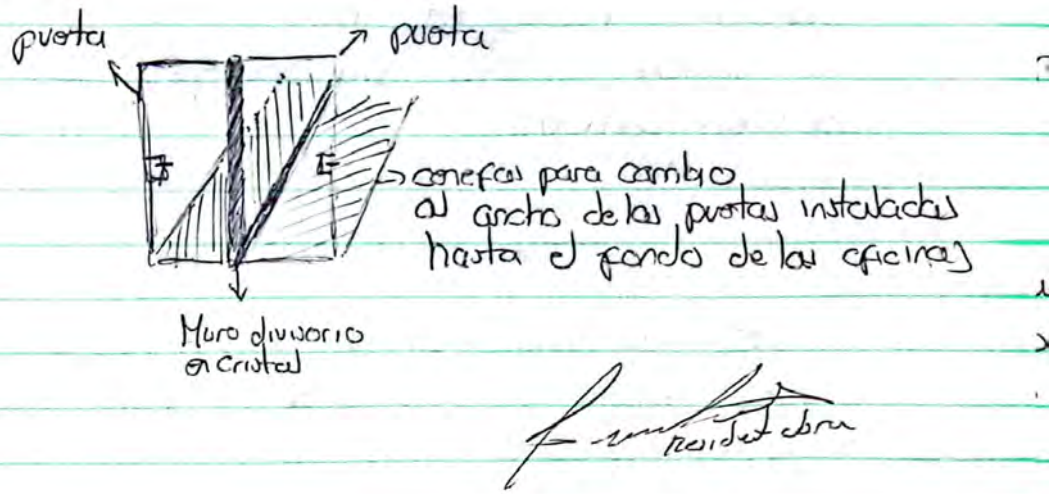

20-11-25 • Sala de audiencias se prosigue con las resanes de los muros delos boxes, sumado a esto se hace la instalacion de interruptores en todo el edificio F se prosigue con la instalacion de estructura de cielo raso con avance del 70%, esto debido a que si se si toca terminar o dar la mejor terminacion a los muros de drywall, en piso 4 ti se termina de desmontar todo el piso en vinilo, ya dando avance a los residuos blancos que quedan mas pegados al suelo, adicionalmente se inicia instalacion de piso vinilico en 615, para poder proseguir con la aplicacion de pintura de los muros. Adicionalmente en el area donde se va a ejecutar la mandera de los tanques, en un lado se nos obligo reo- ortar el area que estaba a disposicion, debido a la instalacion de una tarima para un evento de la fiscalia por ende. se deja plasmado que obligadamente nos toca trasladar un poco mas la ubicacion de los andamios conllevando un replanteo seguro con las distancias de la tuberia que alimentara y descargara a los tanques

Por otro lado se hace la instalacion de puertas en explanos dejando solo pendiente la instalacion de Sandblasting y en piso 4 del F se avanza en la instalacion de divisiones con un avance del 20% aproximadamente.

21-11-25 Se continua con el desmonte de todo residuo que queda al desmontar el piso en vista ~~tatorque~~ de politicas en piso 1 H, donde adicional por agilidad en la ejecucion se procede con el uso de pulidora con disco de desbronque y con soplete para socavar el pegante y asi avanzar con la instalacion de piso vinilico DNA NUEVO AL; se realiza emboquillado de pisos y muros ya se instalaron los aparatos sanitarios al 100% con los accesorios

F PISO ANO: se continua instalacion de estructura de cielo raso ya con avance del 60%.

F PISO ANO PISO: se continua la instalacion de divisiones con un avance del 30%.

Por otro lado se le informa a la supervision que la division para instalar en informatica (jefe) piso 2 H forense estara para la siguiente semana puesto a que el proveedor depende de la disponicion de la tempdadora con la demanda que tienen


22-11-25 En politicas se continua con los remates de guardaescoba para instalacion de la misma mas adelante Por otra parte se va avanzando con la aplicacion de mastico en las oficinas pequeñas de politicas Piso 1 F: se va avanzando con la instalacion de divisiones avanza a un 70%.

Norma

Powered by CamScanner

Sotano del f: se avanza con maquillado de muros en drywall ya con el acho de arriba
En zona de juntas del piso 3 H se terminan de hacer resanes, solo quedando una mano de pintura para finalizar.
Por otra parte se adjunta un esquema de como sera la maniobra del bypass de los tanques la cual fue revisada, observada y aprobada para su aprobacion por parte de interventoria, sumado a esto por medio de un oficio se radicara el paso a paso de como ejecutar la maniobra.

MANIOBRA BYPASS TANQUES ALMACENAMIENTO

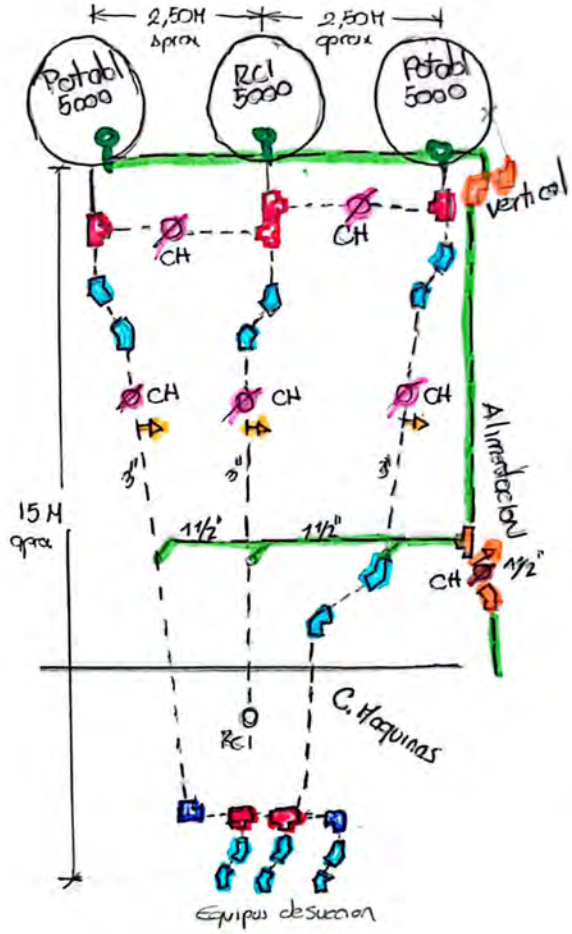

Convenciones

- Cheque 3"
- 3" Registro
- Tuberia 3"
- Tuberia 1 1/2
- 3" semicodo
- 3" codo
- T de 3"
- Flotador
- cheque 1 1/2
- Registro 1 1/2
- T de 1 1/2
- semicodo 1 1/2
- tubera 1 1/2

Powered by CamScanner

23-11-23 Politreas se sigue avanzando con la instalacion de piso vinilico en las oficinas geograficas (Modulares) Sotano F: Se avanza con el dintel de la fachada para reinstalar cristales dejando estructurado para el dia de mañana realizar remates
Explosivos: se instala pisos en las dos oficinas (generales) quedando pendiente la soldadura de los juntas asi mismo se avanza con resanes de muros a intervenir

24-11-23 Sotano del F: Se sigue avanzando con la instalacion de recubrimiento dintel y con maquillado de muros
Politreas H: Se avanza con instalacion de piso vinilico ya instalando un 30%.
Piso 4F: Se hace brigada de aseo para entregar el area
Plataforma: Se avanza con demolicion de placas de las naves esto para lograr su traslado a pto de acopio mas facil

25-11-23 Se termina de tapar grieta de limpieza en piso 4F y en tanques se atiende la solicitud de tapar o mejorar el cerramiento.
Piso Sotano F: Se termina de estructurar el cielo raso para su posterior instalacion de laminas de cielo raso
Piso 4F: Se procede en aplicar las manos de pinturas que hacian falta para ya finalizar esta area al 100%

Norma

Powered by CamScanner

Sumado a esto, se procede en politicas cuarto electrico en tacar retiro de piso vinilico existente
Politicas tambien se avanza con la instalacion de piso al gesso quedando tambien la instalacion de guarda escoba para entregar el 30

27-11-23 Politicas ya se inicia reinstalacion de puestos de trabajo y asi mismo se avanza la instalacion de guarda escoba
GIE: se procede en avanzar con la instalacion de las lamicas de cielo raso donde esta ubicada el muro en drywall divisorio, se realiza remate de pintura quedando solomente instalacion de guarda escobas y instalacion de divisiones y puertas
Piso sotano F: se aplica la membrana de vapor para lograr mitigar la humedad de la roca por el nivel freatico del suelo
Adicional llega estructura para la domo a revisar pero se hace observacion por parte de interventoria sobre el sobredimensionamiento de la estructura. a lo cual toca revisar para aprobacion

28-11-23 se termina de pasar todos los muebles a sitio en politicas y se procede con el montaje y anclaje de los mismos, se levanta la division o cerramiento con pladomba

F Sotano: Se aplica pintura en divisiones de drywall y fijada de uniones y adicional se aplica mastico para seguir el avance de la instalacion de pisos
Piso 1F: Se hace limpieza de la oficina para entregar el area
oficina GIET se reinstalan 2 luminarias para quedar con total en apoyo 4 lamparas de 60x60 aprobadas por la supervision

29-11-25 Se hace limpieza en politicas para lograr entregar a calidad. En piso Sotano F se hace la instacion de piso vinilico avanzando al 70%. Por parte de la superficie donde esta la estructura entre sotano y piso 1F se realiza aplicacion de pintura epoxica.
Por otro lado se iba a intervenir la oficina de informatica forense con la instalacion de division como se habia expresado a la supervision, pero por problemas de logistica, no se puede intervenir el dia de hoy esta oficina a lo que se queda que se realizara iniciando semana.
Por parte de maderas se hace la instalacion de membrana y geotextil en la madera 9 para con esto finalizar la actividad de maderas.
Adicional se realiza la maniobra de la conexion electrica de las fases en piso 1F a lo que se hizo por cubierta puesto a que las oficinas estaban cerradas.
En GIG se hace instalacion de puerta de acceso y adicional se hace remates de dicha instalacion

Norma

30-11-25 Se realiza instalacion de divisiones en sotano F avanzando al 70% quedando pendientes la fachada, se instalan las luminarias y se energizan, adicional se hacen remates de pinturas para terminar para entregar donde se trabaja hasta las 6 PM trabajando para lograr entregar a tiempo.

Residente de obra

01-12-25 Se hace recorrido con supervision donde se solicita que se haga el cambio de las luminarias que no encajan en el espacio libre entre piso y y sotano del F, por otra parte se hace la instalacion de la division exterior (fachada) del sotano quedando la puerta por instalar, sumado se hace limpieza de las zonas para poder entregar a gusto

Residente de obra

03-12-25 Se hace instalacion de sandblasting en sotano del F en las divisiones reinstaladas, se hace aseo. Adicional en TYCI del T sotano se hace la intervencion de demolicion de muros entre cuarto tecnico y la oficina del lado ya para manana se va a hacer la entrega de las pantallas por parte del personal para proseguir avanzando, se instala Sandblasting en GIE

Residente de obra

04-12-25

Norma

Powered by CamScanner
