MEMORIA DE CANTIDADES Y REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPITULO 1

PRELIMINARES

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	AREA	LONGITUD	CANTIDAD	
AREAS DE CANCHAS TENNIS EJECUTADAS					
AREA CANCHA 1	21,06		41,36	1,00	871,04
AREA CANCHA 2	21,06		41,36	1,00	871,04
AREA CANCHA 3	21,06		41,36	1,00	871,04
AREA CANCHA 4	21,06		41,36	1,00	871,04
				TOTAL	**3.484,16**
AREAS COBRADAS EN ACTA PARCIAL No. 01					
CANCHA 1 Y 2	43,00		57,00	1,00	2.451,00
CANCHA 3	21,29		39,57	1,00	842,45
CANCHA 4	21,29		39,57	1,00	842,45
				TOTAL	**4.135,90**
				DIFERENCIA	**-651,74**
VIENEN:				SUBTOTAL	**3.484,16**
PASAN:	3484,16			TOTAL	

OBSERVACIONES:

1. Pagos Anteriores: Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a las cantidades que se cobraron para las canchas de tenis en la parcial No. 01 que totalizan 4.135,90 M2
2.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** representan las cantidades a cobrar en la presente acta parcial No. 07 que totalizan 3.484,16 M2. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

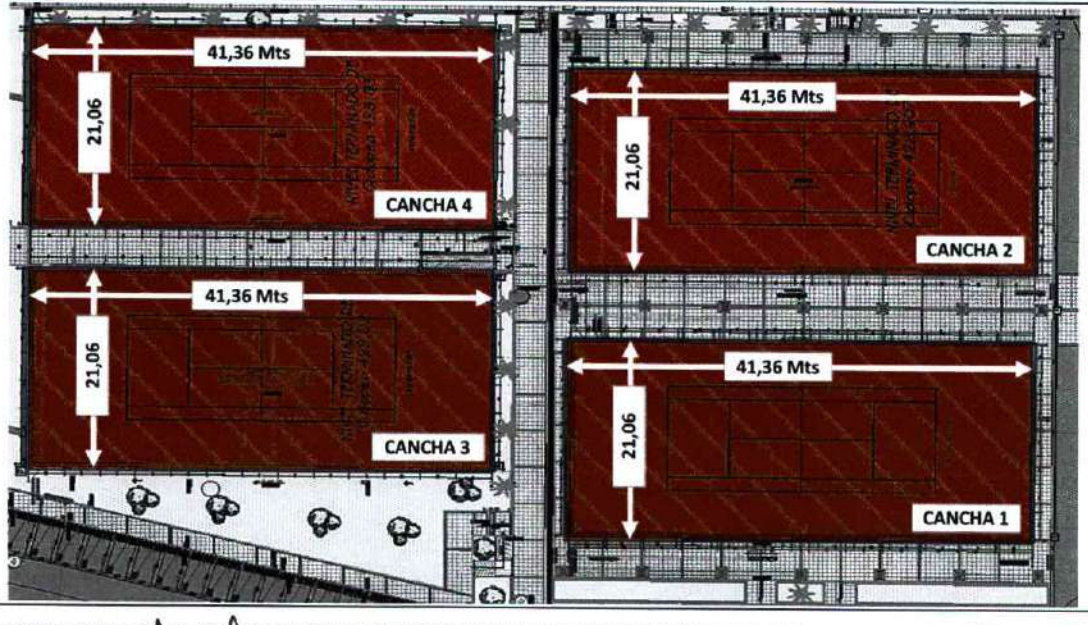

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	AREA	LONGITUD	CANTIDAD	
REAS DE BALONCESTO EJECUTADAS					
ES UN (1) AREA TOTAL DE	90,26		45,61	1,00	4.116,76
				TOTAL	**4.116,76**
AREA COBRADA EN ACTA PARCIAL No. 01					
BALONCESTO	89,80		45,00	1,00	4.041,00
				TOTAL	**4.041,00**
				DIFERENCIA	**75,76**
VIENEN:	3.484,16			**SUBTOTAL**	**4.116,76**
PASAN:	**7.600,92**			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:

1. Pagos Anteriores: Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a las cantidades que se cobraron para el escenario de baloncesto en la parcial No. 01 que totalizan 4.041,00 M2
2. Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** representan las cantidades a cobrar en la presente acta parcial No. 07 que totalizan 4.116,76 M2. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

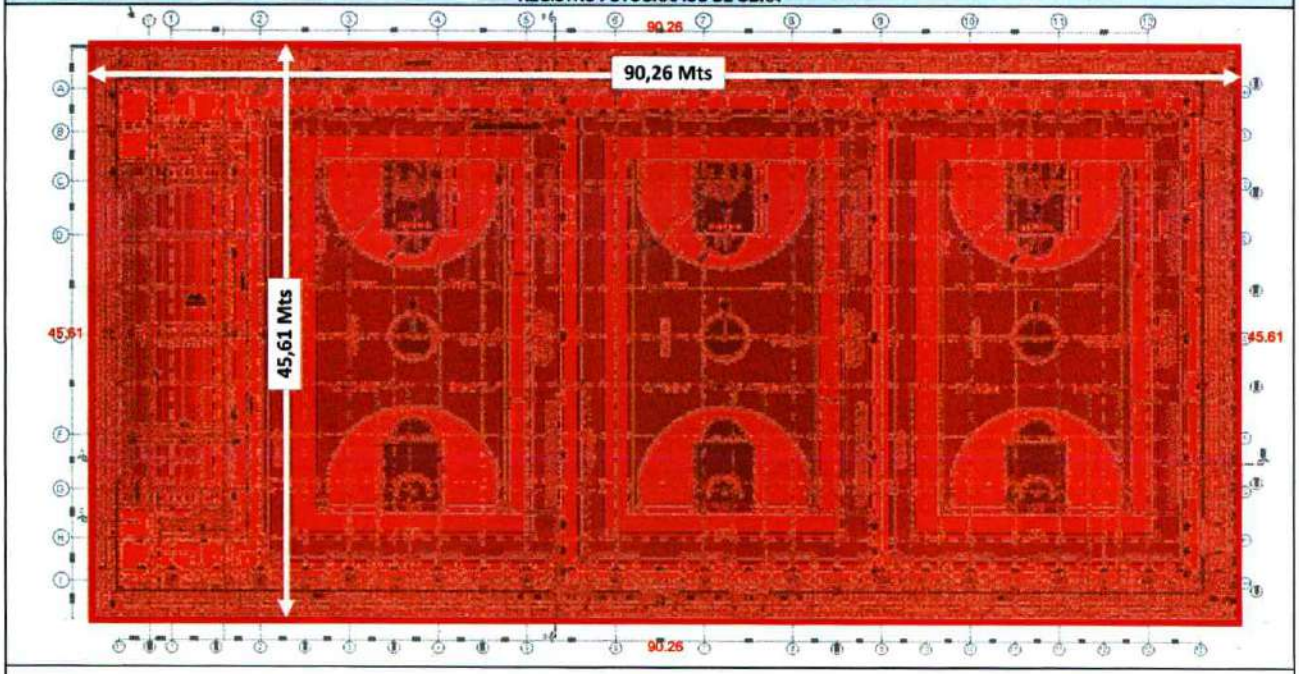

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	AREA	LONGITUD	CANTIDAD	
CANCHAS FUTBOL 5					
AREA CANCHA 1	15,00		25,00	1,00	375,00
AREA CANCHA 2	15,00		25,00	1,00	375,00
AREA CANCHA 3	15,00		25,00	1,00	375,00
				TOTAL	**1.125,00**
AREAS COBRADAS EN ACTA PARCIAL No. 01					
FUTBOL 5 No. 1	15,00		25,00	1,00	375,00
FUTBOL 5 No. 2	15,00		25,00	1,00	375,00
				TOTAL	**750,00**
				DIFERENCIA	**375,00**
VIENEN:	7.600,92			**SUBTOTAL**	**1.125,00**
PASAN:	**8.725,92**			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:

1 Pagos Anteriores: Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a las cantidades que se cobraron para las canchas de futbol 5 No. 1 y 2 en la parcial No. 01 que totalizan 750,00 M2
2 Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** representan las cantidades a cobrar para las tres canchas de futbol 5 en la presente acta parcial No. 07 que totalizan 1.125,00 M2. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

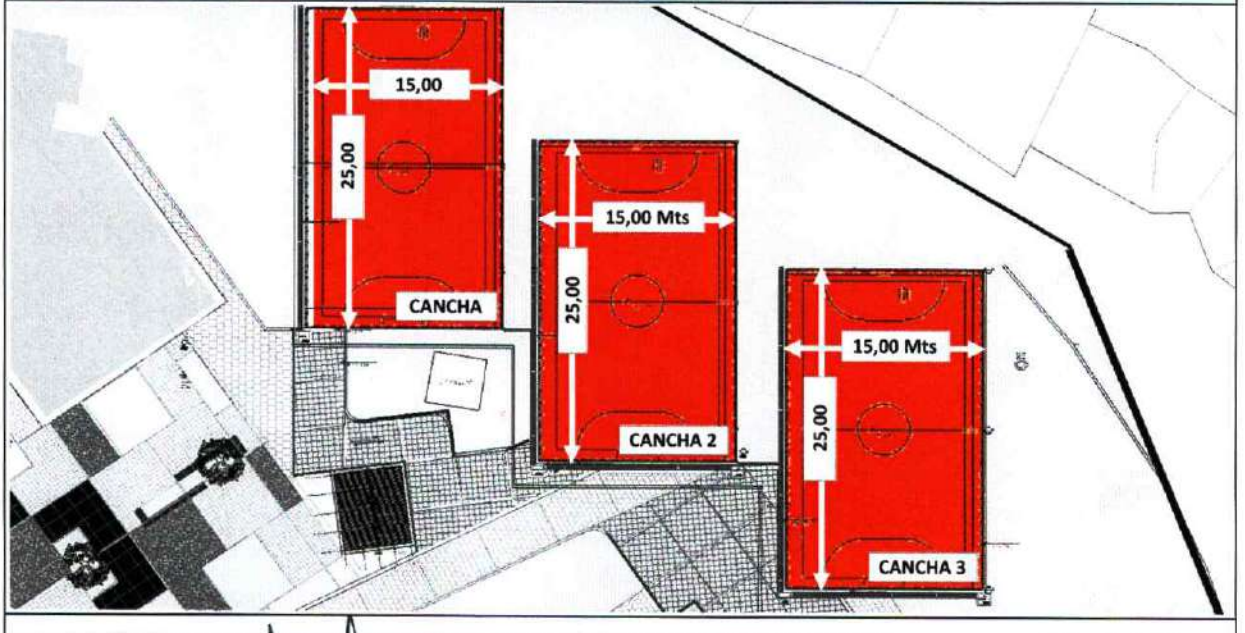

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PARQUEADERO					
ES UN (1) AREA DE	15,31		79,87	1,00	1.222,81
ES UN (1) AREA DE	4,82		10,71	1,00	51,62
ES UN (1) AREA DE	6,03		6,17	1,00	37,21
ES UN (1) AREA DE	5,12		80,62	1,00	412,77
ES UN (1) AREA DE	8,24		81,94	1,00	675,19
ES UN (1) AREA DE	15,99		57,56	1,00	920,38
ES UN (1) AREA DE	2,65		14,28	1,00	37,84
ES UN (1) AREA DE (b*h)/2		9,06	14,28	1,00	64,69
ES UN (1) AREA DE	5,32		41,77	1,00	222,22
ES UN (1) AREA DE	5,86		9,50	1,00	55,67
VIENEN:	8.725,92			**SUBTOTAL**	**3.700,40**
PASAN:	**12.426,32**			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas **en NEGRO** representan las cantidades a cobrar en la presente acta parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

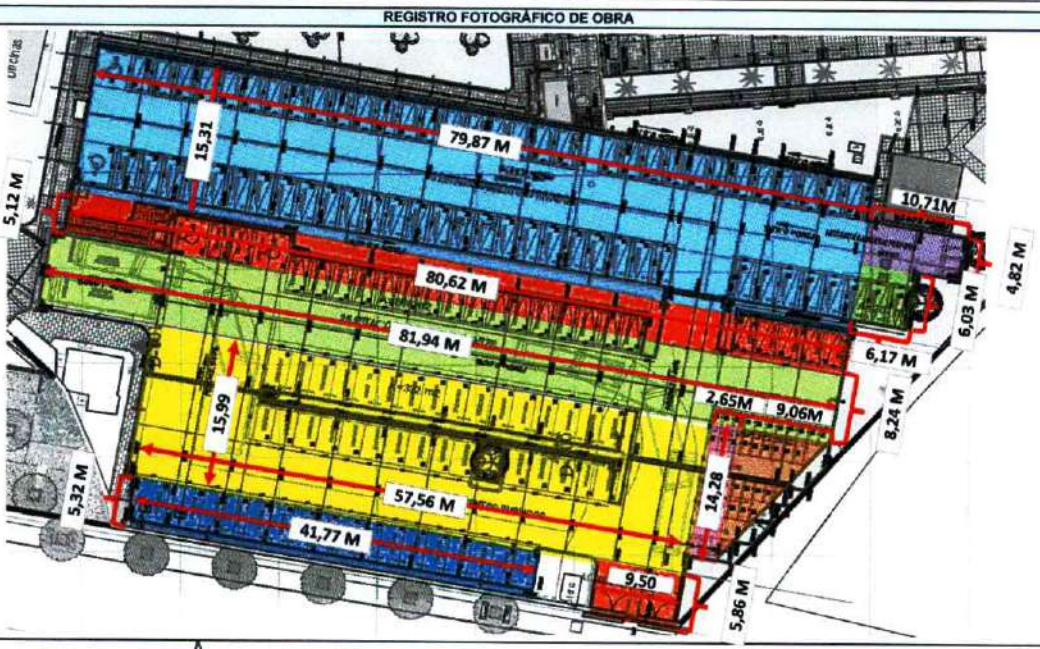

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79656147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PEATONALES					
ES UN (1) AREA DE	5,58		94,90	1,00	529,54
ES UN (1) AREA DE	4,05		42,74	1,00	173,10
MENOS SIETE (7) AREAS DE PEDESTALES	1,20		1,00	-7,00	-8,40
ES UN (1) AREA DE	6,98		50,30	1,00	351,09
MENOS SIETE (7) AREAS DE PEDESTALES	1,20		1,00	-7,00	-8,40
ES UN (1) AREA DE	6,40		31,00	1,00	198,40
ES UN (1) AREA DE	2,30		5,30	1,00	12,19
ES UN (1) AREA DE	1,75		20,70	1,00	36,23
ES UN (1) AREA DE	4,30		43,71	1,00	187,95
ES UN (1) AREA DE (b*h)/2	5,00	4,30		1,00	10,75
ES UN (1) AREA DE	2,41		2,97	1,00	7,16
VIENEN:	12.426,32			**SUBTOTAL**	**1.489,61**
PASAN:	**13.915,93**			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** representan las cantidades a cobrar en la presente acta parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

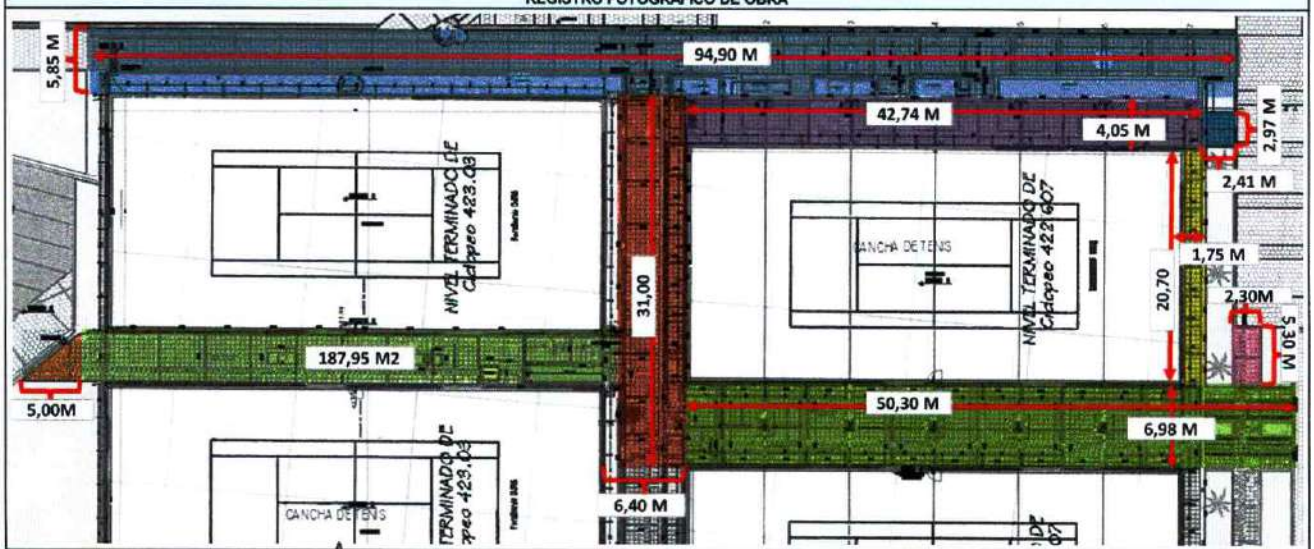

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507 2000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PEATONALES					
ES UN (1) AREA DE	2,20		44,13	1,00	97,09
ES UN (1) AREA DE	6,08		7,24	1,00	44,02
ES UN (1) AREA DE	5,52		3,09	1,00	17,06
ES UN (1) AREA DE	41,00		4,59	1,00	188,19
MENOS SIETE (7) AREAS DE PEDESTALES	1,20		1,00	-7,00	-8,40
ES UN (1) AREA DE	1,90		45,35	1,00	86,17
ES UN (1) AREA DE	5,95		25,40	1,00	151,13
ES UN (1) AREA DE	3,00		2,30	1,00	6,90
ES UN (1) AREA DE	3,40		2,30	1,00	7,82
ES UN (1) AREA DE	2,68		2,99	1,00	8,01
ES UN (1) AREA DE	2,30		22,29	1,00	51,27
ES UN (1) AREA DE	1,77		20,70	1,00	36,64
VIENEN:	13.915,93			**SUBTOTAL**	**685,90**
PASAN:	**14.601,83**			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** representan las cantidades a cobrar en la presente acta parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

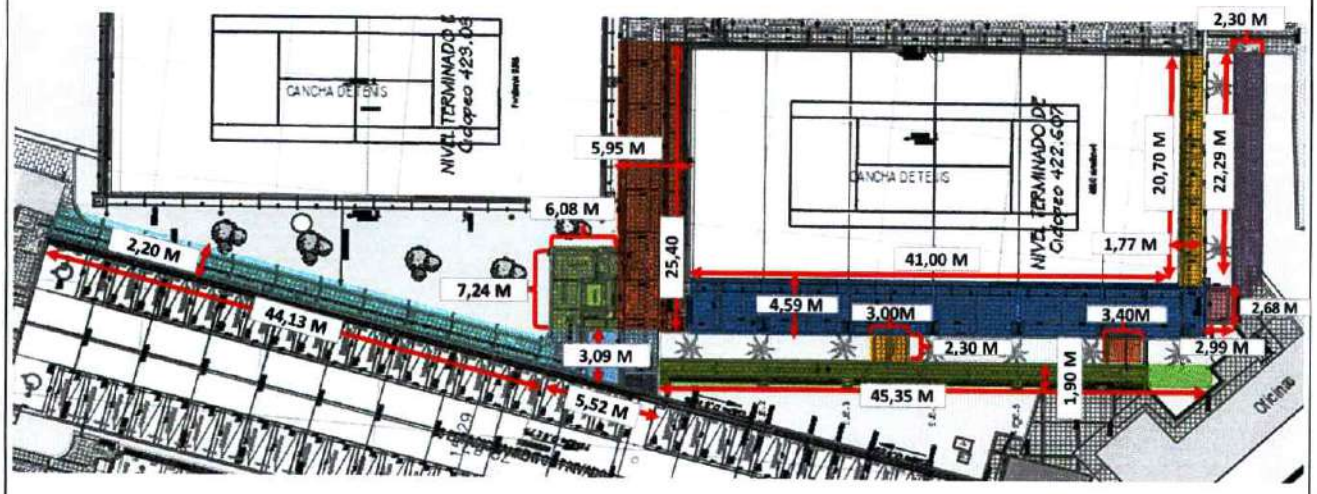

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7965047

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PEATONALES					
ES UN (1) AREA DE	859,93			1,00	859,93
ES UN (1) AREA DE	14,69			1,00	14,69
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
VIENEN:	14.713,34			**SUBTOTAL**	**874,62**
PASAN:	**15.587,96**			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** representan las cantidades a cobrar en la presente acta parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

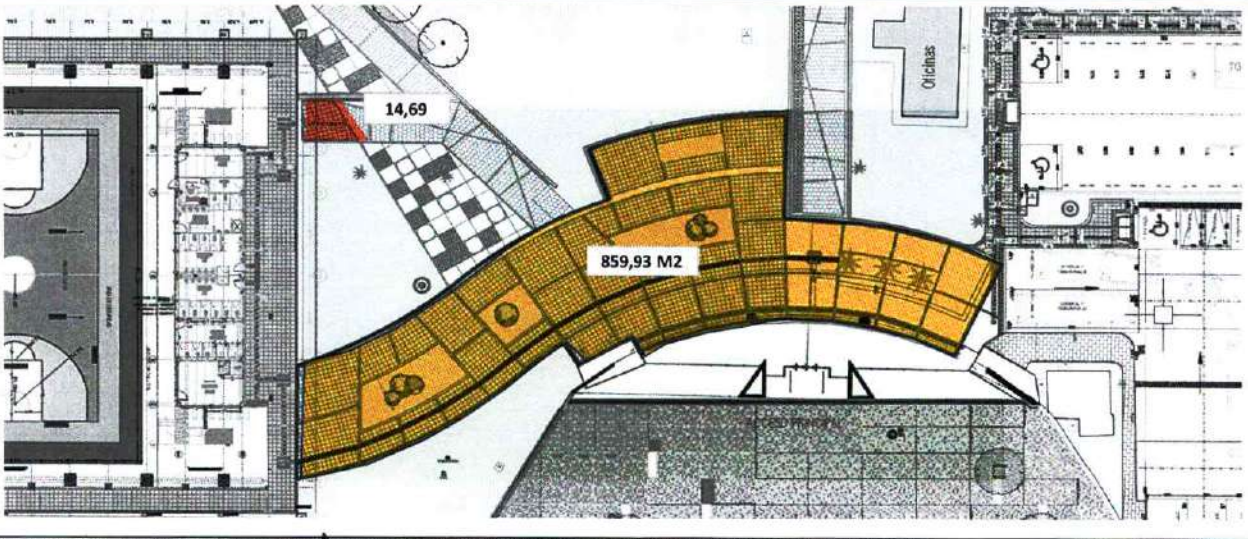

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-70650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 252020090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PEATONALES					
ES UN (1) AREA DE	3,18		20,50	1,00	65,19
					0,00
	AREA	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	
ES UN (1) AREA DE	6,30			1,00	6,30
ES UN (1) AREA DE	20,86			1,00	20,86
ES UN (1) AREA DE	10,16			1,00	10,16
ES UN (1) AREA DE	9,00			1,00	9,00
VIENEN:	14.601,83			**SUBTOTAL**	111,51
PASAN:	14.713,34			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** representan las cantidades a cobrar en la presente acta parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

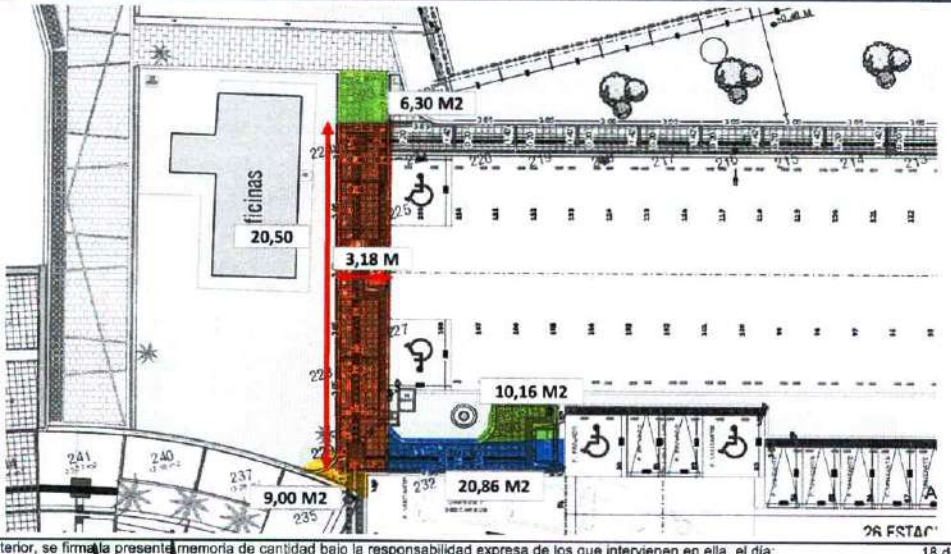

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PEATONALES					
ES UN (1) AREA DE	143,79			1,00	143,79
ES UN (1) AREA DE	147,19			1,00	147,19
VIENEN:	15.587,96			**SUBTOTAL**	**290,98**
PASAN:	**15.878,94**			**TOTAL**	**15.878,94**

OBSERVACIONES:

1. **Pagos Anteriores:** Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 1.
2. **Cobro Actual:** Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**15.878,94**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**15.878,94**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**8.926,89**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**6.952,05**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

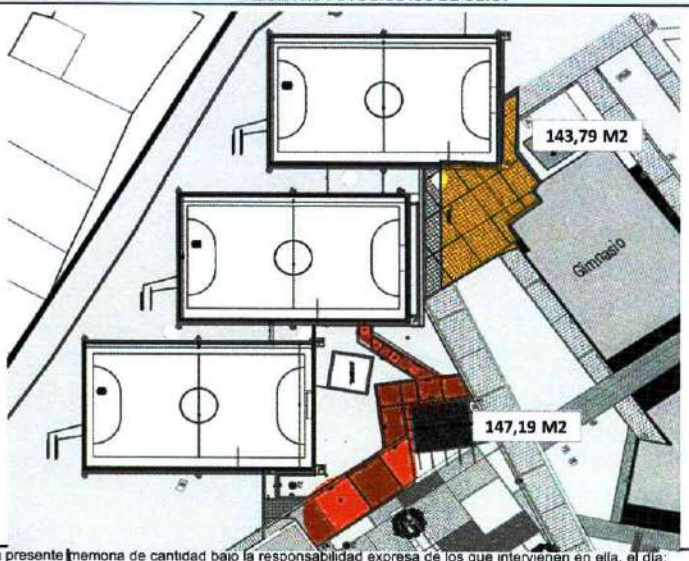

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memona de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79688147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



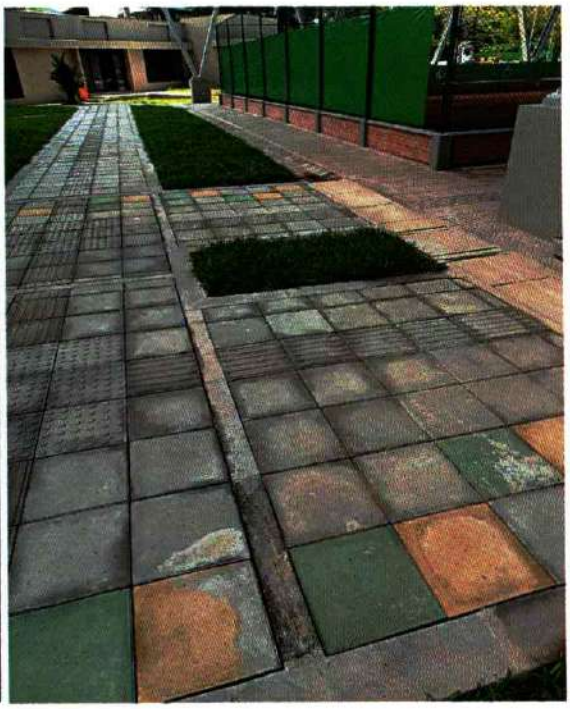

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072090-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

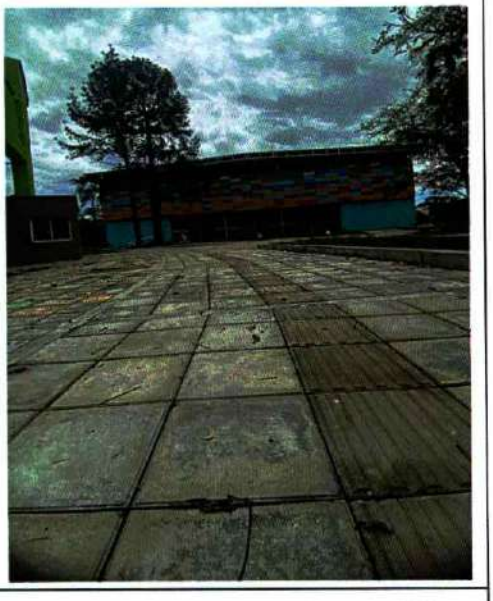Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-78650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**	**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**M3**
NP1.4	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	TOTAL M3	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Cantidad total ítem 3,1	1670,42			1,00	1.670,42
ITEM 3.1 (EXC. MEC. CIM. BASKETH) (cantidad pagada Parcial 02)	1043,01			1,00	1.043,01
SALDO PENDIENTE POR RELACIONAR ITEM 3.1 EN PRESENTE PARCIAL No. 07					627,41
ITEM 3.2 (EXC. MEC. CIM. BASKETH) (cantidad pagada Parcial 02)	89,07			1,00	89,07
ITEM 14.1 (EXC. MEC. CIM. CANCHA TENNIS) (cantidad pagada Parcial 02)	1537,76			1,00	1.537,76
ITEM 14.2 (EXC. MANUAL CIM. CANCHA TENNIS) (cantidad pagada Parcial 02)	64,92			1,00	64,92
ITEM 19,1 (EXCAVACIÓN CANCHAS DE TENNIS) (cantidad pagada Parcial 02)	609,30			1,00	609,30
				SUBTOTAL	3.344,06
			FACTOR EXPANSIÓN	20%	668,81
				TOTAL COBRADO EN PARCIAL No. 02	4.012,87
Cantidad total ítem 20,1	237,81			1,00	237,81
Cantidad total ítem 21,1	1885,23			1,00	1.885,23
Cantidad total ítem 22,5	5,40			1,00	5,40
Cantidad total ítem 23,64	228,08			1,00	228,08
Cantidad total ítem 23,91	107,89			1,00	107,89
Cantidad total ítem 24,2	20,82			1,00	20,82
Cantidad total ítem 24,33	425,76			1,00	425,76
Cantidad total ítem 24,49	28,84			1,00	28,84
Cantidad total ítem 25,2	35,31			1,00	35,31
Cantidad total ítem 25,27	195,64			1,00	195,64
Cantidad total ítem 26,2	281,77			1,00	281,77
Cantidad total ítem 26,32	1652,89			1,00	1.652,89
Cantidad total ítem 27,2	51,47			1,00	51,47
Cantidad total ítem 27,35	205,87			1,00	205,87
				SUBTOTAL	9.334,25
			FACTOR EXPANSIÓN	20%	1.866,85
PASAN:			**SUBTOTAL**		**11.201,10**
			TOTAL		**11.201,10**

OBSERVACIONES:

1. **Pagos Anteriores:** Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 2.
2. **Cobro Actual:** Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
3. **Ver Anexo:** Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar certificado ZOOME. Este documento contiene la información a cobrar.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**11.201,10**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**11.201,10**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**4.012,87**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**7.188,23**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cálculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25502-200079650 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 252021090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma


Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
NP1.4	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

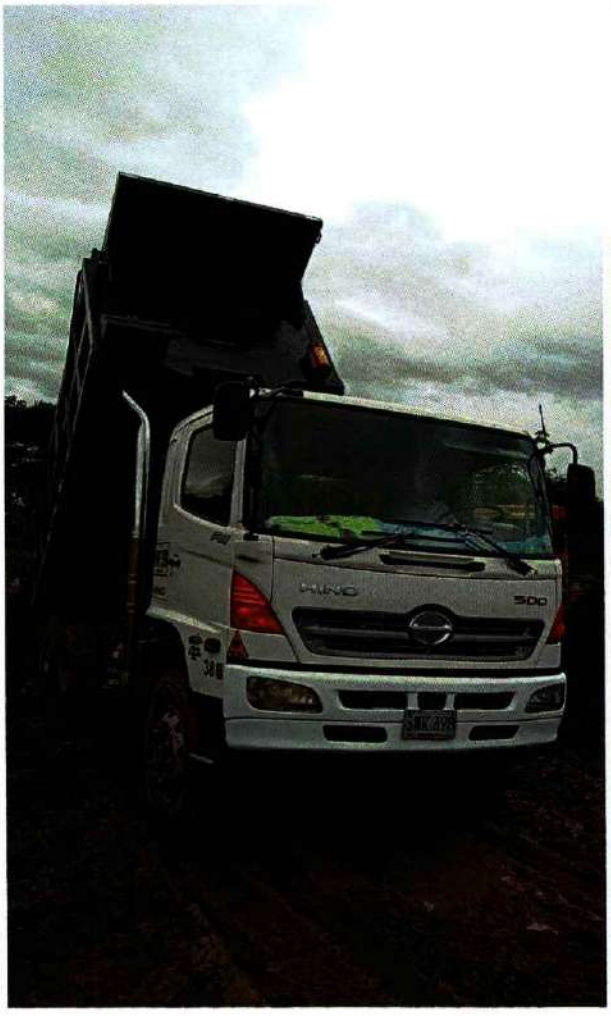



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**VJ**
NP1.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	TOTAL M3	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MATERIAL DE EXCAVACIÓN					
Cantidad total ítem 3,1	1670,42			1,00	1.670,42
ITEM 3.1 (EXC. MEC. CIM. BASKETH) (cantidad pagada Parcial 02)	1043,01			1,00	1.043,01
A	SALDO PENDIENTE POR RELACIONAR ITEM 3.1 EN PRESENTE PARCIAL No. 08				627,41
B	FACTOR EXPANSIÓN			20%	125,48
ITEM 3.2 (EXC. MEC. CIM. BASKETH) (cantidad pagada Parcial 02)	89,07			1,00	89,07
ITEM 14.1 (EXC. MEC. CIM. CANCHA TENNIS) (cantidad pagada Parcial 02)	1537,76			1,00	1.537,76
ITEM 14.2 (EXC. MANUAL CIM. CANCHA TENNIS) (cantidad pagada Parcial 02)	64,92			1,00	64,92
ITEM 19,1 (EXCAVACIÓN CANCHAS DE TENNIS) (cantidad pagada Parcial 02)	609,30			1,00	609,30
A				SUBTOTAL (M3)	3.344,06
B		FACTOR EXPANSIÓN		20,00%	668,81
				SUBTOTAL	4.012,87
(A+B+C+D)/7				VIAJE / 7M3	573,27
Cantidad total ítem 20,1	237,81			1,00	237,81
Cantidad total ítem 21,1	1885,23			1,00	1.885,23
Cantidad total ítem 22,5	5,40			1,00	5,40
Cantidad total ítem 23,64	228,08			1,00	228,08
Cantidad total ítem 23,91	107,89			1,00	107,89
A				SUBTOTAL (M3)	2.464,41
B		FACTOR EXPANSIÓN		20,00%	492,88
ESCOMBROS					
Cantidad total ítem 2.1	480,42			1,00	480,42
ITEM 2.1 (cantidad pagada Parcial 02)	474,61			1,00	474,61
	SALDO PENDIENTE POR RELACIONAR ITEM 2.1 EN PRESENTE PARCIAL No. 07				5,81
Cantidad total ítem 2.4	405,63			1,00	405,63
ITEM 2.4 (cantidad pagada Parcial 02)	260,67			1,00	260,67
	SALDO PENDIENTE POR RELACIONAR ITEM 2.4 EN PRESENTE PARCIAL No. 07				144,96
Cantidad total ítem NP2.17 (cantidad pagada Parcial 02)	55,01			1,00	55,01
Cantidad total ítem NP2.18 (cantidad pagada Parcial 02)	27,04			1,00	27,04
Cantidad total ítem NP2.19 (cantidad pagada Parcial 02)	261,89			1,00	261,89
Cantidad total ítem NP2.20 multiplicado por 0,15m	12,66			1,00	12,66
ITEM NP2.20 (cantidad pagada Parcial 02)	5,00			1,00	5,00
ITEM NP2.20 (cantidad pagada Parcial 02)	7,13			1,00	7,13
	SALDO PENDIENTE POR RELACIONAR ITEM NP2.20 EN PRESENTE PARCIAL No. 07				0,53
Cantidad total ítem NP2.21 (cantidad pagada Parcial 02)	225,66			1,00	225,66
Cantidad total ítem NP2.22	86,59			1,00	86,59
Cantidad total ítem NP2.22 (cantidad pagada Parcial 02)	74,39			1,00	74,39
	SALDO PENDIENTE POR RELACIONAR ITEM NP2.22 EN PRESENTE PARCIAL No. 07				12,20
Cantidad total ítem NP2.23 multiplicado por 0,15m	88,95			1,00	88,95
Cantidad total ítem NP2.23 (cantidad pagada Parcial 02)	30,84			1,00	30,84
	SALDO PENDIENTE POR RELACIONAR ITEM NP2.23 EN PRESENTE PARCIAL No. 07				58,11
C				SUBTOTAL (M3)	1.422,24
D		FACTOR EXPANSIÓN		30,00%	426,67
A+B+C+D				M3	1.848,91
(A+B+C+D)/7				VIAJE / 7M3	264,13
				TOTAL COBRADO DE VIAJE / 7 M3 EN PARCIAL No. 02	837,40
C				SUBTOTAL (M3)	221,61
D		FACTOR EXPANSIÓN		30,00%	66,48
A+B+C+D				M3	3.998,27
(A+B+C+D)/7				TOTAL A COBRAR DE VIAJE / 7 M3 EN PRESENTE PARCIAL No. 07	571,18
PASAN:				SUBTOTAL	1.408,58
				TOTAL	1.408,58

OBSERVACIONES:

1. Pagos Anteriores: Las cantidades y textos en AZUL corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 2
2.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
3.Ver Anexo: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar certificado ZODME. Este documento contiene la información a cobrar

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	1.408,58
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.408,58
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	837,40
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	571,18
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cálculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 18 de agosto de 2025

Nombre: **ALVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650141

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND


Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND


Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 1920282149 CAU

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP1.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

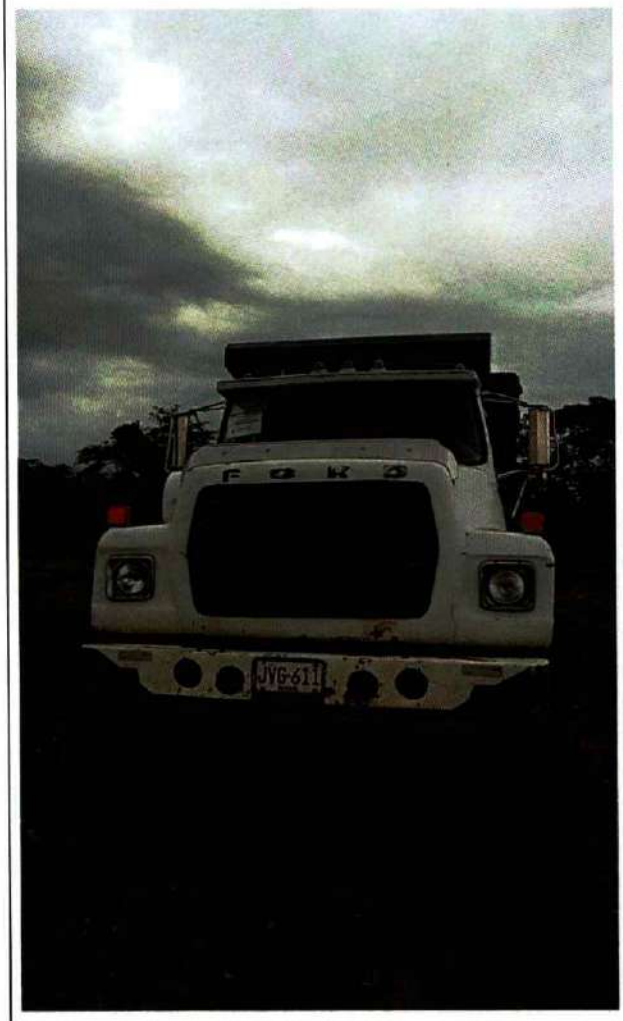

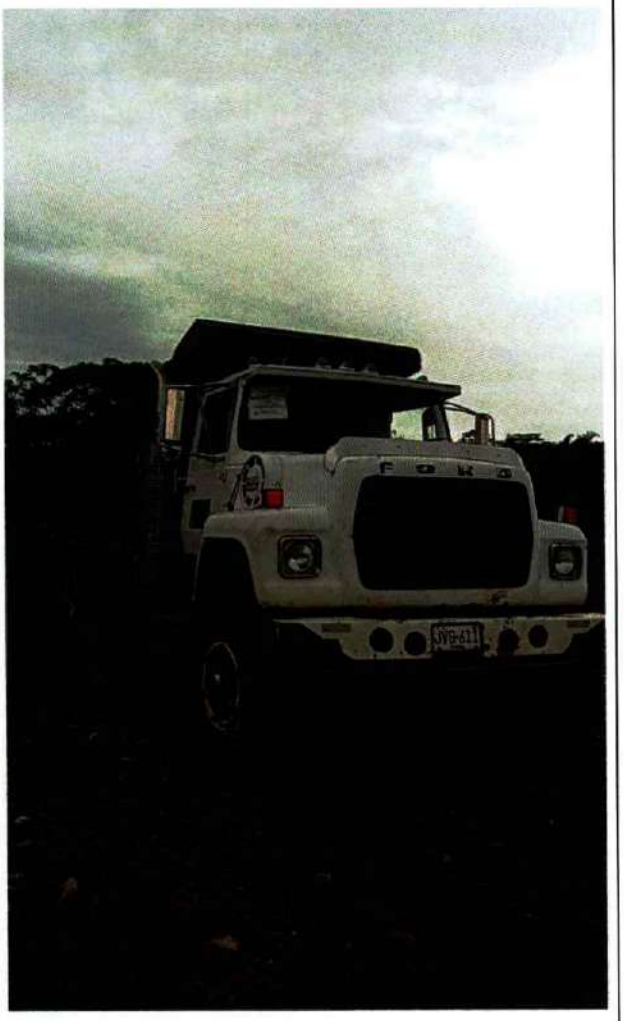

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

ZODME GUATIQUIA S.A.S.
NIT 901.313.682-5

CERTIFICA

Que la empresa **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS**, con NIT: 901.666.597 hizo disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, **RCD (DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN),** producto de la actividad de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles de otras actividades conexas complementarias o análogas que se generaron en el desarrollo del proyecto **"ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"** y se relacionan a continuación.

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD (DEMOLICIÓN)	7188,23 m^3 (Siete mil ciento ochenta y ocho con veintitrés metros cúbicos)
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD (DEMOLICIÓN)	3998,27 m^3 (Tres mil novecientos noventa y ocho con veintisiete metros cúbicos)

Esta disposición se realizó entre el 01 de mayo de 2025 al 15 de agosto de 2025, en la ZODME GUATIQUIA, ubicada en la ciudad de Villavicencio Departamento del Meta margen izquierda del rio Guatiquia, sector vanguardia y que se encuentra debidamente autorizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena "CORMACARENA", según los permisos otorgados, mediante oficios. No. PS-GJ.1.2.6.19.2837

La presente se expide en Villavicencio a los 15 días del mes de Agosto del año 2025

MAURICIO VELÁSQUEZ ZAPATA
Representante Legal
C.C N° 71.709.613

Vereda Vanguardia, sector La Playa, Villavicencio – Meta zodmeguatiquia@gmail.com
CEL 3503708354 – 3046027258

CAPITULO 2

DESMONTE Y DEMOLICIONES

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**	**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
2.2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
Placa 1	88.64			1.00	88.64
Placa 2	88.64			1.00	88.64
Placa 3	78.40			1.00	78.40
Placa 4	135.30			1.00	135.30
Placa 5	31.93			1.00	31.93
CAFETERIA PISCINA (A)	11.56		11.77	1.00	136.06
CAFETERIA CANCHAS SINTETICAS (B)	5.90		25.70	1.00	151.63
ESTRUCTURA CUBIERTA BAÑOS	5.4449			8.00	43.56
ESTRUCTURA CUBIERTA BAÑOS	0.044268			1.00	0.04
ANTIGUO SPA	9.65		19.81	1.00	191.17
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**945.37**
PASAN:				**TOTAL**	**945.37**


OBSERVACIONES:

1. **Pagos Anteriores:** Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 5.
2. **Cobro Actual:** Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
3. **Ver Plano:** Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (Los planos 1 al 09 de CAP.7) Estos planos contienen la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**945.37**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**945.37**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**945.33**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**0.04**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

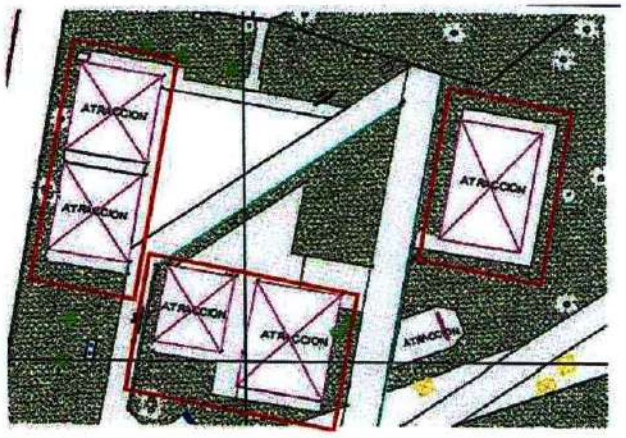

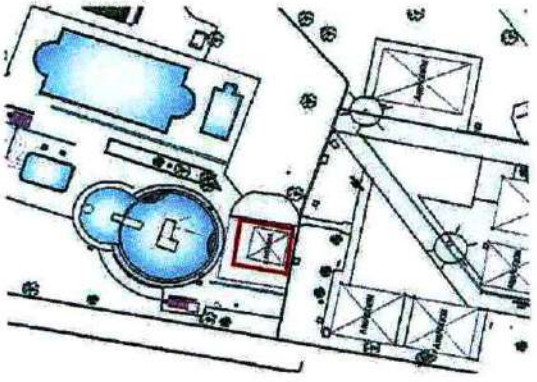

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507800079650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND


Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Iímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
2.2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

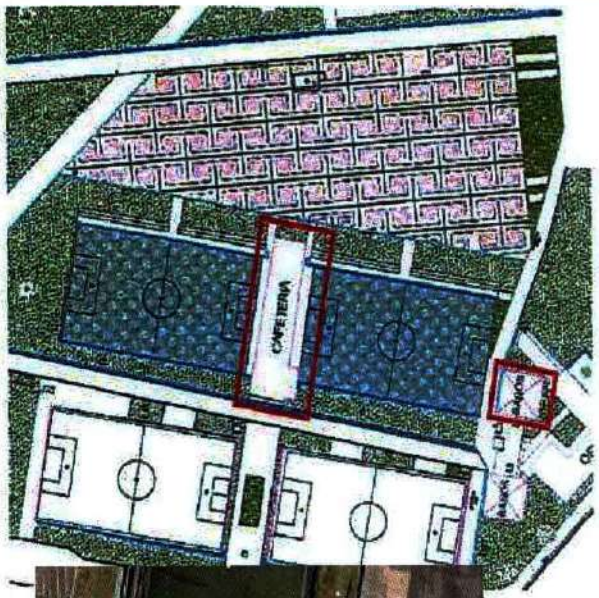







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A250720007960147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
2.3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
CUBIERTA CAFETERIA PISCINA	8.88		8.87	1.00	78.77
BAÑOS		5.445		4.00	21.78
BAÑOS		5.455		4.00	21.82
CAFETERIA EXTERNA	11.10	5.00		1.00	55.50
CUBIERTA CAFETERIA SINTETICA	5.90	25.70		1.00	151.63
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**329.50**
PASAN:				**TOTAL**	**329.50**


OBSERVACIONES:

1. **Pagos Anteriores:** Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 1 y 2.
2. **Cobro Actual:** Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
3. **Ver Planos:** Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (Los planos 1 al 09 de CAP.2) Estos planos contienen la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**329.50**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**329.50**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**307.68**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**21.82**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

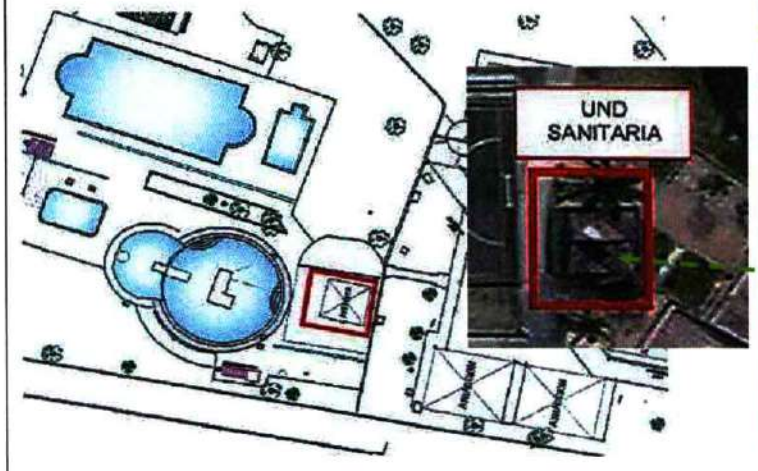

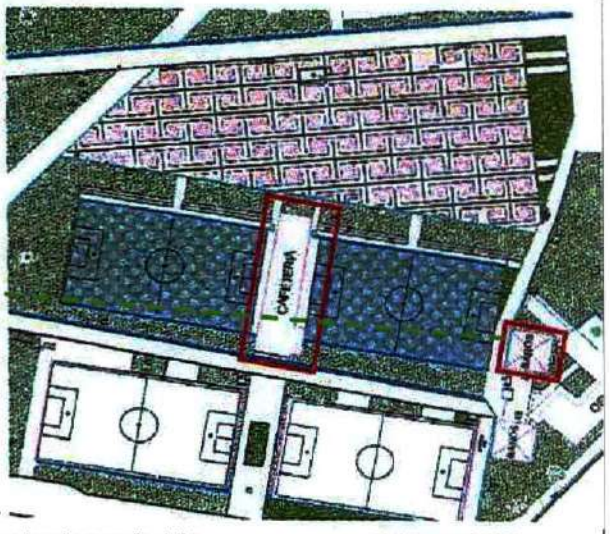

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507[illegible]

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio lírmpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M3**
2.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
CANCHAS SINTETICAS	19.20	0.12	31.90	1.00	73.50
CANCHAS SINTETICAS	19.15	0.12	32.15	1.00	73.88
CANCHAS MULTIPROPOSITO	19.60	0.12	31.96	1.00	75.17
CANCHAS MULTIPROPOSITO	19.20	0.12	31.96	1.00	73.64
CANCHAS MULTIPROPOSITO	0.40	0.12	31.96	1.00	1.53
PARQUEADERO	1539.21		0.07	1.00	107.74
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**405.46**
PASAN:				**TOTAL**	**405.46**


OBSERVACIONES:

1. Pagos Anteriores: Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 5.
2.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
3.Ver Planos: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (Los planos 1 al 09 de CAP.2) Estos planos contienen la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**405.46**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**405.46**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**403.93**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**1.53**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



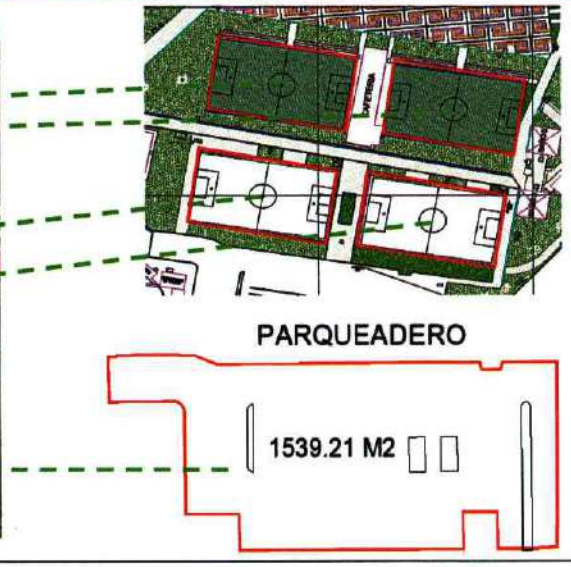

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79550147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNY ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio limpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025	

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
NP2.6	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CAFETERIA PISCINA					
PUERTA				4,00	4,00
TAQUILLA CANCHA SINTETICAS					
PUERTA ACCESO				1,00	1,00
PUERTA TAQUILLA				1,00	1,00
CAFETERIA SINTETICA					
PUERTA				1,00	1,00
UNIDAD SANITARIA					
PUERTA				2,00	2,00
CUARTO ELECTRICO					
PUERTA				1,00	1,00
EDIFICACION ROSADA					
				2,00	2,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	12,00
				TOTAL	12,00

OBSERVACIONES:

1. **Pagos Anteriores:** Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 2.
2. **Cobro Actual:** Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
3. **Ver Plano:** Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (Los planos 1 al 09 de CAP.2) Estos planos contienen la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	13,00
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	12,00
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	10,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	2,00
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cálculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 18/08/2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2502000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Iímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
NP2.11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
CAFETERIA PISCINA					
SANITARIOS				1.00	1.00
BAÑOS CANCHAS 1					
SANITARIOS				3.00	3.00
BAÑOS EDIFICACION ROSADA (ANTIGUO SPA)					
SANITARIOS				2.00	2.00
SANITARIOS				1.00	1.00
VIENEN:				SUBTOTAL	7.00
PASAN:				TOTAL	7.00

OBSERVACIONES:

1. Pagos Anteriores: Las cantidades y todos en AZUL corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 2 y 5.
2.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	7.00
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	7.00
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	6.00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	1.00
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Iimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP2.15	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PISCINAS				5.00	5.00
JUEGOS MECANICOS				3.00	3.00
GRAMOQUIN				8.00	8.00
CANCHAS				4.00	4.00
PARQUEADERO				4.00	4.00
CANCHA FUTBOL 5				3.00	3.00
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**27.00**
PASAN:				**TOTAL**	**27.00**

OBSERVACIONES:

1. **Pagos Anteriores:** Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 2.
2. **Cobro Actual:** Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
3. **Ver Plano:** Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (Los planos 1 al 09 de CAP.2) Estos planos contienen la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		**27.00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		**27.00**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		**20.00**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	**PARCIAL No. 07**	**7.00**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

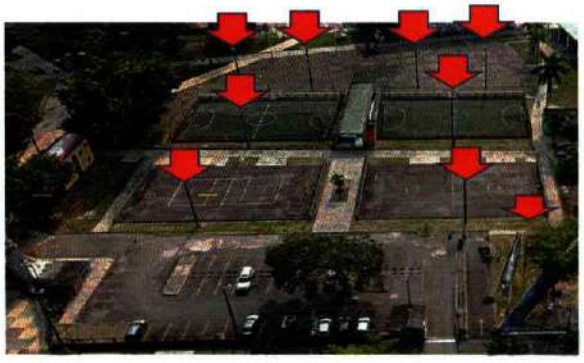



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Iimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UND**
NP2.15	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

FUTBOL 5



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Iímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M3**
NP2.22	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
cafeteria piscinas	**AREA**				
columnas	0.063		2.47	12.00	1.87
viga area y cimentacion	0.063		35.52	2.00	4.48
cafeteria cancha sintetica	**ANCHO**				
columna 1	1.00	0.78	2.98	2.00	4.65
columna 2	0.63	0.50	2.98	1.00	0.94
baños 1 cancha de tennis	**ANCHO**				
Placa entrepiso	6.54	0.12	6.06	1.00	4.76
Descuento Vano Superior	3.30	0.12	3.30	-1.00	-1.31
Columnas	0.25	0.25	1.99	2.00	0.25
carcamo longitudinal cancha de futbol sintetica	**ANCHO**				
	1.41	0.08	70.00	3.00	23.69
estructura cimentacion muro antepecho piscinas	**ANCHO**				
	0.30	0.45	46.14	1.00	6.23
graderias cancha sintetica					
Placa	0.65	0.08	15.12	8.00	6.29
Pedestal 1	0.66	0.40	1.24	32.00	10.48
Pedestal 2	0.85	0.40	0.65	32.00	7.07
Pedestal graderia	0.59	0.38	0.80	14.00	2.51
Pedestal graderia	0.49	0.38	0.59	14.00	1.54
antiguo spa					
columnas edificacion rosa	0.50	0.25	4.80	10.00	6.00
Viga canal	1.78	0.10	4.38	2.00	1.56
Viga canal	1.78	0.10	15.67	2.00	5.58
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**86.59**
PASAN:				**TOTAL**	**86.59**

OBSERVACIONES:

1. Pagos Anteriores: Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 2 y 5.
2.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
3.Ver Plano: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (Los planos 1 al 09 de CAP.2) Estos planos contienen la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**86.59**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**86.59**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**81.01**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**5.58**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**				
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**				**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**				**M3**
NP2.22	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL				
DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA











Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850197

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-990337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
NP2.23	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
bloque cafeteria sintetica					
Muro a	8.00	3.28		1.00	26.24
Muro a1	2.14	2.98		1.00	6.38
Muro a2	1.84	2.98		1.00	5.48
Muro a3	2.64	2.98		1.00	7.87
Muro a4	1.20	2.98		1.00	3.58
Muro a5	5.19	3.28		1.00	17.02
Muro a6	3.04	2.98		1.00	9.06
Muro a7	2.15	2.98		1.00	6.41
Muro a8	2.30	2.98		1.00	6.85
Muro a9	2.96	2.98		1.00	8.82
Muro a10	2.36	2.98		1.00	7.03
Muro b	2.92	3.28		1.00	9.58
Muro b1	1.55	2.98		1.00	4.62
Muro c	5.95	3.28		1.00	19.52
bloque cafeteria sintetica					0.00
Muro c1	0.52	2.98		1.00	1.55
Muro c2	0.53	2.98		1.00	1.58
Muro d	2.92	3.28		1.00	9.58
baños 1 cancha de tennis					0.00
muro perimetro	21.70	3.27		1.00	70.96
muros internos	17.50	1.99		1.00	34.83
EDIFICACION ROSADA (ANTIGUO SPA)					
MUROS DIVISORIOS INTERNOS					
BAÑO		0.82	2.33	1.00	1.91
		0.64	2.33	1.00	1.49
		2.26	2.33	1.00	5.27
		1.44	2.33	2.00	6.71
		1.70	2.33	1.00	3.96
SAUNA		3.13	2.33	1.00	7.29
		1.49	2.33	1.00	3.47
		0.99	2.33	1.00	2.31
DUCHAS		0.92	2.33	1.00	2.14
CUARTO 1		2.22	2.33	1.00	5.17
		1.08	2.33	1.00	2.52
		2.28	2.33	1.00	5.31
		1.08	2.33	1.00	2.52
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**307.03**
PASAN:	**307.03**			**TOTAL**	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Iímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP2.23	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
EDIFICACION ROSADA (ANTIGUO SPA)					
MUROS DIVISORIOS INTERNOS					
CUARTO 2		0.81	2.33		1.89
		2.16	2.33		5.03
BAÑO		1.41	2.33		3.29
		0.18	2.33		0.42
BODEGA		3.13	2.33		7.29
MURO DIVISORIO		4.19	2.33		9.76
		2.45	2.33		5.71
		11.28	2.33		26.28
FACHADA EXTERIOR					
FACHADA FRONTAL					
MODULO 1		4.70	4.80		22.56
MODULO 2		4.70	4.80		22.56
MODULO 3		4.70	4.80		22.56
MODULO 4		4.70	4.80		22.56
DESCUENTOS					
PUERTA		3.60	2.25	-1.00	-8.10
VENTANAS		2.00	0.45	-18.00	-16.20
FACHADA POSTERIOR					
MODULO 1		4.70	5.00		23.50
MODULO 2		4.70	5.00		23.50
MODULO 3		4.70	5.00		23.50
MODULO 4		4.70	5.00		23.50
DESCUENTOS					
VENTANAS		2.00	0.45	-10.0	-9.00
FACHADA LATERAL DERECHA		9.17	4.80		44.02
		7.01	0.20		1.40
DESCUENTOS					
PUERTA		0.77	2.00	-1.0	-1.54
VENTANAS		2.00	0.45	-4.0	-3.60
		2.00	0.84	-2.0	-3.36
FACHADA LATERAL IZQUIERDA		9.17	4.304		39.47
		9.17	0.496		4.55
		7.01	0.20		1.40
DESCUENTOS					
VENTANAS		2.00	0.45	-4.0	-3.60
		2.00	0.84	-2.0	-3.36
VIENEN:	307.03			**SUBTOTAL**	**285.99**
PASAN:				**TOTAL**	**593.02**

OBSERVACIONES:

1. Pagos Anteriores: Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en la Parcial No. 2 y 5.
2.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
3.Ver Planos: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (Los planos 1 al 09 de CAP.2) Estos planos contienen la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**593.02**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**593.02**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**588.47**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**4.55**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7865014?

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-09033? CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Iímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	M2
NP2.23	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

SPA



CAFETERÍA CANCHAS SINTERICAS



UNIDAD SANITARIA CANCHA MULTIFUNCIONAL





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200879660147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Ímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

CAPITULO 3

CANCHA DE BALONCESTO. EXCAVACIONES Y RELLENOS

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
BALONCESTO					
CIMENTACIÓN					
EJE A DEL 1 AL 12	3,30	4,50	2,15	12,00	383,13
EJE I DEL 1 AL 12	3,30	4,50	2,15	12,00	383,13
EJE A DEL 2´ AL 12´	1,60	1,60	2,05	8,00	41,96
EJE I DEL 2´ AL 12´	1,60	1,60	2,05	8,00	41,96
EJE 1´´´ DEL I´´ AL A´´	2,00	2,00	2,05	6,00	49,21
EJE 12´´´ DEL I´´ AL A´´	2,00	2,00	2,05	6,00	49,21
AREA PLACA			VOLUMEN		
			886,59	1,00	886,59
EJE A DEL 1 AL 12 - TRASLAPO	3,30	4,50	-0,37	12,00	-65,93
EJE I DEL 1 AL 12 - TRASLAPO	3,30	4,50	-0,37	12,00	-65,93
EJE A DEL 2´ AL 12´ - TRASLAPO	1,60	1,60	-0,37	8,00	-7,58
EJE I DEL 2´ AL 12´ - TRASLAPO	1,60	1,60	-0,37	8,00	-7,58
EJE 1´´´ DEL I´´ AL A´´ - TRASLAPO	2,00	2,00	-0,37	6,00	-8,88
EJE 12´´´ DEL I´´ AL A´´ - TRASLAPO	2,00	2,00	-0,37	6,00	-8,88
VIENEN:				SUBTOTAL	1.670,41
PASAN:				TOTAL	1.670,41

OBSERVACIONES:

1. Pagos Anteriores: se habian cobrado en actas anteriores 1.661,53 M3
2.Cobro Actual: En la presente acta parcial 07 se estan cobrando 8,88 M3, con lo cual se llega a un acumulado de 1.670,41M3 con la cual se llega a un acumulado total cobrado del 100%.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	1.670,41
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.670,41
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	1.661,53
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	8,88
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

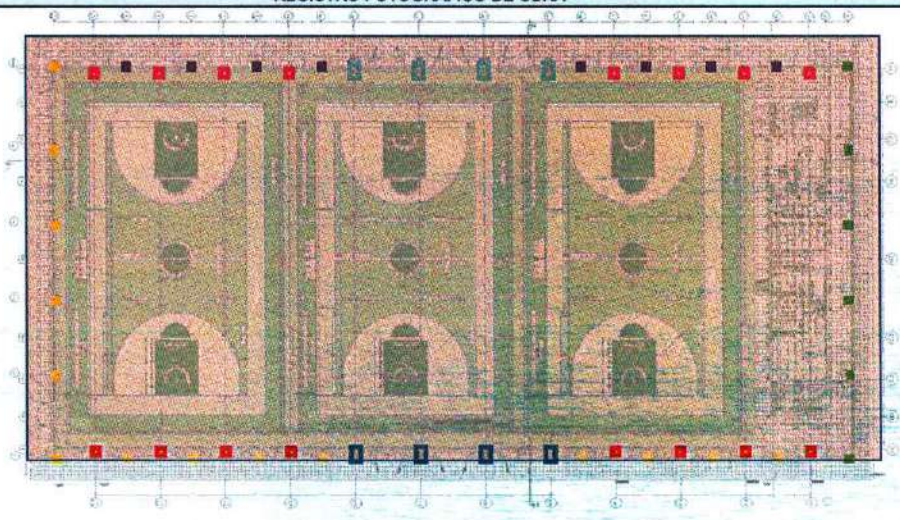

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND


Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio limpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**		**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**M3**
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

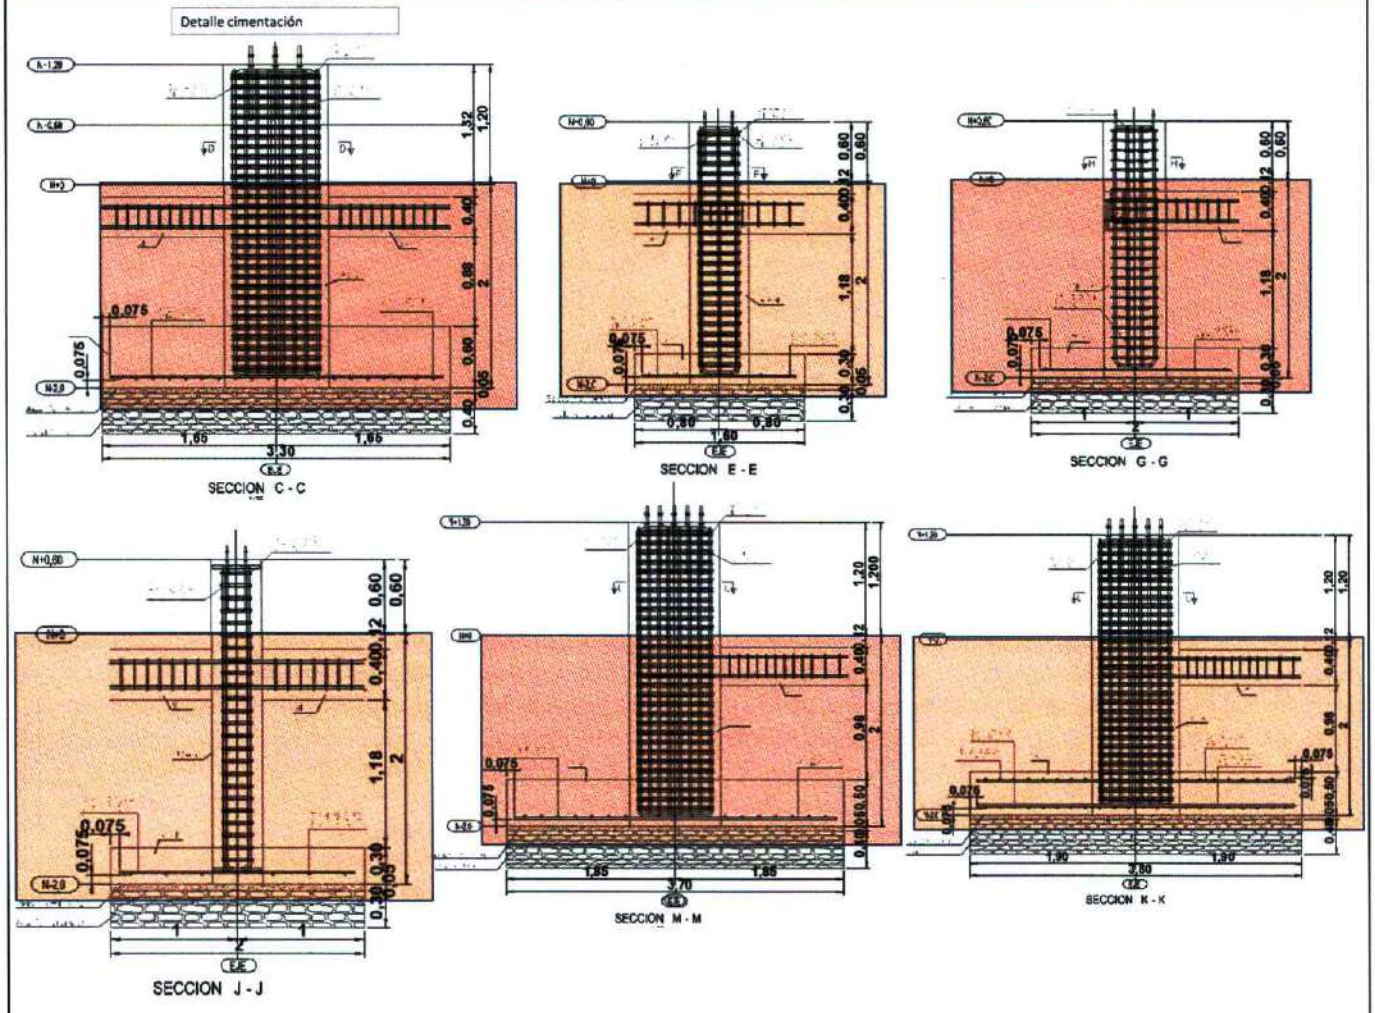

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000179650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio límpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**	**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**M3**
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507-000-7955014

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio limpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

CAPITULO 6
ESTRUCTURAS EN ACERO.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	KG
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
	PLANO	PESO/KG	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO						
Malla electrosoldada 15*15 6mm	1EG	2,99	41,15	74,90	2,00	18431,17
Traslapo					10,00%	1843,12
Descuento pedestales	1EG	2,99	1,00	1,20	-7,00	-25,12
Descuento pedestales	1EG	2,99	1,00	1,20	-7,00	-25,12
Descuento pedestales	1EG	2,99	1,00	1,55	-4,00	-18,54
Descuento pedestales	1EG	2,99	1,00	1,55	-4,00	-18,54
Descuento pedestales	1EG	2,99	0,55	0,60	-7,00	-6,91
Descuento pedestales	1EG	2,99	0,55	0,60	-9,00	-8,88
Descuento pedestales	1EG	2,99	0,60	0,40	-2,00	-1,44
Descuento pedestales	1EG	2,99	0,60	0,40	-2,00	-1,44
GRADERIAS						
Malla electrosoldada 15*15 5mm	1EG	2,52	1,80	27,33	2,00	247,94
Malla electrosoldada 15*15 5mm	1EG	2,52	0,85	27,33	8,00	468,33
Malla electrosoldada 15*15 5mm	1EG	2,52	1,64	1,88	2,00	15,54
Malla electrosoldada 15*15 5mm	1EG	2,52	1,62	1,43	2,00	11,67
VIENEN:					SUBTOTAL	20.911,78
PASAN:					TOTAL	20.911,78


OBSERVACIONES:


1. Al verificar la sumatoria real de las cantidades se verificó que la cantidad real ejecutada fue de 20.911,78KG, 0.01KG menos de la cantidad acumulada que se había cobrado en las anteriores parciales que es de 20.911,79KG


CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		21.157,73
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		20.911,78
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		20.911,79
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	PARCIAL No. 07	-0,01
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		245,95

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





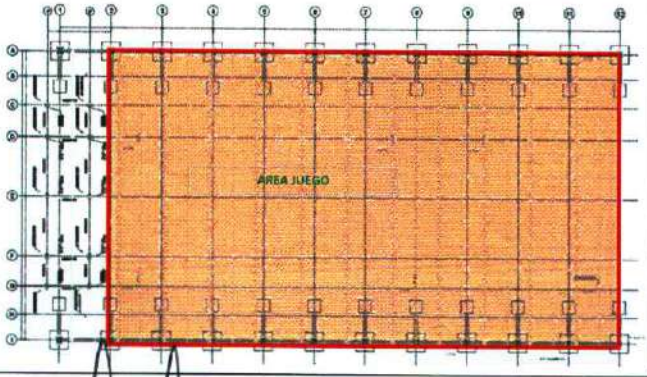

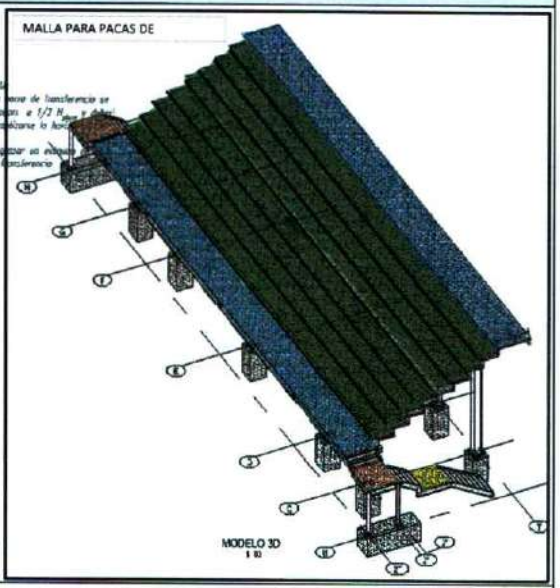

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2502-2000-7965014

Firma

Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS EN ACERO**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**KG**
6,2	**MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

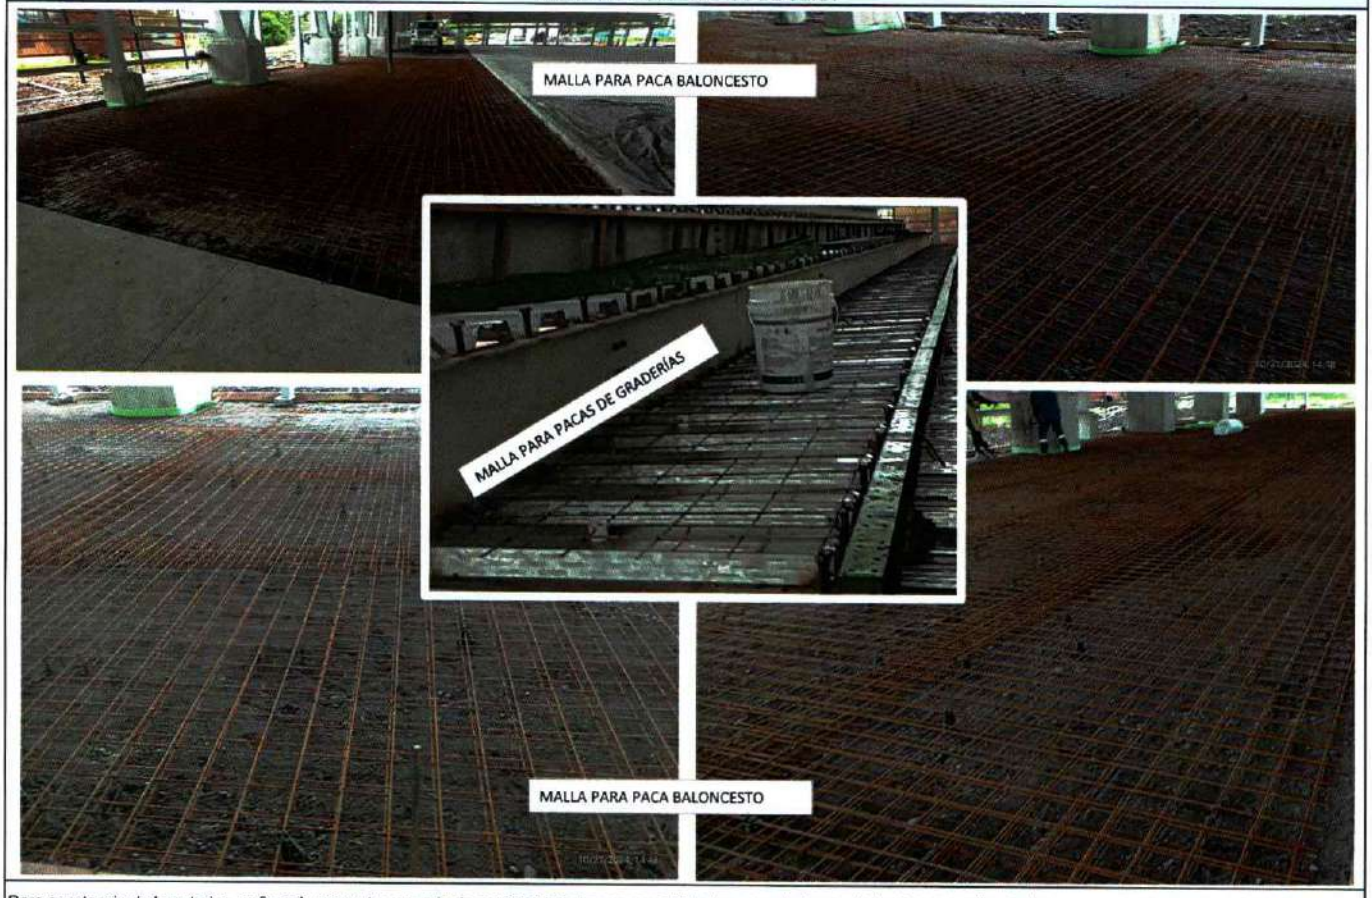

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090937 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 15 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

CAPITULO 7

CANCHA DE BALONCESTO. CUBIERTA Y FACHADA.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**CUBIERTA Y FACHADA**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
NP7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUZINC TIPO CELOSIA PARA CONTROL SOLAR		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	AREA	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
INFERIOR					
ORIENTE Y OCCIDENTE	0,49		32,49	2,00	31,84
	0,49		32,48	2,00	31,83
INFERIOR					
NORTE	0,49		23,75	1,00	11,64
VIENEN:				**SUBTOTAL**	75,31
PASAN:				**TOTAL**	75,31

OBSERVACIONES:
1.Ver Plano: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (Plano 01 de fachada baloncesto) Este documento contiene la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	75,31
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	75,31
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	63,67
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	11,64
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

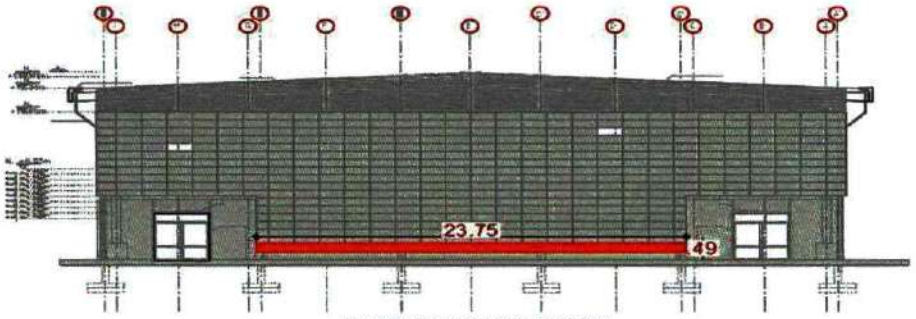

FACHADA TRANSVERSAL DERECHA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79950147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CUBIERTA Y FACHADA**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUZINC TIPO CELOSIA PARA CONTROL SOLAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507-000-7650147

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CUBIERTA Y FACHADA**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUZINC TIPO CELOSIA PARA CONTROL SOLAR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN ALTURAS.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	BASE	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
Fachada principal eje C - D	5,12	2,54		2,00	13,00
VIENEN:				SUBTOTAL	13,00
PASAN:	13,00			TOTAL	13,00


OBSERVACIONES:


CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	87,66
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	13,00
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA CUBIERTA Y FACHADA	13,00
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	74,66

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

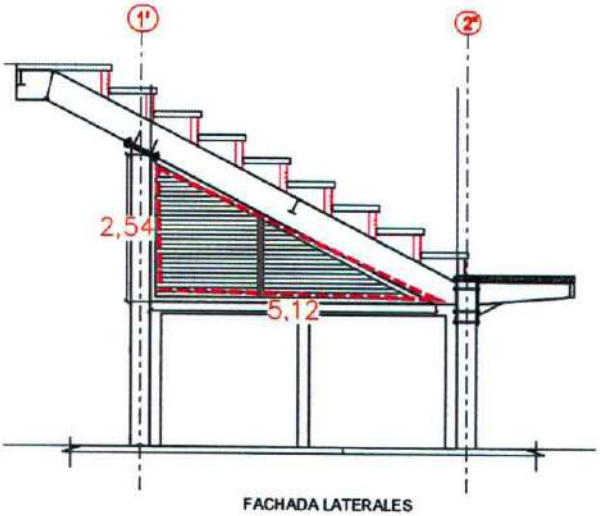

FACHADA LATERALES

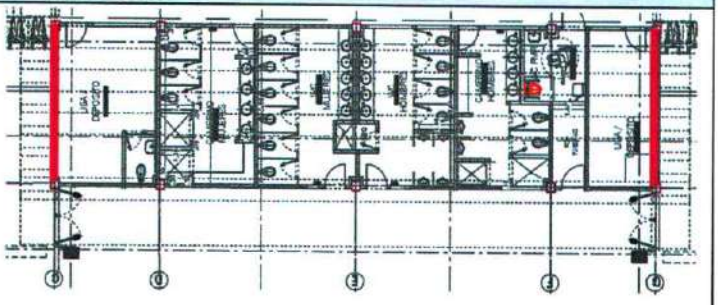



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090937 CND

Firma

Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CUBIERTA Y FACHADA**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUZINC TIPO CELOSIA PARA CONTROL SOLAR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN ALTURAS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

CAPITULO 8

CANCHA DE BALONCESTO. MAMPOSTERÍA Y PAÑETES.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
VIGA FACHADA ENTRE EJES 1'C-1'D LIGA/DEPÓSITO					
VIGUETA 0,10 X 0,20	0,10	0,20	3,95	1,00	0,08
VIGA FACHADA ENTRE EJES 1'D-1'E					
VIGUETA 0,10 X 0,20	0,10	0,20	7,65	1,00	0,15
VIGA FACHADA ENTRE EJES 1'E-1'F					
VIGUETA 0,10 X 0,20	0,10	0,20	7,65	1,00	0,15
VIGA FACHADA ENTRE EJES 1'F-1'G					
VIGUETA 0,10 X 0,20	0,10	0,20	3,95	1,00	0,08
VIGUETA DE VENTANAS					
VIGUETA VENTANAS TIPO 1 Y 3	0,10	0,07	0,66	1,00	0,00
VIGUETA VENTANAS TIPO 2	0,10	0,07	1,80	6,00	0,08
VIENEN:				SUBTOTAL	0,54
PASAN:	0,54			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

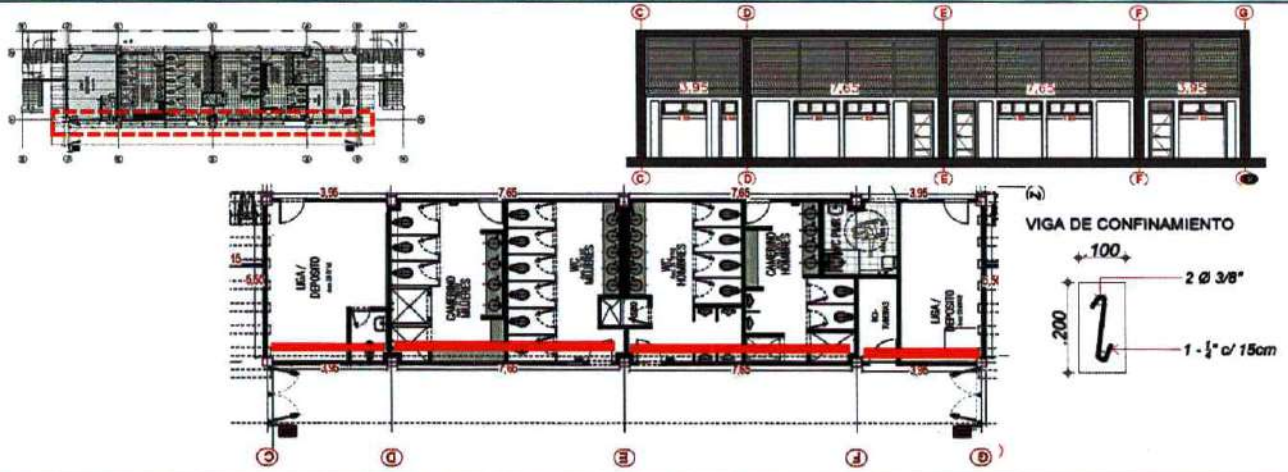

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-78650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-050337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
VIGA ENTRE EJES G1'-G2'					
VIGUETA 0,10 X 0,20	0,10	0,20	5,50	2,00	0,22
MURO ENTRE EJES G1'-G2' y C1'-C2 (escalera)					
VIGUETA 0,10 X 0,20	0,10	0,20	2,15	2,00	0,09
VIGA ENTRE EJES 2'G-2'F					
VIGUETA 0,10 X 0,20	0,10	0,20	3,95	1,00	0,08
VIGA ENTRE EJES 2'F-2'E					
VIGUETA 0,10 X 0,20	0,10	0,20	7,65	1,00	0,15
VIGA ENTRE EJES 2'E-2'D					
VIGUETA 0,10 X 0,20	0,10	0,20	7,65	1,00	0,15
VIGA ENTRE EJES 2'D-2'C					
VIGUETA 0,10 X 0,20	0,10	0,20	3,95	1,00	0,08
VIENEN:	0,54			**SUBTOTAL**	0,77
PASAN:	1,31			**TOTAL**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





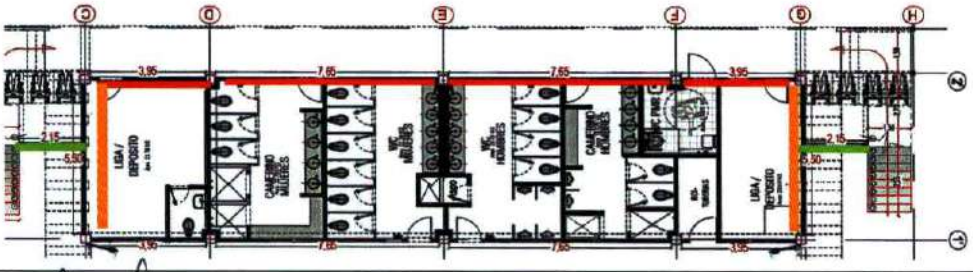

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
ENTRE EJES 2'D-2'C					
VIGUETA ENTRE EJES 2'D-2'C	0,10	0,20	3,95	1,00	0,08
MUROS INTERNOS BAÑO LIGA/DEPOSITO					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	1,83	1,00	0,04
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	1,41	1,00	0,03
LIGA/DEPOSITO - CAMERINO MUJERES ENTRE EJES C1' - C2'					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	5,42	1,00	0,11
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,18	1,00	0,00
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,15	1,00	0,00
MURO CAMERINO MUJERES					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,18	1,00	0,00
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,34	1,00	0,01
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	1,26	2,00	0,05
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	2,74	1,00	0,05
VIENEN:	1,31			**SUBTOTAL**	0,37
PASAN:	1,68			**TOTAL**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

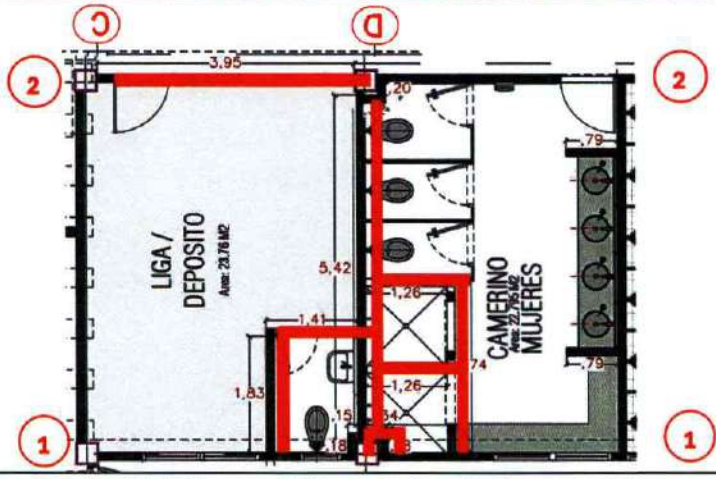

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650143

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-890337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,79	2,00	0,03
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,32	1,00	0,01
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,20	1,00	0,00
WC MUJERES					
VIGUETA 0,10 X 0,20m ENTRE MODULOS	0,10	0,20	5,80	1,00	0,12
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,20	2,00	0,01
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,59	1,00	0,01
MURO INTERNO ENTRE MODULOS W.C. HOMBRES	0,10	0,20	3,09	2,00	0,12
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,81	2,00	0,03
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,97	2,00	0,04
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	1,86	1,00	0,04
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,87	1,00	0,02
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,31	1,00	0,01
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,16	1,00	0,00
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,19	2,00	0,01
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	1,67	1,00	0,03
VIENEN:	1,68			SUBTOTAL	0,48
PASAN:	2,16			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

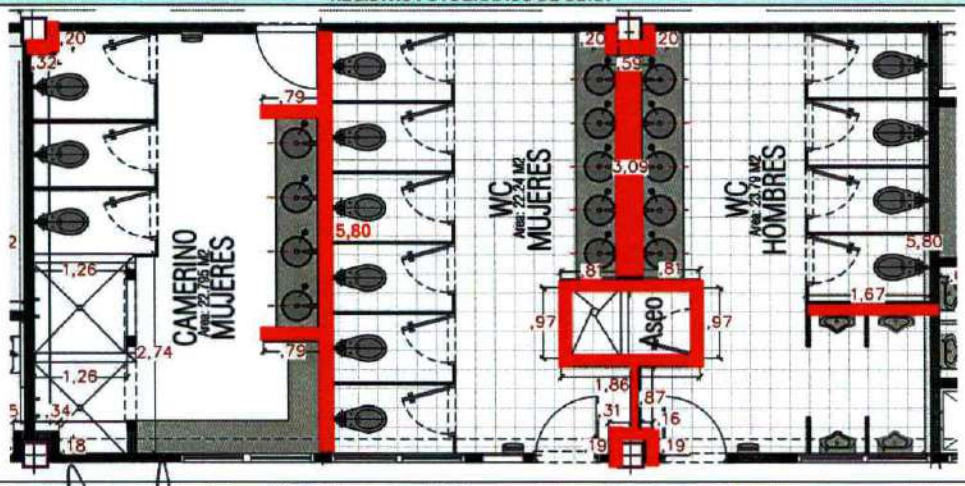

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2502200079650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
CAMERINO HOMBRES					
VIGUETA 0,10 X 0,20m ENTRE MODULOS	0,10	0,20	5,80	1,00	0,12
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,94	1,00	0,02
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,62	1,00	0,01
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	1,22	1,00	0,02
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	1,02	1,00	0,02
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	1,17	1,00	0,02
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	1,52	1,00	0,03
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,18	1,00	0,00
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,23	1,00	0,00
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	2,88	1,00	0,06
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	3,25	1,00	0,07
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	2,65	1,00	0,05
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,30	2,00	0,01
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	0,35	1,00	0,01
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,20	5,83	1,00	0,12
VIENEN:	2,16			SUBTOTAL	0,56
PASAN:	2,72			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

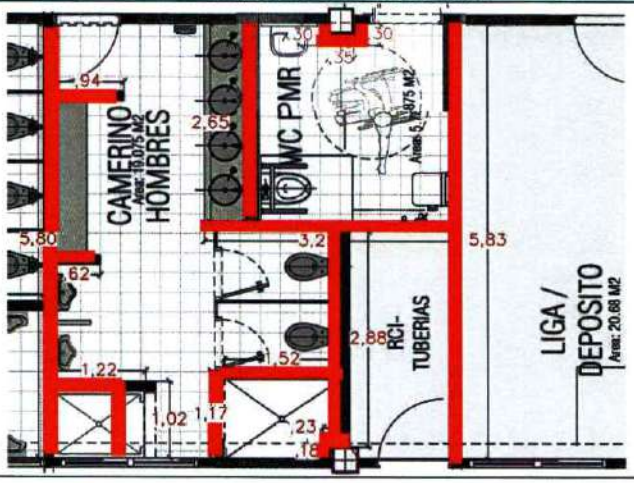

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25672009-79850147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
MUROS FACHCADA LONGITUDINAL EJE I					
VIGA ENTRE EJES 1´´-2					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	7,07	1,00	0,04
VIGAS ENTRE EJES 2'-3' Y 3'-4',					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	6,45	2,00	0,08
VIGA ENTRE EJES 4´-5´					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	6,45	1,00	0,04
VIGA ENTRE EJES 5´-5					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	2,73	1,00	0,02
VIGA ENTRE EJES 8´-9					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	2,73	1,00	0,02
VIGA ENTRE EJES 9´-10' Y 11'-12					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	6,45	2,00	0,08
VIGA ENTRE EJES 10´-11'					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	6,45	1,00	0,04
VIGAS ENTRE EJES 12-12'					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	7,07	1,00	0,04
VIENEN:	2,72			**SUBTOTAL**	0,36
PASAN:	3,08			**TOTAL**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

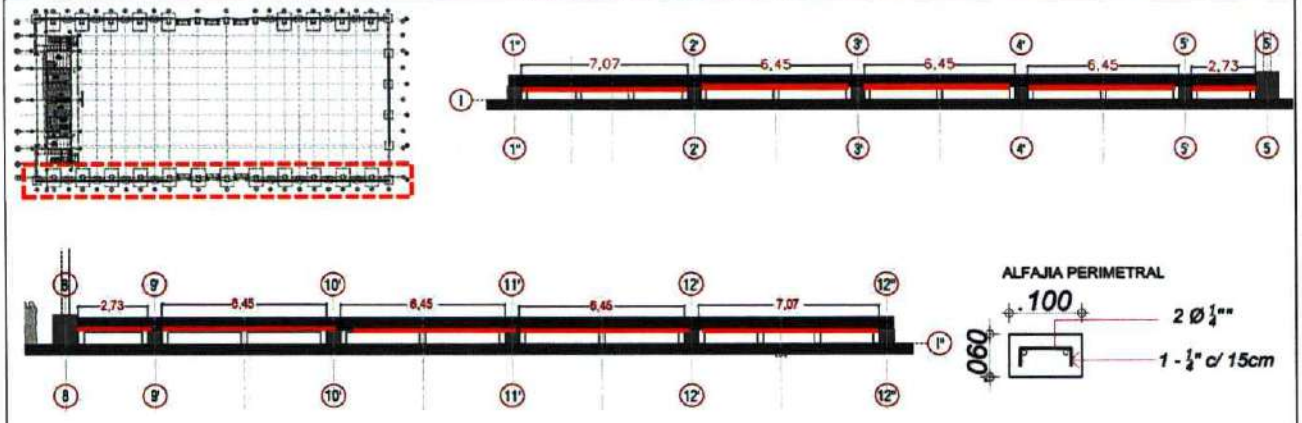

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200[illegible]

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
MUROS FACHCADA LONGITUDINAL EJE A					
VIGA ENTRE EJES 1''-2					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	7,07	1,00	0,04
VIGAS ENTRE EJES 2'-3' Y 3'-4',					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	6,45	2,00	0,08
VIGA ENTRE EJES 4'-5'					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	6,45	1,00	0,04
VIGA ENTRE EJES 5'-5					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	2,73	1,00	0,02
VIGA ENTRE EJES 8'-9					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	2,73	1,00	0,02
VIGA ENTRE EJES 9'-10' Y 11'-12					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	6,45	2,00	0,08
VIGA ENTRE EJES 10'-11'					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	6,45	1,00	0,04
VIGAS ENTRE EJES 12-12'					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	7,07	1,00	0,04
VIENEN:	3,08			**SUBTOTAL**	0,36
PASAN:	3,44			**TOTAL**	3,44

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008-7995014

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
MUROS FACHCADA LONGITUDINAL EJE A					
VIGA ENTRE EJES F´´- E"					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	7,25	1,00	0,04
VIGAS ENTRE EJES E'- D"					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	7,35	1,00	0,04
VIGA ENTRE EJES D´-C"					
VIGUETA 0,10 X 0,20m	0,10	0,06	7,25	1,00	0,04
VIENEN:	3,44			**SUBTOTAL**	0,12
PASAN:				**TOTAL**	3,56

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
2.Ver Plano: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (CAP 8, 1 AL 3) Este documento contiene la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		3,56
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		3,56
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	PACIAL No. 07	3,56
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		0,00

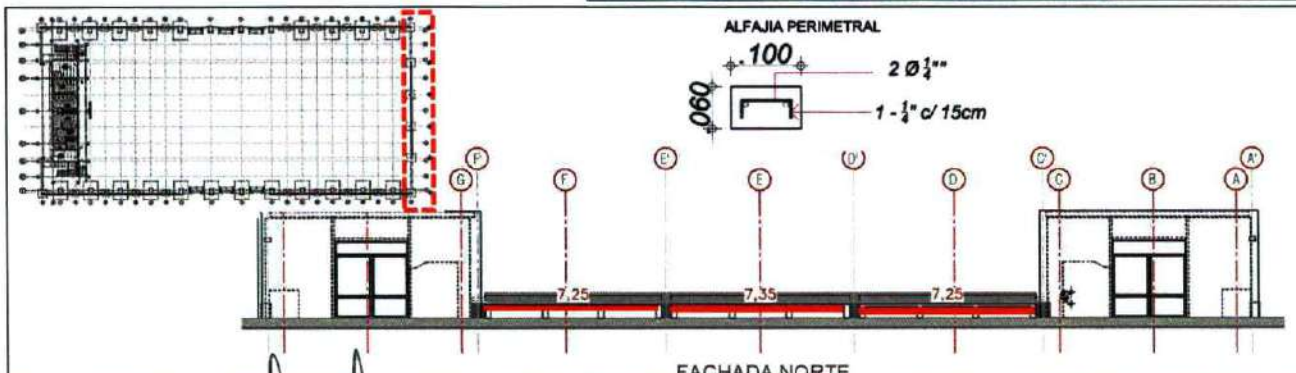

FACHADA NORTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7865147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M3**
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200[illegible]147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	20220055000071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M3**
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090367 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
Columna 1 al 52	0,20	2,30	0,10	52,00	2,39
Columna 53 al 71	0,10	2,30	0,10	19,00	0,44
VIENEN:				SUBTOTAL	2,83
PASAN:	2,83			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

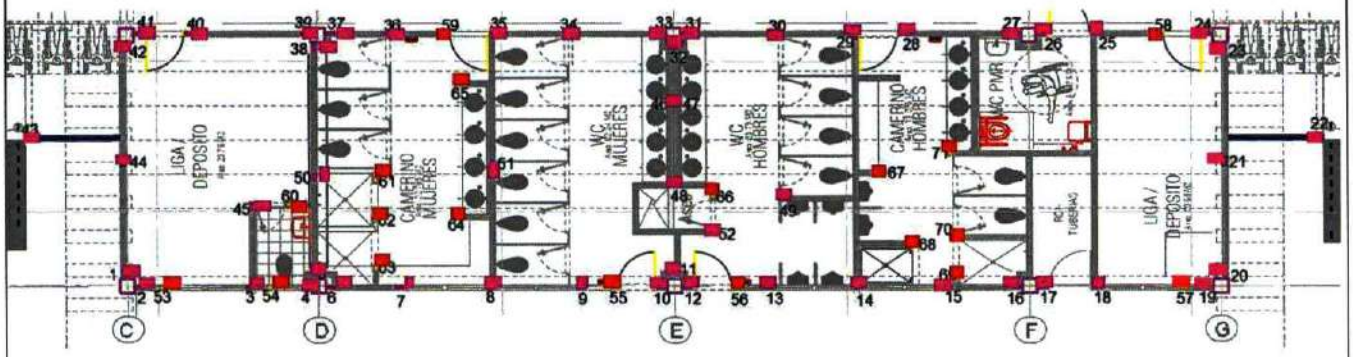

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ALVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200[illegible]79680147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO BARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090937 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 SAU


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**MAMPOSTERÍA**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M3**
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

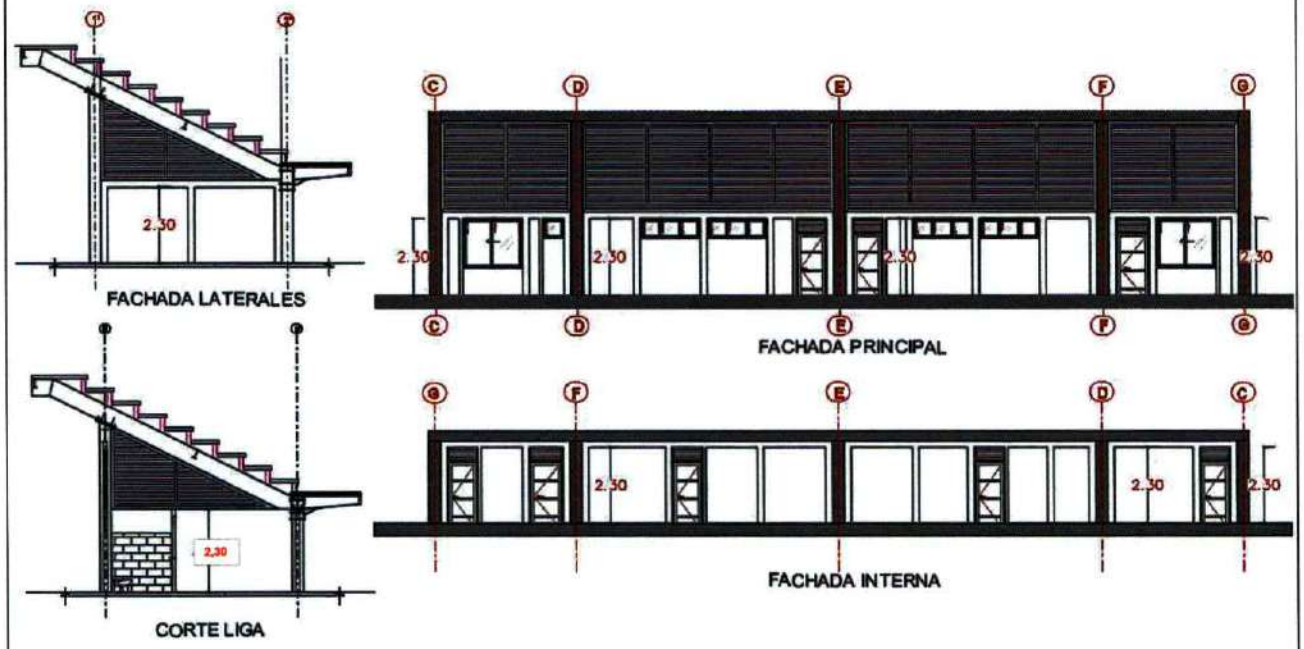

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650142

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
Columnas 0,20x0,10m sector oriental	0,20	0,50	0,10	28,00	0,28
Columnas 0,20x0,10m sector norte	0,20	0,50	0,10	9,00	0,09
Columnas 0,20x0,10m sector occidental	0,20	0,50	0,10	28,00	0,28
VIENEN:	2,83			SUBTOTAL	0,65
PASAN:				TOTAL	3,48

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
2.Ver Plano: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (CAP 8, 1 AL 3) Este documento contiene la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		3,48
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		3,48
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	PACIAL No. 07	3,48
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

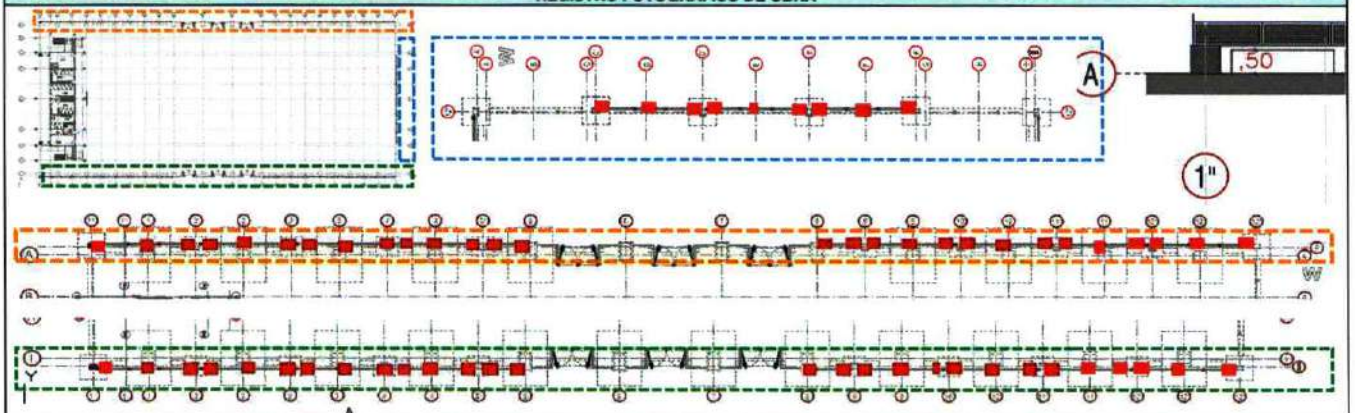

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650347

Firma

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2502000-[illegible]

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO Nº	963 DE 2022	PROYECTO Nº	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
Nº Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
Nº Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Nº Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nº Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	COLOR	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
FACHADA POSTERIOR					
Muro Eje G - F Y D - C		2,50	0,23	3,00	1,73
Muro Eje G - F		2,50	1,59	1,00	3,98
Muro Eje F - E		2,50	2,77	1,00	6,93
Muro Eje F - E Y E - D		2,50	3,97	2,00	19,85
Muro Eje E - D		2,50	2,78	1,00	6,95
Muro Eje D - C		2,50	2,82	1,00	7,05
Muro Eje G - F, F -E, E-D, D-C		0,20	0,90	4,00	0,72
Muro Eje G - F		0,20	1,00	1,00	0,20
VIENEN:				SUBTOTAL	47,41
PASAN:	47,41			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

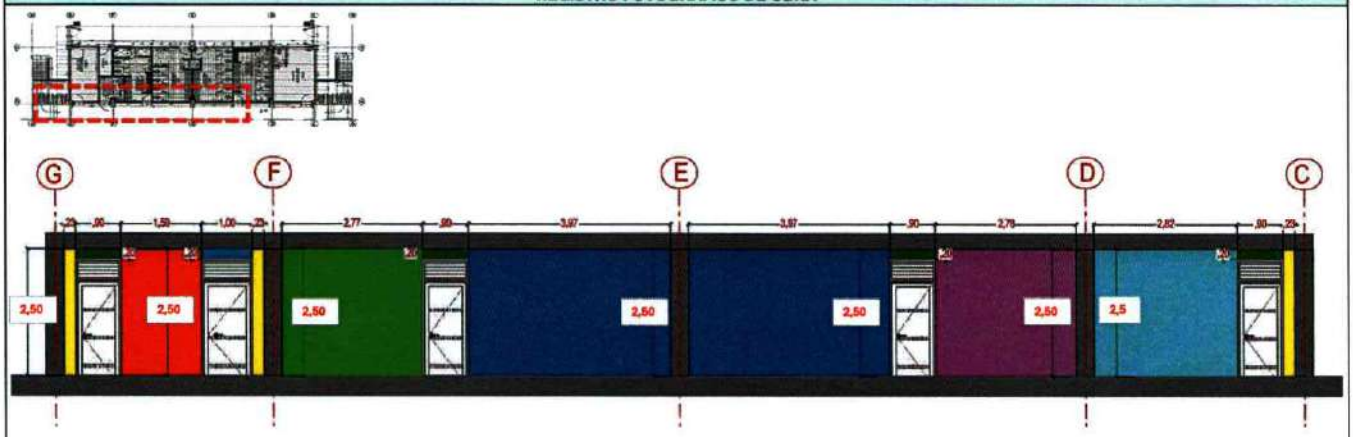

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090397 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
FACHADA LATERAL 1					
EJE G 1' - 2"	5,50	2,50		1,00	13,75
FACHADA LAETERAL 2					
EJE C 1" - 2"	5,50	2,50		1,00	13,75
VIENEN:	47,41			SUBTOTAL	27,50
PASAN:	74,91			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

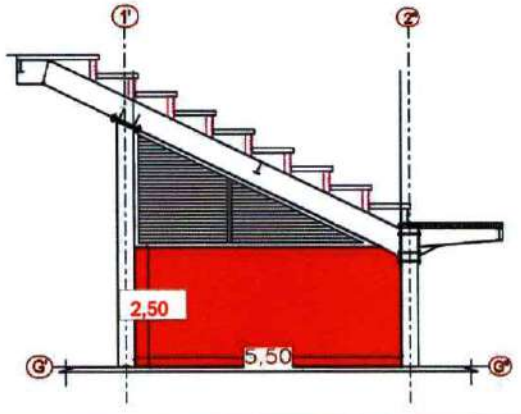

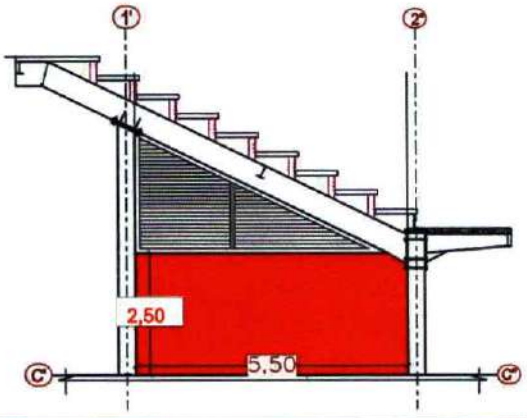

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
BAÑO LIGA / DEPOSITO					
ES UNA SECCIÓN DE		2,50	0,59	1,00	1,48
ES UNA SECCIÓN DE		2,50	1,53	1,00	3,83
ES UNA SECCIÓN DE		2,50	0,15	1,00	0,38
ES UNA SECCIÓN DE		2,50	0,30	1,00	0,75
ES UNA SECCIÓN DE		2,50	1,14	1,00	2,85
ES UNA SECCIÓN DE		2,50	1,83	1,00	4,58
VANO DE VENTANA		0,60	0,63	-1,00	-0,38
VIENEN:	74,91			SUBTOTAL	13,49
PASAN:	88,40			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

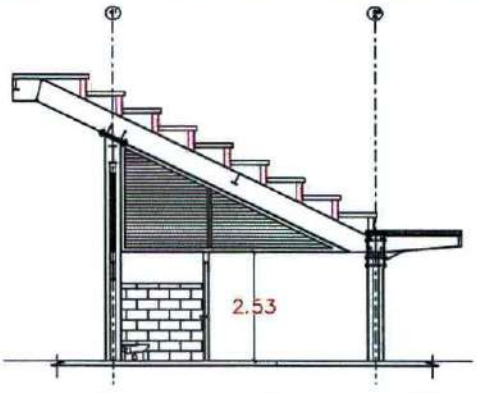

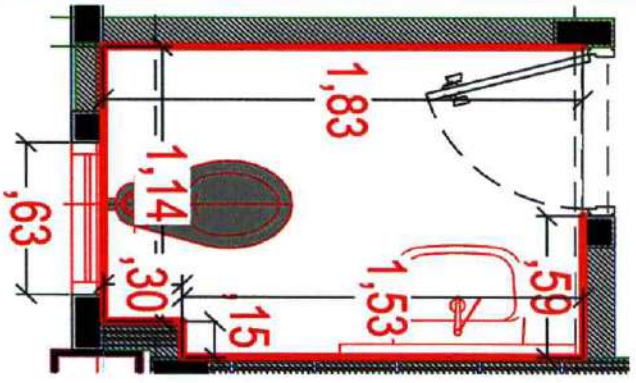

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2587200-79680147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
LIGA / DEPOSITO					
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,82	1,00	7,05
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,15	1,00	0,38
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,03	1,00	0,08
UNA SECCIÓN DE		2,50	3,70	1,00	9,25
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,59	1,00	1,48
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,12	1,00	0,30
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,95	1,00	4,88
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,57	1,00	6,43
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,14	1,00	0,35
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,20	1,00	0,50
UNA SECCIÓN DE		2,50	5,50	1,00	13,75
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,20	1,00	0,50
DESCUENTO VANO VENTANA		0,60	1,80	-1,00	-1,08
VIENEN:	88,40			SUBTOTAL	43,87
PASAN:	132,27			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

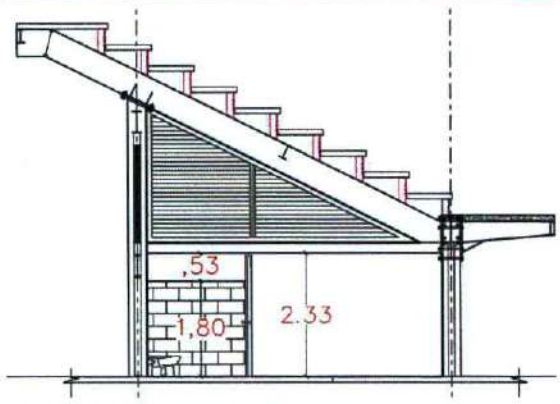



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
CAMERINO MUJERES					
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,66	1,00	6,65
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,31	1,00	0,78
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,32	1,00	0,80
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,75	1,00	6,88
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,38	1,00	3,45
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,35	1,00	0,88
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,12	5,00	1,50
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,22	1,00	0,55
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,26	2,00	6,30
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,25	1,00	3,13
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,22	1,00	0,55
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,34	1,00	0,85
		2,50	1,38	1,00	3,45
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,95	1,00	2,38
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,34	1,00	0,85
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,30	1,00	0,75
VIENEN:	132,27			SUBTOTAL	39,75
PASAN:	172,02			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

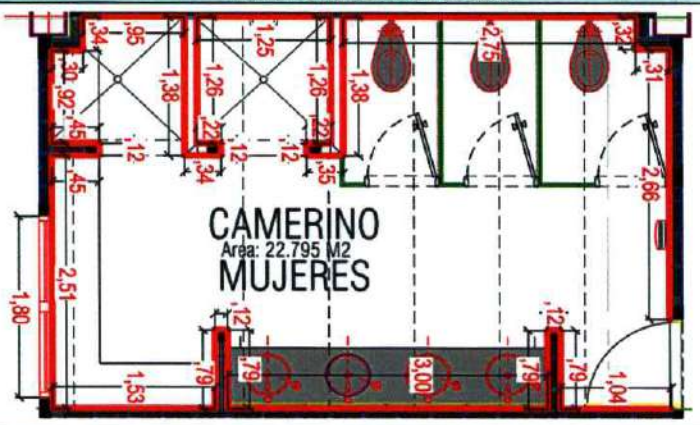

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNY ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,92	1,00	2,30
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,45	2,00	2,25
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,51	1,00	6,28
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,53	1,00	3,83
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,79	4,00	7,90
UNA SECCIÓN DE		2,50	3,00	1,00	7,50
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,04	1,00	2,60
DESCUENTO VANO DE VENTANA		0,60	1,80	-1,00	-1,08
VIENEN:	172,02			SUBTOTAL:	31,58
PASAN:	203,60			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

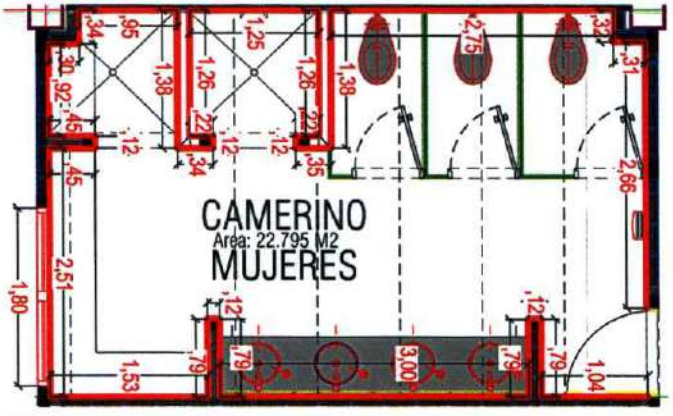

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAQ

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
WC MUJERES					
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,72	1,00	6,80
UNA SECCIÓN DE		2,50	5,80	1,00	14,50
UNA SECCIÓN DE		2,50	3,73	1,00	9,33
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,32	1,00	0,80
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,18	1,00	0,45
UNA SECCIÓN DE		2,50	3,09	1,00	7,73
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,81	1,00	2,03
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,21	1,00	3,03
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,94	1,00	2,35
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,87	1,00	2,18
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,31	2,00	1,55
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,11	1,00	0,28
		0,60	1,80	-1,00	-1,08
VIENEN:	203,60			SUBTOTAL	49,95
PASAN:	253,55			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

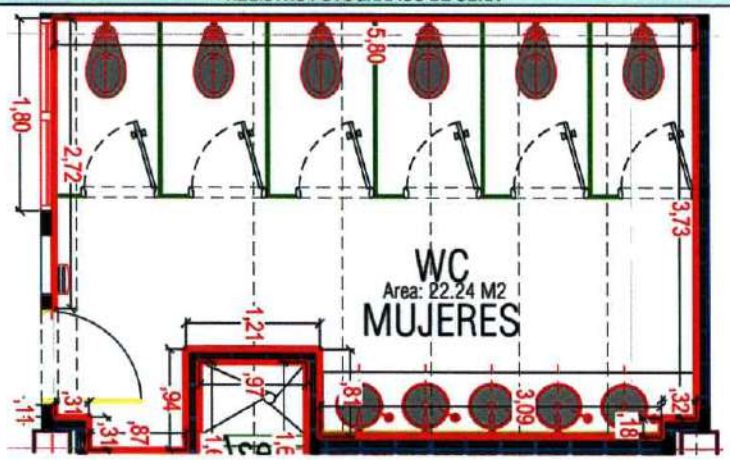

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-78650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
WC HOMBRES					
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,73	1,00	6,83
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,96	1,00	4,90
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,67	2,00	8,35
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,12	1,00	0,30
UNA SECCIÓN DE		2,50	3,72	1,00	9,30
UNA SECCIÓN DE		2,50	3,73	1,00	9,33
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,31	1,00	0,78
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,16	1,00	0,40
UNA SECCIÓN DE		2,50	3,09	1,00	7,73
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,81	1,00	2,03
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,21	2,00	6,05
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,80	1,00	2,00
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,87	1,00	2,18
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,16	1,00	0,40
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,31	1,00	0,78
SE RESTA LA VANO DE VENTANA		0,60	1,80	-1,00	-1,08
VIENEN:	253,55			SUBTOTAL	60,28
PASAN:	313,83			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

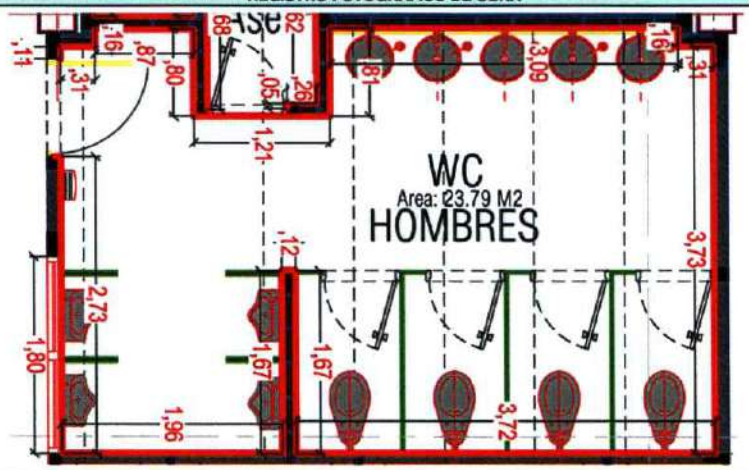

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
CAMERINO HOMBRES					
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,70	1,00	4,25
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,65	1,00	6,63
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,60	1,00	1,50
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,12	6,00	1,80
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,78	1,00	4,45
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,86	1,00	4,65
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,65	2,00	8,25
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,75	1,00	1,88
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,24	1,00	0,60
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,30	1,00	0,75
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,30	1,00	3,25
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,25	2,00	1,25
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,13	1,00	5,33
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,90	1,00	2,25
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,35	2,00	6,75
SE RESTA LA VANO DE VENTANA		0,60	1,80	-1,00	-1,08
VIENEN:	313,83			SUBTOTAL	52,51
PASAN:	366,34			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

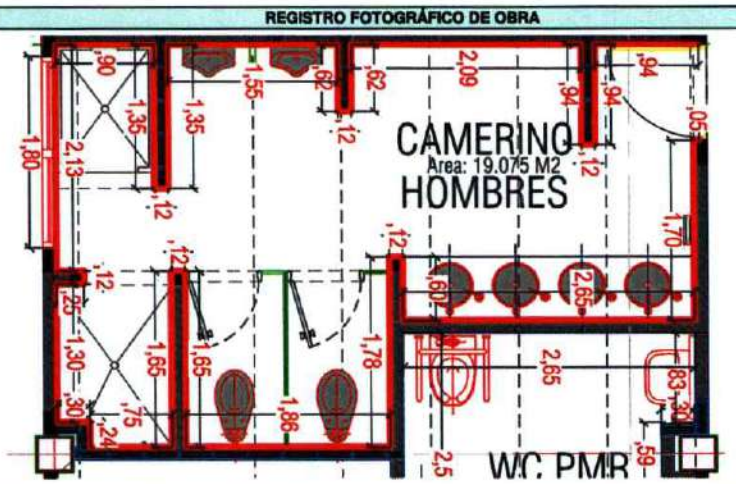

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079850149

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,55	1,00	3,88
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,62	2,00	3,10
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,09	1,00	5,23
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,94	3,00	7,05
VIENEN:	366,34			SUBTOTAL	19,26
PASAN:	385,60			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

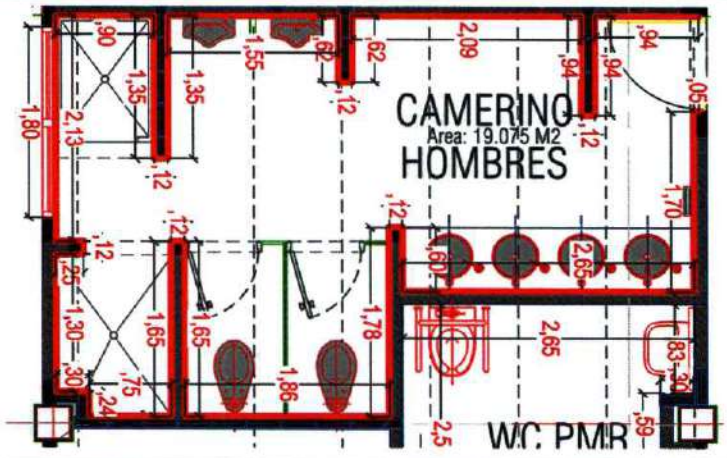

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650747

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 1920282149 CAU


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
ASEO					
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,26	1,00	0,65
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,62	2,00	8,10
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,97	1,00	2,43
WC PMR					
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,11	1,00	0,28
DOS SECCIONES DE		2,50	0,30	2,00	1,50
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,59	1,00	1,48
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,83	1,00	2,08
DOS SECCIONES DE		2,50	2,65	2,00	13,25
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,53	1,00	6,33
VIENEN:	385,60			SUBTOTAL	36,10
PASAN:	421,70			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

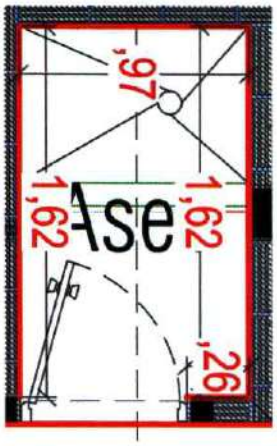

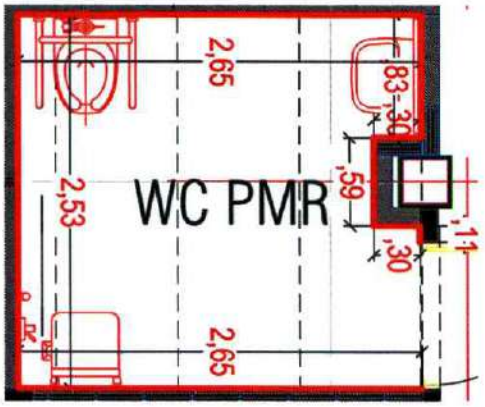

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79850147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82148 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
RCI-TUBERIAS					
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,23	1,00	0,58
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,15	1,00	0,38
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,12	1,00	0,30
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,88	1,00	7,20
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,35	1,00	3,38
UNA SECCIÓN DE		2,50	3,03	1,00	7,58
LIGA / DEPOSITO					
UNA SECCIÓN DE		2,50	1,47	1,00	3,68
UNA SECCIÓN DE		2,50	5,80	1,00	14,50
UNA SECCIÓN DE		2,50	2,60	1,00	6,50
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,15	1,00	0,38
SON DOS SECCIONES DE		2,50	0,20	2,00	1,00
		2,50	5,50	1,00	13,75
UNA SECCIÓN DE		2,50	0,23	1,00	0,58
VANO DE VENTANA		0,60	1,80	-1,00	-1,08
VIENEN:	421,70			SUBTOTAL	58,73
PASAN:	480,43			TOTAL	480,43

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

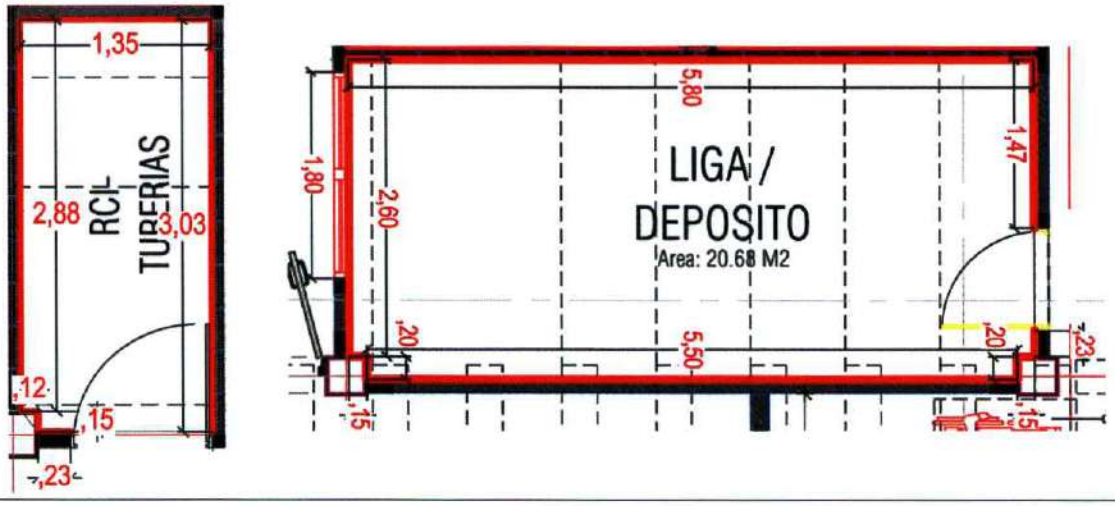

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
MUROS FACHADA LONGITUDINAL EJE I					
MUROS ENTRE EJES 1''-2					
	7,07	0,56		2,00	7,92
MUROS ENTRE EJES 2'-3' Y 3'-4',					
	6,45	0,56		4,00	14,45
MUROS ENTRE EJES 4´-5´					
	6,45	0,56		2,00	7,22
MUROS ENTRE EJES 5´-6					
	2,73	0,56		2,00	3,06
MUROS ENTRE EJES 8´-9					
	2,73	0,56		2,00	3,06
MUROS ENTRE EJES 9´-10' Y 11'-12					
	6,45	0,56		4,00	14,45
	6,45	0,56		2,00	7,22
MUROS ENTRE EJES 12-12'					
	7,07	0,56		2,00	7,92
VIENEN:	480,43			SUBTOTAL	65,30
PASAN:	545,73			TOTAL	545,73

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-79550147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-490337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
MUROS FACHADA LONGITUDINAL EJE A					
MUROS ENTRE EJES 1''-2					
	7,07	0,56		2,00	7,92
MUROS ENTRE EJES 2'-3' Y 3'-4',					
	6,45	0,56		4,00	14,45
MUROS ENTRE EJES 4'-5'					
	6,45	0,56		2,00	7,22
MUROS ENTRE EJES 5'-5					
	2,73	0,56		2,00	3,06
MUROS ENTRE EJES 8'-9					
	2,73	0,56		2,00	3,06
MUROS ENTRE EJES 9'-10' Y 11'-12					
	6,45	0,56		4,00	14,45
MUROS ENTRE EJES 10'-11'					
	6,45	0,56		2,00	7,22
MUROS ENTRE EJES 12-12'					
	7,07	0,56		2,00	7,92
VIENEN:	545,73			SUBTOTAL	65,30
PASAN:	611,03			TOTAL	611,03

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

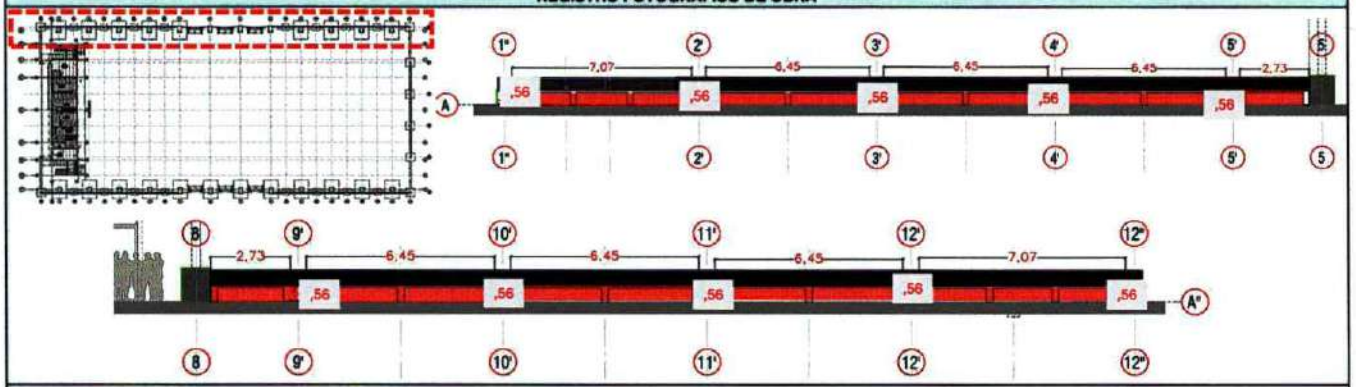

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2587200[illegible]

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
MUROS FACHADA NORTE EJE 12"					
MUROS ENTRE EJES F"- E"					
	7,25	0,56		1,00	4,06
MUROS ENTRE EJES E" - D"					
	7,35	0,56		1,00	4,12
MUROS ENTRE EJES D" - C"					
	7,25	0,56		1,00	4,06
PAÑETE SUPERIOR MURO EJE I Y EJE A Y EJE 12	0,12		136,93	1,00	16,67
VIENEN:	611,03			SUBTOTAL	28,91
PASAN:				TOTAL	639,94

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
2.Ver Plano: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (CAP 8. 1 AL 3) Este documento contiene la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		639,94
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		639,94
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	PACIAL No. 07	639,94
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

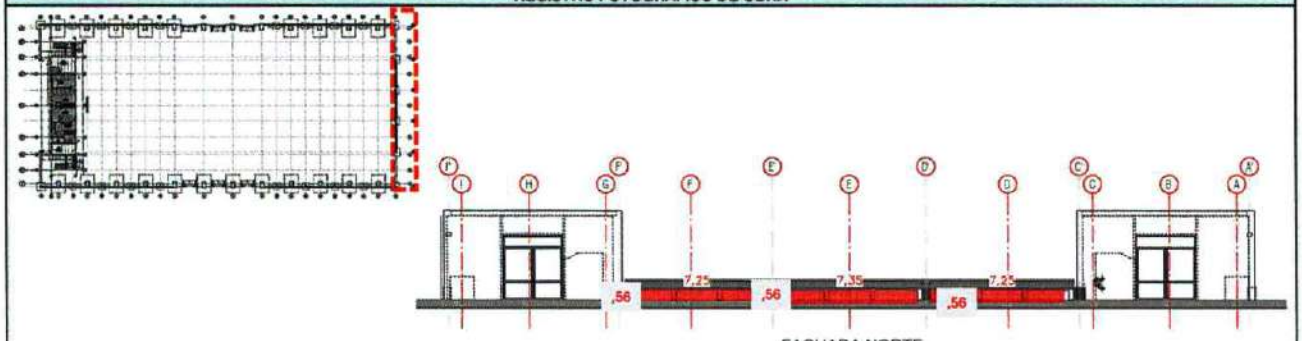

FACHADA NORTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7965014

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507-000-7965014

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**

DIRECTOR DE OBRA

N° Matrícula Profesional: A25072000-7965014

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**

RESIDENTE DE OBRA

N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	COLOR	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
FACHADA PRINCIPAL					
Muro Eje C - D		0,20	3,95	1,00	0,79
Muro Eje C - D		2,30	0,67	1,00	1,54
Muro Eje C - D y F - G		1,70	1,80	1,00	3,06
Muro Eje C - D		1,49	1,70	1,00	2,53
Muro Eje C - D		0,60	0,62	1,00	0,37
Muro Eje C - D		0,60	0,22	1,00	0,13
Muro Eje D - E		0,20	7,65	1,00	1,53
Muro Eje D - E		0,60	1,77	1,00	1,06
Muro Eje D - E		1,70	5,60	1,00	9,52
Muro Eje D - E Y E - F		0,23	0,60	2,00	0,28
Muro Eje D - E		2,30	0,92	1,00	2,12
Muro Eje D - E. E - F Y F - G		2,30	0,23	4,00	2,12
Muro Eje E - F		0,20	7,65	1,00	1,53
Muro Eje E - F		1,70	6,50	1,00	11,05
Muro Eje E - F		0,60	0,92	1,00	0,55
Muro Eje E - F		0,60	1,76	1,00	1,06
VIENEN:					**39,24**
PASAN:	39,24			**TOTAL**	**39,24**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

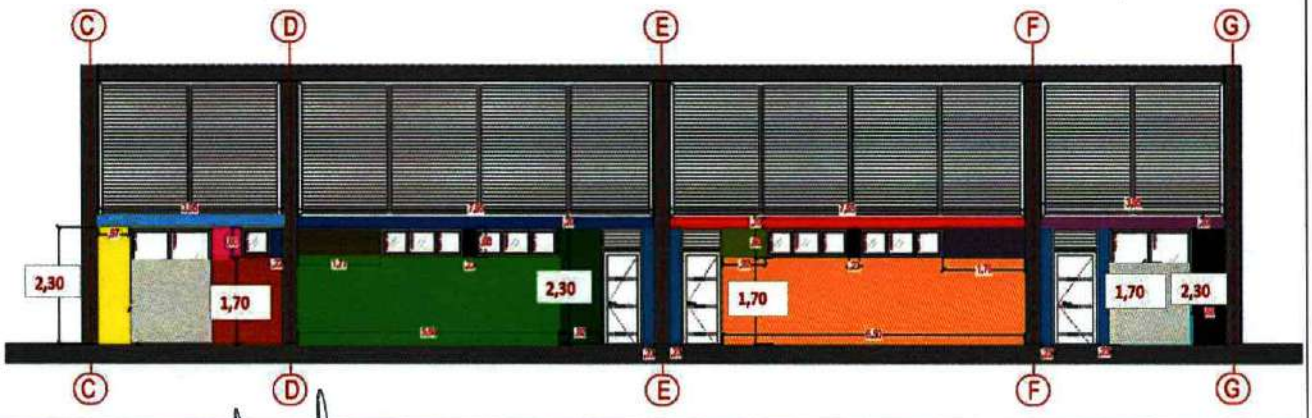

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: AE5072000-78650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
8,8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	COLOR	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
Muro Eje F - G		0,20	3,95	1,00	0,79
Muro Eje F - G		2,30	0,69	1,00	1,59
Muro Eje F - G		1,70	1,80	1,00	3,06
FACHADA LATERAL 1					
EJE G 1" - 2"		5,50	2,53	1,00	13,92
FACHADA LAETERAL 2					
EJE C 1" - 2"		5,50	2,53	1,00	13,92
VIENEN:	39,24				33,28
PASAN:	72,52			TOTAL	72,52


OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
2.Ver Planos: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (CAP 8, 1 AL 3) Este documento contiene la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		72,52
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		72,52
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	PACIAL No. 07	72,52
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

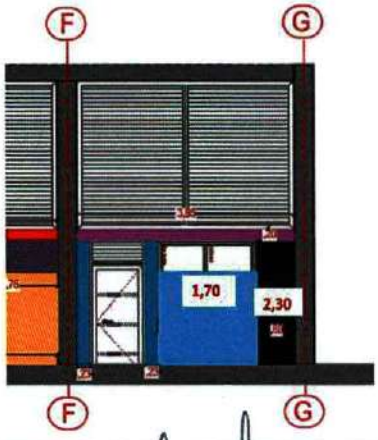

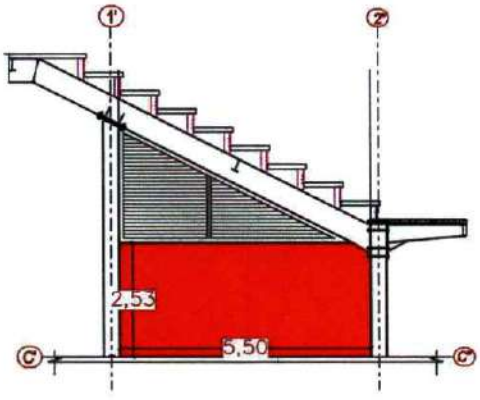

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072080-76650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
8,8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072800-79850147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-190337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORBEAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
8,8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7983014

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
8,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	KG/ML	CANTI. COLUMNETAS	
COLUMNA TIPO 1 0,20 X 0,10					
ACERO REFUERZO 3/8"	2,00	2,78	0,56	52,00	161,91
ESTRIBOS 1/4"	16,00	0,20	0,251	52,00	41,77
COLUMNA TIPO 2 / 0,10 X 0,10					
ACERO REFUERZO 3/8"	1,00	2,78	0,56	19,00	29,58
	CANTIDAD	LONGITUD	KG/ML	ML DE VIGA	
VIGA TIPO 1 / 0,20 X 0,10					
ACERO REFUERZO 3/8"	2,00		0,56	257,49	288,39
ESTRIBOS 1/4"	6,50	0,20	0,251	257,49	84,02
TRASLAPOS	4	0,90	0,56		2,02
VIENEN:				SUBTOTAL	607,69
PASAN:	607,69			TOTAL	607,69


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA












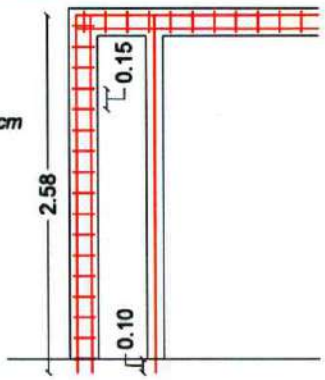

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
8,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	KG/ML	ML DE VIGA	
ALFAJIA 0,06 X 0,10					
ACERO REFUERZO 1/4"	2,00		0,56	138,93	155,60
ESTRIBOS 1/4"	6,50	0,12	0,251	138,93	27,20
TRASLAPOS	19	0,60	0,251		2,86
COLUMNA TIPO 1 0,20 X 0,10					
ACERO REFUERZO 3/8"	2,00	0,60	0,56	65,00	43,68
ESTRIBOS 1/4"	3,00	0,20	0,251	65,00	9,79
VIENEN:	607,69			SUBTOTAL	239,13
PASAN:				TOTAL	846,82


OBSERVACIONES:


1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
2.Ver Planos: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (CAP 8, 1 AL 3) Este documento contiene la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		846,82
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		846,82
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	PACIAL No. 07	846,82
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		0,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

ALFAJIA PERIMETRAL



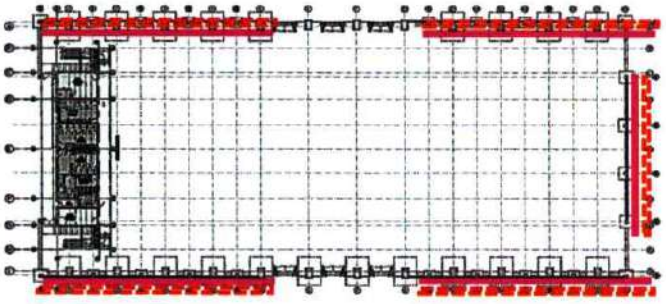

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 0.10 x 0.20



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-78550147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-093337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**KG**
8.9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507[illegible]

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**KG**
8,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**

DIRECTOR DE OBRA

N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**

RESIDENTE DE OBRA

N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
NP8.10	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA PARA MESON Y BANCA, E=0,07 M, INCLUYE REFUERZO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	
Camerino Mujeres					
Banca	2,05	0,45		1,00	0,92
Banca	1,08	0,45		1,00	0,49
Camerino hombre					
Banca	2,09	0,45		1,00	0,94
VIENEN:				SUBTOTAL	2,35
PASAN:				TOTAL	2,35


OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
2.Ver Planos: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (CAP 8, 1 AL 3) Este documento contiene la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		7,40
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		2,35
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	PACIAL No. 07	2,35
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		5,05

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

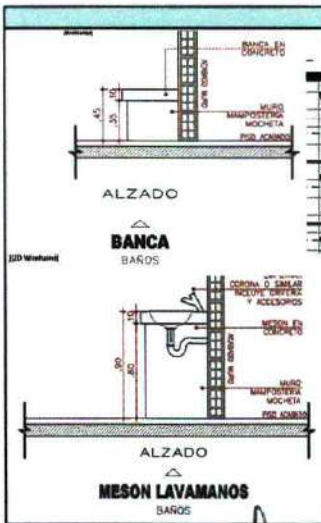

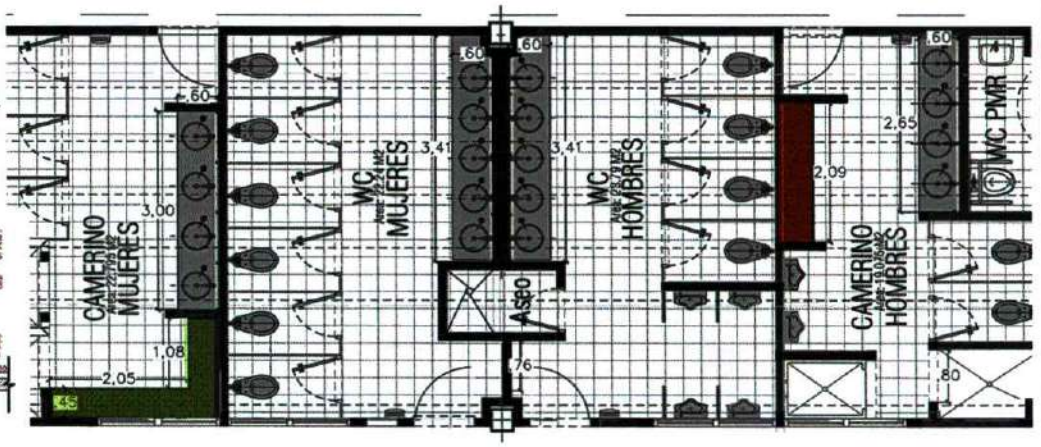

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma	Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO	Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79650147	N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND
Firma	Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS	Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND	N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
NP8.10	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA PARA MESON Y BANCA, E=0,07 M, INCLUYE REFUERZO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-19650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

CAPITULO 9

CANCHA DE BALONCESTO.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
9,5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
Camerino Mujeres				2,00	2,00
Camerino Hombres				2,00	2,00
VIENEN:	0,00			**SUBTOTAL**	**4,00**
PASAN:	**0,00**			**TOTAL**	**4,00**

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 03 ADICIÓN No. 01)	**5,00**
MAYOR CANTIDAD (+)	**0,00**
MENOR CANTIDAD (-)	**1,00**
CANTIDAD ACTUALIZADA PRESENTE PARCIAL No. 07	**4,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

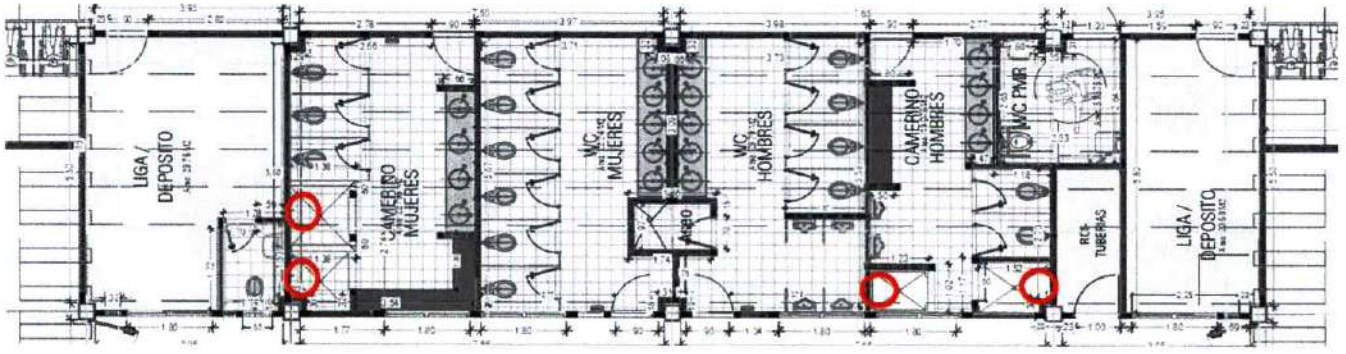

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND


Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

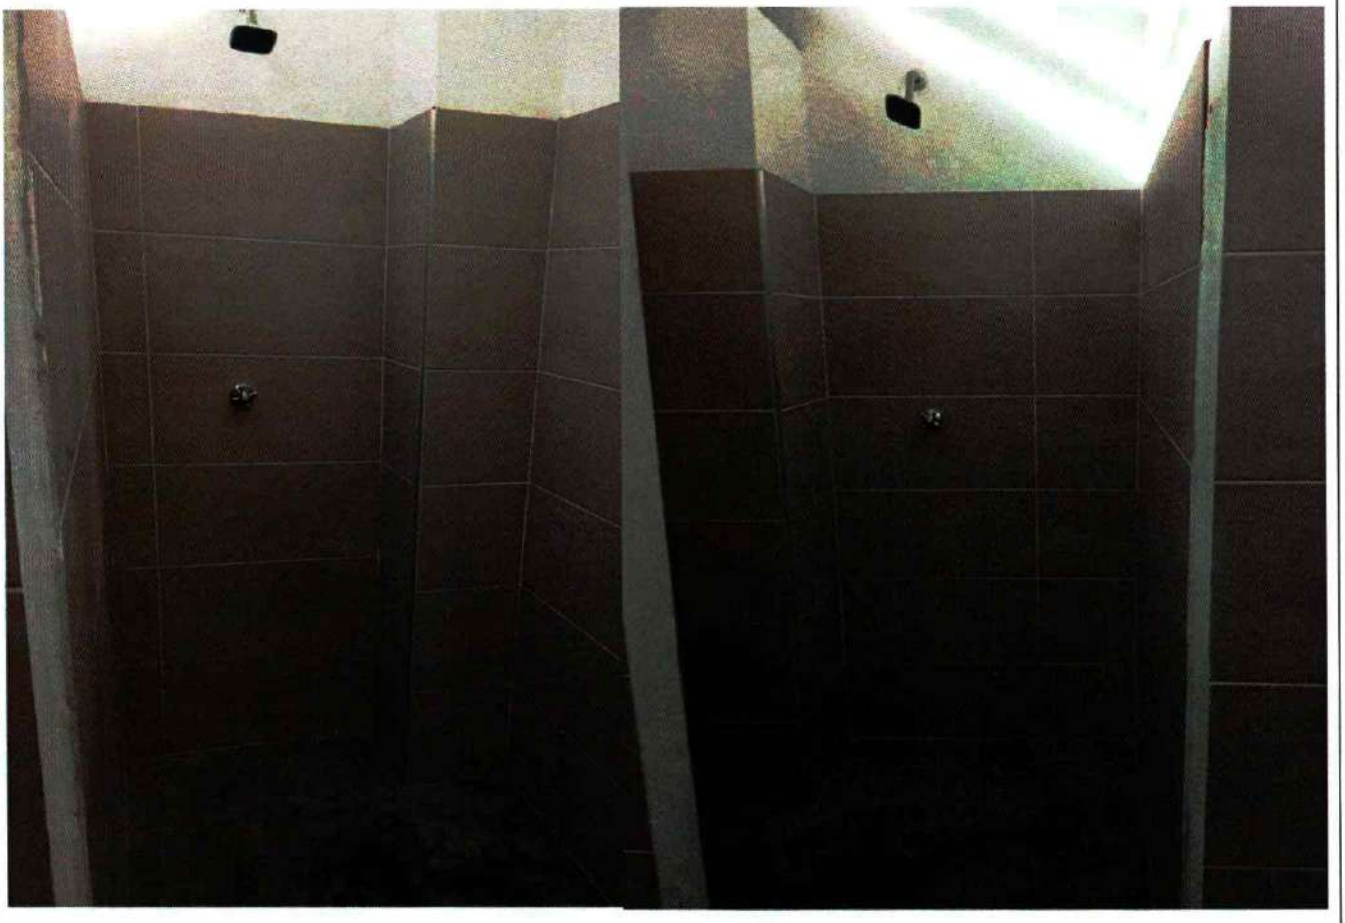

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79680147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	m2
NP9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	AREA	CANTIDAD	
Camerino Mujeres					
Espejo	2,95	0,80		1,00	2,36
Baño Mujeres					
Espejo	3,04	0,80		1,00	2,43
Baño hombre					
Espejo	3,04	0,80		1,00	2,43
Camerino hombre					
Espejo	2,60	0,80		1,00	2,08
Baño liga/deposito					
Espejo	0,75	1,00		1,00	0,75
Baño PMR					
Espejo	0,75	1,00		1,00	0,75
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**10,80**
PASAN:				**TOTAL**	**10,80**

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 03, ADICIONAL 01 Y PRÓRROGA 01	12,00
	MAYOR CANTIDAD (+)	0,00
	MENOR CANTIDAD (-)	1,20
	CANTIDAD ACTUALIZADA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	10,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

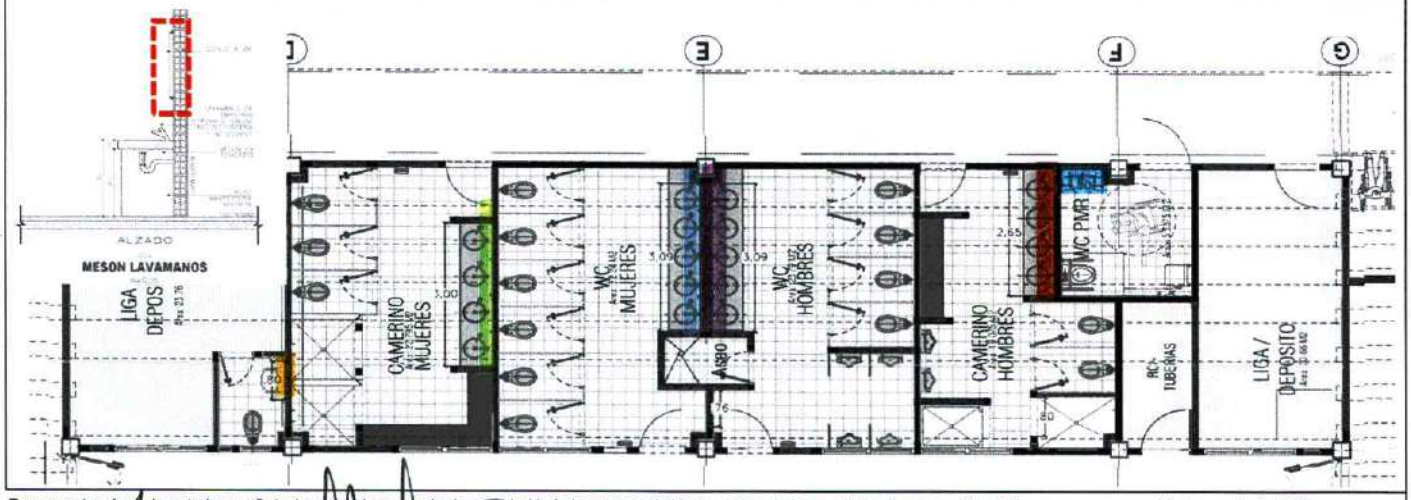

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072009-79656147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO Nº	963 DE 2022	PROYECTO Nº	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	m2
NP9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
Nº Matrícula Profesional: A25122000-79650149

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Nº Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
Nº Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nº Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
9,8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
Baños hombres				5,00	5,00
Camerinos hombres				4,00	4,00
Baños mujeres				5,00	5,00
Camerinos mujeres				4,00	4,00
VIENEN:	0,00			**SUBTOTAL**	**18,00**
PASAN:	**0,00**			**TOTAL**	**18,00**

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 03 ADICIÓN No. 01)	**22,00**
	MAYOR CANTIDAD (+)	**0,00**
	MENOR CANTIDAD (-)	**4,00**
	CANTIDAD ACTUALIZADA PRESENTE PARCIAL No. 07	**18,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

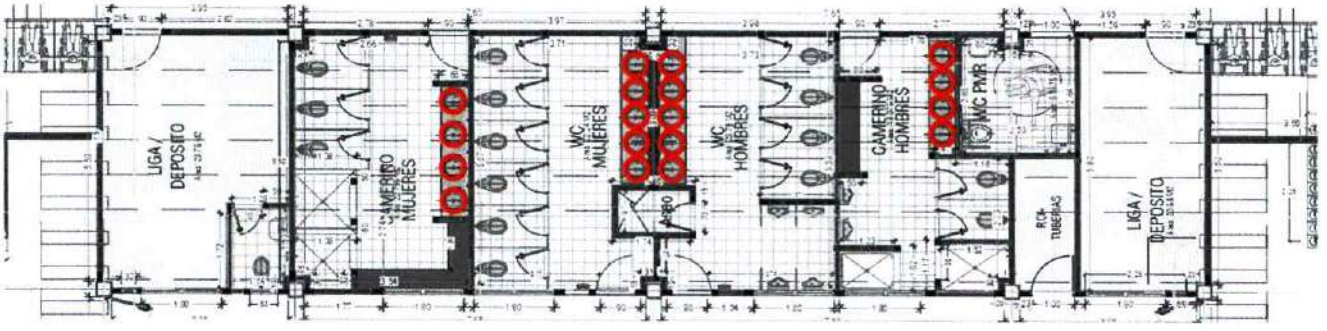

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
9.8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

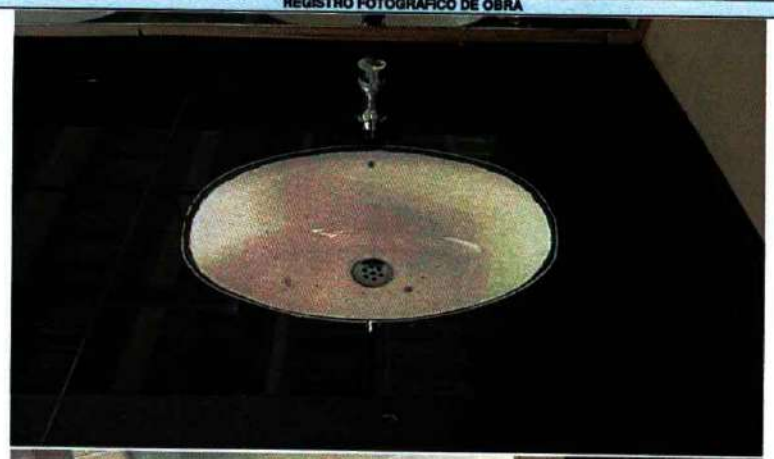



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7885014

Firma

Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP9.9	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO + VALVULA ANTIVANDALICA SANITARIO TIPO PUSH, ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	
Deposito liga				1,00	1,00
Cemrinos mujeres				3,00	3,00
Baños mujeres				6,00	6,00
Baños hombres				4,00	4,00
Camerinos hombres				2,00	2,00
VIENEN:	0,00			**SUBTOTAL**	**16,00**
PASAN:	**0,00**			**TOTAL**	**16,00**

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 03 ADICIÓN No. 01)	**0,00**
	MAYOR CANTIDAD (+)	**16,00**
	MENOR CANTIDAD (-)	**0,00**
	CANTIDAD ACTUALIZADA PRESENTE PARCIAL No. 07	**16,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

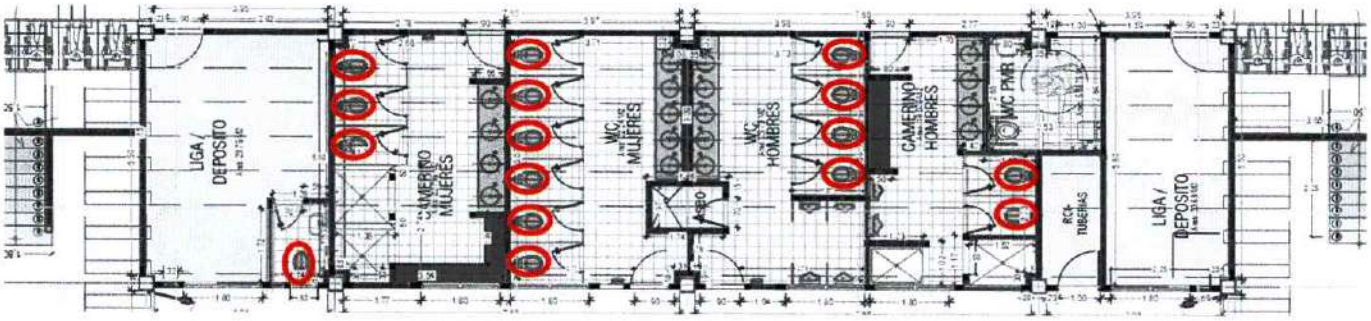

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ALVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25972000-79850137

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
NP9.9	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO + VALVULA ANTIVANDALICA SANITARIO TIPO PUSH, ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-080337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 15 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP9.10	SANITARIO DISCAPACITADOS + FLUXOMETRO ANTIVANDALICA TIPO PALANCA, ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
Baño PMR				1,00	1,00
VIENEN:	0,00			**SUBTOTAL**	**1,00**
PASAN:	**0,00**			**TOTAL**	**1,00**

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 03 ADICIÓN No. 01)	**0,00**
	MAYOR CANTIDAD (+)	**1,00**
	MENOR CANTIDAD (-)	**0,00**
	CANTIDAD ACTUALIZADA PRESENTE PARCIAL No. 07	**1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

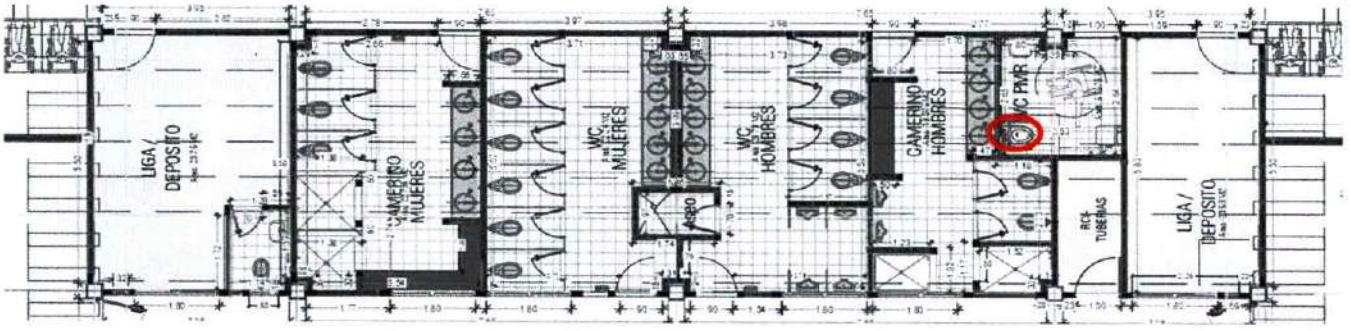

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP9.10	SANITARIO DISCAPACITADOS + FLUXOMETRO ANTIVANDALICA TIPO PALANCA, ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850797

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-290337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP9.11	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE PARED + VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH, ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
Baños hombres				4,00	4,00
camerinos hombres				2,00	2,00
VIENEN:	0,00			**SUBTOTAL**	**6,00**
PASAN:	0,00			**TOTAL**	**6,00**

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 03 ADICIÓN No. 01)	**0,00**
	MAYOR CANTIDAD (+)	**6,00**
	MENOR CANTIDAD (-)	**0,00**
	CANTIDAD ACTUALIZADA PRESENTE PARCIAL No. 07	**6,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

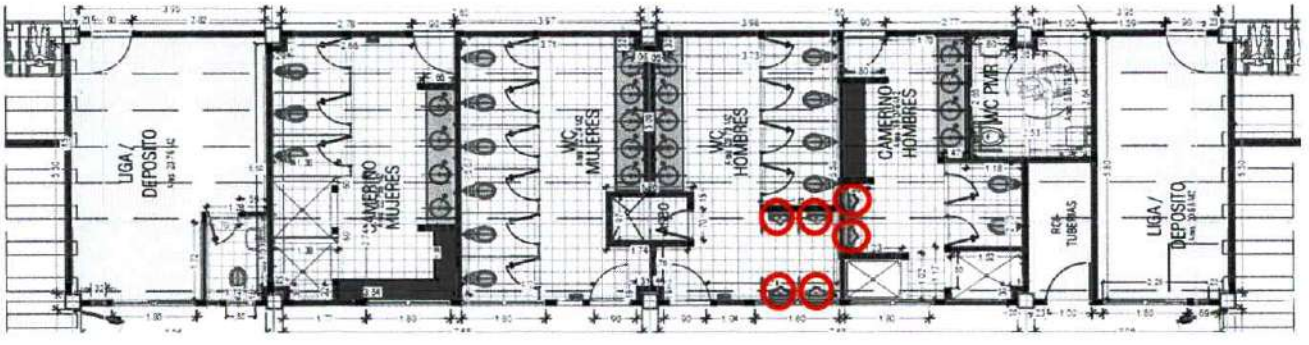

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090397 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP9.11	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE PARED + VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH, ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507[illegible]

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP9.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS EMPOTRAR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y DESAGUE. NO INCLUYE GRIFERIA.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
Baños hombres				5,00	5,00
camerinos hombres				4,00	4,00
Baños mujeres				5,00	5,00
camerinos mujeres				4,00	4,00
VIENEN:	0,00			**SUBTOTAL**	**18,00**
PASAN:	**0,00**			**TOTAL**	**18,00**

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 03 ADICIÓN No. 01)	**0,00**
	MAYOR CANTIDAD (+)	**18,00**
	MENOR CANTIDAD (-)	**0,00**
	CANTIDAD ACTUALIZADA PRESENTE PARCIAL No. 07	**18,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

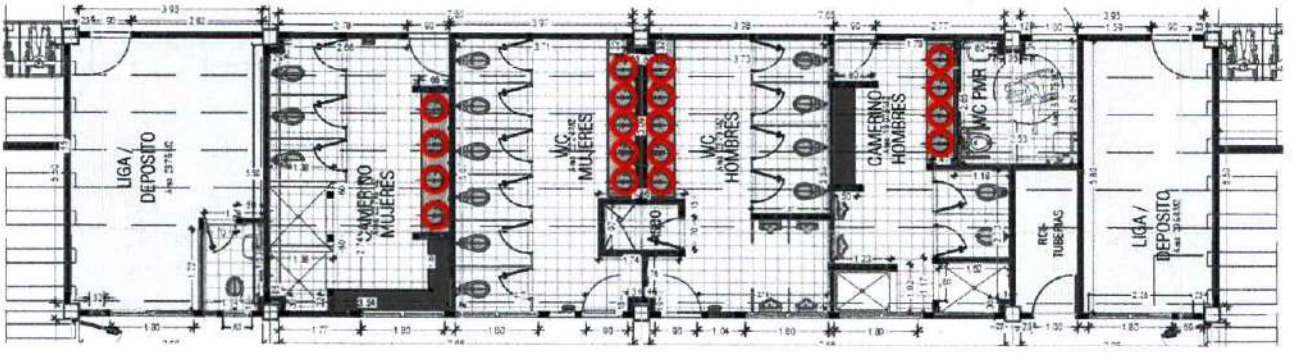

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79658147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP9.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS EMPOTRAR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y DESAGUE. NO INCLUYE GRIFERIA.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2501200-1965147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP9.13	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA ANTICUCARACHA 4 pulg x 3 pulg ALUMINIO TUBERIA 3 pulg	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
Deposito de liga				1,00	1,00
Camerinos mujeres				4,00	4,00
Baños mujeres				2,00	2,00
Baños hombres				3,00	3,00
Camerinos hombres				4,00	4,00
baños discapacitados				1,00	1,00
VIENEN:	0,00			**SUBTOTAL**	**15,00**
PASAN:	**0,00**			**TOTAL**	**15,00**

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 03 ADICIÓN No. 01)	**0,00**
MAYOR CANTIDAD (+)	**15,00**
MENOR CANTIDAD (-)	**0,00**
CANTIDAD ACTUALIZADA PRESENTE PARCIAL No. 07	**15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

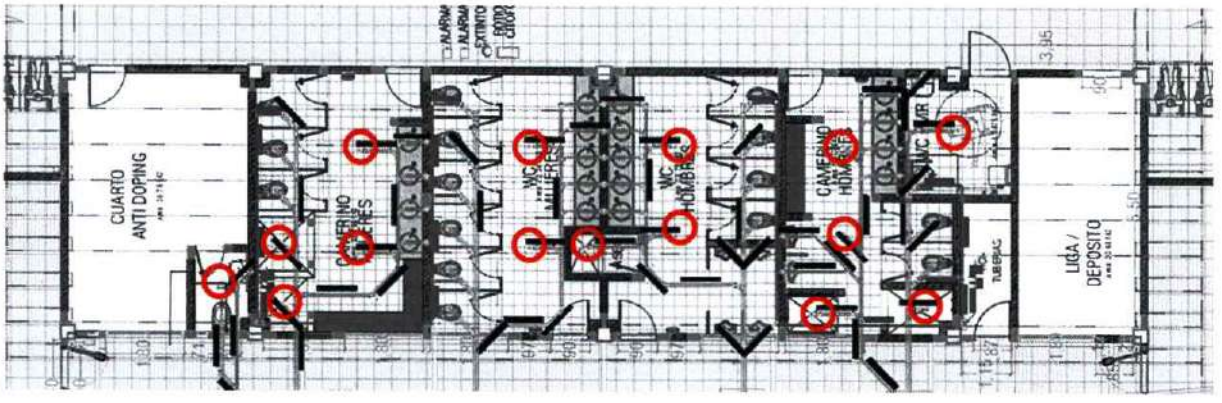

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP9.13	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA ANTICUCARACHA 4 pulg x 3 pulg ALUMINIO TUBERIA 3 pulg	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090367 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	eeee		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
NP9.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PMR DE COLGAR, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE PARA MAMPOSTERIA, Y DESAGUE. NO INCLUYE GRIFERIA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
Baño PMR				1,00	1,00
VIENEN:			SUBTOTAL		1,00
PASAN:			TOTAL		1,00

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 03 ADICIÓN No. 01)	0,00
	MAYOR CANTIDAD (+)	1,00
	MENOR CANTIDAD (-)	0,00
	CANTIDAD ACTUALIZADA PRESENTE PARCIAL No. 07	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

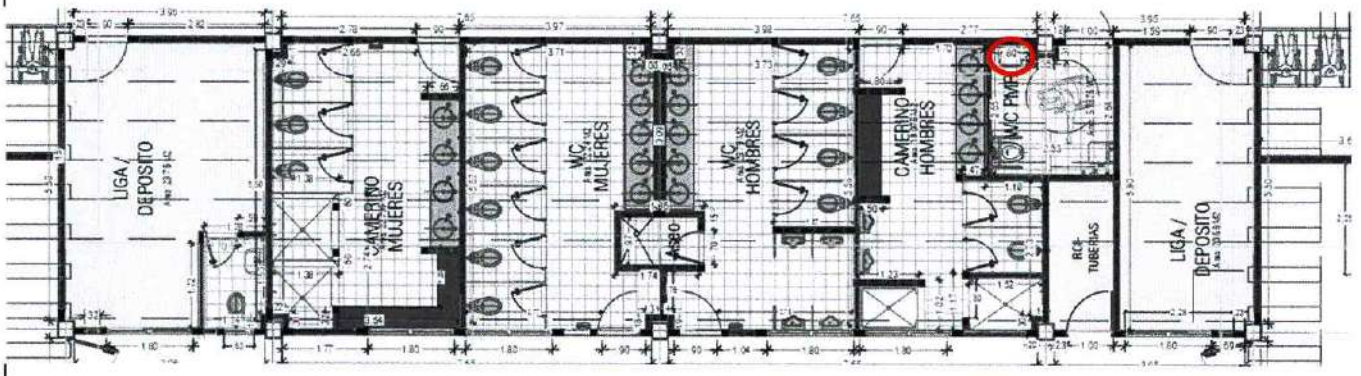

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
NP9.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PMR DE COLGAR, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE PARA MAMPOSTERIA, Y DESAGUE. NO INCLUYE GRIFERIA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507[illegible]0147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

CAPITULO 10

CANCHA DE BALONCESTO.

CARPINTERÍA METÁLICA.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	CARPINTERÍA METÁLICA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
PUERTA TIPO 1	0.90	2.27		7.00	14.30
PUERTA TIPO 2	1.00	2.27		1.00	2.27
PUERTA TIPO 3 BAÑO LIGA / DEPOSITO	0.70	2.27		1.00	1.59
VIENEN:				SUBTOTAL	18.16
PASAN:	18.16			TOTAL	18.16

OBSERVACIONES:			
1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		18.87
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		18.16
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		0.00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	PACIAL No. 07	18.16
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		0.71

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

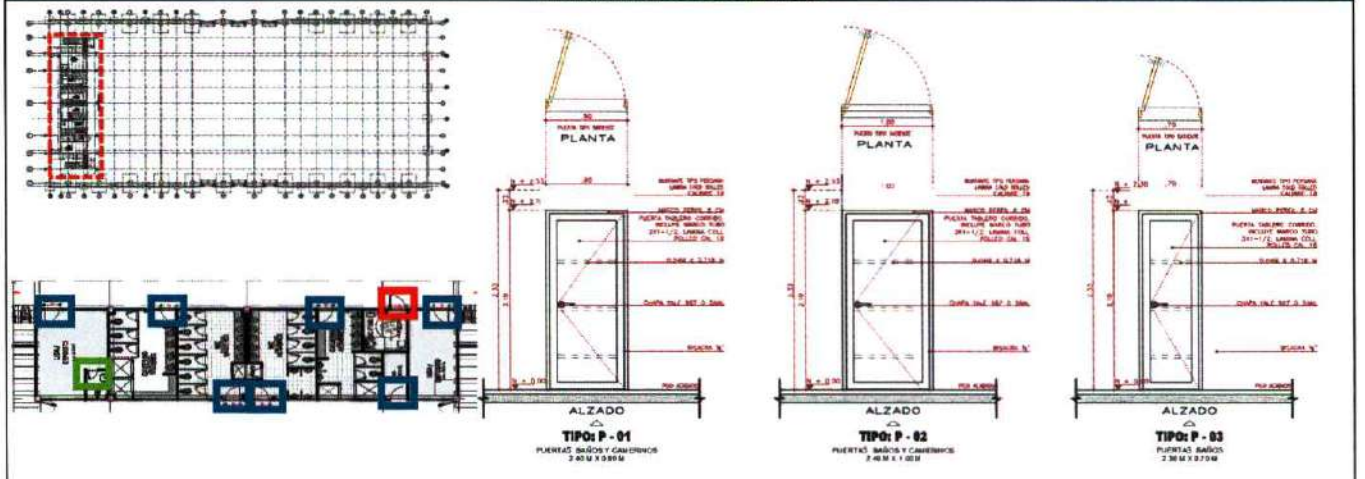

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25252-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	CARPINTERÍA METÁLICA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	CARPINTERÍA METÁLICA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
BARANDA ESCALERA 1			7.60	2.00	15.20
			5.86	2.00	11.72
			0.99	2.00	1.98
			9.09	1.00	9.09
			32.61	1.00	32.61
			27.55	1.00	27.55
VIENEN:		SUBTOTAL			98.15
PASAN:	98.15	TOTAL			98.15

OBSERVACIONES:			
1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		98.17
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		98.15
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		0.00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	PACIAL No. 07	98.15
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		0.02

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

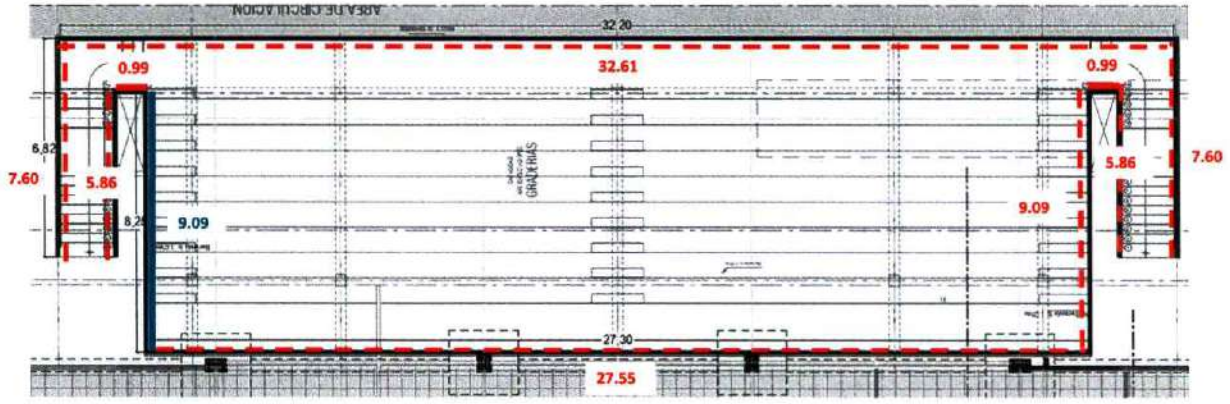

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	CARPINTERÍA METÁLICA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
CAMERINO MUJERES					
PANEL DIVISOR DE BAÑO		1.80	0.33	1.00	0.59
PANEL DIVISOR DE BAÑO		1.60	1.47	2.00	4.70
PANEL FRONTAL DE BAÑO		1.80	0.32	2.00	1.15
PANEL FRONTAL DE BAÑO		1.80	0.25	1.00	0.45
PANEL PUERTA		1.60	0.62	3.00	2.98
W.C. MUJERES					
PANEL DIVISOR DE BAÑO		1.60	1.47	5.00	11.76
PANEL FRONTAL DE BAÑO		1.80	0.24	1.00	0.43
PANEL FRONTAL DE BAÑO		1.80	0.27	5.00	2.43
PANEL PUERTA		1.60	0.62	6.00	5.95
VIENEN:				SUBTOTAL	30.44
PASAN:	30.44			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

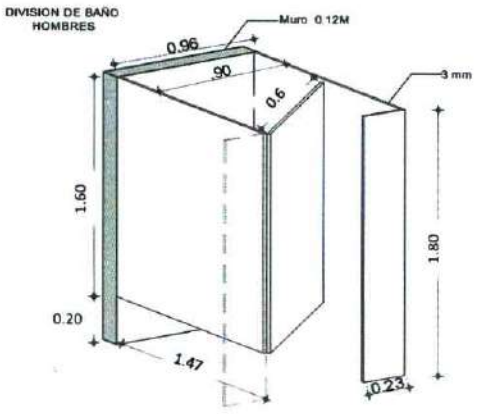

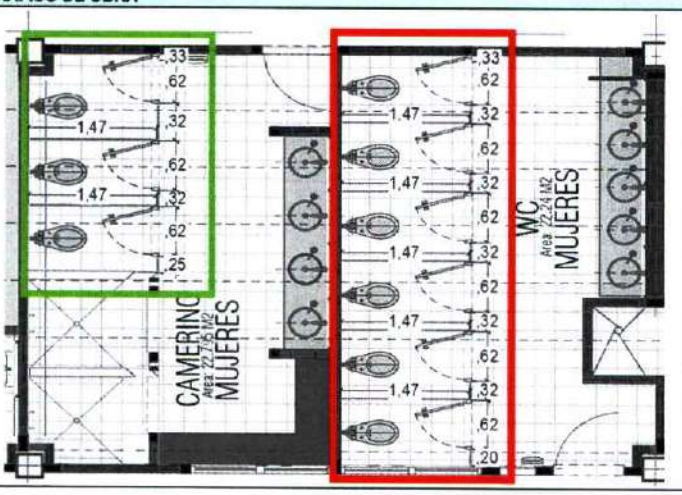

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	CARPINTERÍA METÁLICA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
W.C. HOMBRES					
PANEL FRONTAL DE BAÑO		1.80	0.18	1.00	0.32
PANEL DIVISOR DE BAÑO		1.50	1.47	3.00	6.62
PANEL FRONTAL DE BAÑO		1.80	0.32	3.00	1.73
PANEL FRONTAL DE BAÑO		1.80	0.11	1.00	0.20
PANEL PUERTA		1.50	0.62	4.00	3.72
DIVISIÓN ORINALES		1.40	0.50	4.00	2.80
CAMERINO HOMBRES					
PANEL DIVISOR DE BAÑO		1.50	1.47	1.00	2.21
PANEL FRONTAL DE BAÑO		1.80	0.19	1.00	0.34
PANEL FRONTAL DE BAÑO		1.80	0.20	2.00	0.72
PANEL PUERTA		1.50	0.62	2.00	1.86
DIVISIÓN ORINALES		1.40	0.50	1.00	0.70
VIENEN:	30.44			**SUBTOTAL**	**21.22**
PASAN:	51.66			**TOTAL**	**51.66**


OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		**54.36**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		**51.66**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		**0.00**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	**PARCIAL No. 07**	**51.66**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		**2.70**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

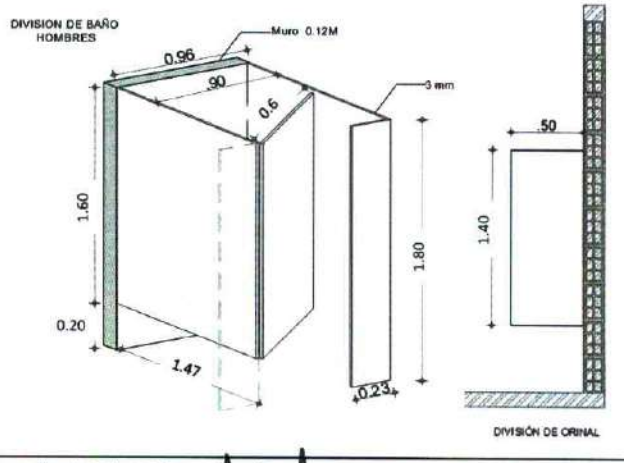

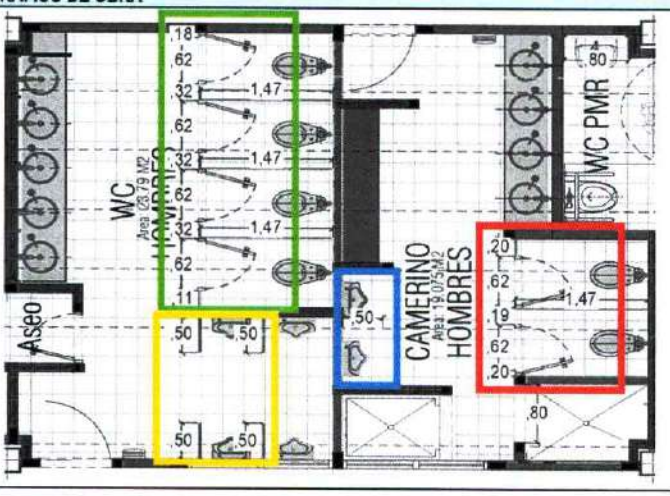

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	CARPINTERÍA METÁLICA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



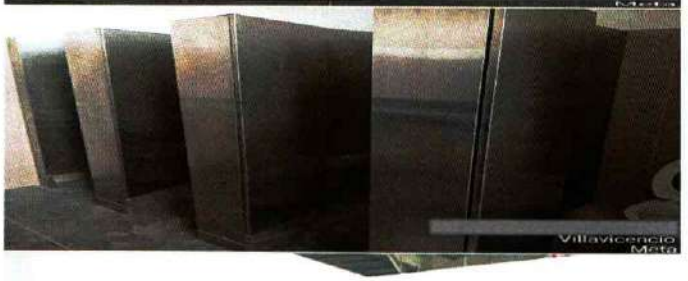







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072009-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	CARPINTERÍA METÁLICA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA TIPO ACORDEON EN 2 HOJAS DIVIDIDAS. REJA EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. INCLUYE REJA MONTANTE EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. CHAPA SENCILLA TIPO INAFER O SIMILAR, ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
PUERTA TIPO 4 - EJE 12"	3.00	3.30		2.00	19.80
PUERTA TIPO 4 - EJE A" Y I"	2.96	3.30		6.00	58.61
VIENEN:				SUBTOTAL	78.41
PASAN:				TOTAL	78.41


OBSERVACIONES:


1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		79.20
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		78.41
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		0.00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	PARCIAL No. 07	78.41
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		0.79

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



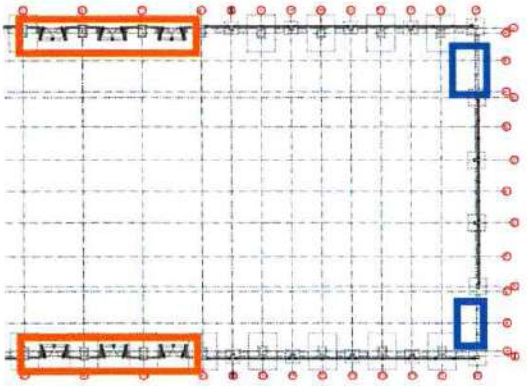

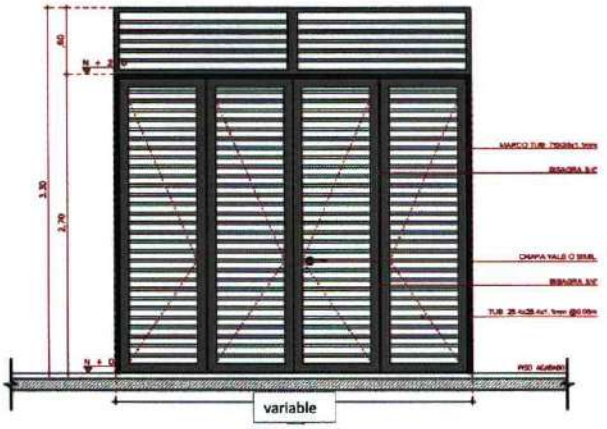

TIPO: P - 04

PUERTAS ENTRADAS PRINCIPALES LATERALES
3.30 X 2.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA TIPO ACORDEON EN 2 HOJAS DIVIDIDAS. REJA EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. INCLUYE REJA MONTANTE EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. CHAPA SENCILLA TIPO INAFER O SIMILAR, ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA TIPO ABATIBLE EN 2 HOJAS. REJA EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. INCLUYE CHAPA SENCILLA TIPO INAFER O SIMILAR, ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
PUERTA TIPO 5 - EJE A"	2.10	2.74		1.00	5.75
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**5.75**
PASAN:				**TOTAL**	**5.75**


OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**10.80**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**5.75**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**0.00**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	**5.75**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**5.05**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

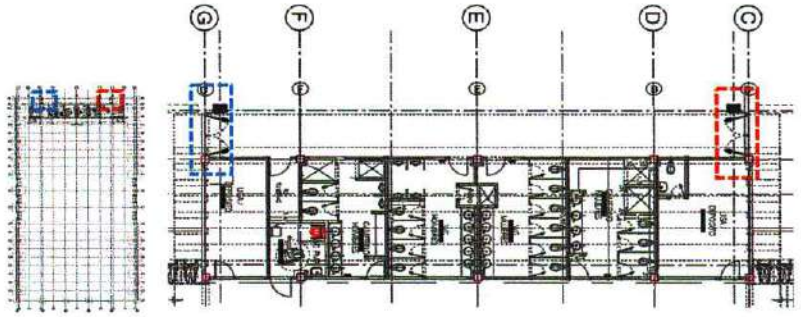

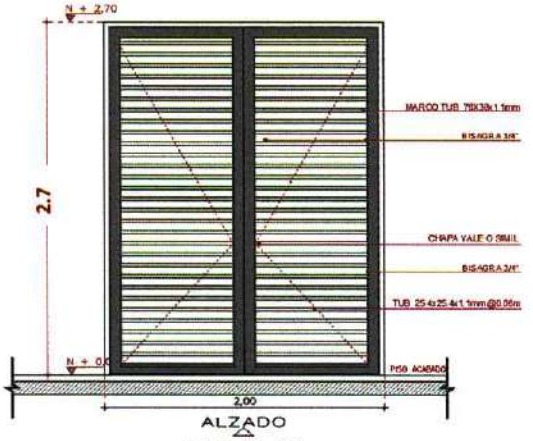

ALZADO

TIPO: P - 05

PUERTAS ENTRADAS PRINCIPALES FRONTALES
2.70 M X 2.00 M

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA TIPO ABATIBLE EN 2 HOJAS. REJA EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. INCLUYE CHAPA SENCILLA TIPO INAFER O SIMILAR, ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

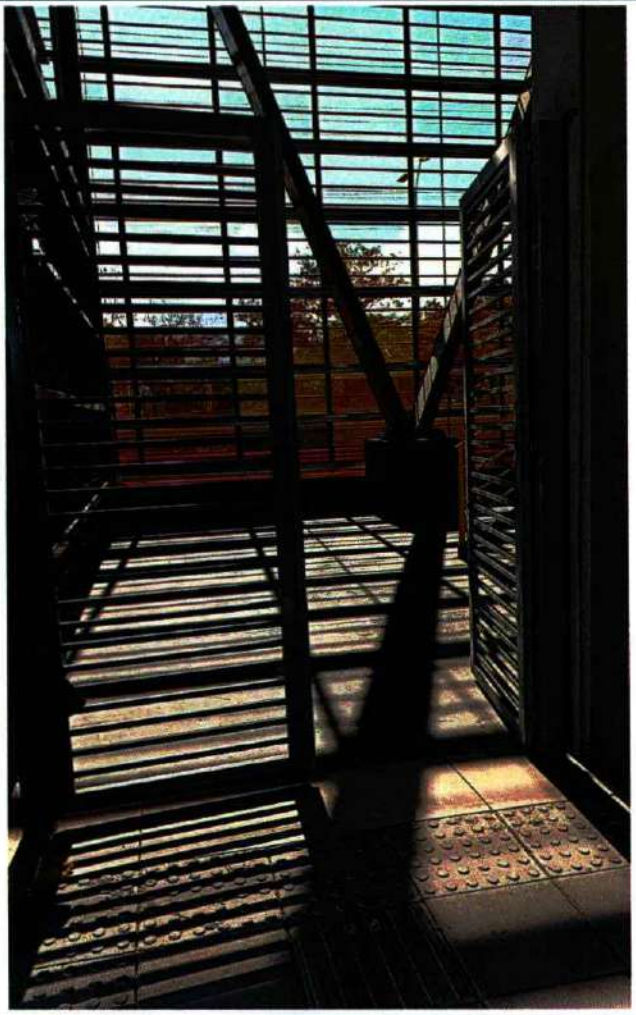

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507209079650147

Firma

Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

CAPITULO 11

CANCHA DE BALONCESTO.

OBRAS EXTERIORES.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**OBRAS EXTERIORES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M3**
11.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	AREA	CANTIDAD	
RELLENO		0.20	628.92	1.00	125.78
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**125.78**
PASAN:				**TOTAL**	**125.78**

OBSERVACIONES:

1.**Cobro Actual:** Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**271.74**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**125.78**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**0.00**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PACIAL No. 07	**125.78**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**145.96**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

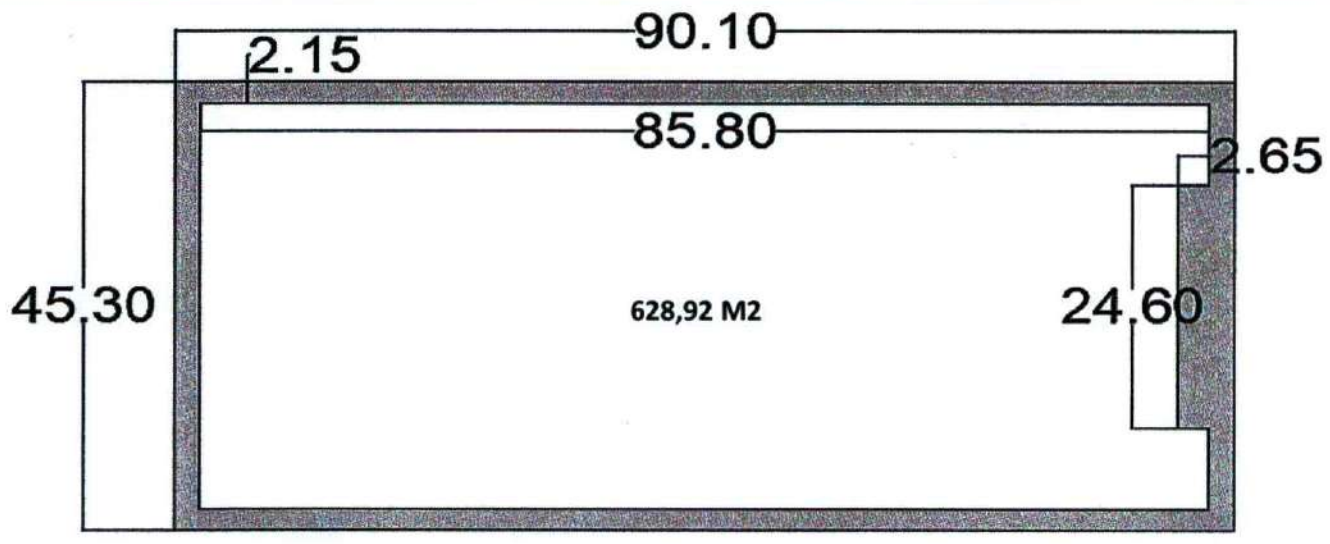

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-75650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CUBIERTA Y FACHADA**	**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ML**
11.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**OBRAS EXTERIORES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**ML**
NP11.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
SUR			45.61	1.00	45.61
NORTE			45.61	1.00	45.61
ORIENTE			90.26	1.00	90.26
OCCIDENTE			90.26	1.00	90.26
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**271.74**
PASAN:				**TOTAL**	**271.74**

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**271.74**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**271.74**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**0.00**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PACIAL No. 07	**271.74**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

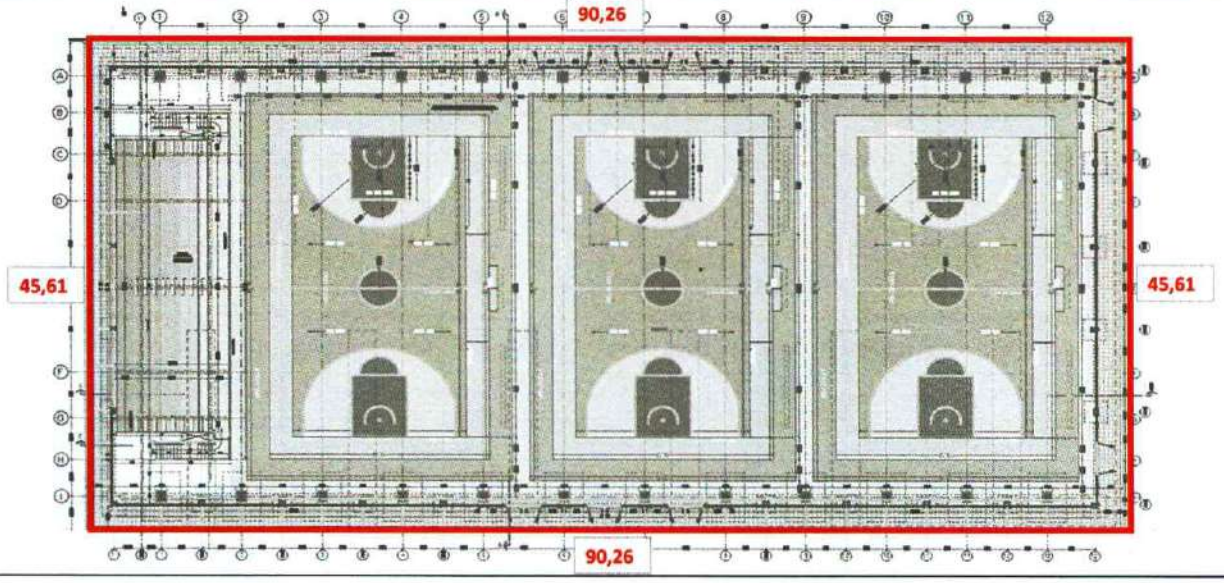

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7960014

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CUBIERTA Y FACHADA**	**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ML**
NP11.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

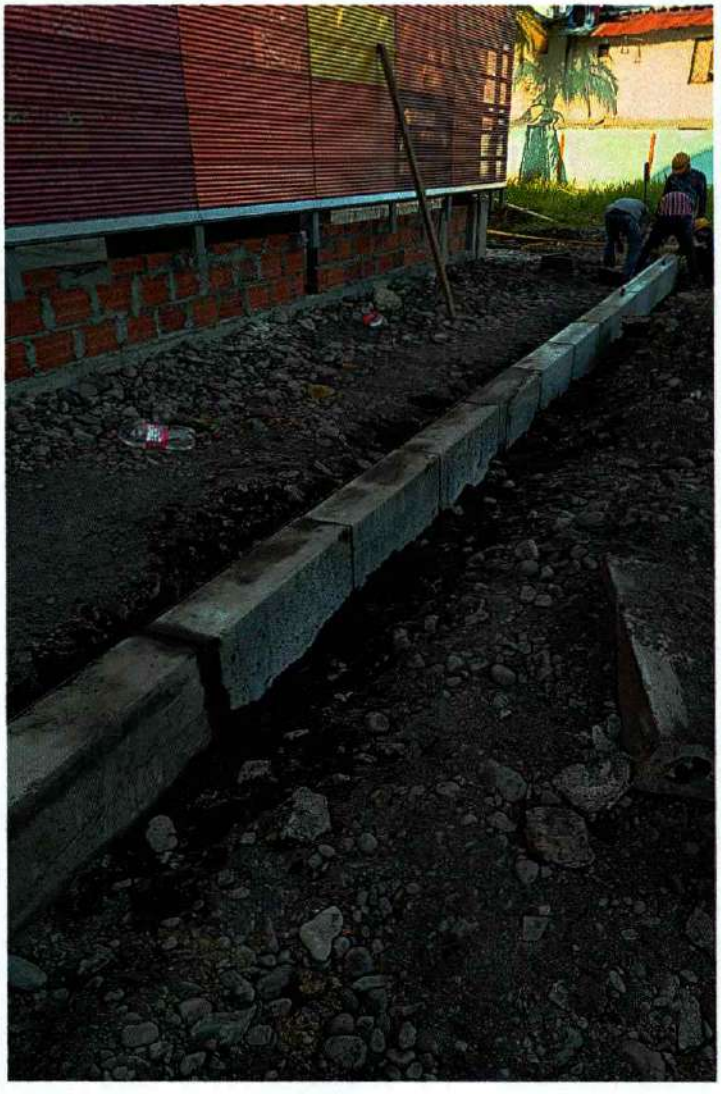



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-7960147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**OBRAS EXTERIORES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**ML**
NP11.5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 80X20X12 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
Norte			2.03	11.00	22.33
Sur			2.03	4.00	8.12
			4.57	6.00	27.42
Oriente			2.03	21.00	42.63
Occidente			2.03	21.00	42.63
VIENEN:	0.00			**SUBTOTAL**	143.13
PASAN:	0.00			**TOTAL**	143.13


OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

2.Ver Plano: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Este documento contiene la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	143.13
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	143.13
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PACIAL No. 07	143.13
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

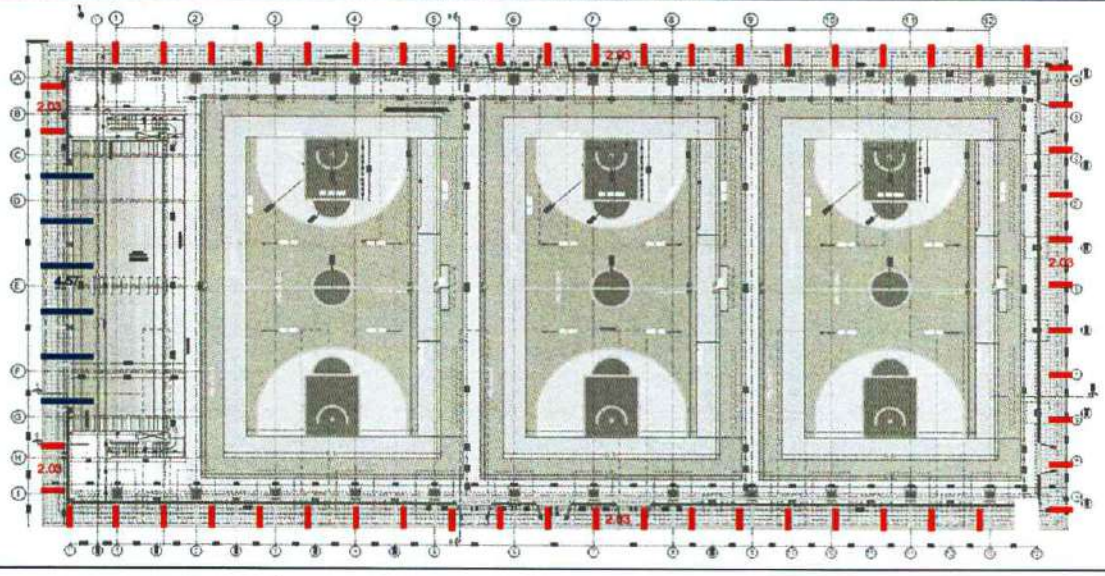

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-99650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	CUBIERTA Y FACHADA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP11.5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 80X20X12 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

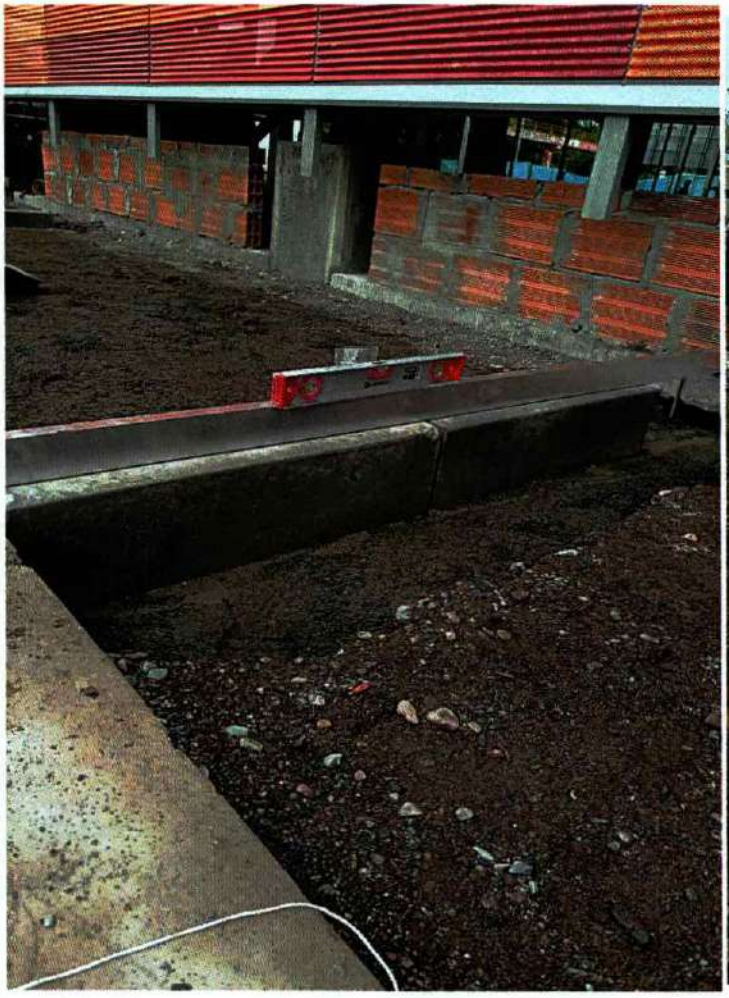



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25073000-76650947

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090397 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153986 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	CUBIERTA Y FACHADA	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP11.5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 80X20X12 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



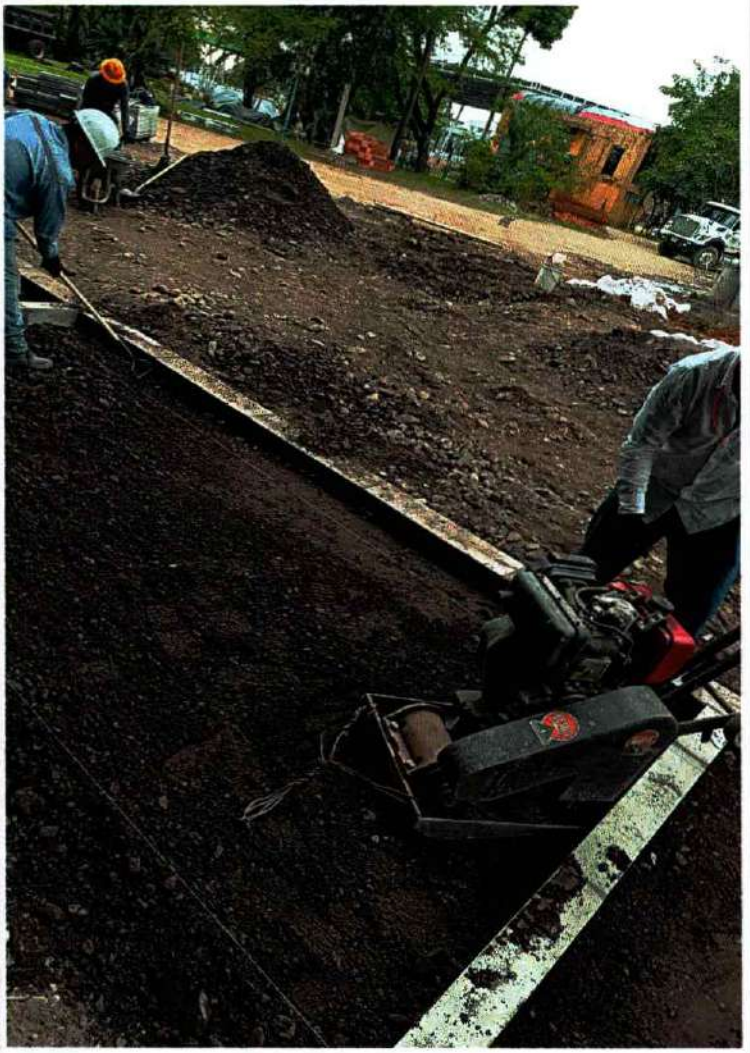

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**OBRAS EXTERIORES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA A-50 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M) TIPO IDU	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	AREA	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
NORTE	2.02		3.69	2.00	14.91
	2.02		4.05	8.00	65.45
SUR	2.02		4.05	2.00	16.36
		12.77		2.00	25.54
	4.56		4.05	5.00	92.34
Menos pedestales	0.40		0.60	-4.00	-0.96
Menos cajas sanitarias	0.80		0.80	-2.00	-1.28
	1.00		1.00	-2.00	-2.00
Menos loseta alerta y guía	0.40		0.40	-166.00	-26.56
ORIENTE	2.02		3.07	1.00	6.20
	2.02		4.05	20.00	163.62
		9.69		1.00	9.69
OCCIDENTE	2.02		3.07	1.00	6.20
	2.02		4.05	20.00	163.62
		9.69		1.00	9.69
VIENEN:	0.00			**SUBTOTAL**	542.82
PASAN:	0.00			**TOTAL**	542.82


OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

2.Ver Plano: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar ([redacted]) Este documento contiene la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**542.82**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**542.82**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**0.00**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PACIAL No. 07	**542.82**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

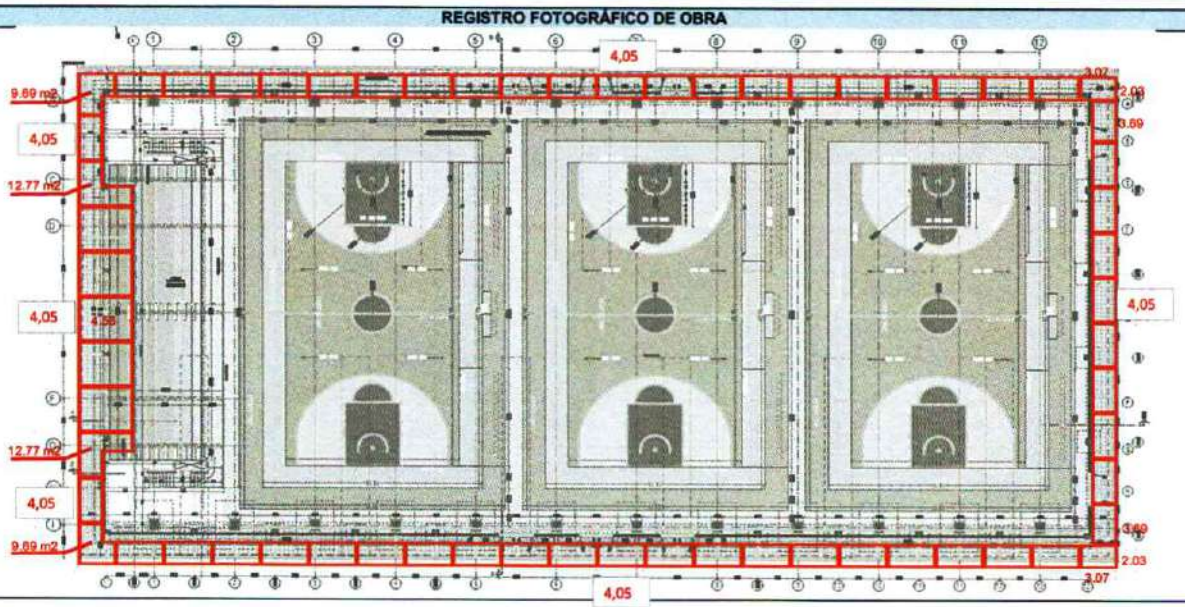

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2502000-78650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND


Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CUBIERTA Y FACHADA**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA A-50 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M) TIPO IDU	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

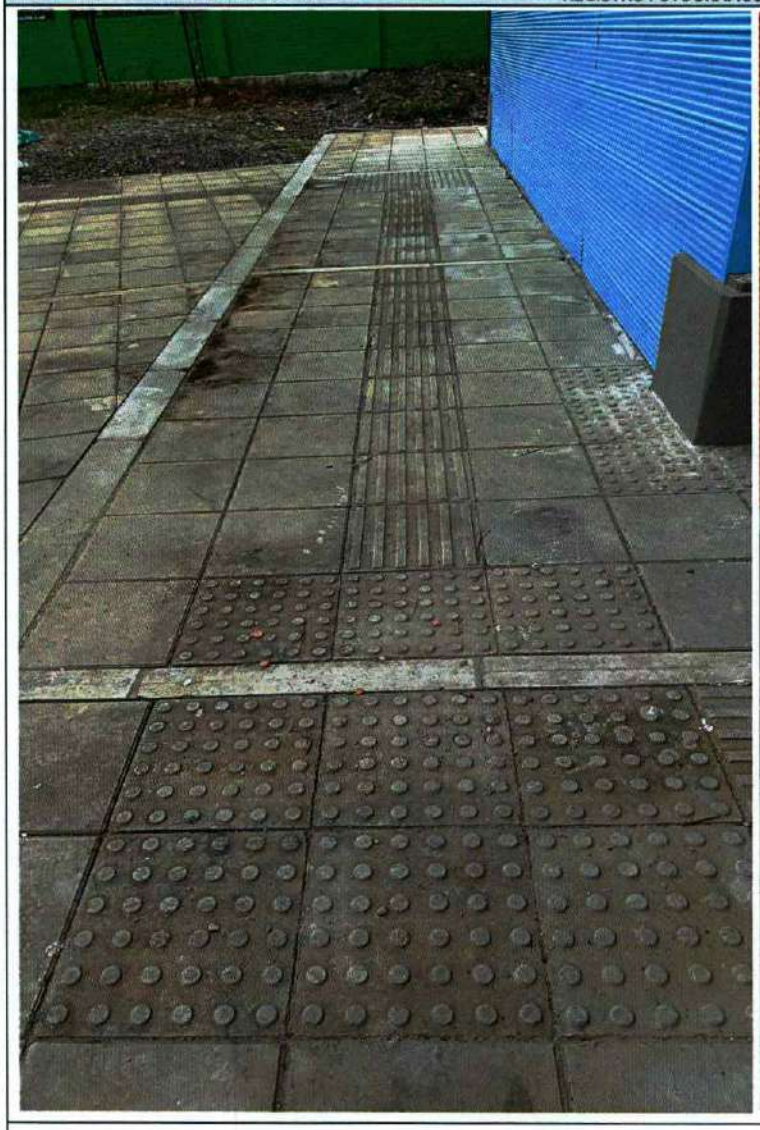

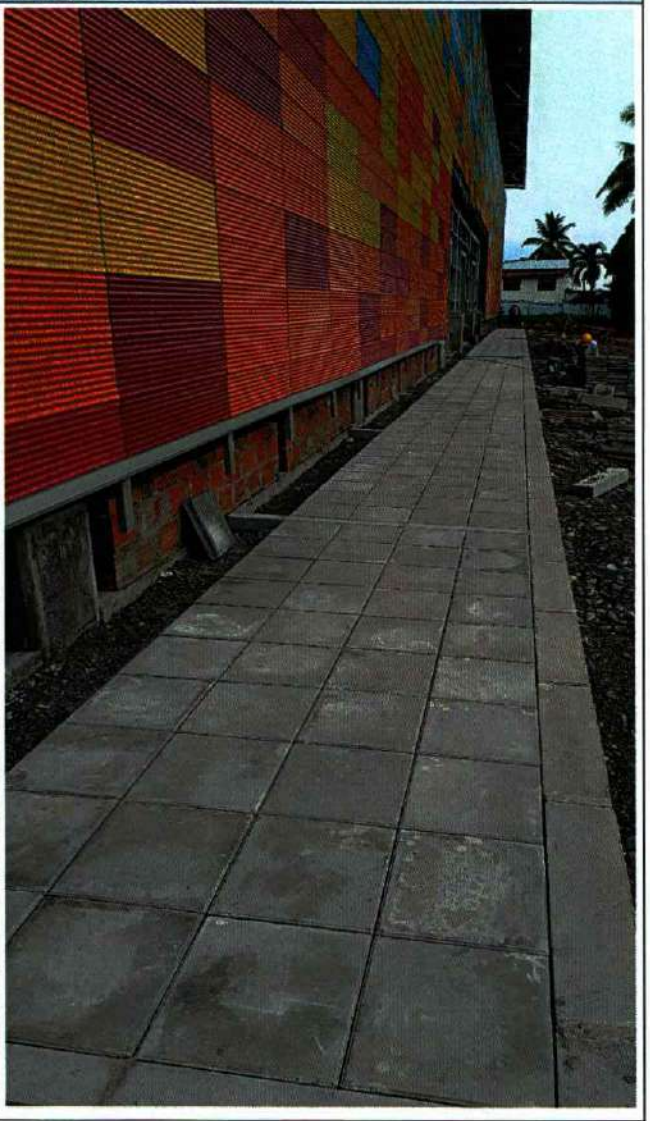

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7965018

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 5701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CUBIERTA Y FACHADA**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA A-50 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M) TIPO IDU	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79550143

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**OBRAS EXTERIORES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**ML**
NP11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA TOPEROL A-55 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M)	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	AREA	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCENARIO DE BALONCESTO					
LOSETA TOPEROL - SUR			0.40	89.00	35.60
VIENEN:	0.00			**SUBTOTAL**	**35.60**
PASAN:	0.00			**TOTAL**	**35.60**

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejen el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)		**35.60**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		**35.60**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES		**0.00**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA	**PACIAL No. 07**	**35.60**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR		**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

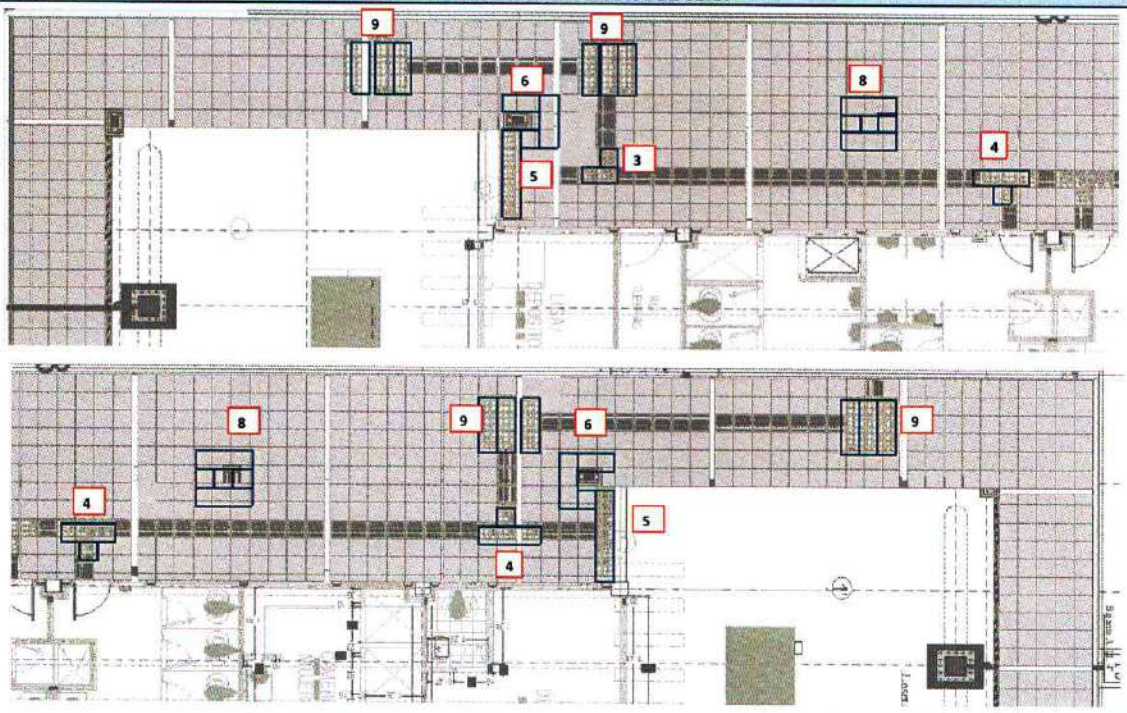

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-09650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	CUBIERTA Y FACHADA	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA TOPEROL A-55 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7966014

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153998 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

CAPITULO 12

CANCHA DE BALONCESTO.

PISOS Y ENCHAPES.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	PISOS Y ENCHAPES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
NP12.8	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	PERIMETRO	CANTIDAD	
BAÑO LIGA/DEPÓSITO					
ES UNA SECCIÓN DE		1.825	5.35	1.00	9.76
VIENEN:				SUBTOTAL	9.76
PASAN:	9.76			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

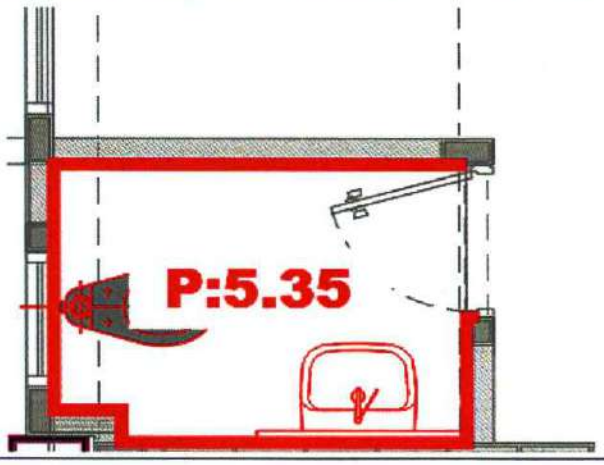

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-73650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	PISOS Y ENCHAPES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
NP12.8	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	PERIMETRO	CANTIDAD	
CAMERINO MUJERES					
ES UNA SECCIÓN DE		1.81	28.29	1.00	51.20
ES UNA SECCIÓN DE	1.80	0.135		-1.00	-0.24
VIENEN:	9.76			SUBTOTAL	50.96
PASAN:	60.72			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

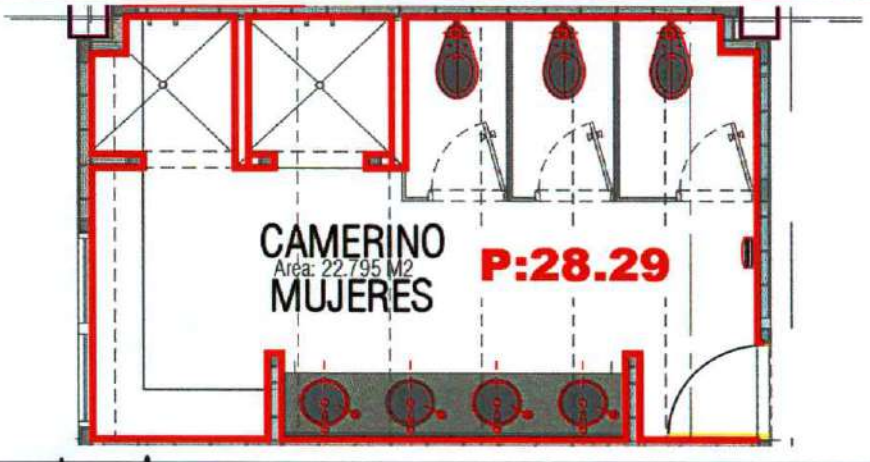

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**PISOS Y ENCHAPES**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP12.8	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	PERIMETRO	CANTIDAD	
W.C. MUJERES					
ES UNA SECCIÓN DE		1.81	19.98	1.00	36.16
ES UNA SECCIÓN DE	1.80	0.15		-1.00	-0.27
VIENEN:	60.72			SUBTOTAL	35.89
PASAN:	96.61			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

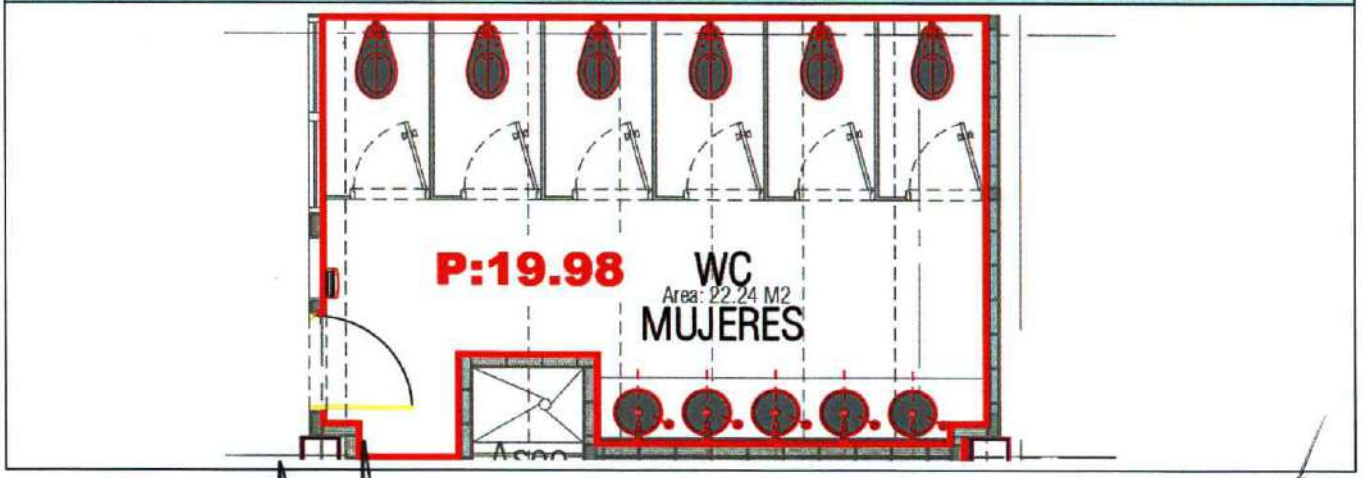

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	PISOS Y ENCHAPES	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	M2
NP12.8	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	PERIMETRO	CANTIDAD	
W.C. HOMBRES					
ES UNA SECCIÓN DE		1.81	27.40	1.00	49.59
ES UNA SECCIÓN DE	1.795	0.135		-1.00	-0.24
VIENEN:	96.61			SUBTOTAL	49.35
PASAN:	145.96			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

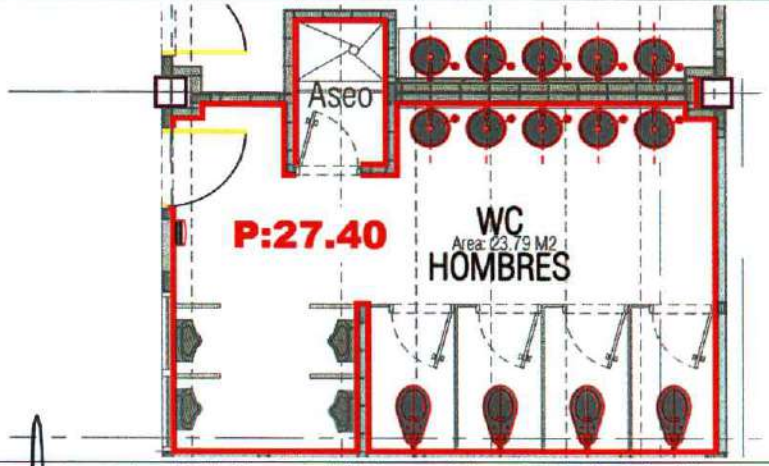

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25172080-7985017

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	PISOS Y ENCHAPES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
NP12.8	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	PERIMETRO	CANTIDAD	
CAMERINO HOMBRES					
ES UNA SECCIÓN DE		1.826	29.40	1.00	53.68
ES UNA SECCIÓN DE	1.80	0.14		-1.00	-0.25
VIENEN:	145.96			SUBTOTAL	53.43
PASAN:	199.39			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 8250720000-19650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	PISOS Y ENCHAPES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
NP12.8	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	PERIMETRO	CANTIDAD	
WC PMR					
ES UNA SECCIÓN DE		1.83	9.785	1.00	17.91
CAMERINOS MUJERES					
SECCIONES DE	0.60	0.83		4.00	1.99
SECCIONES DE	0.14	0.83		3.00	0.35
SECCIÓNES DE	0.44	0.36		6.00	0.95
SECCIÓNES DE	0.14	0.36		4.00	0.20
CAMERINOS HOMBRES					
SECCIÓNES DE	0.42	0.36		4.00	0.60
SECCIÓNES DE	0.14	0.36		3.00	0.15
SECCIONES DE	0.46	0.83		4.00	1.53
SECCIONES DE	0.14	0.83		3.00	0.35
WC HOMBRES Y MUJERES					
SECCIONES DE	0.14	0.83		2.00	0.23
SECCIONES DE	0.60	0.83		4.00	1.99
VIENEN:	199.39			SUBTOTAL	26.25
PASAN:	225.64			TOTAL	225.64


OBSERVACIONES:

1. Pagos Anteriores: Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en anteriores Parciales.
2.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	225.64
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	225.64
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	217.30
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PACIAL No. 07	8.34
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

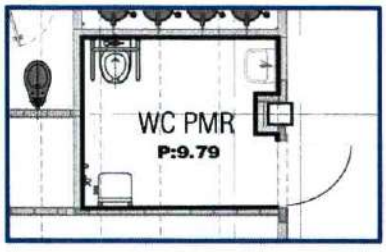

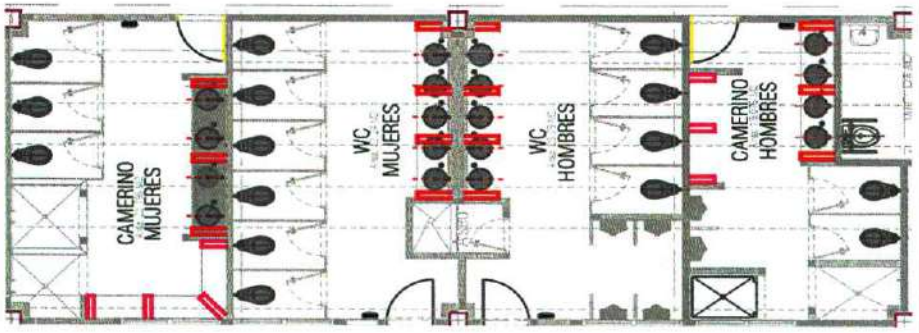

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072004-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CUBIERTA Y FACHADA**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP12.8	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



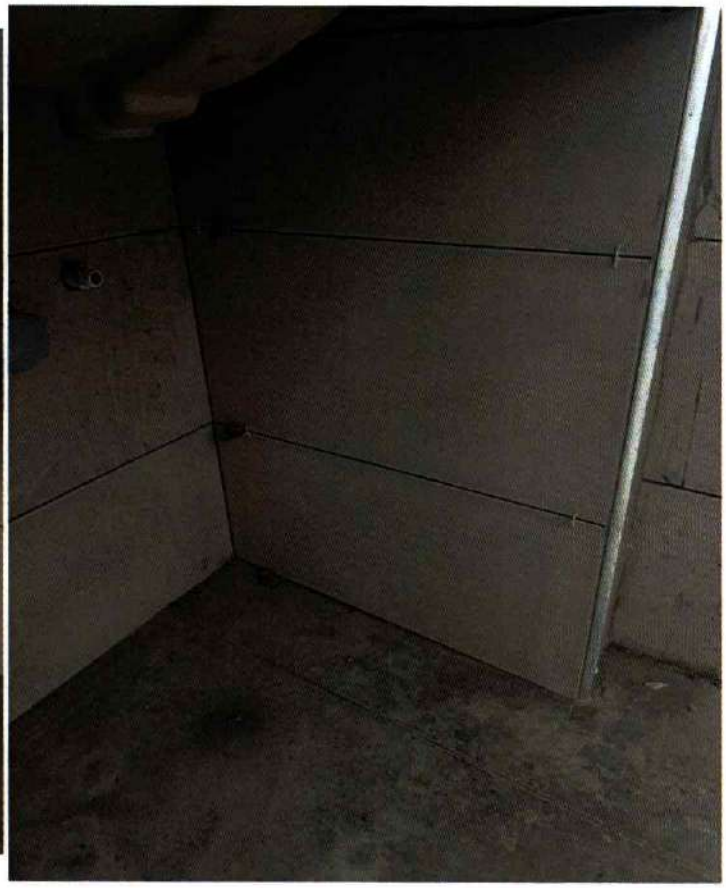

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850447

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CUBIERTA Y FACHADA**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP12.8	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



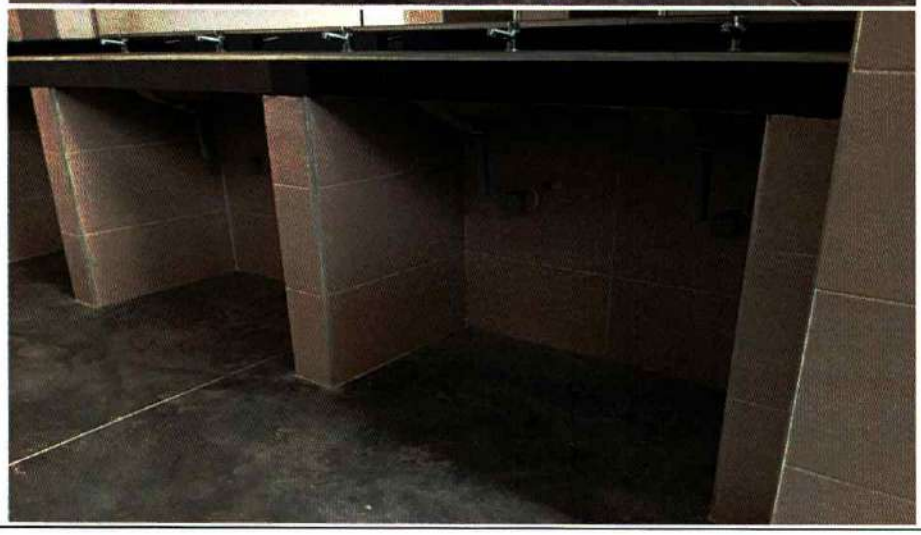

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ALVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

CAPITULO 13

CANCHA DE BALONCESTO. ACABADOS.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
BAÑO LIGA / DEPOSITO					
ES UNA SECCIÓN DE		0.73	0.59	1.00	0.43
ES UNA SECCIÓN DE		0.73	1.53	1.00	1.12
ES UNA SECCIÓN DE		0.73	0.15	1.00	0.11
ES UNA SECCIÓN DE		0.73	0.30	1.00	0.22
ES UNA SECCIÓN DE		0.73	1.14	1.00	0.83
ES UNA SECCIÓN DE		0.73	1.83	1.00	1.34
VANO DE VENTANA		0.60	0.63	-1.00	-0.38
VIENEN:				SUBTOTAL	3.67
PASAN:	3.67			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

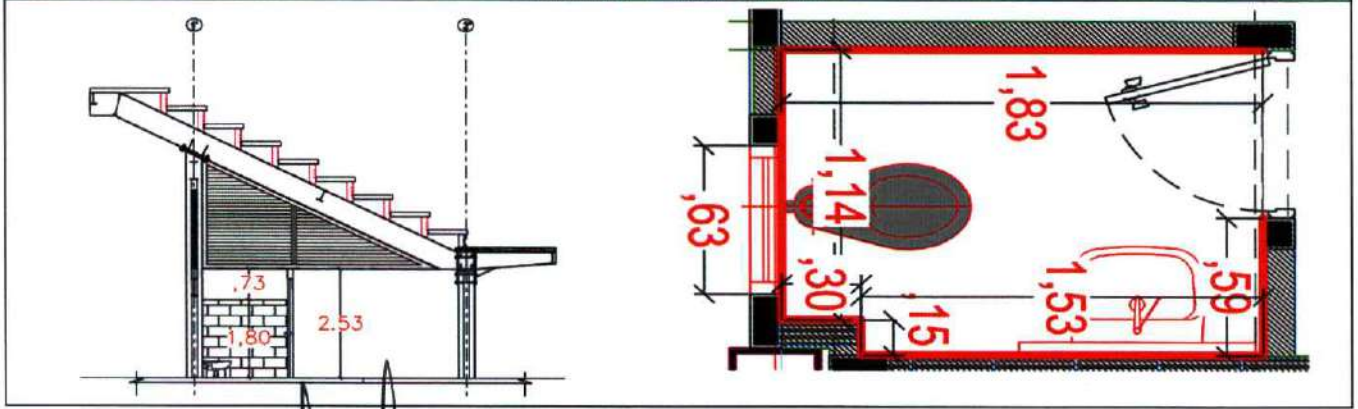

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-2000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
LIGA / DEPOSITO					
UNA SECCIÓN DE		2.53	2.82	1.00	7.13
UNA SECCIÓN DE		2.53	0.15	1.00	0.38
UNA SECCIÓN DE		2.53	0.03	1.00	0.08
UNA SECCIÓN DE		2.53	3.70	1.00	9.36
UNA SECCIÓN DE		2.53	0.59	1.00	1.49
UNA SECCIÓN DE		2.53	0.12	1.00	0.30
UNA SECCIÓN DE		2.53	1.95	1.00	4.93
UNA SECCIÓN DE		2.53	2.57	1.00	6.50
UNA SECCIÓN DE		2.53	0.14	1.00	0.35
UNA SECCIÓN DE		2.53	0.20	1.00	0.51
UNA SECCIÓN DE		2.53	5.50	1.00	13.92
UNA SECCIÓN DE		2.53	0.20	1.00	0.51
VANO DE VENTANA		1.50	1.80	-1.00	-2.70
VIENEN:	3.67			SUBTOTAL	42.76
PASAN:	46.43			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

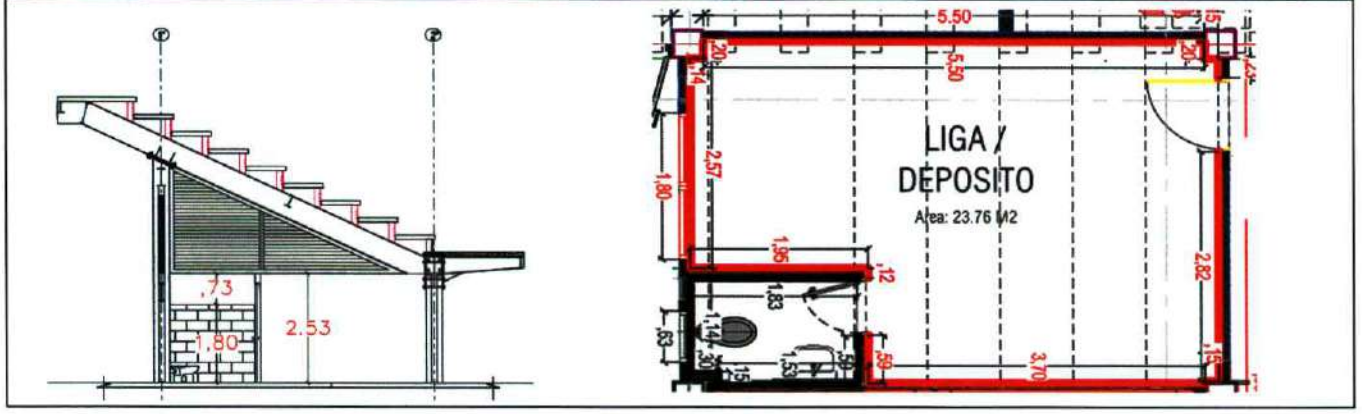

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional A25072000-9650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
CAMERINO MUJERES					
UNA SECCIÓN DE		0.73	2.66	1.00	1.94
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.31	1.00	0.23
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.32	1.00	0.23
UNA SECCIÓN DE		0.73	2.75	1.00	2.01
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.38	1.00	1.01
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.35	1.00	0.26
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.12	5.00	0.44
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.22	1.00	0.16
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.26	2.00	1.84
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.25	1.00	0.91
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.22	1.00	0.16
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.34	1.00	0.25
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.38	1.00	1.01
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.95	1.00	0.69
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.34	1.00	0.25
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.30	1.00	0.22
VIENEN:	46.43			SUBTOTAL	11.61
PASAN:	58.04			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

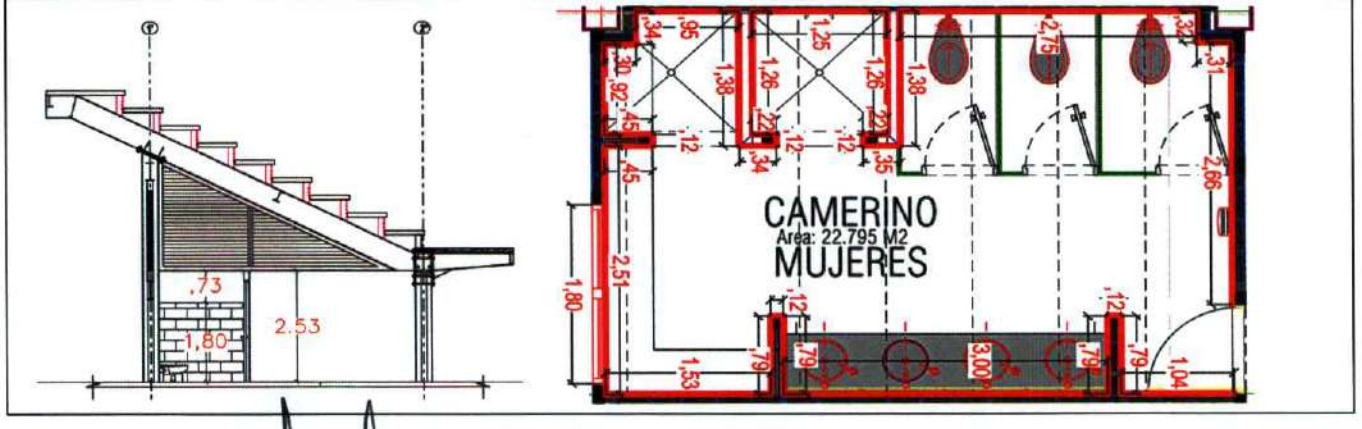

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-19650143

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.92	1.00	0.67
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.45	2.00	0.66
UNA SECCIÓN DE		0.73	2.51	1.00	1.83
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.53	1.00	1.12
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.79	4.00	2.31
UNA SECCIÓN DE		0.73	3.00	1.00	2.19
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.04	1.00	0.76
SE RESTA LA VANO DE VENTANA		0.60	1.80	-1.00	-1.08
VIENEN:	58.04			SUBTOTAL	8.46
PASAN:	66.50			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

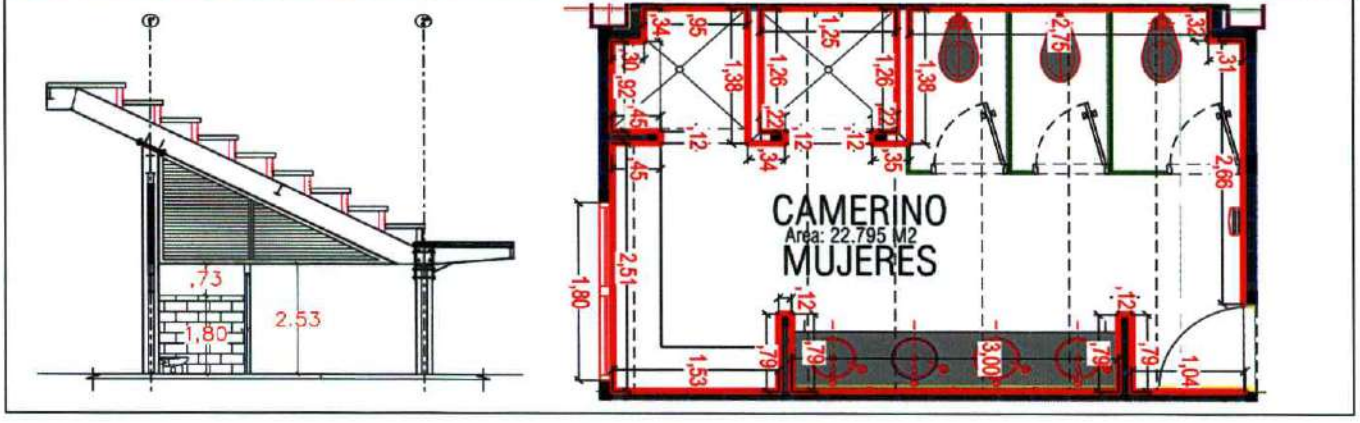

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507[illegible]

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
WC MUJERES					
UNA SECCIÓN DE		0,73	2,72	1,00	1,99
UNA SECCIÓN DE		0,73	5,80	1,00	4,23
UNA SECCIÓN DE		0,73	3,73	1,00	2,72
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,18	1,00	0,13
UNA SECCIÓN DE		0,73	3,09	1,00	2,26
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,81	1,00	0,59
UNA SECCIÓN DE		0,73	1,21	1,00	0,88
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,94	1,00	0,69
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,87	1,00	0,64
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,31	2,00	0,45
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,11	1,00	0,08
SE RESTA LA VANO DE VENTANA		0,60	1,80	-1,00	-1,08
VIENEN:	66,50			SUBTOTAL	13,58
PASAN:	80,08			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

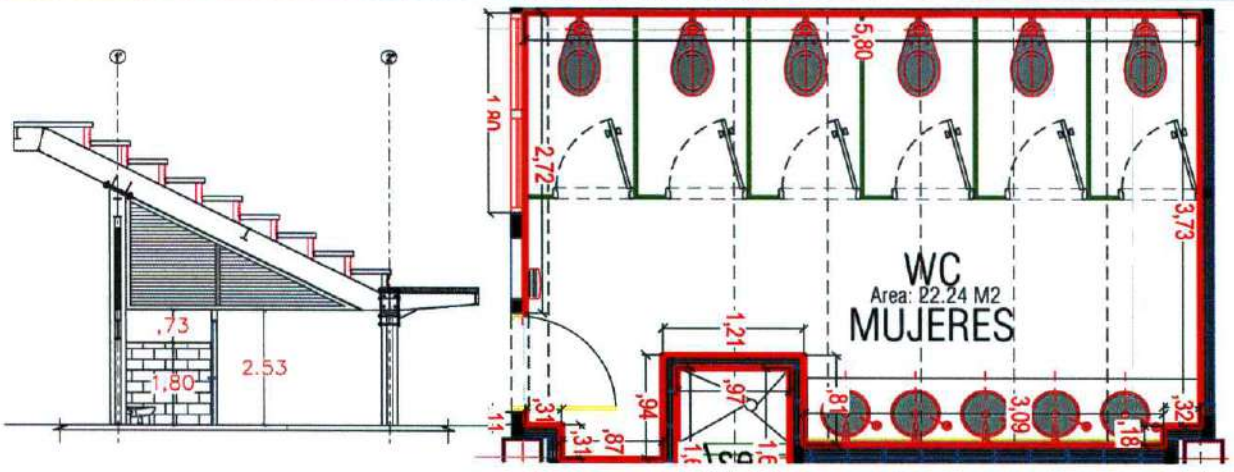

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
WC HOMBRES					
UNA SECCIÓN DE		0,73	2,73	1,00	1,99
UNA SECCIÓN DE		0,73	1,96	1,00	1,43
UNA SECCIÓN DE		0,73	1,67	2,00	2,44
UNA SECCIÓN DE		0,73	3,72	1,00	2,72
UNA SECCIÓN DE		0,73	3,73	1,00	2,72
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,31	1,00	0,23
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,16	1,00	0,12
UNA SECCIÓN DE		0,73	3,09	1,00	2,26
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,81	1,00	0,59
UNA SECCIÓN DE		0,73	1,21	1,00	0,88
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,80	1,00	0,58
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,87	1,00	0,64
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,16	1,00	0,12
UNA SECCIÓN DE		0,73	0,31	1,00	0,23
SE RESTA VANO DE VENTANA		0,60	1,80	-1,00	-1,08
VIENEN:	80,08			SUBTOTAL	15,87
PASAN:	95,95			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

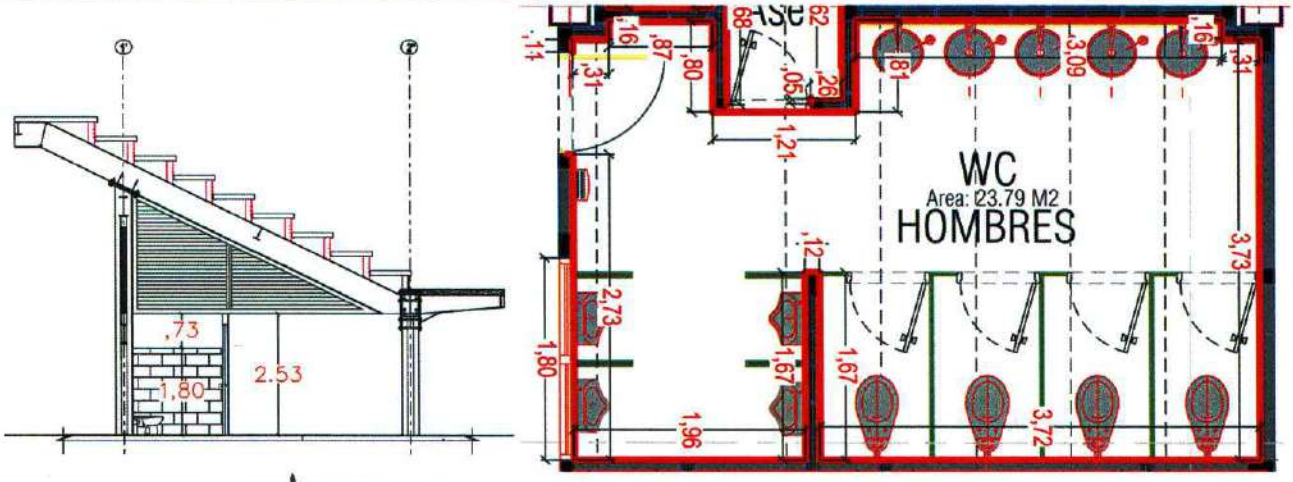

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79690147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
CAMERINO HOMBRES					
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.70	1.00	1.24
UNA SECCIÓN DE		0.73	2.65	1.00	1.93
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.60	1.00	0.44
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.12	6.00	0.53
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.78	1.00	1.30
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.86	1.00	1.36
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.65	2.00	2.41
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.75	1.00	0.55
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.24	1.00	0.18
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.30	1.00	0.22
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.30	1.00	0.95
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.25	2.00	0.37
UNA SECCIÓN DE		0.73	2.13	1.00	1.55
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.90	1.00	0.66
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.35	2.00	1.97
SE RESTA LA VANO DE VENTANA		0.60	1.80	-1.00	-1.08
VIENEN:	95.95			SUBTOTAL	14.58
PASAN:	110.53			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

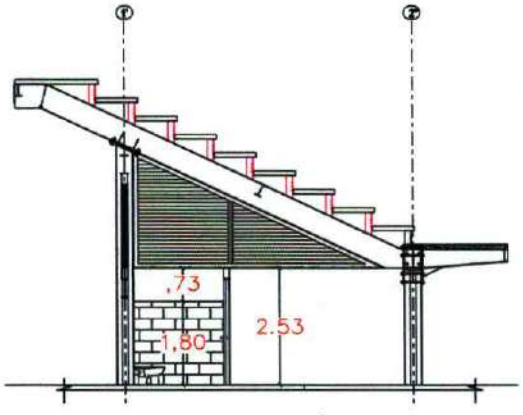

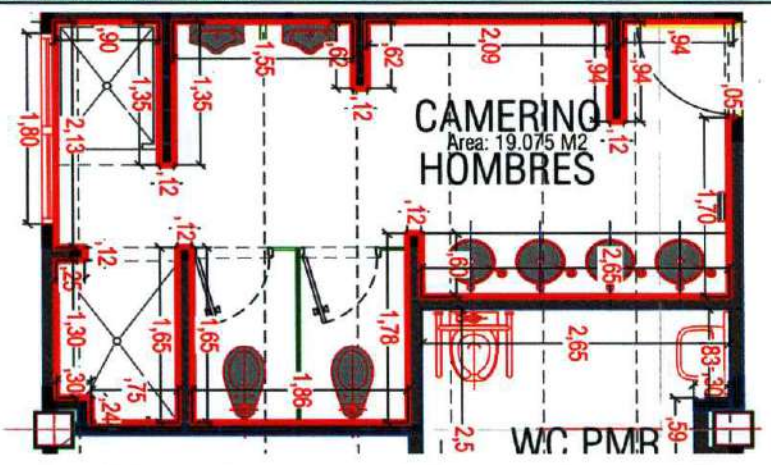

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200[illegible]-79654147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.55	1.00	1.13
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.62	2.00	0.91
UNA SECCIÓN DE		0.73	2.09	1.00	1.53
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.94	3.00	2.06
VIENEN:	110.53			SUBTOTAL	5.63
PASAN:	116.16			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

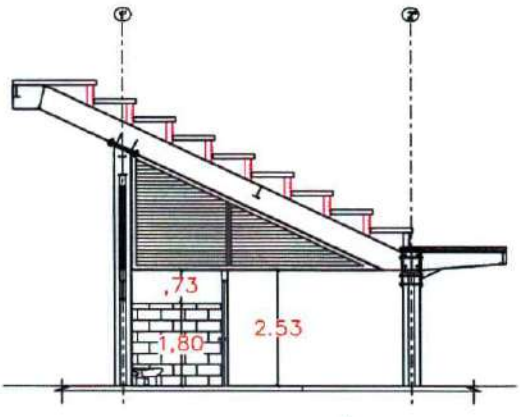

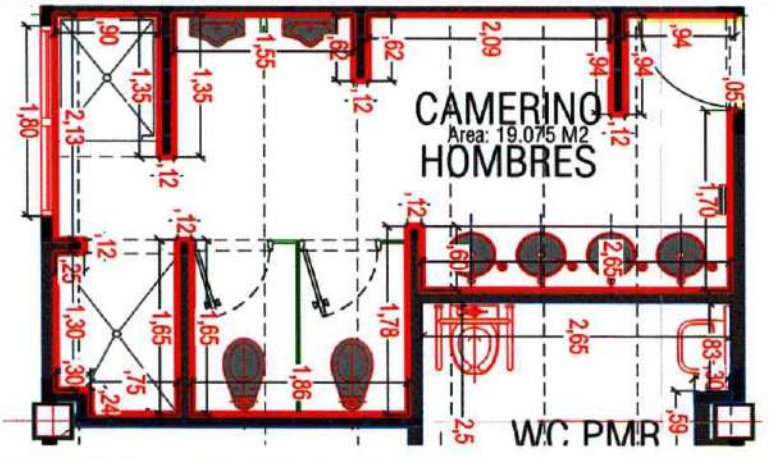

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
ASEO					
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.26	1.00	0.19
UNA SECCIÓN DE		0.73	1.62	2.00	2.37
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.97	1.00	0.71
WC PMR					
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.11	1.00	0.08
DOS SECCIONES DE		0.73	0.30	2.00	0.44
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.59	1.00	0.43
UNA SECCIÓN DE		0.73	0.83	1.00	0.61
DOS SECCIONES DE		0.73	2.65	2.00	3.87
UNA SECCIÓN DE		0.73	2.53	1.00	1.85
VIENEN:	116.16			SUBTOTAL	10.55
PASAN:	126.71			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

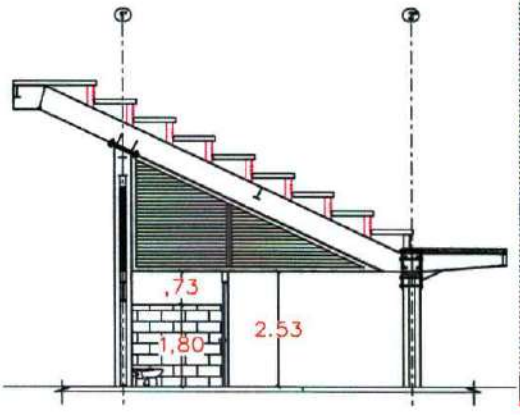

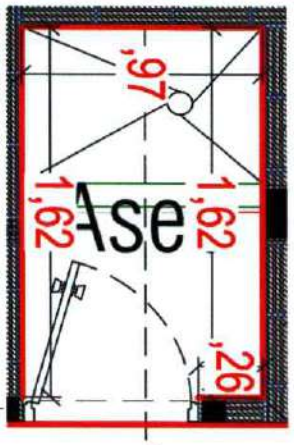

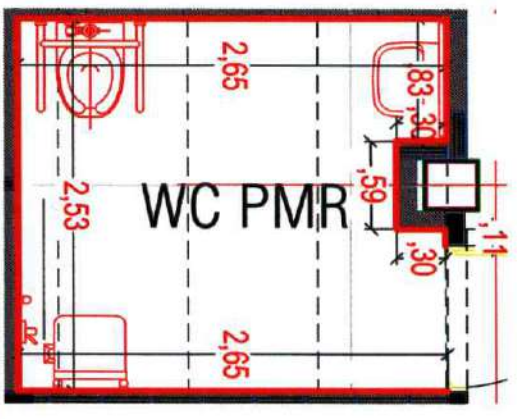

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-7965014

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
RCI-TUBERIAS					
UNA SECCIÓN DE		2,53	0,23	1,00	0,58
UNA SECCIÓN DE		2,53	0,15	1,00	0,38
UNA SECCIÓN DE		2,53	0,12	1,00	0,30
UNA SECCIÓN DE		2,53	2,88	1,00	7,29
UNA SECCIÓN DE		2,53	1,35	1,00	3,42
UNA SECCIÓN DE		2,53	3,03	1,00	7,67
LIGA / DEPOSITO					
UNA SECCIÓN DE		2,53	1,47	1,00	3,72
UNA SECCIÓN DE		2,53	5,80	1,00	14,67
UNA SECCIÓN DE		2,53	2,60	1,00	6,58
UNA SECCIÓN DE		2,53	0,15	2,00	0,76
SON DOS SECCIONES DE		2,53	0,20	2,00	1,01
UNA SECCIÓN DE		2,53	5,50	1,00	13,92
UNA SECCIÓN DE		2,53	0,23	1,00	0,58
VANO DE VENTANA		0,60	1,80	-1,00	-1,08
VIENEN:	126,71			**SUBTOTAL**	**59,80**
PASAN:	186,51			**TOTAL**	**186,51**

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (PARCIAL No. 07)	**186,51**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**186,51**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**0,00**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**186,51**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

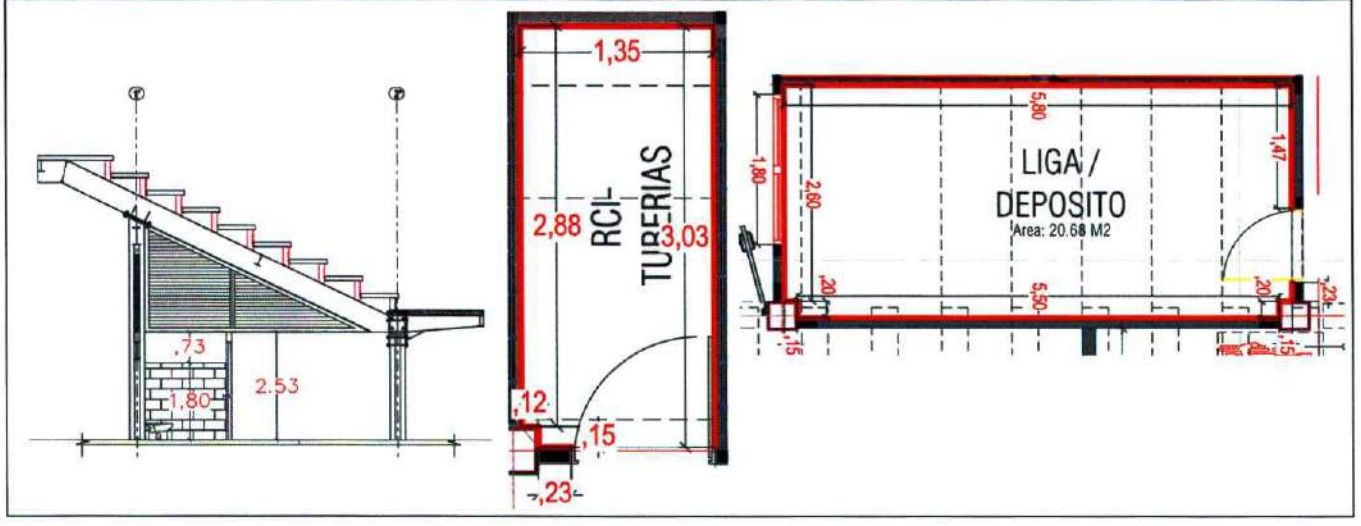

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND


Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO Nº	963 DE 2022	PROYECTO Nº	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PACIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

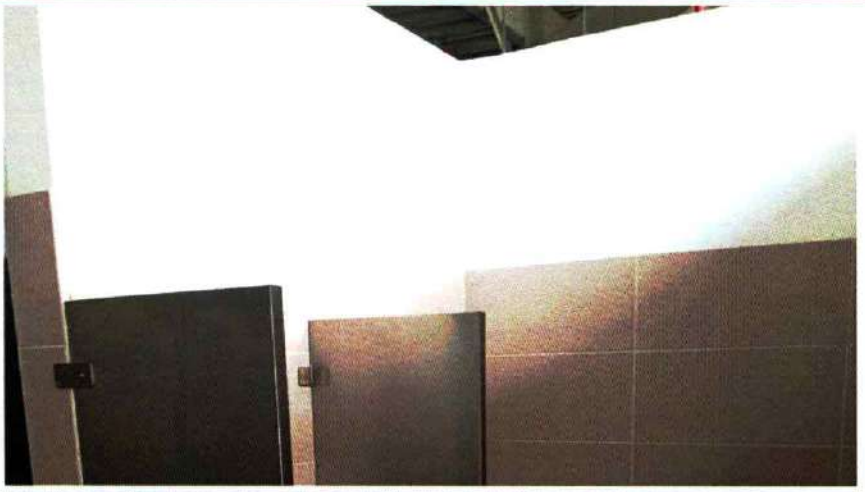



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
Nº Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Nº Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
Nº Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma


Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nº Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PACIAL No. 07**	
CAPITULO:	**ACABADOS**	**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

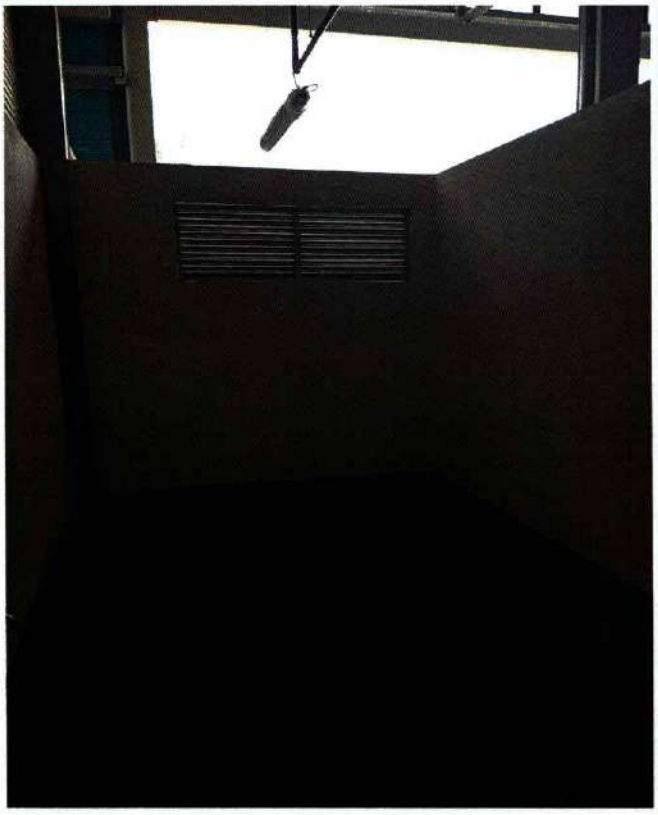



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7965014

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	COLOR	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
FACHADA PRINCIPAL					
Muro Eje C - D		0.20	3.95	1.00	0.79
Muro Eje C - D		2.30	0.67	1.00	1.54
Muro Eje C - D y F - G		1.70	1.80	1.00	3.06
Muro Eje C - D		1.49	1.70	1.00	2.53
Muro Eje C - D		0.60	0.62	1.00	0.37
Muro Eje C - D		0.60	0.22	1.00	0.13
Muro Eje D - E		0.20	7.65	1.00	1.53
Muro Eje D - E		0.60	1.77	1.00	1.06
Muro Eje D - E		1.70	5.60	1.00	9.52
Muro Eje D - E Y E - F		0.23	0.60	2.00	0.28
Muro Eje D - E		2.30	0.92	1.00	2.12
Muro Eje D - E, E - F Y F - G		2.30	0.23	4.00	2.12
Muro Eje E - F		0.20	7.65	1.00	1.53
Muro Eje E - F		1.70	6.50	1.00	11.05
Muro Eje E - F		0.60	0.92	1.00	0.55
Muro Eje E - F		0.60	1.76	1.00	1.06
VIENEN:				SUBTOTAL	39.24
PASAN:	39.24			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

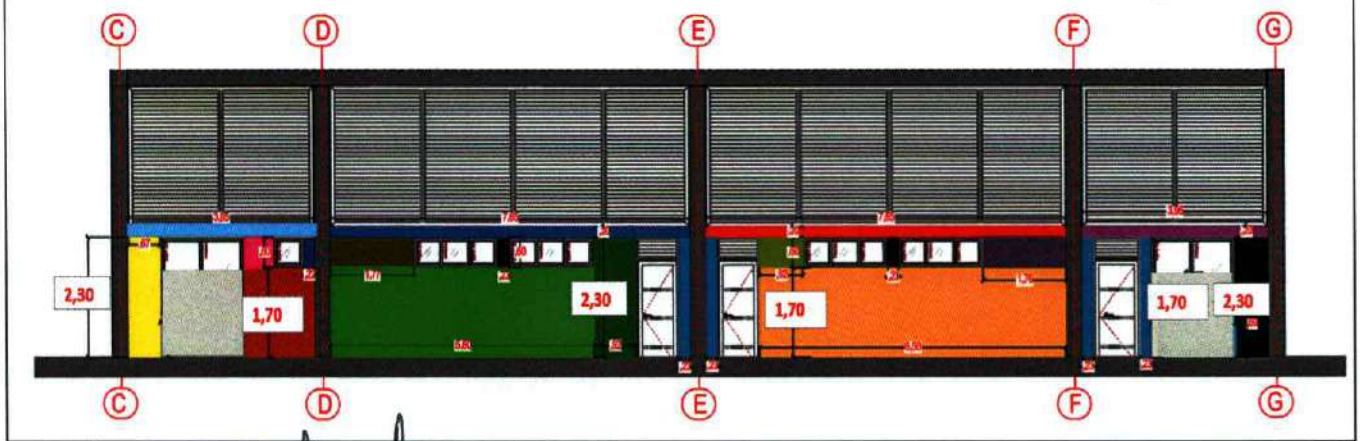

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	COLOR	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
Muro Eje F - G		0.20	3.95	1.00	0.79
Muro Eje F - G		2.30	0.69	1.00	1.59
Muro Eje F - G		1.70	1.80	1.00	3.06
FACHADA POSTERIOR					
Muro Eje G - F Y D - C		2.50	0.23	3.00	1.73
Muro Eje G - F		2.50	1.59	1.00	3.98
Muro Eje F - E		2.50	2.77	1.00	6.93
Muro Eje F - E Y E - D		2.50	3.97	2.00	19.85
Muro Eje E - D		2.50	2.78	1.00	6.95
Muro Eje D - C		2.50	2.82	1.00	7.05
Muro Eje G - F, F -E, E-D, D-C		0.20	0.90	4.00	0.72
Muro Eje G - F		0.20	1.00	1.00	0.20
VIENEN:	39.24			SUBTOTAL	52.85
PASAN:	92.09			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

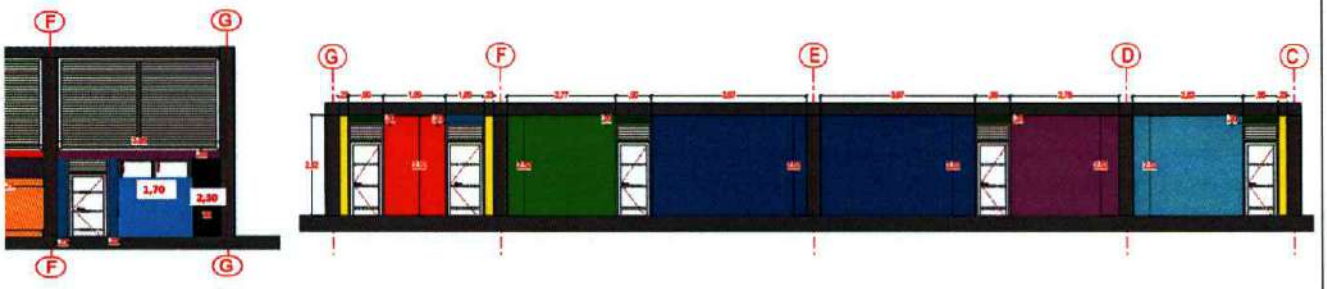

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507[illegible]

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
FACHADA LATERAL 1					
EJE G 1' - 2"	5.50	2.53		1.00	13.92
FACHADA LAETERAL 2					
EJE C 1" - 2"	5.50	2.53		1.00	13.92
VIENEN:	92.09			SUBTOTAL	27.84
PASAN:	119.93			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

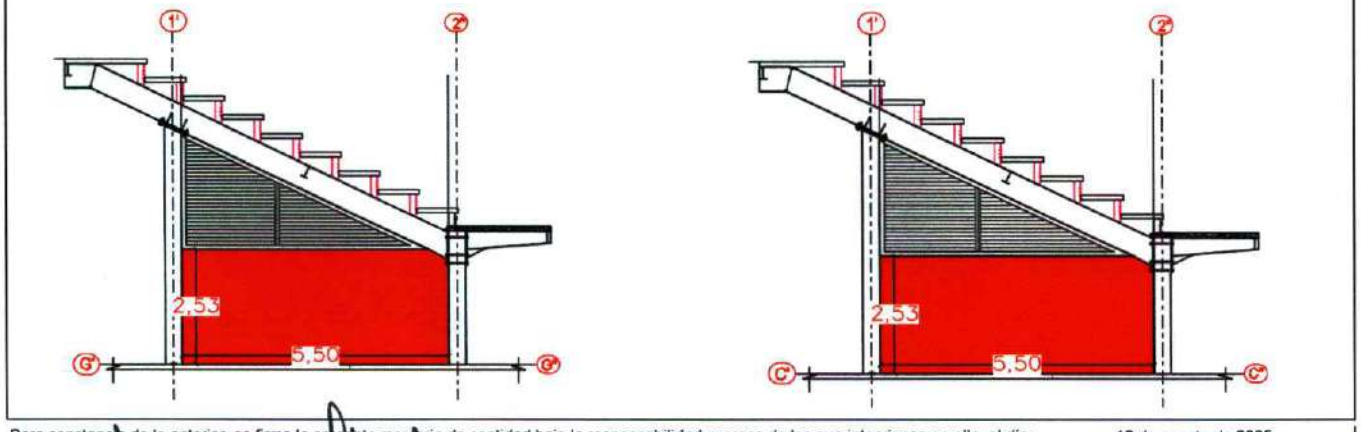

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: **GIOVANNY ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
MUROS FACHADA LONGITUDINAL EJE I					
MUROS ENTRE EJES 1´´-2					
	7.07	0.56		2.00	7.92
MUROS ENTRE EJES 2'-3' Y 3'-4',					
	6.45	0.56		4.00	14.45
MUROS ENTRE EJES 4´-5´					
	6.45	0.56		2.00	7.22
MUROS ENTRE EJES 5´-5					
	2.73	0.56		2.00	3.06
MUROS ENTRE EJES 8´-9					
	2.73	0.56		2.00	3.06
MUROS ENTRE EJES 9´-10' Y 11'-12					
	6.45	0.56		4.00	14.45
MUROS ENTRE EJES 10´-11'					
	6.45	0.56		2.00	7.22
MUROS ENTRE EJES 12-12'					
	7.07	0.56		2.00	7.92
PINTURA SUPERIOR MURO EJE I Y EJE A	0.12	58.30		2.00	13.99
VIENEN:	119.93			SUBTOTAL	79.29
PASAN:	199.22			TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

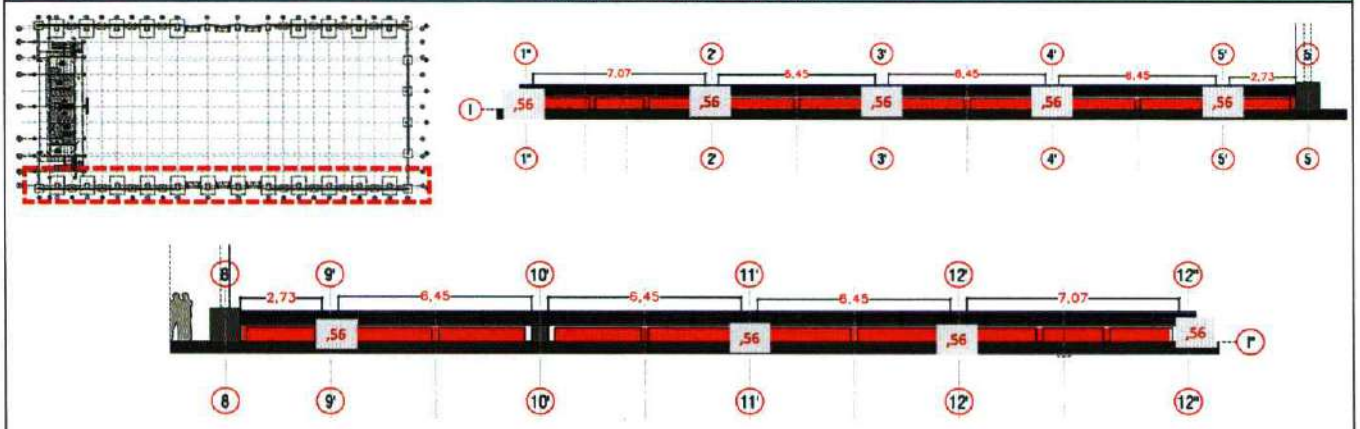

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7965014

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
MUROS FACHADA LONGITUDINAL EJE A					
MUROS ENTRE EJES 1''-2					
	7.07	0.56		2.00	7.92
MUROS ENTRE EJES 2'-3' Y 3'-4',					
	6.45	0.56		4.00	14.45
MUROS ENTRE EJES 4'-5'					
	6.45	0.56		2.00	7.22
MUROS ENTRE EJES 5'-5					
	2.73	0.56		2.00	3.06
MUROS ENTRE EJES 8'-9					
	2.73	0.56		2.00	3.06
MUROS ENTRE EJES 9'-10' Y 11'-12					
	6.45	0.56		4.00	14.45
MUROS ENTRE EJES 10'-11'					
	6.45	0.56		2.00	7.22
MUROS ENTRE EJES 12-12'					
	7.07	0.56		2.00	7.92
VIENEN:	199.22			SUBTOTAL	65.30
PASAN:	264.52			TOTAL	264.52

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7950147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
MUROS FACHADA NORTE EJE 12"					
MUROS ENTRE EJES F"- E"					
	7.25	0.56		2.00	8.12
MUROS ENTRE EJES E" - D"					
	7.35	0.56		2.00	8.23
MUROS ENTRE EJES D" - C"					
	7.25	0.56		2.00	8.12
PINTURA SUPERIOR MURO EJE I Y EJE A	0.12	21.85		1.00	2.62
VIENEN:	264.52			SUBTOTAL	27.09
PASAN:				TOTAL	291.61

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (PARCIAL No. 07)	291.61
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	291.61
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	291.61
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



FACHADA NORTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LARGO	CANTIDAD	
MUROS FACHADA NORTE EJE 12"					
MUROS ENTRE EJES F"- E"					
	7.25	0.56		2.00	8.12
MUROS ENTRE EJES E" - D"					
	7.35	0.56		2.00	8.23
MUROS ENTRE EJES D" - C"					
	7.25	0.56		2.00	8.12
PINTURA SUPERIOR MURO EJE I Y EJE A	0.12	21.85		1.00	2.62
VIENEN:	264.52			SUBTOTAL	27.09
PASAN:				TOTAL	291.61

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en NEGRO de esta memoria de cálculo representan los montos que se están cobrando en la presente parcial No. 05. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.
2.Ver Plano: Para obtener una mejor comprensión de las cantidades a cobrar, se debe consultar (xxxxxxxxxxxxxx) Este documento contiene la información gráfica necesaria para validar las mediciones y los montos presentados en esta memoria.

CANTIDAD ACTUALIZADA (PARCIAL No. 07)	291.61
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	291.61
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	217.30
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	74.31
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

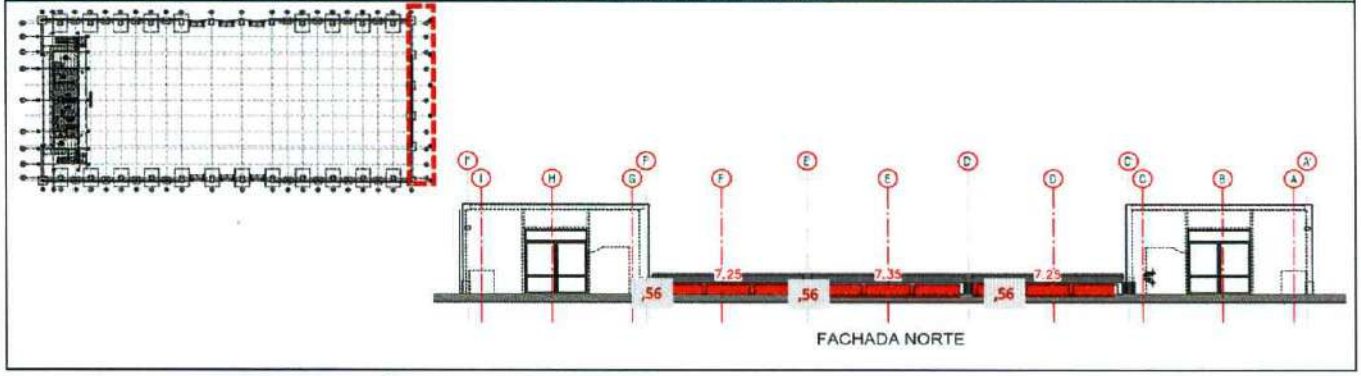

FACHADA NORTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	ACABADOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**ACABADOS**	**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 15 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

CAPITULO 15

CUBIERTA DE TENIS.

CIMENTACIÓN.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE TENNIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**KG**
15.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
ZAPATA					
Z6 - RH8	3/4"	2,235	4,15	616	5713,56
Z6 - RH9	3/4"	2,235	3,65	560	4568,34
Z5 - RH11	3/4"	2,235	3,55	133	1055,26
Z5 - RH11	3/4"	2,235	3,55	133	1055,26
PEDESTALES					
PD-2 - RV1	1"	3,973	3,89	714	11034,85
PD2 - E1	1/2"	0,994	4,04	630	2529,93
PD2 - E2	1/2"	0,994	1,09	2520	2730,32
PD2 - E3	1/2"	0,994	1,29	1890	2423,47
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**31.110,99**
PASAN:	**31110,99**			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:

1. **Pagos Anteriores:** Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en las anteriores parciales.
2. **Cobro Actual:** Las cantidad relacionados en **NEGRO** es donde se encuentra el 0,003 KG faltante por cobrar y que se esta cobrando en la presente acta parcial 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

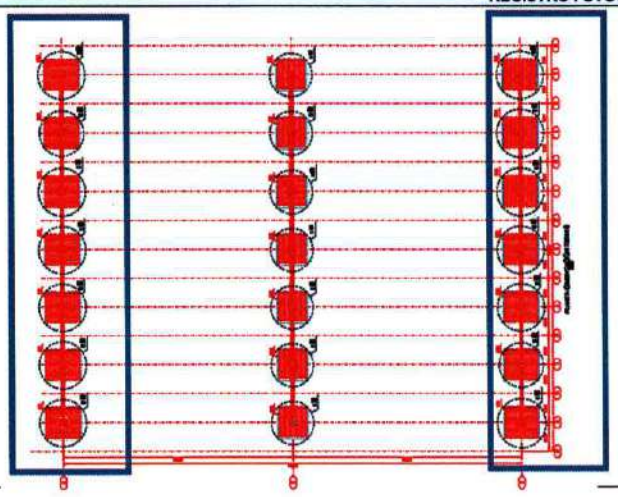

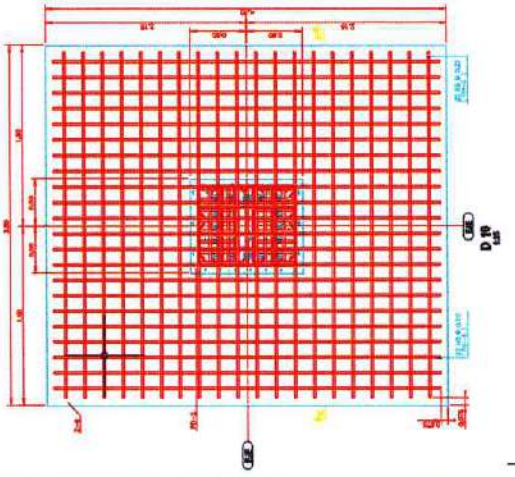

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-19650347

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE TENNIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**KG**
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGA CIMENTACION					
INFERIOR	3/4"	2,235	5,70	9	114,66
	3/4"	2,235	9,00	9	181,04
	3/4"	2,235	12,00	9	241,38
	3/4"	2,235	9,00	9	181,04
	3/4"	2,235	12,00	9	241,38
SUPERIOR	3/4"	2,235	12,00	9	241,38
	3/4"	2,235	9,00	9	181,04
	3/4"	2,235	12,00	9	241,38
	3/4"	2,235	9,00	9	181,04
	3/4"	2,235	5,70	9	114,66
ESTRIBOS - E11	3/8"	0,56	1,21	810	548,86
VIENEN:	31110,99			**SUBTOTAL**	**2.467,86**
PASAN:	**33578,85**			**TOTAL**	**33.578,85**

OBSERVACIONES:

1. **Pagos Anteriores:** Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a los pagos realizados en las anteriores parciales. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**33.578,85**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**33.578,85**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**33.578,847**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**0,003**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

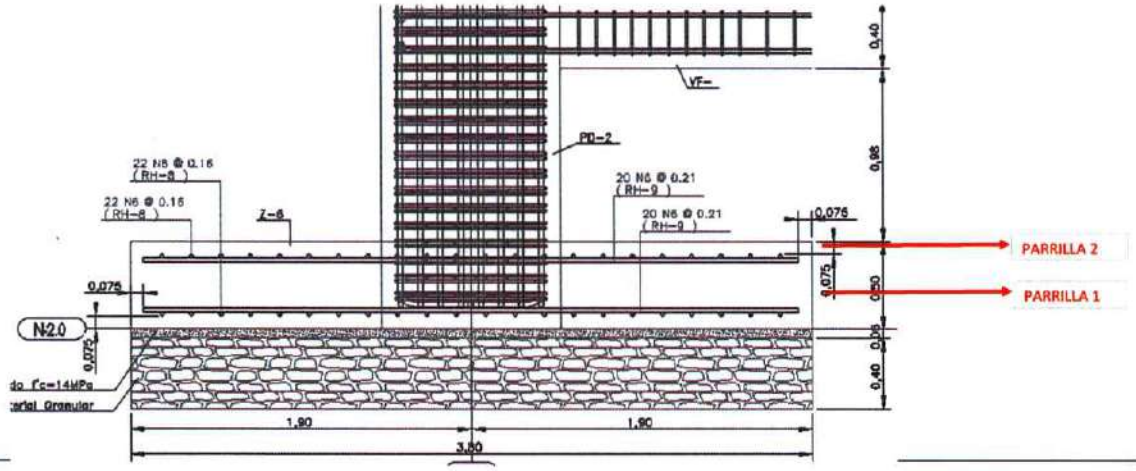

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25507200-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE TENNIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**KG**
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7955014

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE TENNIS**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M3**
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO		


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	
Cancha 1 - cimentación cerramiento Tenis cubierta					
SON DOS (2) SECCIONES DE	0.40	40.73	0.50	2.00	16.29
SON DOS (2) SECCIONES DE	0.40	21.23	0.50	2.00	8.49
Cancha 2 - cimentación cerramiento Tenis cubierta					
SON DOS (2) SECCIONES DE	0.40	40.73	0.50	1.00	8.15
SON DOS (2) SECCIONES DE	0.40	21.23	0.50	2.00	8.49
SON DOS (2) SECCIONES DE	0.40	40.73	0.50	1.00	8.14
Cancha 3 - cimentación cerramiento Tenis descubierta					
SON DOS (2) SECCIONES DE	0.40	40.73	0.50	2.00	16.29
SON DOS (2) SECCIONES DE	0.40	21.23	0.50	2.00	8.49
Cancha 4 - cimentación cerramiento Tenis descubierta					
SON DOS (2) SECCIONES DE	0.40	40.73	0.50	2.00	16.29
SON DOS (2) SECCIONES DE	0.40	21.23	0.50	2.00	8.49
VIENEN:	0.00			**SUBTOTAL**	99.12
PASAN:	99.12			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:

1. Pagos Anteriores: Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a las cantidades que se pagaron en la Parcial 05 las cuales suman 41,42 M3 y en **VERDE** las que se cobraron en la parcial 06 las cuales suman 57,70 M3 para un acumulado en actas anteriores de 99,12 M3.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

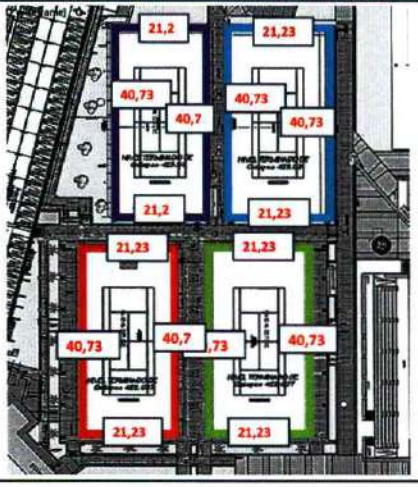

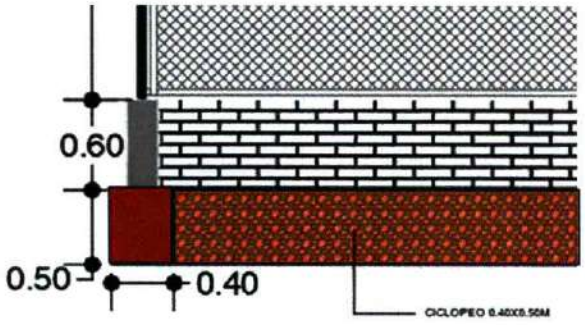

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE TENNIS**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M3**
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO		


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	
MATERAS ZONA TENIS					
MATERA 1					
Es una (1) longitud de [redacted]	0.20	3.60	0.86	1.00	0.62
Es una (1) longitud de [redacted]	0.20	3.45	1.12	1.00	0.77
Es una (1) longitud de [redacted]	0.20	3.06	0.86	1.00	0.53
Es una (1) longitud de [redacted]	0.20	2.33	1.12	1.00	0.52
MATERA 2					
Es una (1) longitud de [redacted]	0.20	2.58	1.12	1.00	0.58
Es una (1) longitud de [redacted]	0.20	2.60	1.12	1.00	0.58
Es una (1) longitud de [redacted]	0.20	1.60	1.12	1.00	0.36
Es una (1) longitud de [redacted]	0.20	1.60	1.12	1.00	0.36
VIENEN:	**99.12**			**SUBTOTAL**	**4.32**
PASAN:	**103.44**			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:


1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** representan las cantidades a cobrar en la presente acta parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA


ZONA TENIS

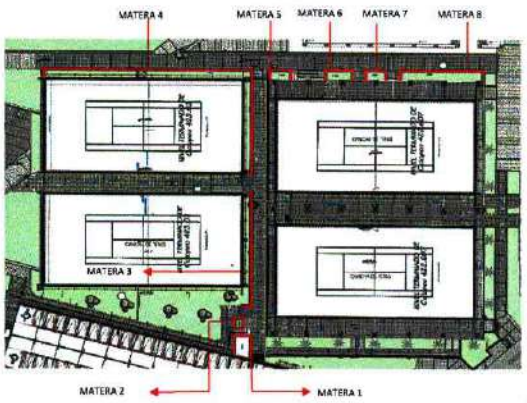

MATERAS EN CONCRETO CICLOPEO

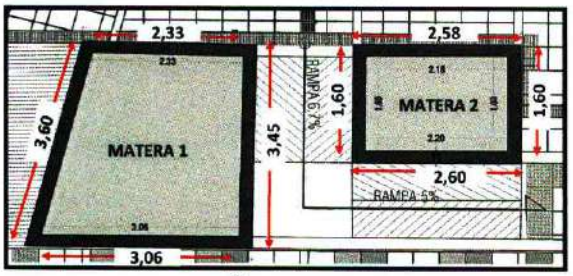





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAN

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:			**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M3**
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	
MATERAS ZONA TENIS					
MATERA 3					
Es una (1) longitud de	0.30	2.10	0.80	1.00	0.50
Es una (1) longitud de	0.30	23.59	0.80	1.00	5.66
Es una (1) longitud de	0.30	0.67	0.80	1.00	0.16
MATERA 4					
Es una (1) longitud de	0.23	0.80	0.80	1.00	0.15
Es una (1) longitud de	0.30	0.80	0.80	1.00	0.19
Es una (1) longitud de	0.30	21.32	0.80	1.00	5.12
Es una (1) longitud de	0.30	1.75	0.80	2.00	0.84
Es una (1) longitud de	0.30	42.96	0.80	1.00	10.31
VIENEN:	103.44			**SUBTOTAL**	22.93
PASAN:	126.37			**TOTAL**	

OBSERVACIONES:

1.Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** representan las cantidades a cobrar en la presente acta parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

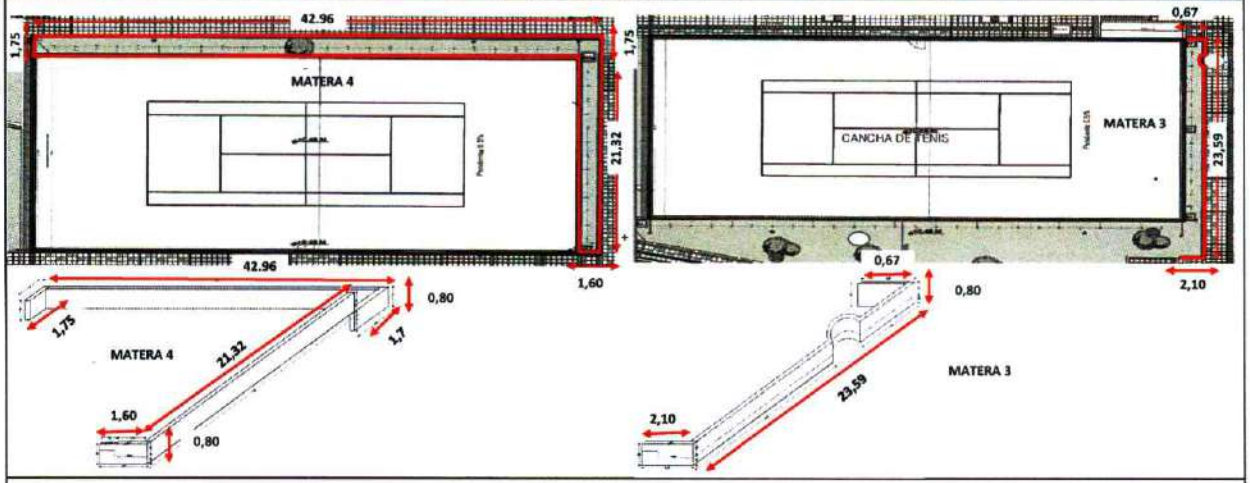

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ALVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200[illegible]

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **GIOVANNY ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-183996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE TENNIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M3**
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	
MATERAS ZONA TENIS					
MATERA 5					
Es una (1) longitud de	0,30	4,46	0,80	1,00	1,07
Es una (1) longitud de	0,30	1,96	0,80	1,00	0,47
Es una (1) longitud de	0,30	1,98	0,80	1,00	0,48
MATERA 6					
Es una (1) longitud de	0,30	5,62	0,80	1,00	1,35
Son dos (1) longitudes de	0,30	0,11	0,80	1,00	0,03
VIENEN:	126,37			**SUBTOTAL**	**3,40**
PASAN:				**TOTAL**	**129,77**


OBSERVACIONES:


1. Pagos Anteriores: Las cantidades y textos en **AZUL** corresponden a las cantidades que se pagaron en la Parcial 05 las cuales suman 41,42 M3 y en **VERDE** las que se cobraron en la parcial 06 las cuales suman 57,70 M3 para un acumulado en actas anteriores de 99,12 M3.
2. Cobro Actual: Las cantidades relacionadas en **NEGRO** representan las cantidades a cobrar en la presente acta parcial No. 07. Estos montos reflejan el avance de las obras y están basados en las mediciones y verificaciones realizadas hasta la fecha.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**129,77**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**129,77**
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**99,12**
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**30,65**
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

MATERAS EN CONCRETO CICLOPEO

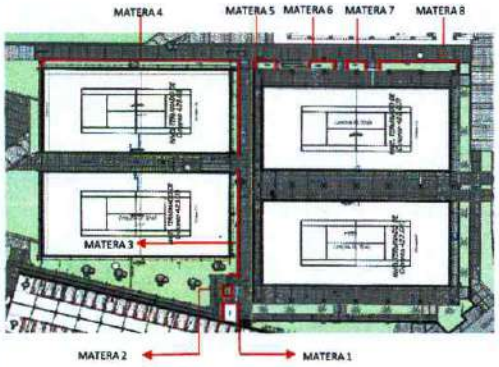



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A250720007965147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE TENNIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M3**
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A250[illegible]2000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE TENNIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M3**
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507-2000-78650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE TENNIS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79656147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-190337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNY ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

CAPITULO 19

CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE TENIS.


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UN**
19.12	MALLA CENTRAL DE TENIS TIPO ATP		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
Cancha 1					
Se instaló una malla central de tenis tipo ATP				1.00	1.00
Cancha 2					
Se instaló una malla central de tenis tipo ATP				1.00	1.00
Cancha 3					
Se instaló una malla central de tenis tipo ATP				1.00	1.00
Cancha 4					
Se instaló una malla central de tenis tipo ATP				1.00	1.00
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**4.00**
PASAN:				**TOTAL**	**4.00**

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**4.00**
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**4.00**
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**0.00**
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**4.00**
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

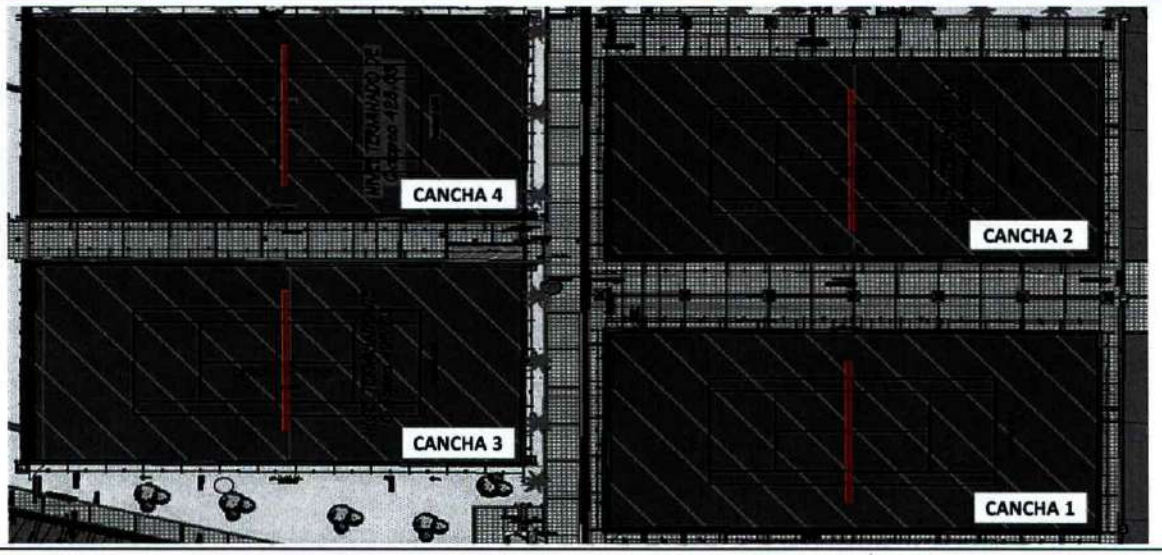

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN
19.12	MALLA CENTRAL DE TENIS TIPO ATP	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79651472

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 18 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN
19.12	MALLA CENTRAL DE TENIS TIPO ATP	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

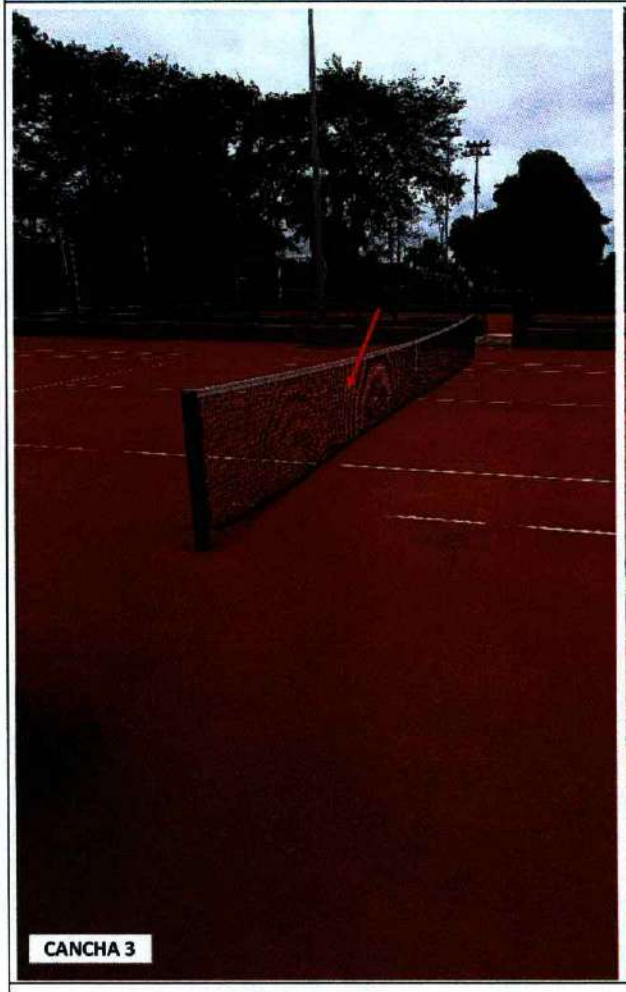

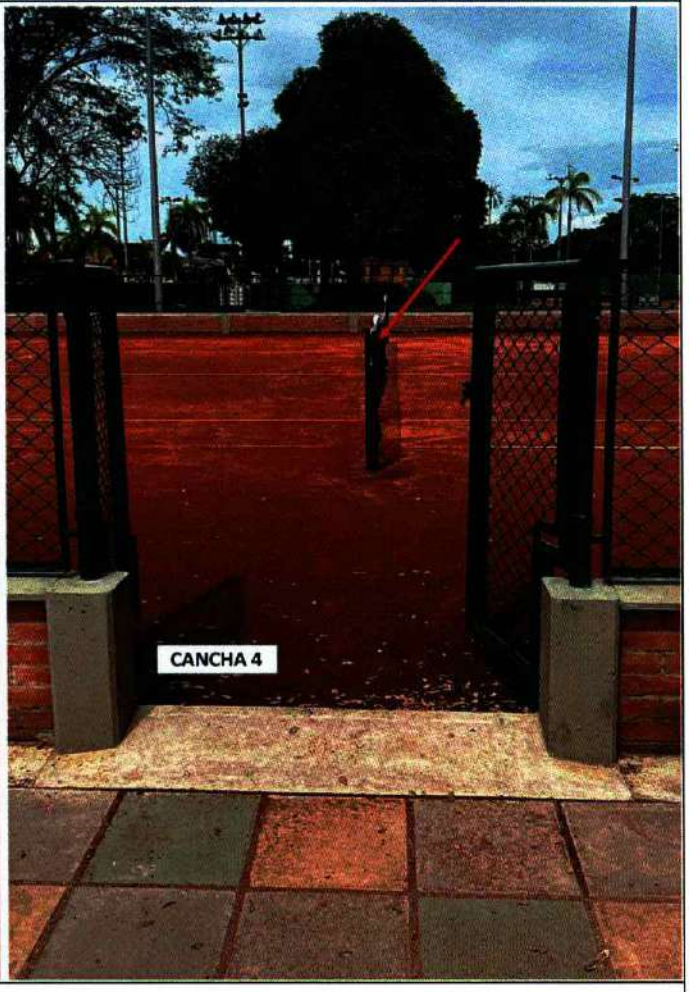

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079658147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**
19.13	PASING DE SALIDA DE AGUA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
Cancha 4					
Se instalaron cuatro pasing de salida de agua				4.00	4.00
VIENEN:			**SUBTOTAL**		**4.00**
PASAN:			**TOTAL**		**4.00**

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**4.00**
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**4.00**
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**0.00**
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**4.00**
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

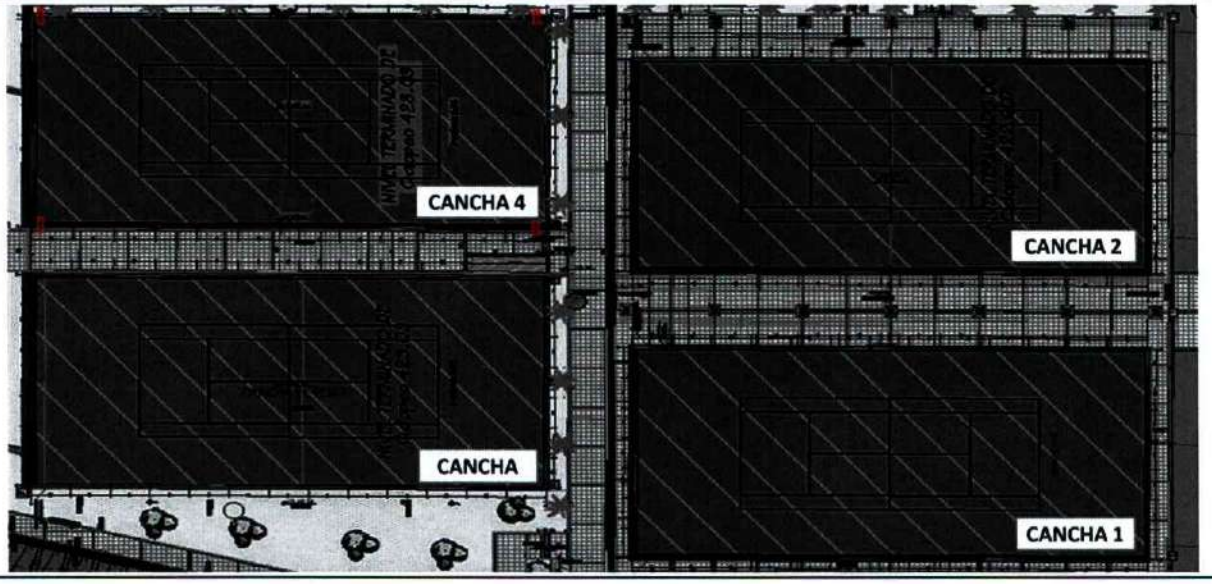

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008-796501

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**
19.13	PASING DE SALIDA DE AGUA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79680147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M3**
NP19.14	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
Cancha 1	0.20	0.20	0.60	40.00	0.96
Cancha 2	0.20	0.20	0.60	40.00	0.96
Cancha 3	0.20	0.20	0.60	40.00	0.96
Cancha 4	0.20	0.20	0.60	40.00	0.96
VIENEN:				**SUBTOTAL**	3.84
PASAN:				**TOTAL**	3.84

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	7.16
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3.84
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0.00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	3.84
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	3.32

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

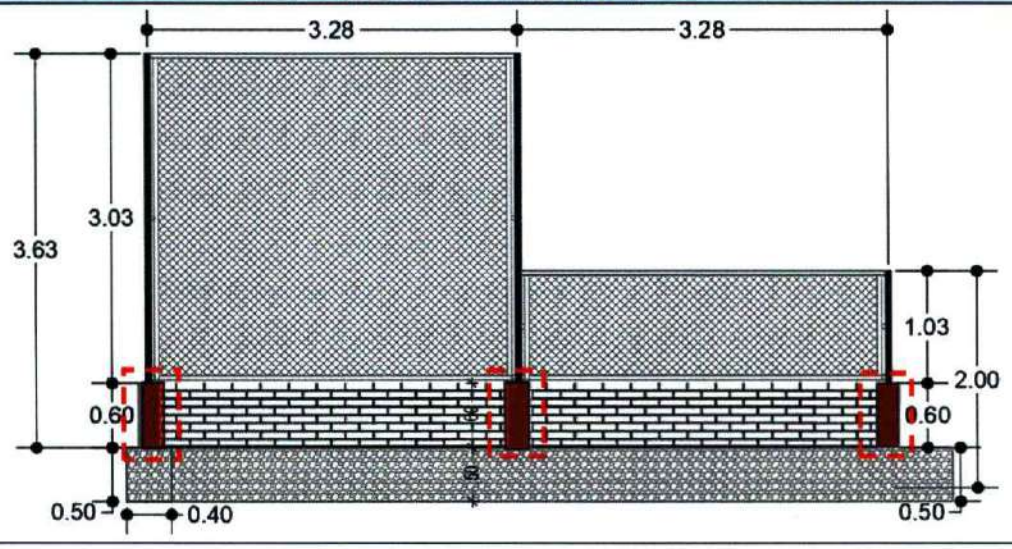

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507[illegible]

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND


Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	PARCIAL No. 07		
CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS		UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		M3
NP19.14	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

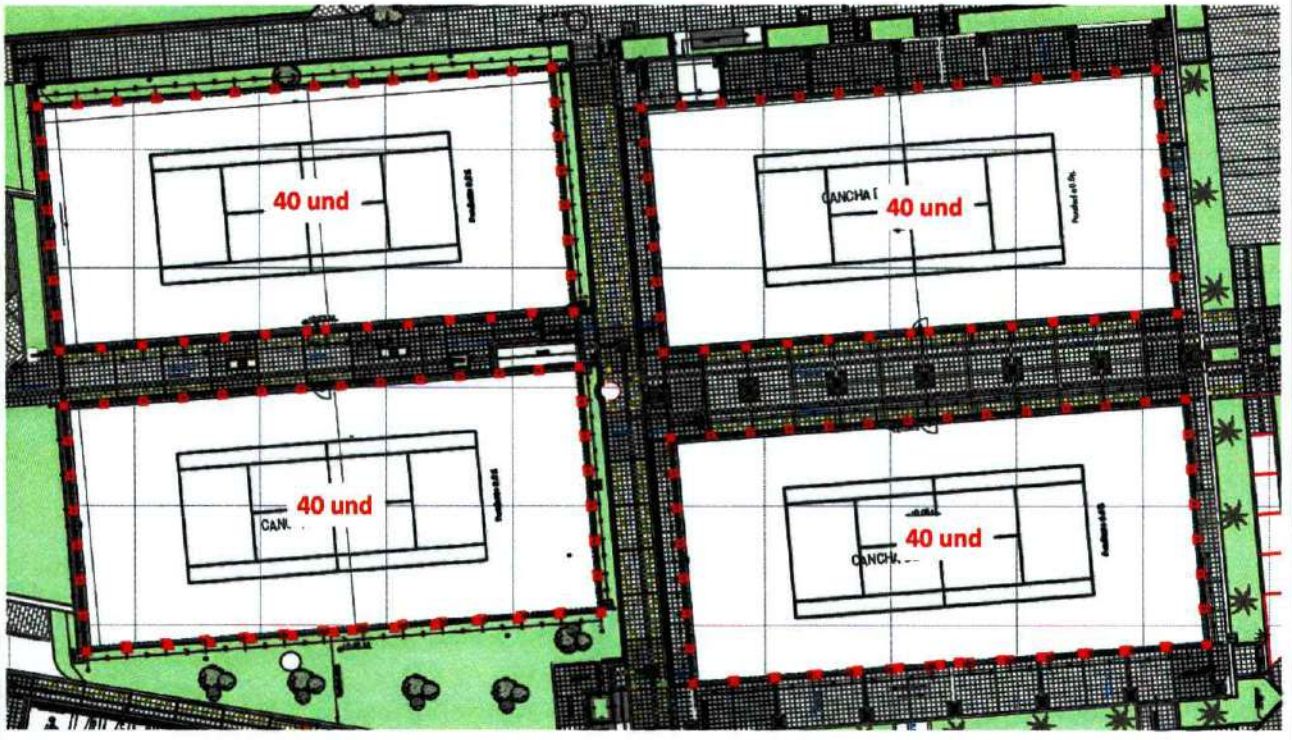

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-[illegible]

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP19.14	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 252020090397 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP19.15	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24,5x12x6 CM VISTA DOBLE (MORTERO TIPO S 1:3) INCLUYE DOVELAS EN CONCRETO	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
Cancha 1					
Fachadas Laterales	0.50		2.77	14.00	19.39
Fachada Posterior	0.50		2.98	13.00	19.37
Fachada Frontal	0.50		3.11	12.00	18.66
Cancha 2	0.50				
Fachadas Laterales	0.50		2.77	14.00	19.39
Fachada Posterior	0.50		2.98	13.00	19.37
Fachada Frontal	0.50		3.11	12.00	18.66
Cancha 3	0.50				
Fachadas Laterales	0.50		2.77	14.00	19.39
Fachada Posterior	0.50		2.98	13.00	19.37
Fachada Frontal	0.50		3.11	12.00	18.66
Cancha 4	0.50				
Fachadas Laterales	0.50		2.77	14.00	19.39
Fachada Posterior	0.50		2.98	13.00	19.37
Fachada Frontal	0.50		3.11	12.00	18.66
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**229.68**
PASAN:				**TOTAL**	**229.68**

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**229.68**
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**229.68**
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**0.00**
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**229.68**
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

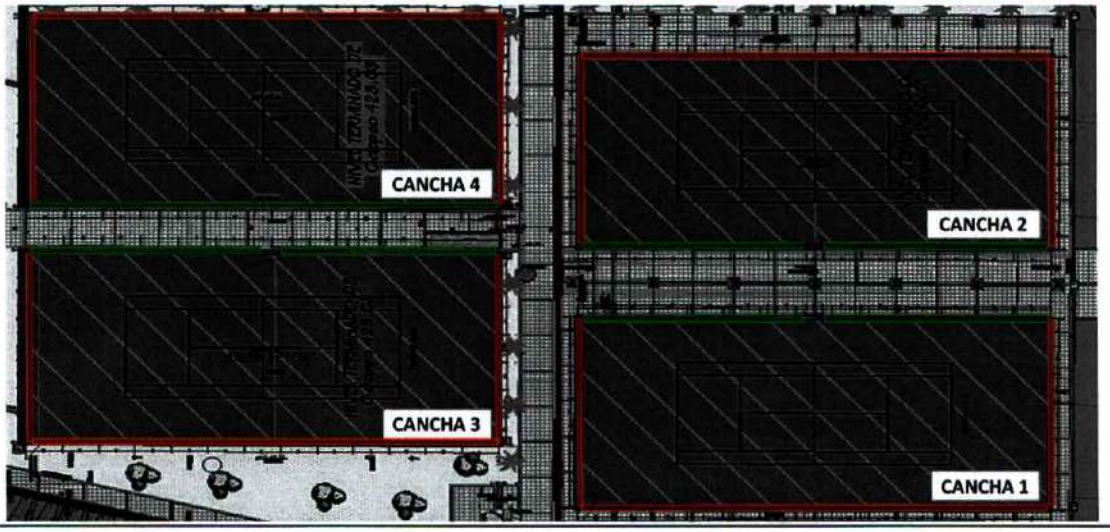

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650107

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-050337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP19.15	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24,5x12x6 CM VISTA DOBLE (MORTERO TIPO S 1:3) INCLUYE DOVELAS EN CONCRETO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



FACHADA LATERAL DERECHA

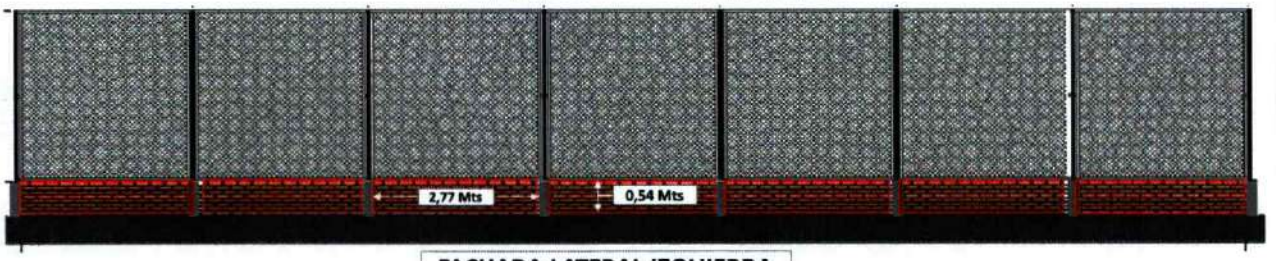

FACHADA LATERAL IZQUIERDA



FACHADA FRONTAL



FACHADA POSTERIOR

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP19.15	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24,5x12x6 CM VISTA DOBLE (MORTERO TIPO S 1:3) INCLUYE DOVELAS EN CONCRETO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA








Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25072900-79850147

Firma

Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**		**UNIDAD**
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
NP19.16	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
Cancha 1					
Fachadas Laterales	0.50		2.77	28.00	38.78
Fachada Posterior	0.50		2.98	26.00	38.74
Fachada Frontal	0.50		3.11	24.00	37.32
Cancha 2					
Fachadas Laterales	0.50		2.77	28.00	38.78
Fachada Posterior	0.50		2.98	26.00	38.74
Fachada Frontal	0.50		3.11	24.00	37.32
Cancha 3					
Fachadas Laterales	0.50		2.77	28.00	38.78
Fachada Posterior	0.50		2.98	26.00	38.74
Fachada Frontal	0.50		3.11	24.00	37.32
Cancha 4					
Fachadas Laterales	0.50		2.77	28.00	38.78
Fachada Posterior	0.50		2.98	26.00	38.74
Fachada Frontal	0.50		3.11	24.00	37.32
VIENEN:				**SUBTOTAL**	**459.36**
PASAN:				**TOTAL**	**459.36**

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	**459.36**
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**459.36**
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	**0.00**
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	**459.36**
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

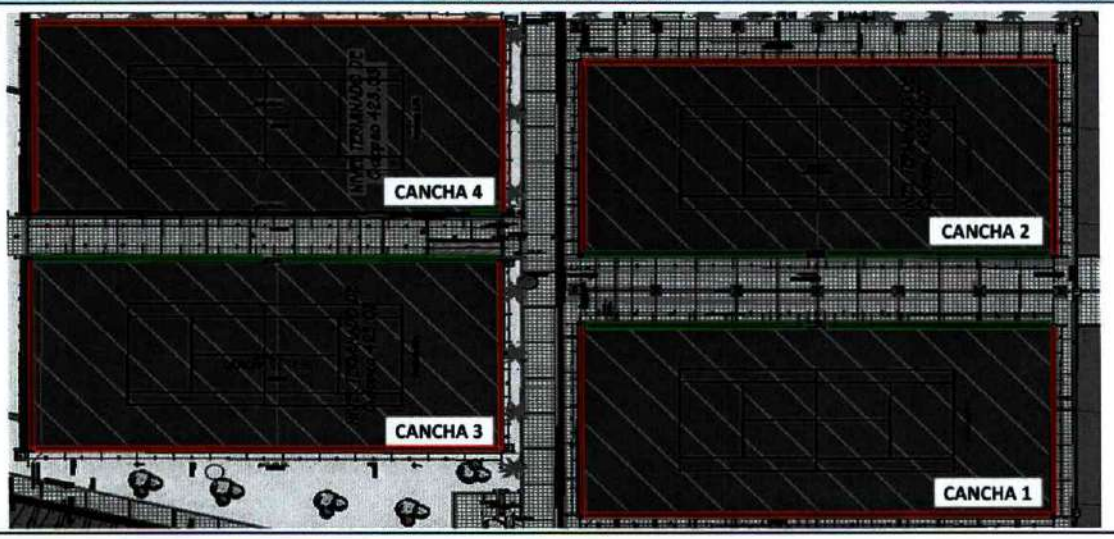

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7965017

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-190337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND


Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	PARCIAL No. 07		
CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS		UNIDAD
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
NP19.16	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



FACHADA LATERAL DERECHA



FACHADA LATERAL IZQUIERDA



FACHADA FRONTAL



FACHADA POSTERIOR

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202000-[illegible]

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP19.16	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

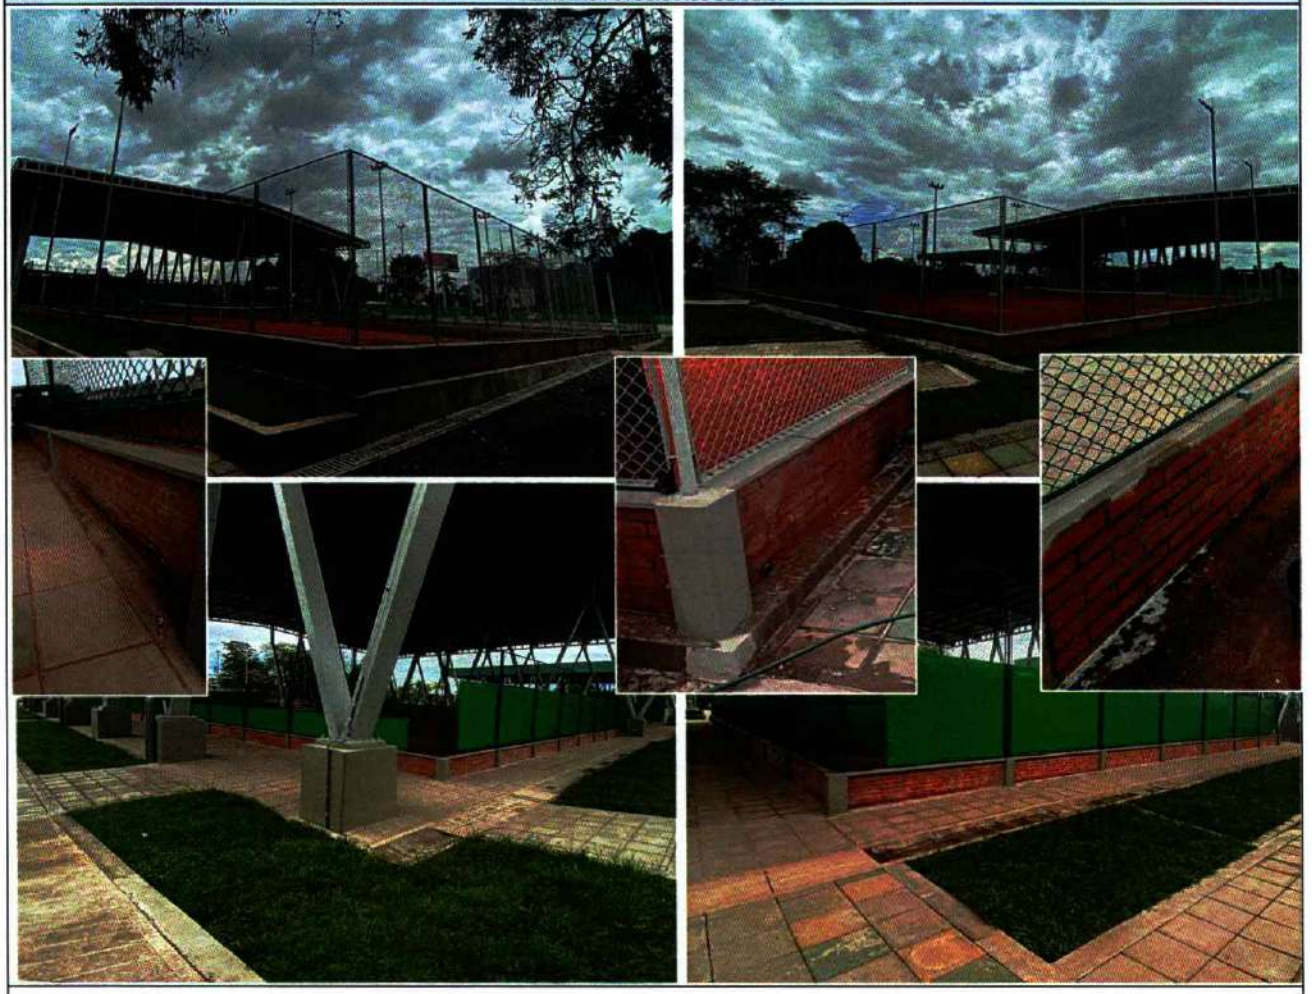

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2587200079650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO BARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-080337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
NP19.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO ESCENARIO TENIS EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON, MALLA GALVANIZADA HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO METALICO INCLUYE PINTURA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
Canchas de Tenis					
Cancha 1					
Modulos de H=3 Fachada Lateral Derecha	2.94	3.00		7.00	61.74
Modulos de H=3 Fachada Lateral Izquierda	2.94	3.00		7.00	61.74
Modulos de H=3 Fachada Frontal	3.28	3.00		4.00	39.36
Modulos de H=1 Fachada Frontal	3.28	1.00		8.00	26.24
Puerta Fachada Frontal	1.50	1.60		1.00	2.40
Modulos de H=3 Fachada Posterior	3.15	3.00		4.00	37.80
Modulos de H=1 Fachada Posterior	3.15	1.00		9.00	28.35
Cancha 2					
Modulos de H=3 Fachada Lateral Derecha	2.94	3.00		7.00	61.74
Modulos de H=3 Fachada Lateral Izquierda	2.94	3.00		7.00	61.74
Modulos de H=3 Fachada Frontal	3.28	3.00		4.00	39.36
Modulos de H=1 Fachada Frontal	3.28	1.00		8.00	26.24
Puerta Fachada Frontal	1.50	1.60		1.00	2.40
Modulos de H=3 Fachada Posterior	3.15	3.00		4.00	37.80
Modulos de H=1 Fachada Posterior	3.15	1.00		9.00	28.35
Cancha 3					
Modulos de H=3 Fachada Lateral Derecha	2.94	3.00		7.00	61.74
Modulos de H=3 Fachada Lateral Izquierda	2.94	3.00		7.00	61.74
Modulos de H=3 Fachada Frontal	3.28	3.00		4.00	39.36
Modulos de H=1 Fachada Frontal	3.28	1.00		8.00	26.24
Puerta Fachada Frontal	1.50	1.60		1.00	2.40
Modulos de H=3 Fachada Posterior	3.15	3.00		4.00	37.80
Modulos de H=1 Fachada Posterior	3.15	1.00		9.00	28.35
Cancha 4					
Modulos de H=3 Fachada Lateral Derecha	2.94	3.00		7.00	61.74
Modulos de H=3 Fachada Lateral Izquierda	2.94	3.00		7.00	61.74
Modulos de H=3 Fachada Frontal	3.28	3.00		4.00	39.36
Modulos de H=1 Fachada Frontal	3.28	1.00		8.00	26.24
Puerta Fachada Frontal	1.50	1.60		1.00	2.40
Modulos de H=3 Fachada Posterior	3.15	3.00		4.00	37.80
Modulos de H=1 Fachada Posterior	3.15	1.00		9.00	28.35
VIENEN:				SUBTOTAL	1,030.52
PASAN:				TOTAL	1,030.52

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MOD. No. 06)	1,030.52
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1,030.52
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0.00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07	1030.52
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



FACHADA LATERAL DERECHA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79630147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 07	
CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
NP19.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO ESCENARIO TENIS EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO METALICO INCLUYE PINTURA	


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

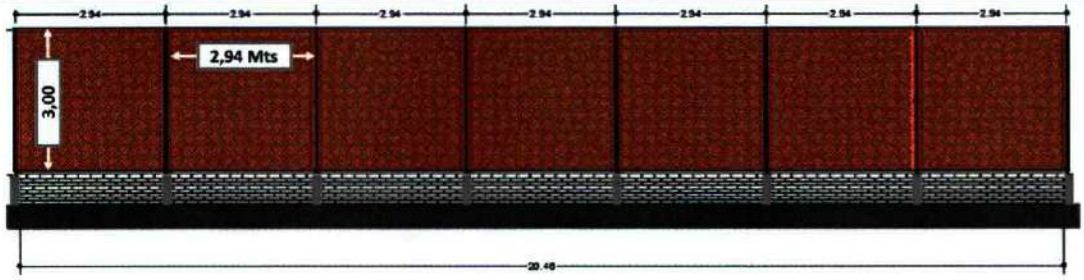

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

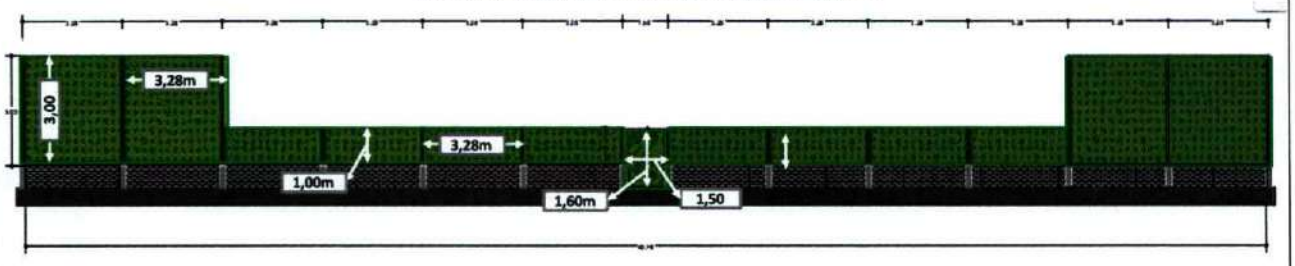

FACHADA FRONTAL

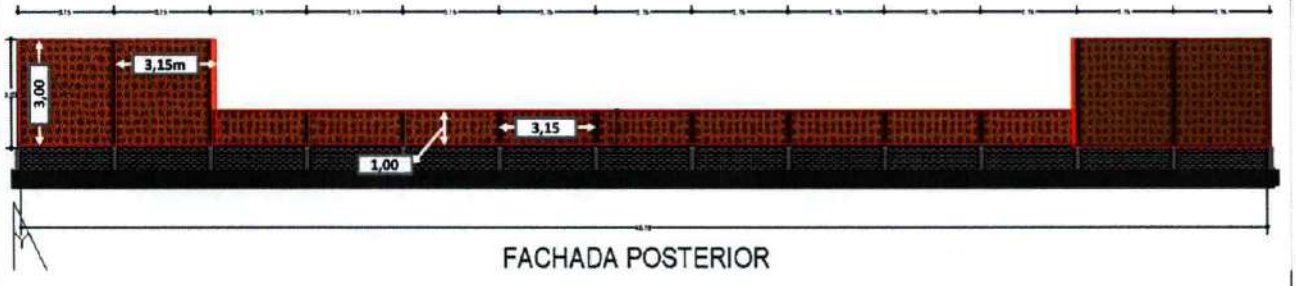

FACHADA POSTERIOR

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507-2000-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	**963 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500071**
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	**PARCIAL No. 07**	
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**	**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**M2**
NP19.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO ESCENARIO TENIS EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO METALICO INCLUYE PINTURA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



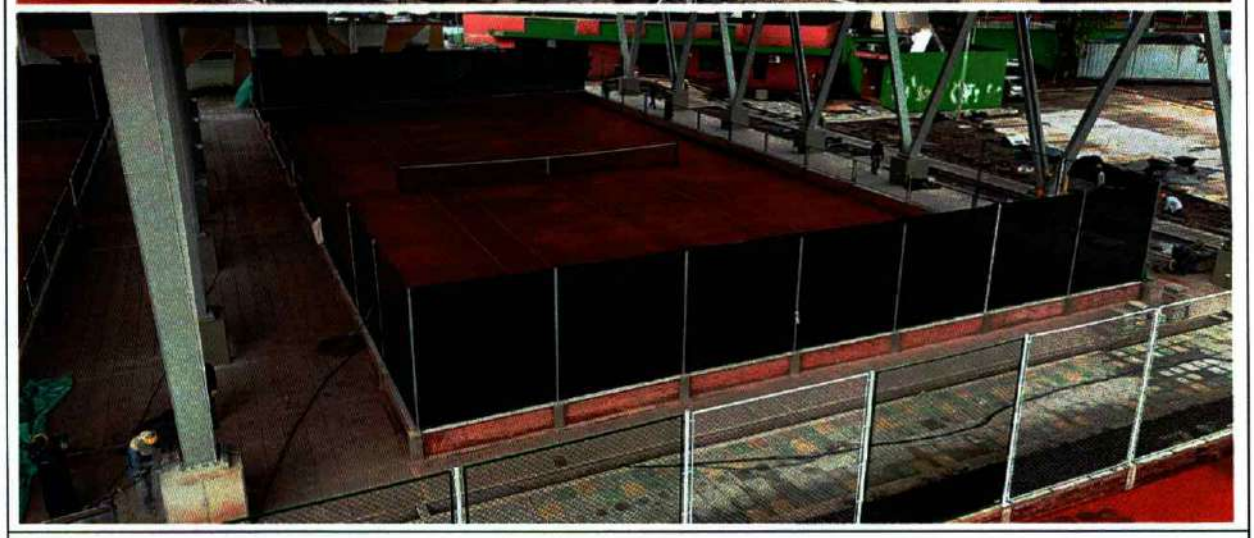

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2520200079650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ARIEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	**PARCIAL No. 07**		
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**		**UNIDAD**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**M2**
NP19.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO ESCENARIO TENIS EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON, MALLA GALVANIZADA HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO METALICO INCLUYE PINTURA		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





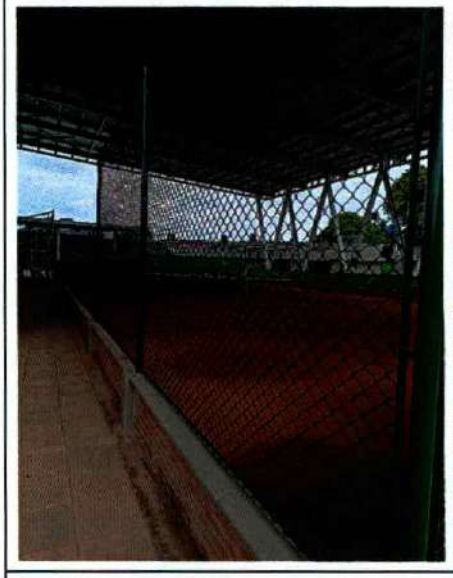



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 18 de agosto de 2025

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7983014

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRÍGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia
