CONSORCIO INTERCEL

CONTRATO CO1.PCCNTR.4146310 de 2022

"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA."

INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA N18
08 de julio al 07 de agosto del 2024

ELABORÓ		
Nombre	**cargo**	**Firma**
Arq. Myriam González W.	Residente	
Arq. Alexis Reyes Diaz	Residente	

APROBÓ		
Nombre	**cargo**	**Firma**
Arq. Carlos Enrique Escobar	Director	

FECHAS	VERSION	OBSERVACIONES

Contenido

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 3

1.1 Objeto del contrato 3

1.2 localización de las sedes educativas a intervenir 4

1.3 Información básica de los contratos / pólizas 5

2. CLIMATOLOGIA 7

3. ASPECTO ADMINISTRATIVO 7

3.1 Control personal de interventoría 8

3.2 Control personal de contratista de obra 8

3.3 Actas de comité de obra 9

4. PROCESO CESION DE CONTRATO 9

5. ASPECTO TÉCNICO 10

5.1 Relación de documentos 11

5.2 Planes de manejo ambiental 11

5.3 Planes de manejo SGSST 11

5.4 Actividades ejecutadas / Registro fotográfico 11

5.4.1 IED SAN JOSÉ - SEDE B – EL DESCANSO 12

5.4.2 IED LUIS ANGEL ARANGO SEDE B LA CABAÑA 12

5.4.3 IED CLAS SEDE C 13

5.4.4 IED KENNEDY SEDE C LOS HEROES 14

5.4.5 IED VAN UDEN SEDE A 15

5.4.9 IED ISABEL II SEDE A 17

5.1.12 IED NELSON MANDELA 18

6. ATENCION DE EMERGENCIAS 19

7. ACTAS DE ENTREGA 20

8. ASPECTO FINANCIERO 20

8.1 Presupuesto de obra 20

8.2 Análisis de estado financiero 21

8.3 Control al avance de ejecución de obra Programado Vs Ejecutado 23

8.4 Control corte de obra 24

9. RELACION DE PAGOS 25

9.1 Contrato de interventoría 25

9.2 Contrato de obra 26

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

11. ANEXOS 27
11.1 Acta comité de obra 27

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Objeto del contrato

interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento

de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura.

1.2 localización de las sedes educativas a intervenir

Dentro de las sedes educativas a ejecutar en el Grupo 10, se encuentran ubicadas tanto en la Localidad de Fontibón y la Localidad de Kennedy, de acuerdo a listado que se enumera a continuación:

Localidad de Fontibón:

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	DIRECCION
FONTIBON	LUIS ANGEL ARANGO	B	LA CABAÑA	Carrera 104 A Bis N.º 23 G 19
FONTIBON	VAN UDEN	C	SAN VICENTE	Carrera 124 No 17-05
FONTIBON	ATAHUALPA	A	ATAHUALPA	Avda. Carrera 116 No 22 I 56
FONTIBON	PABLO NERUDA	B	ANTONIO NARIÑO	Calle 16 J No 99-95
FONTIBON	LA FELICIDAD	A	LA FELICIDAD	Calle 19 No 79-37
FONTIBON	CARLOS FEDERICI	A	ZONA FRANCA	Calle 14 A No 108-78
FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT	A	SIMON BOLIVAR	Avda. Kra 97 No 16 J 15
FONTIBON	DILE FONTIBON			Calle 25B No.81 – 55
FONTIBON	BODEGA FONTIBON			Carrera 116 No 14B – 30
FONTIBON	FABRICA DE TIZA			
FONTIBON	VAN UDEN	A	VAN UDEN	Calle 17 D No 123 B 26
FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON	B	EMMA VILLEGAS DE GAITAN	Calle 22 F No 109 B 29

Localidad de Kennedy:

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	DIRECCION
KENNEDY	SAN JOSE DE CASTILLA	A	CASTILLA	Calle 7 C No 78 F 20

KENNEDY	SAN JOSE DE CASTILLA	C	VISION COLOMBIA	Carrera 79 C No 13 A 40
KENNEDY	NICOLAS ESGUERRA	A	NICOLAS ESGUERRA	Calle 9 C No 68-52
KENNEDY	KENNEDY	C	LOS HEROES	Calle 35 B Sur No 73 A 40 Int 1
KENNEDY	KENNEDY	D	ROSA MARIA GORDILLO	Carrera 73 D No 35-20 Sur Int 1
KENNEDY	NELSON MANDELA	A	NELSON MANDELA	Carrera 90 A No 46-50 Sur
KENNEDY	JACKELINE	A	JACKELINE	Carrera 77 Q 45 A 21 Sur
KENNEDY	ISABEL II	A	ISABEL II	Diagonal 2 D No. 79 C 83
KENNEDY	CLASS	C	ROMULO GALLEGOS	Calle 57 D Sur No 78 H 43
KENNEDY	SAN JOSE	B	EL DESCANSO	Carrera 78 N Bis No 45-60 Sur

1.3 Información básica de los contratos / pólizas

A continuación, se presenta información con respecto a los contratos tanto de interventoría como de obra. De igual manera se presenta información con respecto a las pólizas de seguro de las partes mencionadas anteriormente.

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCEL
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4146310-2022
REPRESENTANTE LEGAL:	ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 878.272.093
FECHA DE INICIO CONTRATO:	03/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02/01/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES

CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCCENTER SAS
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077646-2022
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME SALAMANCA MOLINA
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.419.923.186
FECHA DE INICIO CONTRATO:	03/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02/12/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 MESES

Para la ejecución del **contrato de interventoría** se expide la póliza **de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal de SEGUROS DEL ESTADO S.A.** bajo el número de póliza **No 21-44-101398631** con vigencia desde el 03/01/2023 hasta el 03/01/2029 y con los siguientes amparos:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA HASTA	VIGENCIA DESDE	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	03/01/2023	03/07/2024	$ 175.654.418,60
Salarios, Prestaciones Sociales	03/01/2023	03/01/2027	$ 43.913.604,65
Calidad del Servicio	03/01/2023	03/01/2029	$ 175.654.418,60


Para la ejecución del **contrato de obra** se expide la **póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal de SEGUROS MUNDIAL** bajo el número de póliza **No 100000412** con vigencia desde el 01/06/2025 hasta el 08/06/2025 y con los siguientes amparos:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA HASTA	VIGENCIA DESDE	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	03/01/2023	03/07/2024	$ 2.283.984.637,20
Prestaciones Sociales	03/01/2023	03/01/2026	$ 1.141.992.318,60

Estabilidad de la obra	03/01/2023	03/01/2025	$ 2.283.984.637,20

2. CLIMATOLOGIA

Para el mes de julio del 2024, se presentaron días de lluvias en la zona dónde se realizó el proyecto, los datos son tomados de la estación meteorológica más cercana al proyecto

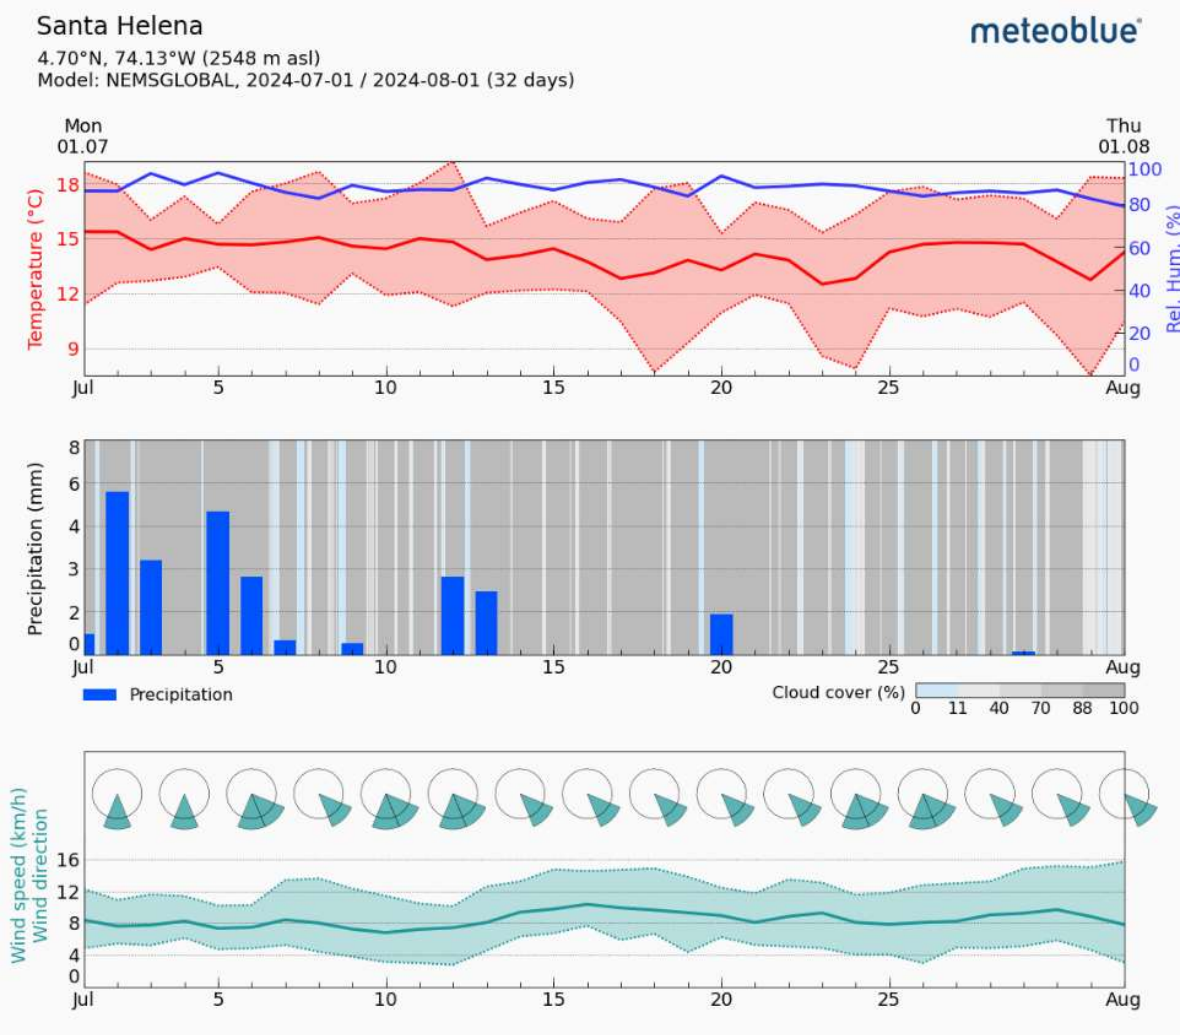

https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/weatherarchive/santa%20helena_colombia_3668752?fcstlength=1m&year=2024&month=7

3. ASPECTO ADMINISTRATIVO

3.1 Control personal de interventoría

Se relacionan los profesionales de la Interventoría CONSORCIO INTERCEL, que se encontraron en campo para la verificación y control de las actividades contratadas en el contrato CO1.PCCNTR.4146310 de 2022 de los diferentes colegios nombrados con anterioridad que han intervenido en la Ejecución

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	Carlos Enrique Escobar Leguizamo
Residente de Interventoría	Myriam González Wilches
Residente de Interventoría	Hanier Alexis Reyes Díaz
Inspector de Interventoría	Javier Arturo Ortiz
Inspector de Interventoría	Lorena Bonilla Páez
Técnico o Tecnólogo SST	Tatiana Bolívar García
Especialista Ambiental e hidráulico	Angelica Sánchez Suescun
Especialista costos y presupuestos	Carlos José Escobar Quintero
Especialista Eléctrico	Alexander Ramírez Restrepo
Asesor Estructural	Juan Ricardo Torres
Coordinadora SST	Martha Patricia Torres Amaya
Asesor Jurídico	Wbeimar Arnulfo Hernandez Roa

3.2 Control personal de contratista de obra

Se relacionan los profesionales del contratista GRUPO CONSTRUCENTER S.A.S que se encontraran en campo para la construcción de las actividades contratadas en el contrato CO1.PCCNTR.4077646 de 2022 encargado de la remodelación de los diferentes colegios nombrados con anterioridad y que han intervenido en la ejecución de las actividades programadas:

CARGO	NOMBRE
Director de Obra	Oscar Javier Báez Lemus
Residente de Obra	Diego Camilo Ochoa Ducura
Residente de Obra	Jaime Trigos

Inspector de Obra	Alejandra Conde
Inspector de Obra	Víctor Ochoa
Técnico SST	Cristian Vanegas
Asesor en Redes Eléctricas	Rubén Darío Martínez
Asesor Hidrosanitario	
Profesional de costos y Presupuestos	Anderson Parra

3.3 Actas de comité de obra

Para el período que comprende este informe, se realizan las siguientes Actas de Seguimiento y/o Reunión, se adjuntan las presentes actas de comité en ANEXO N.1:

- Acta de Reunión No. 60
- Acta de Reunión No. 61
- Acta de Reunión No. 62

4. PROCESO CESION DE CONTRATO

Con el fin de establecer el precedente del proceso de cesión del contrato, se establece y se mantiene dicho capítulo (4. PROCESO CESION DE CONTRATO) en el presente informe como constancia por parte de esta interventoría.

A lo largo del tiempo transcurrido del contrato No. 4077646-2022 el contratista de obra responsable de su ejecución CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 no ha contado con la viabilidad financiera como lo han manifestado en los recientes comités de obra, ya que se evidencia problemas financieros y bancarios en donde ha perjudicado directamente el desarrollo del contrato, puesto que se identifica un bajo nivel de liquidez de parte del consorcio para inyección y ejecución de las obras. Por esta razón en el periodo, el CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 decide realizar solicitud de prorroga directamente a la SECRETARIA DE EDUCACION.

El CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 en calidad de cedente del contrato No. 4077646-2022 presenta e informa a la SECRETARIA DE EDUCACION en calidad de contratante al GRUPO CONSTRUCCENTER SAS como el contratista de obra quien será el cesionario del contrato.

Esta interventoría en la fecha del 12/09/2023 mediante oficio, da la viabilidad de la cesión del contrato dadas las circunstancias respecto a los problemas financieros que presenta el

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022. Se resalta que la prioridad de la interventoría es efectuar el seguimiento a las obras para que se realicen, es decir, lograr el cumplimiento del objeto contractual.

Es así como debe recordarse que el contrato actualmente presente graves retrasos y se encuentra en trámite un proceso sancionatorio de caducidad bajo las garantías de la Ley 1474 de 2011, por lo tanto, para esta interventoría es claro que la única forma de que el contrato pueda ejecutarse integralmente es a través de la cesión a un nuevo contratista que asuma las actividades, le inyecte recursos al proyecto y avance simultáneamente en los diversos frentes de obra para ponerse al día en la programación.

Sin embargo, esta interventoría, deja la salvedad que frente a la viabilidad técnica, financiera y jurídica la revisión exclusiva la hizo la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Dada la viabilidad por parte de esta interventoría en donde resalta la anterior salvedad, en la fecha del 15/09/2023 se realiza la cesión del contrato.

Los datos pertinentes para esta cesión son los siguientes:

CEDENTE:

- Nombre de la Empresa: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
- NIT de la Empresa: 901.639.619-0
- Representante Legal: Álvaro Enrique Rodríguez Pérez
- Correo Electrónico del Representante Legal: conconstructor2022@gmail.com, alenrope@hotmail.com
- Teléfono de Contacto: 3133812561

CESIONARIO:

- Nombre de la Empresa: GRUPO CONSTRUCCENTER SAS
- NIT de la Empresa: 900.085.456-4
- Representante Legal: JAIME SALAMANCA MOLINA
- Correo Electrónico del Representante Legal: gerencia@construccenter.co
- Teléfono de Contacto: 313 418 5900

5. ASPECTO TÉCNICO

5.1 Relación de documentos

Hasta la fecha que comprende el presente informe, se ha realizado la entrega de la siguiente documentación:

- Informe Diagnóstico de Interventoría
- Plan de Calidad de Interventoría
- Informe Preliminar de Obra
- Plan RCD
- Plan de Calidad de Obra
- Plan de Manejo Ambiental
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

De la misma forma, se asegura la presentación de la información en relación a presupuestos, cronogramas, flujo de caja, APU´s y demás documentación técnica exigida previo a la generación del Acta de Inicio y posterior a la misma para las instituciones en ejecución.

Adicional a lo indicado, se espera la entrega de la demás documentación por parte del contratista de obra de las instituciones restantes para asegurar la totalidad de la información diagnóstico que se debe verificar y presentar a La Entidad.

5.2 Planes de manejo ambiental

Esta información reposa los respectivos informes y la documentación en relación a las actividades realizadas para este tópico que fueron entregadas previamente por el contratista previo inicio del contrato.


5.3 Planes de manejo SGSST

La documentación en relación a las actividades realizadas para este tópico que fueron entregadas previamente por el contratista previo inicio del contrato.

5.4 Actividades ejecutadas / Registro fotográfico

Durante el período comprendido entre el 08 de julio al 07 de agosto del año en curso, para cada institución se relaciona las actividades ejecutadas y su respectivo registro fotográfico.

5.4.1 IED SAN JOSÉ - SEDE B – EL DESCANSO

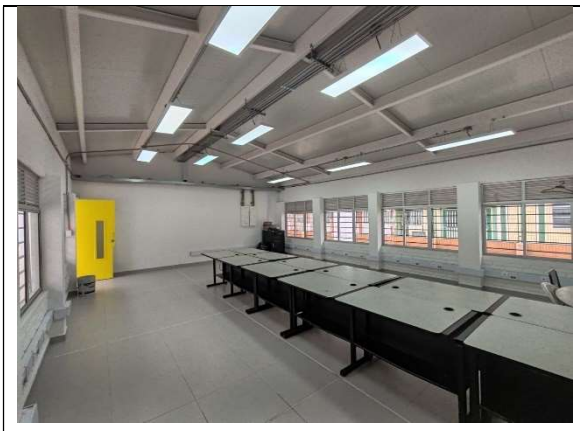







5.4.2 IED LUIS ANGEL ARANGO SEDE B LA CABAÑA









5.4.3 IED CLAS SEDE C











5.4.4 IED KENNEDY SEDE C LOS HEROES

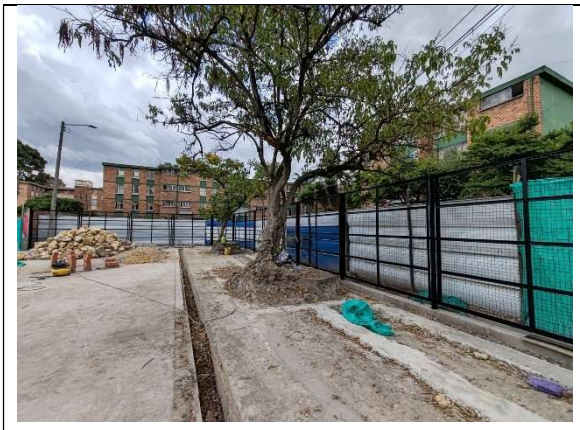

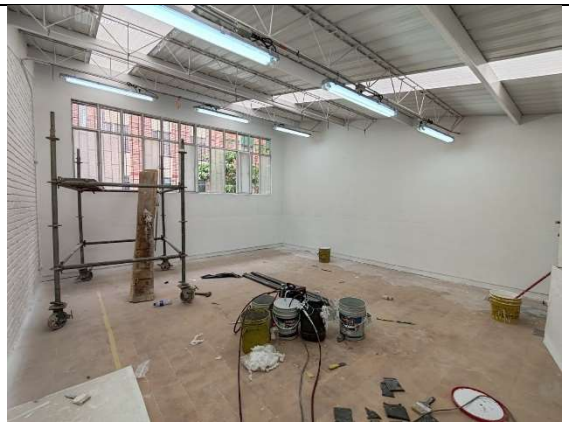

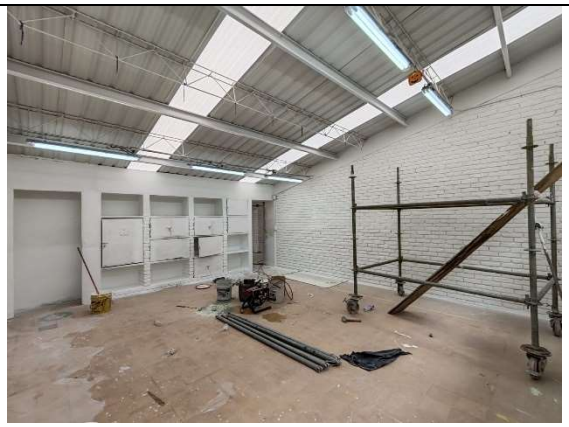
5.4.5 IED VAN UDEN SEDE A



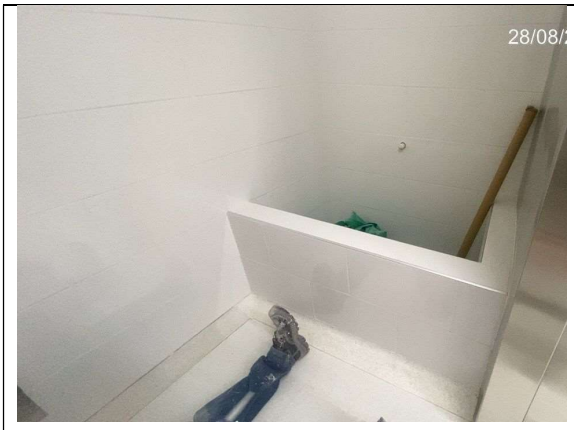


28/08/2024, 1:07:13 p. m.



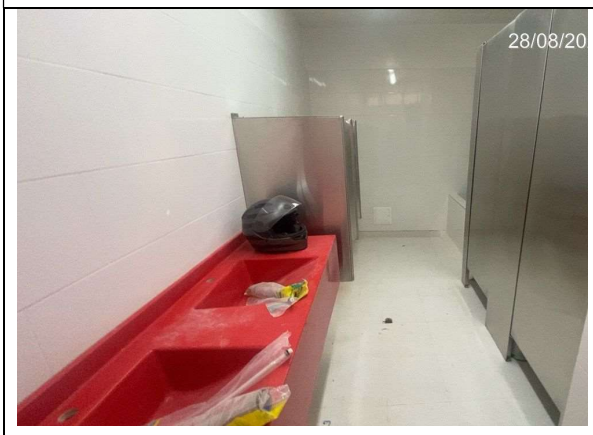


28/08/2024, 1:06:33

5.4.9 IED ISABEL II SEDE A













5.1.12 IED NELSON MANDELA













6. ATENCION DE EMERGENCIAS

Para el presente periodo se continúa con la ejecución de la atención de emergencia del IED INEM KENNEDY, IED JAIME GARZON de los cuales no se relacionan en el siguiente consolidado ya que aún no se han cerrado y por tanto no se cuenta con su valor final.

COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	FECHA	VALOR
IED LUIS ALFONSO TORRES	Arreglo en tablero eléctrico	Febrero	$ 305.260,00
IED LUIS ANGEL ARANGO SEDE A	Adecuación de aulas modulares para atención de contingencia	Octubre	$66.365.016,18
IED KENNEDY	Intervención en área de cocina y cuartos fríos	octubre	$20.845.776,99
IED HERNANDO DURAN DUSAN	Intervención en área de cocina, cambio de pisos y	Julio	$66.776.120,79
IED NUEVA CASTILLA	Inundación de cuarto de maquina	Junio	$ 1.797.294,00
IED MARSELLA SEDE A	Emergencia baños	Junio	$ 7.129.988,83
IED GABRIEL BETANCOURT MEJIA	Cambio de puertas acceso en vidrio	Junio	$ 25.261.854,91
IED TOM ADAMS SEDE B	cambio de piso	Mayo	$ 8.339.633,12
IED OEA	filtración red presión	Mayo	$ 1.316.964,96
IED GABRIEL BETANCOURT MEJIA	Filtración red hidráulica	Mayo	$ 1.008.109,00
IED EMMA VILLEGAS DE GAITAN	Intervención en cocina	Abril	$ 1.461.713,25
IED CODEMA SEDE A	Reparación techo baño de niños	Marzo	$ 1.552.697,54
CDI MARSELLA	Intervención de redes eléctricas	Febrero	$24.378.531,07
CDI SAN JOSE SEDE A	Intervención de cárcamos en área de cocina	Febrero	$ 2.904.609,71
IED GUSTAVO ROJAS PINILLA	Tala y poda de árboles	Febrero	$2.935.564,00

IED LA FLORESTA SUR SEDE A	Tala de árbol	Febrero	$853.237,00
IED CLASS SEDE C	Poda de árbol	Febrero	$375.853,00
IED INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Poda de arboles	Febrero	$1.055.969,00
IED JAIME HERNANDO GARZON FORERO	Tala de árboles	Febrero	$5.119.422,00
IED MARSELLA	Tala de árboles	Febrero	$1.706.474,00
IED TOM ADAMS SEDE B	Poda de árboles	Febrero	$2.863.644,00
IED INEM DE KENNEDY	Poda de árboles	Febrero	$ 680.116,00
IED SAN JOSE SEDE B EL DESCANSO	Poda de árboles	Febrero	$ 680.116,00
IED FRANCISCO DE MIRANDA	Poda de árboles	Febrero	$2.040.348,00
VALOR TOTAL ATENCION EMERGENCIAS			$ 248.173.109,35

7. ACTAS DE ENTREGA

Para el presente periodo no se realizaron actas de entregas.

8. ASPECTO FINANCIERO

8.1 Presupuesto de obra

A continuación, se presenta cuadro comparativo entre presupuesto de cada uno de los colegios según los alcances presentados por parte de la secretaria de educación y presupuesto presentado por parte del contratista hasta el presente mes correspondiente al balance financiero V4. Los presupuestos relacionados están actualizados a la fecha.

LOCALIDAD	COLEGIO	PRESUPUESTO SED	PRESUPUESTO CONTRATISTA
FONTIBON	IED LUIS ANGEL ARANGO SEDE B LA CABAÑA	$ 1.435.548.882,00	$ 1.299.598.077,00
	IED VAN UDEN SEDE C SAN VICENTE	$ 339.486.886,00	$ 98.660.199,00
	IED ATAHUALPA	$ 277.156.505,00	$ 306.594.265,00
	IED PABLO NERUDA SEDE B ANTONIO NARIÑO	$ 101.296.613,00	$ 201.056.072,00
	IED LA FELICIDAD	$ 255.853.547,00	$ 118.220.079,00
	IED CARLOS FEDERICI SEDE A ZONA FRANCA	$ 406.170.709,00	$ 321.910.433,00
	IED RODRIGO ARENAS BETANCOURT SEDE A SIMON BOLIVAR	$ 359.146.768,00	$ 103.625.289,00
	DIRECCION LOCAL DE FONTIBON	$ 102.946.262,00	$ 102.946.262,00
	BODEGA FONTIBON	$ 11.979.519,00	$ 3.388.422,00
	FABRICA DE TIZA	$ 5.294.385,00	$ 4.101.362,50
	IED VAN UDEN SEDE A	$ 746.891.491,00	$ 287.872.176,00
	IED INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS	$ 194.128.676,00	$ 120.218.936,00
KENNEDY	IED SAN JOSE DE CASTILLA SEDE A	$ 577.643.886,00	$ 208.162.447,00
	IED SAN JOSE DE CASTILLA SEDE C VISION COLOMBIA	$ 197.248.964,00	$ 158.466.463,00
	IED NICOLAS ESGUERRA SEDE A	$ 893.401.272,00	$ 1.538.829.715,00
	IED KENNEDY SEDE C LOS HEROES	$ 676.596.484,00	$ 1.048.047.076,00
	IED KENNEDY SEDE D ROSA MARIA GORDILLO	$ 799.859.520,00	$ 859.164.410,00
	IED NELSON MANDELA SEDE A	$ 525.683.334,00	$ 422.042.864,00
	IED JACKELINE SEDE A	$ 387.831.474,00	$ 219.189.301,00
	IED ISABEL II SEDE A	$ 496.232.694,00	$ 611.983.267,00
	IED CLASS SEDE C ROMULO GALLEGOS	$ 425.339.692,00	$ 793.422.475,00
	IED SAN JOSE SEDE B EL DESCANSO	$ 1.838.051.134,00	$ 1.621.220.138,00


8.2 Análisis de estado financiero


Para el mes de agosto al cual corresponde el presente informe mensual, se presenta el corte de obra N.18, el cual cuenta con un valor facturado por parte del contratista de obra de $419.020.571,00

Con respecto al acumulado entre los cortes de obra facturados por parte del contratista, se cuenta con un valor total de $ 9.330.457.695,00 este valor corresponde a un porcentaje de obra ejecutado de 81.70%.

Para el presente periodo se identifica un avance de 3.67% con respecto al anterior periodo

A continuación, se relacionan gráficos comparativos entre los valores correspondiente a cada una de las actas de corte parciales de obra a la fecha al igual que los porcentajes de avance

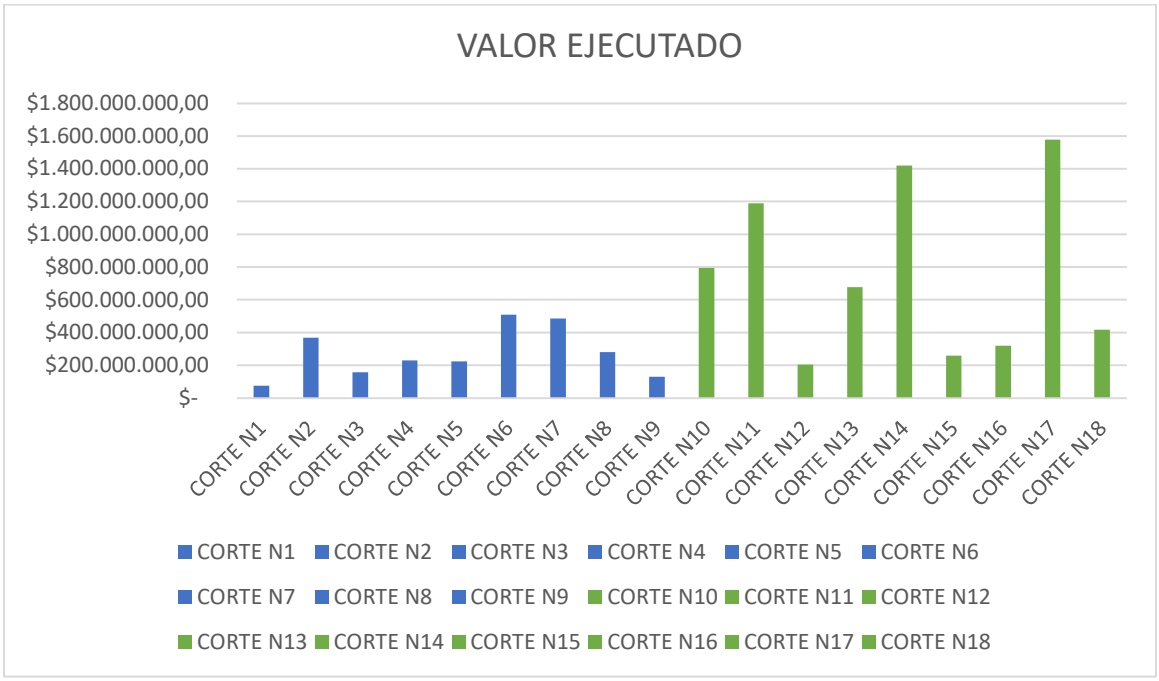

VALOR EJECUTADO
$1.800.000.000,00
$1.600.000.000,00
$1.400.000.000,00
$1.200.000.000,00
$1.000.000.000,00
$800.000.000,00
$600.000.000,00
$400.000.000,00
$200.000.000,00
$-
CORTE N1
CORTE N2
CORTE N3
CORTE N4
CORTE N5
CORTE N6
CORTE N7
CORTE N8
CORTE N9
CORTE N10
CORTE N11
CORTE N12
CORTE N13
CORTE N14
CORTE N15
CORTE N16
CORTE N17
CORTE N18

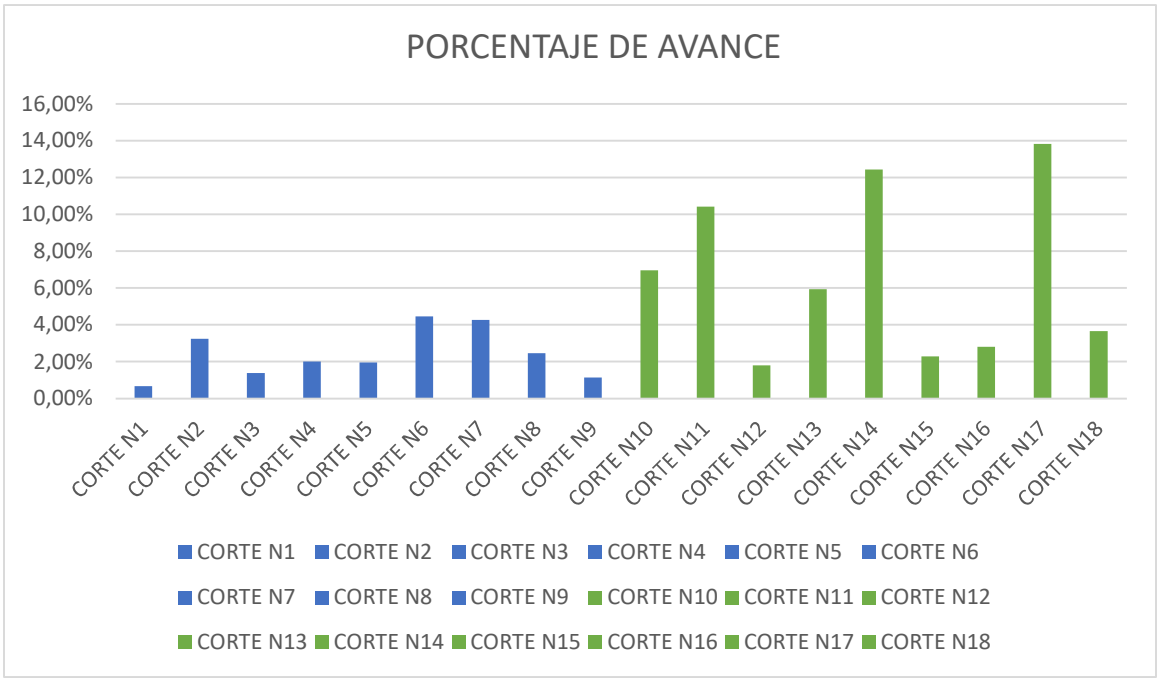
PORCENTAJE DE AVANCE
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
CORTE N1
CORTE N2
CORTE N3
CORTE N4
CORTE N5
CORTE N6
CORTE N7
CORTE N8
CORTE N9
CORTE N10
CORTE N11
CORTE N12
CORTE N13
CORTE N14
CORTE N15
CORTE N16
CORTE N17
CORTE N18

8.3 Control al avance de ejecución de obra Programado Vs Ejecutado

Los porcentajes de obra tanto programados como ejecutados son netamente basados en la información financiera, ya que el contratista presentó **el balance financiero versión 3** para el presente periodo se identifica que en diferentes frentes de obra los presupuesto se actualizaron con respecto a los alcances en cada colegio

Valor contrato	% Ejecutado	% Restante por ejecutar
$ 11.419.923.186,00	81.70%	18.30%

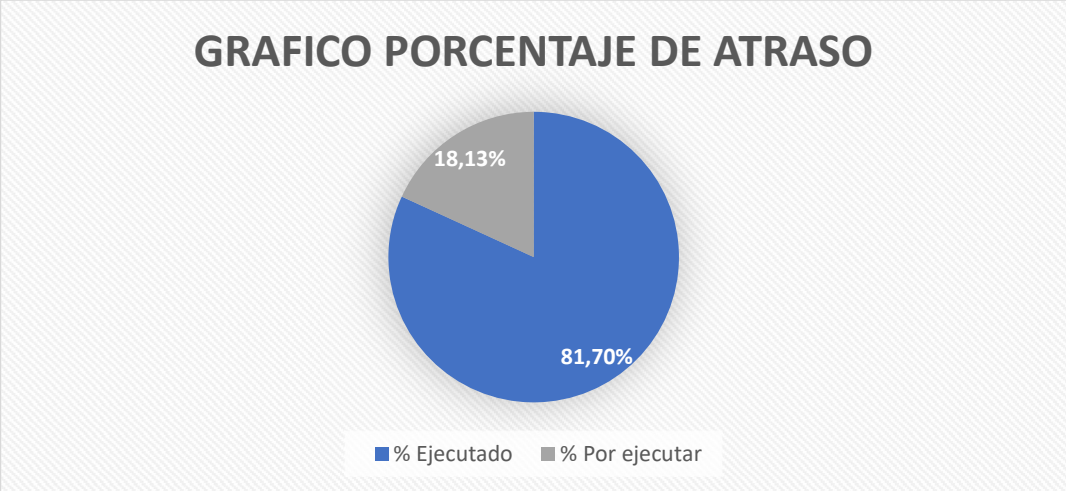

Relación de Seguimiento de avance del presente mes según programación entregada por parte del contratista, en donde se relaciona cuadro comparativo entre porcentajes y valores programados Vs ejecutados, en cada uno de los frentes:

MES DE JULIO 2024			
% Programado	Valor programado	% Ejecutado	Valor ejecutado
100%	$ 11.419.923.186,00	81.70%	$ 9.330.457.695,00

MES DE JULIO 2024		
Colegio	% Programado	% Ejecutado
IED LUIS ANGEL ARANGO SEDE B LA CABAÑA	100 %	80,86%
IED VAN UDEN SEDE C SAN VICENTE	100%	100%
IED VAN UDEN SEDE A VAN UDEN TORRE NORTE	100 %	80.25%
IED ATAHUALPA SEDE A	100%	100%

IED PABLO NERUDA SEDE B ANTONIO NARIÑO	100%	100%
IED LA FELICIDAD	100%	100%
IED COLEGIO CARLOS FEDERECI SEDE A ZONA FRANCA	100%	100%
IED RODRIGO ARENAS BETANCOURT SEDE A	100%	100%
BODEGA DE FONTIBON	100%	100%
FABRICA DE TIZAS	100%	100%
IED SAN JOSE CASTILLA SEDE C VISION COLOMBIA	100%	100%
IED NICOLAS ESGUERRA SEDE A	100%	91,71%
IED KENNEDY SEDE C LOS HEROES	100%	91,25%
IED CLASS SEDE C ROMULO GALLEGOS	100%	63,76%
IED COLEGIO SAN JOSE SEDE B EL DESCANSO	100%	100%
IED INTEGRADO FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS	100%	100%
IED NELSON MANDELA SEDE A	100%	85,81%
IED KENNEDY SEDE D ROSA MARIA GORDILLO	100%	16.74%
IED ISABEL II SEDE A	100%	94,67%
IED JACKELINE SEDE A	100%	100%
IED SAN JOSE DE CASTILLA SEDE A CASTILLA	100%	3.59%



8.4 Control corte de obra

Dentro del corte N18 el contratista de obra hace cobro de las actividades ejecutadas en los siguientes frentes:

- IED LUIS ANGEL ARANGO SEDE B LA CABAÑA
- IED VAN UDEN SEDE A VAN UDEN TORRE NORTE
- IED PABLO NERUDA SEDE B ANTONIO NARIÑO
- IED LA FELICIDAD

- IED NICOLAS ESGUERRA SEDE A
- IED KENNEDY SEDE C LOS HEROES
- IED COLEGIO SAN JOSE SEDE B EL DESCANSO
- IED NELSON MANDELA
- IED KENNEDY SEDE D ROSA MARIA GORDILLO
- IED ISABEL II SEDE A
- INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

CORTE DE OBRA N17	
COLEGIOS DE MEJORAMIENTOS	
Colegio	Valor Ejecutado
IED LUIS ANGEL ARANGO SEDE B LA CABAÑA	$ 65.993.992,51
IED VAN UDEN SEDE A VAN UDEN TORRE NORTE	$ 100.108.950,05
IED PABLO NERUDA SEDE B ANTONIO NARIÑO	$ 5.910.902,60
IED LA FELICIDAD	$ 6.085.031,22
IED NICOLAS ESGUERRA SEDE A	$ 10.470.249,50
IED KENNEDY SEDE C LOS HEROES	$ 24.003.586,56
IED COLEGIO SAN JOSE SEDE B EL DESCANSO	$ 4.875.028,00
IED NELSON MANDELA	$ 32.232.064,05
IED KENNEDY SEDE D ROSA MARIA GORDILLO	$ 1.645.971,80
IED ISABEL II SEDE A	$ 40.719.909,94
COLEGIOS ATENCION DE EMERGENCIA	
IED INEM KENNEDY	$ 118.139.462,80
VALOR MEJORAMIENTOS	$ 292.045.686,23
VALOR ATENCION EMERGENCIAS	$ 118.139.462,80
VALOR TOTAL CORTE N17	$ 419.020.571,00

9. RELACION DE PAGOS

9.1 Contrato de interventoría

CONCEPTO	VALOR
Acta Parcial No 01 Contrato Interventoría	$5,590,202.00
Acta Parcial No 02 Contrato Interventoría	$ 26.949.779.00
Acta Parcial No 03 Contrato Interventoría	$ 11.514.147.00
Acta Parcial No 04 Contrato Interventoría	$ 16.770.605.00
Acta Parcial No 05 Contrato Interventoría	$ 16,186,554.00
Acta Parcial No 06 Contrato Interventoría	$ 31.200.800,62
Acta Parcial No 07 Contrato Interventoría	$ 35.376.800,00

Acta Parcial No 08 Contrato Interventoría	$ 20.692.091,00
Acta Parcial No 09 Contrato Interventoría	$ 9.428.251,00
Acta Parcial No 10 Contrato Interventoría	$ 58.154.787,00
Acta Parcial No 11 Contrato Interventoría	$ 87.190.462,00
Acta Parcial No 12 Contrato Interventoría	$15.018.453,00
Acta Parcial No 13 Contrato Interventoría	$112.888.704,00
Acta Parcial No 14 Contrato Interventoría	$200.358.163,00
Acta Parcial No 15 Contrato Interventoría	$33.487.702,00
Acta Parcial No 16 Contrato Interventoría	$22.859.826,00
Acta Parcial No 17 Contrato Interventoría	$189.783.192,00
Acta Parcial No 18 Contrato Interventoría	$81.779.434,00
VALOR ACUMULADO	**$981.158.106,00**

9.2 Contrato de obra

CONCEPTO	VALOR
Acta Parcial No 01 Contrato Obra	$ 76.045.979,00
Acta Parcial No 02 Contrato Obra	$ 369.051.505,00
Acta Parcial No 03 Contrato Obra	$ 157.640.658,00
Acta Parcial No 04 Contrato Obra	$ 229.624.540,00
Acta Parcial No 05 Contrato Obra	$ 223.555.294,00
Acta Parcial No 06 Contrato Obra	$ 508.507.253,00
Acta Parcial No 07 Contrato Obra	$ 486.261.713,00
Acta Parcial No 08 Contrato Obra	$ 280.400.368,00
Acta Parcial No 09 Contrato Obra	$ 130,337,376.00
Acta Parcial No 10 Contrato Obra	$ 796,161,759.00
Acta Parcial No 11 Contrato Obra	$1.190.900.448,00
Acta Parcial No 12 Contrato Obra	$ 205.506.720,00
Acta Parcial No 13 Contrato Obra	$ 678.804.604,00
Acta Parcial No 14 Contrato Obra	$ 1.420.554.150,00
Acta Parcial No 15 Contrato Obra	$260.784.404,00
Acta Parcial No 16 Contrato Obra	$321.016.492,00
Acta Parcial No 17 Contrato Obra	$1.578.819.893,00
Acta Parcial No 18 Contrato Obra	$ 419.020.571,00
VALOR ACUMULADO	**$ 9.330.457.695,00**

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Según las condiciones dadas en el transcurrir de la ejecución del contrato se requiere realizar prorroga la cual en el presente periodo se esta tramitando por parte de las tres entidades
- Para el presente periodo se finalizan los siguientes frentes de obra: IED PABLO NERUDA SEDE B, IED LA FELICIDAD, IED CARLO FEDERICI, de los cuales cuentan con pendientes como retiros de escombro y aseo final para su entrega
- Esta interventoría presenta a la secretaría el presunto incumplimiento por parte del contratista

11. ANEXOS

11.1 Acta comité de obra

- Acta de Reunión No. 60
- Acta de Reunión No. 61
- Acta de Reunión No. 62
