Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

FECHA:	Semana:	**12**	12/01/2026	16/01/2026	


OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.

CONTRATO DE OBRA No.:	1890-2025	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	1900 -2025
CONTRATISTA	ID SAS	**INTEVENTOR**	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 497.846.840,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 49.167.825,00
FECHA DE INICIO OBRA:	27/10/2025	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	27/10/2025
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	NA	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	NA
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	NA	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	NA
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31/12/2025	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE INITORIA:**	31/12/2025
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	16/01/2026	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE INITORIA:**	16/01/2026
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	85	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	85


3. Descrición Obras ejecutadas

OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA, ACTA DE TERMINACION.

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.





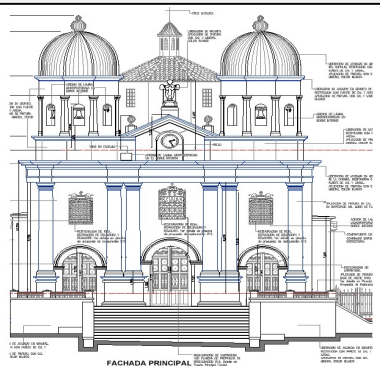

FACHADA PRINCIPAL





E. Curva "S"

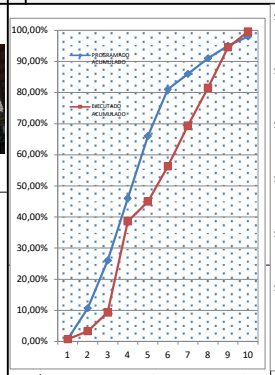


Gráfico porcent ejecutadas vs programadas



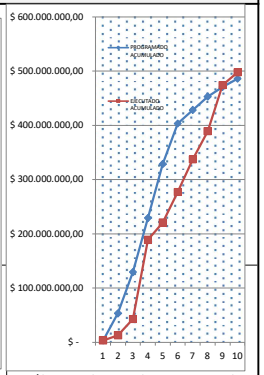


Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico




Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	64,00	**98%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 497.846.840,0**	**100,00%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 497.846.840,0**	**100,00%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**$ 0,00**	**0,00%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)	0,00	

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	2
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1
	INGENIERO RESIDENTE	1
	ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL	
	SST	1
	MAESTRO DE OBRA	
	AYUDANTES	5
	OFICIALES	10
	HERREROS	
TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA		**20**


CONSTRUCTODO INEGNEIROS CONTRATISTAS LTDA
INTERVENTOR
HENRY ALBERTO CASTRO REINA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
2	10,00%	10,70%	2,59%	3,29%
3	15,30%	26,00%	6,03%	9,32%
4	20,00%	46,00%	29,30%	38,62%
5	20,00%	66,00%	6,38%	45,00%
6	15,00%	81,00%	11,30%	56,30%
7	5,00%	86,00%	13,09%	69,39%
8	5,00%	91,00%	12,20%	81,59%
9	4,00%	95,00%	13,00%	94,59%
10	3,00%	98,00%	5,00%	99,59%
11	1,00%	99,00%	0,41%	100,00%
12	1,00%	100,00%		

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 3.485.393,28	$ 3.485.393,28	$ 3.484.927,88	$ 3.484.927,88
2	$ 49.791.332,60	$ 53.276.725,88	$ 9.405.677,80	$ 12.890.605,68
3	$ 76.180.738,87	$ 129.457.464,75	$ 30.002.196,96	$ 42.892.802,64
4	$ 99.582.665,19	$ 229.040.129,94	$ 146.116.777,02	$ 189.009.579,66
5	$ 99.582.665,19	$ 328.622.795,13	$ 31.762.628,39	$ 220.772.208,05
6	$ 74.686.998,89	$ 403.309.794,03	$ 56.256.692,92	$ 277.028.900,97
7	$ 24.895.666,30	$ 428.205.460,33	$ 60.168.151,36	$ 337.197.052,33
8	$ 24.895.666,30	$ 453.101.126,62	$ 55.259.382,84	$ 389.082.694,00
9	$ 21.954.381,74	$ 470.913.325,00	$ 84.998.323,47	$ 474.081.017,47
10	$ 14.937.399,78	$ 485.850.724,78	$ 23.765.822,53	$ 497.846.840,00
11	$ 4.979.133,26	$ 490.829.858,04		
12	$ 4.979.133,26	$ 497.846.840,00		

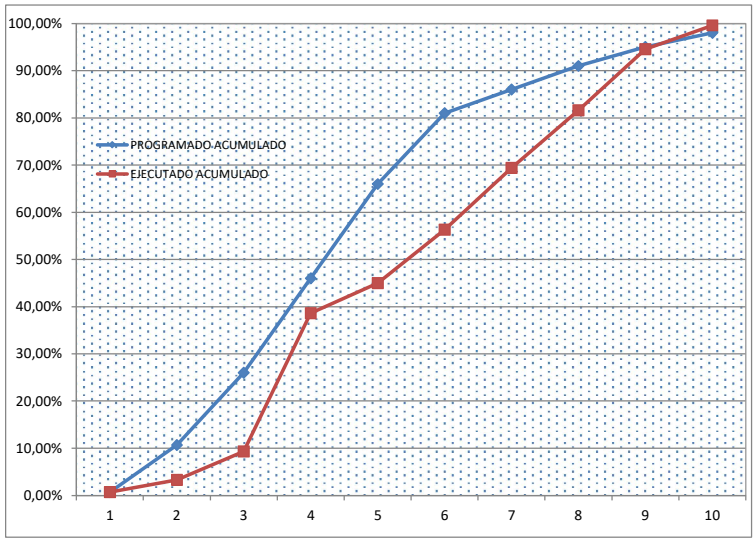

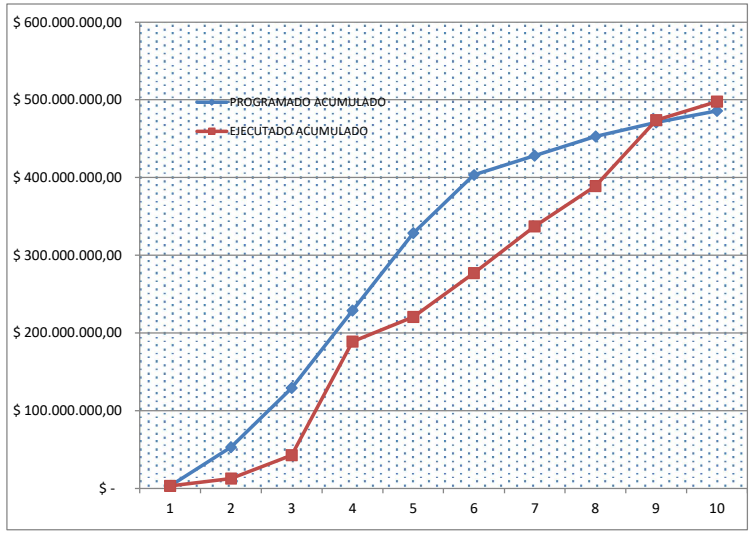

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
INTERVENTOR

SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA

FECHA REG.	**OCTUBRE 2025**	**DEPARTAMENTO**	**ANTIOQUIA**
SEMANA No.	**1**	**OBJETO**	**PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL**
IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN		**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL**	

BALANCE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: PRELIMINARES										
1.1	Campamento 9 M2	UNIDAD	1,00	$ 3.049.459	$ 3.049.459		$ -	0%	1,00	$ 3.049.459,00	100,00%
1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN TELA VERDE H = 2.10 M (Incluye postes en madera rolliza y polisombra verde o similar)	ML	100,00	$ 49.173	$ 4.917.300		$ -	0%	100,00	$ 4.917.300,00	100,00%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.966.759**		**$ -**			**$ 7.966.759,00**	
	CAPITULO 3: ESTRUCTURA MODULOS										
3.1	Plataformas de trabajo COMPLETA con andamio certificado de 4.4 X 12 H=30m.	kg/día	30000,00	$ 4.796,00	$ 143.880.000		$ -	0%	30000,00	$ 143.880.000,00	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 143.880.000**		**$ -**			**$ 143.880.000,00**	
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA										
4.1	Desmonte de enchape en granito (incluye retiro de escombros)	M2		$ 77.793	$ -		$ -			$ -	
4.2	Reparación y/o remplazo de molduras afectadas o faltantes	ML	65,81	$ 565.420	$ 37.207.677	5,01	$ 2.832.754,20		65,81	$ 37.207.677,39	100%
4.3	Reparación arcos de medio punto en ladrillo	UN	3,00	$ 3.243.227	$ 9.729.681		$ -		3,00	$ 9.729.681,00	100%
4.4	Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros	ML	28,00	$ 346.523	$ 9.702.644		$ -	0%	28,00	$ 9.702.644,00	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 56.640.002**		**$ 2.832.754,20**			**$ 56.640.002,39**	
	CAPITULO 10: ACABADOS										
10.1	Pañete 1:3 a base de cal y arena y fibra vegetal. No incluye pintura	M2	1047,34	$ 84.591	$ 88.595.538		$ -	0%	1047,34	$ 88.595.537,94	100%
10.2	Pintura muro tres manos, con cal + mineral (blanco)	M2	1047,34	$ 31.860	$ 33.368.252	55,34	$ 1.763.132,40	100,00%	1047,34	$ 33.368.252,40	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 121.963.790**		**$ 1.763.132,40**			**$ 121.963.790,34**	
	CAPITULO 13: CARPINTERIA METALICA Y MADERA										
13.1	Mantenimiento de carpintería en metalica (incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte de acabado final)	M2		$ 587.657	$ -		$ -			$ -	
13.2	Mantenimiento de carpintería en madera(incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de inmunizante y dos manos de barniz de acabado final)	M2		$ 787.142	$ -		$ -			$ -	
13.4	Suministro e instalacion de proteccion vanos campanarios (rejas en marco metalico (con 1 mano de antocorrosivo y 2 manos de acabado en esmalte) y malla para control de aves (color transparente, material nylon, calibre 0,8mm rombo 4,4cm, resistencia 180k*m2, durabilidad de 4 a 6 años. Caracteristicas: proteccion uv y antihongos, no absorbe humedad, no conduce electricidad, no es escalable, no deshilacha, nudo reforzado)	M2	20,02	$ 657.540	$ 13.163.951	15,02	$ 9.876.250,80		20,02	$ 13.163.950,80	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 13.163.951**		**$ 9.876.250,80**			**$ 13.163.950,80**	
	CAPITULO 14: CUBIERTA										
14.1	lavado y protección con sello hidrofugo de cúpulas con acabado en granito	M2	94,45	$ 166.132	$ 15.691.167		$ -		94,45	$ 15.691.167,40	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 15.691.167**		**$ -**			**$ 15.691.167,40**	
	CAPITULO 15: OBRAS EXTERIORES Y ASEO GENERAL										
15.1	Aseo general para entrega	M2	300	$ 11.150	$ 3.345.000	211,23	$ 2.355.214,50		300,00	$ 3.345.000,00	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 3.345.000**		**$ 2.355.214,50**			**$ 3.345.000,00**	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL						
							$ -		0,00	$ -	
	TOTAL OBRAS NO PREVISTAS CIMENTACION						**$ -**			**$ -**	
	TOTAL CAPITULO OBRAS NO PREVISTAS										

	COSTOS DIRECTOS		**$ 362.650.670**		**$ 16.827.352**			**$ 362.650.670**		
	ADMINISTRACION	28,33%	$ 102.738.935	28,33%	$ 4.767.189		28,33%	$ 102.738.935		
	IMPREVISTOS	3,00%	$ 10.879.520	3,00%	$ 504.821		3,00%	$ 10.879.520		
	UTILIDAD	5,00%	$ 18.132.533	5,00%	$ 841.368		5,00%	$ 18.132.533		
	TOTAL A.I.U. 30%		**$ 131.750.988**		**$ 6.113.377**			**$ 131.750.988**		
	TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 494.401.658**		**$ 22.940.729**			**$ 494.401.658**		
	IVA APBRE UTILIDAD		**$ 3.445.181**		**$ 159.860**			**$ 3.445.181**		
	COSTO TOTAL		**$ 497.846.840**		**$ 23.100.589**			**$ 497.846.840**		

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
HENRY ALBERTO CASTRO REINA
INTERVENTOR

SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA			
CONSECUTIVO:	1	AMBITO:	PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL
IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓNDEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN		INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL	

BALANCE DE OBRA


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1.1	Campamento TIPO	UNIDAD	1,00	$ 3.549.059	$ 3.549.059
1.7	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN TELA VERDE CON ESTRUCTURA METALICA (postes metalicos cada 2.5 metros)	ML	1955,00	$ 49.170	$ 3.397.700
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.046.759**
	CAPITULO 2: ESTRUCTURA MODULOS				
2.1	Presbiterios de Iglesia COMPLETA con andamio construido en 4.0 X 2.2 de alto	Iglesia	20000,00	$ 4.796,00	$ 143.880.000
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 143.880.000**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
4.1	Desmonte de enchape en granito (incluye retiro de escombros)	M2		$ ###	$
4.2	Reparación y/o remplazo de muelle de afectados o faltantes	ML	64,81	$ 666.667	$ 27.267.627
4.3	Reparación arcos de medio punto en ladrillo	UN	1,00	$ 3.410.207	$ 3.734.641
4.4	Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros	ML	29,00	$ 388.965	$ 2.776.414
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 34.040.682**
	CAPITULO 10: ACABADOS				
10.1	Pulido (1 a 3 pase de cal y arena) Nivelación de enlucido fino incluye pintura	M2	1047,24	$ 86.995	$ 88.581.704
10.2	Pintura muro tres manos, con cal + mineral blanco	M2	1047,24	$ 37.889	$ 33.382.839
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 121.964.543**
	CAPITULO 12: CARPINTERIA METALICA Y MADERA				
12.1	Mantenimiento de carpintería en metálica (incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de antioxidoso y dos manos de esmalte de acabado final)	M2		$ 697.897	$ -
12.2	Mantenimiento de carpintería en madera(incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de imunizante y dos manos de barniz de acabado final)	M2		$ 797.742	$ -
12.4	Suministro e instalacion de protección varios campanarios (vigia en marco metalico (con 1 mano de antioxoroloso y 2 manos de acabado en esmalte) y malla para control de aves (color transparente, material nylon, calibre 0,8mm como 4,4cm, resistencia 1800 Psi, durabilidad de 4 a 6 años. Caracteristicas: proteccion uv y antibiorgnia, no absorbe humedad, no conduce electricidad, no es oxidable, no dentellaria, nudo reforzado)	M2	20,12	$ 697.960	$ 13.163.951
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 13.163.951**
	CAPITULO 14: CUBIERTA				
14.1	lavado y protección con sello hidrofugo de cúpulas con acabado en granito	M2	94,41	$ 180.722	$ 17.691.167
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 19.691.167**
	CAPITULO 15: OBRAS EXTERIORES Y ASEO GENERAL				
15.1	Aseo general para entrega	M2	300	$ 11.130	$ 3.345.000
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 3.345.000**
	CAPITULO 16: ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
	TOTAL OBRAS NO PREVISTAS CIMENTACION				
	TOTAL CAPITULO OBRAS NO PREVISTAS				

COSTOS DIRECTOS		**$ 362.650.973**
ADMINISTRACION	26.39%	$ 95.711.849
IMPREVISTOS	3%	$ 10.879.529
UTILIDAD	5%	$ 18.132.548
TOTAL A.I.U. 35%		**$ 124.723.926**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 494.462.071**
5% APORTE UTILIDAD		**$ 2.461.184**
COSTO TOTAL		**$ 497.847.255**

CONSTRUCTORES INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
HENRY ALBERTO CASTRO SILVA
INTERVENTOR

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION

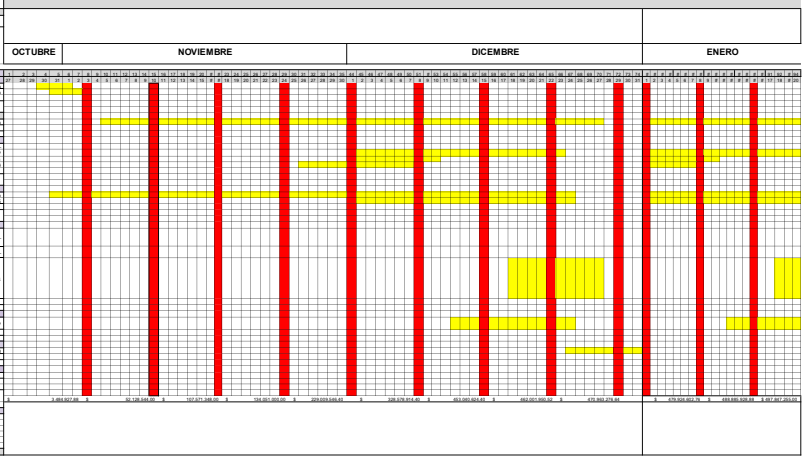


| | | | | |

ANEXO 3

Proyecto Nº.		
Interventor:	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	
Constructor:	ID SAS	
Semana Reportada:	12	
Perido de Informe:	12/01/2026	17/01/2026

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

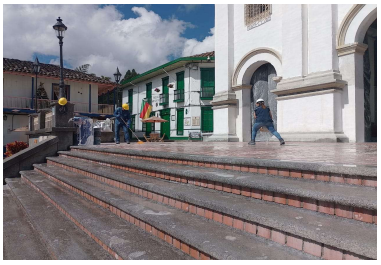


RETIRO SEÑALIZACION



SEÑALIZACION

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



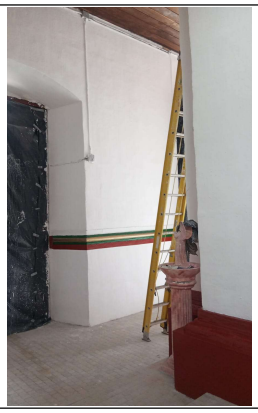

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

NO APLICA

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

NO APLICA

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:





CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	CONSTRUCTODO INEGNIEROS CONTRATISTAS LTDA	
Constructor:	ID SAS	
Semana Reportada:	12	
Perido de Informe:	12/01/2026	17/01/2026

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

	SI	NO
La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No. _____**		X

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad: SE REALIZAN 57 OBSERVACIONES PARA ENTREGAR OBRA

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Periodo de alistamiento y preliminares.

	SI	NO
La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No. _____**		X

Enumere los equipos calibrados:

3. ENSAYOS


	SI	NO
La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No. _____**		X


Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales: NO APLICA DURANTE LA SEMANA

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



























OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JOSE TOMA ARIAS	DIRECTOR DE OBRAS	50%
ANTONIO LUIS ARTEAGA SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRAS	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
HENRY ALBERTO CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
DAVID AMAYA NAVARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 12 FINAL			
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	12/01/2026 **Y EL** 17/01/2026 **PLAZO:**		
CONTRATISTA:	ID SAS	**CONTRATO No.**	1890-2025
INTERVENTOR:	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	**CONTRATO No.**	1900 -2025

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES ENERO																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
ESPECIALISTAS																																
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
MAESTRO DE OBRA																																
OFICIAL	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3																
AYUDANTE	1	5	5	5	2	1	5	5	5	2	5	2	2	5	2	2																
SST	1	1	1	1		1	1	1	1		1			1																		
PERSONAL CONTRATISTA	**8**	**12**	**12**	**12**	**7**	**8**	**12**	**12**	**12**	**7**	**12**	**7**	**7**	**12**	**7**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** **154**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16	10,39%	
De fuera de la región	4 4 4 8 8 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8	104	67,53%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16	10,39%	
De fuera de la región	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	48	31,17%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**0**	**0,00%**	
De la región	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0,00%	
De fuera de la región	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0,00%	
En condición de desplazamiento	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0,00%	
MUJERES		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16	10,39%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	
PROVEEDORES				
Local	2			
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

HENRY ALBERTO CASTRO REINA
INTERVENTOR

OBRA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor anticipo:	20%	$ 99.569.368,00
valor propuesta:	100%	$ 497.846.840,00

ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO		VALOR
COMPRA DE MATERIALES	30%	$ 29.870.810,40
PAGO DE MANO DE OBRA Y CONTRATISTAS	35%	$ 34.849.278,80
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	$ 24.892.342,00
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	10%	$ 9.956.936,80

INTERVENTORIA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor pago anticipado:		$ -
porcentaje ofertado:		$ -
valor total interventoria:		$ 49.167.825,00
valor total obra:		$ 497.846.840,00
