CORPODESOC

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 027-2024

OBJETO:

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR UBICADO EN LA CARRERA 5 CON CALLE 5ª HACIA EL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DEL HATO AL MUNICIPIO DEL PALMAR - SANTANDER

INFORME FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE PALMAR-SANTANDER
2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe los diferentes aspectos del desarrollo del contrato de OBRA PUBLICA No.027-2024 suscrito entre la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ – ESVALLE S.A - E.S.P, con Nit. 900.378.564-1 y la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER – CORPODESOC SDER, Nit. 900.823.015-7, con objeto "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR UBICADO EN LA CARRERA 5 CON CALLE 5ª HACIA EL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DEL HATO AL MUNICIPIO DEL PALMAR – SANTANDER"

El informe se ha desarrollado bajo los siguientes capítulos:

- Información general del contrato.
- Descripción del proyecto.
- Metodología.
- Conclusiones y Recomendaciones
- Registro fotográfico

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Los datos generales del contrato se detallan a continuación:

CONTRATO No	027 DE 2024	**FECHA**	27-11-2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR UBICADO EN LA CARRERA 5 CON CALLE 5A HACIA EL CAMINO VEREDAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DEL HATO AL MUNICIPIO DE PALMAR - SANTANDER		
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLE DE SAN JOSÉ ESVALLE S.A. E.S.P.		
NIT.	900.378.564-1		
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER – CORPODESOC SDER		
NIT.	900.823.015-7		
REPRESENTANTE LEGAL	WILMER FERNEY HERNÁNDEZ GÓMEZ		
CÉDULA CIUDADANÍA No	1.101.687.313, DE SOCORRO		
VALOR	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($362.184.740,00)		
SUPERVISOR	FERNANDO ACEVEDO VARGAS		
CÉDULA CIUDADANÍA No	91.069.122 DE SAN GIL		
CARGO O ACTIVIDAD	SUPERVISOR		
CONTRATO No	020 DE 2024 Y 004 DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
INTERVENTORIA	N/A		
NIT. INTERVENTORÍA	N/A		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CÉDULA CIUDADANÍA No	N/A		
FECHA DE INICIACIÓN	NOVIEMBRE 29 DE 2024		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	DICIEMBRE 24 DE 2024		
FECHA DE REINCIO No. 1	FEBRERO 07 DE 2025		
PRÓRROGA No. 1	DOS (02) MESES		
FECHA DE PRÓRROGA No. 1	FEBRERO 07 DE 2025		
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	ABRIL 06 DE 2025		
FECHA DE REINCIO No. 2	AGOSTO 06 DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DICIEMBRE 29 DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 2	AGOSTO 12 DE 2025		
PLAZO INICIAL	UN (01) MES		
PLAZO FINAL	TRES (03) MESES		

RELACION DE ACTAS


ACTA	FECHA	CONTRATO	OBSERVACION
ACTA DE INICIO	NOVIEMBRE 29 DE 2024	Obra Pública No. 027 DE 2024	Se formalizó el inicio de la ejecución de los contratos, estableciendo como fecha de terminación el 29 de diciembre de 2024.
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	DICIEMBRE 24 DE 2024	Obra Pública No. 027 DE 2024	Suspender la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 027 de 2024 por un período de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del veinticuatro (24) de diciembre de 2024.
FECHA DE REINCIO No. 1	FEBRERO 07 DE 2025	Obra Pública No. 027 DE 2024	Reiniciar el Contrato de Obra Pública No. 027 de 2024, a partir del siete (07) de febrero de 2025..
PRÓRROGA No. 1	DOS (02) MESES	Obra Pública No. 027 DE 2024	Se prorroga por dos (02) meses el plazo de ejecución, lo cual permitirá garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, realizar los controles de calidad necesarios y asegurar la correcta terminación de las obras para la prestación eficiente del servicio público de acueducto y alcantarillado a la comunidad del Municipio de Palmar.
FECHA DE PRÓRROGA No. 1	FEBRERO 07 DE 2025	Obra Pública No. 027 DE 2024	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra pública No. 027 de 2024 por un término de dos (2) meses adicionales, manteniendo inalteradas todas las demás condiciones contractuales
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS No. 01	FEBRERO 23 DE 2025	Obra Pública No. 027 DE 2024	Modificación de las cantidades de obra y la inclusión de ítems no previstos en el presupuesto del Contrato de Obra Pública No. 027 de 2024, y actualizar el cuadro del presupuesto del contrato de obra con los ajustes aprobados, de conformidad con el cuadro del balance de cantidades del Anexo 1.
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	ABRIL 06 DE 2025	Obra Pública No. 027 DE 2024	Suspender la ejecución del contrato de obra pública No. 027 de 2024, a partir del seis (06) de abril de 2025, por un período de cuatro (04) meses, o antes si se superan los hechos que motivaron la suspensión No. 2.
FECHA DE REINCIO No. 2	AGOSTO 06 DE 2025	Obra Pública No. 027 DE 2024	Reiniciar la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 027 de 2024, a partir del seis (06) de agosto de 2025.


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Palmar – Santander, hace parte de los municipios que conforman la provincia comunera, y por ende son sitios destinados por propios y extraños al descanso y la actividad turística. El Palmar cuenta con diversos sitios turísticos que en muchas temporadas del año son frecuentados por diversos grupos sociales que emergen del bullicio de las grandes ciudades y de los municipios aledaños. Por tal motivo el municipio ha extendido su área urbana y con ello sus necesidades de sistemas de alcantarillado y acueducto.

Este proyecto estuvo dirigido a la "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR UBICADO EN LA CARRERA 5 CON CALLE 5ª HACIA EL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DEL HATO AL MUNICIPIO DEL PALMAR – SANTANDER".

El proyecto se basó en la construcción de cerca de 300 ml de alcantarillado y 420 ml de redes de acueducto, con sus respectivos pozos de inspección y acometidas. El área de influencia del proyecto es de aproximadamente 29 familias que contaran con estos servicios para satisfacer las necesidades básicas en cuanto a saneamiento básico se refiere.

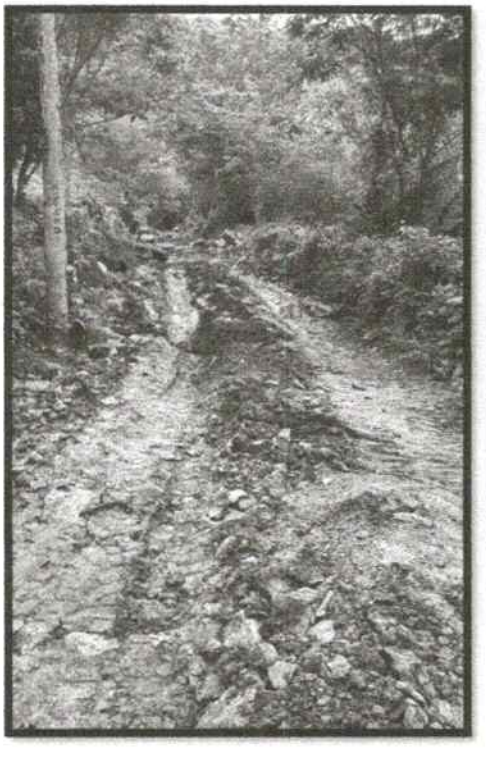

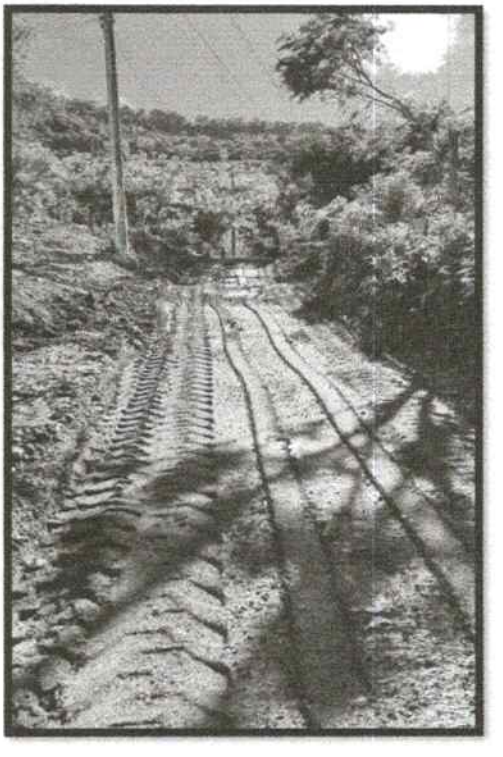


LOCALIZACION

El Palmar es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Santander, en la provincia Comunera. El municipio limita al norte con Galán, al este con el Socorro y Cabrera, por el oeste con Hato, y al sur con Simacota. Es el cuarto municipio más pequeño de Colombia. Posee una superficie de 21.9 Km² y está localizado a una altura de 889 m.s.n.m y en las coordenadas 06°32´18" N y 73°17´26" O.



El sitio donde se realizaron las actividades propias del proyecto fue la Carrera 5 con calle 5ª hacia el camino que conduce al municipio del Hato al municipio del Palmar – Santander.

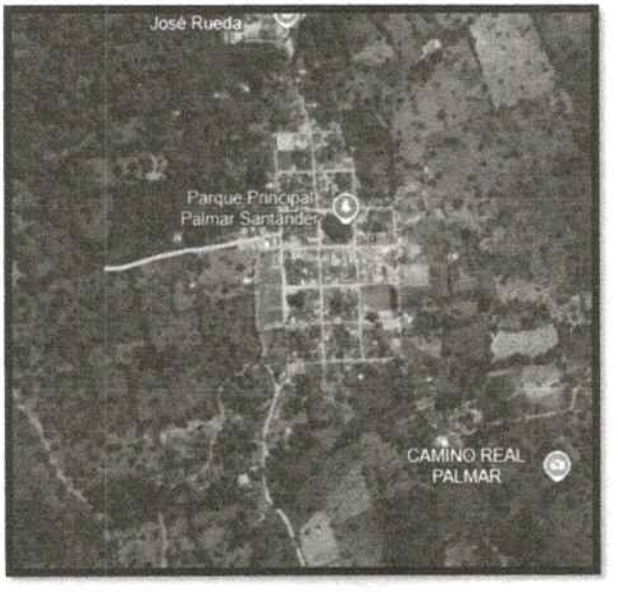

METODOLOGIA

En Colombia, los sistemas de alcantarillado son infraestructuras diseñadas para recolectar y transportar aguas residuales y aguas pluviales, usualmente a plantas de tratamiento o cuerpos receptores. Estos sistemas son esenciales para la salud pública y la protección del medio ambiente, evitando la acumulación de aguas contaminadas y reduciendo el riesgo de enfermedades.

En Colombia, la gestión del alcantarillado puede variar según la región y el municipio, pero en general, las empresas de servicios públicos son responsables de la operación y mantenimiento de estos sistemas. La inversión en infraestructura de alcantarillado es crucial para mejorar las condiciones de vida y proteger el medio ambiente, y es un objetivo de desarrollo sostenible en muchos países.

Las redes de alcantarillado cumplen un papel fundamental en el desarrollo de un país, ya que hacen parte de la infraestructura necesaria para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población y de esta manera contribuyen con el progreso sostenible y con el crecimiento económico y social a través de la inversión y la eficiente ejecución y utilización de los proyectos.


En Colombia, los sistemas de acueducto consisten en la infraestructura y procesos necesarios para captar, tratar, almacenar y distribuir agua potable a la población. Estos sistemas incluyen la captación de fuentes hídricas, sistemas de conducción (tuberías, canales, etc.), plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y la red de distribución que llega a los hogares y establecimientos.

En resumen, los sistemas de acueducto en Colombia son complejos, integrando diferentes componentes y procesos para asegurar un suministro continuo y seguro de agua potable a la población, garantizando su potabilidad y calidad.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Localización y Replanteo.


La localización y replanteo en la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado consistió en el proceso de trasladar las dimensiones y detalles de los diseños y planos al terreno donde se llevó a cabo la obra. Implico marcar y materializar en el sitio la ubicación precisa de los elementos que conforman los sistemas mencionados como Pozos de Inspección, Red de tubería, Cajas de Inspección, etc., utilizando instrumentos topográficos y referencias del terreno.

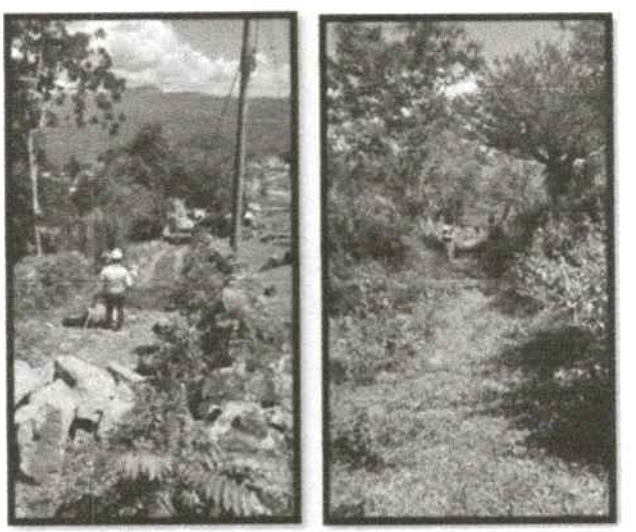

Excavaciones


Las excavaciones son acciones para remover tierra u otros materiales del suelo para crear una cavidad o depresión; en la construcción de sistema de acueducto y alcantarillado las excavaciones son fundamentales para preparar el terreno para la instalación de la tubería principal y las redes complementarias, así como para la construcción de pozos y cajas de inspección.

En este proyecto se removieron cerca de 650m^3 entre roca y tierra con el objetivo de instalar la tubería de la red principal y las acometidas de cada uno de los predios que hicieron parte de la zona de influencia del proyecto.

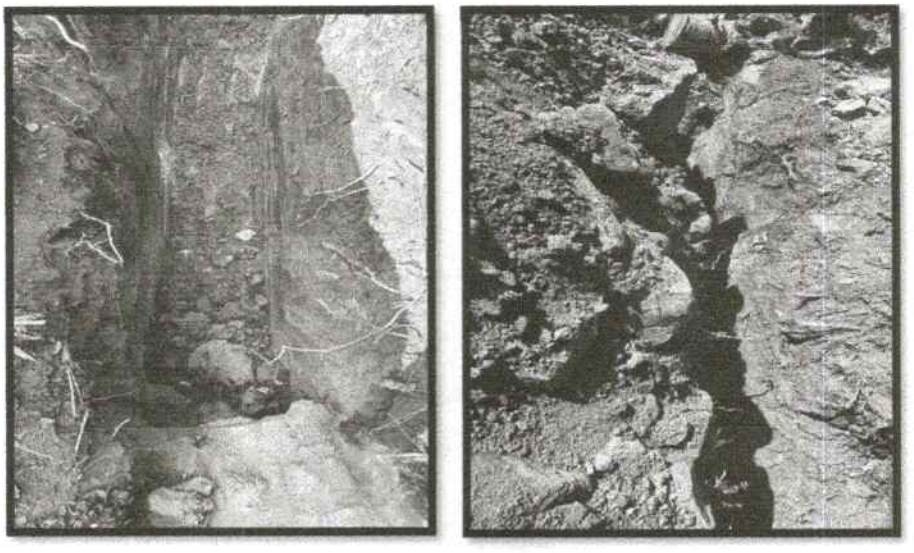

Suministro e Instalación de Tubería.

El sistema de alcantarillado en su etapa de recolección de aguas residuales generadas en las viviendas de la zona de influencia del proyecto, consiste en la construcción de cajas de inspección en la parte externa de la vivienda con el fin de recolectar las aguas servidas originadas en la misma. Las aguas residuales continúan por una tubería novafort de 6" hasta comunicarse con la red principal. La red principal consiste en una tubería novafort de 8" ubicada a la profundidad establecida por las condiciones propias del proyecto, en el trayecto de la red principal se encuentran construidos algunos pozos de inspección de alturas variadas dependientes de la topografía del terreno.


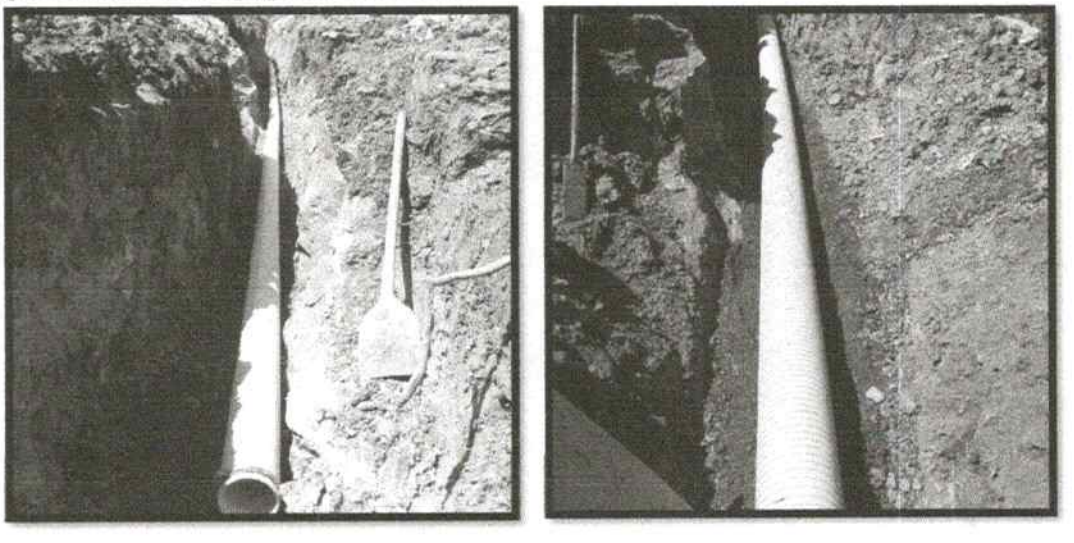







Antes de instalar la tubería principal y la tubería de las acometidas se procede a extender una capa de material con granulometría fina en el fondo de la excavación que permite la protección de la tubería con el contacto con rocas o algunos materiales que puedan afectar la tubería.

Instalada las diferentes tuberías dentro del sistema de alcantarillado se procede por cubrirlas con materiales finos que protegen la tubería de otros materiales más gruesos o filosos que puedan llegar al contacto y causar fisuras o daños en la misma.

El sistema de acueducto es similar al sistema de alcantarillado, ya que cuenta con una red principal de 2" en tubería de alta presión y acometidas para cada uno de los beneficiarios del proyecto.

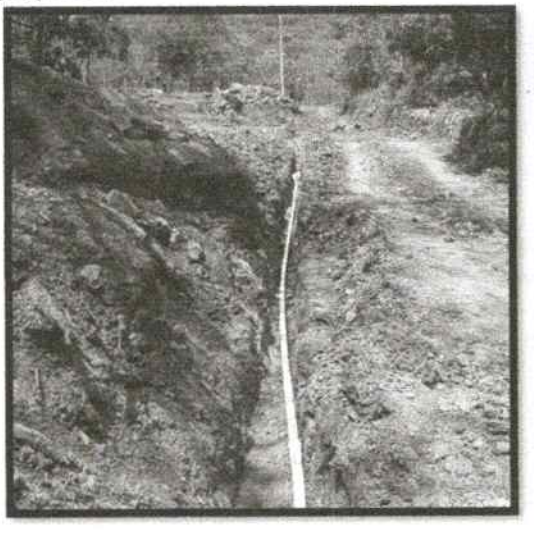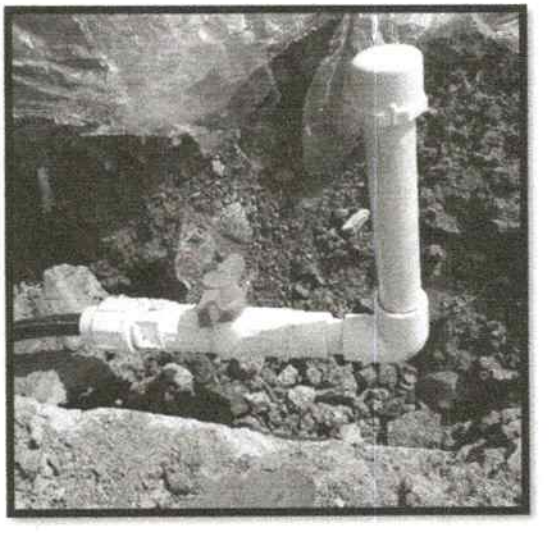


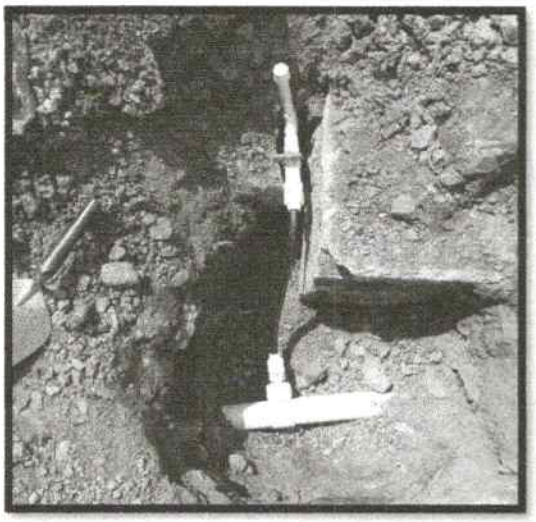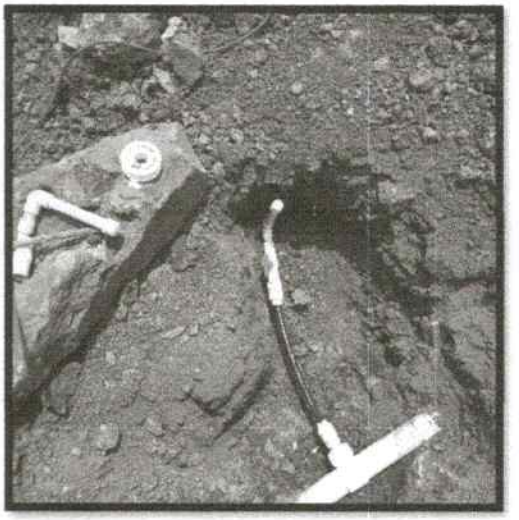
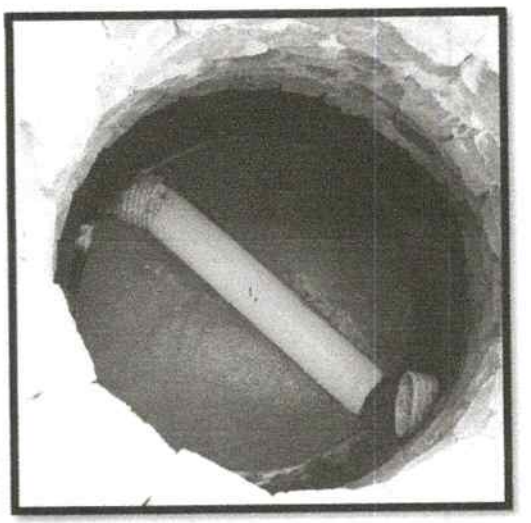
La instalación de la tubería principal y las acometidas del sistema de acueducto es igual al del alcantarillado, solo difieren en las profundidades y los anchos de las excavaciones; además las acometidas del sistema de acueducto son más complejas ya que necesitan de varios accesorios antes de llegar al destinatario.

Construcción de pozos de inspección y cajas de inspección


Los pozos de inspección de alcantarillado, también conocidos como pozos de visita o cámaras de inspección, son estructuras subterráneas diseñadas para permitir el acceso, inspección, limpieza y mantenimiento de las tuberías y colectores del sistema de alcantarillado. Estos pozos son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, permitiendo la detección y reparación de problemas como obstrucciones, fugas o daños en las tuberías.


Los pozos de inspección fueron construidos en ladrillos macizos y frisados en su interior, con sus respectivos aros y tapas en hierro fundido. Sus tapas en concreto reforzado aseguran el tránsito de vehículos pesados y la protección de cada uno de ellos.

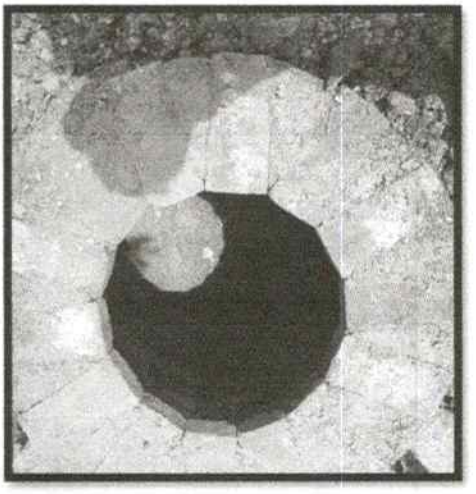En Colombia, las cajas de alcantarillado, también conocidas como cajas de inspección, son estructuras clave en el sistema de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial. Su función principal es permitir la inspección, limpieza y mantenimiento de las tuberías, facilitando el acceso desde la superficie para verificar el flujo de aguas residuales o pluviales y solucionar posibles obstrucciones. Pueden encontrarse tanto dentro de las propiedades como en la vía pública, conectando las redes internas de desagüe con la red pública.





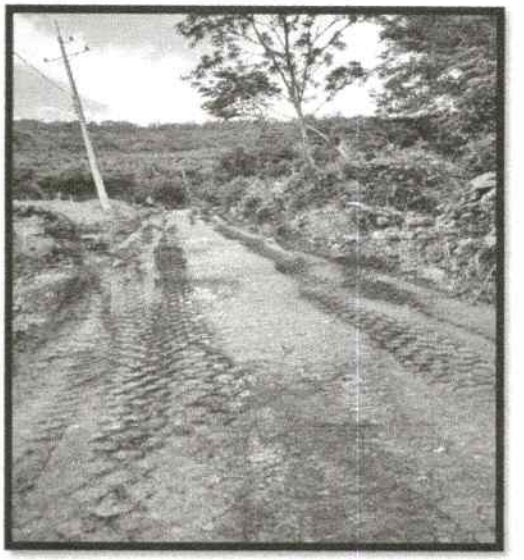
Las cajas de inspección de este proyecto fueron construidas en la parte externa de las viviendas o en su defecto del lote, construidas en ladrillo macizo y frisadas en su parte interna. Para cada caja de inspección se construyó una tapa de concreto reforzado que permite protegerla del ingreso de materiales que obstruyan el sistema de alcantarillado.

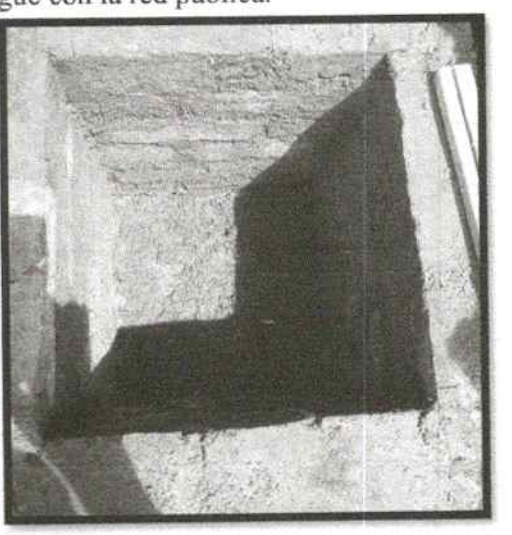Rellenos y Compactación de las excavaciones.

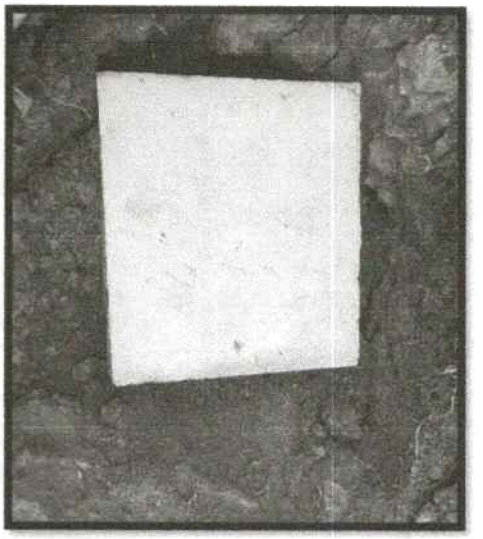En excavaciones de alcantarillado, los rellenos compactados consisten en rellenar el espacio excavado alrededor de las tuberías con materiales seleccionados y luego compactarlos para asegurar la estabilidad y correcto funcionamiento de la red de alcantarillado. Este proceso es crucial para prevenir asentamientos, fallas y garantizar una adecuada capacidad de soporte del terreno.



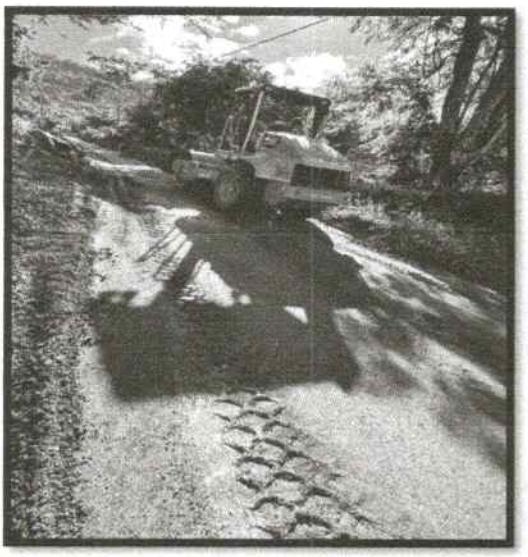

Se utilizaron materiales como arena, grava o mezclas de suelo-agregado, que cumplieron con especificaciones técnicas para evitar problemas como la expansión o contracción del suelo. El material se colocó en capas delgadas, generalmente de 15 a 30 cm de espesor, para facilitar la compactación. Se aplicó fuerza al material de relleno para reducir el volumen de aire y aumentar la densidad, mejorando la capacidad de soporte del suelo. Se utilizaron diversos métodos de compactación, con equipos como apisonador tipo canguro y en la parte alta vibrocompactador de rodillo.

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

Durante el desarrollo del proyecto se establecieron mediante comités de obra la inclusión de nuevas actividades de obra, debido a las necesidades que se fueron presentando, con el fin de poder construir un sistema de acueducto y alcantarillado que cumpla con las necesidades establecidas para los habitantes de la zona de influencia del proyecto. Así, como también se realizó un balance de obra con cantidades mayores y cantidades menores, pero siempre protegiendo el valor inicial del proyecto, es decir sin aumento ni adicionales de dinero.
El acta de mayores y menores resultante de los comités de obra fue elaborada, revisada y aprobada por los supervisores del proyecto.

CORPODESOC

PRESUPUESTO DE OBRA

	CONDICIONES INICIALES	MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No. 1	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	TOTAL EJECUTADO

1. Excavaciones y rellenos

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1,01	Excavaciones varias en material común	m3	194,65	$ 36.193	$ 7.044.967		86,78		$ 3.140.829	281,43	$ 10.185.796	281,43	$ 10.185.796
1,02	Excavaciones en roca	m3	737,44	$ 113.538	$ 83.727.463		-456,01		$ (51.774.463)	281,43	$ 31.952.999	281,43	$ 31.952.999
1,03	Relleno y compactación con material de excavación	m3	956,75	$ 32.618	$ 31.207.272		-924,25		$ (30.147.187)	32,50	$ 1.060.085	32,50	$ 1.060.085
				Subtotal capitulo	$ 121.979.702				$ (78.780.821)		$ 43.198.880		$ 43.198.880

2. Suministro e instalación red de alcantarillado

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2,01	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado d=8" (red principal)	ml	269,50	$ 92.458	$ 24.917.431		19,40		$ 1.793.685	288,90	$ 26.711.116	288,90	$ 26.711.116
2,02	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado d=6"	ml	87,00	$ 73.458	$ 6.390.846		0,00		$ -	87,00	$ 6.390.846	87,00	$ 6.390.846
2,03	Conexión de domiciliarias de 8" a 6" (incluye accesorios de instalación)	Und	29,00	$ 305.211	$ 8.851.119		0,00		$ -	29,00	$ 8.851.119	29,00	$ 8.851.119
2,04	Suministro e instalación de atraque para tubería	m3	143,10	$ 88.505	$ 12.665.066		-14,87		$ (1.316.069)	128,23	$ 11.348.996	128,23	$ 11.348.996
				Subtotal capitulo	$ 52.824.462				$ 477.616		$ 53.302.077		$ 53.302.077

3. Pozos de Inspección

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
3,01	Construcción de pozo de inspección H: 2,00 m	Und	1,00	$ 6.113.579	$ 6.113.579		-1,00		$ (6.113.579)		$ -		$ -
3,02	Construcción de pozo de inspección H: 1,46 m	Und	1,00	$ 4.619.470	$ 4.619.470		-1,00		$ (4.619.470)		$ -		$ -
3,03	Construcción de pozo de inspección H: 1,29 m	Und	1,00	$ 4.140.369	$ 4.140.369		-1,00		$ (4.140.369)		$ -		$ -
3,04	Construcción de pozo de inspección H: 2,70 m	Und	1,00	$ 7.967.738	$ 7.967.738		-1,00		$ (7.967.738)		$ -		$ -
3,05	Construcción de pozo de inspección H: 2,15 m	Und	1,00	$ 6.482.879	$ 6.482.879		-1,00		$ (6.482.879)		$ -		$ -
				Subtotal capitulo	$ 29.324.035				$ (29.324.035)		$ -		$ -

4. Cajas de Inspección

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
4,01	Cajas de inspección incluye tapa según especificación	Und	29,00	$ 426,695	$ 12.374.155		0,00		$ -	29,00	$ 12.374.155	29,00	$ 12.374.155
				Subtotal capitulo	**$ 12.374.155**				**$ -**		**$ 12.374.155**		**$ 12.374.155**
CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y VALVULAS DE CORTE													
5. Preliminares													
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
5,01	Localización y replanteo de redes	ml	356,50	$ 2.934	$ 1.045.971		61,40		$ 180.148	417,90	$ 1.226.119	417,90	$ 1.226.119
				Subtotal capitulo	**$ 1.045.971**				**$ 180.148**		**$ 1.226.119**		**$ 1.226.119**
6. Excavaciones y rellenos													
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Parcial**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
6,01	Excavaciones varias en material común	m3	42,80	$ 36.193	$ 1.549.060		-1,01		$ (36.555)	41,79	$ 1.512.505	41,79	$ 1.512.505
6,02	Excavaciones en roca	m3	171,15	$ 113.538	$ 19.432.029		-129,36		$ (14.687.276)	41,79	$ 4.744.753	41,79	$ 4.744.753
6,03	Relleno y compactacion con material de excavación	m3	187,20	$ 32.618	$ 6.106.090		-187,20		$ (6.106.090)	0,00	$ -		$ -
				Subtotal capitulo	**$ 27.087.179**				**$ (20.829.920)**		**$ 6.257.259**		**$ 6.257.259**
7. Red de Acueducto													
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
7,01	Suministro e instalación de tubería d=2" RDE 21 (incluye accesorios de conexión)	ml	269,56	$ 49.909	$ 13.453.470		148,34		$ 7.403.501	417,90	$ 20.856.971	417,90	$ 20.856.971
7,02	Suministro e instalación de red de 1/2" (incluye tubería pf + uad, registros, collar de derivación y accesorios).	Und	29,00	$ 148.605	$ 4.309.545		0,00		$ -	29,00	$ 4.309.545	29,00	$ 4.309.545
7,03	Suministro e instalación de atraque para tubería	m3	64,18	$ 88.505	$ 5.680.251		-25,67		$ (2.271.923)	38,51	$ 3.408.328	38,51	$ 3.408.328
				Subtotal capitulo	**$ 23.443.266**				**$ 5.131.578**		**$ 28.574.844**		**$ 28.574.844**
8. Valvula de corte													
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Parcial**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**

8,01	Suministro e instalación de válvula de corte de 2"	Und	2,00	$ 103.111	$ 206.222		-2,00		$ (206.222)		$ -		$ -
				Subtotal capitulo	**$ 206.222**				**$ (206.222)**		**$ -**		**$ -**
					9 ITEMS NO PREVISTOS ALCANTARILLADO								
Item	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor Parcial**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
9,01	Localizacion y Replanteo de Redes					ml	288,90	$ 3.182	$ 919.303	288,90	$ 919.303	288,90	$ 919.303
9,02	Suministro e Instalacion de material seleccionado					m3	376,60	$ 68.550	$ 25.815.930	376,60	$ 25.815.930	376,60	$ 25.815.930
9,03	Retiro y Transporte material de la excavacion					m3	542,89	$ 49.625	$ 26.940.916	542,89	$ 26.940.916	542,89	$ 26.940.916
9,04	Demolicion, retiro y transporte roca proveniente de cerca existente					m3	67,50	$ 75.455	$ 5.093.213	67,50	$ 5.093.213	67,50	$ 5.093.213
9,05	Suministro e Instalacion de tapa metalica tipo pesado, incluye aro					Unidad	1,00	$ 620.000	$ 620.000	1,00	$ 620.000	1,00	$ 620.000
9,06	Construcción de pozo de inspección H: promedio 1.65 m					Unidad	5,00	$ 5.179.166	$ 25.895.830	5,00	$ 25.895.830	5,00	$ 25.895.830
				Subtotal capitulo	**$ -**				**$ 85.285.191**		**$ 85.285.192**		**$ 85.285.192**
					10 ITEMS NO PREVISTOS ACUEDUCTO								
Item	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor Parcial**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
10,01	Suministro e Instalacion de material seleccionado					m3	45,07	$ 68.550	$ 3.089.549	45,07	$ 3.089.549	45,07	$ 3.089.549
10,02	Retiro y Transporte material de la excavacion					m3	60,84	$ 49.625	$ 3.019.185	60,84	$ 3.019.185	60,84	$ 3.019.185
				Subtotal capitulo	**$ -**				**$ 6.108.733**		**$ 6.108.733**		**$ 6.108.733**
				Reducción – Modificación de Cantidades No. 1					**$ 31.957.733**		**$ 31.957.733**		
				Total costo directo	**$ 268.284.992**				**$ -**		**$ 268.284.992**		**$ 236.327.259**
		Administración	**29%**		**$ 77.802.648**					**Administración**	**$ 77.802.648**	**Administración**	**$ 68.534.905**
		Imprevistos	**1%**		**$ 2.682.850**					**Imprevistos**	**$ 2.682.850**	**Imprevistos**	**$ 2.363.273**
		Utilidades	**5%**		**$ 13.414.250**					**Utilidades**	**$ 13.414.250**	**Utilidades**	**$ 11.816.363**
		Total costo proyecto			**$ 362.184.740**					**Total proyecto**	**$ 362.184.740**	**Total**	**$ 319.041.800**


BALANCE FINANCIERO


Desarrollo Presupuestal del Contrato		
Valor del contrato de obra	$362.184.740,00	
Valor girado en el anticipo (50% del contrato)		$181.092.370,00
Valor a girar según saldo del acta de recibo final		$137.949.430,00
Saldo a favor de la entidad		$43.142.940,00
Sumas iguales	**$362.184.740,00**	**$362.184.740,00**


RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS


La maquinaria y herramienta utilizada es la necesaria para cumplir con las actividades establecidas en el contrato de obra No 027 DE 2024, y está relacionada a continuación:

- Mezcladora de concreto.
- Vibrador de concreto

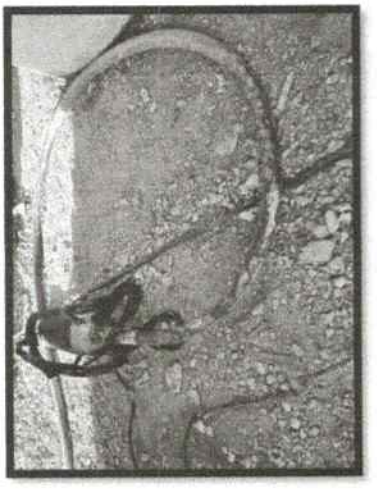

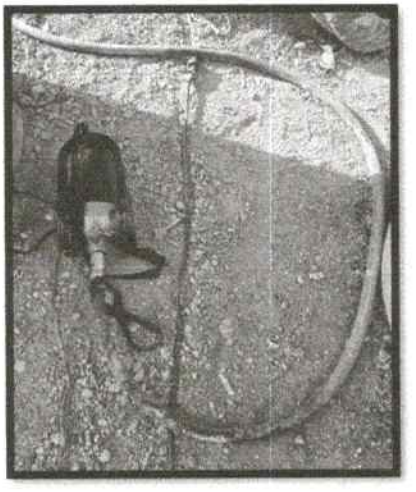

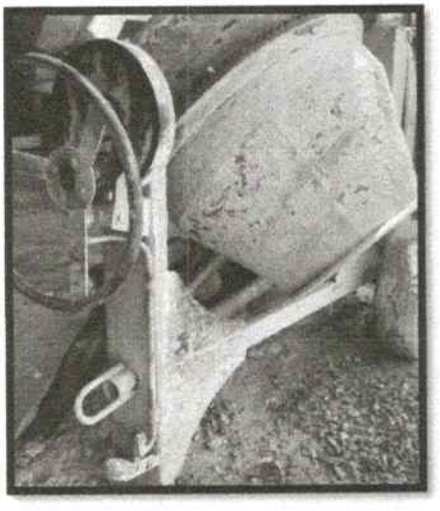

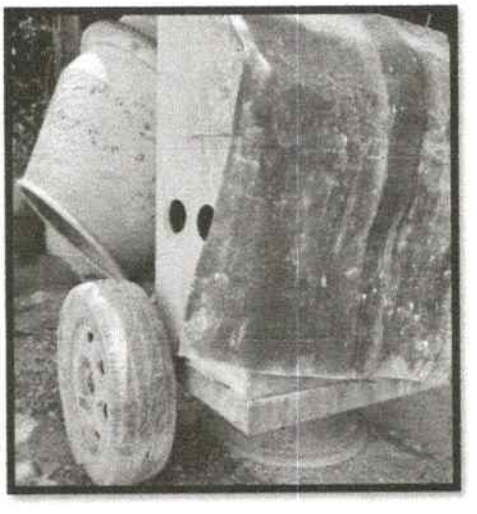

PERSONAL

Todos los trabajos fueron ejecutados por personal calificado, experimentado e idóneo con el fin de garantizar que todas las actividades se ejecutaran de forma segura y con las especificaciones técnicas exigidas.

A continuación, se presenta la relación del personal utilizado:

CARGO	NOMBRE	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Director de Obra	Nestor Raul Cala Jimenez	SI, DEPENDIENTE
Residente de Obra	Maria Camila Ortiz Corredor	SI, DEPENDIENTE

El contratista cuenta con las afiliaciones de todos sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales de Colombia, a la Seguridad Social Integral y Riesgos Profesionales; con el fin de procurarles adecuada atención y protección en caso de enfermedad común, enfermedad profesional y accidentes de trabajo; y la debida protección por invalidez, vejez o muerte.

Periodo	No. Planilla	AFP	EPS	ARP	CCF
NOV-2024	34701859	$49.400	$12.400	$21.600	$12.400
DIC-2024	34702449	$578.100	$ 144.500	$ 251.500	$144.500
FEB-2025	34702612	$ 868.600	$217.300	$ 275.200	$217.300
MAR-2025	34702621	$ 1.005.000	$ 251.500	$ 336.200	$251.500
ABR-2025	34702636	$394.400	$98.700	$72.700	$ 98.700
AGO-2025	34702704	$252.100	$63.100	$73.000	$63.100

PÓLIZAS

Las garantías fueron debidamente aprobadas por el municipio antes de la suscripción del acta de inicio y se encuentran vigentes bajo los siguientes amparos y cuantías.

Para poder iniciar la ejecución de la obra y como respaldo durante el contrato principal, se constituyeron las siguientes garantías y seguros:

Póliza de Seguro de cumplimiento No. 96-44-101193604 de **SEGUROS DEL ESTADO**

FECHA DE EXPEDICION DE LA POLIZA: 28/11/2024

AMPAROS	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	27/11/2024 hasta 27/06/2025	$72.436.948,00
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	27/11/2024 hasta 27/04/2025	$181.092.370,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización Laboral	27/11/2024 hasta 27/12/2027	$72.436.948,00
Estabilidad y calidad de obra	5 Años, 0 meses y 0 días	$108.655.422,00

Póliza de Seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 96-40-101068589 de **SEGUROS DEL ESTADO**
FECHA DE EXPEDICION DE LA POLIZA: 28/11/2024

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Predios Labores y Operaciones	10.00 % del valor de la perdida – mínimo: 1.00 SMMLV	27/11/2024 Hasta 27/04/2025	$260.000.000,00
Daño emergente y lucro cesante	10.00 % del valor de la perdida – mínimo: 1.00 SMMLV	27/11/2024 Hasta 27/04/2025	$260.000.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	10.00 % del valor de la perdida – mínimo: 1.00 SMMLV	27/11/2024 Hasta 27/04/2025	$260.000.000,00

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


- La zona intervenida en la construcción del sistema alcantarillado, posee una pendiente pronunciada, la cual permite una rápida evacuación de las aguas residuales y pocas probabilidades de obstrucción en su trayecto.
- El área de excavación del sistema de alcantarillado fue construida sobra mantos rocosos, los cuales fueron retirados del área para evitar daños en las tuberías instaladas.
- Es importante realizar revisiones periódicas al sistema de alcantarillado, con el fin de realizar mantenimientos preventivos y aumentar la vida útil del sistema.
- En la zona de intervención se encontraron varios lotes sin construir, es importante tener precaución con las acometidas del sistema de acueducto al momento de construir dichas viviendas.
- La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER acató cada una de las recomendaciones establecidas por el supervisor de obra, buscando de esta manera la mejora continua en cada uno de las actividades ejecutadas.
- La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER utilizó materiales de construcción (Sub Base, Arena, Grava, cemento etc.) de alta calidad, dando como resultado obras que generaron impacto positivo en el área intervenida del proyecto.
- El personal contratado por la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER fue seleccionado con individuos provenientes de la zona de influencia del proyecto, con el fin de generar empleo en la misma región
- El contratista CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER cumplió con el personal solicitado por el ente contratante, con su respectiva dedicación en obra y con las funciones establecidas para cada uno de ellos.
- El contratista CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER ha cumplido con todas las especificaciones técnicas, planos de construcción, diseños y directrices establecidas por el ente contratante como por el equipo destinado para la supervisión.

R/L WILMER FERNEY HERNÁNDEZ GÓMEZ
COPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER "CORPODESOC SDER"


REGISTRO FOTOGRAFICO

En el marco de la ejecución del contrato, se procede a presentar el registro fotográfico de las actividades desarrolladas en sitio, con el propósito de documentar y sustentar el avance físico de la obra. Las imágenes corresponden a las labores de:


1. **Localización y Replanteo de Redes**

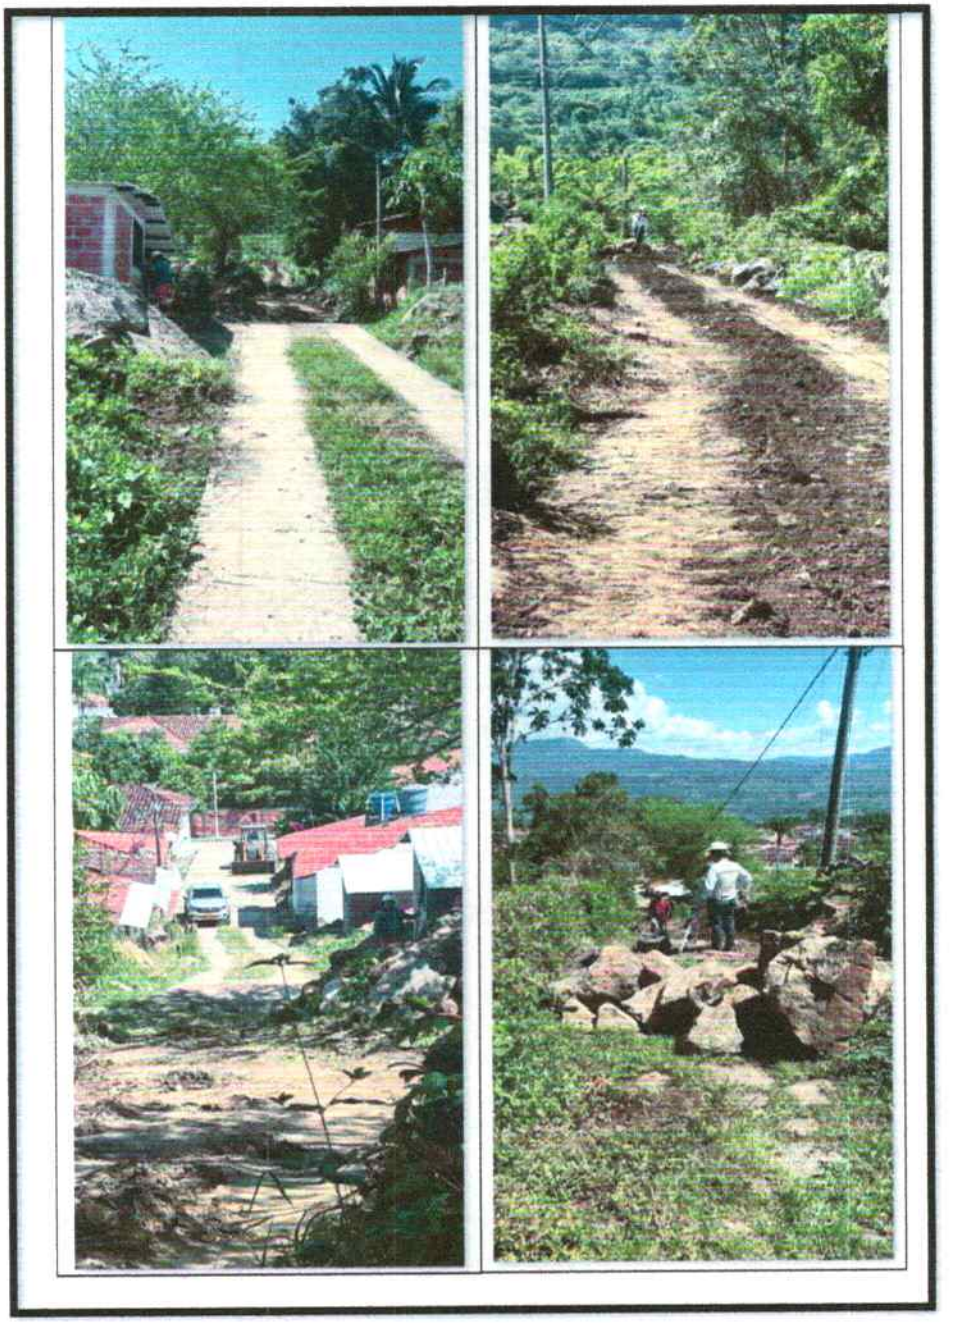


2. **Excavaciones varias en material común y en roca**

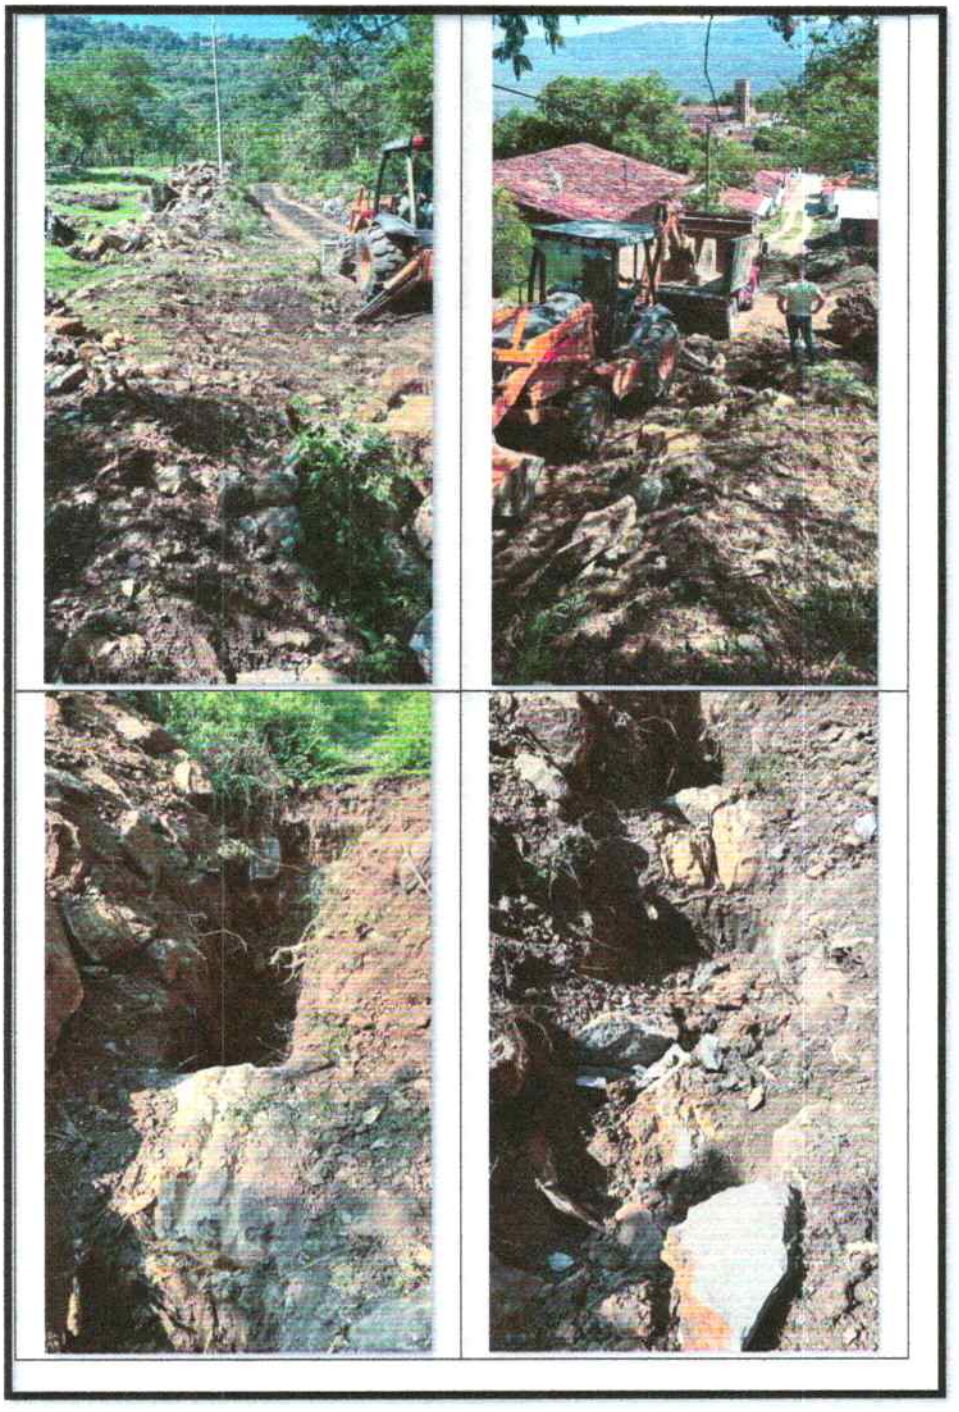




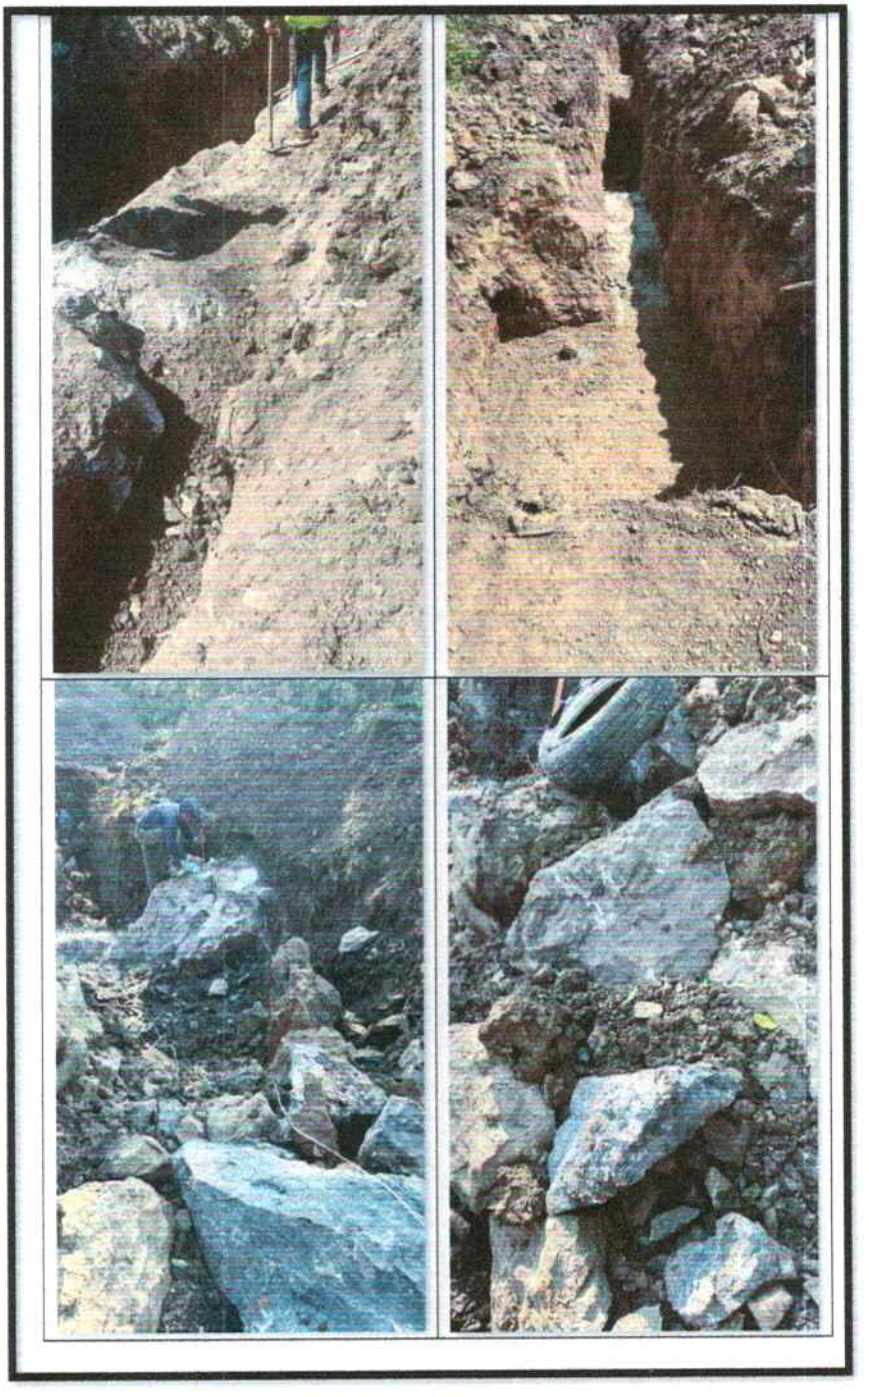


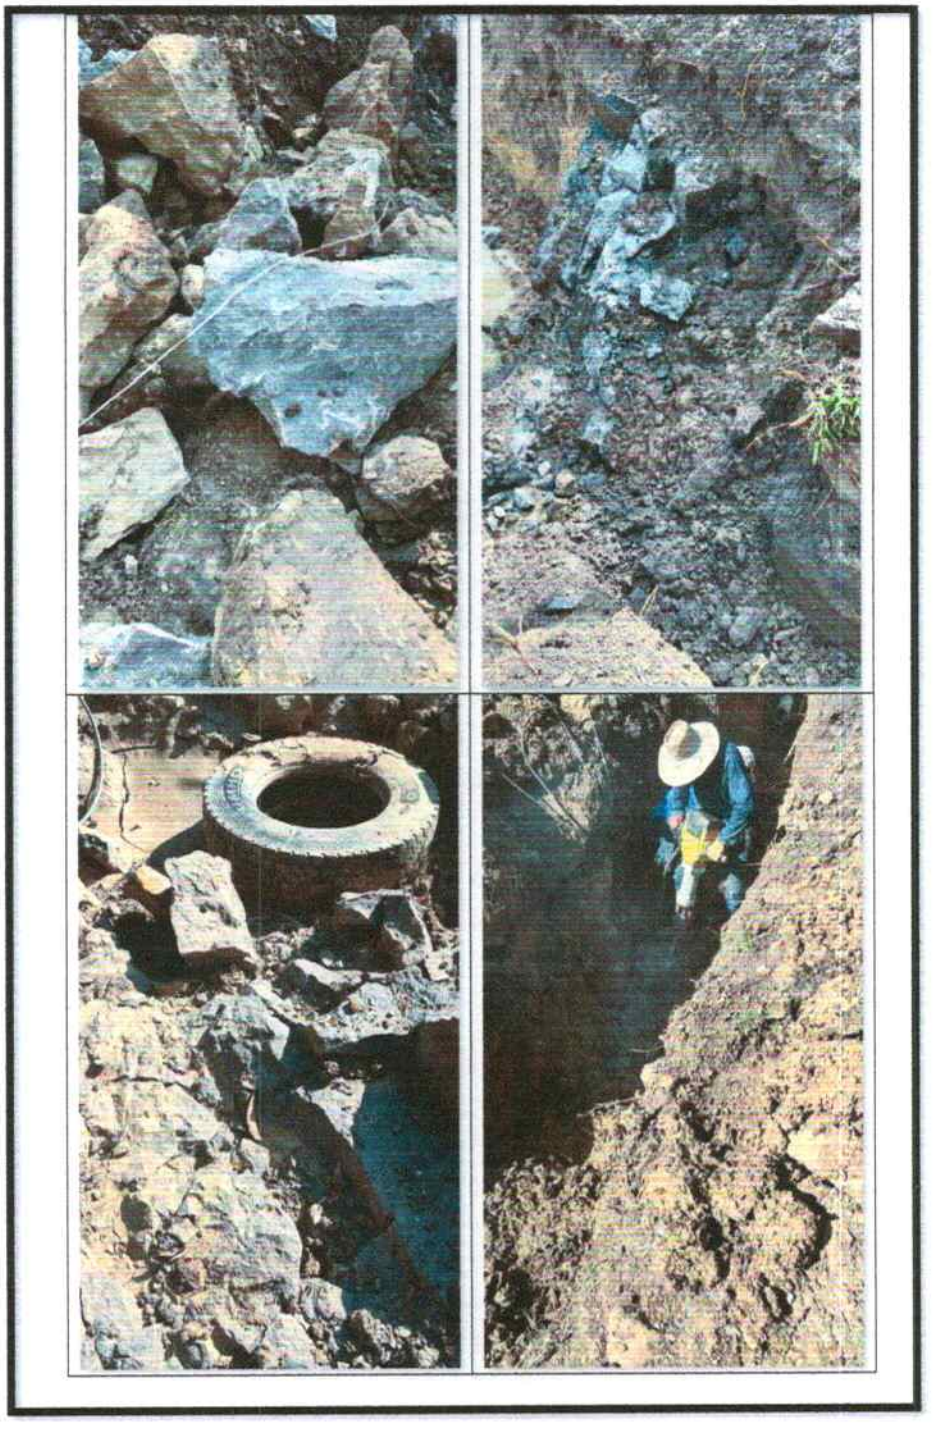

3. **Construcción de pozo de inspección H: promedio 1.65**

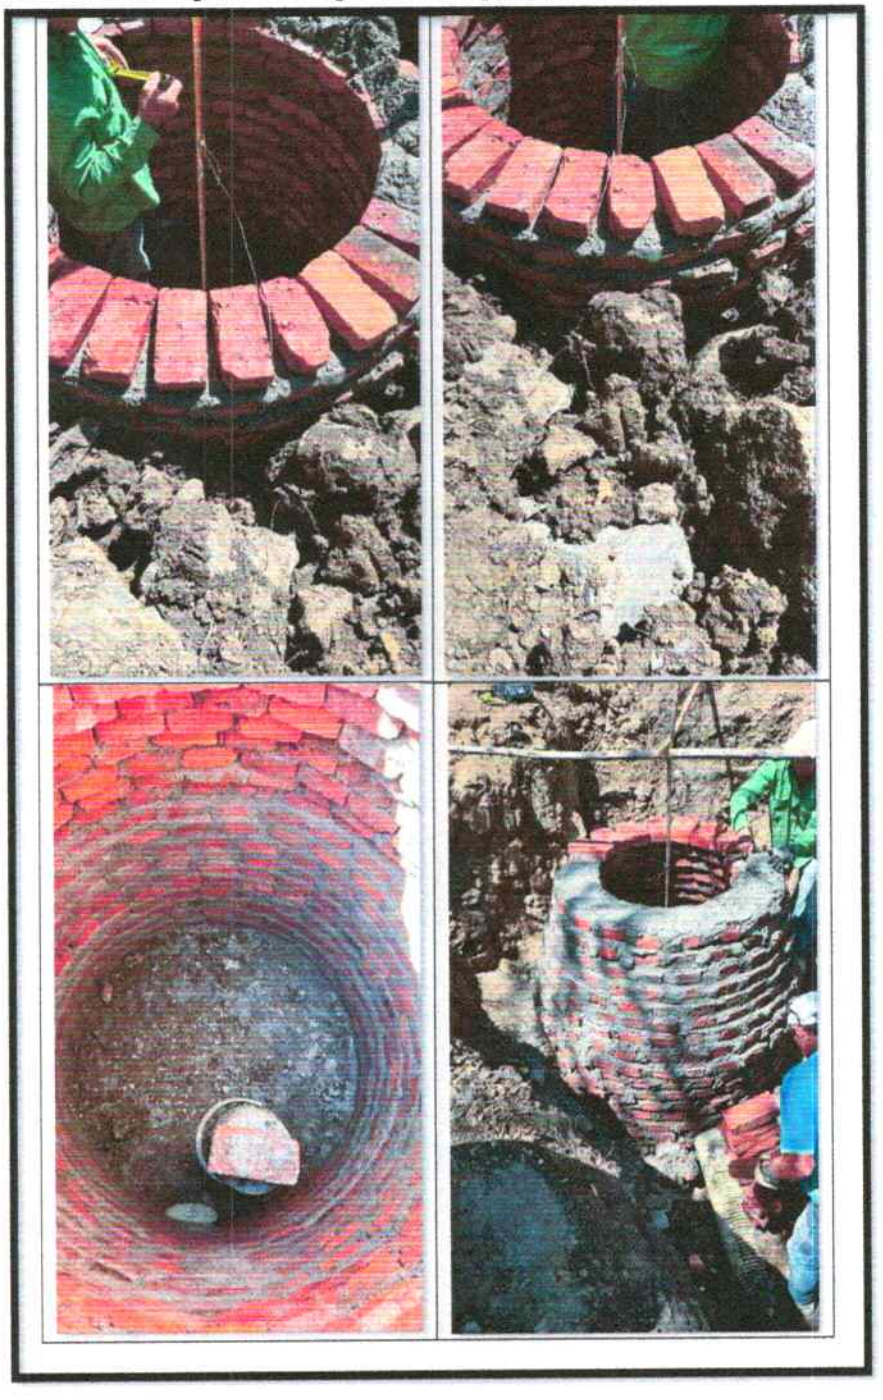


4. Suministro e instalación de tubería de alcantarillado d=8 y d=6"

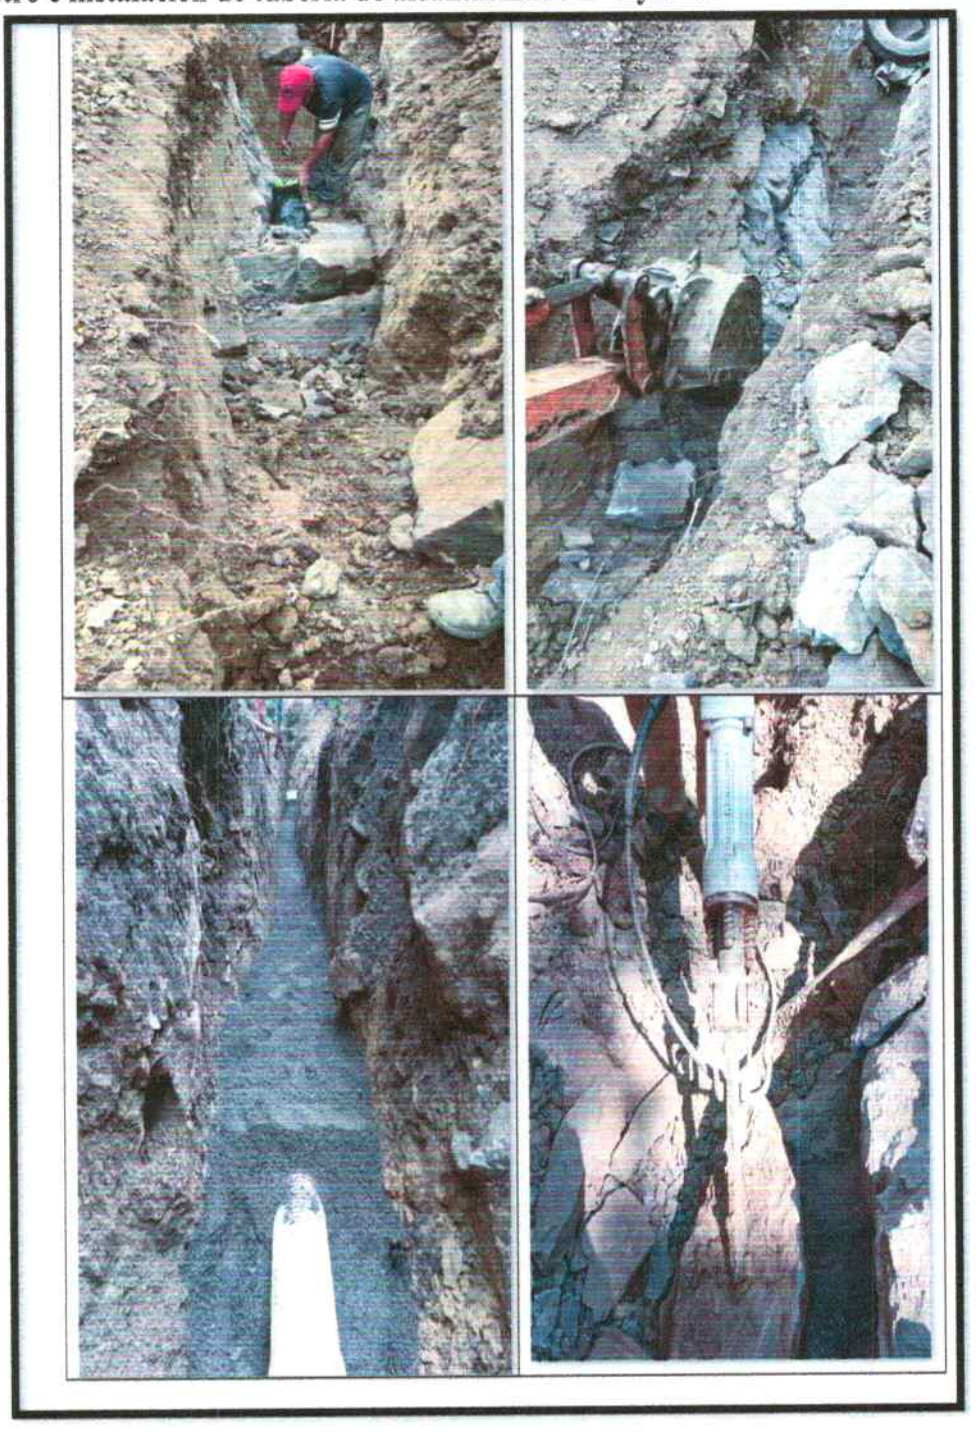


Suministro e instalación de atraque para tubería



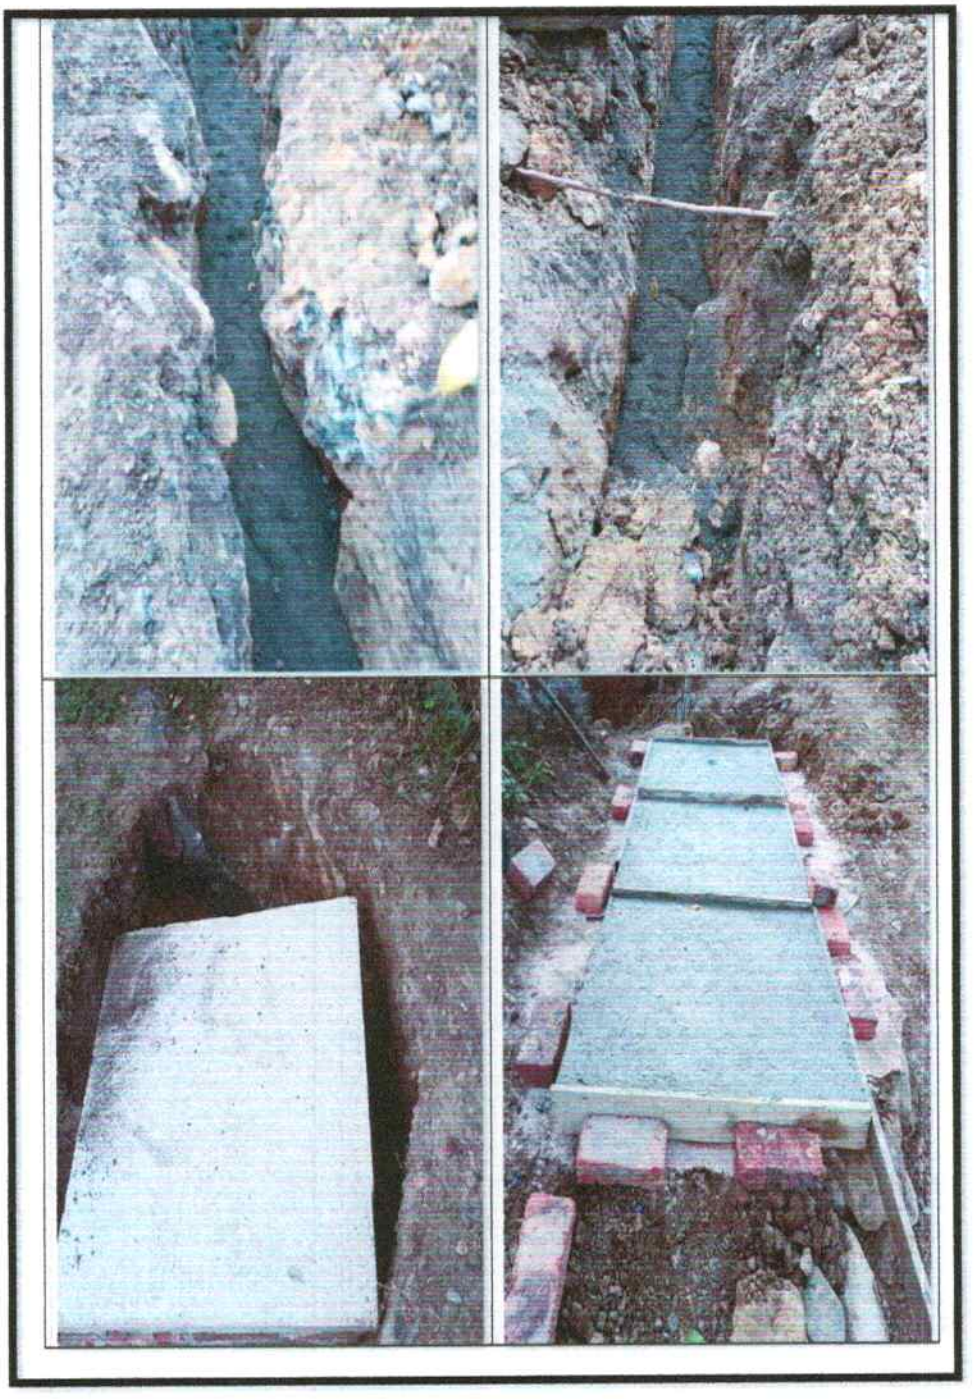

Cajas de inspección incluye tapa según especificación

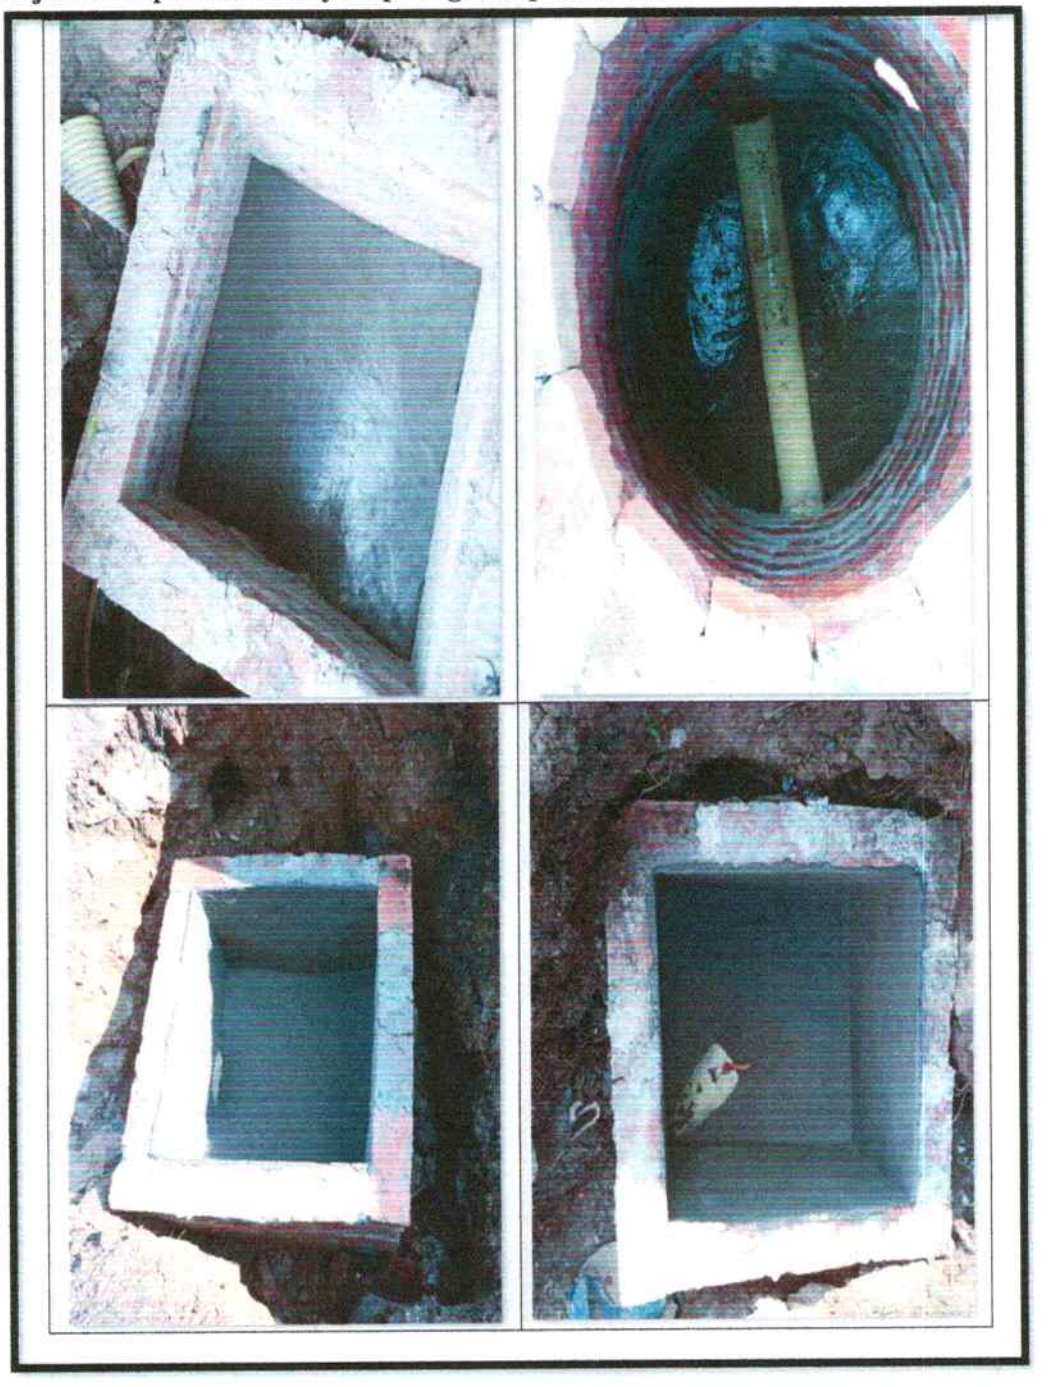



MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	9,04	DESCRIPCION	Demolicion, retiro y transporte roca proveniente de cerca existente	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR




Tuberia			
Dimensiones			CANT
Largo	Ancho	H	
100,00	0,50	1,35	67,50
			67,50
SUB - TOTAL ITEM			67,50
TOTAL			67,50

Contrato de Obra No	027 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander

	9,05	DESCRIPCION	Suministro e instalacion de tapa metalica tipo pesado, incluye aro	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR



Pozos	
tapa aro Pozo inicial P0	1,00
SUB - TOTAL ITEM	1,00
TOTAL	1,00

Contrato de Obra No	027 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander

	9,06	DESCRIPCION	Construcción de pozo de inspección H: promedio 1.65 m	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR




Pozos	
Pozo 1	1,00
Pozo 2	1,00
Pozo 3	1,00
Pozo 4	1,00
Pozo 5	1,00
SUB - TOTAL ITEM	5,00
TOTAL	5,00

ITEM	10,01	DESCRIPCION	Suministro e instalacion de material seleccionado (Alcantarillado)	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR




Tuberia			
Dimensiones			CANT
Largo	Ancho	H	
417,90	0,40	0,50	83,58
			83,58
menos relleno material de excavacion			0,00
menos atraque para tuberias			-38,51
SUB - TOTAL ITEM			45,07
TOTAL			45,07

Contrato de Obra No	027 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander

	10,02	DESCRIPCION	Retiro y Transporte material de la excavacion	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR




Tuberia	
relleno con material seleccionado	45,07
SUB - TOTAL ITEM	45,07
Factor de expansion	1,35
TOTAL	60,84

Contrato de Obra No	027 de 2024						
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander						
ITEM	7,03	DESCRIPCION	Suministro e instalación de atraque para tuberia	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	PALMAR





Fondo			
Longitud	Espesor	Ancho	Volumen
417,9	0,1	0,4	16,72
Superior			
Longitud	Espesor	Ancho	Volumen
417,9	0,1	0,4	16,72
Laterales			
Longitud	Espesor	Ancho	Volumen
417,9	0,05	0,4	8,36
Tuberia			
Longitud	Area		Volumen
417,9	0,01		3,28
SUB-TOTAL ITEM			**38,51**
TOTAL			**38,51**

Contrato de Obra No	027 de 2024						
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander						
ITEM	9,01	DESCRIPCION	Localización y replanteo de redes (sanitaria)	UNIDAD	ml	UBICACIÓN	PALMAR







Tuberia		
Tramo		Longitud
Pozo 1	Pozo 2	58,40
Pozo 2	Pozo 3	72,50
Pozo 3	Pozo 4	62,20
Pozo 4	Pozo 5	33,00
Pozo 5	Pozo 6	62,80
SUB-TOTAL ITEM		**288,90**
TOTAL		**288,90**

ITEM	9,02	DESCRIPCION	Suministro e instalacion de material seleccionado (Alcantarillado)	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR





Tuberia			
Dimensiones			CANT
Largo	Ancho	H	
58,40	1,00	1,70	99,28
72,5	1,00	1,60	116,00
62,2	1,00	1,48	92,06
33	1,00	1,53	50,49
62,8	1,00	1,75	109,90
			467,73
Acometidas			
Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad
3,00	0,80	1,00	29,00 **69,60**
menos relleno material de excavacion			**-32,50**
menos atraque para tuberias			**-128,23**
SUB - TOTAL ITEM			**376,60**
TOTAL			**376,60**

Contrato de Obra No	027 de 2024						
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander						
	9,03	DESCRIPCION	Retiro y Transporte material de la excavacion	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR






Tuberia	
relleno con material seleccionado	376,60
pozos	14,40
calas	11,14
SUB - TOTAL ITEM	**402,14**
Factor de expansion	**1,35**
TOTAL	**542,89**


Contrato de Obra No	027 de 2024							
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander							
ITEM	6,01	DESCRIPCION	Excavaciones varias en material común	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR	
 				Dimensiones			CANT	
				Largo	Ancho	H		
				417,90	0,40	0,50	83,58	
				SUB - TOTAL ITEM				83,58
							Factor	0,5
							TOTAL	41,79

Contrato de Obra No	027 de 2024							
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander							
	6,02	DESCRIPCION	Excavaciones en Roca	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR	
 				Tuberia				
				Excavacion total			83,58	
				SUB - TOTAL ITEM				83,58
							Factor	0,5
							TOTAL	41,79

Contrato de Obra No	027 de 2024							
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander							
ITEM	7,01	DESCRIPCION	Suministro e instalación de tubería d=2" RDE 21 (incluye accesorios de conexión)	UNIDAD	ml	UBICACIÓN	PALMAR	
 				Tuberia				
				Tramo			Longitud	
				Pozo 1		Pozo 6	288,90	
				Pozo 6		Tanque	129,00	
				SUB-TOTAL ITEM			417,90	
				TOTAL			417,90	

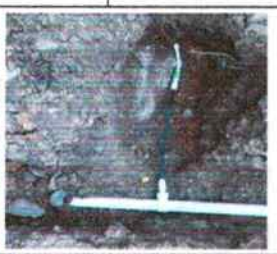Contrato de Obra No	027 de 2024							
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander							
ITEM	7,02	DESCRIPCION	Suministro e instalación de red de 1/2" (incluye tubería pf + uad, registros, collar de derivación y accesorios).	UNIDAD	Und	UBICACIÓN	PALMAR	
 				Domiciliarias				
				Tramo			Cantidad	
				Pozo 1		Pozo 2	9,00	
				Pozo 2		Pozo 3	17,00	
				Pozo 3		Pozo 4	3,00	
				Pozo 4		Pozo 5	0,00	
				Pozo 5		Pozo 6	0,00	
				SUB-TOTAL ITEM			29,00	
				TOTAL			29,00	

Contrato de Obra No	027 de 2024							
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander							
ITEM	2,04	DESCRIPCION	Suministro e instalación de atraque para tuberia	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR	
 					Fondo			
					Longitud	Espesor	Ancho	Volumen
					288,90	0,10	1,00	28,89
					Superior			
					Longitud	Espesor	Ancho	Volumen
					288,90	0,10	1,00	28,89
					Tuberia y Laterales			
					Longitud	Espesor	Ancho	Volumen
					417,90	0,20	1,00	83,58
					Tuberia			
					Longitud	Area		Volumen
					417,9	0,03		13,13
					SUB-TOTAL ITEM			128,23
					TOTAL			128,23

Contrato de Obra No	027 de 2024							
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander							
ITEM	4,01	DESCRIPCION	Cajas de inspección incluye tapa según especificación	UNIDAD	Und	UBICACIÓN	PALMAR	
 					Domiciliarias			
					Tramo		Cantidad	
					Pozo 1	Pozo 2	9,00	
					Pozo 2	Pozo 3	17,00	
					Pozo 3	Pozo 4	3,00	
					Pozo 4	Pozo 5	0,00	
					Pozo 5	Pozo 6	0,00	
					SUB-TOTAL ITEM		29,00	
					TOTAL		29,00	

Contrato de Obra No	027 de 2024							
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander							
ITEM	5,01	DESCRIPCION	Localización y replanteo de redes (hidraulica)	UNIDAD	ml	UBICACIÓN	PALMAR	
 					Tuberia			
					Tramo		Longitud	
					Pozo 1	Pozo 6	288,90	
					Pozo 6	Tanque	129,00	
					SUB-TOTAL ITEM		417,90	
					TOTAL		417,90	

Contrato de Obra No	027 de 2024						
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander						
ITEM	2,01	DESCRIPCION	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado d=8" (red principal)	UNIDAD	ml	UBICACIÓN	PALMAR





	Tuberia		
	Tramo		Longitud
	Pozo 1	Pozo 2	58,40
	Pozo 2	Pozo 3	72,50
	Pozo 3	Pozo 4	62,20
	Pozo 4	Pozo 5	33,00
	Pozo 5	Pozo 6	62,80
	SUB-TOTAL ITEM		288,90
	TOTAL		288,90

Contrato de Obra No	027 de 2024						
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander						
ITEM	2,02	DESCRIPCION	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado d=6"	UNIDAD	ml	UBICACIÓN	PALMAR





	Tuberia			
Tramo		Longitud	Cantidad	Total
Pozo 1	Pozo 2	3,00	9,00	27,00
Pozo 2	Pozo 3	3,00	17,00	51,00
Pozo 3	Pozo 4	3,00	3,00	9,00
Pozo 4	Pozo 5	3,00	0,00	0,00
Pozo 5	Pozo 6	3,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ITEM			87,00
	TOTAL			87,00

Contrato de Obra No	027 de 2024						
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander						
ITEM	2,03	DESCRIPCION	Conexión de domiciliarias de 8" a 6" (incluye accesorios de instalación)	UNIDAD	Und	UBICACIÓN	PALMAR






	Domiciliarias		
	Tramo		Cantidad
	Pozo 1	Pozo 2	9,00
	Pozo 2	Pozo 3	17,00
	Pozo 3	Pozo 4	3,00
	Pozo 4	Pozo 5	0,00
	Pozo 5	Pozo 6	0,00
	SUB-TOTAL ITEM		29,00
	TOTAL		29,00

MEMORIAS DE CALCULO

Contrato de Obra No	027 de 2024						
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander						
ITEM	1,01	DESCRIPCION	Excavaciones varias en material comun	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR

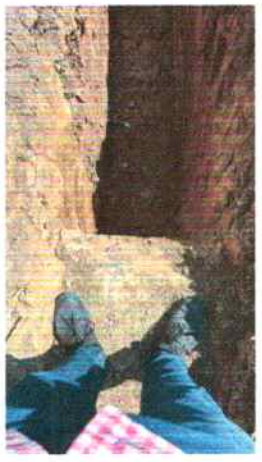



Tuberia			
Dimensiones			CANT
Largo	Ancho	H	
58,40	1,00	1,70	99,28
72,5	1,00	1,60	116,00
62,2	1,00	1,48	92,06
33	1,00	1,53	50,49
62,8	1,00	1,75	109,90
			467,73
Pozos de Inspeccion			
Pozo	Radio	Altura	
P1	0,75	1,7	3,00
P2	0,75	1,5	2,65
P3	0,75	1,45	2,56
P4	0,75	1,6	2,83
P5	0,75	1,9	3,36
			14,40
Acometidas			
Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	
3,00	0,80	1,00	29,00	69,60
Cajas de Inspeccion			
Largo	Ancho	Altura	Cantidad	
0,80	0,80	0,60	29,00	11,14
SUB - TOTAL ITEM				562,86
Factor				0,5
TOTAL				281,43

Contrato de Obra No	027 de 2024						
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander						
	1,02	DESCRIPCION	Excavaciones en Roca	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR









Excavacion total		562,86
SUB - TOTAL ITEM		562,86
Factor		0,5
TOTAL		281,43

Contrato de Obra No	027 de 2024						
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion y ampliacion de la red del servicio de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la carrera 5 con calle 5a hacia el camino veredal que conduce al municipio del Hato al Municipio de Palmar - Santander						
ITEM	1,03	DESCRIPCION	Relleno y compactación con material de excavación	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PALMAR







Tuberia			
Dimensiones			CANT
Largo	Ancho	H	
25,00	1	1,7	42,50
25,00	1	0,4	-10,00
			32,50
SUB - TOTAL ITEM			32,50
TOTAL			32,50

CORPODESOC

PLANILLAS DE SEGURIDAD

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER
IDENTIFICACIÓN:	NI-900823015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-05
FECHA DE PAGO:	2024-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	8634054597
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8634054597
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 52.000	$ 52.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 52.000	$ 52.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 208.000	$ 210.500
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 208.000	$ 210.500
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 52.000	$ 52.700
tal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 52.000	$ 52.700
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 318.800	$ 322.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/01/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364824		MAYEDUDU@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	8634054597	E	2024-12-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	322.800	4.000	Banco Occidente
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8634054597	2024-12-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exonera Parafiscales	Activi Econo
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1101667313	HERNANDEZ GOMEZ WILMER FERNEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.890	0,99522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1749

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364824		MAYEDUDU@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	8634054597	E	2024-12-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	322,800	4,000	Banco Occidente
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8634054597	2024-12-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	2.500	0	210.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	2.500	0	210.500
EPS(Administradoras: 1)				1	52.000	0	700	0	52.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	52.000	0	700	0	52.700
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	100	0	6.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.800	0	100	0	6.900
CCF(Administradoras: 1)				1	52.000	0	700	0	52.700
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	52.000	0	700	0	52.700
Gran Total					318.800	0	4.000	0	322.800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER
IDENTIFICACIÓN:	NI-900823015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-05
FECHA DE PAGO:	2025-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	34701859
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34701859
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 10.500	$ 12.400
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 10.500	$ 12.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 13.900	$ 16.500
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 27.800	$ 32.900
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 7.700	$ 41.700	$ 49.400
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 18.300	$ 21.600
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 18.300	$ 21.600
[illegible]9	890200106	CAJASAN	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 10.500	$ 12.400
[illegible]tal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 10.500	$ 12.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 14.800	$ 81.000	$ 95.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/01/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364624			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	34701659	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	95.800	14.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34701659	2024-12-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Aplica Exención
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1101690519	BUITRAGO BERMUDEZ JORGE LEONARDO	1.300.000	F	X															0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	86.667	13.900	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	86.667	3.500	CAJASAN-CCF39	86.667	3.500	86.667	6.100	0,069965	0	0	0	0	0	01	N	27.000	S	54290
2	CC 79985314	CALA JIMENEZ NESTOR RAUL	1.300.000	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	86.667	13.900	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	86.667	3.500	CAJASAN-CCF39	86.667	3.500	86.667	6.100	0,069965	0	0	0	0	0	01	N	27.000	S	54290
3	CC 1100967916	ORTIZ CORREDOR MARIA CAMILA	1.300.000	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	86.667	13.900	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	86.667	3.500	CAJASAN-CCF39	86.667	3.500	86.667	6.100	0,069965	0	0	0	0	0	01	N	27.000	S	54290

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364624			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	34701659	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	95.800	14.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34701659	2024-12-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
260.001	260.001	260.001	260.001	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	41.700	0	7.700	0	49.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	27.800	0	5.100	0	32.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	13.900	0	2.600	0	16.500
EPS(Administradoras: 1)				3	10.500	0	1.900	0	12.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	10.500	0	1.900	0	12.400
ARP(Administradoras: 1)				3	18.300	0	3.300	0	21.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	18.300	0	3.300	0	21.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				3	10.500	0	1.900	0	12.400
CAJASAN	CCF39	890200106	1	3	10.500	0	1.900	0	12.400
Gran Total					81.000	0	14.800	0	95.800

PAGOS
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER
IDENTIFICACIÓN:	NI-900823015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-08
FECHA DE PAGO:	2024-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	8634054609
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8634054609
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
tal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800	$ 318.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/02/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364624		MAYEDUDU@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	8634054609	E	2024-12-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	318,800	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8634054609	2025-01-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPMT	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	PENSOL	PENSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Aplica Exonera
1	CC 1101667313	HERNANDEZ GOMEZ WILMER FERNEY	1,300,000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1,300,000	208,000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1,300,000	52,000	CAJASAN-CCF39	1,300,000	52,000	1,300,000	6,890	0,99722	0	0	0	0	0	0	0	0	318,800	S	17490

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364624		MAYEDUDU@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	8634054609	E	2024-12-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	318,800	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8634054609	2025-01-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	0	0	6.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.800	0	0	0	6.800
CCF(Administradoras: 1)				1	52.000	0	0	0	52.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					318.800	0	0	0	318.800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER
IDENTIFICACIÓN:	NI-900823015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-08
FECHA DE PAGO:	2025-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	34702449
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34702449
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 19.700	$ 124.800	$ 144.500
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 19.700	$ 124.800	$ 144.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 26.300	$ 166.400	$ 192.700
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 52.600	$ 332.800	$ 385.400
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 78.900	$ 499.200	$ 578.100
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 34.300	$ 217.200	$ 251.500
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 34.300	$ 217.200	$ 251.500
09	890200106	CAJASAN	3	$ 0	$ 0	$ 19.700	$ 124.800	$ 144.500
tal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 19.700	$ 124.800	$ 144.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 152.600	$ 966.000	$ 1.118.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/02/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900623015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364824			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	34702449	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.118.600	152.600	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34702449	2025-01-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Aport Exento
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS1	AFP1	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.			
1	CC 1101698568	BUITRAGO BERMUDEZ JORGE LEONARDO	1.300.000	F	X															0			24	24	24	24	PROTECCION-230201	1.949.000	166.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.949.000	41.600	CAJASAN-CCF39	1.949.000	41.600	1.949.000	72.400	0,069%	0	0	0	0	0	01	0	322.000	S	54290
2	CC 79793534	CALA JIMENEZ NESTOR RAUL	1.300.000	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.949.000	166.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.949.000	41.600	CAJASAN-CCF39	1.949.000	41.600	1.949.000	72.400	0,069%	0	0	0	0	0	01	0	322.000	S	54290
3	CC 1130967866	ORTIZ CORREDOR MARIA CAMILA	1.300.000	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.949.000	166.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.949.000	41.600	CAJASAN-CCF39	1.949.000	41.600	1.949.000	72.400	0,069%	0	0	0	0	0	01	0	322.000	S	54290

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900623015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364824			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	34702449	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.118.600	152.600	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34702449	2025-01-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	499.200	0	78.900	0	578.100
PORVENIR	230301	800224808	8	2	332.800	0	52.600	0	385.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	166.400	0	26.300	0	192.700
EPS(Administradoras: 1)				3	124.800	0	19.700	0	144.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	124.800	0	19.700	0	144.500
ARP(Administradoras: 1)				3	217.200	0	34.300	0	251.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	217.200	0	34.300	0	251.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				3	124.800	0	19.700	0	144.500
CAJASAN	CCF39	890200106	1	3	124.800	0	19.700	0	144.500
Gran Total					966.000	0	152.600	0	1.118.600

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364524			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	34702612	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.578.400	170.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34702612	2025-03-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1101680568	BUITRAGO BERMUDEZ JORGE LEONARDO	1.423.500	F	X															0			24	24	24	24	PROTECCION -230201	1.138.800	182.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.138.800	45.600	CAJASAN-CCF39	1.138.800	45.600	1.138.800	79.500	9,09960	0	0	0	0	0	01	9	352.800	S	5429001
2	CC 79793514	CALA JIMENEZ NESTOR RAUL	1.423.500	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.138.800	182.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.138.800	45.600	CAJASAN-CCF39	1.138.800	45.600	1.138.800	79.500	9,09960	0	0	0	0	0	01	9	352.800	S	5429001
3	CC 1101687313	HERNANDEZ GOMEZ WILMER FERNEY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	9,09522	0	0	0	0	0	01	9	349.300	S	1749001
4	CC 1100967066	ORTIZ CORREDOR MARIA CAMILA	1.423.500	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.138.800	182.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.138.800	45.600	CAJASAN-CCF39	1.138.800	45.600	1.138.800	79.500	9,09960	0	0	0	0	0	01	9	352.800	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364524			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	34702612	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.578.400	170.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34702612	2025-03-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.839.900	4.839.900	4.839.900	4.839.900	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	774.700	0	93.900	0	868.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	182.300	0	22.100	0	204.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	592.400	0	71.800	0	664.200
EPS(Administradoras: 1)				4	193.800	0	23.500	0	217.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	193.800	0	23.500	0	217.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFIL...	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDO INCAPACI... DESCONTADOS	...LOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	245.400	0	29.800	0	275.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	245.400	0	29.800	0	275.200
CCF(Administradoras: 1)				4	193.800	0	23.500	0	217.300
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	193.800	0	23.500	0	217.300
Gran Total					1.407.700	0	170.700	0	1.578.400

PAGOS
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER
IDENTIFICACIÓN:	NI-900823015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-04
FECHA DE PAGO:	2025-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	34702621
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34702621
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 23.500	$ 228.000	$ 251.500
Subtotal Salud		1	4	$ 0	$ 0	$ 23.500	$ 228.000	$ 251.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 23.500	$ 227.800	$ 251.300
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 70.300	$ 683.400	$ 753.700
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 93.800	$ 911.200	$ 1.005.000
14-11	890903790	ARL SURA	4	$ 0	$ 0	$ 31.400	$ 304.800	$ 336.200
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 31.400	$ 304.800	$ 336.200
39	890200108	CAJASAN	4	$ 0	$ 0	$ 23.500	$ 228.000	$ 251.500
otal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 23.500	$ 228.000	$ 251.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 172.200	$ 1.672.000	$ 1.844.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/05/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364624		MAYEDUDU@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	34702621	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.844.200	172.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34702621	2025-04-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Activid Exentn
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Ces.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1101695068	BUITRAGO BERMUDEZ JORGE LEONARDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	54290
2	CC 79793384	CALA JIMENEZ NESTOR RAUL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	54290
3	CC 1101667313	HERNANDEZ GOMEZ WILMUR FURNEY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	2.500	0,00122	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	17490
4	CC 1100967866	ORTIZ CORREDOR MARIA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	54290

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364624		MAYEDUDU@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	34702621	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.844.200	172.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34702621	2025-04-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	911.200	0	93.800	0	1.005.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	683.400	0	70.300	0	753.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	23.500	0	251.300
EPS(Administradoras: 1)				4	228.000	0	23.500	0	251.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	228.000	0	23.500	0	251.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	304.800	0	31.400	0	336.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	304.800	0	31.400	0	336.200
CCF(Administradoras: 1)				4	228.000	0	23.500	0	251.500
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	228.000	0	23.500	0	251.500
Gran Total					1.672.000	0	172.200	0	1.844.200

PAGOS
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER
IDENTIFICACIÓN:	NI-900823015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-07
FECHA DE PAGO:	2025-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	34702636
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34702636
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 91.200	$ 98.700
Subtotal Salud		1	4	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 91.200	$ 98.700
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 45.600	$ 49.400
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 319.000	$ 345.000
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 29.800	$ 364.600	$ 394.400
14-11	890903790	ARL SURA	4	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 67.200	$ 72.700
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 67.200	$ 72.700
39	890200106	CAJASAN	4	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 91.200	$ 98.700
otal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 91.200	$ 98.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 50.300	$ 614.200	$ 664.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nl 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	6	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364824			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	34702636	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	664.500	50.300	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34702636	2025-05-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Aportes Exonerados
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CPNT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	AFL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1101695168	BUITRAGO BERMUDEZ JORGE LEONARDO	1.423.500	F	X																	0	6	6	6	PROTECCION-230201	284.700	45.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	284.700	11.400	CAJASAN-CCF39	284.700	11.400	284.700	19.950	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	88.300	S	542900
2	CC 79783314	CALA JIMENEZ NESTOR RAUL	1.423.500	F	X																	6	6	6	6	PORVENIR-230301	284.700	45.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	284.700	11.400	CAJASAN-CCF39	284.700	11.400	284.700	19.980	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	88.300	S	542900
3	CC 1101687313	HERNANDEZ GOMEZ WILMER FERNEY	1.423.500	F																		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	2.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	174900
4	CC 1100867966	ORTIZ CORREDOR MARIA CAMILA	1.423.500	F	X																	6	6	6	6	PORVENIR-230301	284.700	45.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	284.700	11.400	CAJASAN-CCF39	284.700	11.400	284.700	19.980	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	88.300	S	542900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nl 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	6	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364824			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	34702636	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	664.500	50.300	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34702636	2025-05-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2,277,600	2,277,600	2,277,600	2,277,600	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	364.600	0	29.800	0	394.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	45.600	0	3.800	0	49.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	319.000	0	26.000	0	345.000
EPS(Administradoras: 1)				4	91.200	0	7.500	0	98.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	91.200	0	7.500	0	98.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	67.200	0	5.500	0	72.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	67.200	0	5.500	0	72.700
CCF(Administradoras: 1)				4	91.200	0	7.500	0	98.700
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	91.200	0	7.500	0	98.700
Gran Total					614.200	0	50.300	0	664.500

PAGOS
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER
IDENTIFICACIÓN:	NI-900823015
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-04
FECHA DE PAGO:	2025-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34702704
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34702704
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 62.700	$ 63.100
Subtotal Salud		1	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 62.700	$ 63.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 53.200	$ 53.500
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 197.600	$ 198.600
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 250.800	$ 252.100
14-11	890903790	ARL SURA	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 72.600	$ 73.000
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 72.600	$ 73.000
39	890200106	CAJASAN	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 62.700	$ 63.100
otal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 62.700	$ 63.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 448.800	$ 451.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	6	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364824			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	34702704	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	451.300	2.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34702704	2025-09-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	ATP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exonera de Parafiscales	Aportes Exonera
1	CC 1101690568	BUSTRAGO BERMUDEZ JORGE LEONARDO	1.423.500	F	X															0			7	7	7	7	PROTECCION-230201	332.150	53.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	332.150	13.300	CAJASAN-CCF39	332.150	23.250	332.150	23.250	0,069600	0	0	0	0	0	01	9	103.000	S	54290
2	CC 79793314	CALA JIMENEZ NESTOR RAUL	1.423.500	F	X															0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	332.150	53.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	332.150	13.300	CAJASAN-CCF39	332.150	23.250	332.150	23.250	0,069600	0	0	0	0	0	01	9	103.000	S	54290
3	CC 1101687113	HERNANDEZ GOMEZ WILMUR FERNEY	1.423.500	F		X														0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	569.400	22.800	CAJASAN-CCF39	569.400	23.910	569.400	3.080	0,005327	0	0	0	0	0	01	9	159.600	S	17490
4	CC 1100967966	ORTIZ CORREDOR MARIA CAMILA	1.423.500	F	X	X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	332.150	53.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	332.150	13.300	CAJASAN-CCF39	332.150	23.250	332.150	23.250	0,069600	0	0	0	0	0	01	9	103.000	S	54290

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900823015	7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER	B	6	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CL 9 15 52		3175364824			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	34702704	E	2025-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	451.300	2.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34702704	2025-09-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1,565,850	1,565,850	1,565,850	1,565,850	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	250.800	0	1.300	0	252.100
PORVENIR	230301	800224808	8	3	197.600	0	1.000	0	198.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	53.200	0	300	0	53.500
EPS(Administradoras: 1)				4	62.700	0	400	0	63.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	62.700	0	400	0	63.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	72.600	0	400	0	73.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	72.600	0	400	0	73.000
CCF(Administradoras: 1)				4	62.700	0	400	0	63.100
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	62.700	0	400	0	63.100
Gran Total					448.800	0	2.500	0	451.300

PAGOS
PAGADO

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CEMENTO HIDRÁULICO GRIS, TIPO UG Y ART

Fabricado por **EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S.**, en la **Carrera 43A No. 14-57 Piso 6 Edificio San Francisco, Medellín, Autopista Medellin Bogota 600 m adelante del puente Rioclaro Sonson, Antioquia, Colombia,** identificada con **número de NIT 900907364.**

Manufactured by **EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S.**, in the **Carrera 43A No. 14-57 Piso 6 Edificio San Francisco, Medellín, Autopista Medellin Bogota 600 m adelante del puente Rioclaro Sonson, Antioquia, Colombia,** identified with **NIT number 900907364.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 121 (2021)

Especificación de Desempeño para Cemento Hidráulico
Performance Specification for Hydraulic Cement.

SECTOR ICS 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER945380
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2022-08-05	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2028-08-04

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:

ALION
HOLCIM corona

INFORME RESULTADOS
CEMENTO TIPO UG

ene-21

LOTE	PARÁMETROS FÍSICOS							RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			
	Retenido Tamiz 45µ (%)	Blaine (m2/kg)	Frag. Inicial (min)	Frag. Final (min)	Cont. Aire (%)	Cambio longitud (%)	Exp. Barras de mortero (%)	R1 Día (MPa)	R3 Días (MPa)	R7 Días (MPa)	R28 Días (MPa)
2021/01/04	7,14	436	100	195				9,9	20,2	25,1	
2021/01/06	7,06	389	93	195				10,4	21,8	25,5	
2021/01/12	5,44	389	114	210				10,0	20,2	23,8	
2021/01/19	6,26	437	105	240				9,6	19,1	24,8	
PROMEDIO	6,48	413	103	210				10,0	20,3	24,8	
DESVIACIÓN	0,80	27	9	21				0,3	1,1	0,7	
COEF. VAR	12,30	7	9	10				3,1	5,3	3,0	
MÁXIMO	7,14	437	114	240				10,4	21,8	25,5	
MÍNIMO	5,44	389	93	195				9,6	19,1	23,8	
DATOS	4	4	4	4				4	4	4	
NTC 121			45 - 420		12,00	0,80	0,020		8,0	15,0	24,0

Revisado por: Erika Pérez
Gerente de Control de Calidad

Fecha de emisión: 29/01/2021

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO DE PVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN

bricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la **Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C.; CELTA S.A.S.**

Carrera 24 No. 30-500, Soledad, Atlántico, Colombia

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the **Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C.;**

CELTA S.A.S. Carrera 24 No. 30-500, Soledad, Atlántico, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2018)

Plásticos. Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) clasificados según la presión (serie RDE)

Plastics. Poly (vinyl chloride) (PVC) pressure rated pipes (SDR series)

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hld the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0001-1
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1971-06-17	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-21	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2029-09-20

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB ACCREDITED PRODUCT CERTIFICATION BODY ID # 0677

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua". "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS Y ACCESORIOS PVC FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la **Autopista del Sur 71-75, Bogotá D.C., Colombia**

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the **Autopista del Sur 71-75, Bogotá D.C., Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 5070 (2006)

Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para uso en alcantarillado, controlados por el diámetro interior

Poly (vinyl chloride) (PVC) closed profile gravity pipe and fitting based on controlled inside diameter

SECTOR ICS: 91.140.80

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0001-13
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2003-09-15	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha del Último Vencimiento: Last Expiration Date:	2023-12-16	**Fecha de Restauración:** Restoration Date:	2023-12-26
Fecha del Próximo Vencimiento: Next Expiration Date:	2029-12-16		

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC. Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua". "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS DE PVC PERFILADOS, DE PARED DOBLE CORRUGADA, PARA USO EN ALCANTARILLADO

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la **Autopista del Sur 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia**

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the **Autopista del Sur 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 5055 (2018)

Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno

Poly (vinyl chloride) (PVC) profile gravity sewer pipe and fittings based on controlled inside diameter

SECTOR ICS: 32.040.20 - 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0001-17
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2010-04-21	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-21	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2029-09-20

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERÍA SANITARIA-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la **Autopista del Sur 71-75, Bogotá D.C., Colombia**

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the **Autopista del Sur 71-75, Bogotá D.C., Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1341 (2006)

Accesorios de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para tubería sanitaria-aguas lluvias y ventilación
Poly(vinyl chloride) (PVC) waste and vent fittings
SECTOR ICS: 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0001-4
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1979-01-01	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-21	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2029-09-20

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia
