MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
30 ENE 2026
Hora: 5:40pm
Quien Recibe:

INFORME DE SUPERVISION FINAL
No. 01

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	639 DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL AREA RURAL DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO C.C 71193281 FERRETERIA FERROMETRO
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ NIT. 891.800.466-4
SUPERVISION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA ACTA 01 DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA 02 RECIBO FINAL	19 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA 03 LIQUIDACION FINAL	30 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 100.000.000,00
VALOR ACTA 02 RECIBO FINAL	$ 99.999.466,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 99.999.466,00
VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 534,00
FECHA DEL PRESENTE ACTA	30 DE ENERO DE 2026
PORCENTAJE DE AVANCE FIANCIERO	100%

ADICIONAL

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VALOR ADICIONAL	$ 100.000.000,00 N/A
VALOR TOTAL	$ 100.000.000,00
VALOR ANTICIPO 50%	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 99.999.466,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	$ 99.999.466,00
VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 534,00

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Que el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, adelantó el proceso de contratación SASI 023 DE 2025, que tiene como objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL AREA RURAL DE PUERTO BOYACA", adjudicado mediante resolución No. 00596 del 12 de noviembre de 2025.

Que se suscribió el contrato 639 de 2025, por las partes Municipio de Puerto Boyacá, el Ingeniero JUANPABLO SALAZAR SALAZAR, Secretario de Obras Públicas y el señor DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO, identificado con c.c. 71193281, en calidad de Contratista, el día 21 de noviembre de 2025, se firma acta de inicio, con un plazo de ejecución de DOS (02) MESES, dando inicio al plazo contractual.

Para constancia, se firma el clausulado en el domicilio de cada una de las partes, mediante el instrumento Electrónico de contratación SECOP II, con ID del contrato Nro. CO1.SLCNTR.16132235, proceso debidamente alimentado en cargue a la plataforma de contratación SECOP II, captura evidencia del cargue en sitio web.

Que el día 19 de enero de 2026 se suscribe por las partes el Acta 02 de Recibo Final por un valor ejecutado de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 99.999.466,00) detallados en el cuadro de la preacta que acompaña dicha acta, quedando un saldo a favor del Municipio por valor de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($534,00), con un 100% de ejecución.



Información

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ

Precio estimado total: 252.614.360 COP
Número del proceso: SASI 014 DE 2025 (Presentación de oferta)
Título: SASI 014 DE 2025 (Presentación de oferta)
Fase: Presentación de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado
Fase previa: Presentación de observaciones
Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA
Tipo de proceso: Selección abreviada subasta inversa
Proceso relacionado

MiPymo

Limitación de todo el proceso a MiPymes: Sí No

Datos del contrato

Tipo de contrato: Suministros
Justificación de la modalidad de contratación: Bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización
Duración del contrato: 3 (Meses)
Dirección de ejecución del contrato: CARRERA 7 CALLE 10 ESQUINA Puerto Boyaca Boyaca COLOMBIA
Codigo UNSPSC: 30111501 - Cemento
Lista adicional de codigos UNSPSC:
Lotes?: Sí No

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?: Sí No
PAA:
Misión y visión: Misión En el seno de la ribera del río grande de La Magdalena, hacia la esperanza de trabajar unidos por un futuro para mejor. Ante la posibilidad de un futuro que se declara incierto y difícil, los hijos de esta tierra proclaman con fuerza y con el eco de su canto, somos por el hacer, hacer y hacer. Así pues, haciendo de la fuerza del amar que nos une, ponemos a consideración del pueblo, el programa de gobierno Puerto Boyacá, Potencia Nacional de Desarrollo. Comprendiendo que la política tiene que ser renovada a las viejas prácticas malas de antaño, de promesas irrealizables. De manera contraria, urge poner en marcha una visión de trabajo que acompañe y se sienta cerca en la tierra, y con el corazón en la gente. Nuestra misión es acompañar todo el tiempo, puertas abiertas para adelantar un trabajo conjunto, transparente y responsable con un servicio enfocado para lograr hacer de Puerto Boyacá una entidad constituyente, propositiva y participativa, en un territorio moderno y sostenible, y en un gobierno justo, eficiente y transparente. Ser el eje motor y dinamizador hacia un Puerto Boyacá Potencia Nacional del Desarrollo. Visión El proyecto político que pretendemos a consideración del pueblo, responde a una visión de largo plazo, en el cual no hemos de pensar en términos de cuatrienios, que no se materializan en el corto plazo, ni tampoco en el periodo de tiempo, sino por el sueño de desarrollo que los invita a trabajar sin descanso, esta visión se encuentra en concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual reconoce que cualquier acción de nuestro pueblo, de nuestros vecinos de nuestra memoria histórica. El ideal que soñó Rubén a nuestra amada tierra, es superior con más esfuerzo, y el ego destructor de la gente a que tanto comprometa por poner todo lo que tenemos por la gente de esta tierra, de ser un eje de hacer una Nación Foca al modelo de Ciudad Región y el amor por la gente de esta tierra, de ser un eje de hacer una Desarrollo Ético Ultimos años, nos hemos acostumbrado que todos solucionen, resuelvan, hagan, menos nosotros mismos, nuestra responsabilidad. Es más, vemos que todos somos solucionadores no vemos, resolutivo todo, debido su acceso de subsidio, su insuficiente compromiso con la gente que tiene la gran capacidad para solucionarlo la administración pública. Nuestro deber moral inmediato es de ser responsables con la realidad de las comunidades con las que mantenemos nuestros compromisos, pero con la certeza de que la fortaleza de las convicciones que se sustentan en una fuente de conocimiento y de capacidades acumuladas, que nos permitan ejecutar proyectos de alto impacto público. Enmarcando al máximo la probabilidad de nuevos errores. Esta es nuestra visión política, resultado de un aprendizaje acelerado y de la franca realidad. Un proyecto que responde con pleno compromiso a las demandas históricas de nuestra sociedad.
Valor total estimado de adquisiciones: 252.614.360 COP

Adquisiciones planeadas

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
01	INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
02	RECIBO FINAL	19 DE ENERO DE 2026
03	LIQUIDACION FINAL	30 DE ENERO DE 2026

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

GARANTIAS

ANEXO 0
Póliza: M-100282707
Fecha de expedición: 20/11/2025
Aseguradora: Seguros Mundial

AMPARO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	18/11/2025	18/07/2026	$ 10.000.000,00

Aprobada mediante Acta de Aprobación de Pólizas N°217 del 21/11/2025

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

El presente contrato surte su ejecución como bolsa, presupuesto de actividades del cual se van ejecutando según la necesidad hasta agotar el recurso dispuesto.

Relación de cantidades ejecutadas para cobro liquidación en el **periodo comprendido** desde el 21 de noviembre 2025 al 19 de enero de 2026:

ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista realiza la ejecución y entrega de los ítems contractuales con los servicios realizados, para la correcta ejecución del contrato en mención, los pedidos se realizan mediante ordenes de pedido donde el contratante realiza la solicitud del despacho de los elementos a suministrar, los cuales se aportan como anexo al presente informe.

Relación de actividades contractuales realizadas durante el periodo 21 de noviembre al 19 de enero de 2026:

CONTRATADO				RECIBO FINAL	
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VLR SUBTOTAL
1	UNION SIMPLE PVC 4"	UND	$ 1.718	1,00	$ 1.718,00
2	UNION RAPIDA O PASANTE PVC-P DE 4"	UND	$ 86.870	5,00	$ 434.350,00
3	UNION DE REPARACION PVC-P 2"	UND	$ 38.027	4,00	$ 152.108,00
4	UNION PVC-P 1/2"	UND	$ 478	4,00	$ 1.912,00
5	TUBO PVC-P 1" RDE 21	M	$ 6.308	3,00	$ 18.924,00

6	TUBO PVC-P 2" RDE 21	M	$	22.758	1462,00	$ 33.272.196,00
7	TUBO PVC-P 4" RDE 21	M	$	84.009	395,14	$ 33.195.316,00
8	TUBO PVC-S 6"	M	$	71.653	0,00	$ -
9	TUBO PVC-P 6" RDE 21 UNION MECANICA	M	$	142.563	0,00	$ -
10	TUBO ACERO INOXIDABLE 304 SCH 40 2"	M	$	294.690	45,00	$ 13.261.050,00
11	TUBERIA PF+UAD DE 1/2"	M	$	2.824	200,00	$ 564.800,00
12	ADAPTADOR MACHO PVC-P 2"	UND	$	7.046	3,00	$ 21.138,00
13	ADAPTADOR MACHO PVC-P 1"	UND	$	1.867	3,00	$ 5.601,00
14	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	UND	$	1.867	0,00	$ -
15	ADAPTADOR MACHO PARA PF+UAD DE 1/2"	UND	$	3.515	36,00	$ 126.540,00
16	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UND	$	593	18,00	$ 10.674,00
17	TEE PVC 1"	UND	$	3.263	2,00	$ 6.526,00
18	TEE PVC-P 2"	UND	$	16.298	1,00	$ 16.298,00
19	TAPON ROSCADO PVC 1"	UND	$	2.510	1,00	$ 2.510,00
20	TAPON ROSCADO PVC 2"	UND	$	9.373	1,00	$ 9.373,00
21	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6M	UND	$	37.659	200,00	$ 7.531.800,00
22	LIMPIADOR PVC 1/4 GL	UND	$	54.900	0,00	$ -
23	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL	UND	$	60.900	2,00	$ 121.800,00
24	COLLARIN DE DERIVACION PVC PRE DE 2" X 1/2"	UND	$	13.137	18,00	$ 236.466,00
25	CEMENTO GRIS	KG	$	730	6500,00	$ 4.745.000,00
26	CONTACTOR 32 AMP - 220 V	UND	$	67.213	0,00	$ -
27	ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" X 6 M	UND	$	78.489	4,00	$ 313.956,00
28	CINTA TEFLON 1/2"	UND	$	1.495	0,00	$ -
29	GRAVILLA DE 3/4" A 1/2"	M3	$	179.290	14,00	$ 2.510.060,00
30	ARENA LAVADA	M3	$	52.500	14,00	$ 735.000,00
31	UNION PVC PSI 1"	UND	$	4.290	0,00	$ -
32	LLAVE PASO PVC ROSC PCP 2" NARANJA	UND	$	50.050	0,00	$ -
33	BUJE SOLDADO PSI 2"X1"	UND	$	5.060	1,00	$ 5.060,00
34	LLAVE PASO METAL ITALY 1"	UND	$	64.350	1,00	$ 64.350,00
35	LLAVE PASO METAL ITALY 2"	UND	$	179.190	1,00	$ 179.190,00
36	UNION PVC PSI 1"	UND	$	1.100	0,00	$ -
37	TEE PVC PSI 1/2"	UND	$	880	0,00	$ -
38	TUBO PVC PSI RD13.5 1/2" MT	M	$	2.420	3,00	$ 7.260,00
39	VARILLA CORRUGADA 5/8"	UND	$	52.360	40,00	$ 2.094.400,00
40	PROTECTOR VOLTAJE 20A 4400W ECA147 MERCURY	UND	$	120.450	2,00	$ 240.900,00
41	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 10	UND	$	26.950	0,00	$ -
42	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 8	UND	$	43.450	0,00	$ -
43	ACIDO NITRICO GL	GL	$	43.950	0,00	$ -
44	CONTACTOR 50 AMP - 110 V CHINT	UND	$	113.190	1,00	$ 113.190,00
TOTAL			$ 100.000.000			$ 99.999.466,00

CONTRATADO				RECIBO FINAL		ACUMULADO	
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VLR SUBTOTAL	CANTIDAD	VLR SUBTOTAL
1	UNION SIMPLE PVC 4"	UND	$ 1.718	1,00	$ 1.718,00	1,00	$ 1.718,00
2	UNION RAPIDA O PASANTE PVC-P DE 4"	UND	$ 86.870	5,00	$ 434.350,00	5,00	$ 434.350,00
3	UNION DE REPARACION PVC-P 2"	UND	$ 38.027	4,00	$ 152.108,00	4,00	$ 152.108,00
4	UNION PVC-P 1/2"	UND	$ 478	4,00	$ 1.912,00	4,00	$ 1.912,00
5	TUBO PVC-P 1" RDE 21	M	$ 6.308	3,00	$ 18.924,00	3,00	$ 18.924,00
6	TUBO PVC-P 2" RDE 21	M	$ 22.758	1462,00	$ 33.272.196,00	1462,00	$ 33.272.196,00
7	TUBO PVC-P 4" RDE 21	M	$ 84.009	395,14	$ 33.195.316,00	395,14	$ 33.195.316,00
8	TUBO PVC-S 6"	M	$ 71.653	0,00	$ -	0,00	$ -
9	TUBO PVC-P 6" RDE 21 UNION MECANICA	M	$ 142.563	0,00	$ -	0,00	$ -
10	TUBO ACERO INOXIDABLE 304 SCH 40 2"	M	$ 294.690	45,00	$ 13.261.050,00	45,00	$ 13.261.050,00
11	TUBERIA PF+UAD DE 1/2"	M	$ 2.824	200,00	$ 564.800,00	200,00	$ 564.800,00
12	ADAPTADOR MACHO PVC-P 2"	UND	$ 7.046	3,00	$ 21.138,00	3,00	$ 21.138,00
13	ADAPTADOR MACHO PVC-P 1"	UND	$ 1.867	3,00	$ 5.601,00	3,00	$ 5.601,00
14	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	UND	$ 1.867	0,00	$ -	0,00	$ -
15	ADAPTADOR MACHO PARA PF+UAD DE 1/2"	UND	$ 3.515	36,00	$ 126.540,00	36,00	$ 126.540,00
16	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UND	$ 593	18,00	$ 10.674,00	18,00	$ 10.674,00
17	TEE PVC 1"	UND	$ 3.263	2,00	$ 6.526,00	2,00	$ 6.526,00
18	TEE PVC-P 2"	UND	$ 16.298	1,00	$ 16.298,00	1,00	$ 16.298,00
19	TAPON ROSCADO PVC 1"	UND	$ 2.510	1,00	$ 2.510,00	1,00	$ 2.510,00
20	TAPON ROSCADO PVC 2"	UND	$ 9.373	1,00	$ 9.373,00	1,00	$ 9.373,00
21	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6M	UND	$ 37.659	200,00	$ 7.531.800,00	200,00	$ 7.531.800,00
22	LIMPIADOR PVC 1/4 GL	UND	$ 54.900	0,00	$ -	0,00	$ -
23	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL	UND	$ 60.900	2,00	$ 121.800,00	2,00	$ 121.800,00
24	COLLARIN DE DERIVACION PVC PRE DE 2" X 1/2"	UND	$ 13.137	18,00	$ 236.466,00	18,00	$ 236.466,00
25	CEMENTO GRIS	KG	$ 730	6500,00	$ 4.745.000,00	6500,00	$ 4.745.000,00
26	CONTACTOR 32 AMP - 220 V	UND	$ 67.213	0,00	$ -	0,00	$ -
27	ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" X 6 M	UND	$ 78.489	4,00	$ 313.956,00	4,00	$ 313.956,00
28	CINTA TEFLON 1/2"	UND	$ 1.495	0,00	$ -	0,00	$ -
29	GRAVILLA DE 3/4" A 1/2"	M3	$ 179.290	14,00	$ 2.510.060,00	14,00	$ 2.510.060,00
30	ARENA LAVADA	M3	$ 52.500	14,00	$ 735.000,00	14,00	$ 735.000,00
31	UNION PVC PSI 1"	UND	$ 4.290	0,00	$ -	0,00	$ -
32	LLAVE PASO PVC ROSC PCP 2" NARANJA	UND	$ 50.050	0,00	$ -	0,00	$ -
33	BUJE SOLDADO PSI 2"X1"	UND	$ 5.060	1,00	$ 5.060,00	1,00	$ 5.060,00
34	LLAVE PASO METAL ITALY 1"	UND	$ 64.350	1,00	$ 64.350,00	1,00	$ 64.350,00
35	LLAVE PASO METAL ITALY 2"	UND	$ 179.190	1,00	$ 179.190,00	1,00	$ 179.190,00

36	UNION PVC PSI 1"	UND	$ 1.100	0,00	$ -	0,00	$ -
37	TEE PVC PSI 1/2"	UND	$ 880	0,00	$ -	0,00	$ -
38	TUBO PVC PSI RD13.5 1/2" MT	M	$ 2.420	3,00	$ 7.260,00	3,00	$ 7.260,00
39	VARILLA CORRUGADA 5/8"	UND	$ 52.360	40,00	$ 2.094.400,00	40,00	$ 2.094.400,00
40	PROTECTOR VOLTAJE 20A 4400W ECA147 MERCURY	UND	$ 120.450	2,00	$ 240.900,00	2,00	$ 240.900,00
41	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 10	UND	$ 26.950	0,00	$ -	0,00	$ -
42	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 8	UND	$ 43.450	0,00	$ -	0,00	$ -
43	ACIDO NITRICO GL	GL	$ 43.950	0,00	$ -	0,00	$ -
44	CONTACTOR 50 AMP - 110 V CHINT	UND	$ 113.190	1,00	$ 113.190,00	1,00	$ 113.190,00
TOTAL			$ 100.000.000		$ 99.999.466,00		$ 99.999.466,00

Los materiales solicitados se han utilizado para la realización de actividades propias de la Secretaria de Obras Publicas concernientes al mantenimiento de sistemas de captación y redes de agua para consumo humano:

- Reparación de sistema de captación mediante bombeo de pozo profundo y red de distribución acueducto en Resguardo indígena de los Emberas.
- Reparación del sistema de acueducto mediante bombeo de pozo profundo y red de distribución en la vereda Pavitas, cambio de tubería y accesorios eléctricos
- Reparación del sistema de acueducto mediante bombeo de pozo profundo y red de distribución en la vereda Pozo dos.
- Mejoramiento del sistema de acueducto apoyo con materiales en el asentamiento de Romerito entregados a la JAC respectiva
- Acueducto Piñal – Patio Bonito cambio protector de voltaje, cableado del sistema de acueducto.
- Acueducto de Serviez cambio de contactor

PARTE VII. REGISTROS FOTOGRAFICOS
























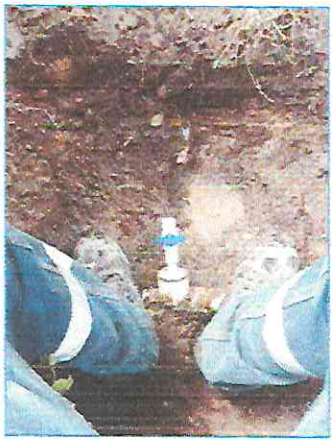










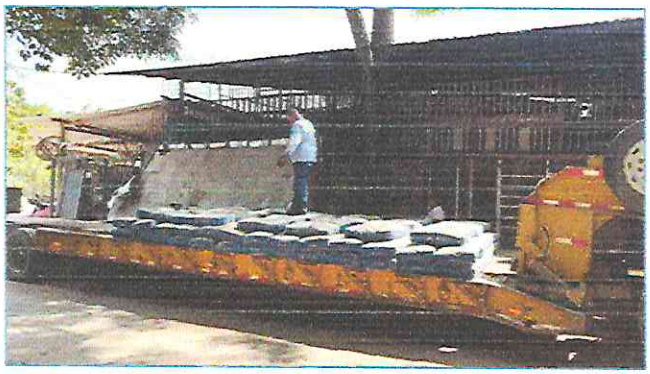





Juan Pablo Sal Sal

ING. JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
Secretario de Obras Públicas
Supervisor Delegado
