INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 5 LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 064 DE 2025

Del 1 al 31 de diciembre de 2025

Valle del Cauca

1. IDENTIFICACION DE LA OBRA

CONTRATO	064 de 2025	
CONTRATANTE	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA	
CONTRATISTA	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS SEDES JUDICIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" Y SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO DE JUSTICIA “OSCAR TRUJILLO LERMA” DE ROLDANILLO Y PALACIO DE JUSTICA DE CARTAGO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO	
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($1.552.981.713,00), M/CTE, incluido IVA y AIU	
FIRMA DEL CONTATO	29 de julio de 2025	
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (5) meses	
FECHA DE INICIO	01 de agosto de 2025	
SUPERVISORES:	Cesar Augusto Rendón Díaz	Supervisión del contrato
	Piedad Lorena Hernández Fernández	Apoyo a la supervisión
	Juan José Monsalve Ospina	Apoyo a la supervisión

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles se desarrolla en los municipios de Palmira, Roldanillo y Cartago del Departamento del Valle de Cauca.

- *Municipios de intervención*



3. SEDES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA

SEDE	MUNICIPIO	DIRECCION
Palacio de Justicia de Palmira "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO"	Palmira	Carrera 23 No. 29 - 09
Edificio Sede Judicial de Familia	Palmira	Calle 22 No. 28 A 10
Palacio de Justicia de Cartago	Cartago	Calle 1 No. 4 - 29
Palacio de Justicia de Roldanillo	Roldanillo	Calle 7 No. 9 - 02

4. INTRODUCCION

El presente documento tiene como objeto dar un informe de aspectos administrativos, financieros, y técnicos actividades ejecutadas durante el periodo del 1 al 31 de diciembre del presente año, que se adelantan como parte de Contrato Estatal de Obra No. 064 de 2025 del 29 de julio de 2025 cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS SEDES JUDICIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" Y SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO DE JUSTICIA "OSCAR TRUJILLO LERMA" DE ROLDANILLO Y PALACIO DE JUSTICA DE CARTAGO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO", ubicados en el departamento del Valle del Cauca.

5. VALOR DEL CONTRATO

DESPACHO JUDICIAL	COSTO DIRECTO	ADICION No. 1	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	IVA	TOTAL COSTOS INDIRECTOS + AIU
			27% / 25% / 23%	1% / 2% / 1%	5%	19%	
Palacio de Justicia de Palmira	$ 613.330.682,00	$ 74.420.599,00	$ 185.692.846,00	$ 6.877.513,00	$34.387.564,00	$ 6.533.637,00	$ 921.242.841,00
Sede de Familia de Palmira	$ 180.519.376,00	$ 38.281.187,00	$ 54.00.141,00	$ 4.376.011,00	$10.940.028,00	$ 2.078.605,00	$ 290.895.347,00
Palacio de Justicia de Roldanillo	$ 137.690.446,00	$ 20.671.253,00	$ 36.423.190,00	$ 1.583.617,00	$ 7.918.085,00	$ 1.504.436,00	$ 205.791.025,00
Palacio de Justicia de Cartago	$ 102.579.613,00	$ 1.346.893,00	$ 23.903.097,00	$ 1.039.265,00	$ 5.196.325,00	$ 987.302,00	$ 135.052.498,00
TOTAL	**$1.034.120.117,00**	**$134.719.932,00**	**$ 300.719.274,00**	**$ 13.876.407,00**	**$ 58.442.003,00**	**$ 11.103.980,00**	**$ 1.552.891.713,00**

6. SEGUIMIENTO FINANCIERO

ESTADO DEL CONTRATO		
DESCRIPCION		VALOR A FACTURAR
Obra Contratada	$1.373.787.900,00	
Valor Adición No. 1	$ 179.193.813,00	
Valor Acta Parcial No. 1		$ 639.013.131,00
Valor Acta Parcial No. 2		$ 531.959.394,00
Valor Recibo Final		$ 0,00
Saldo por Ejecutar	$382.009.189,00	

SEDE	Valor contractual	Acta Parcial No. 1	Acta Parcial No. 2	Acta de recibo Final	Acumulado	Valor por cobrar
Palacio de Justicia de Palmira	$ 921.242.841,00	$236.117.646,00	$411.193.783,00	$ 0,00	$647.311.428,00	$ 273.931.413,00
Sede de Familia de Palmira	$ 290.895.347,00	$196.470.281,00	$ 20.627.743,00	$ 0,00	$217.098.023,00	$ 73.797.325,00
Palacio de Justicia de Roldanillo	$ 205.791.025,00	$124.762.968,00	$ 57.364.474,00	$ 0,00	$182.127.443,00	$ 23.663.585,00
Palacio de Justicia de Cartago	$ 135.052.498,00	$ 81.662.236,00	$ 42.773.394,00	$ 0,00	$ 124.435.628,00	$ 10.616.866,00
TOTAL	**$ 1.552.891.713,00**	$639.013.131,00	$531.959.394,00	$ 0,00	$1.170.972.522,00	$ 382.009.189,00

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se realiza la Modificación No. 2 al contrato, con respecto al cambio en la especificación técnica del Ítem 52 del Palacio de Justicia de Palmira y la adición en tiempo por veinte (20) días más

7.1 RELACION DE POLIZAS

CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO - PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101241082, ANEXO 0 - Firma del contrato y acta de inicio			
Cumplimiento de contrato	01/08/2025	05/05/2026	137.378.790,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/08/2025	30/12/2028	274.757.580,00
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		137.378.790,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	0 años, 11 meses y 4 días		137.378.790,00
SEGUROS DEL ESTADO - PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 14-40-101074717 ANEXO 0 - Firma del contrato y acta de inicio			
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	01/08/2025	05/05/2026	284.700.000,00

CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO - PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101241082, ANEXO 1 – Modificación No. 1 (adición)			
Cumplimiento de contrato	01/08/2025	05/05/2026	137.378.790,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/08/2025	30/12/2028	274.757.580,00
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		155.298.171,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	0 años, 11 meses y 4 días		155.298.171,30
SEGUROS DEL ESTADO - PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 14-40-101074717 ANEXO 1 - Modificación No. 1 (adición)			
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	01/08/2025	05/05/2026	284.700.000,00

CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO - PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101241082, ANEXO 2 – Modificación No. 2 (adición en tiempo)			
Cumplimiento de contrato	01/08/2025	05/06/2026	155.298.790,30
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/08/2025	30/01/2029	310.596.342,60
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		155.298.171,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	0 años, 11 meses y 4 días		155.298.171,30
SEGUROS DEL ESTADO - PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 14-40-101074717 ANEXO 2 - Modificación No. 2 (adición en tiempo)			
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	01/08/2025	05/06/2026	284.700.000,00

7.2 ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, y acta de recibo final.)

TIPO DE ACTA	FECHA	DESCPRICIÓN

7.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

Se continua con el mismo personal, sin cambios:

NOMBRE	CARGO	PROFESION	MP / LICENCIA
María Claudia García Cardona	Director de Obra	Ingeniera Civil con Especialización en Gerencia de Construcciones y Magister en Ingeniería Civil	76202-356992 VLL
Julio Ricardo Rojas Hernández	Residente de Obra	Arquitecto con especialización en Gerencia Integral de Obras y Medio Ambiente y Desarrollo Local	25700-5909
Angie Camila Azuero Torres	Residente Ambiental	Ingeniería Ambiental con Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible	161021--0557973
Erika Tatiana Cano Leal	Residente SISO	Tecnóloga en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional	1036, 03/05/2021

7.4 PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	SEDE
Elkin Dario Caro Estrada	Oficial	Sede Judicial Familia
José Zoilo Caceres Ibarguen	Oficial	Palacio de Justica - Palmira
Rodolfo Caceres Ibarguen	Ayudante	Palacio de Justica - Palmira
Uriel Antonio Caceres Ibarguen	Ayudante	Palacio de Justica - Palmira
German Alonso Tenorio Navarro	Maestro	Palacio de Justica - Palmira
Alvaro León Barraza	Maestro	Palacio de Justicia de Cartago
Eduardo José León Barraza	Oficial	Palacio de Justicia Roldanillo
Jhonny Ever Arrieta Berrocal	Pintor	Palacio de Justica - Palmira
Reinaldo León Barraza	Maestro	Palacio de Justicia Roldanillo
Duberley Londoño Sánchez	Ayudante	Palacio de Justica – Palmira
Carlos Alfredo Tamayo Rivas	Ayudante	Palacio de Justica – Palmira
Rafael Palacios Caicedo	Maestro	Palacio de Justica – Palmira
Leonardo Palacios Caicedo	Maestro	Palacio de Justica – Palmira
Dubel Herney Valle Vasquez	Ayudante	Palacio de Justica – Palmira

Adjunto al presente escrito se remite el Informe de Seguimiento de Personal administrativo y de obra, y copia del libro de registro de personal por frente de obra

7.5 SEGURIDAD SOCIAL

Planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales del periodo de octubre 2025

NOMBRES	Operador de pago	Planilla No.	Fecha de pago
María Claudia García Cardona	Aportes en línea	9496652389	19/12/2025
Julio Ricardo Rojas Hernández	Aportes en línea	9496957804	26/12/2025
Angie Camila Azuero Torres	Aportes en línea	9496068406	26/12/2025
Erika Tatiana Cano Leal	Aportes en línea	9496959928	26/12/2025
Personal Operativo (oficiales y ayudantes)	Aportes en línea	9496959928	26/12/2025
Contratistas Independientes	Aportes en línea	9496960437	26/12/2025

Adjunto al presente escrito se hace entrega de las planillas de aportes a segundad social y aportes parafiscales del personal antes relacionado.

8. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL

Adjunto al presente escrito se hace entrega del informe No. 5 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

9. BITACORA DE OBRA

Adjunto al presente escrito se hace entre de fotocopia de los libros de obra de los frentes de Palmira, Roldanillo y Cartago

10. DESARROLLO Y AVANCE DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA

Para el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades operativas:

10.1 PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA

ITEM	DESCRIPCION
TRATAMIENTO IMPERMEABILIZACION TERRAZAS	
35	Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano



36	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral altura 10cm (superficie con pendiente)



38	Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)






TRATAMIENTO HUMEDADES INTERNAS

49	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) (Incluye filos y dilataciones







OTROS	
51	Desmonte de puerta metálica



52	Suministro e instalación de puerta cortafuego metálica de doble ala, certificación nacional, con dimensiones especiales de 2.40m de ancho por 2.69m de alto, con resistencia al fuego mínima de ciento ochenta (180) minuto (RF-180) , conforme a las normas NFPA 252, NFPA 80 y en cumplimiento del Reglamento técnico colombiano de construcción sismorresistente NSR-10



ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE	
1,03	Demolición mesones en concreto



1,05	Demolición de cielo raso




1,18	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura






1,16	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo





1,15	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm






48;	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra




49;	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_






10.2 SEDE JUDICIAL FAMILIIA DE PALMIRA

ITEM	DESCRIPCION
ARREGLO FACHADA (ACCESO)	
28	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye estructura, masillada, filos y pintura para exterior 2 manos




CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS	
39	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)




OTROS	
76	Suministro e instalación de placa de identificación



10.3 PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

ITEM	DESCRIPCION
BATERÍAS SANITARIAS - COCINETA	
1,07	Corte de piso en concreto con pulidora



LOSA TANQUES DE AGUA	
2,01	Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir



VARIOS	
3,01	Adecuación dintel de madera 0,05x0,50x1,80, inmunnizado y pintado color negro mate, incluye alzaprimada de muro/cubierta, retiro dintel existente, resane y pintura 3 vinilo manos en muro





3,02	Cambio columna de madera 0,15x0,15x3,5, similar al existente inmunnizada y pintada color negro mate (similar al existente), incluye alzaprimada de cubierta, retiro de la columna existente y todo lo necesario para su correcta instalación







SEGURIDAD HUMANA	
5,02	Suministro e instalación de Placa de Identificación



10.4 PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

ITEM / ID	DESCRIPCION
BATERIAS SANITARIAS	
1,36	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.




1,37	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento




HUNDIMIENTO HALL DE ACCESO	
2,15	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)




11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizaron en los respectivos frentes de trabajo las actividades de demolición y desmontes para las adecuaciones de los espacios de acuerdo a los diseños entregados. En los frentes donde se hizo intervención de cubierta, se ejecutaron los respectivos mantenimientos y la construcción de estructura y suministro e instalación de teja, se instaló gran parte de la tubería hidrosanitaria, según diseños, y se procedió realizar la actividad de pañetes y afinados de pisos, así mismo se realizó el retiro y disposición de residuos en sitios autorizados.

12. ANEXOS

- Bitácoras de Obra de Palacio de Justicia de Palmira, Sede Judicial Familia de Palmira, Palacio de Justicia de Roldanillo y Palacio de Justicia de Cartago del periodo correspondiente al mes de diciembre de 2025
- Formato seguimiento Personal diciembre 2025
- Informe No. 4 de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025, con sus anexos
- Planillas de aportes a seguridad social
- Registro y Control No. 5 del Plan de Calidad
- Registro o formatos llevados durante el periodo, que hacen parte integral del Plan de Calidad

Atentamente,

MARIA CLAUDIA GARCIA CARDONA
C.C. No. 1.144.181.626 de Cali
Ingeniera Civil MP No. 76202-356992 VLL
Directora de Obra

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
C.C. No. 79.356.655 de Bogotá
Arquitecto MP No. 25700-57909
Representante Legal

INFORME No. 5 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA

CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 064 de 2025
CONTRATISTA: JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

1 al 31 de diciembre de 2025

Carrera 61 F No. 51 B 33 sur, Bogotá D.C. – Tel Móvil 3017558184 -3017804089
Email: arquitectosconstructoresbog@hotmail.com

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO	064 de 2025
CONTRATANTE	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS SEDES JUDICIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" Y SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO DE JUSTICIA “OSCAR TRUJILLO LERMA” DE ROLDANILLO Y PALACIO DE JUSTICA DE CARTAGO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($1.552.981.713,00), M/CTE, incluido IVA y AIU
FIRMA DEL CONTATO	29 de julio de 2024
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (5) meses y veinte (20) días
FECHA DE INICIO	01 de agosto de 2025
SUPERVISORES:	Cesar Augusto Rendón Díaz — Supervisión del contrato
	Piedad Lorena Hernández Fernández — Apoyo a la supervisión
	Juan José Monsalve Ospina — Apoyo a la supervisión

1. OBJETIVO GENERAL

Presentar de manera clara y ordenada la información relacionada con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente durante el periodo evaluado, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, los planes de gestión implementados y las políticas de la entidad, asegurando la prevención de riesgos laborales, la protección del personal vinculado a la actividad y la mitigación de impactos ambientales generados por las operaciones.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de control de riesgos laborales.
- Asegurar la protección de la integridad física y mental del personal involucrado en la obra.
- Garantizar el manejo adecuado de residuos, emisiones y demás aspectos ambientales.
- Contribuir a la mejora continua del desempeño en SST y gestión ambiental de la obra.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Acto subestándar o inseguro:** Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.
- **Alerta:** acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
- **Alta Dirección:** Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.
- **Amenaza:** factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones a sus integrantes e instalaciones
- **Capacitación:** conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa
- **Contingencia:** evento que puede suceder o no suceder, para el cual se debe estar preparado.
- **Control:** acción encaminada a eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias
- **COVID-19:** Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la OrganizaciónMundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII).
- **Emergencia:** estado de alteración parcial o total de las actividades de una empresa, ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las personasy organizaciones.
- **Exposición:** Acción de exponer a alguien o algo a los efectos de otros agentes lo cual depende de la cantidad de sustancia o dosis, tiempo de contacto y/o frecuencia.
- **Gestión:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
- **Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional:** Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a controlar y mejorar la seguridad ysalud en el trabajo.
- **Identificación:** Es la acción que permite reconocer los registros y relacionarlos con la actividad involucrada o el proceso del sistema que evidencian.
- **Información:** datos que poseen significado.
- **Manual del Sistema de Gestión:** Documento que especifica el Sistema de Gestión de una organización.
- **Objetivos:** Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, medio ambiente y la seguridad y

salud en el trabajo.

- **Políticas:** Intenciones globales y orientación de una organización relativasa la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
- **Proceso:** Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en resultado.
- **SYSO:** Sistema de gestión para desarrollar la política y gestionar los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.
- **SGSST:** Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- **SG:** Sigla que significa sistema de gestión
- **SST:** Sigla que significa seguridad y salud en el trabajo
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de enfermedad o lesión a las personas, o a una combinación de éstos.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

3. ALCANCE Y RESPONSABLES

El presente informe abarca las actividades de planeación, ejecución, seguimiento y control relacionadas con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente durante el desarrollo de la obra. Incluye el análisis de condiciones de trabajo, aplicación de medidas preventivas, control de riesgos, gestión de residuos, cumplimiento de la normatividad vigente y verificación del desempeño de contratistas y personal vinculado. El alcance comprende todas las fases del proyecto, desde la preparación del área de trabajo hasta la entrega final de la obra, incluyendo los registros, inspecciones, capacitaciones y acciones correctivas implementadas

Contratista / Responsable de la obra:

- Garantizar la implementación y cumplimiento de las medidas de SST y ambientales establecidas en el plan de gestión.
- Proveer los recursos necesarios (EPP, señalización, equipos, capacitación) para prevenir accidentes y minimizar impactos ambientales.
- Reportar oportunamente incidentes, accidentes de trabajo, condiciones inseguras y aspectos ambientales significativos.

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo / Ambiental:

- Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de SST y medio ambiente.
- Ejecutar inspecciones periódicas y elaborar reportes de hallazgos.
- Coordinar capacitaciones y actividades de sensibilización en seguridad, salud y medio ambiente.
- Recomendar acciones correctivas y verificar su implementación.

Supervisión:

- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales en materia de SST y medio ambiente.
- Revisar y aprobar los informes de gestión presentados por el contratista.
- Hacer seguimiento a las medidas correctivas y de mejora implementadas.

Trabajadores y personal vinculado a la obra:

- Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y medio ambiente establecidos.
- Usar adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Reportar riesgos, condiciones inseguras y aspectos ambientales negativos detectados.
- Participar en capacitaciones y actividades de prevención.

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El proyecto contempla el mantenimiento y reparaciones locativas a los inmuebles a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Departamento del Valle de Cauca, brindando protección de los bienes inmuebles, operatividad y garantizando la integridad de los servidores judiciales y sus visitantes.

4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Valle del Cauca está ubicado, es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros.

Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes por KM2.

El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000m sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año.

El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali. El 81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales.

Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una de las zonas agrícolas más importantes del país.

4.2 SEDES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA A INTERVENIR

SEDE	MUNICIPIO	DIRECCION
Palacio de Justicia de Palmira "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO"	Palmira	Carrera 23 No. 29 - 09
Edificio Sede Judicial de Familia	Palmira	Calle 22 No. 28 A 10
Palacio de Justicia de Cartago	Cartago	Calle 1 No. 4 - 29
Palacio de Justicia de Roldanillo	Roldanillo	Calle 7 No. 9 - 02

4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El contrato de obra contempla varias actividades que conllevan al mantenimiento y reparaciones locativas a los inmuebles a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Departamento del Valle de Cauca, con los más altos estándares de calidad tanto eléctrico como obra civil.

4.4 GENERALIDADES DEL SG-SST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y el Sistema de Gestión Ambiental son herramientas fundamentales que garantizan el cumplimiento de la normatividad vigente, la protección integral de los trabajadores y la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales asociados a las actividades de la obra. En el marco del proyecto de mantenimiento y reparaciones locativas en las sedes judiciales de Palmira, Cartago y Roldanillo, se aplican los siguientes principios:

- Prevención de riesgos laborales: Identificación, evaluación y control de los peligros que puedan generar incidentes, accidentes o enfermedades laborales.
- Cumplimiento normativo: Aplicación de la legislación nacional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión ambiental, así como de los lineamientos internos de la entidad contratante.
- Mejora continua: Ejecución de acciones de seguimiento, medición y control que permitan fortalecer el desempeño en SST y medio ambiente.
- Gestión de residuos: Separación, almacenamiento temporal, disposición final adecuada y aprovechamiento de residuos sólidos generados durante las actividades de la obra.
- Protección ambiental: Control de emisiones, vertimientos, ruido, consumo de recursos naturales y demás aspectos ambientales relevantes.
- Capacitación y sensibilización: Formación continua de los trabajadores en temas de seguridad, salud ocupacional y buenas prácticas ambientales.
- Participación de los trabajadores: Fomento de la cultura preventiva, reporte de condiciones inseguras y compromiso con la protección del entorno.

En este sentido, el SGSST y la gestión ambiental se convierten en ejes transversales que acompañan todas las fases del proyecto, contribuyendo a la seguridad, bienestar y sostenibilidad de las operaciones en las sedes judiciales intervenidas**.**

5. PERSONAL EN OBRA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Para el periodo del informe, se continúan actividades en el Palacio de Justicia de Palmira "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO", Sede Judicial Familia de Palmira, Palacio de Justicia Roldanillo en el Palacio de Justicia de Cartago. El personal que inicia y continua labor para este periodo es:

NOMBRE	CARGO	SEDE O FRENTE
María Claudia García Cardona	Director de Obra	Palmira, Roldanillo y Cartago
Julio Ricardo Rojas Hernández	Residente de Obra	Palmira, Roldanillo y Cartago
Angie Camila Azuero Torres	Residente Ambiental	Palmira, Roldanillo y Cartago
Erika Tatiana Cano Leal	Residente SISO	Palmira, Roldanillo y Cartago
Elkin Darío Caro Estrada	Oficial	Sede Judicial Familia

German Alonso Tenorio Navarro	Maestro	Palacio de Justica - Palmira
José Zoilo Cáceres Ibarguen	Oficial	Palacio de Justica - Palmira
Uriel Antonio Cáceres Ibarguen	Ayudante	Palacio de Justica - Palmira
Rodolfo Cáceres Ibarguen	Ayudante	Palacio de Justica - Palmira
Álvaro León Barraza	Maestro	Palacio de Justicia de Cartago
Eduardo José León Barraza	Oficial	Palacio de Justicia Roldanillo
Jhonny Ever Arrieta Berrocal	Pintor	Palacio de Justica – Palmira
Reinaldo León Barraza	Maestro	Palacio de Justicia Roldanillo
Duberley Londoño Sánchez	Ayudante	Palacio de Justica – Palmira
Carlos Alfredo Tamayo Rivas	Ayudante	Palacio de Justica – Palmira
Rafael Palacios Caicedo	Maestro	Palacio de Justica – Palmira
Leonardo Palacios Caicedo	Maestro	Palacio de Justica – Palmira
Dubel Herney Valle Vásquez	Ayudante	Palacio de Justica – Palmira

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SGSST

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo como medidas de control el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el mes de diciembre de 2025 se han realizado las siguientes actividades:

a) Exámenes preocupaciones

Se realizan los exámenes de ingreso y exámenes de ingreso con énfasis en alturas, teniendo en cuenta la ocupación o actividades a realizar de cada uno de los trabajadores.

b) Inducción de Personal

Se inicia la etapa de inducción a la empresa y puesto de trabajo, para ello se realizan charlas personalizadas con el personal antes de su ingreso e inicio de labores, dejando constancia de esta. Para el mes de diciembre de 2025 se realizó la inducción a los trabajadores y subcontratistas quienes recibieron información.

c) Charlas Preoperacionales y Pausas Activas

Enfatizadas en mitigar, controlar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo, así como el cuidado del medio ambiente; previo al desarrollo e inicio de labores mediante charlas de seguridad diarias con una duración de 5 minutos se dan conocer diferentes temas en materia de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, se llevan a cabo una vez se inicien las actividades contempladas en el contrato estatal de obra:

• Riesgo Físico ¿qué es? • Reporte de condiciones inseguras • Orden y aseo en áreas de trabajo • Señalización de seguridad en áreas de trabajo	• Hidratación y pausas activas • Estrés laboral y agotamiento • Inspección preoperacional de herramientas • Procedimientos seguros de trabajo

• Conciencia ambiental	

De igual manera se desarrollan pausas activas con base en ejercicios de calistenia a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteo musculares a fin de generar cultura y prevenir el estrés, que permita a los colaboradores recuperar energías garantizando un desempeño eficiente en su trabajo.

Es de resaltar que para dichas actividades deberá asistir todo el personal - oficiales de obra, ayudantes de obra, electricistas, soldador, residentes de obra, director de obra y todo aquel colaborador que intervenga en la misma, de igual manera se hacen participes al personal que se encuentra en otras sedes tales como Cartago y Roldanillo

INDUCCION DE PERSONAL Y CHARLAS PREOPERACIONALES





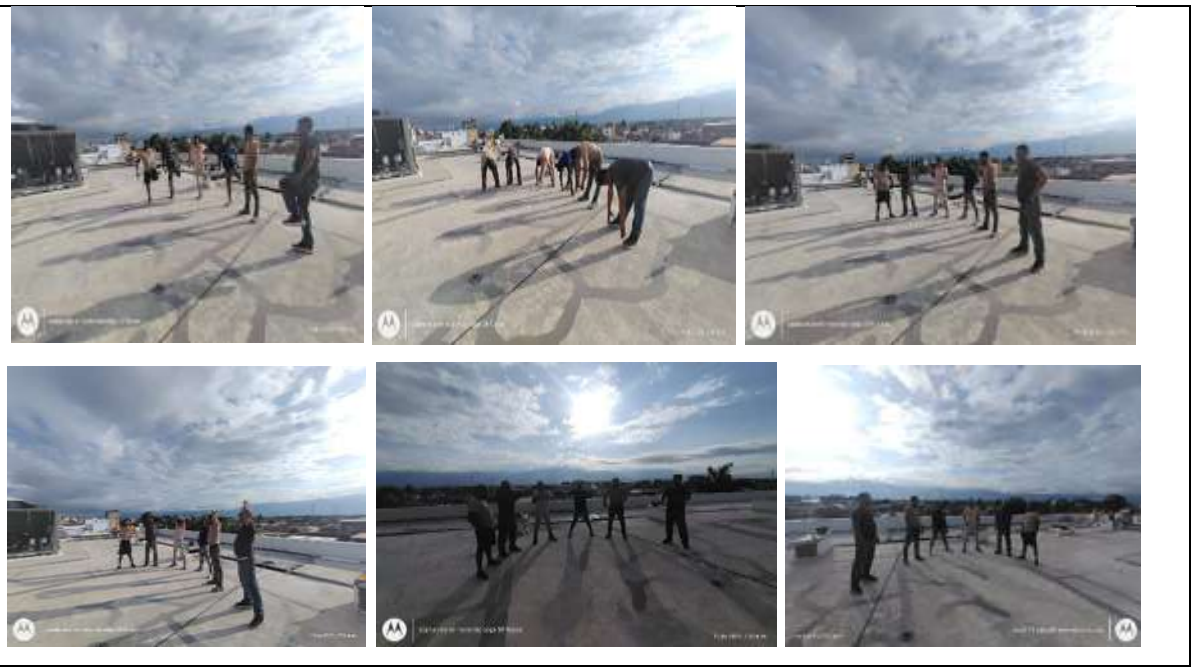





PAUSAS ACTIVAS







d) Entrega y cambio de dotación o elementos de protección individual

Se realiza la entrega de la dotación y elementos de protección individual necesarios para el desarrollo de las labores, a los diferentes colaboradores que participan en las actividades quedando como registro el acta de entrega de dotación y Epp's

d) Inspección de dotación Elementos de protección personal

Se realiza la correspondiente inspección a los elementos de protección individual entregado al personal de la obra, a través de observación directa verifica las condiciones.

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP






e) Inspección de equipos de emergencia

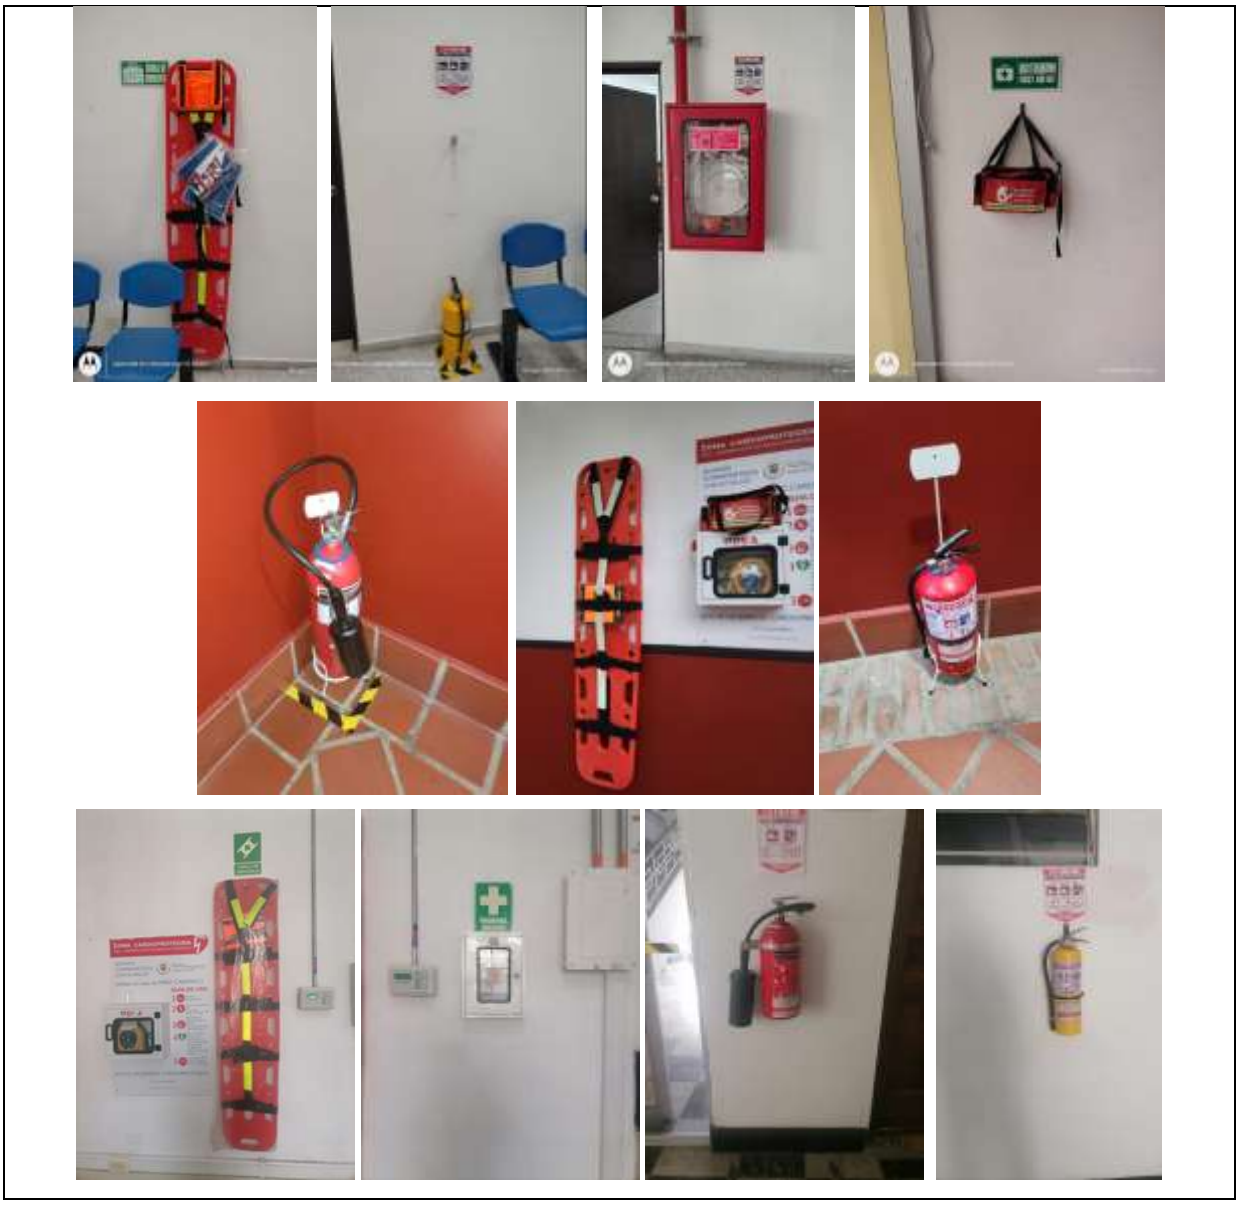
Garantizando las actividades tendientes a prestar la primera atención o primero auxilios a los trabajadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias, se realizó inspección a los elementos de emergencias los cuales son inspeccionados mensualmente, dicha inspección será plasmada en el formato "inspección de equipos de emergencia" por la profesional SST

EQUIPOS DE EMERGENCIA









f) Inspección de Herramientas y elementos de trabajo

Se realizan las correspondientes inspecciones semanales a las herramientas y elementos de trabajo a cargo del personal de la obra, dicha inspección se plasmada en el formato "inspección de herramientas" por la profesional SST quien a través de observación directa verificaron condiciones.

g) Inspección a puestos de trabajo

Se realizan inspecciones a los diferentes puestos de trabajo, con la finalidad de identificar los Peligros y Riesgos a los cuales pueden llegar a estar expuestos los trabajadores y así mismo implementar medidas de control para minimizar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo.

h) Señalización y demarcación de áreas de trabajo

Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones locativas de la obra se realiza la ubicación de señalización a fin de prevenir a los usuarios sobre la existencia de riesgos o situaciones especiales, de igual manera se restringe el paso de personal, se realiza la señalización de zonas de intervención a fin de evitar accidentes y eventualidades con la comunidad educativa.

SEÑALIZACION Y DEMARCACION



7. NOVEDADES DE PERSONAL (INGRESO, AUSENCIAS E INCAPACIDADES)

7.1 Afiliaciones de ley y Seguridad social

El Residente SST y la Dirección Administrativa consultan en el sistema SISPRO RUAF las entidades donde han estado afiliados los trabajadores y con base en dicha información realizar las respectivas afiliaciones de ley, si hay lugar a ello:

- ARL (Administradora de riesgos laborales)
- EPS (Entidad Promotora de Salud)
- AFP (Administradora de Fondos de Pensión)
- CCF (Caja de Compensación Familiar)

De igual manera y de acuerdo con los reportes mensuales de novedades de personal, en las fechas establecidas se realizarán los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal del personal vinculado con el contratista en pro de garantizar el acceso de los trabajadores a los beneficios y cobertura de dicho sistema.

Relación de seguridad social personal de obra diciembre 2025

NOMBRES	Operador de pago	Planilla No.	Fecha de pago
María Claudia García Cardona	Aportes en línea	9496652389	19/12/2025
Julio Ricardo Rojas Hernández	Aportes en línea	9496957804	26/12/2025
Angie Camila Azuero Torres	Aportes en línea	9496068406	26/12/2025
Erika Tatiana Cano Leal	Aportes en línea	9496959928	26/12/2025
Personal Operativo (oficiales y ayudantes)	Aportes en línea	9496959928	26/12/2025
Contratistas Independientes	Aportes en línea	9496960437	26/12/2025

7.2 Ausencias

7.2.1. Enfermedad General: No se presentaron

7.2.2. Accidente trabajo: No se presentaron

8. ANALISIS SEGURO DE TRABAJO – AST

Los permisos de trabajo son obligatorios en los procesos en los cuales se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea, para ello se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa. Durante el periodo informado, se realizaron tareas o actividades que requirieron tales permisos, los cuales fueron elaborados por las Residente SISO

9. MANEJO AMBIENTAL

9.1 Objetivo

Presentar los avances en la implementación de las medidas ambientales, la gestión de residuos, el cumplimiento normativo y las recomendaciones para minimizar impactos ambientales generados durante las actividades de obra

9.2 Cumplimiento de asistencia a inducción PGA – Rama Judicial

Se asiste a las capacitaciones realizadas por el equipo de la Rama Judicial

9.3 Actividades ejecutadas en el periodo

9.3.1 Manejo de Residuos y Punto ecológico

Se cuenta con varios puntos Ecológicos en cada una de las sedes a intervenir en Palmira, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

- Separación en obra: reciclables (plástico, cartón, metal) y ordinarios

DISPOSICION DE RESIDUOS



9.3.2 Manejo de Escombros

- Acopio en sitio autorizado dentro de la obra
- Transporte y disposición en escombrera autorizada

DISPOSICION DE RESIDUOS Y ESCOMBROS



9.3.3 Manejo de Recurso Hídrico

- Uso eficiente del agua en actividades de limpieza.
- No se presentaron vertimientos no controlados.

9.3.4 Manejo del Recurso atmosférico

- Con Control de emisiones de polvo.

- Horarios de trabajo ajustados para controlar ruido.

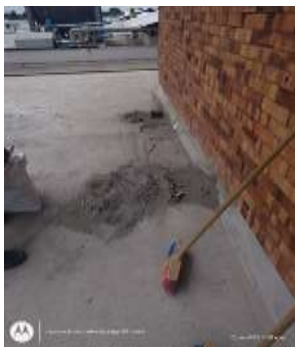
9.3.5 Manejo de Fauna y Flora

- Por tratarse de una zona urbana, no hay vegetación a su alrededor, sin embargo, las sedes están provistas de plantas ornamentales y plantas de jardín que rodean las edificaciones, están han sido debidamente protegidas.
- No se presentaron afectaciones a la fauna local, teniendo en cuenta que se trata de una zona urbana

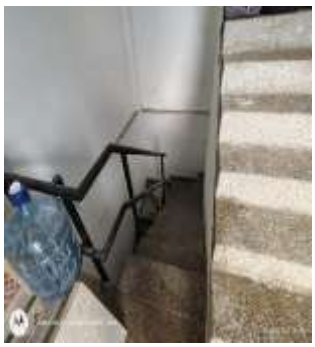
9.3.6 Jornada de aseo

Se realizarán jornadas de aseo y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra.

ASEO







10. CONCLUSIONES

La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio ambiente, se llevó a cabo en cumplimiento de las normas que lo rigen. Durante las labores del presente periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre de 2025, no se produjo ningún incidente o accidente incapacitante o falta, esto se logró con base al cumplimiento de los procedimientos y estándares de seguridad, a las capacitaciones y a la comunicación directa y adecuada que se ha realizado con el personal

11. RECOMENDACIONES

Para dar continuidad al Plan de Manejo Ambiental de obra, se llevarán a cabo las siguientes actividades para las siguientes actividades a iniciar:

- Continuar la coordinación con gestores autorizados para la disposición final de residuos peligrosos y reciclables.
- Mantener las herramientas en buen estado para reducir emisiones de gases contaminantes.
- Restringir actividades ruidosas a horarios laborales de la Entidad que afecten el libre desarrollo de las audiencias
- Almacenar pinturas, solventes, aceites y químicos en áreas ventiladas y con bandejas de retención.
- Contar con fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS) disponibles en la obra.
- Capacitar al personal en manipulación segura de sustancias peligrosas.
- Capacitar al personal en buenas prácticas ambientales

12. ANEXOS

- Planillas de aportes a seguridad social correspondientes al mes de diciembre
- Exámenes de ingreso del personal ingresado en diciembre
- Charlas de seguridad
- Registro de entrega de EPP
- Preoperacionales de herramientas
- Certificados de disposición final de residuos

Cordialmente,



RESIDENTE SISO
ERIKA TATIANA CANO LEAL
C.C. No. 1.002.944.087 de Viterbo (Caldas)
Tecnóloga en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Resolución No. 6120 del 28/10/2019, de la Secretaria de Salud del Atlántico



RESIDENTE AMBENTAL
ANGIE CAMILA AZUERO TORRES
C.C. No. 1.075.309.091 de Neiva
Ingeniera Ambiental MP No. 161021--0557973
Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144181626		GARCIA CARDONA MARIA CLAUDIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 34a # 31-27	TULUA-VALLE	2240424	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,920,000**	**$467,200**			**$2,920,000**	**$365,000**			**$0**	**$0**			**$2,920,000**		**$203,300**		**$0**	**$0**		**$1,035,500**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,920,000**	**$467,200**			**$2,920,000**	**$365,000**			**$0**	**$0**			**$2,920,000**		**$203,300**		**$0**	**$0**		**$1,035,500**
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)																					**$2,920,000**	**$467,200**			**$2,920,000**	**$365,000**			**$0**	**$0**			**$2,920,000**		**$203,300**		**$0**	**$0**		**$1,035,500**
1	CC	1144181626	GARCIA MARIA									X								23030 1	30	$2,920,000	$467,200	EPS018	30	$2,920,000	$365,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,920,000	6.960%	$203,300	0	$0	$0	No	$1,035,500
Total	**Afiliados(1)**																					$2,920,000	$467,200			$2,920,000	$365,000			$0	$0			$2,920,000		$203,300		$0	$0		$1,035,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000001097	9496652389	I	2026/01/08	2025/12/19	BANCO DE BOGOTA	0	$1,035,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$467,200	$0	$0	$467,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$467,200	$0	$0	$467,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$203,300	$0	$0	$203,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$203,300	$0	$0	$203,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$365,000	$0	$0	$365,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$365,000	$0	$0	$365,000
TOTAL				**1**	**$1,035,500**	**$0**	**$0**	**$1,035,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79356655		ROJAS HERNANDEZ JULIO RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 61 F No. 51 B 33 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4783612	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2037499286	9496957804	I	2026/01/15	2025/12/26	BANCO DE BOGOTA	0	$1,600,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$4,270,500**	**$683,300**			**$4,270,500**	**$533,900**			**$4,270,500**	**$85,500**			**$4,270,500**	**$297,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$4,270,500**	**$683,300**			**$4,270,500**	**$533,900**			**$4,270,500**	**$85,500**			**$4,270,500**	**$297,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$4,270,500**	**$683,300**			**$4,270,500**	**$533,900**			**$4,270,500**	**$85,500**			**$4,270,500**	**$297,300**		**$0**	**$0**
1	CC 79356655	ROJAS JULIO	230201	30	$4,270,500	$683,300	EPS008	30	$4,270,500	$533,900	CCF21	30	$4,270,500	$85,500	14-11	30	$4,270,500	$297,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$4,270,500**	**$683,300**			**$4,270,500**	**$533,900**			**$4,270,500**	**$85,500**			**$4,270,500**	**$297,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$683,300	$0	$0	$683,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$683,300	$0	$0	$683,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$297,300	$0	$0	$297,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$297,300	$0	$0	$297,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$85,500	$0	$0	$85,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$85,500	$0	$0	$85,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,900	$0	$0	$533,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$533,900	$0	$0	$533,900
TOTAL				**1**	**$1,600,000**	**$0**	**$0**	**$1,600,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075309091		AZUERO TORRES ANGIE CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 11 # 23-06	NEIVA-HUILA	6638597	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1984255728	9496068406	I	2026/01/23	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$1,035,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075309091	AZUERO ANGIE	230301	30	$2,920,000	$467,200	EPS005	30	$2,920,000	$365,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,920,000	$203,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,920,000	$467,200			$2,920,000	$365,000			$0	$0			$2,920,000	$203,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$467,200	$0	$0	$467,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$467,200	$0	$0	$467,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$203,300	$0	$0	$203,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$203,300	$0	$0	$203,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$365,000	$0	$0	$365,000
SANITAS S.A.	EPS005	800,251,440	6	1	$365,000	$0	$0	$365,000
TOTAL				1	$1,035,500	$0	$0	$1,035,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79356655		JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 61 F NO. 51 B 33 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6012581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2037469573	9496959928	E	2026/01/15	2025/12/26	BANCO DE BOGOTA	0	$5,621,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$5,647,000	$903,600			$7,070,500	$283,000			$7,070,500	$283,000			$7,070,500	$128,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)						$4,223,500	$675,800			$5,647,000	$226,000			$5,647,000	$226,000			$5,647,000	$29,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,223,500	$675,800			$5,647,000	$226,000			$5,647,000	$226,000			$5,647,000	$29,700		$0	$0
1	CC	52015193	ANDRADE MARTHA	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF21	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
2	CC	19304786	ANTURI ANCIZAR		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	52124864	CARDONA INGRID	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
4	CC	79445826	ROJAS RAUL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VALLE DEL CAUCA (12 Afiliados)						$12,781,350	$2,045,500			$13,208,400	$528,800			$13,208,400	$528,800			$13,208,400	$919,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PALMIRA (12 Afiliados)						$12,781,350	$2,045,500			$13,208,400	$528,800			$13,208,400	$528,800			$13,208,400	$919,900		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (12 Afiliados)						$12,781,350	$2,045,500			$13,208,400	$528,800			$13,208,400	$528,800			$13,208,400	$919,900		$0	$0
5	CC	85445927	ARRIETA JHONNY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	11621273	CACERES RODOLFO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1113664324	CACERES URIEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1002944087	CANO ERIKA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF57	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
9	CC	1002422428	LEON ALVARO	230201	19	$901,550	$144,300	EPS002	19	$901,550	$36,100	CCF57	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
10	CC	19769102	LEON EDUARDO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	1019080140	LEON REINALDO	230301	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$38,000	CCF57	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
12	CC	18400006	LONDOÑO DUBERLEY	230301	25	$1,186,250	$189,800	ESSC18	25	$1,186,250	$47,500	CCF57	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
13	CC	94405894	PALACIOS LEONARDO	230301	9	$427,050	$68,400	ESSC18	9	$427,050	$17,100	CCF57	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
14	CC	16650125	PALACIOS RAFAEL		0	$0	$0	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF57	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
15	CC	1113675641	TAMAYO CARLOS	230301	21	$996,450	$159,500	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF57	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
16	CC	1143853811	VALLE DUBEL	230301	9	$427,050	$68,400	ESSC18	9	$427,050	$17,100	CCF57	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
Total	**Afiliados(16)**					$18,428,350	$2,949,100			$20,278,900	$811,800			$20,278,900	$811,800			$20,278,900	$1,048,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,949,100	$0	$0	$2,949,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,893,600	$0	$0	$1,893,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$827,700	$0	$0	$827,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,048,700	$0	$0	$1,048,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,048,700	$0	$0	$1,048,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$811,800	$0	$0	$811,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$283,000	$0	$0	$283,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	12	$528,800	$0	$0	$528,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$811,800	$0	$0	$811,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$226,000	$0	$0	$226,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$81,700	$0	$0	$81,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$152,000	$0	$0	$152,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$17,100	$0	$0	$17,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$335,000	$0	$0	$335,000
TOTAL				**16**	**$5,621,400**	**$0**	**$0**	**$5,621,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79356655		JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 61 F NO. 51 B 33 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6012581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2037483461	9496960437	Y	2026/01/15	2025/12/26	BANCO DE BOGOTA	0	$1,514,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VALLE DEL CAUCA (3 Afiliados)						**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$534,000**			**$0**	**$0**			**$4,270,500**	**$297,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PALMIRA (3 Afiliados)						**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$534,000**			**$0**	**$0**			**$4,270,500**	**$297,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (3 Afiliados)						**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$534,000**			**$0**	**$0**			**$4,270,500**	**$297,300**		**$0**	**$0**
1	CC	1077633443	CACERES JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
2	CC	71277685	CARO ELKIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
3	CC	1020803673	TENORIO GERMAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$534,000**			**$0**	**$0**			**$4,270,500**	**$297,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$0	$297,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300	$0	$0	$297,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$534,000	$0	$0	$534,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$356,000	$0	$0	$356,000
TOTAL				**3**	**$1,514,700**	**$0**	**$0**	**$1,514,700**

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FOR-SI-03
		VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 2

PROYECTO:	PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA	CONTRATISTA	Julio Ricardo Rojas Hernandez.

ACTIVIDAD:	Actividades Varias en General.	FECHA DE SOCIALIZACION	01-12-2025.	No. DEL ATS	/.

HERRAMIENTAS / EQUIPOS: Pala, Palustre, Codal, taladro, Polidora, Martillo,

ELELEMTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: Casco de seguridad, botas de seguridad, Casco de seguridad Guantes de seguridad, gafas de seguridad, Camisa manga larga, Pantalon Jeans, Linea de vida.

PASO A PASO	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIAS DE CONTROL
Traslado de material al area de trabajo.	lumbagos, *Fisico *locativo Mecanicos	lumbagos, ensolaciones, Caida sobre nivel.	Uso de elementos de Protección, Personal
Instalación de estructura metalica en Fachada.	*Fisico, *locativo *meconico * Trabajo en alturas.	ensolaciones, Caidas, Fracturas, golpes, muerte.	Higiene postural, señalización de areas de trabajo.
Instalacion de board en Fachada.	*Fisico *locativo. *Meconico. * Trabajo en alturas	ensolaciones Caidas, Fracturas, muertes.	Uso de elementos de Protección Personal.
Chaseado de Perfileria	* Fisico * locativo.	ensolaciones deshidratación golpes Fracturas Perdida	Uso de elementos de Protección Contra Caidas.
Instalación de tela en terraza.	* Fisico * Quimico * locativo	Parcial de audicion. Alergias, golpes, Fracturas	Uso de EPP. señalización de areas de
Instalación de enchape en baños.	* Fisico * locativo	golpes, Fracturas, ensolaciones Caidas sobre mismo nivel.	trabajo. Caidas, Fracturas Raspones, golpes.
Fraguado de Paredes. en baños.	* Fisico * Quimico * locativo	golpes, Fracturas, Caidas.	Uso de elementos de Protecion Personal.

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FOR-SI-03
		VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 2

PROYECTO:	PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA.	CONTRATISTA	Julio Ricardo Rojas H.		
ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES VARIAS REPETITIVAS.	FECHA DE SOCIALIZACION	09 - 12 - 2025	No. DEL ATS	/

HERRAMIENTAS / EQUIPOS:
Pala, palustre, Pulidora, Taladro, Cortadora de Ceramica, Herramienta de mano.

ELELEMTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL:
Guantes de seguridad, botas de seguridad, Gafas de seguridad, Camisa manga larga, Pantalón Jeans.

PASO A PASO	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIAS DE CONTROL
Instalación de Puertas y ventanas Centro de servicio.	* Fisico * ergonomico * locativo.	* ensolaciones, Cambios de temperatura deficiencia de luz, golpes, Fracturas, Caidas, Perdida Parcial	Uso adecuado de elementos de Protección Personal.
Instalacion Membrana.	* Fisico * locativo.	Auditiva, Fracturas, Caidas, golpes, ensolaciones.	señalización de areas de trabajo.
Pintura en Fachada.	* Fisico * locativo	Perdida auditiva, ensola ciones, Fracturas, Caidas,	uso ole elementos de Proteccion Contra Caidas.
Instalación de seramica en terrazo.	* Fisico * Locativo	golpes, machucones, Horados, Fracturas.	Higiene postural uso de elementos de
Instalación de bard. en Fachada.	* Fisico * locativo. * Trabajo en Alturas.	Alergias, ensdaciones golpes, Fracturas,	Proteccion Personal, señalizacion ole
Aplicación de supermatic. en Paredes.	* Fisico * Quimico * locativo.	*golpes + Fractura lumbagos.	areas de trabajo.
Orden y Aseo en areas ole trabajo.	* Fisico * locativo.		

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FOR-SI-03
		VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 2

PROYECTO:	PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA.	CONTRATISTA	Julio Ricardo Rojas H.

ACTIVIDAD:	Actividades generales	FECHA DE SOCIALIZACION	15-11-25	No. DEL ATS	/

HERRAMIENTAS / EQUIPOS: llana, espatula, taladro, Pulidora, Rodillo, Martillo, Maseta, Andamios, lineas de vida.

ELELEMTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: Arnes de seguridad cuerpo completo, Lieneas de vida. Guantes de seguridad, Casco de seguridad, Gafas de seguridad, eslinga de restriccion.

PASO A PASO	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIAS DE CONTROL
Traslado de material a area de trabajo.	*Lumbagos, *Fisico, *locativo	Lumbagos, Caidas, Fracturas golpes, ensolaciones.	Uso ade cuado de elementos de protecci
Armado de andamios.	* locativo * ergonomico. * Fisico	Caidas, golpes, Fracturas, Lumbagos.	on Personal, delimitacion de area de trabajo
Preparación de estuco listo Para pulida de Paredes.	*Fisico * ergonomico *locativo * Quimico	Alergias, ensolaciones, Cambios de temperatura.	Uso de elementos de Proteccion Personal.
Instalacion de Puerta Corta Fuegos.	* Fisico. * ergonomico. * locativo.	Caidas, Fracturas, Raspones, Lumbagos,	Uso de elementos de Protección Contra Caidas.
Resane. de marco en Puerta Corta Fuego.	* Fisico * Mecanico. * locativo * ergonomico	Caidas, de distinto nivel virus, bacterias, Lumbagos	Uso de elementos de Proteccion Contra Caidas
Pintura en Fachada lateral.	* Caida de distinto nivel * Fisico * locativo. .	Caida de distinto nivel Lumbagos Caidas.	Uso de EPP. Orden y aseo en areas
Instalación de membrana.	* Fisico * Mecanico * locativo	golpes, Fracturas, Lumbagos Caida de distinto nivel.	de trabajo.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-SGSST-01
		VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 1

FECHA 01 - 12 - 2025.				CONSECUTIVO SI	
CONTRATISTA Julio Ricardo Rojas Hernandez.					PROYECTO
TIPO DE EVENTO					Palacio de Justicia Palmira. Roldanillo, Cartago.
Notificación de Riesgo		Charla de 5 minutos	x		DURACION
Reunión de Operaciones		Curso / Taller / Capacitación			
Reinducción		Socialización ATS			5mintos.
Reunión COPASST / Comité		Otros			

DATOS DEL INSTRUCTOR O DIRECTOR DE LA REUNION		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / EMPRESA	FIRMA
Erika Tatiana Cano Leal	Inspector SST	ERIKA CANO.

TEMAS TRATADOS
1. Riesgo Fisico.
2. ¿QUE ES?

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	C.C.	FIRMA
1	Julio Ricardo Rojas Hernandez	Residente	79.356.655	Virtual.
2	Maria Claudia Garcia	Dr Obra	1.144.181.626.	Virtual P. Cartago.
3	Angie Camila Azuero.	Ambiental.	1.075.309.091	Virtual.
4	Jose Zoilo Caceres	OFicial	1.077.663.443.	Zoilo
5	Uriel Antonio Caceres	OFicial.	1.113.664.324	Antonio
6	Rodolfo Caceres.	OFicial.	1.162.1273.	
7	Elkin Dario Caro	soldador.	71277. 685.	Elkin C.
8	Santiago Caicedo.	ayudante.	11.116.802.02.	Santiago C.
9	Cesar Villa.	OFicial.	9.453. 0022.	Cesar villa.
10	Alvaro León Barraza	OFicial.	1.002.422.428.	Alvaro León.
11	Germán Tenorio	Contratista.	1.020.803.673.	
12	Jhonny Ameta.	OFicial	85.495. 927.	Jhonny Ameta.
13	Reinaldo León Barraza.	AUXI.	1.019.080.140.	
14	Eduardo León Barraza	OFicial.	19.769.102.	Eduardo León.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-SGSST-01
		VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 1

FECHA 03 - 12 - 2025				CONSECUTIVO 51.	
CONTRATISTA Julio Ricardo Rojas Hernandez.				PROYECTO	
TIPO DE EVENTO				Palacio de Justicia, Palmira Roldanillo, Cartago.	
Notificación de Riesgo		Charla de 5 minutos	X	DURACION	
Reunión de Operaciones		Curso / Taller / Capacitación			
Reinducción		Socialización ATS		5minutos	
Reunión COPASST / Comité		Otros			

DATOS DEL INSTRUCTOR O DIRECTOR DE LA REUNION		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / EMPRESA	FIRMA
Erika Tatiana Cano L.	Inspector SST.	ErikaCano.

TEMAS TRATADOS
1. Hidratacion y Pausas Activas.
2.

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	C.C.	FIRMA
1	Julio Ricardo Rojas H.	Residente	79.356.655.	Virtual.
2	Maria Claudia Garcia.	Dr Obra.	1.144.181.626.	Virtual P. Roldanillo.
3	Angie Camila Alzuro.	Ambiental.	1075.309.091	Virtual.
4	Jose Zoilo Caceres	OFicial	1.077.633.443	Zoilo
5	Uriel Antonio Caceres	OFicial	1.113.664.324.	Antonio
6	Rodolfo Caceres	Auxiliar.	1.162. 1273.	
7	Elkin Dario Caro	Soldador	71.277.685.	ELKIN CARO
8	Santiago Caicedo	Auxiliar.	11.116.602.02	Santiago C.
9	Cesar Villa	OFicial	9.453. 0022.	Cesar villa.
10	Alvaro Leon Barraza.	OFicial.	1.002.422.428.	Alvaro León
11	German Tenorio	Contratista.	1.020.803.673	
12	Jhonny Arrieta	OFicial.	85.445.927	Jhony Arieta.
13	Reinoldo León Barraza.	Auxiliar	1.019.080.140.	
14	Eduardo Leon Barraza	OFicial	19.764. 102.	Eduardo León.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-SGSST-01
		VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 1

FECHA 05 - 12 - 2025 .				CONSECUTIVO	
CONTRATISTA					PROYECTO
TIPO DE EVENTO					
Notificación de Riesgo		Charla de 5 minutos			
Reunión de Operaciones		Curso / Taller / Capacitación			DURACION
Reinducción		Socialización ATS			
Reunión COPASST / Comité		Otros			

DATOS DEL INSTRUCTOR O DIRECTOR DE LA REUNION		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / EMPRESA	FIRMA
Erika Tatiana Cano Leal.	Inspector SST	Erika Cano.

TEMAS TRATADOS
1. Reporte de Condiciones Insegura!
2.

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	C.C.	FIRMA
1	Jhonny Arrieta	OFicial	85.445.927	
2	ElKin Dario Caro	OFicial.	71.277.685.	- ElKin Caro
3	Zoilo Caceres.	OFICIal.	1.077.633.443	- Zoilo
4	Antonio Caceres.	OFicial	1.113.664.324	-Antonio
5	Rodolfo Caceres	OFicial	11.621.273	-
6	Julio Ricardo Rojas H	Residente.	79.356.655	Virtual.
7	Maria Claudia Garcia.	Dr Obra.	1.144.181.626.	Virtual. P. Cartago.
8	Angie Camila Azuero	Ambiental.	1.075.309.091	Virtual P. Cartago.
9	Santiago Caicedo	Ayudante	11.116.602 02.	Santiago C.
10	Cesar Villa.	OFicial	9.453. 0022.	Cesar villa.
11	Alvaro Leon Barroza.	OFicial.	1.002.422.428.	Alvaro León
12	German Tenorio.	Contratista.	1.020.803.673.	
13	Reinaldo Leon Barroza.	AUXIL.	1.019.080.140.	Reinaldo.
14	Eduardo Leon Barroza.	OFicial.	19.769. 102.	Eduardo

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-SGSST-01
		VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 1

FECHA 08 - 12 - 2025.				CONSECUTIVO 01	
CONTRATISTA Julio Ricardo Rojas Hernandez.					PROYECTO
TIPO DE EVENTO					Palogo de Justicia Palmira Boldanillo, Cartago
Notificación de Riesgo		Charla de 5 minutos	X		
Reunión de Operaciones		Curso / Taller / Capacitación			DURACION
Reinducción		Socialización ATS			
Reunión COPASST / Comité		Otros			5 minutos.

DATOS DEL INSTRUCTOR O DIRECTOR DE LA REUNION		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / EMPRESA	FIRMA
Erika Tatiana Cano Leal	Inspector SST	Erika Cano.

TEMAS TRATADOS
1. Estres laboral y agotamiento.
2.

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	C.C.	FIRMA
1	Julio Ricardo Rojas H	Residente	79.356.655.	Virtual
2	Maria Claudia Garcia	Dr Obra	1.144.181.626.	
3	Angie Camila Azuero	Ambiental.	1.095.309.091	Virtual
4	Jose Pablo Caceres	Oficial	1.077.633.493.	Zoilo.
5	Unel Antonio Caceres	Oficial	1.113.604.324	Antonio.
6	Rodolfo Caceres	Auxiliar	1.162.1273.	
7	Elkin Dario Caro	Soldador	71.277.685.	Elkin CARO
8	Santiago Cuicedo	Auxiliar.	11.116.602.02.	Santiago C.
9	Cesar Villa	Oficial.	9.453.0022.	cesar villa.
10	German Tenorio	Contratista.	1.020.803.673.	
11	Alvaro León Barraza	Oficial.	1.002.422.488.	Alvaro León.
12	Jhonny Arrieta.	Oficial	85.445.927.	
13	Reinaldo León Barraza	Oficial.	1.019.080.140.	
14	Eduardo Leon Barraza	Oficial.	19.769.102.	Eduardo Leon.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-SGSST-01
		VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 1

FECHA	10 - 12 - 2025.			CONSECUTIVO	51
CONTRATISTA	Julio Ricardo Rojas Hernandez.			PROYECTO	
TIPO DE EVENTO				Palacio de Justicia Palmira Cartago Roldanillo.	
Notificación de Riesgo		Charla de 5 minutos	X		
Reunión de Operaciones		Curso / Taller / Capacitación		DURACION	
Reinducción		Socialización ATS	X	5minutos.	
Reunión COPASST / Comité		Otros			

DATOS DEL INSTRUCTOR O DIRECTOR DE LA REUNION		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / EMPRESA	FIRMA
Erika Tatiana Cano Leal	Inspector SST.	Erika Cano.

TEMAS TRATADOS
1. Orden y aseo en areas de trabajo.
2. ¿Que evita?

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	C.C.	FIRMA
1	Julio Ricardo Rojas H.	Residente	79.356.655.	Virtual.
2	Maria Claudia Garcia	Dr Obra.	1.144.181.626.	
3	Angie Camila Azuero.	Ambiental.	1.075.309.091.	Virtual.
4	Jose Zoilo Caceres.	Oficial	1.077.633.443	Zoilo
5	Unel Antonio Caceres	Oficial	1.113.664.324	Antonio
6	Rodolfo Caceres.	Auxiliar	1.162. 1273.	
7	Elkin Dario Caro	Soldador	71. 277. 685.	Elkin Dario
8	Santiago Caicedo.	Auxiliar.	11.116.602.02.	Santiago C.
9	Cesar Villa.	Oficial	9.453. 0022.	Cesar Villa.
10	Alvaro Leon Barraza.	Oficial	1.002. 422.428.	Alvaro León
11				
12				
13				
14				

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-SGSST-01
		VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 1

FECHA 15-12-2025.				CONSECUTIVO	Sí
CONTRATISTA Julio Ricardo Rojas Hernandez.					PROYECTO
TIPO DE EVENTO					Palacio de Justicia Palmira Roldanillo Cartago.
Notificación de Riesgo		Charla de 5 minutos	X		
Reunión de Operaciones		Curso / Taller / Capacitación			DURACION
Reinducción		Socialización ATS			
Reunión COPASST / Comité		Otros			5minutos.

DATOS DEL INSTRUCTOR O DIRECTOR DE LA REUNION		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / EMPRESA	FIRMA
Erika Tatiana Cano Leal	Inspector SST	Erika Cano.

TEMAS TRATADOS
1. Inspección Preoperacional de herramientas.
2.

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	C.C.	FIRMA
1	Rodolfo caceres	Auxiliar	11.621.273.	
2	José Zoilo Caceres.	Oficial	1.077.633.443	Zoilo
3	Unel Antonio Caceres	Oficial	1.113.664.324	Antonio
4	Elkin Dario Caro	Soldador	71.277.685.	Elkin CARO
5	Santiago Caicedo	Auxiliar	11.116.602.02.	Santiago. C.
6	Cesar Villa.	Oficial	9.453.00 22.	Cesar Villa
7	Alvaro León Barraza	Oficial	1.002.422.428.	Alvaro León
8	German Tenorio	Contratista.	1.020.903.673	
9	Jhony Arreta	Oficial	85.445.927.	Jhony Arreta.
10	Julio Ricardo Rojas H	Residente	79.356.655	Virtual
11	Maria Claudia Garcia	Dr Obra	1.144.181.626.	
12	Angie Camila Azuero	Ambiental.	1.075.309.091	Virtual.
13	Reinaldo León Barraza	Auxiliar	1.019.080.190	Reinaldo. L.
14	Eduardo León Barraza	Oficial	19.769.102.	Eduardo León

Powered by CamScanner

RR	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	CODIGO: FOR-SGSST-01 VERSION: 1 PAGINA: 1 DE 1

FECHA 12 - 12 - 2025.				CONSECUTIVO	Si
CONTRATISTA				PROYECTO	
TIPO DE EVENTO				Palacio de Justicia Palmira. Roldanillo, Cartago.	
Notificación de Riesgo		Charla de 5 minutos	X		
Reunión de Operaciones		Curso / Taller / Capacitación		DURACION	
Reinducción		Socialización ATS		5 minutos.	
Reunión COPASST / Comité		Otros			

DATOS DEL INSTRUCTOR O DIRECTOR DE LA REUNION		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / EMPRESA	FIRMA
Erika Tatiana Canoled	Inspector sst	ERIKA Cano.

TEMAS TRATADOS
1. Señalizacion de seguridad en areas de
2. trabajo.

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	C.C.	FIRMA
1	Julio Ricardo Rojas H	Residente	79.356.655	Virtual.
2	Maria Claudia Garcia	Dr Obra	1.144.181.626.	
3	Angie Camila Azuero	Ambiental.	1.075.309.091.	Virtual.
4	German Tenorio	Contratista.	1.020.803.673.	
5	José Zoilo Caceres	OFicial	1.077.633.443.	Zoilo
6	Uriel antonio Caceres	oficial	1.113.664.324	Antonio
7	Rodolfo Caceres	Auxiliar	1.162. 1273.	x
8	Elkin Dario Caro.	Soldador.	71.277. 685.	ELKIN D. CARO
9	Santiago Caicedo	Ayudante.	1.111.660.202.	Santiago C.
10	Cesar Villa	Oficial	9.453.0022	Cesar Villa.
11	Alvaro León Barraza	OFicial.	1.002.422.428.	Alvaro León
12	German Tenorio	Contratista.	1.020.803.673.	
13	Reinaldo León Barraza.	Auxiliar	1.019.080.140	Reinaldo León.
14	Eduardo León Barraza.	Oficial	19.769.102.	Eduardo León.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-SGSST-01
		VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 1

FECHA 17-12-2025.				CONSECUTIVO	Si.
CONTRATISTA Julio Ricardo Rojas Hernandez.					PROYECTO
TIPO DE EVENTO					Palacio de Justicia Palmira Boldanillo, Cartago.
Notificación de Riesgo		Charla de 5 minutos	✓		DURACION
Reunión de Operaciones		Curso / Taller / Capacitación			
Reinducción		Socialización ATS			5minutos
Reunión COPASST / Comité		Otros			

DATOS DEL INSTRUCTOR O DIRECTOR DE LA REUNION		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / EMPRESA	FIRMA
Erika Tatiana Cano Leal	Inspector SST	Erika Cano.

TEMAS TRATADOS
1. Procedimientos seguros de trabajo.
2. Conciencia Ambiental.

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	C.C.	FIRMA
1	Antonio Caceres	Oficial	1.113.664.324	Antonio
2	Rodolfo caceres	Auxiliar	11.621.273.	*
3	José zoilo Caceres	Oficial.	1.077.633.443.	Zoilo
4	Elkin Dano Cano	Soldador	71.277.685	Elkin Cano
5	Santiago Caicedo	Auxiliar.	1.111.660.202	Santiago. C.
6	Cesar villa.	Oficial.	94.530.022	Cesar villa.
7	Alvaro León Barraza	Oficial	1.002.422.428.	Alvaro León.
8	German Tenorio	Contratista.	1.020.803.673.	
9	Jhony Arrieta	Oficial	85.445.927	Jhony Arrieta.
10	Reinaldo Barraza	Auxiliar.	1.019.080.140	Reinaldo.
11	Eduardo León Barraza.	Oficial	19.769.102.	Eduardo León.
12	Julio Ricardo Rojas H	Residente	79.356.655.	Virtual.
13	Maria Claudia Garcia	Dr Obra.	1.144.181.626.	
14	Angie Camila Aguero	Ambiental	1.075.309.091	Virtual.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE EPP

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO		DUBERLEY JONDOÑO.			
CARGO	Oficial	CÉDULA	18.400.006.	PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA.
FECHA DE ENTREGA	DECRIPCIÓN DE EPP	CANTIDAD	OBSERVACIONES		FIRMA DE EMPLEADO
05-12-25	Guantes seguridad	1 Par			DUBERLEY Londoño.
12-12-25	Guantes seguridar	1 Par.			DUBERLEY Londoño.

Yo Duberley Londoño identificado(a) con C.C. 18.400.006. hago constancia que he recibido la inducción en salud ocupacional y seguridad industrial. Me considero que estoy capacitado (a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las normas de salud ocupacional y seguridad industrial, y a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de salud ocupacional la necesidad de reposición o cambio de ellos. Igualmente a informar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo, de igual manera me comprometo a velar y salvaguardar mi entorno medio ambiental en miras de la conservación del mismo.

Powered by CamScanner

Powered by CS C

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE EPP

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO		Carlos Alfredo Tamayo Rivas			
CARGO	Obrilior.	CÉDULA	1.113.675.641	PROYECTO	Palacio de Justicia.
FECHA DE ENTREGA	DECRIPCIÓN DE EPP	CANTIDAD	OBSERVACIONES		FIRMA DE EMPLEADO
12-12-25.	Guantes de seguridad	1 par.			Carlos Tamayo.
23-12-25	Guantes de seguridad	1 Par.			Carlos Tamayo.

Yo Carlos Tamayo identificado(a) con C.C. 1.113.675.641. hago constancia que he recibido la inducción en salud ocupacional y seguridad industrial. Me considero que estoy capacitado (a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las normas de salud ocupacional y seguridad industrial, y a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de salud ocupacional la necesidad de reposición o cambio de ellos. Igualmente a informar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo, de igual manera me comprometo a velar y salvaguardar mi entorno medio ambiental en miras de la conservación del mismo.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE EPP

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO		Alvaro Leon Barraza.			
CARGO	Oficial	CÉDULA	1.002.422.428.	PROYECTO	Palacio de Justicia
FECHA DE ENTREGA	DECRIPCIÓN DE EPP	CANTIDAD	OBSERVACIONES		FIRMA DE EMPLEADO
04-12-25	Guantes de seguridad	1 Par.			ALVARO León
12-12-25	Guantes de seguridad	1 Par.			Alvaro León

Yo Alvaro León B identificado(a) con C.C. 1.002.422.428 hago constancia que he recibido la inducción en salud ocupacional y seguridad industrial. Me considero que estoy capacitado (a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las normas de salud ocupacional y seguridad industrial, y a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de salud ocupacional la necesidad de reposición o cambio de ellos. Igualmente a informar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo, de igual manera me comprometo a velar y salvaguardar mi entorno medio ambiental en miras de la conservación del mismo.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE EPP

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO		Eduardo José León.			
CARGO	Oficial	CÉDULA	19.769.102	PROYECTO	Palacio de Justicia.
FECHA DE ENTREGA	DECRIPCIÓN DE EPP	CANTIDAD	OBSERVACIONES		FIRMA DE EMPLEADO
05-12-25.	Guantes de Seguridad	1 par			Eduardo León
12-12-25.	Guantes de seguridad.	1 Par.			Eduardo León.

Yo Eduardo León identificado(a) con C.C. 19.769.102. hago constancia que he recibido la inducción en salud ocupacional y seguridad industrial. Me considero que estoy capacitado (a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las normas de salud ocupacional y seguridad industrial, y a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de salud ocupacional la necesidad de reposición o cambio de ellos. Igualmente a informar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo, de igual manera me comprometo a velar y salvaguardar mi entorno medio ambiental en miras de la conservación del mismo.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE EPP

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO		Reinaldo León.			
CARGO	Auxiliar.	CÉDULA	1.019.080.140	PROYECTO	Palacio de Justicia

FECHA DE ENTREGA	DECRIPCIÓN DE EPP	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FIRMA DE EMPLEADO
05-12-25.	Guantes de seguridad	1 Par		
12-12-25.	Guantes de seguridad	1 Par		

Yo_____ identificado(a) con C.C._____ hago constancia que he recibido la Inducción en salud ocupacional y seguridad industrial. Me considero que estoy capacitado (a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las normas de salud ocupacional y seguridad industrial, y a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de salud ocupacional la necesidad de reposición o cambio de ellos. Igualmente a informar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo, de igual manera me comprometo a velar y salvaguardar mi entorno medio ambiental en miras de la conservación del mismo.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: FOR-SI 02 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 de 1

Resolución 4272 de 2021, Artículo 15. Permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el Permiso de trabajo o sus anexos.

Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañado de una lista de chequeo, más aún en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución.

1. DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Empresa Persona: Julio Ricardo Rojas.	Ciudad: Palmira Valle del Cauca.	Lugar de Trabajo: Fachada.	
Área/Proceso: Fachada.	Sede donde se realiza el trabajo: Sede Judicial Familia	Vigencia del Permiso: 1 dia	
Fecha del Trabajo (dd/mm/aaaa): 10-12-2025.	Hora de Inicio (a.m./p.m.): 8:00 AM.	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 PM.	

Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma
1.113.664.324	Antonio Caceres	SI	OFICIAL.	SI.	Antonio
1.077.633.443	José Zoilo Caceres	SI	OFICIAL	SI	Zoilo

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Tipos de trabajos en alturas a realizar: Instalacion de Cielo RASO. en Fachada.

Herramientas a utilizar: Taladro, Martillo, Flexometro, board.

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 2.00 mts.

3. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamio ☑	Escalera ☐	Elevador de Personal o Grúa con canasta ☐	Se involucran otras Trabajo Alto Riesgo TAR:	SI ☐ No ☑	Espacio Confinados ☐	Trabajo en caliente ☐	Energías Peligrosas ☐
Otros (¿Cuáles?)				Otras (¿Cuáles?)				

Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:

Línea de vida vertical	SI ☑ No ☐	Eslinga de posicionamiento	SI ☐ No ☐	Sistemas de anclaje	SI ☐ No ☐	Arnés de cuerpo entero	SI ☑ No ☐	Guantes	SI ☑ No ☐
Línea de vida horizontal	SI ☐ No ☐	Eslinga	SI ☑ No ☐	Casco con barboquejo	SI ☑ No ☐	Señalización del área	SI ☑ No ☐	Gafas	SI ☑ No ☐

Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuales?)

Casco Dieléctrico ☐	Guantes ☑	Protección Arco Eléctrico ☐	Equipos de comunicación		
Monogafas Seguridad ☐	Botas Dieléctricas ☐	Peto Carnaza ☐			
Prot. Auditiva ☐	Botas de Seguridad ☑	Kit Guantes Dieléctricos ☐			
Mercmatic ☐	Ropa de Trabajo ☐	Cuerda Protectora ☐	Equipo de rescate		
Respirador ☐	Otros ☐				
Equi. Protecc. Respiratoria. ☐					

Otros:

ITEM	SI	No	N/A	ITEM	SI	No	N/A
Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST)	✓			Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.			✓
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	✓			Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.			✓
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea.	✓			Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.			
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.	✓			Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	✓		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados.	✓			El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse.	✓		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar.	✓			El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	✓		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente.	✓			Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.	✓		
Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso.	✓			Están operando los frenos de las ruedas de los andamios	✓		
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.	✓			Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio.			
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.			✓	Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta.			
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.		✓		Los andamios se encuentran asegurados cada tres secciones.			
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.			✓	Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.			
Las cuerdas se encuentran libres de nudos.	✓			Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.			
Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	✓						

Nombre y Cedula del Supervisor	Firma
Erika Tatiana Cano CC: 1002.944.087 Nombre y firma de persona Autorizada Coordinador Alturas	Erika Cano
Erika Tatiana Cano CC: 1002.944.087 Nombre, apellido y firma del coordinador de trabajos en alturas (cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo).	Erika Cano

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

Cuando se designe un vigilante de seguridad como medida de prevención dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta designación.

Powered by CamScanner

RR	**PERMISO PARA TRABAJO ESPECIAL - P.T.E**	**CODIGO:** FOR-SI-02 **VERSION:** 1 **PAGINA:** 1 DE 3

LOS SIGUIENTES TIPOS DE TRABAJO ESTAN CUBIERTOS POR ESTE PERMISO DE TRABAJO ESPECIAL

Valido solamente cuando este firmado por el profesional autorizado, Este permiso debe ser emitido antes de iniciar el trabajo especial y debe ser cerrado inmediatamente concluye el trabajo o al final del turno en que fue emitido.

CONTRATISTA: Julio Ricardo Rojas Hernandez.

P.T.E. No. 2. **FECHA** 15-12-2025. **ATS No.** —

PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA **Área:** FACHADA.

Inicio: 8:00 AM. **Valido hasta las:** 5:00 PM.

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Pintura sobre Fachada Lateral.

Este permiso certifica que yo como Responsable del Trabajo, personalmente completé una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados en **CAIDA EN ALTURAS, COLISION DE OBJETOS, FUEGO / EXPLOSIÓN, CHOQUE ELECTRICO Y TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS,** y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los Equipos y elementos de Protección Personal recomendados en los procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que indique en el reverso de este permiso, yo como Responsable del trabajo me aseguré que el personal designado conozca las exigencias de seguridad para protección ante accidente y/o lesión que comprometa el personal relacionado con este trabajo y fueron adecuadamente entrenado para saber qué hacer ante una **EMERGENCIA.**

FIRMA DE RESPONSABLES DE APERTURA DEL PERMISO

Responsable del Trabajo: **Maestro General** _____ **FIRMA:** _____

Responsable del Área: **Arquitecto y/o Ingeniero** _____ **FIRMA:** _____

Funcionario que aprueba: **Inspector SST** Erika Tatiana Cano Leal **FIRMA:** ERIKA CANO.

	S	N
¿El trabajo arriba descrito termino satisfactoriamente?	✓	
¿El trabajo arriba descrito NO finalizo en este periodo?		—
¿El área y equipos cubiertos por el PTE está liberado?		—

FIRMA DE RESPONSABLES DEL CIERRE DEL PERMISO

Responsable del Trabajo: **Maestro General** _____ **FIRMA:** _____

Funcionario que aprueba: **Inspector SISO** Erika Tatiana Cano Leal **FIRMA:** ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

RR	**PERMISO PARA TRABAJO ESPECIAL - P.T.E**	**CODIGO:** FOR-SI-02 **VERSION:** 1 **PAGINA:** 2 DE 3

LOS SIGUIENTES TIPOS DE TRABAJO ESTAN CUBIERTOS POR ESTE PERMISO DE TRABAJO ESPECIAL

Las precauciones para cada tipo de trabajo especial, están verificadas en el formulario. (Asegúrese que estén incluidas todas las precauciones para cada riesgo).

- [ ] 1 **Trabajo Elevado** – Todos los trabajos en andamios y/ plataformas temporales, escaleras de tijera, elevadas que excedan los 1.5 m sobre el nivel del suelo, con excepción de trabajo de rutina sobre plataforma con guardacuerpos.
- [ ] 2 **Uso de grúas móviles y similares**
- [ ] 3 **Excavación Manual** excediendo los 1.2 m de propiedad y todos los trabajos, de excavaciones mecanizadas
- [ ] 4 **Trabajo con Soplete** (arco o gas)
- [x] 5 **Otras** (Explique) Trabajo sobre tabla suspendida

1. PROTECCION PARA TRABAJOS ELEVADOS

S	N	N/A	PFRECAUCIONES EXIGIDAS
		/	Escaleras inspeccionadas antes de usar
		/	Escaleras debidamente apoyadas y niveladas
			☐ Asegurada arriba ☐ Asegurada abajo
		/	Andamios inspeccionados en buenas condiciones (andamios y tablones)
		/	Área de trabajo aislada y señalizada con cuerda o cinta y placas de aviso
		/	Herramientas y otros equipos colocados en forma segura
			EQUIPOS ENTREGADOS
/			Arnés de seguridad tipo paracaídas
/			Cuerda / eslinga de seguridad y traba de caídas, con absorción de choque
/			Casco de barbuqueo
/			Guantes
/			Monogafas
			Otros (explicar)

2. PROTECCION CONTRA INCENDIO / EXPLOSION

S	N	N/A	PRECAUCIONES EXIGIDAS
		/	Materiales combustibles retirados (papeles, solventes, maderas, etc.)
		/	Recipientes con liquido o gas infamable retirados o en un sitio seguro
		/	Retirada de cilindros con carga (llenos)
			BRIGADISTA DESIGNADO
		/	Nombre: _____
		/	Otros (explicar)
			EQUIPOS ENTREGADOS
			Extintor portátil de incendio / Tipo
		/	CO2 Capacidad
		/	POS Capacidad

3. PROTECCION CONTRA CHOQUE ELECTRICO

S	N	N/A	PRECAUCIONES EXIGIDAS
		/	Suministro de energia desconectado, bloqueado, y etiquetado
		/	Verificación circuito de voltaje en cero
/		/	Inspección de herramientas electricas y cables de extención
		/	Espacio libre (3,7 metros) de líneas / conductores electricos
			EQUIPOS ENTREGADOS
		/	Guantes de caucho aislante y cuero aprobados

4. PROTECCION EN GRUAS MOVILES

S	N	N/A	PFRECAUCIONES EXIGIDAS
		/	Grúas inspeccionadas antes de uso
		/	Brazos soportados
		/	Grúas niveladas
		/	Espacio libre de 3,7 metros de líneas de verificados
		/	Barrera instalada
			OBSERVADOR DE SEGURIDAD DESIGNADO
		/	Nombre: _____
		/	Reunión previa para discusión del trabajo
		/	Carga / levantamiento
		/	Cuerdas-Guayas. Grilletes inspeccionadas antes de uso

5. EXCAVACIONES EXCEDIENDO 1,50 metros

S	N	N/A	PFRECAUCIONES EXIGIDAS
		/	Paredes de excavación sostenidas o derrumbadas
		/	Verificado el retiro de
		/	Colocación de barreras, colombinas, cinta de seguridad (para señalizar área)
		/	Colocación de medios de salida (escalera o peldaños)
		/	Área iluminada adecuadamente
		/	Removida tierra o materiales de la orilla de la excavación

6. EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCION INDIVIDUAL

Ropas y equipamientos de protección individual

S	N	N/A	PRECAUCIONES EXIGIDAS
/			Casco de segruridad
/			Monogafas
/			Tapa oidos
/			Protección Respiratoria
/			Protección Facial
		/	Ropa para soldador (delantal, Mangas, etc.)
/			Botas de Seguridad
/			Guantes
		/	Otros (explicar)

7. OTROS - EXPLICAR

Powered by CamScanner

	PERMISO PARA TRABAJO ESPECIAL - P.T.E	CODIGO: FOR-SI-02 VERSION: 1 PAGINA: 3 DE 3

FIRMA EJECUTANTES

Trabajador Ejecutante:	Jhong Arrieta	**FIRMA:**	Jhong Arrieta
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	
Trabajador Ejecutante:		**FIRMA:**	

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA: 15 (dd) 12 (mm) 2025 HORA: desde(00:00) 8:00 hasta (es)

PROYECTO: Palacio de Justicia, sede Judicial Familia CONTRATISTA: Julio Ricardo Rojas

ÁREA O LUGAR: Terraza. Nº PERSONAS EJECUTORAS: 1.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Soldadura de perfiles.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Soldador Flexometro Rodillo, brocha

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?			✓
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	✓		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	✓		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	✓		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	✓		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	✓		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	✓		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	✓		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?	✓		
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?	✓		
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?	✓		
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?	✓		

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de camaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	✓		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	✓	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	✓	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [ ] NO [✓]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [✓]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [✓]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

NOMBRE Erika Tatiana Cano Leal. CC 1.002.944.087.

FIRMA Erika Cano.

EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
15-12-25	Elkin Dario Caro.	71.777.675	Elkin Caro
/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	FORMATO: "PREOPERACIONAL MAQUINA PARA SOLDAR"	

Area: Terraza.	**Numero Interno:** /
Inspeccion relizada Por: Erika Tatiana Cano Leal	**Modelo:** 2012.
Semana de inspeccion del Dia 15 **a D** 20 **del Mes** Dic **del An** 2025.	**Marca:** Boch.

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	B		B		B		B		B		B			
Estado de los soportes del motor	B		B		B		B		B		B			/
Estado del motor de arranque	B		B		B		B		B		B			/
Estado del alternador	B		B		B		B		B		B			/
Estado de tanque de combustible	B		B		B		B		B		B			
Estado del generador	B		B		B		B		B		B			
Estado del Sistema elèctrico	B		B		B		B		B		B			/
Estado del switch de encendido.	B		B		B		B		B		B			/
Niveles de aceite	B		B		B		B		B		B			/
Estado de conexiones electricas	B		B		B		B		B		B			/
Estado varilla puesta a tierra	B		B		B		B		B		B			
Estado de la bateria	B		B		B		B		B		B			
Niveles de agua del radiador	B		B		B		B		B		B			
Estado del exhosto	B		B		B		B		B		B			/
Estado de las llantas	B		B		B		B		B		B			/
Estado del dispositivo de tiro	B		B		B		B		B		B			/
Estado de las compuertas laterales	B		B		B		B		B		B			
Estado tomas de salidas de 110 y 220 AC.	B		B		B		B		B		B			
Estado de correas del motor	B		B		B		B		B		B			/
Estado de correas del alternador	B		B		B		B		B		B			/
Estado indicadores (horometro -temperatura)	B		B		B		B		B		B		/	
VoBo Supervisor y/o Ing Residente:	ERikaC		ERikaC		ERikaC		ERikaC		ERikaC		ERikaC		—	

Nombres y Apellidos: Erika Tatiana Cano Leal.

OBSERVACIONES :

Inspección y mantenimiento. Regular.

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S	Descripcion	Responsable	Firma

C = Correccion S = Seguimiento

Responsable de Acciones Correctivas:	Firma:
Nombre y Apellido	

* Escriba toda especificacion que requiera aclarar en el espacio **Observaciones**

** Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.

Powered by CamScanner

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Nombre de la sede de trabajo: PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA.									**Fecha de la inspección**	**DD**	**MM**	**AA**	
Ciudad: PALMIRA			**Departamento:** VALLE DEL CAUCA.							15	12	2025.	
Responsable de la inspección:									**Cargo:**				
N°	**Tipo**	**Capacidad**	**Fecha Ultima Recarga**	**Ubicación**	**Manometro**	**Altura (1,5 m)**	**Boquilla**	**Manija**	**Señaliación**	**Pintura**	**Pin de seguridad**	**Manguera**	
1	ABC	10 Lbrs	10/11/25	Pasillo.	B.	B	B	B	B	B	B	N/A.	
2	ABC	20 Lbrs	10/11/25	Ingreso	B	B	B	B	B	B	B	B.	
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Diligenciado por: Erika Tatiana Cano Leal.

Estado: Indicar las caracteristicas de los elementos con C: Cumple, NC: No Cumple o Na: No Aplica

TIPO: ABC , CO2 y SOLKAFLAM.

CAPACIDAD: 10 LB, 15 LB, 20 LB, 30 LB, 150 LB y 3.700 GR

Powered by CamScanner

RR	**INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES**	**CODIGO:** FOR-SI-13 **VERSION:** 1 **PAGINA:** 1 DE 1

PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

SEMANA DEL 01 **DE** DIC **DE** 2025 **AL** 06 **DE** DIC **DE** 2025.

DESCRIPCION HERRAMIENTA			DIA DE INSPECCION													
HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento		B		B		B		B		B		B			
Cincel	Cabeza de hongo		B		B		B		B		B		B			
	Punta		B		B		B		B		B		B			
Segueta	Hoja		B		B		B		B		B		B			
	Marco		B		B		B		B		B		B			
Extensiones eléctricas	Clavijas		B		B		B		B		B		B			
	Estado de cables (encauchetado)		B		B		B		B		B		B.			
Machetes	Funda		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Revisar mango		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A.			
Carretillas	Llantas		B		B		B		B		B		B			
	Ejes		B		B		B		B		B		B			
	Chasis y mangos		B		B		B		B		B		B			
Picas	Cabo		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Palas			B		B		B		B		B		B.			
Martillo de bola	Mango		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Martillo de uña			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Destornillador			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Hombre solo	Estado General		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Barras			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Serrucho			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Limas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Llaves expansivas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Llaves mixtas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Llaves para tubo			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Tijeras			B		B		B		B		B		B.			

	ACTIVIDAD CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA EJECUCION	FECHA REVISION
1				
2				
3				
4				

ELABORADO POR		REVISION POR	
CARGO	Oficial.	CARGO	Inspector SST.
NOMBRE	Antonio Caceres.	NOMBRE	Erika Tatiana Cano Leal
FIRMA	Antonio	FIRMA	ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	**CODIGO:** FOR-SI-13 **VERSION:** 1 **PAGINA:** 1 DE 1

PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA.

SEMANA DEL 09 **DE** DIC **DE** 2025. **AL** 13 **DE** DIC **DE** 2025.

DESCRIPCION HERRAMIENTA			DIA DE INSPECCION													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
HERRAMIENTA	REVISION	CANT	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento			/	B		B		B		B		B			
Cincel	Cabeza de hongo			/	B		B		B		B		B			
	Punta			/	B		B		B		B		B			
Segueta	Hoja			/	B		B		B		B		B			
	Marco			/	B		B		B		B		B			
Extensiones eléctricas	Clavijas			/	B		B		B		B		B			
	Estado de cables (encauchetado)			/	B		B		B		B		B			
Machetes	Funda			/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Revisar mango			/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Carretillas	Llantas			/	B		B		B		B		B			
	Ejes			/	B		B		B		B		B			
	Chasis y mangos			/	B		B		B		B		B			
Picas	Cabo			/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A.			
Palas				/	B		B		B		B		B.			
Martillo de bola	Mango			/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Martillo de uña				/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Destornillador				/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Hombre solo	Estado General			/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Barras				/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Serrucho				/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Limas				/	N/A		N/A.		N/A		N/A		N/A.			
Llaves expansivas				/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Llaves mixtas				/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Llaves para tubo				/	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Tijeras				/	B		B		B		B		B.			

ACTIVIDAD CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA EJECUCION	FECHA REVISION
1				
2				
3				
4				

ELABORADO POR		REVISION POR	
CARGO	Oficial.	CARGO	Inspector SST.
NOMBRE	Antonio Cacere	NOMBRE	Erika Tatiana Cano Leal
FIRMA	Antonio	FIRMA	ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

RR	**INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES**	**CODIGO:** FOR-SI-13 **VERSION:** 1 **PAGINA:** 1 DE 1

PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA.

SEMANA DEL 15 **DE** 2012 **DE** DIC **AL** 20 **DE** DIC **DE** 2015

DESCRIPCION HERRAMIENTA			DIA DE INSPECCION													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
HERRAMIENTA	REVISION	CANT	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento		B		B		B		B		B		B			
Cincel	Cabeza de hongo		B		B		B		B		B		B			
	Punta		B		B		B		B		B		B			
Segueta	Hoja		B		B		B		B		B		B			
	Marco		B		B		B		B		B		B			
Extensiones eléctricas	Clavijas		B		B		B		B		B		B			
	Estado de cables (encauchetado)		B		B		B		B		B		B			
Machetes	Funda		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Revisar mango		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Carretillas	Llantas		B		B		B		B		B		B			
	Ejes		B		B		B		B		B		B			
	Chasis y mangos		B		B		B		B		B		B			
Picas	Cabo		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Palas			B		B		B		B		B		B			
Martillo de bola	Mango		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Martillo de uña			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Destornillador			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Hombre solo	Estado General		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Barras			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Serrucho			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Limas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Llaves expansivas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Llaves mixtas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Llaves para tubo			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Tijeras			B		B		B		B		B		B			

	ACTIVIDAD CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA EJECUCION	FECHA REVISION
1				
2				
3				
4				

ELABORADO POR		REVISION POR	
CARGO	INSPECTOR SST.	CARGO	Inspector, SST.
NOMBRE	ERIKA TATIANA CANO.	NOMBRE	Erika Tatiana Cano Leal
FIRMA	ERIKA CANO.	FIRMA	ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ ARQUITECTO		CODIGO: FOR-SI 09
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 9 al 13 Mes Dic.	ÁREA:	Terraza.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Erika Tatiana Cano L.	GRUPO DE TRABAJO:	

REALIZA INSPECCION PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☑ O PULIDORA DE MANO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)		/	B		B		B		B		B			/
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)		/	B		B		B		B		B		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS		/	B		B		B		B		B		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			B		B		B		B		B		/	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			B		B		B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA		/	B		B		B		B		B		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM		/	B		B		B		B		B		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA		/	B		B		B		B		B		/	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)		/	B		B		B		B		B		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA			B		B		B		B		B		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		B		B		B		B		B		/	
ESTADO DEL DISCO			B		B		B		B		B			

DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			B		B		B		B		B		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)		/	B		B		B		B		B		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS		/	B		B		B		B		B		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO		/	B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO		/	B		B		B		B		B			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN		/	B		B		B		B		B		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA		/	B		B		B		B		B		/	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)		/	B		B		B		B		B		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR		/	B		B		B		B		B		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS		/	B		B		B		B		B		/	
ESTADO DE LAS BROCAS			B		B		B		B		B			

OBSERVACIONES

Jhony Ames		Erika Cano
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

		CODIGO: FOR-SI 09
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 15 al 20 Mes DIC.	ÁREA:	Terraza.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Erika Tatiana Cano L.	GRUPO DE TRABAJO:	

REALIZA INSPECCION PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☑ O PULIDORA DE MANO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	B		B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL DISCO	B		B		B		B		B		B			
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	B		B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	B		B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE LAS BROCAS	B		B		B		B		B		B.			

OBSERVACIONES

2010	Jose Fonlo Caceres	ERIKA CANO.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	**CODIGO:** FOR-SI-08 **VERSION:** 1 **PAGINA:** 1 DE 1

OBRA: PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA.	DD	MM	AA
	01	12	2025

ASPECTOS A EVALUAR				
ARNES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Arnés en general	✓			
Estado de las hebillas	✓			
Estado del anillo en D de la espalda	✓			
Estado del anillo en D de la cadena (si hay)	✓			
Estado de la hebilla de correas de muslos	✓			
Estado de la pieza plástica de la espalda	✓			
Estado de la trabilla	✓			
Estado de las correas de los hombros	✓			
Estado de las correas de los muslos	✓			
Estado de las correas subpélvicas	✓			
Estado de las costuras de extremos de correas de hombros	✓			
Estado de las costuras de extremos de correas subpélvica	✓			

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS				
	ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECA**	**FECHA EJEC.**
1				
2				
3				

ASPECTOS A EVALUAR				
ESLINGAS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Se encuentra en buen estado de limpieza	✓			
Ganchos o mosquetones limpios	✓			
Sistema retráctil funciona correctamente	✓			
Posee etiqueta	✓			
La etiqueta es legible	✓			
SISTEMA DE ANCLAJE	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Se encuentra en buen estado de limpieza	✓			
SE observa deterioro y/o desgaste evidente	✓			

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS				
	ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**	**FECHA EJEC.**
1				
2				
3				

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas, la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del equipo.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno

ELABORADO POR		**REVISION DE CIERRE POR**	
CARGO	Oficial	**CARGO**	Inspector SST
NOMBRE	Jhonny Arneles.	**NOMBRE**	Erika Tatiana Cano Leal
FIRMA		**FIRMA**	ERIKA CANO

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	**CODIGO:** FOR-SI-08 **VERSION:** 1 **PAGINA:** 1 DE 1

OBRA: Sede Judicial Familia.	DD	MM	AA
	09	12	2025

ASPECTOS A EVALUAR				
ARNES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Arnés en general	✓			
Estado de las hebillas	✓			
Estado del anillo en D de la espalda	✓			
Estado del anillo en D de la cadena (si hay)	✓			
Estado de la hebilla de correas de muslos	✓			
Estado de la pieza plástica de la espalda	✓			
Estado de la trabilla	✓			
Estado de las correas de los hombros	✓			
Estado de las correas de los muslos	✓			
Estado de las correas subpélvicas	✓			
Estado de las costuras de extremos de correas de hombros	✓			
Estado de las costuras de extremos de correas subpélvica	✓			

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS				
	ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECA**	**FECHA EJEC.**
1				
2				
3				

ASPECTOS A EVALUAR				
ESLINGAS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Se encuentra en buen estado de limpieza	✓			
Ganchos o mosquetones limpios	✓			
Sistema retráctil funciona correctamente	✓			
Posee etiqueta	✓			
La etiqueta es legible	✓			
SISTEMA DE ANCLAJE	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Se encuentra en buen estado de limpieza	✓			
SE observa deterioro y/o desgaste evidente	✓			

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS				
	ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**	**FECHA EJEC.**
1				
2				
3				

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas, la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del equipo.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno

ELABORADO POR		**REVISION DE CIERRE POR**	
CARGO	Oficial	**CARGO**	Inspector SST.
NOMBRE	José Zoilo Caceres.	**NOMBRE**	Erika Tatiana Cano Leal
FIRMA	Zoilo	**FIRMA**	ErikaCano.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	**CODIGO:** FOR-SI-08 **VERSION:** 1 **PAGINA:** 1 DE 1

OBRA: PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA.

DD	MM	AA
15	12	2025

ASPECTOS A EVALUAR				
ARNES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Amés en general	✓			
Estado de las hebillas	✓			
Estado del anillo en D de la espalda	✓			
Estado del anillo en D de la cadena (si hay)	✓			
Estado de la hebilla de correas de muslos	✓			
Estado de la pieza plástica de la espalda	✓			
Estado de la trabilla	✓			
Estado de las correas de los hombros	✓			
Estado de las correas de los muslos	✓			
Estado de las correas subpélvicas	✓			
Estado de las costuras de extremos de correas de hombros	✓			
Estado de las costuras de extremos de correas subpélvica	✓			

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS				
	ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECA**	**FECHA EJEC.**
1				
2				
3				

ASPECTOS A EVALUAR				
ESLINGAS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Se encuentra en buen estado de limpieza	✓			
Ganchos o mosquetones limpios	✓			
Sistema retráctil funciona correctamente	✓			
Posee etiqueta	✓			
La etiqueta es legible	✓			
SISTEMA DE ANCLAJE	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Se encuentra en buen estado de limpieza	✓			
SE observa deterioro y/o desgaste evidente	✓			

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS				
	ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**	**FECHA EJEC.**
1				
2				
3				

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas, la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del equipo.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno

ELABORADO POR		REVISION DE CIERRE POR	
CARGO	Oficial	**CARGO**	Inspector sst.
NOMBRE	Antonio Caceres	**NOMBRE**	Erica Tatiana Cano Leal
FIRMA	Antonio	**FIRMA**	ERIKA CANO

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PERSONAL OFRECIDO EN PROCESOS DE INTERVENCION DE INMUEBLES

Contrato N. 064-2025	Informe N.	5	Fecha	30/12/25

Servicio	Perfil	Cargo	Cantidad	Dedicación (%)	Experiencia General	Nombre completo	C.C	EPS	ARL	PENSIÓN	PLANILLA No.	DIAS	1/12/25	2/12/25	3/12/25	4/12/25	5/12/25	6/12/25	7/12/25	8/12/25	9/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25	13/12/25	14/12/25	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25	20/12/25	21/12/25	22/12/25	23/12/25	24/12/25	25/12/25	26/12/25	27/12/25	28/12/25	29/12/25	30/12/25	31/12/25	OBSERVACIONES
	Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto con Maestría en Ingeniería. debidamente acreditado por el Consejo profesional según corresponda, quien ejercerá como Director de Obra, con dedicación del 100%. Con experiencia general Mínimo cinco (5) años en el ejercicio de su profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, con experiencia específica: Demostrar participación como director de obra en un contrato con intervención en infraestructuras pública que supere el 40% de los M2 del inmueble a Intervenir, deberá Dirigir, Programar, Administrar la obra, asistir a los comités de obra, presentar informes de avance de las obras y demás funciones propias del cargo	Director de Obrta	1	100% distribuido en todos los inmuebles	5 años	MARÍA CLAUDIA GARCÍA CARDONA	1.144.181.626	SOS	SURA	PORVENIR	9496652389	23	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				X	X		
	Un (1) Arquitecto y/o ingeniero civil, quien ejercerá como Residente, con dedicación del 100%. Con experiencia general mínima de 5 años contados a partir de la expedición de su matrícula COPNIA, con experiencia específica: Demostrar participación como residente de obra en un contrato con intervención en infraestructuras catalogada como bien patrimonial que supere el 40% de los M2 del inmueble a Intervenir, deberá Supervisar las actividades de obra, dirigir personal a cargo y demás funciones que le designe el director de obra. Velar por la ejecución de la obra, asistir a los comités de obra, apoyar la elaboración de informes de ejecución, hacer el acompañamiento en las respectivas visitas programadas para mostrar avances y otras funciones propias del cargo, brindar los conceptos técnicos respecto las labores de intervención	Residente de obra	1	100% distribuido en todos los inmuebles	5 años	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	79.356.655	COMPENSAR	SURA	PROTECCION	9496957804	26	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				X	X		
	Un (1) Profesional o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el trabajo, quien ejercerá como SISO, con dedicación del 100%. Con experiencia general mínima de 3 años contados a partir de la expedición de su Licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo expedida por el ministerio de Salud o secretaria Departamental de Salud según corresponda, Curso de Coordinador de Trabajo en Alturas, con experiencia específica: Demostrar participación como Residente SST en mínimo un contrato con intervención en infraestructuras públicas que supere el 20% de los M2 del inmueble a Intervenir, deberá realizar el Levantamiento de matriz de riesgo Señalización y demarcación de áreas de trabajo. Acompañamiento en las labores, verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial. Realizar la verificación e inspección de los elementos a utilizar en trabajo de alturas. Realizar pausas activas Verificación de afiliaciones seguridad social y ARL del personal. Implementación de plan de gestión ambiental y entrega final del mismos y demás labores propias de la profesión.	SISO	1	100% durante la ejecución de toda la obra en todos los inmuebles	3 años	ERIKA TATIANA CANO LEAL	1.002.944.087	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	9496999928	24	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				X	X		
	Un (1) Ingeniero Ambiental con especialización en gerencia ambiental y desarrollo sostenible, quien ejercerá como AMBIENTAL, con dedicación del 100%, quien deberá Demostrar participación como Residente ambiental en mínimo un contrato con intervención en infraestructuras públicas que supere el 10% de los M2 del inmueble a Intervenir. Quien liderara todo lo relacionado con la caracterización, implementación y cumplimiento de la normatividad ambiental. Entregará los respectivos informes y soportes.	Ambiental	1	100% durante la ejecución de actividades de esta índole		ANGIE CAMILA AZUERO TORRES	1.075.309.091	SURA	SANITAS	PORVENIR	9496957804	18	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X		X							
						RAUL ALFONSO ROJAS HERNANDEZ	79.445.826	COMPENSAR	SURA	PROTECCION	9496999928	21	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X		X				X	X		
						ELKIN DARIO CARO ESTRADA	71.277.685	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCION	9496960437	25	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				X	X		
						JOSE ZOILO CACERES IBARGUEN	1.077.633.443	SOS	SURA	PORVENIR	9496960437	24	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X		X				X	X		
						RODOLFO CACERES IBARGUEN	11.621.273	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	9496999928	23	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X		X				X	X		
						URIEL ANTONIO CACERES IBARGUEN	1.113.664.324	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	9496999928	23	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X		X				X	X		
						GERMAN ALONSO TENORIO NAVARRO	1.020.803.673	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCION	9496960437	24	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				X	X		
						ALVARO LEON BARRAZA	1.002.422.428	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCION	9496999928	17	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X															Retiro 19/12 por culminación de actividades contratadas
						EDUARDO JOSE LEON BARRAZA	19.769.102	SALUD TOTAL	SURA	COLFONDOS	9496999928	23	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X				X	X		
						JHONNY EVER ARRIETA BERROCAL	85.445.927	FAMISANAR	SURA	PROTECCION	9496999928	24	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				X	X		
						REINALDO LEON BARRAZA	1.019.080.140	FAMISANAR	SURA	PORVENIR	9496999928	18	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X															Retiro 20/12 por culminación de actividades contratadas
						DUBERLEY LONDOÑO SANCHEZ	18.400.006	EMSSANAR	SURA	PORVENIR	9496999928	18						X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				X			
						CARLOS ALFREDO TAMAYO RIVAS	1.113.675.641	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	9496999928	15										X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				X			
						RAFAEL PALACIOS CAICEDO	16.650.125	NUEVA EPS	SURA	NO OBLIGADO POR EDAD	9496999928	6																					X	X	X		X				X	X		
						LEONARDO PALACIOS CAICEDO	94.405.894	EMSSANAR	SURA	PORVENIR	9496999928	6																					X	X	X		X				X	X		
						DUBEL HERNEY VALLE VASQUEZ	1.143.853.811	EMSSANAR	SURA	PORVENIR	9496999928	6																					X	X	X		X				X	X		
													4	4	4	4	4	3	2	0	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	4	3	1	4	4	4	0	4	0	0	3	3	0	

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
Representante Legal

30-NOV-2025
DIA DOMINGO No se laboro.

Residente.

01-DIC-2025
Se comienza actividades a las 8:am, Se termina la embaquillada en Muros y pisos de baño Mujeres, el Meson de Marmol. llega a la obra, se estan terminando la estructura y soportes para la instalación del Meson, se realiza la instalación del Meson en Marmol. personal en obra, 2 oficiales, 1 pintor, 1 ayudante.

res.obra.

02-DIC-2025
Se inician actividades a las 8:am, se continua con detalles y armado de refuerzo para soporte del Meson en Marmol baño Mujeres, se instalan los lavamanos en Meson, se realiza la prueba Hidraulica, y de desagüe de los lavamanos, funcionando en perfecto estado. personal en obra 1 oficial, 2 pintores, 1 ayudante.

res. obra.

03-DIC-2025
se inicia actividades a las 8:am, se termina de detallar todo lo referente a la instalación de urinales, se instala Divisiones de Aluminio en urinales, tambien se comienza con la instalación de los ba-

visiones y puertas de aluminio en baños de hombres y baños de Mujeres. personal en obra 2 oficiales, 1 pintor, 1 ayudante, 3 instaladores de carpintería aluminio.

Resd. obra.

04-Dic-2025

Se realiza todos los detalles pendiente, de embaquillada, pintura tanto en Muros como en cielo raso, se termina la instalación de Divisiones y puertas en aluminio baño de Mujeres en baños de hombres queda pendiente la actividad por terminar de divisiones de baño por falta de Material que se quedo en bodega en la ciudad de palmira, solo quedaria pendiente la instalación de la puerta que este en proceso de Construcción, tambien se aplica Umillo en Hoja de acceso a baños esta actividad no esta contemplada en el presupuesto pero en aras de Mejorar visualmente la entrada a los baños se aplica, como solo queda pendiente lo Mencionado anteriormente se retira el personal que Consta de 2 oficiales, 1 pintor, 1 ayudante y 3 instaladores de aluminio, ya que la obra en el resto de actividades Quedo ejecutada al 100%, tan pronto suministren la puerta nos desplazaremos a realizar la instalación de esta y de igual Manera la parte de Aluminio que falto, Se Me informa que la Supervisor realizara una visita al sitio de la obra, la cual se Queda pendiente para atender los observaciones pertinentes, cabe

destacar que los sitios donde se realice intervenciones queden totalmente limpios.

res. obra

05-DIC-2025
NO hay personal en obra ya que se esta esperando la entrega de la hoja de la puerta para realizar la instalacion de esta y lo pendiente de aluminio.

res. obra.

06-DIC-2025
se continua esperando la entrega de la hoja de la puerta.

res. obra.

07-DIC-2025
Se continua a la espera de la entrega de la puerta.

res. obra

08-DIC-2025
Se continua a la espera de la hoja de la puerta.

09-DIC-2025
se continua a la espera de la puerta, se recibe observaciones por parte de la supervision del contrato las cuales

Seren tenidas en cuenta para subsanar el dios de la instalación de la puerta

res. obra

10-DIC-2025

Se inician actividades a las 8:am el Maestro de obra llego a realizar los arreglos de las observaciones echas por la Supervisión

res. obra.

11-DIC-2025

Se inicias actividades a las 8:am se continua con los detalles de acuerdo a las observaciones echas por la interventoría, se llega a la obra con el Material y personal para ejecutar la instalación de la Carpintería de aluminio que habia quedado pendiente en baño hombres, tambien se realiza la instalacion de Marco y puerta en baños de Mujeres (puerta en Madera Maciza) Se instalan 4 espejos 3 en baños de Mujeres y 1 en baño de hombres, terminado la Jornada se termina todos los detalles observados por la supervision, al igual que la instalacion de la puerta, se le hace entrega al señor Jose encargado de coordinar todo el contrato por parte de la rama Judicial, las zonas intervenidas quedan habilitadas y totalmente limpias, ye queda atento a cualquier otra observacion siempre y cuando sea reportada a los actividades que se ejecutaron en este frente.

res. obra.

01-DIC-2025
Se inician actividades a las 7:am.
Se Continua con los acabados en los baños de Mujeres, Pintura y remates de enchapes. Personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

Ves. obra

02-DIC-2025
Se inician actividades a las 7:am, se comienza a realizar el raspado de Muro en bodega donde esta el fisuramiento, tambien se Continua dando acabado a los Muros de baños Mujeres. personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

Ves. obra.

03-DIC-2025
Se inician actividades a las 7:am.
Se Continua con la actividad de reparación en Muro de bodega, se continua con los acabados en Muros de baños Mujeres. personal en obra. 1 oficial, 1 ayudante.

Ves. obra.

04-DIC-2025
se inician actividades a las 7:am
se Continua con los acabados en Muro de baño de Mujeres, se realizan los Ganchos para la reparación de Muro en bodega se fijan con epoxico, esta actividad no esta contemplada en el presupuesto

opical, se tomara como un imprevisto, tambien se realiza la actividad de arreglo en Muro de un juzgado, una vez colocados la cremallera de los ganchos de Refuerzo en Muros de bodega se procede a repellar. personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

res. obra.

05-DIC-2025

Se inician actividades a las 7:am, se realiza actividad de cambio de tablones en Mal estado en pasillos, se le da acabado al remate de los postes en Madera en los dados, tambien se continua con resanes en Muro de juzgado, tambien se cuenta con el recorte para la adecuación del Meson de Marmol, tambien se continua con remates en Muros de baños de Mujeres. Personal en obra 1 oficial, 1 ayudante, 1 dirct. obra.

res. obra.

06-DIC-2025

Se inica actividades a las 7:am, se instalan los orinales faltantes por instalar, se le da acabado total a los Muros de los baños y de la reparación que se hizo en la bodega, se realiza la fundida de una tapa que se partio y hay que reemplazarla, personal en obra 1 oficial, 1 Ayudante.

res. obra.

07-DIC-2025 (DIA DOMINGO).
Se inicia actividades a las 7:am, se hace recorrido por la totalidad de la obra detallando todas las actividades, enclapes, pintura, parte electrica, parte Sanitaria, verificando que todo este funcionando, se realiza evacuación de escombros dejado el sitio de acopio limpio, tambien se detalla los 8 pasos en Madera instalados, personal en Obra 1 Oficial, 1 ayudante, 1 res. de obra.

Resd. obra.

08-DIC-2025
DIA lunes festivo No se labora.

Resd. obra.

09-DIC-2025
Se recibi visita a obra por parte de la Supervision del Contrato Se realizaron algunas observaciones de acabados la cual Se tomo nota para atender a la Menor brevedad.

Resi. obra.

10-DIC-2025
Se programa la IDa Nuevamente a palacio con el fin de subsanar todas las observaciones realizadas por la supervision, Se programa para el dia

viernes dos q que entrejen la escalera gato certificada para llevarla e instalarla al igual que el pendiente de la Carpintería de Aluminio (puertas baño de Mujeres)

Res. obra.

11-Dic-2025
No se laboro.

Res. obra.

12-Dic-2025
Se inicia actividades 7:am, Se comienza con la instalación de la escalera gato certificada, tambien se realiza la instalación de baranda en zona de tanques de agua, tambien se realiza instalacion de los puertas de aluminio en baño de Mujeres, se realizar la totalidad de todas las observaciones echas por la Supervision, se instala la totalidad de los espejos en los baños, todas las actividades quedan terminadas eceptuando la carpintería Madera 2 puertas que se instalaran el dia Sabado 13 de Dic. los paste que son 8 quedan pendiente por instalar ya que se les estadando tiempo para su secado y asi evitar futuras fisuras y deformaciones. personal en obra, 2 oficiales, 1 pintor, 3 instaladors de carpintería aluminio, un instalador de escalera certificada. Residente, se trabajo hasta las 10 PM.

Res. obra.

13-DIC-2025
Se inica actividad a las 9:am se Realiza la instalación de los dos puertes en Madera en baño de discapacitados y baño publicos, con sus respectivos chapas, la única actividad pendiente es la instalación de los 8 Postes en Madera. Mientras se sigue secando en bodega taller. personal en obra 1 Carpintero.

Residente obra.

14-DIC-2025
DIA DOMINGO NO se Labora.

15-DIC-2025
No hay personal en obra ya que la unica actividad pendiente por ejecutar es el Suministro y la instalación de postes en patio central, la cual se realizara una vez la Madera este lo Mayor posible seca antes de que termine el contrato.

16-DIC-2025
No hay personal en obra, pendiente la instalación de postes en Madera, se encuentran en el taller en el proceso de secado.

15-Dic-2025
Se continua a la espera del secado de los postes en Madera, para poder realizar su respectiva instalación.

16-Dic-2025

Se continua a la espera del secado de los postes en Madera para su respectiva instalación.

17-Dic-2025

Se continua con el secado de los postes de Madera en taller.

18-Dic-2025

Se continua con el secado de los postes en Madera en taller.

19-Dic-2025

Se continua con secado de postes en taller.

20-Dic-2025
Se continua en taller secado de postes en Madera para su instalación.

resid. obra

21-Dic-2025
Se continua con el secado de poste en Madera en taller.

res. obra.

22-Dic-2025
Se continua a la espera del secado de los postes en taller para proceder una vez secos a su instalación.

Resl. obra.

23-Dic-2025
Se continua a la espera del secado de los postes en Madera para proceder a su instalación.

24-Dic-2025
Se continua con secado en taller de los postes en Madera.

res. obra

25-Dic-2025
Se continua con secado en taller de los 8 postes de Madera.

res. obra.

Powered by CamScanner

26-DIC-2025
Se continua con los 8 postes en taller en su secado para luego instalar.

res. obra.

27-DIC-2025
Se continua con el secado de los postes en taller.

res. obra.

28-DIC-2025
Se continua con secado de postes de Madera en taller.

res obra.

29-DIC-2025
Se continua con secado de postes en taller

30-DIC-2025
Se continua con secado de postes en Madera en taller para luego proceder a su respectiva instalación.


res obra

31-DIC-2025
Se realiza inspección al taller para revisar el secado de la Madera (postes) es recomendable dejar otros días Mas para el secado.

res. obra.

Powered by CamScanner


NOVEDADES: Sin Novedades.
OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

*  ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA (DOMINGO) 30-NOV-2025
Charla de seguridad Día lluvioso.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 2:00 PM.
* Aplicación de SIKA Permalastick
* Instalación de tela sobre Producto SIKA PERMALASTICK.
* Aplicación de nueva Producto SIKA PERMALASTICK.
* Aplicación de granito.
NOVEDADES: Se detienen Actividades de aplicacion de SIKA Permalastick. por lluvia, ~~se~~ a las 9:28: AM. y se reanuda nuevamente la actividad a las 10:04 AM.
OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 Residente, 1 SST.

*  ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 01-DIC-2025
Hora de Inicio: Día Soleado
Hora de Fin: Charla de seguridad.
* Instalación de platinas en losa para impermeabilizacion.
* aplicacion de Producto sika permalastick.
* Instalación de tela.
* Aplicación de granito.
* apertura Con polidora de Canal Para Cifon.
* aplicacion de Cemento en Canal Para Cifón.
* Instalacion de tela Para impermeabilización losa.
NOVEDADES: Sin novedades.
OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente. 1 Ambiental.

*  ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 02 - DIC - 2025.

Hora Inicio: 8:00 AM. Dia Lluvioso

Hora Fin: 5:00 PM. Charla de seguridad.

* Descargue de material ladrillos.
* Descargue de Arena en lote.
* adecuación y retira de impermeabilizante en area de Comedor.
* Trazo de medidas para Instalación de ladrillos.
* Sacado de Puntos con mezcla para fundicion de area de Comedores.
* Instalacion de malla electrosoldada para fundición.

NOVEDADES: No se realizan actividades en terraza de terminación de aplicación de sika Permalastick y postura de tela para Continuación de impermeabilizado. Por lluvias. las Cuales Inician a las 8:00 AM. y no sesan del todo, lo que hace que impida la aplicacion y postura de lo antes mencionado.

OPERATIVOS: 5 Oficiales, 1 Auxiliar, 1 soldador, 1 SST, 1 Dr obra 1 Residente, 1 Ambiental.

* ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 03 - DIC - 2025.

Hora de Inicio: 8:00 AM. Dias Soleado.

Hora de Fin: 5:00 PM. Charla de seguridad.

* Preparación de mezcla para fundición area Comedor.
* Fundición de area para Comedor.
* detallado con codal sobre Cemento para aplicacion de mineral.
* aplicacion de mineral.
* Instalación de tela para Impermeabilizacion de losa en terraza.

NOVEDADES: Sin novedades.

OPERATIVOS: 5 oficiales, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Ambiental. 1. Residente

* ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 04 - NOV - 2025
Hora de inicio: 8:00 AM. Charlas de Seguridad
Hora de Fin: 5:00 PM. Día Soleado
* Chaseado de Perfiles para membrana.
* Refuerzo de estructura metalica Para Fachado
* Instalación de tela en losa terraza.
* Abertura de regatas para instalación de tuberia hidraulica.
* Instalación de tuberias hidraulicas en regatas antes. abiertas.
NOVEDADES1: Se suspenden actividades a las 11:00 AM. de: Chaseado de Perfiles para membrana, Refuerzos de estructura metalica en Fachada, y apertura de regatas en baño discapacitado por audiencia en juzgado octavo Penal Circuito, los operativos que quedan suspendidos de esta actividad son: 3 oficiales y 1 Ayudante. se inician nuevamente las actividades antes descritas. a las 12:00 PM:
* Retiro de basura en sentro de acopio en el lote.
* descargué de puerta contra Fuego. Acopio Sotano.
* Retiro de grava del area para Comedor hacia el Lote.
NOVEDAD 2: Se suspende actividad en terraza de. Chaseado de Perfiles Para membrana a las 2:15 PM Por Eucaristia, Operativos que quedan suspendidos: 1 Oficial, 1 Auxiliar, Se suspenden actividades a las 4:00 PM Por Formación Actividades General Operac
Estas Paras de actividades nos estan afectando en la Programación dispuesta Para la ejecución de estas, ya que incluso en los ultimos días ya estado llueve bastante afectando de igualmanera las actividades que estamos realizando tanto en Fachada Como en Terraza.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 05-DIC-2025.

Charla de seguridad y salud en el trabajo.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Adecuación de piedras y materias ore donde esta el comedor.
* Retiro de piedra del lado siguiente para adecuación de medidas en area de comedor.
* Chaseado de perfileria para instalación de tela y membrana.
* aplicación de sobre piso en baños discapacitados
* aplicación de SIKA Permalastick en canilera y Piedra.
* instalación de tela en losa para adecuacion de membrana.
* Aplicación de estuco en muros del centro de servicio
* Retiro de basura de lote.

NOVEDAD 1: se suspenden actividades en terraza de Chaseado de perfileria para membrana. y refuerzo de estructura metalica en Fachada, a las: 9:10 AM, por audiencias en el juzgado 5 penal municipal, operativos. 2 Oficiales. y 1 Auxiliar,
se inician nuevamente actividades a la 1:30 PM.
* Demolición de pasillo
* Aplicacion de sobre piso en baños discapacitados.

OPERATIVOS: 6 Oficiales, 2 auxiliares, 1 Contratista, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr obra, 1 Ambiental.

os.

* ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 06- DIC -2025
* Día Soleado. Charla de Seguridad
Hora Inicio: 8:00 AM.
Hora Fin:
* Continuación de demolición Pasillo.
* Cubrimiento de pie de puerta en auditorio.
* Orden y aseo are de demolición Pasillo.
* Retiro de Ventanas y marcos de Ventanas en Centro de servicios.
* Demolicion de muro oficina en Centro de servicios.
* Retiro de escombro y orden y aseo Centro de ser vicios.
* Preparación de mezcla para Instalación de ladrillos Pacillos.
* Instalación de estructura metalica en techo de baños. discapacitados y enfermeria.
* adecuación de redes electricas en Centro de servicios.
* Aseguramiento de estructura metalica en Fachada lateral.
NOVEDADES: Sin Novedades.
OPERATIVOS: 6 oficiales, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Residente, 1 Dr obra, 1 Ambiental, 1 Contratista.

* ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. Domingo 07- DIC - 2025
Día soleado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 4:00 PM.
* Fundición segunda area para Comedor.
* Tapado para techo en baño discapacitados.
* Orden y aseo en areas de trabajo
* Aseguramiento de estructura metalica en Fachada
* NOVEDADES: Sin Novedades.
OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 Auxiliar, 1 Residente.

* ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA Lunes Festivo 08-DIC-2025.

* Día: Soleado.
Hora de Inicio: 9:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Orden y aseo areas de Trabajo
* Fundición area Comedor.
* Pega de enchape. en baño discapacitados.
*
*

NOVEDADES: Sin NOVEDADES.
OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 Auxiliar, 1 Residente de obra.

* ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 09-DIC-2025.
Dia Soleado. Charla de seguridad.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Refuerzo de estructura metalica en Fachada
* Chaseado de Perfiles para Instalación de membrana.
* Enchape en en baño discapacitados.
NOVEDADES 1: Se suspenden actividades en terraza de Chaseado de perfiles para Instalacion de membrana. Y Chaseado de estructura metalica de Fachada., Por audiencia en el juzgado 8 penal circuito, a la Hora: 10:00 AM, Operativos 2 Oficiales, 2 auxiliares.
* Refuerzo de Perfileria metalica para techo en baño discapacitado y enfermeria.
NOVEDAD 2: Se suspenden actividades en baño discapacitados y enfermeria, de la actividad Refuerzo de estructura metalica "Perfileria" Por audiencia. en el juzgado tercero penal Circuito, Hora: 1:30 pm
3 Oficiales.
OPERATIVOS: 09 Oficiales, 03 Auxiliares, 1 Contratista, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

* ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 10 - DIC - 2025.

Día soleado. Charla de seguridad

Hora Inicio: 8:00 AM.

Hora Fin:

* Chaseado de estructura metalica en Fachada.
* Chaseado de perfileria Para Instalación de membrana.
* masillado y lijado en Centro de servicios de muros.
* enchape de Piso,
* Corte de enchape Para Pisos.

NOVEDADES: * Se suspenden actividades de Chaseado de estructura metalica en Fachada, Por audiencia en el Juzgado 6 Penal municipal.

Hora de Pare de Actividades: 8:10 AM.

OPERATIVOS: 2 Oficiales, 1 Auxiliar.

* Se suspenden Actividades de masillado y lijado en Area Centro de Servicio.

Hora de Pare de Actividades: 8:23 AM.

Hora de Inicio Actividades: No se inician Actividades.

OPERATIVOS: 3 Oficiales 1 Auxiliar

* Se suspenden actividades en baño discapacitados de Corte de Ceramica Por audiencia en el juzgado 8 Penal municipal.

Hora de Pare de Actividades: 9:20 AM.

Hora de Inicio Actividades:

OPERATIVOS: 2 Oficiales, 1 Auxiliar.

OPERATIVOS: Oficiales 09, 05 auxiliares, 1 soldador, 1 SST. 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

*

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES EN OBRA. 11- DIC- 2025.

* Día Soleado
* Charlas de seguridad.
* Hora de Inicio: 8:00 AM.
* Hora de Fin: 6:00 PM.
* Chaseado de estructura metalica en Fachada.
* Chaseado de Perfileria para Instalación de membrana.
* Armado de andamios.
* Fraguo en enchape baño discapacitados.
* Orden y ase en area de trabajo.
* Instalación de seperboard en Fachada.

NOVEDADES: se suspenden Actividades de Chaseado de Perfiles para Instalacion de membrana.
Hora: 9:40 AM.
OPERATIVOS: 1 OFicial, 1 Ayudante.

* se suspenden Actividades de Refuerzo de estructura metalica en Fachada.
Hora: 9:40 AM.
Operativos: 2 OFICIALES, 1 Ayudante,
*Por audiencia en juzgado 6 Penal municipal.
*Se Inicia nuevamente Actividades a las 2:00 PM.
*OPERATIVOS: 09 OFICIALES, 03 AUXILIARES, 1 soldador, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO

ACTIVIDADES DE OBRA 12- DIC- 2025.

Dia Soleado
Charla de seguridad.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 6:00 PM
* Chaseado de Perfiles Para Instalación de membrana.
* Chaseado de refuerzos para estructura metalica en Fachada.
* Cate de Ceramica en baños.

NOVEDADES: Se suspenden Actividades de Instalación de Perfiles para Refuerzo de estructura metalica en Fachada.

Powered by CamScanner

* Chaseado de perfiles para instalación de membrana.
* Corte de Ceramica para terminación de enchape baños.

Por audencia en sala #1 juzgado 8 penal municipal Circuito.
Hora: 9:04 AM.
OPERATIVOS PARADOS DE ACTIVIDAD: 5 Oficiales y 3 Auxiliares.
* Hora de Reinicio de Actividades Antes mencionadas: 2:18: PM.
OPERATIVOS: 09 OFICIALES, 3 auxiliales 1 soldador, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Residente, 1 Contratista.
*

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 13 - DIC - 2025.
Dia Soleado Pausas: Activas.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 3:00 PM.
* Instalación de baterias sanitarias
* Instalación de lavamanos.
* demolición de Concreto en area de Comedor.
* Instalación de superboard en Fachada.
* Instalación de Refuerzos para estructura metalica.
* Retiro de escombro y traslado a lote.
* Chaseado de Perfileria para Instalacion de membrana.
NOVEDADES: Sin novedades.
OPERATIVOS: 09 OFICIALES, 3 auxiliares, 1 soldador, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Ambiental, 1 Residente, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. Domingo 14 - DIC - 2025.
* Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 3:00 PM.
* Pega de board sobre Fachada.
* Chaseado de perfiles para Instalación de membrana.
* Armado de Andamios.
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 5 OFICIALES, 3 Ayudantes, 1 Residente.

ERIKA Cano

ACTIVIDADES DE OBRA. 15 - DIC - 2025

* Dia parcialmente nublado
* Charla de seguridad
* Hora de Inicio: 8:00 AM.
* Hora de Fin: 5:00 pm.
* Instalación de estructura metalica en Fachada
* Instalación de perfileria para Instalacion de membrana.
* Instalación de baterias Sanitarias y lavamanos en baño discapacitados.

NOVEDADES: se suspenden actividades en terraza de Instalacion de estructura metalica en Fachada y Chaseado de perfiles para Instalación de membrana. por audiencia en juzgado 8 penal circuito.
Hora: 9:40 AM.

OPERATIVOS: 4 oficiales, 3 Auxiliares.

OPERATIVOS: 09 Oficiales, 3 auxiliares, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Contratista.

Erika Cano.

ACTIVIDADES DE OBRA 16 - DIC - 2025

Hora INICIO: 8:00 AM. Charla de seguridad.

Hora Fin:

* Ijado de Paredes y cielo de baños discapacitados y enfermeria.
* Instalación de espejo. en baño discapacitados.
* descargue de cemento en lote.
* Chaseado de Perfiles para Instalación de membrana.
* Descargue de membrana.
* Pega de ladrillos para adecuación de Comedor.
* Instalación de estructura metdica en Fachada.
* Refuerzos de estructura metalica en Fachada.
* Instalación de eterboard en Fachada.
* Armado de Andamios. Pintura de baños y enfermeria.

SIN NOVEDADES.

OPERATIVOS: 09 Oficiales, 3 auxiliares, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Resid 1 Ambiental.

ERIKA CANO

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 17 - DIC - 2025

Charla de seguridad Dia soleado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 7:00 PM.
* Desistalación de Puerta Corta Fuegos en sotano.
* Instalación de Nueva Puerta cortafuegos.
* Instalación y adecuación de tomas y swich. en Centro de servicios.
* Instalacion de manto.
* Instalación de tela. para el manto.
* sellado de manto Con Calor.
* Instalación de malla electro soldado Area Para Comedor.
* Instalación de dilataciones en Fachada.
*

SIN NOVEDADES.
OPERATIVOS: 9 Oficiales, 3 auxiliares, 1 Contratista, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA Cano.

ACTIVIDADES DE OBRA 18 - DIC - 2025.

Charla de seguridad Dia soleado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 7:00 pm.
* Pintura en puertas de. Baño discapacitado y enfermeria.
* Resane de marco de puerta CortaFuegos.
* sobrepiso en terraza.
* Instalación de manto.
* sellado de manto Con Calor.
(SIN) * Aplicado de masilla en Fachada.
* Instalación de enchape Cominadero terraza.
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 9 Oficiales, 3 auxiliares, 1 Contratista, 1 SST, 1 Residente 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA Cano.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 19 - DIC - 2025.

Hora de Inicio: 8:00 AM. Charla de Seguridad

Hora de Fin: 7:30 PM.

* Pintura de Puerta y marco para baño discapacitados y enfermeria.
* Resane de marco de puerta Corta Fuego. Zona interna y externa.
* Fundición de Caminadero en terraza.
* Resane Con Supermastick. en Fachada
* Orden y aseo en baño discapacitado y enfermeria.
* Instalacion de monto, Descargue de material

SIN NOVEDADES: Sesuspenden Actividades a las 3:05 Por lluvia.

OPERATIVOS: 09 Oficiales, 3 auxiliares, 1 Contratista, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Residente, 1 Dr Obra,

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 20 - DIC - 2025

Hora de Inicio: 8:00 AM.

Hora de Fin:

NOVEDADES: No se pueden Realizar Actividades en terraza Por lluvia Hora: 8:13 AM.

Se inicia nuvamente actividades en terraza a las 10:00 AM.

* Instalacion de membrana.
* Pintura en Fachada.
* Pintura de Pasamanos.
* Instalacion de tela para Instalacion de membrana.

SIN MÁS NOVEDADES.

OPERATIVOS: 09 Oficiales, 3 auxiliares, 1 Contratista, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental,

ERIKA CANO

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA. DOMINGO - 21 - DIC - 2025

Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 3:00 PM.

* Pintura en muros Centro de servicio
* Instalacion de marcos de Ventanas y ventana en Centro de servicios.
* Instalacion de marcos de puerta y Puerta en Centro de servicio.
* Terminación de aplicado de Pintura en Fachada.

SIN NOVEDADES.

OPERATIVOS: 05 OFICIALES, 3 auxiliares, 1 Contratista, 1 Residente.

ERIKA Cano.

ACTIVIDADES DE OBRA 22 - DIC - 2025.

Hora de Inicio: 8:00 AM
Hora de Fin: 5:00 pm.

* Retiro de andamios.
* Pintura en Sotana amarillo y negro pared.
* Pintura en borde de Fachada.
* Instalación de tela para membrana
* Repello para Instalacion de baldosa.
* Pega de baldosa en Caminadero.

SIN NOVEDADES.

OPERATIVOS: 06 OFICIALES, 3 ayudantes, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental,

ERIKA Cano.

ACTIVIDADES DE OBRA 23 - DIC - 2025.

Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Fin: 5:00 pm.

* Descargue de trompo.
* Mezcla de urena Cemento y triturado.
* Fundicion Para area de Comedor.
* Traslado de membrana.
* Aplicacion de mineral area para Comedor.

Powered by CamScanner

* Realización de Figuras en Piso area Comedor.
* Retiro de basura Lote.
* Repello Para Instalacion de enchape.
* Descargue de arena y cemento.
* Terminacion de Pintura en Fachada.

* NOVEDADES: No se realizan actividades en Fachada por no autorizacion Ingre
OPERATIVOS: 07 Oficiales, 3 ayudantes, 1 SST, 1 Or Obra, 1 Resident
1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 24- DIC - 2025.
Hora Inicio: 8:00 AM.
Hora Fin. 5:00 PM.
NOVEDAD: * Se suspenden Actividades Generales en Terraza Por lluvia 8:30. 06 oficiales 2 ayudantes.
* Inicio de actividades 9:12 AM.
* Orden y aseo en areas de trabajo.
* Enchape de Caminadero.
* Aplicacion de silicona Ventanas Fachada.
* Instalación de membrana.
OPERATIVOS: 07 Oficiales, 3 ayudantes, 1 SST, 1 Or Obra, 1 Residente
1 Ambiental.

ERIKA CANO.

25 - Dic - 2025.
"NO se realizarón Actividades"

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 26 - Dic - 2025.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin:
* Instalación de enchape.
Instalación de membrana.

Powered by CamScanner

* Instalación de Cinta impermeabilizante en borde de Fachada.
* Terminación de detalles en Centro de Servicios.
* NOVEDADES: No se realizan actividades en Fachada por no autorizacion de Ingr
OPERATIVOS: 05 oficiales, 3 auxiliares, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Ob
1 Ambiental,

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 27 - DIC - 2025.
Charla de seguridad
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 3:00 PM.
* Instalación de enchape Caminadero.
* Instalacion de tela para membrana.
* Terminación de remates en membrana terraza Zona izquierda
* Aplicación de boquilla.
* NOVEDADES. No se realizan actividades en fachada por no autorizacion Ingr
OPERATIVOS: 05 oficiales, 03 ayudantes, 1 sst, 1 Residente,
1 Ambiental, 1 Dr Obra.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES OBRA Domingo 28 - DIC - 2025.
Hora de Inicio: 8:00 AM
Hora de Fin:
* Corte e Instalación de enchape Caminadero y area de maquinas en Terraza.
* NOVEDADES. No se realizo actividades en Fachada por no autorizacion Ingreso
OPERATIVOS: 2 oficiales, 2 auxiliares, 1 SST, 1 Residente
1 Dr Obra, 1 Ambiental

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA. 29- DIC - 2025

Charlas de seguridad

Hora de Inicio: 8:00 AM.

Hora de Fin: 5:00 PM.

* Instalación de baldosas en area de maquinas terraza.
* aplicación de bogüillo.
* Instalación de remate de membrana zona izquierda de terraza.
* Orden y aseo en areas de trabajo.

SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 03 oficiales, 2 ayudantes, 1 SST, 1 Residente 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 30- DIC - 2025.

Hora de Inicio: 8:00 AM.

Hora de Fin: 5:00 PM.


* Corte de Ceramicas
* Instalación de enchape zona derecha de terraza.
* Instalación de tela para membrana.
* Instalacion de membrana zona derecha de terraza.
* Terminación de Pintura y detalles centro de servicios.

SIN NOVEDADES.

OPERATIVOS: 04 oficiales, 2 ayudantes, 1 SST, 1 Ambiental 1 Dr Obra,

ERIKA CANO

ACTIVIDADES DE OBRA. 31 - DIC - 2025.
Hora de Inicio: 8:00 AM. Charla de seguridad
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Instalación de enchape.
* Instalación de membrana.
* Terminación de detalles en Fachada.
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 04 Oficiales, 2 ayudantes, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental.



ERIKA CANO.

01 - ENE - 2026.

"No se laboró"



ERIKA CANO

02 - ENE - 2026.


"No se laboro"



ERIKA CANO

03 - ENE - 2026.

"No se laboro"



ERIKA CANO.

Domingo 04 - ENE - 2026.

ACTIVIDADES DE OBRA. 05 - ENE - 2026.
* PAUSAS ACTIVAS.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Corte e instalacion de Ceramica Tenoza.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 28- NOV- 2025.
Charla de seguridad Dia lluvioso.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin:
* Armado de andamio
* delimitación de area donde se realizaran actividades.
* descargue de material
* Aplicacion de estuco sobre Fachada.
NOVEDADES:
OPERATIVOS: 4 OFiciales, 1 SST, 1 Or obra, 1 Residente, 1 Ambient




ERIKA Cano.

ACTIVIDADES DE OBRA. 29- NOV- 2025.
Dia soleado. Charla de seguridad.
Hora Inicio: 8:00 AM.
Hora Fin:
"NO SE REALIZARÓN ACTIVIDADES"

DOMINGO 30- NOV- 2025.

"NO SE Realizarón Actividades"



ERIKA CANO.
01- DIC - 2025.

NO SE Realizarón actividades.



ERIKA CANO.

02- DIC - 2025.
"NO se realizarón actividades"



ERIKA CANO
03- DIC - 2025.
"NO SE REALIZARÓN ACTIVIDADES"
ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EN OBRA. 04 - DIC - 2025
Dia soleado Charla de seguridad
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin:

* Traslado de escombro para relleno de anden.
* Preparación de mezcla. para fundición de anden.

NOVEDADES: Sin novedades.
OPERATIVOS: 4 OFICIALES, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

05 - DIC - 2025.

"NO SE REALIZARON ACTIVIDADES."

06 - DIC - 2025.

"NO SE REALIZARON ACTIVIDADES".

Domingo 07 - DIC - 2025.

"NO SE LABORÓ"

Lunes Festivo 08 - DIC - 2025

"NO SE LABORÓ"

09 - DIC - 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA.
Dió soleado. Charla de seguridad.
Hora de Inicio:
Hora de Fin:
* Traslado de laminas de board para area de trabajo.
* Señalizacion y delimitación de areas
* Traslado de andamio a areas de trabajo.
* Corte de laminas de super board.
* Tapado Con board frente de ingreso sede judicial.

Powered by CamScanner

NOVEDADES: Sin Novedades.
OPERATIVOS: 3 Oficiales, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 10-DIC-2025.
Dia soleado Charla de seguridad
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Lijado de Fachada.
* Armado de Andamios
* Señalización de area.
* Aplicacion de Impermehabilizante en Terraza
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 02 OFICIALES, 2 AUXILIARES, 1 SST, 1 Residente
1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO

ACTIVIDADES DE OBRA 11 - DIC - 2025.
Dia soleado Charla de seguridad.
Hora de inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Recubrimiento de estructura metalica Con eter board.
* Lijado de Fachada
* Armado de Andamio
* delimitacion de areas de trabajo.
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 02 OFICIALES, 2 AUXILIARES, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 12 - DIC - 2025
Dia Soleado Hora Fin: 5:00 pm.
Hora Inicio: 8:00 Charla Seguridad

Powered by CamScanner

* Recubrimiento Final de estructura en fachado con eterboard.
* Armado de Andamios.
* Señalización en Area de Trabajo.
* Retiro de escalera Acceso a terraza.
* Instalacion de tubena Rectangular Para techo escalera gato.

SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 1 Oficial, 1 soldador, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Residente 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA Cano.

ACTIVIDADES DE OBRA. 13 - DIC - 2025.
Dia soleado Charla de seguridad.
Hora de Inicio:
Hora de Fin:
* Instalación de escalera gato.
* Instalación de tejas.
* Pintura de estructura Rectangular.
* Instalación de escalera Antigua en ~~Canal~~ Zona izquierda de terraza.

SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 1 soldador, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr obra. 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA Cano.

Domingo - 14 DIC - 2025
No se labora.

15- DIC - 2025.
No se laboró en la sede.

ACTIVIDAD DE OBRA. 16 - DIC - 2025.
Hora Inicio: 8:00
Hora Fin: 5:00 PM.
* aplicacion de Supermastick. en Fachada.
* Armado de Andamios.
* Señalización de Area de trabajo.
SIN NOVEDADES.
OPERATIVOS: 2 Oficiales, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Residente.
1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

17 - DIC - 2025.

☹ NO SE REALIZARON ACTIVIDADES!!

ACTIVIDADES DE OBRA. 18 - DIC - 2025.
Hora Inicio: 8:00 AM. Hora Fin: 5:00 PM.
* Instalacion de estructura metalica a traga luz. de Sala Para niños
* Tapado de estructura metalica en traga luz y resane Con Supermastick.
* Pintura de area resanada antes.
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 04 Oficiales, 2 ayudantes, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 19 - DIC - 2025.

Hora Inicio: 8:00 AM.

Hora Fin: 5:00 pm.

* Instalacion de puerta para escalera gato.
* Pintura de puerta escalero gato.
* Aplicacion de estuco board de fachada frente Principal

SIN NOVEDAD.

OPERATIVOS: 02 Oficiales, 1 Ayudante, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 20 - DIC - 2025.

Hora Inicio: 7:00 AM.

Hora Fin: 12:32 pm.

* Retoque de pintura en estructura Perlines.
* Instalación de cinta asfaltico sobre Canales.

SIN NOVEDAD.

OPERATIVOS: 1 Oficial, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO

Domingo 21 - DIC - 2025.

"No se laboro."

22 - DIC. - 2025

"No se laboro"

23 - DIC - 2025.

" no se laboro ".

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 24- DIC - 2025.
Charla de seguridad Día Soleado
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Raspado de y resane de Fachada exterior de sede Judicial Familia.
SIN NOVEDADES.
OPERATIVOS: 01 Oficial, 01 Ayudante, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

25 - DIC - 2026.
"No se laboró"

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 26- DIC - 2025.
Charla de seguridad Día Soleado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Terminación de resane y raspado de Fachada exterior lateral y Pintura de Fachada
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 01 Oficial, 1 ayudante, 1 sst, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

27- DIC- 2025.
"No se laboró"

ERIKA CANO.

Domingo 28 - DIC - 2025

"NO se laboro".




ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 29 - DIC - 2025.
Charla de Seguridad Día Soleado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Resane de Fachada lateral Frente via principal sede Judicial.
* Raspado de Fachada.
* Armado de Andamios.
SIN NOVEDADES.
OPERATIVOS: 01 OFICIAL, 1 ayudante, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental.



ERIKA CANO.


ACTIVIDADES DE OBRA 30 - DIC - 2025.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Terminación de Resane y Rasqueteo de Fachada.
* Instalacion de dilataciones.
* SIN NOVEDADES.
OPERATIVOS: 01 OFICIAL, 1 ayudante, 1 SST, 1 Residente, 1 Ambiental,



ERIKA CANO.

31 - DIC - 2025.

"NO se laboró"



ERIKA CANO.



Powered by CamScanner

| Matriz de Calidad | | |

	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	**CODIGO: FORD-PDC-01** **VERSION: 01 2025** **PAGINA: 1 DE 1**

FECHA: 30 de diciembre de 2025	**CONSECUTIVO:**	**005**
PROYECTO: Mantenimiento y Reparaciones Locativas a las Sedes Judiciales del Palacio de Justicia "Simón David Carrejo Bejarano" y Sede Judicial Familia de Palmira, Palacio de Justicia “Oscar Lema Trujillo” de Roldanillo y Palacio de Justica de Cartago		
Contrato No.: 064 de 2025		

No.	Nombre del Registro	Codigo	Consecutivo	Responsable del Diligenciamiento	Medio de archivo (fisico/digital)	Tiempo de conservación	Acceso restringido (Si/No)	Observaciones
1	Listado Maestro de registros	FOR-PDC-01	005	Martha Andrade	Digital	5 años	No	
2	Control de recepción y almacén	FOR-PDC-04	005	Martha Andrade	Digital	5 años	No	
3	Registro de Inspección tecnica	FOR-PDC-05	005	Ricardo Rojas	Digital	5 años	No	
4	Listado de proveedores	FOR-PDC-09		Martha Andrade	Digital	5 años	No	
5	Orden de Compra	FOR-PDC-10	018	Ricardo Rojas	Digital	5 años	No	
6	Orden de Compra	FOR-PDC-10	019	Ricardo Rojas	Digital	5 años	No	
7	Orden de Compra	FOR-PDC-10	020	Ricardo Rojas	Digital	5 años	No	
8	Registro de evaluación de proveedores	FOR-PDC-11		Ricardo Rojas	Digital	5 años	No	
9	Matriz de compras	FOR-PDC-12		Martha Andrade	Digital	5 años	No	
10								
11								
12								
13								
14								
15								



ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**
NOMBRE: Martha Patricia Andrade	**NOMBRE:** Julio Ricardo Rojas Hernandez
CARGO: Dirección Administrativa	**CARGO:** Representante Legal
FIRMA: 	**FIRMA:** 

	CONTROL DE RECEPCION Y ALMACEN	**CODIGO: FORD-PDC-04**
		VERSION: 01 2025
		PAGINA: 1 DE 1

PERIODO: 01 al 30 de diciembre de 2025	**CONTRATO No.:** 064 de 2025	**CONSECUTIVO: 005**
PROYECTO: Mantenimiento y Reparaciones Locativas a las Sedes Judiciales del Palacio de Justicia "Simón David Carrejo Bejarano" y Sede Judicial Familia de Palmira, Palacio de Justicia "Oscar Lema Trujillo" de Roldanillo y Palacio de Justica de Cartago		


No.	Fecha	Factura	Proveedor	Material	Unidad	Cantidad	Frente o Sede
1	5/12/2025	253698	Homecenter	Pared Marmol Canaria	und	14	Palacio Palmira
2	6/12/2025	252750	Homecenter	Cemento Topex uso general	und	10	Palacio Palmira
3	8/12/2025	6256	Ferreteria la H	Teja UPVC Blanca 11,80x1,13	und	6	Palacio Palmira
4	8/12/2025	6256	Ferreteria la H	Teja UPVC Blanca 3x1,13	und	1	Palacio Palmira
5	8/12/2025	6256	Ferreteria la H	Teja UPVC Blanca 5,9x1,13	und	1	Palacio Palmira
6	10/12/2025	252884	Homecenter	Cemento Topex uso general	und	10	Palacio Palmira
7	14/12/2025	8737	Suministros y pinturas Palm	Pintura Vinilo Tipo 1	und	2	Palacio Palmira
8	21/12/2025	253551	Homecenter	Manto autoadhesivo	und	5	Palacio Palmira
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	**REVISADO POR**
Nombre: Martha Patricia Andrade	Nombre: Julio Ricardo Rojas Hernandez
Cargo: Dirección Administrativa	Cargo: Representante Legal
Firma: 	Firma: 

	REGISTRO DE INSPECCION TECNICA	CODIGO: FOR-PDC-05
		VERSION: 01 2025
		FECHA: 01-07-2025
		PAGINA: 1 DE 1

PERIODO: 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	**CONTRATO No.:** 064 de 2025	**CONSECUTIVO:**	**005**
PROYECTO: Mantenimiento y Reparaciones Locativas a las Sedes Judiciales del Palacio de Justicia "Simón David Carrejo Bejarano" y Sede Judicial Familia de Palmira, Palacio de Justicia “Oscar Lema Trujillo” de Roldanillo y Palacio de Justica de Cartago			

Fecha de inspección	Actividad Inspeccionada	Código de actividad o ítem	Inpección técnica aplicada	Resultado de la inspección	Responsable de inspección	Firma Responsable de Inspección	Registro fotografico
30/11/2025	Suministro Puerta Cortafuego	52	Visual y documental	Cumple con especificaciones tecnicas NFPA251, NFPA80, ficha tecnica ya aprobada.	Ricardo Rojas Hernandez		
30/11/2025	Esacaleras Gato para Roldanillo y	74 y 5,01	Visual y documental	Cumple con estándares de fabricación y calidad de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021	Ricardo Rojas Hernandez		 
							 

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**
Nombre: Julio Ricardo Rojas Hernandez	Nombre: Maria Claudia Garcia Cardona
Cargo: Residente de Obra	Cargo: Directora de Obra
Firma	Firma

	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: FOR-PDC-10
		VERSION: 01 2025
		FECHA: 01-07-2025
		PAG: 1 DE 1


FECHA: 04 de diciembre 2025	**CONSECUTIVO:**	018
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS RAMA JUDICILA VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.: 064 de 2025		

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE: Homecenter - Sodimac Colombia	
NIT/CC: 800242106	**e-mail:** proveedores@homecenter.co
Telf: 3108606158	**Dirección:** Cl. 40 38 35 - Palmira

CONDICIONES COMERCIALES	
Fecha de entrega:	**Incluye transporte: Si**
Lugar de entrega:	

Ítem	Descripción el producto / servicio	Unidad	Cantidad
1	Pared Marmol Canaria	und	14
2	Cemento Topex uso general	und	20
3	Manto autoadhesivo	und	5
4	Sika Permalastic Pro	und	7
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
Nombre: Ricardo Rojas	Nombre: Maria Claudia Garcia
Cargo : Residente de Obra	Cargo : Director de Obra

Firma 	Firma 


	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: FOR-PDC-10
		VERSION: 01 2025
		FECHA: 01-07-2025
		PAG: 1 DE 1

FECHA: 04 de diciembre 2025	**CONSECUTIVO:**	019
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA		
CONTRATO No.: 064 de 2025		

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE: Suministros y Pinturas Palmira SAS	
NIT/CC: 900922832	**e-mail:** ventas@sumipinturas.com
Telf: 3136059533	**Dirección:** Cl 28 27 66, Palmira

CONDICIONES COMERCIALES	
Fecha de entrega: 04/11/2025 - 30/11/2025	**Incluye transporte: No**
Lugar de entrega: Recogido en tienda	

Ítem	Descripción el producto / servicio	Unidad	Cantidad
1	Pintura Vinilo Tipo 1	und	2
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
Nombre: Ricardo Rojas	Nombre: Maria Claudia Garcia
Cargo : Residente de Obra	Cargo : Director de Obra
Firma 	Firma 


	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: FOR-PDC-10
		VERSION: 01 2025
		FECHA: 01-07-2025
		PAG: 1 DE 1

FECHA: 04 de diciembre 2025	**CONSECUTIVO:**	020
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA		
CONTRATO No.: 064 de 2025		

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE: Ferreteria la H	
NIT/CC: 901040860-7	**e-mail:**
Telf: 6022855730	**Dirección:** CL 42 40 03, Palmira

CONDICIONES COMERCIALES	
Fecha de entrega: 04/11/2025 - 30/11/2025	**Incluye transporte: No**
Lugar de entrega: Recogido en tienda	

Ítem	Descripción el producto / servicio	Unidad	Cantidad
1	Teja UPVC Blanca 11,80x1,13	und	6
2	Teja UPVC Blanca 3x1,13	und	1
3	Teja UPVC Blanca 5,9x1,13	und	1
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
Nombre: Ricardo Rojas	Nombre: Maria Claudia Garcia
Cargo : Residente de Obra	Cargo : Director de Obra
Firma 	Firma 
