INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO SOLIDARIO CS N°046 -2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL – ASOCOMUNAL CAÑASGORDAS NIT: 901.048.955-4**		
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación		
FECHA DE CONTRATACIÓN	03/diciembre/2025	**PERIODO A COBRAR**	Del 03 de diciembre de 2025 al 10 de diciembre del 2025
NÚMERO DEL CONVENIO	CS N°046-2025	**NUMERO DEL INFORME**	01

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL – ASOCOMUNAL CAÑASGORDAS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DEL BARRIO EL EDÉN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SOPORTE ESTRUCTURAL CON CONCRETO CICLÓPEO QUE PERMITA MITIGAR EL PROCESO DE SOCAVACIÓN GENERADO POR LA QUEBRADA APUCARCO, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL

METAS PROGRAMADAS Y/O ALCANCE	• EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DEL BARRIO EL EDÉN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SOPORTE ESTRUCTURAL CON CONCRETO CICLÓPEO QUE PERMITA MITIGAR EL PROCESO DE SOCAVACIÓN GENERADO POR LA QUEBRADA APUCARCO, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.

1

AVANCES

De acuerdo a las actividades planteadas dentro del convenio de solidaridad N°046-2025, me permito entregar informe de avances de actividades:

PRESUPUESTO GENERAL

No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
1,1	1,1			Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de 2" a 4"	m3	22,00	$ 562.136	$ 12.366.992
2				TRANSPORTE				
2,1	2,1			Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3 - Km	2.072,70	$ 1.186	$ 2.458.222
							SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 14.825.214,00
							APORTE JAC (4%)	$ 593.009,00
							VALOR TOTAL	$ 15.418.223,00

1. Excavación y preparación de la zona de cimentación
   - Ejecución de excavaciones manuales o mecánicas hasta alcanzar el nivel requerido para la construcción del soporte en concreto ciclópeo.
   - Retiro de material suelto, arrastrado por la socavación o no apto para fundación.
   - Acondicionamiento del terreno para garantizar una base firme, limpia y estable.
2. Conformación y fundida de concreto ciclópeo
   - Suministro, preparación, mezcla, transporte, colocación y curado del concreto ciclópeo.

- Elaboración del concreto con resistencia mínima equivalente a un concreto simple de 2.000 psi, salvo recomendación técnica distinta.
- Inclusión de piedras limpias y estables de tamaño entre 8" y 16", distribuidas uniformemente.
- Colocación del concreto ciclópeo en capas de máximo 40 cm, compactadas manualmente para eliminar vacíos y asegurar la continuidad del macizo.
- Conformación del volumen y geometría del macizo de soporte según diseño, garantizando estabilidad frente a empujes laterales y socavación.

3. Reconformación y relleno alrededor de la estructura ciclópea

- Relleno lateral y posterior de la estructura con material adecuado y compactación manual para asegurar el confinamiento del macizo construido.
- Nivelación del área intervenida para permitir una adecuada transición hacia el puente.

4. Acabado, curado y protección de la obra


- Implementación de curado húmedo del concreto ciclópeo por un tiempo no menor a 7 días, evitando desecación prematura.
- Protección de las superficies nuevas frente al caudal directo, golpes de agua o arrastre de materiales hasta su fraguado adecuado.
- Revisión final del apoyo y estabilidad de la estructura antes de habilitar la zona.

Acta de Obra No1

REGISTRO FOTOGRAFICO





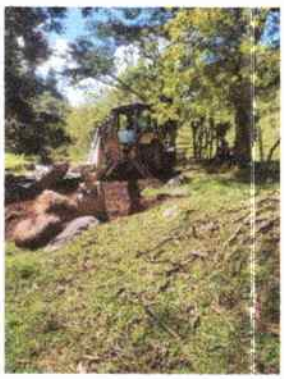














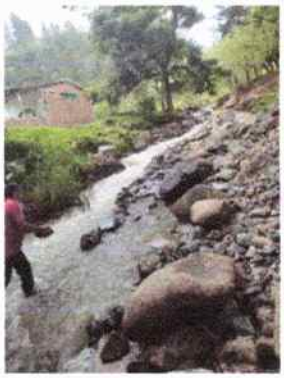





CONCLUSIONES

Como contratista se vienen ejecutando las actividades contenidas en el convenio, todo esto dentro del plazo previsto, según lo que se estipulo en el **CONVENIO SOLIDARIO N°046-2025,** y se procede a presentar la respectiva cuenta de cobro por valor **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/L ($14.825.214,00)**

FIRMA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	**ING. ADIELA REYES COLLAZOS** Secretaria de Planeación
CONTRATISTA	Octavio Gomez Oquendo **OCTAVIO GOMEZ OQUENDO** Presidente JAC ASOCOMUNAL CAÑASGORDAS
