
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1		**CONSTRUCCION TENSOESTRUCTURA**	**198 días**	**lun 2/02/26**
2		LOCALIZACION Y REPLANTEO	5 días	lun 2/02/26
3		**CIMENTACION**	**90 días**	**lun 9/02/26**
4		EXCAVACION DADOS	13 días	lun 9/02/26
5		EXCAVACION, ARMADO Y FUNDIDA DE ANILLOS CAISSONS	31 días	jue 26/02/26
6		ARMADO CANASTA NUCLEO / FUSTE	5 días	mié 15/04/26
7		RETIRO DE ESCOMBROS	90 días	lun 9/02/26
8		CONCRETO PATA Y FUSTE	10 días	mié 22/04/26
9		DESCABECE Y NIVELACION	5 días	jue 7/05/26
10		ARMADO CANASTAS DE DADOS	8 días	jue 14/05/26
11		FORMALETA, ARMADO Y CONCRETO DADOS	20 días	mié 20/05/26
12		**ESTRUCTURA METALIC**	**155 días**	**lun 2/02/26**
13		VERIFICACIÓN PLANOS DE TALLER	20 días	lun 2/02/26
14		FABRICACION	75 días	lun 16/02/26
15		TRANSPORTE	10 días	lun 25/05/26
16		MONTAJE E INSTALACIÓN	45 días	mié 24/06/26
17		PINTURA	15 días	mar 1/09/26
18		APANTALLAMIENTO - LINEAS DE VIDA - SISTEMA AGUAS LLUVIAS	20 días	mar 1/09/26
19		**MEMBRANA Y FACHAD**	**180 días**	**lun 2/02/26**
20		MODELADO Y PATRONAJE	40 días	lun 2/02/26
21		IMPORTACION DE MATERIA PRIMA	30 días	lun 2/02/26
22		FABRICACION, CORTE, SELLADO Y REFUERZOS	30 días	mar 31/03/26
23		TRASLADO, EMLABAJE, EXPORTACION, TRANSPORTE MARITIMO Y TRASLADO A OBRA	20 días	vie 15/05/26
24		MONTAJE CUBIERTA Y FACHADA	30 días	mar 15/09/26
25		OBRAS DE URBANISMO	35 días	mar 1/09/26

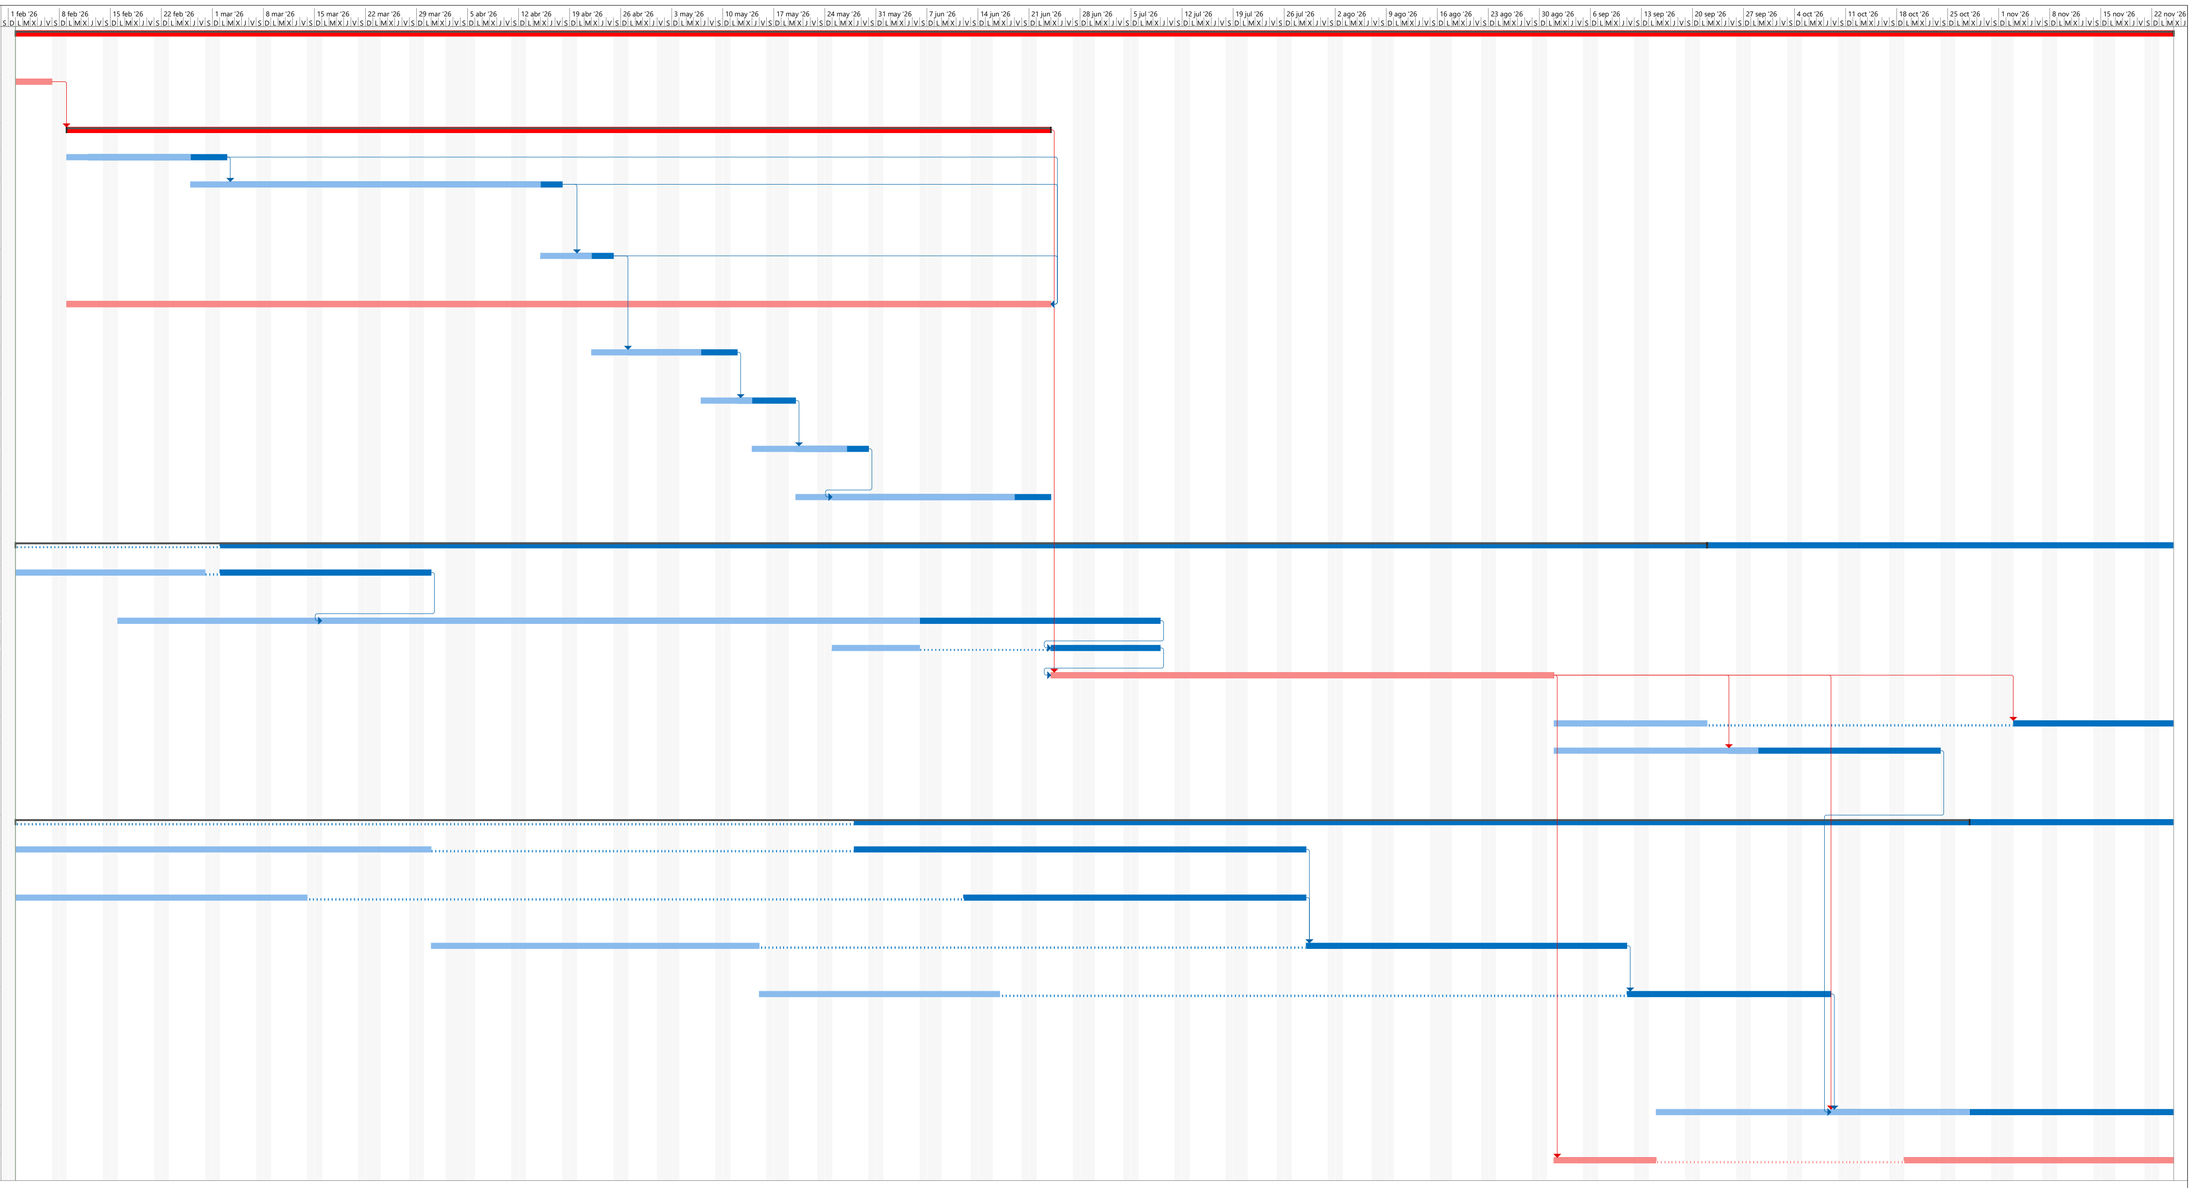

Proyecto: 20260121 PROGRAM
Fecha: mié 21/01/26

Ruta Crítica, Holgura, División, Resumen, Tarea inactiva, Resumen inactivo, solo duración, Resumen manual, solo fin, Hito externo, Tareas críticas, Progreso
Inicio Tardío, Tarea, Hito, Resumen del proyecto, Hito inactivo, Tarea manual, Informe de resumen manual, solo el comienzo, Tareas externas, Fecha límite, División crítica, Progreso manual
