
CRONOGRAMA PROYECTO

Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
1		**LOTE 2**	**41 días**	**$218,532,804**	**lun 19/01/26**	**sáb 28/02/26**		
2		INICIO	0 días	$0	lun 19/01/26	lun 19/01/26	10,6,8,9,2	
3		**RURAL**	**31 días**	**$184,705,826**	**lun 19/01/26**	**mié 18/02/26**		
4	4	**KM 18 SECTOR PINERA - LA ELVIRA**	**31 días**	**$184,705,826**	**lun 19/01/26**	**mié 18/02/26**		
5		**PRELIMINARES**	**0 días**	**$1,092,841**	**lun 19/01/26**	**lun 19/01/26**		
6		LOCALIZACION Y REPLANTEO	0 días	$1,092,841	lun 19/01/26	lun 19/01/26		2
7		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**15 días**	**$32,440,540**	**lun 19/01/26**	**lun 2/02/26**		
8		EXCAVACION A MAQUINA	5 días	$2,445,113	lun 19/01/26	vie 23/01/26	12CC+2 di	2
9		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	5 días	$15,978,929	lun 19/01/26	vie 23/01/26		2
10		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	15 días	$14,016,498	lun 19/01/26	lun 2/02/26		2
11		**RELLENOS Y BASES**	**10 días**	**$22,779,951**	**mié 21/01/26**	**vie 30/01/26**		
12		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	3 días	$3,229,495	mié 21/01/26	vie 23/01/26	13	8CC+2 días
13		RELLENO SUBBASE	7 días	$19,550,456	sáb 24/01/26	vie 30/01/26	19	12
14		**CONCRETOS**	**13 días**	**$80,519,222**	**lun 2/02/26**	**sáb 14/02/26**		
15		CONSTRUCCION DE HUELLAS	12 días	$38,585,911	lun 2/02/26	vie 13/02/26	16CC+5 di	19CC+2 día
16		EMPEDRADO	8 días	$31,128,271	sáb 7/02/26	sáb 14/02/26		15CC+5 día
17		CONSTRUCCION DE VIGA	12 días	$10,805,040	lun 2/02/26	vie 13/02/26		15CC
18		**ACEROS**	**10 días**	**$14,668,560**	**sáb 31/01/26**	**lun 9/02/26**		
19		ACERO DE REFUERZO	10 días	$14,668,560	sáb 31/01/26	lun 9/02/26	15CC+2 di	13
20		**DRENAJES**	**5 días**	**$33,204,712**	**sáb 14/02/26**	**mié 18/02/26**		
21		CONSTRUCCION DE CUNETAS	5 días	$33,204,712	sáb 14/02/26	mié 18/02/26		15
22		**# 8 - COMUNA 18 - CALLE 2 ENTRE CARRERA 96 Y 97**	**30 días**	**$33,826,978**	**vie 30/01/26**	**sáb 28/02/26**		
23		**I - ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**$316,240**	**vie 30/01/26**	**sáb 31/01/26**		
24		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	2 días	$316,240	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	28	2CC+11 días
25		**II - DEMOLICIONES**	**1 día**	**$156,200**	**mar 24/02/26**	**mar 24/02/26**		
26		DEMOLICION DE ANDEN	1 día	$156,200	mar 24/02/26	mar 24/02/26	40	38
27		**III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	**7 días**	**$3,058,380**	**dom 1/02/26**	**sáb 7/02/26**		
28		EXCAVACION A MANO	7 días	$1,238,910	dom 1/02/26	sáb 7/02/26	29CC,31	24
29		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	7 días	$1,819,470	dom 1/02/26	sáb 7/02/26		28CC
30		**IV - RELLENOS Y BASES**	**5 días**	**$2,599,863**	**dom 8/02/26**	**jue 12/02/26**		
31		RELLENO CON ROCA	2 días	$856,120	dom 8/02/26	lun 9/02/26	36,33,34	28
32		**ESTRUCTURAS**	**3 días**	**$1,743,743**	**mar 10/02/26**	**jue 12/02/26**		
33		ZAPATA Y PANTALLA PARA MUROS DE CONTENCIÓN	3 días	$774,873	mar 10/02/26	jue 12/02/26		31
34		ANDEN EN CONCRETO	3 días	$968,870	mar 10/02/26	jue 12/02/26		31
35		**ACEROS**	**4 días**	**$3,363,500**	**mar 10/02/26**	**vie 13/02/26**		
36		ACERO DE REUERZO	4 días	$3,363,500	mar 10/02/26	vie 13/02/26	39	31
37		**NO PREVISTOS**	**15 días**	**$24,332,795**	**sáb 14/02/26**	**sáb 28/02/26**		
38		CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO SIMPLE F'C=3000 PSI CON SECCION 1.2x0.8x0.65 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA.	5 días	$4,467,205	jue 19/02/26	lun 23/02/26	26	39
39		CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO SIMPLE F'C=3000 PSI CON SECCION 1.8x0.8x0.65 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA.	5 días	$5,280,420	sáb 14/02/26	mié 18/02/26	38,43	36
40		CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO SIMPLE CON TAPA F'C=3000 PSI CON SECCION 0.8x0.65 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	4 días	$9,097,092	mié 25/02/26	sáb 28/02/26		26
41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN GARRA DE TIGRE TUBERÍA PEAD Ø=8"	1 día	$1,751,252	dom 22/02/26	dom 22/02/26		42CC
42		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CODO HIERRO DUCTIL EXTREMO LISO 90° x 8"	1 día	$1,210,738	dom 22/02/26	dom 22/02/26	41CC	44CC
43		CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO SIMPLE F'C=3000 PSI CON SECCION 1.1x0.8x1.15 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA.	3 días	$2,062,666	jue 19/02/26	sáb 21/02/26	44	39
44		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ MÍNIMA SN8), Ø=8" (200 MM) (INCLUYE ACARREO INTERNO). PRECIO LISTA DE EMCALI 10004351	1 día	$463,422	dom 22/02/26	dom 22/02/26	42CC	43

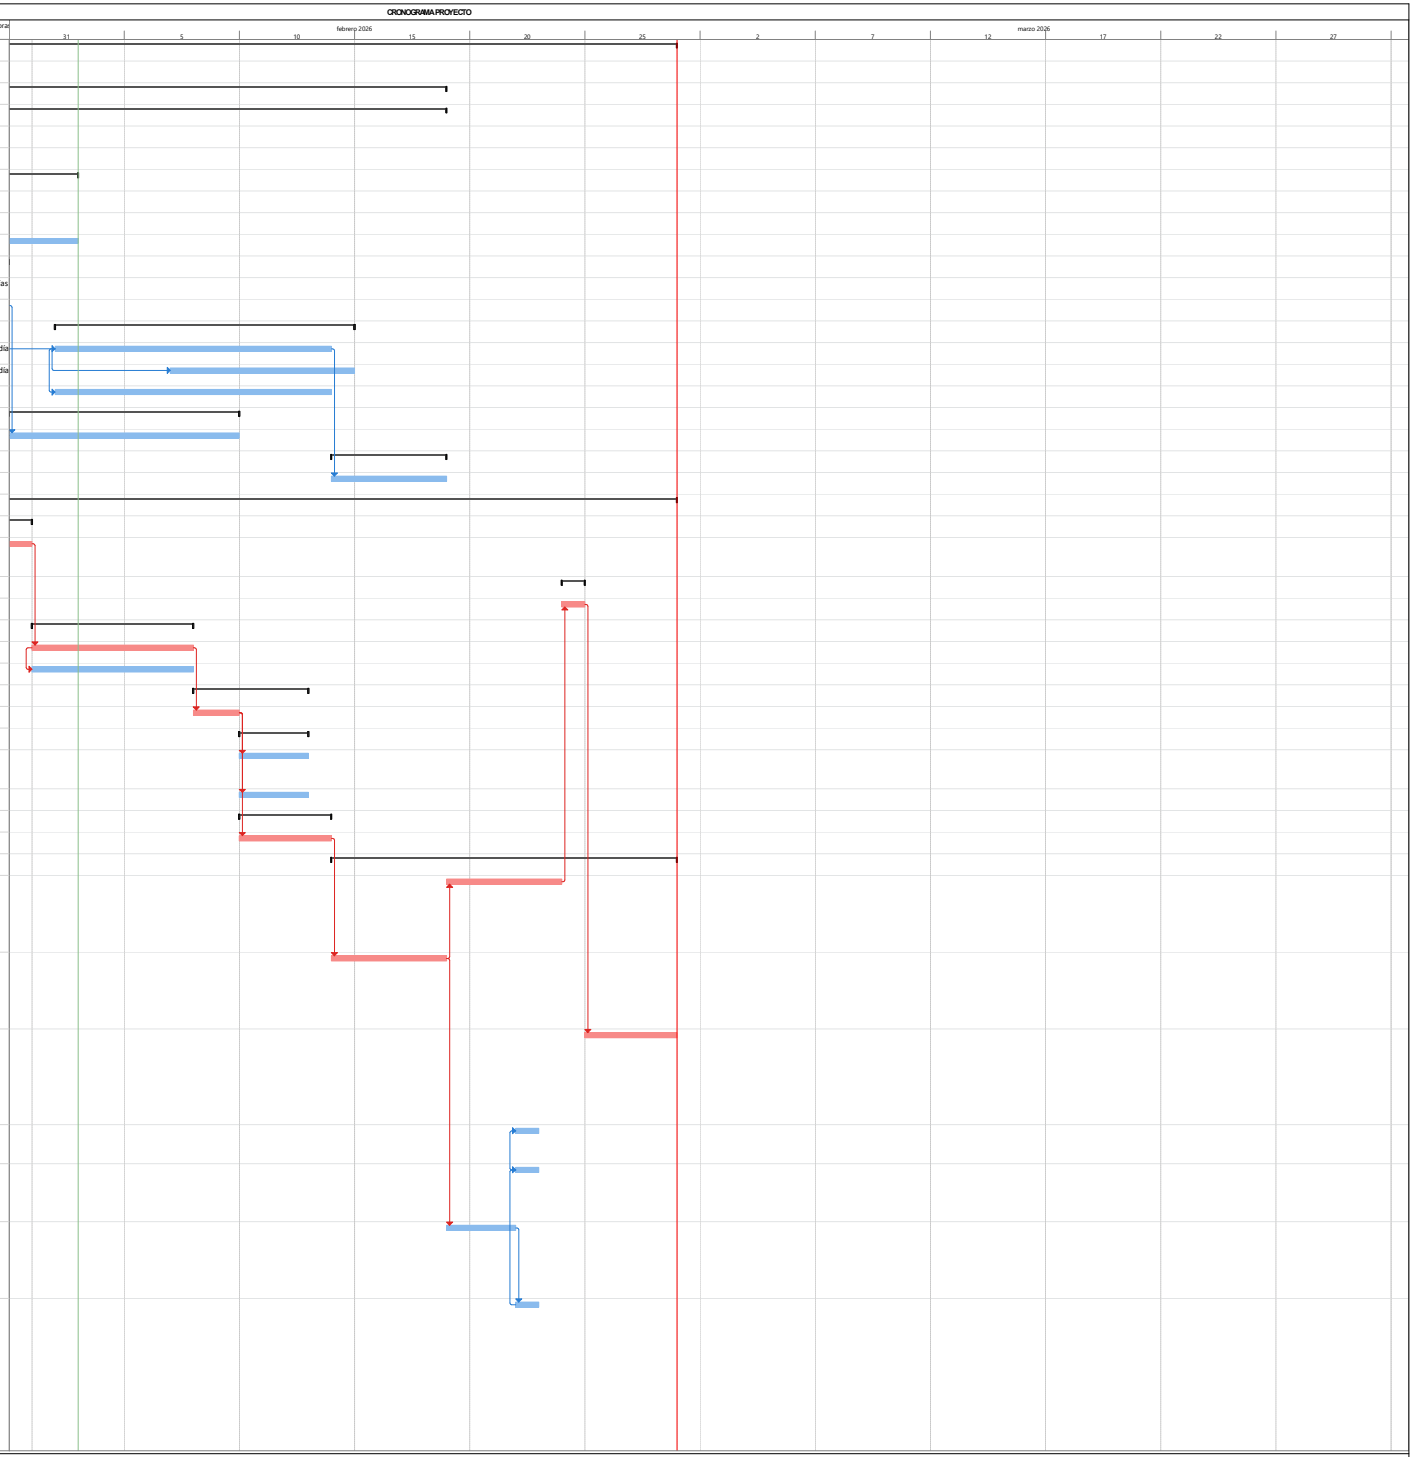

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
