CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024

MEMORIAS DE CALCULO

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411


Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE | CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM 3.00.03	UNIDAD m3	MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa							
BLOQUE 1	MURO	1,00	0,22	49,51	5,11		55,66	1,00	55,66
BLOQUE 1	ZARPA	1,00	0,60	49,51	0,25		7,43	1,00	7,43
BLOQUE 2	MURO TIPO 1	1,00	0,22	21,12	5,11		23,74	1,00	23,74
BLOQUE 2	MURO TIPO 1	1,00	0,60	21,12	0,25		3,17	1,00	3,17
BLOQUE 2	MURO TIPO 1	1,00	0,60	8,84	0,25		1,33	1,00	1,33
BLOQUE 2	ZARPA	1,00	0,22	8,84	5,11		9,94	1,00	9,94
URGENCIAS	ZAPATA				0,40	151,63	60,65		60,65
VASTAGO 1			0,25	31,04	2,50		19,40		19,40
VASTAGO 2			0,25	13,02	2,50		8,14		8,14
VASTAGO 3			0,25	30,32	2,50		18,95		18,95
									208,40

MEMORIA

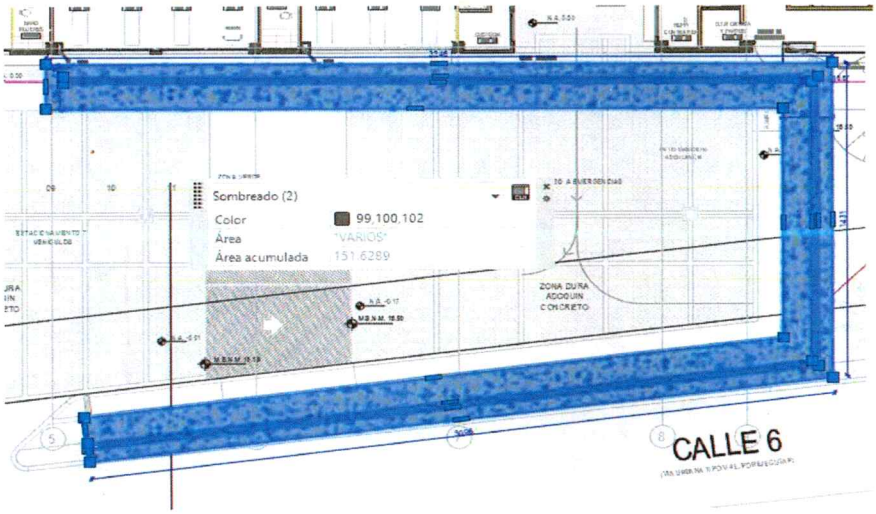

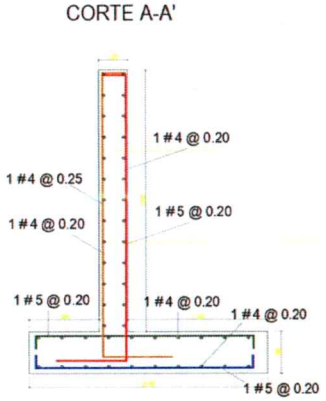

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA


Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

MEMORIA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
					ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	3.00.07	UNIDAD	m2	GEODREN PLANAR DETRÁS DE MURO DE CONTENCIÓN							
BLOQUE 1		MURO		1,00	0,22	49,51	5,11		55,66	2,00	111,32
BLOQUE 1		ZARPA		1,00	0,60	49,51	0,25		7,43	2,00	14,85
BLOQUE 2		MURO TIPO 1		1,00	0,22	21,12	5,11		23,74	2,00	47,49
BLOQUE 2		MURO TIPO 1		1,00	0,60	21,12	0,25		3,17	2,00	6,34
BLOQUE 2		MURO TIPO 1		1,00	0,60	8,84	0,25		1,33	2,00	2,65
BLOQUE 2		ZARPA		1,00	0,22	8,84	5,11		9,94	2,00	19,88
											546,81

MEMORIA







Página 1





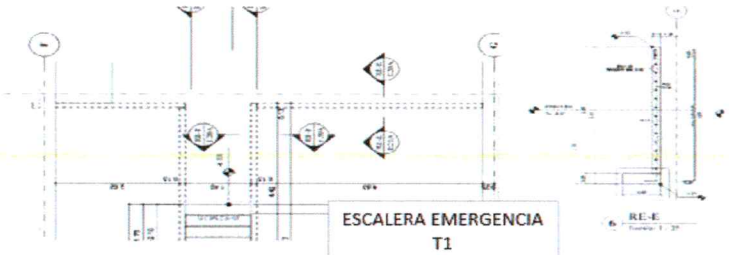



MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		

ITEM: ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	CANTIDAD	LONGITUD		diametro #	PESO	TOTAL
COLUMNAS MODULO 1						
G3	4	4,200	16,80	6	2,235	37,548
	8	5,000	40,00	6	2,235	89,400
	8	6,700	53,60	7	3,042	163,051
	8	2,500	20,00	7	3,042	60,840
	53	1,900	100,70	3	0,560	56,392
	252	0,640	161,28	3	0,560	90,317
			0,00			
G4	4	6,500	26,00	7	3,042	79,092
	4	2,800	11,20	7	3,042	34,070
	12	5,000	60,00	8	3,973	238,380
	12	4,400	52,80	8	3,973	209,774
	75	1,900	142,50	3	0,560	79,800
	220	0,640	140,80	3	0,560	78,848
			0,00			
G5	4	4,440	17,76	7	3,042	54,026
	4	5,000	20,00	7	3,042	60,840
	12	8,000	96,00	8	3,973	381,408
	12	8,000	96,00	8	3,973	381,408
	53	1,900	100,70	3	0,560	56,392
	220	0,640	140,80	3	0,560	78,848
			0,00			
G6	4	4,000	16,00	7	3,042	48,672
	4	5,800	23,20	7	3,042	70,574
	12	3,000	36,00	8	3,973	143,028
	12	7,000	84,00	8	3,973	333,732
	51	1,900	96,90	3	0,560	54,264
	220	0,640	140,80	3	0,560	78,848
			0,00			
G7	4	4,000	16,00	7	3,042	48,672
	4	5,800	23,20	7	3,042	70,574
	12	3,000	36,00	8	3,973	143,028
	12	7,000	84,00	8	3,973	333,732
	54	1,900	102,60	3	0,560	57,456
	224	0,640	143,36	3	0,560	80,282
			0,00			
G8	6	4,500	27,00	10	6,207	167,589
	6	6,500	39,00	10	6,207	242,073
	12	7,800	93,60	8	3,973	371,873
	12	2,500	30,00	8	3,973	119,190
	53	1,900	100,70	3	0,560	56,392
	265	0,640	169,60	3	0,560	94,976
			0,00			
G9	2	6,050	12,10	6	2,235	27,044
	4	4,400	17,60	7	3,042	53,539
	6	9,000	54,00	9	5,028	271,512
	4	3,400	13,60	5	1,552	21,107
	12	8,200	98,40	9	5,028	494,755
	12	7,500	90,00	9	5,028	452,520
	34	1,900	64,60	3	0,560	36,176

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			170	0,640	108,80	3	0,560	60,928
			53	1,900	100,70	3	0,560	56,392
			212	0,640	135,68	3	0,560	75,981
					0,00			
G10			4	7,900	31,60	8	3,973	125,547
			4	7,700	30,80	7	3,042	93,694
			12	6,700	80,40	9	5,028	404,251
			8	9,450	75,60	6	2,235	168,966
			29	1,900	55,10	3	0,560	30,856
			155	0,640	99,20	3	0,560	55,552
			56	1,900	106,40	3	0,560	59,584
			260	0,640	166,40	3	0,560	93,184
					0,00			
G11			2	6,050	12,10	6	2,235	27,044
			6	4,200	25,20	8	3,973	100,120
			6	9,000	54,00	9	5,028	271,512
			4	3,200	12,80	5	1,552	19,866
			12	8,200	98,40	9	5,028	494,755
			12	7,000	84,00	9	5,028	422,352
			34	1,900	64,60	3	0,560	36,176
			180	0,640	115,20	3	0,560	64,512
			49	1,900	93,10	3	0,560	52,136
			212	0,640	135,68	3	0,560	75,981
					0,00			
G12 - G13 - I11 - I12 - I13			16	6,050	96,80	9	5,028	486,710
			74	8,200	606,80	9	5,028	3050,990
			70	5,700	399,00	6	2,235	891,765
			170	1,900	323,00	3	0,560	180,880
			980	0,640	627,20	3	0,560	351,232
			235	1,900	446,50	3	0,560	250,040
			980	0,640	627,20	3	0,560	351,232
					0,00			
G14 - GI14			30	8,000	240,00	8	3,973	953,520
			30	5,700	171,00	6	2,235	382,185
			170	1,900	323,00	3	0,560	180,880
			670	0,640	428,80	3	0,560	240,128
					0,00			
H3			6	2,600	15,60	7	3,042	47,455
			6	6,700	40,20	7	3,042	122,288
			10	4,300	43,00	6	2,235	96,105
			10	4,800	48,00	6	2,235	107,280
			54	1,900	102,60	3	0,560	57,456
			240	0,640	153,60	3	0,560	86,016

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO HOSPITAL COVEÑAS 2023	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
					0,00			
H4 - H5			8	2,600	20,80	7	3,042	63,274
			8	6,700	53,60	7	3,042	163,051
			16	4,200	67,20	6	2,235	150,192
			16	5,000	80,00	6	2,235	178,800
			108	1,900	205,20	3	0,560	114,912
			432	0,640	276,48	3	0,560	154,829
					0,00			
H6 - H7			8	2,600	20,80	7	3,042	63,274
			8	7,100	56,80	7	3,042	172,786
			16	5,500	88,00	6	2,235	196,680
			16	4,000	64,00	6	2,235	143,040
			106	1,900	201,40	3	0,560	112,784
			424	0,640	271,36	3	0,560	151,962
					0,00			
H8			4	2,600	10,40	7	3,042	31,637
			4	7,500	30,00	7	3,042	91,260
			8	4,200	33,60	8	3,973	133,493
			8	6,000	48,00	8	3,973	190,704
			54	1,900	102,60	3	0,560	57,456
			216	0,640	138,24	3	0,560	77,414
					0,00			
H9 - H14 - I9 - I10			48	8,000	384,00	8	3,973	1525,632
			48	5,700	273,60	6	2,235	611,496
			324	1,900	615,60	3	0,560	344,736
			1296	0,640	829,44	3	0,560	464,486
					0,00			
H10 - H11 - H12 - H13			48	8,000	384,00	8	3,973	1525,632
			48	5,700	273,60	6	2,235	611,496
			324	1,900	615,60	3	0,560	344,736
			1296	0,640	829,44	3	0,560	464,486
					0,00			
I3			12	3,500	42,00	7	3,042	127,764
			12	6,000	72,00	7	3,042	219,024
			54	1,900	102,60	3	0,560	57,456
			216	0,640	138,24	3	0,560	77,414
					0,00			

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			8	8,300	66,40	7	3,042	201,989
I4 - I5			16	8,400	134,40	8	3,973	533,971
			108	1,900	205,20	3	0,560	114,912
			432	0,640	276,48	3	0,560	154,829
			4	8,700	34,80	7	3,042	105,862
I6			8	8,800	70,40	8	3,973	279,699
			52	1,900	98,80	3	0,560	55,328
			208	0,640	133,12	3	0,560	74,547
			4	8,700	34,80	7	3,042	105,862
I7			8	8,800	70,40	8	3,973	279,699
			54	1,900	102,60	3	0,560	57,456
			208	0,640	133,12	3	0,560	74,547
			12	4,000	48,00	10	6,207	297,936
I8			12	7,000	84,00	10	6,207	521,388
			53	1,900	100,70	3	0,560	56,392
			216	0,640	138,24	3	0,560	77,414
MODULO 2 COLUMNAS								
			4	3,000		7	3,042	36,504
D3			4	6,000		7	3,042	73,008
			8	6,500		6	2,235	116,220
			8	2,200		6	2,235	39,336
			47	1,900		3	0,560	50,008
			188	0,640		3	0,560	67,379
			4	3,000		8	3,973	47,676
			4	7,000		8	3,973	111,244
D4			8	4,300		7	3,042	104,645
			8	5,500		7	3,042	133,848
			52	1,900		3	0,560	55,328
			208	0,640		3	0,560	74,547
			4	3,000		8	3,973	47,676
			4	7,500		8	3,973	119,190
D5			8	7,200		7	3,042	175,219
			8	3,000		7	3,042	73,008
			54	1,900		3	0,560	57,456
			216	0,640		3	0,560	77,414
			12	3,300		7	3,042	120,463
D6			12	7,000		7	3,042	255,528
			54	1,900		3	0,560	57,456
			216	0,640		3	0,560	77,414
			4	3,700		8	3,973	58,800
			4	6,600		8	3,973	104,887
D7			8	7,600		7	3,042	184,954
			8	2,600		7	3,042	63,274
			53	1,900		3	0,560	56,392
			212	0,640		3	0,560	75,981
			4	7,500		6	2,235	67,050
			4	3,000		6	2,235	26,820

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
D8			8	3,600		7	3,042	87,610
			8	7,000		7	3,042	170,352
			54	1,900		3	0,560	57,456
			216	0,640		3	0,560	77,414
D9			4	7,400		6	2,235	66,156
			4	4,000		6	2,235	35,760
			8	3,400		7	3,042	82,742
			8	8,200		7	3,042	199,555
			59	1,900		3	0,560	62,776
			236	0,640		3	0,560	84,582
D10			4	7,800		8	3,973	123,958
			4	4,000		8	3,973	63,568
			8	3,400		7	3,042	82,742
			8	8,300		7	3,042	201,989
			60	1,900		3	0,560	63,840
			240	0,640		3	0,560	86,016
D11			8	3,800		10	6,207	188,693
			8	9,100		10	6,207	451,870
			8	2,500		10	6,207	124,140
			4	8,000		8	3,973	127,136
			4	5,800		8	3,973	92,174
			81	1,900		3	0,560	86,184
			405	0,640		3	0,560	145,152
D12			4	8,200		10	6,207	203,590
			4	6,000		10	6,207	148,968
			8	4,000		9	5,028	160,896
			8	9,000		10	6,207	446,904
			8	2,500		10	6,207	124,140
			81	1,900		3	0,560	86,184
			405	0,640		3	0,560	145,152
D13			2	6,050		9	5,028	60,839
			4	3,800		9	5,028	76,426
			4	9,000		8	3,973	143,028
			4	2,200		6	2,235	19,668
			8	8,200		9	5,028	329,837
			8	5,700		6	2,235	101,916
			34	1,900		3	0,560	36,176
			170	0,640		3	0,560	60,928
			47	1,900		3	0,560	50,008
			188	0,640		3	0,560	67,379
D13´			4	7,900		7	3,042	96,127
			4	5,500		6	2,235	49,170
			8	3,100		6	2,235	55,428
			8	9,000		5	1,552	111,744
			8	15,500		5	1,552	192,448
			81	1,900		3	0,560	86,184
			405	0,640		3	0,560	145,152

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
E3			12	7,500		6	2,235	201,150
			51	1,900		3	0,560	54,264
			204	0,640		3	0,560	73,114
								0,000
E4			12	8,450		6	2,235	226,629
			53	1,900		3	0,560	56,392
			212	0,640		3	0,560	75,981
								0,000
E5			12	3,000		6	2,235	80,460
			12	7,000		6	2,235	187,740
			54	1,900		3	0,560	57,456
			216	0,640		3	0,560	77,414
E6			12	3,000		6	2,235	80,460
			12	7,000		6	2,235	187,740
			54	1,900		3	0,560	57,456
			216	0,640		3	0,560	77,414
E7			12	8,800		6	2,235	236,016
			54	1,900		3	0,560	57,456
			216	0,640		3	0,560	77,414
E8			12	7,500		7	3,042	273,780
			12	3,000		7	3,042	109,512
			54	1,900		3	0,560	57,456
			216	0,640		3	0,560	77,414
E9			12	3,000		7	3,042	109,512
			12	7,500		7	3,042	273,780
			55	1,900		3	0,560	58,520
			220	0,640		3	0,560	78,848
E10			12	3,700		10	6,207	275,591
			12	8,000		10	6,207	595,872
			57	1,900		3	0,560	60,648
			285	0,640		3	0,560	102,144
E11 - E12			24	8,200		9	5,028	989,510
			24	5,700		6	2,235	305,748
			4	9,000		9	5,028	181,008
			74	1,900		3	0,560	78,736
			370	0,640		3	0,560	132,608
			94	1,900		3	0,560	100,016
			376	0,640		3	0,560	134,758
E13			12	5,500		7	3,042	200,772
			12	8,000		7	3,042	292,032
			81	1,900		3	0,560	86,184
			324	0,640		3	0,560	116,122
								0,000
E13'			12	5,400		6	2,235	144,828
			12	7,900		7	3,042	288,382

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			81	1,900		3	0,560	86,184
			324	0,640		3	0,560	116,122
F3			4	7,500		7	3,042	91,260
			8	7,400		6	2,235	132,312
			48	1,900		3	0,560	51,072
			192	0,640		3	0,560	68,813
								0,000
F4			4	2,600		8	3,973	41,319
			4	7,000		8	3,973	111,244
			8	4,400		7	3,042	107,078
			8	5,000		7	3,042	121,680
			50	1,900		3	0,560	53,200
			200	0,640		3	0,560	71,680
F5			12	7,750		7	3,042	282,906
			12	2,500		7	3,042	91,260
			52	1,900		3	0,560	55,328
			208	0,640		3	0,560	74,547
F6			12	3,000		7	3,042	109,512
			12	7,000		7	3,042	255,528
			53	1,900		3	0,560	56,392
			212	0,640		3	0,560	75,981
F7			12	3,000		7	3,042	109,512
			12	7,000		7	3,042	255,528
			51	1,900		3	0,560	54,264
			204	0,640		3	0,560	73,114
F8			4	3,500		7	3,042	42,588
			4	7,000		7	3,042	85,176
			12	7,800		8	3,973	371,873
			12	3,000		8	3,973	143,028
			54	1,900		3	0,560	57,456
			216	0,640		3	0,560	77,414
F9			4	8,000		7	3,042	97,344
			4	3,000		8	3,973	47,676
			8	4,000		8	3,973	127,136
			8	7,000		8	3,973	222,488
			55	1,900		3	0,560	58,520
			220	0,640		3	0,560	78,848
F10			4	8,000		6	2,235	71,520
			4	3,000		6	2,235	26,820
			8	4,000		7	3,042	97,344
			8	7,000		7	3,042	170,352
			55	1,900		3	0,560	58,520
			220	0,640		3	0,560	78,848
F12			12	5,500		7	3,042	200,772
			12	8,200		8	3,973	390,943

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			81	1,900		3	0,560	86,184
			324	0,640		3	0,560	116,122
			30	6,600		6	2,235	442,530
			30	8,200		9	5,028	1236,888
F11 - F13			4	6,050		9	5,028	121,678
			74	1,900		3	0,560	78,736
			370	0,640		3	0,560	132,608
			94	1,900		3	0,560	100,016
			376	0,640		3	0,560	134,758
			4	7,900		7	3,042	96,127
			4	5,500		6	2,235	49,170
			8	3,100		6	2,235	55,428
F13´			8	8,600		5	1,552	106,778
			8	2,200		5	1,552	27,315
			81	1,900		3	0,560	86,184
			324	0,640		3	0,560	116,122
MODULO 3 COLUMNAS								
			4	3,500		6	2,235	31,290
			4	7,000		6	2,235	62,580
A1			8	7,500		6	2,235	134,100
			8	3,000		6	2,235	53,640
			54	1,900		3	0,560	57,456
			216	0,640		3	0,560	77,414
			12	4,500		7	3,042	164,268
			12	6,000		7	3,042	219,024
A2			55	1,900		3	0,560	58,520
			220	0,640		3	0,560	78,848
			12	8,000		7	3,042	292,032
			12	3,000		7	3,042	109,512
A3			55	1,900		3	0,560	58,520
			220	0,640		3	0,560	78,848
			6	7,700		7	3,042	140,540
			6	3,000		7	3,042	54,756
			6	7,500		8	3,973	178,785
A4			6	3,500		8	3,973	83,433
			59	1,500		3	0,560	49,560
			236	0,540		3	0,560	71,366
			4	3,400		7	3,042	41,371
			4	7,500		7	3,042	91,260
			4	8,500		8	3,973	135,082
A5			4	3,000		8	3,973	47,676
			62	1,500		3	0,560	52,080
			124	0,540		3	0,560	37,498
			4	3,400		7	3,042	41,371
			4	7,500		7	3,042	91,260
A6			4	8,000		8	3,973	127,136

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			4	3,000		8	3,973	47,676
			61	1,500		3	0,560	51,240
			122	0,540		3	0,560	36,893
A7			4	3,400		7	3,042	41,371
			4	7,500		7	3,042	91,260
			4	8,800		8	3,973	139,850
			4	3,000		8	3,973	47,676
			62	1,500		3	0,560	52,080
			124	0,540		3	0,560	37,498
A8			12	3,500		8	3,973	166,866
			12	8,000		8	3,973	381,408
			58	1,900		3	0,560	61,712
			232	0,640		3	0,560	83,149
A9 - C10			24	3,500		8	3,973	333,732
			24	8,800		8	3,973	839,098
			118	1,900		3	0,560	125,552
			472	0,640		3	0,560	169,165
A10			8	3,500		8	3,973	111,244
			8	8,500		8	3,973	270,164
			4	7,800		7	3,042	94,910
			4	3,500		7	3,042	42,588
			60	1,900		3	0,560	63,840
			240	0,640		3	0,560	86,016
A10´			8	4,000		7	3,042	97,344
			8	8,000		7	3,042	194,688
			68	1,500		3	0,560	57,120
			136	0,540		3	0,560	41,126
B1			9	9,000		7	3,042	246,402
			59	1,500		3	0,560	49,560
			118	0,540		3	0,560	35,683
B2			12	8,500		6	2,235	227,970
			53	1,900		3	0,560	56,392
			212	0,640		3	0,560	75,981
B3 - B4			8	7,500		5	1,552	93,120
			8	2,500		5	1,552	31,040
			16	3,500		6	2,235	125,160
			16	7,000		6	2,235	250,320
			108	1,900		3	0,560	114,912
			432	0,640		3	0,560	154,829
B5			8	7,500		6	2,235	134,100
			8	3,000		6	2,235	53,640
			62	1,500		3	0,560	52,080
			124	0,540		3	0,560	37,498

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
B6			8	3,500		6	2,235	62,580
			8	7,000		6	2,235	125,160
			60	1,500		3	0,560	50,400
			120	0,540		3	0,560	36,288
B7			8	8,000		6	2,235	143,040
			8	3,000		6	2,235	53,640
			62	1,500		3	0,560	52,080
			124	0,540		3	0,560	37,498
B8			12	4,000		7	3,042	146,016
			12	7,000		7	3,042	255,528
			56	1,900		3	0,560	59,584
			224	0,640		3	0,560	80,282
B9			12	3,500		7	3,042	127,764
			12	7,500		7	3,042	273,780
			57	1,900		3	0,560	60,648
			228	0,640		3	0,560	81,715
B10			8	3,500		7	3,042	85,176
			8	7,800		7	3,042	189,821
			4	7,800		6	2,235	69,732
			4	3,500		6	2,235	31,290
			59	1,900		3	0,560	62,776
			236	0,640		3	0,560	84,582
B10´			4	3,500		7	3,042	42,588
			4	8,500		7	3,042	103,428
			4	7,800		6	2,235	69,732
			4	3,500		6	2,235	31,290
			68	1,500		3	0,560	57,120
			136	0,540		3	0,560	41,126
C1			12	4,000		6	2,235	107,280
			12	6,000		6	2,235	160,920
			52	1,900		3	0,560	55,328
			508	0,640		3	0,560	182,067
C2			12	9,000		10	6,207	670,356
			51	1,900		3	0,560	54,264
			255	0,640		3	0,560	91,392
C3			12	3,500		7	3,042	127,764
			12	6,500		7	3,042	237,276
			52	1,900		3	0,560	55,328
			208	0,640		3	0,560	74,547
C4			6	3,500		8	3,973	83,433
			6	7,000		8	3,973	166,866
			6	7,500		7	3,042	136,890
			6	2,500		7	3,042	45,630
			58	1,500		3	0,560	48,720

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			116	0,540		3	0,560	35,078
C5			4	8,000		8	3,973	127,136
			4	3,000		8	3,973	47,676
			4	3,500		7	3,042	42,588
			4	7,300		7	3,042	88,826
			59	1,500		3	0,560	49,560
			118	0,540		3	0,560	35,683
C6			4	4,000		8	3,973	63,568
			4	7,000		8	3,973	111,244
			4	8,000		7	3,042	97,344
			4	2,700		7	3,042	32,854
			61	1,500		3	0,560	51,240
			122	0,540		3	0,560	36,893
C7			4	8,000		8	3,973	127,136
			4	3,000		8	3,973	47,676
			4	3,500		7	3,042	42,588
			4	7,500		7	3,042	91,260
			61	1,500		3	0,560	51,240
			122	0,540		3	0,560	36,893
C8			12	3,500		8	3,973	166,866
			12	7,500		8	3,973	357,570
			55	1,900		3	0,560	58,520
			220	0,640		3	0,560	78,848
C9			12	3,500		8	3,973	166,866
			12	8,000		8	3,973	381,408
			56	1,900		3	0,560	59,584
			224	0,640		3	0,560	80,282
C10´			8	3,400		7	3,042	82,742
			8	8,000		7	3,042	194,688
			68	1,500		3	0,560	57,120
			136	0,540		3	0,560	41,126
E-2			7	3,500		7	3,042	74,529
			7	7,000		7	3,042	149,058
			7	7,000		6	2,235	109,515
			7	3,000		5	1,552	32,592
			68	2,100		3	0,560	79,968
			272	0,520		3	0,560	79,206
			68	0,940		3	0,560	35,795
C1			32	4,600		4	0,994	146,317
			176	0,900		3	0,560	88,704
			352	0,400		3	0,560	78,848
C1A			32	6,300		4	0,994	200,390
			228	0,900		3	0,560	114,912
			456	0,400		3	0,560	102,144

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
C2			16	4,700		5	1,552	116,710
			88	0,900		3	0,560	44,352
			176	0,400		3	0,560	39,424
C2A			16	6,400		5	1,552	158,925
			114	0,900		3	0,560	57,456
			228	0,400		3	0,560	51,072
VIGAS ENTREPISO								
V-200			3	5,200		5	1,552	24,211
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	5,000		6	2,235	22,350
			3	6,300		6	2,235	42,242
			2	5,000		5	1,552	15,520
			3	3,300		5	1,552	15,365
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	6,000		6	2,235	40,230
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		6	2,235	43,583
			2	5,500		7	3,042	33,462
			3	3,900		5	1,552	18,158
			3	6,500		6	2,235	43,583
			2	5,500		7	3,042	33,462
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,000		7	3,042	54,756
			2	5,000		6	2,235	22,350
			3	5,300		6	2,235	35,537
			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	9,400		5	1,552	43,766
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,500		5	1,552	16,296
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	6,000		6	2,235	40,230
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		6	2,235	36,878
			4	12,000		5	1,552	74,496
			3	12,000		5	1,552	55,872
			4	12,000		5	1,552	74,496
			3	12,000		6	2,235	80,460
			4	3,300		5	1,552	20,486
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	12,000		6	2,235	80,460
			2	5,000		4	0,994	9,940
			4	8,050		5	1,552	49,974
			3	10,000		6	2,235	67,050
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	9,500		6	2,235	63,698
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	6,000		6	2,235	40,230

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO HOSPITAL COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			285	1,700		3	0,560	271,320
			285	0,690		3	0,560	110,124
			173	1,700		3	0,560	164,696
			173	0,690		3	0,560	66,847
			173	1,740		3	0,560	168,571
			173	1,000		3	0,560	96,880
			2	6,500		5	1,552	20,176
			2	6,400		7	3,042	38,938
			2	4,000		8	3,973	31,784
			2	4,000		5	1,552	12,416
			2	6,300		6	2,235	28,161
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,600		7	3,042	40,154
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	4,600		5	1,552	14,278
			2	2,300		4	0,994	4,572
			2	9,000		6	2,235	40,230
			2	3,000		8	3,973	23,838
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,800		7	3,042	41,371
			2	3,500		6	2,235	15,645
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
VT-200			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	4,000		7	3,042	24,336
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	5,500		5	1,552	17,072
			2	3,300		5	1,552	10,243
			2	6,200		7	3,042	37,721
			2	11,000		7	3,042	66,924
			2	9,300		6	2,235	41,571
			2	5,700		6	2,235	25,479
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	5,500		5	1,552	17,072
			2	11,000		6	2,235	49,170
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	10,500		6	2,235	46,935
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	2,800		5	1,552	8,691

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			86	1,420		2	0,248	30,286
			256	1,480		3	0,560	212,173
			64	0,660		2	0,248	10,476
			16	0,720		3	0,560	6,451
								0,000
			3	5,300		6	2,235	35,537
			3	5,000		6	2,235	33,525
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,300		6	2,235	42,242
			3	5,000		6	2,235	33,525
			3	3,300		5	1,552	15,365
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	6,000		6	2,235	40,230
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		6	2,235	43,583
			2	5,500		7	3,042	33,462
			3	3,900		5	1,552	18,158
			3	6,500		6	2,235	43,583
			2	5,500		7	3,042	33,462
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,000		7	3,042	54,756
			2	9,000		6	2,235	40,230
			3	5,300		6	2,235	35,537
			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	5,500		7	3,042	50,193
	V-201		3	9,400		5	1,552	43,766
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,500		5	1,552	16,296
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	7,500		6	2,235	50,288
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	12,000		6	2,235	80,460
			2	5,000		4	0,994	9,940
			3	10,000		6	2,235	67,050
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	9,500		6	2,235	63,698
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	6,000		6	2,235	40,230
			453	1,700		3	0,560	431,256
			453	0,690		3	0,560	175,039
								0,000
			2	6,500		5	1,552	20,176
			2	6,400		7	3,042	38,938
			2	4,000		8	3,973	31,784
			2	4,000		5	1,552	12,416

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	6,600		7	3,042	40,154
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,600		7	3,042	40,154
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	4,600		5	1,552	14,278
			2	2,300		4	0,994	4,572
			2	9,000		6	2,235	40,230
			2	3,000		8	3,973	23,838
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,800		7	3,042	41,371
			2	3,500		6	2,235	15,645
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
VT-201			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	4,000		7	3,042	24,336
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	5,500		6	2,235	24,585
			2	3,300		5	1,552	10,243
			2	6,200		7	3,042	37,721
			2	11,000		7	3,042	66,924
			2	9,300		6	2,235	41,571
			2	6,000		7	3,042	36,504
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	5,500		5	1,552	17,072
			2	11,000		6	2,235	49,170
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	10,500		6	2,235	46,935
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	2,800		5	1,552	8,691
			70	1,420		2	0,248	24,651
			272	1,480		3	0,560	225,434
			48	0,660		2	0,248	7,857
			16	0,720		3	0,560	6,451
			3	4,300		6	2,235	28,832
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	5,800		7	3,042	52,931
			3	5,800		7	3,042	52,931
			3	9,000		6	2,235	60,345

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	5,800		7	3,042	52,931
V-202			3	5,900		7	3,042	53,843
			3	5,500		5	1,552	25,608
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	9,600		6	2,235	64,368
			3	7,100		6	2,235	47,606
			185	1,700		3	0,560	176,120
			185	0,690		3	0,560	71,484
			2	6,500		4	0,994	12,922
			2	5,800		5	1,552	18,003
			2	3,500		5	1,552	10,864
			2	6,500		4	0,994	12,922
VT-204			2	5,000		4	0,994	9,940
			2	12,000		4	0,994	23,856
			2	5,000		4	0,994	9,940
			2	6,000		4	0,994	11,928
			64	1,420		2	0,248	22,538
			2	6,500		5	1,552	20,176
			2	6,400		7	3,042	38,938
			2	4,000		8	3,973	31,784
			2	4,000		5	1,552	12,416
			2	6,600		7	3,042	40,154
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,600		7	3,042	40,154
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	4,600		5	1,552	14,278
			2	2,300		4	0,994	4,572
			2	9,000		6	2,235	40,230
			2	3,000		8	3,973	23,838
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,800		7	3,042	41,371
			2	3,500		6	2,235	15,645
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
VT-202			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,400		7	3,042	38,938
			2	4,000		7	3,042	24,336
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	5,500		6	2,235	24,585
			2	3,300		5	1,552	10,243
			2	6,200		7	3,042	37,721

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	11,000		7	3,042	66,924
			2	9,300		6	2,235	41,571
			2	6,000		7	3,042	36,504
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	5,500		5	1,552	17,072
			2	11,000		6	2,235	49,170
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	10,500		6	2,235	46,935
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	2,800		5	1,552	8,691
			86	1,420		2	0,248	30,286
			256	1,480		3	0,560	212,173
			64	0,660		2	0,248	10,476
			16	0,720		3	0,560	6,451
			3	8,600		7	3,042	78,484
			2	3,900		6	2,235	17,433
			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	6,500		5	1,552	30,264
			3	6,300		6	2,235	42,242
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	5,800		6	2,235	38,889
			3	5,300		6	2,235	35,537
	V-203		3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		7	3,042	59,319
			2	5,000		6	2,235	22,350
			2	3,600		5	1,552	11,174
			3	8,100		6	2,235	54,311
			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	10,000		6	2,235	67,050
			3	6,200		6	2,235	41,571
			221	1,700		3	0,560	210,392
			221	0,690		3	0,560	85,394
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	5,800		8	3,973	69,130
			3	6,600		6	2,235	44,253
	V-204		3	3,500		7	3,042	31,941
			3	6,900		7	3,042	62,969
			3	12,000		7	3,042	109,512
			116	1,700		3	0,560	110,432
			116	0,690		3	0,560	44,822
								0,000

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	6,500		5	1,552	20,176
			2	6,400		7	3,042	38,938
			2	4,000		8	3,973	31,784
			2	6,600		7	3,042	40,154
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,600		7	3,042	40,154
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	4,600		5	1,552	14,278
			2	2,300		4	0,994	4,572
			2	9,400		7	3,042	57,190
			2	3,000		8	3,973	23,838
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,800		7	3,042	41,371
			2	3,500		6	2,235	15,645
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		7	3,042	23,119
		VT-203	2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,400		7	3,042	38,938
			2	4,000		7	3,042	24,336
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	5,500		6	2,235	24,585
			2	3,300		5	1,552	10,243
			2	6,200		7	3,042	37,721
			2	11,000		7	3,042	66,924
			2	9,300		6	2,235	41,571
			2	6,000		7	3,042	36,504
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	5,500		6	2,235	24,585
			2	11,000		6	2,235	49,170
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	10,500		6	2,235	46,935
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	12,000		6	2,235	53,640
			2	2,800		5	1,552	8,691
			86	1,420		2	0,248	30,286
			256	1,480		3	0,560	212,173
			64	0,660		2	0,248	10,476
			32	0,720		3	0,560	12,902
			2	4,000		5	1,552	12,416
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	3,600		8	3,973	42,908
			3	5,800		8	3,973	69,130

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
V-205			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	5,800		8	3,973	69,130
			2	3,500		7	3,042	21,294
			1	3,500		8	3,973	13,906
			3	6,500		7	3,042	59,319
			3	3,000		7	3,042	27,378
			3	7,000		7	3,042	63,882
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			100	1,780		4	0,994	176,932
			12	1,700		3	0,560	11,424
			100	0,770		4	0,994	76,538
			12	0,690		3	0,560	4,637
V-206			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,300		8	3,973	87,009
			3	5,800		8	3,973	69,130
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	5,800		7	3,042	52,931
			3	3,600		6	2,235	24,138
			3	3,600		6	2,235	24,138
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			100	1,780		4	0,994	176,932
			12	1,700		3	0,560	11,424
			100	0,770		4	0,994	76,538
			12	0,690		3	0,560	4,637
V-207			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,300		8	3,973	87,009
			3	5,800		8	3,973	69,130
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	5,800		7	3,042	52,931
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	3,600		6	2,235	24,138
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			100	1,780		4	0,994	176,932
			12	1,700		3	0,560	11,424
			100	0,770		4	0,994	76,538
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		9	5,028	181,008
			3	7,400		9	5,028	111,622
			3	3,600		9	5,028	54,302
			3	5,800		9	5,028	87,487

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	3,600		9	5,028	54,302
			3	3,600		9	5,028	54,302
			3	5,800		9	5,028	87,487
V-208			3	3,600		9	5,028	54,302
			3	7,400		9	5,028	111,622
			3	12,000		9	5,028	181,008
			2	5,000		7	3,042	30,420
			2	6,000		7	3,042	36,504
			104	1,700		3	0,560	99,008
			104	0,690		3	0,560	40,186
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,300		8	3,973	87,009
			3	3,600		8	3,973	42,908
			3	5,800		8	3,973	69,130
V-209			3	7,100		8	3,973	84,625
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	12,000		7	3,042	109,512
			118	1,700		3	0,560	112,336
			118	0,690		3	0,560	45,595
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	6,600		6	2,235	44,253
V-210			3	12,000		6	2,235	80,460
			52	1,700		3	0,560	49,504
			52	0,690		3	0,560	20,093
			3	5,800		7	3,042	52,931
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,300		8	3,973	87,009
			3	5,800		8	3,972	69,113
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	3,600		7	3,042	32,854
			2	3,600		6	2,235	16,092
V-211			2	3,600		6	2,235	16,092
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	12,000		6	2,235	53,640
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			100	1,780		4	0,994	176,932
			12	1,700		3	0,560	11,424
			100	0,770		4	0,994	76,538
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,300		8	3,973	87,009
			3	5,800		8	3,973	69,130
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	3,600		7	3,042	32,854
V-212			3	5,800		7	3,042	52,931

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	3,600		6	2,235	16,092
			2	3,600		6	2,235	16,092
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	12,000		6	2,235	53,640
			100	1,780		4	0,994	176,932
			12	1,700		3	0,560	11,424
			100	0,770		4	0,994	76,538
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,300		8	3,973	87,009
			3	5,800		8	3,973	69,130
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	5,800		7	3,042	52,931
V-213			2	3,600		6	2,235	16,092
			2	3,600		6	2,235	16,092
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	12,000		6	2,235	53,640
			100	1,780		4	0,994	176,932
			12	1,700		3	0,560	11,424
			100	0,770		4	0,994	76,538
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,300		8	3,973	87,009
			3	5,800		8	3,973	69,130
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	3,600		7	3,042	32,854
			3	5,800		7	3,042	52,931
V-214			2	3,600		6	2,235	16,092
			2	3,600		6	2,235	16,092
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	12,000		6	2,235	53,640
			100	1,780		4	0,994	176,932
			12	1,700		3	0,560	11,424
			100	0,770		4	0,994	76,538
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,300		8	3,973	87,009
			3	3,600		8	3,973	42,908
			3	7,100		8	3,973	84,625
			3	5,800		9	5,028	87,487
V-215			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	12,000		7	3,042	109,512
			2	6,000		6	2,235	26,820
			118	1,700		3	0,560	112,336
			118	0,690		3	0,560	45,595

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
								0,000
V-216			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	8,600		5	1,552	40,042
			3	8,600		5	1,552	40,042
			3	12,000		5	1,552	55,872
			94	1,700		3	0,560	89,488
			94	0,690		3	0,560	36,322
MODULO 2 VIGAS ENTREPISO								
V-130			3	3,800		6	2,235	25,479
			2	3,300		6	2,235	14,751
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,400		6	2,235	42,912
			2	5,500		7	3,042	33,462
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,400		5	1,552	15,830
			3	7,300		6	2,235	48,947
			3	5,000		7	3,042	45,630
			3	3,000		5	1,552	13,968
			3	7,300		6	2,235	48,947
			3	5,500		7	3,042	50,193
			3	3,400		5	1,552	15,830
			3	10,300		7	3,042	93,998
			2	10,000		7	3,042	60,840
			3	3,500		5	1,552	16,296
			3	7,000		6	2,235	46,935
			3	5,500		7	3,042	50,193
			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	6,700		7	3,042	61,144
			2	5,500		6	2,235	24,585
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		7	3,042	59,319
			2	5,500		6	2,235	24,585
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	8,000		6	2,235	53,640
			3	8,000		5	1,552	37,248
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	12,000		6	2,235	80,460
			2	5,000		4	0,994	9,940
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	10,000		6	2,235	67,050
			3	10,000		7	3,042	91,260
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	10,000		7	3,042	91,260
			3	5,200		7	3,042	47,455
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	7,200		7	3,042	65,707
			407	1,700		3	0,560	387,464
			407	0,690		3	0,560	157,265
			2	6,500		4	0,994	12,922
			3	7,000		6	2,235	46,935
			3	3,800		6	2,235	25,479

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	7,100		6	2,235	47,606
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	2,000		4	0,994	3,976
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	9,300		5	1,552	43,301
			3	7,000		4	0,994	20,874
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	5,800		6	2,235	38,889
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		4	0,994	7,554
	VT-130		3	5,300		5	1,552	24,677
			3	3,000		4	0,994	8,946
			2	2,800		4	0,994	5,566
			2	5,500		6	2,235	24,585
			3	8,600		6	2,235	57,663
			2	4,800		5	1,552	14,899
			2	12,000		4	0,994	23,856
			2	5,500		5	1,552	17,072
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	5,000		5	1,552	15,520
			2	4,600		5	1,552	14,278
			2	5,000		5	1,552	15,520
			2	7,200		5	1,552	22,349
			2	5,800		4	0,994	11,530
			2	5,000		5	1,552	15,520
			3	7,500		5	1,552	34,920
			2	5,300		4	0,994	10,536
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	5,300		4	0,994	10,536
			3	7,900		4	0,994	23,558
			2	4,800		5	1,552	14,899
			2	8,000		6	2,235	35,760
			2	4,800		4	0,994	9,542
			44	1,420		2	0,248	15,495
			272	1,480		3	0,560	225,434
			16	0,720		3	0,560	6,451
								0,000
			3	3,800		6	2,235	25,479
			2	3,300		7	3,042	20,077
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,400		6	2,235	42,912

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	5,500		7	3,042	50,193
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		7	3,042	50,193
			3	3,400		5	1,552	15,830
			3	7,300		6	2,235	48,947
			3	5,000		7	3,042	45,630
			3	3,000		5	1,552	13,968
			3	7,300		6	2,235	48,947
			3	5,500		7	3,042	50,193
			3	3,400		5	1,552	15,830
			3	10,300		7	3,042	93,998
			3	10,000		6	2,235	67,050
			3	3,500		5	1,552	16,296
			3	7,000		6	2,235	46,935
			3	5,500		7	3,042	50,193
			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	6,700		7	3,042	61,144
		V-131	2	5,500		6	2,235	24,585
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		7	3,042	59,319
			2	5,500		6	2,235	24,585
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	8,000		6	2,235	53,640
			3	8,000		5	1,552	37,248
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	7,400		7	3,042	67,532
			2	5,000		4	0,994	9,940
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	10,000		7	3,042	91,260
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	10,000		7	3,042	91,260
			3	5,000		6	2,235	33,525
			3	12,000		6	2,235	80,460
			386	1,700		3	0,560	367,472
			386	0,690		3	0,560	149,150
			21	1,780		4	0,994	37,156
			21	0,770		4	0,994	16,073
			2	6,500		4	0,994	12,922
			2	7,000		7	3,042	42,588
			1	3,500		7	3,042	10,647
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	3,000		4	0,994	5,964
			2	5,800		6	2,235	25,926
			1	2,800		6	2,235	6,258
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	3,800		4	0,994	7,554
			2	5,800		6	2,235	25,926
			1	3,000		6	2,235	6,705
			3	3,800		5	1,552	17,693

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	3,000		4	0,994	5,964
			2	6,800		6	2,235	30,396
			1	2,500		6	2,235	5,588
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		4	0,994	7,554
			2	9,300		5	1,552	28,867
			1	6,300		5	1,552	9,778
			2	3,800		5	1,552	11,795
			3	3,800		4	0,994	11,332
			2	3,800		4	0,994	7,554
			2	5,800		6	2,235	25,926
			1	3,000		6	2,235	6,705
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	3,000		4	0,994	5,964
			2	7,800		7	3,042	47,455
	VT-131		1	2,500		7	3,042	7,605
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,000		4	0,994	5,964
			2	3,500		6	2,235	15,645
			1	2,300		6	2,235	5,141
			3	2,300		5	1,552	10,709
			1	5,500		8	3,973	21,852
			2	8,300		7	3,042	50,497
			1	4,800		6	2,235	10,728
			2	10,800		4	0,994	21,470
			1	4,500		6	2,235	10,058
			2	7,000		5	1,552	21,728
			1	3,500		4	0,994	3,479
			2	5,000		4	0,994	9,940
			2	10,800		4	0,994	21,470
			1	5,300		7	3,042	16,123
			2	7,800		5	1,552	24,211
			2	3,800		4	0,994	7,554
			2	5,500		4	0,994	10,934
			1	4,300		5	1,552	6,674
			2	7,800		5	1,552	24,211
			1	3,800		4	0,994	3,777
			2	5,300		4	0,994	10,536
			2	12,000		4	0,994	23,856
			1	4,800		6	2,235	10,728
			2	7,000		4	0,994	13,916
			29	1,420		2	0,248	10,213
			240	1,480		3	0,560	198,912
			16	0,720		3	0,560	6,451
			3	3,800		6	2,235	25,479
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	3,300		5	1,552	10,243
			3	6,400		6	2,235	42,912
			2	5,500		6	2,235	24,585
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		6	2,235	36,878

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	3,400		5	1,552	15,830
			3	7,300		6	2,235	48,947
			3	5,000		7	3,042	45,630
			3	3,000		5	1,552	13,968
			3	7,300		6	2,235	48,947
			3	5,500		7	3,042	50,193
			3	3,400		5	1,552	15,830
			3	10,300		7	3,042	93,998
			3	10,000		6	2,235	67,050
			3	3,500		5	1,552	16,296
			3	7,000		6	2,235	46,935
			3	5,500		7	3,042	50,193
			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	6,700		7	3,042	61,144
			2	5,500		6	2,235	24,585
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		7	3,042	59,319
	V-132		2	5,500		6	2,235	24,585
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	8,000		6	2,235	53,640
			3	8,000		5	1,552	37,248
			4	12,000		5	1,552	74,496
			3	12,000		5	1,552	55,872
			4	12,000		5	1,552	74,496
			3	12,000		5	1,552	55,872
			4	3,300		5	1,552	20,486
			3	6,100		5	1,552	28,402
			2	5,000		4	0,994	9,940
			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	5,200		5	1,552	24,211
			2	5,800		7	3,042	35,287
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	10,000		6	2,235	67,050
			3	4,800		6	2,235	32,184
			3	12,000		6	2,235	80,460
			245	1,700		3	0,560	233,240
			245	0,690		3	0,560	94,668
			163	1,700		3	0,560	155,176
			163	0,690		3	0,560	62,983
			163	1,740		3	0,560	158,827
			163	1,000		3	0,560	91,280
			4	8,050		5	1,552	49,974
			2	6,500		4	0,994	12,922
			3	7,000		6	2,235	46,935
			3	3,800		7	3,042	34,679
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	7,100		6	2,235	47,606
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	2,000		4	0,994	3,976
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	3,000		4	0,994	5,964

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	9,300		5	1,552	43,301
			3	7,000		4	0,994	20,874
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	5,800		6	2,235	38,889
			3	3,800		6	2,235	25,479
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		4	0,994	7,554
		VT-132	3	5,300		5	1,552	24,677
			3	3,000		4	0,994	8,946
			2	2,800		4	0,994	5,566
			2	5,500		6	2,235	24,585
			3	8,600		6	2,235	57,663
			2	4,800		5	1,552	14,899
			2	12,000		4	0,994	23,856
			2	5,500		5	1,552	17,072
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	5,000		5	1,552	15,520
			2	4,600		5	1,552	14,278
			2	5,000		6	2,235	22,350
			2	7,200		5	1,552	22,349
			2	5,800		4	0,994	11,530
			2	5,000		5	1,552	15,520
			3	7,500		5	1,552	34,920
			2	5,300		4	0,994	10,536
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	5,300		4	0,994	10,536
			3	7,900		4	0,994	23,558
			2	4,800		5	1,552	14,899
			2	8,000		6	2,235	35,760
			2	4,800		4	0,994	9,542
			44	1,420		2	0,248	15,495
			272	1,480		3	0,560	225,434
			16	0,720		3	0,560	6,451
			2	6,500		4	0,994	12,922
			3	7,000		6	2,235	46,935
			3	3,800		7	3,042	34,679
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	7,100		6	2,235	47,606
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	2,000		4	0,994	3,976
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	6,800		6	2,235	45,594

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	9,300		5	1,552	43,301
			3	7,000		4	0,994	20,874
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	5,800		6	2,235	38,889
			3	3,800		7	3,042	34,679
			2	3,000		4	0,994	5,964
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	4,000		6	2,235	26,820
			2	3,800		4	0,994	7,554
VT-133			3	5,300		5	1,552	24,677
			3	3,000		4	0,994	8,946
			2	2,800		4	0,994	5,566
			2	5,500		6	2,235	24,585
			3	8,600		6	2,235	57,663
			2	4,800		5	1,552	14,899
			2	12,000		4	0,994	23,856
			2	5,500		5	1,552	17,072
			2	5,000		5	1,552	15,520
			2	4,600		5	1,552	14,278
			2	5,000		6	2,235	22,350
			2	7,200		5	1,552	22,349
			2	5,800		4	0,994	11,530
			2	5,000		5	1,552	15,520
			3	7,500		5	1,552	34,920
			2	5,300		4	0,994	10,536
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	5,300		4	0,994	10,536
			3	7,900		4	0,994	23,558
			2	4,800		5	1,552	14,899
			2	8,000		6	2,235	35,760
			2	4,800		4	0,994	9,542
			44	1,420		2	0,248	15,495
			272	1,480		3	0,560	225,434
			16	0,720		3	0,560	6,451
			3	12,000		4	0,994	35,784
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	6,900		6	2,235	46,265
			3	3,300		6	2,235	22,127
			3	3,300		7	3,042	30,116
			3	5,500		7	3,042	50,193
V-133			2	4,500		4	0,994	8,946
			2	4,500		4	0,994	8,946
			3	6,500		5	1,552	30,264
			3	12,000		5	1,552	55,872
			80	1,700		3	0,560	76,160
			80	0,690		3	0,560	30,912
			8	6,500		4	0,994	51,688

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			4	9,500		6	2,235	84,930
			4	8,500		7	3,042	103,428
			8	3,000		4	0,994	23,856
VT-133A			4	6,800		8	3,973	108,066
			4	8,500		7	3,042	103,428
			8	9,500		4	0,994	75,544
			176	1,580		3	0,560	155,725
			176	0,670		3	0,560	66,035
			8	2,500		4	0,994	19,880
VT-133B			8	2,500		4	0,994	19,880
			24	1,580		3	0,560	21,235
			24	0,670		3	0,560	9,005
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,400		8	3,973	88,201
			3	3,400		8	3,973	40,525
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	6,000		8	3,973	71,514
			3	3,400		8	3,973	40,525
			3	7,200		8	3,973	85,817
V-134			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	5,500		9	5,028	82,962
			3	3,500		9	5,028	52,794
			3	7,200		6	2,235	48,276
			3	12,000		6	2,235	80,460
			99	1,780		4	0,994	175,163
			99	0,770		4	0,994	75,773
			12	1,700		3	0,560	11,424
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,400		8	3,973	88,201
			3	3,400		8	3,973	40,525
			3	5,500		8	3,973	65,555
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	6,000		7	3,042	54,756
			3	7,000		7	3,042	63,882
V-135			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	3,500		6	2,235	23,468
			3	3,500		6	2,235	23,468
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	12,000		6	2,235	80,460
			99	1,780		4	0,994	175,163
			99	0,770		4	0,994	75,773
			12	1,700		3	0,560	11,424
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	5,500		8	3,973	65,555
			3	6,000		8	3,973	71,514

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO HOSPITAL COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
V-136			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	3,500		7	3,042	31,941
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	12,000		6	2,235	53,640
			99	1,780		4	0,994	175,163
			99	0,770		4	0,994	75,773
			12	1,700		3	0,560	11,424
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	5,500		8	3,973	65,555
			3	6,000		8	3,973	71,514
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
V-137			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	3,500		7	3,042	31,941
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	12,000		6	2,235	53,640
			99	1,780		4	0,994	175,163
			99	0,770		4	0,994	75,773
			12	1,700		3	0,560	11,424
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,400		8	3,973	88,201
			3	5,500		8	3,973	65,555
			3	3,400		7	3,042	31,028
			3	3,600		7	3,042	32,854
V-138			3	7,200		7	3,042	65,707
			3	12,000		7	3,042	109,512
			2	4,500		6	2,235	20,115
			2	4,000		6	2,235	17,880
			116	1,700		3	0,560	110,432
			116	0,690		3	0,560	44,822
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,400		8	3,973	88,201
			3	5,500		8	3,973	65,555
			3	3,400		7	3,042	31,028
			3	3,600		7	3,042	32,854
V-139			3	7,200		7	3,042	65,707
			3	12,000		7	3,042	109,512
			2	4,500		6	2,235	20,115
			2	4,000		6	2,235	17,880
			117	1,700		3	0,560	111,384
			117	0,690		3	0,560	45,209

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
V-140			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	5,500		8	3,973	65,555
			3	6,000		8	3,973	71,514
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	3,500		7	3,042	31,941
			2	6,800		6	3,042	41,371
			2	12,000		6	3,042	73,008
			99	1,780		4	2,235	393,852
			99	0,770		4	2,235	170,374
			12	1,700		3	0,560	11,424
			12	0,690		3	0,560	4,637
V-141			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	6,000		7	3,042	54,756
			2	12,000		7	3,042	73,008
			3	7,100		7	3,042	64,795
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,000		8	3,973	71,514
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	12,000		8	3,973	143,028
			99	1,700		3	0,560	94,248
			99	0,690		3	0,560	38,254
V-142			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	6,000		8	3,973	71,514
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	5,500		9	5,028	82,962
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	3,500		7	3,042	31,941
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	12,000		6	2,235	53,640
			99	1,780		4	0,994	175,163
			99	0,770		4	0,994	75,773
			12	1,700		3	0,540	11,016
			12	0,690		3	0,540	4,471
V-143			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	5,500		9	5,028	82,962

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO HOSPITAL COVEÑAS 2023			HOSPITAL DE COVEÑAS			MEMORIA DE CANTIDADES		
OBJETO:			CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE					
ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			107	1,700		3	0,560	101,864
			107	0,690		3	0,560	41,345
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	9,200		7	3,042	83,959
			3	8,900		6	2,235	59,675
V144			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	12,000		5	1,552	55,872
			14	2,000		3	0,560	15,680
			80	1,700		3	0,560	76,160
			108	0,690		3	0,560	41,731
MODULO 3 PLACA ENTREPISO								
			3	4,800		5	1,552	22,349
			2	2,500		6	2,235	11,175
			3	5,700		6	2,235	38,219
			2	4,500		5	1,552	13,968
			3	12,000		5	1,552	55,872
			4	5,800		6	2,235	51,852
			3	6,700		7	3,042	61,144
			2	5,300		6	2,235	23,691
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		7	3,042	59,319
			2	4,500		5	1,552	13,968
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	6,800		7	3,042	41,371
			2	5,300		7	3,042	32,245
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,800		7	3,042	62,057
V-160			2	5,000		6	2,235	22,350
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	10,500		7	3,042	95,823
			2	8,500		6	2,235	37,995
			3	9,800		7	3,042	89,435
			3	7,000		5	1,552	32,592
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	11,000		6	2,235	73,755
			3	7,600		6	2,235	50,958
			3	11,000		6	2,235	73,755
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	8,500		7	3,042	77,571
			3	10,300		6	2,235	69,062
			2	4,500		6	2,235	20,115
			386	1,700		3	0,560	367,472
			386	0,690		3	0,560	149,150
			2	4,300		4	0,994	8,548
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	3,300		4	0,994	9,841
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		4	0,994	7,554

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	9,300		5	1,552	43,301
	VT-160		2	6,800		4	0,994	13,518
			3	10,000		4	0,994	29,820
			3	3,300		4	0,994	9,841
			1	3,800		4	0,994	3,777
			2	12,000		4	0,994	23,856
			3	5,300		4	0,994	15,805
			2	11,000		4	0,994	21,868
			2	4,800		4	0,994	9,542
			2	4,800		4	0,994	9,542
			2	12,000		4	0,994	23,856
			1	3,800		4	0,994	3,777
			2	7,000		5	1,552	21,728
			2	4,800		4	0,994	9,542
			2	12,000		4	0,994	23,856
			3	5,800		4	0,994	17,296
			2	10,300		4	0,994	20,476
			2	5,500		4	0,994	10,934
			3	8,800		5	1,552	40,973
			2	4,300		4	0,994	8,548
			274	1,420		2	0,248	96,492
			209	0,660		2	0,248	34,209
			2	4,300		5	1,552	13,347
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	3,300		4	0,994	9,841
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		6	2,235	26,820

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	9,300		5	1,552	43,301
		VT-161	3	6,800		4	0,994	20,278
			3	10,000		4	0,994	29,820
			3	3,300		5	1,552	15,365
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	5,300		4	0,994	10,536
			3	10,000		4	0,994	29,820
			2	4,800		4	0,994	9,542
			2	4,800		4	0,994	9,542
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	4,500		4	0,994	8,946
			2	7,000		5	1,552	21,728
			2	4,800		4	0,994	9,542
			3	12,000		4	0,994	35,784
			3	5,800		4	0,994	17,296
			3	10,300		4	0,994	30,715
			2	5,500		5	1,552	17,072
			3	8,800		5	1,552	40,973
			3	4,300		4	0,994	12,823
			258	1,420		2	0,248	90,857
			16	1,480		3	0,560	13,261
			209	0,660		2	0,248	34,209
			3	2,800		7	3,042	25,553
			3	10,000		5	1,552	46,560
			3	5,000		6	2,235	33,525
			3	10,000		5	1,552	46,560
			3	5,800		7	3,042	52,931
			3	6,000		5	1,552	27,936
			3	5,800		6	2,235	38,889
			3	10,800		5	1,552	50,285
			3	5,800		6	2,235	38,889
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	8,000		6	2,235	53,640
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	9,000		6	2,235	60,345
		V-161	3	10,000		6	2,235	67,050
			3	10,700		6	2,235	71,744
			3	7,100		6	2,235	47,606
			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	9,400		5	1,552	43,766
			3	9,200		5	1,552	42,835
			3	9,200		5	1,552	42,835
			3	6,000		5	1,552	27,936
			3	12,000		5	1,552	55,872
			2	8,000		6	2,235	35,760
			3	9,800		6	2,235	65,709
			3	10,000		5	1,552	46,560
			2	5,000		6	2,235	22,350
			358	1,700		3	0,560	340,816
			358	0,690		3	0,560	138,331

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	4,300		4	0,994	8,548
			3	5,800		4	0,994	17,296
			3	3,300		5	1,552	15,365
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		4	0,994	7,554
			3	9,300		5	1,552	43,301
	VT-162		3	6,800		4	0,994	20,278
			3	10,000		4	0,994	29,820
			3	3,300		4	0,994	9,841
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	5,300		4	0,994	10,536
			3	10,000		4	0,994	29,820
			2	4,800		4	0,994	9,542
			3	4,800		4	0,994	14,314
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	4,500		4	0,994	8,946
			2	7,000		5	1,552	21,728
			2	4,800		4	0,994	9,542
			3	12,000		4	0,994	35,784
			3	5,800		4	0,994	17,296
			3	10,300		4	0,994	30,715
			2	5,500		4	0,994	10,934
			3	8,800		5	1,552	40,973
			3	4,300		4	1,552	20,021
			258	1,420		2	0,248	90,857
			17	1,480		3	0,560	14,090
			190	0,660		2	0,248	31,099
			2	4,300		5	1,552	13,347
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	3,300		4	0,994	9,841
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		6	2,235	26,820
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		6	2,235	26,820
			3	3,800		4	0,994	11,332

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	4,000		5	1,552	18,624
			3	3,800		4	0,994	11,332
			3	9,300		5	1,552	43,301
		VT-163	3	6,800		4	0,994	20,278
			3	10,000		4	0,994	29,820
			3	3,300		5	1,552	15,365
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	5,300		4	0,994	10,536
			3	10,000		4	0,994	29,820
			2	4,800		4	0,994	9,542
			3	4,800		4	0,994	14,314
			3	12,000		4	0,994	35,784
			2	4,500		4	0,994	8,946
			2	7,000		5	1,552	21,728
			2	4,800		4	0,994	9,542
			3	12,000		4	0,994	35,784
			3	5,800		4	0,994	17,296
			3	10,100		4	0,994	30,118
			2	5,500		4	0,994	10,934
			3	8,800		5	1,552	40,973
			3	4,500		4	0,994	13,419
			209	1,420		2	0,248	73,601
			65	1,480		3	0,560	53,872
			128	0,660		2	0,248	20,951
			3	4,800		5	1,552	22,349
			2	2,500		6	2,235	11,175
			3	5,700		6	2,235	38,219
			2	4,500		5	1,552	13,968
			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	5,800		5	1,552	27,005
			3	6,700		6	2,235	44,924
			2	5,300		5	1,552	16,451
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		7	3,042	59,319
			2	4,500		5	1,552	13,968
			3	3,800		5	1,552	17,693
			2	6,800		7	3,042	41,371
			2	5,300		7	3,042	32,245
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,800		7	3,042	62,057
			2	5,000		6	2,235	22,350
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	10,500		7	3,042	95,823
			2	8,500		6	2,235	37,995
		V-162	3	9,800		6	2,235	65,709

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	7,100		6	2,235	47,606
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	11,000		6	2,235	73,755
			4	12,000		5	1,552	74,496
			3	7,600		6	2,235	50,958
			4	12,000		5	1,552	74,496
			3	11,000		6	2,235	73,755
			4	3,300		5	1,552	20,486
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	6,500		6	2,235	43,583
			4	6,650		5	1,552	41,283
			2	5,000		5	1,552	15,520
			3	8,800		7	3,042	80,309
			3	10,000		6	2,235	67,050
			2	4,500		6	2,235	20,115
			217	1,700		3	0,560	206,584
			217	0,690		3	0,560	83,849
			170	1,700		3	0,560	161,840
			170	0,690		3	0,560	65,688
			170	1,740		3	0,560	165,648
			170	1,000		3	0,560	95,200
V-163			3	4,300		6	2,235	28,832
			3	4,200		5	1,552	19,555
			3	4,000		5	1,552	18,624
			3	6,500		6	2,235	43,583
			2	5,000		6	2,235	22,350
			3	7,600		5	1,552	35,386
			3	3,000		6	2,235	20,115
			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	8,800		5	1,552	40,973
			14	2,000		3	0,560	15,680
			80	1,700		3	0,560	76,160
			108	0,690		3	0,560	41,731
								0,000
V-164			1	3,500		8	3,973	13,906
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			1	6,000		8	3,973	23,838
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	6,000		7	3,042	54,756
			3	7,100		7	3,042	64,795
			3	12,000		7	3,042	109,512
			2	7,000		6	2,235	31,290
			2	12,000		6	2,235	53,640
			52	1,700		3	0,560	49,504
			52	0,690		3	0,560	20,093
			45	1,780		4	0,994	79,619
			45	0,770		4	0,994	34,442
								0,000
			1	3,500		8	3,973	13,906
			3	12,000		8	3,973	143,028

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO HOSPITAL COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,000		8	3,973	71,514
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	6,000		7	3,042	54,756
			1	3,500		7	3,042	10,647
			3	3,500		7	3,042	31,941
	V-165		2	7,000		7	3,042	42,588
			2	12,000		7	3,042	73,008
			3	7,100		7	3,042	64,795
			3	12,000		7	3,042	109,512
			89	1,780		4	0,994	157,469
			89	0,770		4	0,994	68,119
			12	1,700		3	0,560	11,424
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,000		8	3,973	71,514
			3	3,500		8	3,973	41,717
			1	3,500		7	3,042	10,647
			3	6,000		7	3,042	54,756
			3	3,500		7	3,042	31,941
	V-166		2	7,000		7	3,042	42,588
			3	7,100		7	3,042	64,795
			6	12,000		7	3,042	219,024
			6	12,000		7	3,042	219,024
			2	3,500		6	2,235	15,645
			89	1,780		4	0,994	157,469
			89	0,770		4	0,994	68,119
			12	1,700		3	0,560	11,424
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,000		8	3,973	71,514
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	6,000		7	3,042	54,756
			1	3,500		7	3,042	10,647
			3	3,500		7	3,042	31,941
	V-167		2	7,000		7	3,042	42,588
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	7,100		7	3,042	64,795
			3	12,000		7	3,042	109,512
			90	1,780		4	0,994	159,239
			90	0,770		4	0,994	68,884
			11	1,700		3	0,560	10,472
			11	0,690		3	0,560	4,250
			1	3,500		6	2,235	7,823
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,000		8	3,973	71,514
			1	3,500		7	3,042	10,647
			3	3,500		7	3,042	31,941

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	3,500		7	3,042	31,941
			1	3,500		7	3,042	10,647
			2	7,000		7	3,042	42,588
	V-168		3	12,000		7	3,042	109,512
			3	7,100		7	3,042	64,795
			3	12,000		7	3,042	109,512
			2	6,000		6	2,235	26,820
			74	1,780		4	0,994	130,930
			74	0,770		4	0,994	56,638
			15	1,700		3	0,560	14,280
			15	0,690		3	0,560	5,796
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,000		8	3,973	71,514
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	12,000		8	3,973	143,028
			1	3,500		7	3,042	10,647
			3	3,500		7	3,042	31,941
	V-169		3	3,500		7	3,042	31,941
			1	3,500		7	3,042	10,647
			3	6,000		7	3,042	54,756
			2	5,000		6	2,235	22,350
			86	1,780		4	0,994	152,162
			86	0,770		4	0,994	65,823
			12	1,700		3	0,560	11,424
			12	0,690		3	0,560	4,637
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	6,000		7	3,042	54,756
	V-170		2	4,600		6	2,235	20,562
			2	4,600		6	2,235	20,562
			3	7,000		6	2,235	46,935
			3	12,000		6	2,235	80,460
			95	1,700		3	0,560	90,440
			95	0,690		3	0,560	36,708
			3	12,000		8	3,973	143,028
			1	3,500		8	3,973	13,906
			3	7,200		7	3,042	65,707
			2	3,500		7	3,042	21,294
			3	6,000		7	3,042	54,756
	V-171		2	3,500		7	3,042	21,294
			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	7,000		7	3,042	63,882
			1	4,000		6	2,235	8,940
			96	1,700		3	0,560	91,392
			96	0,690		3	0,560	37,094
			3	12,000		8	3,973	143,028

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO HOSPITAL COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	3,600		8	3,973	42,908
			3	6,000		8	3,973	71,514
			3	3,500		8	3,973	41,717
		V-172	3	7,100		7	3,042	64,795
			3	12,000		7	3,042	109,512
			2	4,600		6	2,235	20,562
			2	4,600		6	2,235	20,562
			107	1,700		3	0,560	101,864
			107	0,690		3	0,560	41,345
			3	12,000		5	1,552	55,872
			3	8,800		5	1,552	40,973
			2	3,000		5	1,552	9,312
			2	5,800		5	1,552	18,003
		V-173	2	3,000		5	1,552	9,312
			3	8,900		5	1,552	41,438
			3	12,000		5	1,552	55,872
			14	2,000		3	0,560	15,680
			80	1,700		3	0,560	76,160
			108	0,690		3	0,560	41,731
MODULO 1 CUBIERTA								
			3	3,800		6	2,235	25,479
			3	3,500		6	2,235	23,468
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,800		7	3,042	62,057
			3	6,000		6	2,235	40,230
			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	5,500		5	1,552	25,608
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	7,000		6	2,235	46,935
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	10,200		7	3,042	93,085
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	6,300		7	3,042	57,494
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,600		6	2,235	44,253
		V-300	3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,000		5	1,552	13,968
			3	7,200		6	2,235	48,276

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	5,000		7	3,042	45,630
			3	6,000		6	2,235	40,230
			3	9,400		6	2,235	63,027
			3	9,400		6	2,235	63,027
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	12,000		6	2,235	80,460
			2	9,500		6	2,235	42,465
			3	9,800		6	2,235	65,709
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	9,600		6	2,235	64,368
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	6,500		6	2,235	43,583
			468	1,700		3	0,560	445,536
			468	0,690		3	0,560	180,835
			3	3,800		6	2,235	25,479
			3	3,500		6	2,235	23,468
			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	6,800		7	3,042	62,057
			3	6,000		6	2,235	40,230
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	5,500		5	1,552	25,608
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	7,000		6	2,235	46,935
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	10,200		6	2,235	68,391
			3	8,200		6	2,235	54,981
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	6,300		7	3,042	57,494
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	5,500		6	2,235	36,878
V-301			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,000		5	1,552	13,968
			3	7,200		6	2,235	48,276
			3	5,000		7	3,042	45,630
			3	6,000		6	2,235	40,230
			3	9,400		6	2,235	63,027
			3	9,200		6	2,235	61,686
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	12,000		6	2,235	80,460

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	9,500		6	2,235	42,465
			3	9,900		6	2,235	66,380
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	9,600		6	2,235	64,368
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	9,000		6	2,235	60,345
			3	6,400		6	2,235	42,912
			468	1,700		3	0,560	445,536
			468	0,690		3	0,560	180,835
			3	3,800		6	2,235	25,479
			3	3,500		6	2,235	23,468
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,800		7	3,042	62,057
			3	6,000		6	2,235	40,230
			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	5,500		5	1,552	25,608
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	7,000		6	2,235	46,935
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	10,200		7	3,042	93,085
			3	6,800		6	2,235	45,594
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	6,300		7	3,042	57,494
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	5,500		6	2,235	36,878
V-302			3	3,600		5	1,552	16,762
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,800		5	1,552	17,693
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	5,500		6	2,235	36,878
			3	3,000		5	1,552	13,968
			3	7,200		6	2,235	48,276
			3	5,000		7	3,042	45,630
			3	6,000		6	2,235	40,230
			2	4,000		5	1,552	12,416
			3	9,400		6	2,235	63,027
			3	9,400		6	2,235	63,027
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	12,000		6	2,235	80,460
			2	9,500		6	2,235	42,465
			3	9,800		6	2,235	65,709
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	9,600		6	2,235	64,368
			3	9,200		6	2,235	61,686

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO HOSPITAL COVEÑAS 2023	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	9,200		6	2,235	61,686
			3	6,200		6	2,235	41,571
			2	4,000		5	1,552	12,416
			468	1,700		3	0,560	445,536
			468	0,690		3	0,560	180,835
			2	6,500		5	1,552	20,176
			2	6,400		6	2,235	28,608
			2	4,000		6	2,235	17,880
			2	4,000		4	0,994	7,952
			2	6,300		5	1,552	19,555
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	3,800		4	0,994	7,554
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	3,800		4	0,994	7,554
			2	6,600		6	2,235	29,502
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	4,600		4	0,994	9,145
			2	2,300		4	0,994	4,572
			2	9,000		6	2,235	40,230
			2	3,800		4	0,994	7,554
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	3,500		5	1,552	10,864
			2	3,800		4	0,994	7,554
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		4	0,994	7,554
			2	6,000		5	1,552	18,624
VT-301			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	3,800		4	0,994	7,554
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	4,000		6	2,235	17,880
			2	4,500		4	0,994	8,946
			2	5,500		5	1,552	17,072
			2	3,300		5	1,552	10,243
			2	6,200		5	1,552	19,245
			2	11,000		5	1,552	34,144
			2	9,300		5	1,552	28,867
			2	5,700		5	1,552	17,693
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	5,500		4	0,994	10,934
			2	11,000		5	1,552	34,144
			2	4,500		3	0,560	5,040
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	4,500		3	0,560	5,040
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	10,500		5	1,552	32,592
			2	6,000		3	0,560	6,720
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	2,800		4	0,994	5,566
			342	1,420		2	0,248	120,439

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
VT-302			2	6,500		5	1,552	20,176
			2	6,400		6	2,235	28,608
			2	4,000		6	2,235	17,880
			2	4,000		5	1,552	12,416
			2	6,300		5	1,552	19,555
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,600		6	2,235	29,502
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	4,600		5	1,552	14,278
			2	2,300		4	0,994	4,572
			2	9,000		6	2,235	40,230
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	3,500		5	1,552	10,864
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	4,000		6	2,235	17,880
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	5,500		5	1,552	17,072
			2	3,300		5	1,552	10,243
			2	6,200		6	2,235	27,714
			2	11,000		5	1,552	34,144
			2	9,300		5	1,552	28,867
			2	5,700		5	1,552	17,693
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	5,500		4	0,994	10,934
			2	11,000		5	1,552	34,144
			2	4,500		3	0,560	5,040
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	4,500		3	0,560	5,040
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	10,500		5	1,552	32,592
			2	6,000		3	0,560	6,720
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	2,800		5	1,552	8,691
			450	1,400		3	0,560	352,800
			2	6,500		5	1,552	20,176
			2	6,400		6	2,235	28,608
			2	4,000		6	2,235	17,880
			2	4,000		5	1,552	12,416
			2	6,300		5	1,552	19,555
			2	3,800		6	2,235	16,986

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,600		6	2,235	29,502
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	4,600		5	1,552	14,278
			2	2,300		4	0,994	4,572
			2	9,000		6	2,235	40,230
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	3,500		5	1,552	10,864
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
	VT-303		2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	4,000		6	2,235	17,880
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	5,500		5	1,552	17,072
			2	3,300		5	1,552	10,243
			2	6,200		6	2,235	27,714
			2	11,000		5	1,552	34,144
			2	9,300		5	1,552	28,867
			2	5,700		5	1,552	17,693
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	5,500		4	0,994	10,934
			2	11,000		5	1,552	34,144
			2	4,500		3	0,560	5,040
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	4,500		3	0,560	5,040
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	10,500		5	1,552	32,592
			2	6,000		3	0,560	6,720
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	2,800		5	1,552	8,691
			444	1,400		3	0,560	348,096
			2	6,500		5	1,552	20,176
			2	6,400		6	2,235	28,608
			2	4,000		6	2,235	17,880
			2	4,000		5	1,552	12,416
			2	6,300		5	1,552	19,555
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,600		6	2,235	29,502
			2	3,800		5	1,552	11,795

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSOLIDANDO EL HOSPITAL COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	4,600		5	1,552	14,278
			2	2,300		4	0,994	4,572
			2	9,000		6	2,235	40,230
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,800		6	2,235	30,396
			2	3,500		5	1,552	10,864
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
VT-304			2	3,800		6	2,235	16,986
			2	3,800		5	1,552	11,795
			2	6,000		5	1,552	18,624
			2	4,000		6	2,235	17,880
			2	4,500		5	1,552	13,968
			2	5,500		5	1,552	17,072
			2	3,300		5	1,552	10,243
			2	6,200		6	2,235	27,714
			2	11,000		5	1,552	34,144
			2	9,300		5	1,552	28,867
			2	5,700		5	1,552	17,693
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	5,500		4	0,994	10,934
			2	11,000		5	1,552	34,144
			2	4,500		3	0,560	5,040
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	4,500		3	0,560	5,040
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	10,500		5	1,552	32,592
			2	6,000		3	0,560	6,720
			2	12,000		5	1,552	37,248
			2	2,800		5	1,552	8,691
			444	1,400		3	0,560	348,096
			3	3,300		7	3,042	30,116
			3	7,000		7	3,042	63,882
			2	5,500		7	3,042	33,462
			3	4,000		7	3,042	36,504
V-303			3	6,400		6	2,235	42,912
			3	12,000		6	2,235	80,460
			3	6,600		6	2,235	44,253
			3	6,500		5	1,552	30,264
			80	1,700		3	0,560	76,160
			80	0,690		3	0,560	30,912
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	5,600		8	3,973	66,746
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
V-304			3	6,500		7	3,042	59,319
			3	6,500		7	3,042	59,319

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	7,000		7	3,042	63,882
			2	5,800		7	3,042	35,287
			2	3,000		5	1,552	9,312
			108	1,700		3	0,560	102,816
			108	0,690		3	0,560	41,731
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	5,600		8	3,973	66,746
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
	V-305		3	6,500		7	3,042	59,319
			3	6,500		7	3,042	59,319
			3	7,400		8	3,973	88,201
			2	3,000		5	1,552	9,312
			106	1,700		3	0,560	100,912
			106	0,690		3	0,560	40,958
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	5,600		8	3,973	66,746
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
	V-306		3	6,500		7	3,042	59,319
			3	6,500		7	3,042	59,319
			3	7,400		8	3,973	88,201
			2	3,000		5	1,552	9,312
			108	1,700		3	0,560	102,816
			108	0,690		3	0,560	41,731
			3	3,600		8	3,973	42,908
			3	5,600		8	3,973	66,746
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,500		7	3,042	59,319
	V-307		3	6,500		7	3,042	59,319
			3	7,400		8	3,973	88,201
			2	3,000		5	1,552	9,312
			1	5,600		8	3,973	22,249
			62	1,700		3	0,560	59,024
			62	0,690		3	0,560	23,957
			51	1,780		4	0,994	90,235
			51	0,770		4	0,994	39,034
			3	3,600		8	3,973	42,908
			3	5,600		8	3,973	66,746
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,500		7	3,042	59,319
	V-310		3	6,500		7	3,042	59,319
			3	7,400		8	3,973	88,201

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO HOSPITAL COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	3,000		5	1,552	9,312
			1	5,600		8	3,973	22,249
			62	1,700		3	0,560	59,024
			62	0,690		3	0,560	23,957
			51	1,780		4	0,994	90,235
			51	0,770		4	0,994	39,034
			3	3,600		8	3,973	42,908
			3	5,600		8	3,973	66,746
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,500		7	3,042	59,319
			3	6,500		7	3,042	59,319
	V-311		3	7,400		8	3,973	88,201
			2	3,000		5	1,552	9,312
			1	5,600		8	3,973	22,249
			87	1,700		3	0,560	82,824
			87	0,690		3	0,560	33,617
			26	1,780		4	0,994	46,002
			26	0,770		4	0,994	19,900
			3	3,600		8	3,973	42,908
			3	5,600		8	3,973	66,746
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,500		7	3,042	59,319
	V-312		3	6,500		7	3,042	59,319
			3	7,400		8	3,973	88,201
			2	3,000		5	1,552	9,312
			1	5,600		8	3,973	22,249
			78	1,700		3	0,560	74,256
			78	0,690		3	0,560	30,139
			35	1,780		4	0,994	61,926
			35	0,770		4	0,994	26,788
			3	3,600		8	3,973	42,908
			3	5,600		8	3,973	66,746
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
			3	6,500		8	3,042	59,319
	V-313		3	6,500		8	3,042	59,319
			3	7,400		8	3,973	88,201
			2	3,000		5	1,552	9,312
			1	5,600		8	3,973	22,249
			61	1,700		3	0,560	58,072
			61	0,690		3	0,560	23,570
			52	1,780		4	0,994	92,005
			52	0,770		4	0,994	39,800
			3	3,500		7	3,042	31,941

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERVENTOR COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	5,600		8	3,973	66,746
			3	3,500		7	3,042	31,941
			3	12,000		8	3,973	143,028
			3	7,200		8	3,973	85,817
V-314			3	6,500		8	3,973	77,474
			3	6,500		8	3,973	77,474
			3	7,400		8	3,973	88,201
			2	3,000		5	1,552	9,312
			106	1,700		3	0,560	100,912
			106	0,690		3	0,560	40,958
			3	6,500		5	1,552	30,264
			3	7,000		5	1,552	32,592
			3	11,300		5	1,552	52,613
V-315			3	7,000		5	1,552	32,592
			3	5,800		6	2,235	38,889
			80	1,700		3	0,560	76,160
			80	0,690		3	0,560	30,912
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,800		6	2,235	38,889
			3	7,000		7	3,042	63,882
			3	5,600		7	3,042	51,106
V-308			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	6,900		7	3,042	62,969
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	3,500		8	3,973	41,717
			110	1,700		3	0,560	104,720
			110	0,690		3	0,560	42,504
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	6,500		6	2,235	43,583
			3	5,800		6	2,235	38,889
			3	7,000		7	3,042	63,882
			3	5,600		7	3,042	51,106
V-309			3	12,000		7	3,042	109,512
			3	6,900		7	3,042	62,969
			3	3,500		8	3,973	41,717
			3	3,500		8	3,973	41,717
			110	1,700		3	0,560	104,720
			110	0,690		3	0,560	42,504
MODULO 2 CUBIERTA								
			2	9,5		7	3,042	57,798
			2	3,3		6	2,235	14,751
			2	3,3		6	2,235	14,751
			3	9,4		6	2,235	63,027
V-230			4	9,2		4	0,994	36,579
			40	1,7		3	0,560	38,080
			40	0,69		3	0,560	15,456
			40	1,74		3	0,560	38,976
			40	1		3	0,560	22,400

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	9,5		7	3,042	57,798
			2	3,3		7	3,042	20,077
V-231			2	3,5		7	3,042	21,294
			3	9,4		6	2,235	63,027
			40	1,7		3	0,560	38,080
			40	0,69		3	0,560	15,456
			2	9,5		7	3,042	57,798
			2	3,3		6	2,235	14,751
			2	3,3		6	2,235	14,751
			3	9,4		6	2,235	63,027
V-232			4	9,2		4	0,994	36,579
			40	1,7		3	0,560	38,080
			40	0,69		3	0,560	15,456
			40	1,74		3	0,560	38,976
			40	1		3	0,560	22,400
			8	9,2		5	1,552	114,227
			8	9,3		6	2,235	166,284
			8	5,5		7	3,042	133,848
VT-230			64	1,42		2	0,248	22,538
			64	1,48		3	0,560	53,043
			64	0,72		3	0,560	25,805
			2	4		5	1,552	12,416
			2	2,8		7	3,042	17,035
			2	3		4	0,994	5,964
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		5	1,552	10,864
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		6	2,235	15,645
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	12		4	0,994	23,856
			2	6,8		5	1,552	21,107
			2	4,5		4	0,994	8,946
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		5	1,552	10,864
VT-231			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	10,8		4	0,994	21,470
			2	3		4	0,994	5,964
			2	3,3		4	0,994	6,560
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4,2		4	0,994	8,350
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4		4	0,994	7,952

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	5,3		4	0,994	10,536
			2	12		4	0,994	23,856
			2	6,3		4	0,994	12,524
			2	5,3		4	0,994	10,536
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4		4	0,994	7,952
			2	4		4	0,994	7,952
			2	12		4	0,994	23,856
			2	12		4	0,994	23,856
			2	5,5		5	1,552	17,072
			284	1,42		2	0,248	100,013
								0,000
			2	4		5	1,552	12,416
			2	2,8		7	3,042	17,035
			2	3		4	0,994	5,964
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		5	1,552	10,864
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		6	2,235	15,645
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	12		4	0,994	23,856
			2	6,8		5	1,552	21,107
			2	4,5		4	0,994	8,946
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		5	1,552	10,864
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	10,8		4	0,994	21,470
			2	3		4	0,994	5,964
			2	3,3		4	0,994	6,560
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4,2		4	0,994	8,350
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4		4	0,994	7,952
			2	5,3		4	0,994	10,536
			2	12		4	0,994	23,856
			2	6,3		4	0,994	12,524
			2	5,3		4	0,994	10,536
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4		4	0,994	7,952
			2	4		4	0,994	7,952
			2	12		4	0,994	23,856
			2	12		4	0,994	23,856
			2	5,5		5	1,552	17,072
			284	1,42		2	0,248	100,013

VT-232

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONCEJO MUNICIPAL COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	4		5	1,552	12,416
			2	2,8		7	3,042	17,035
			2	3		4	0,994	5,964
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		5	1,552	10,864
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		6	2,235	15,645
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	12		4	0,994	23,856
			2	6,8		5	1,552	21,107
			2	4,5		4	0,994	8,946
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		5	1,552	10,864
			2	3,8		4	0,994	7,554
VT-233			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	10,8		4	0,994	21,470
			2	3		4	0,994	5,964
			2	3,3		4	0,994	6,560
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4,2		4	0,994	8,350
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4		4	0,994	7,952
			2	5,3		4	0,994	10,536
			2	12		4	0,994	23,856
			2	6,3		4	0,994	12,524
			2	5,3		4	0,994	10,536
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4		4	0,994	7,952
			2	4		4	0,994	7,952
			2	12		4	0,994	23,856
			2	12		4	0,994	23,856
			2	5,5		5	1,552	17,072
			284	1,42		2	0,248	100,013
			2	4		5	1,552	12,416
			2	2,8		7	3,042	17,035
			2	3		4	0,994	5,964
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		5	1,552	10,864
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		6	2,235	15,645
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	12		4	0,994	23,856

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
VT-234			2	6,8		5	1,552	21,107
			2	4,5		4	0,994	8,946
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,5		5	1,552	10,864
			2	3,8		4	0,994	7,554
			2	5,8		5	1,552	18,003
			2	3,8		6	2,235	16,986
			2	10,8		4	0,994	21,470
			2	3		4	0,994	5,964
			2	3,3		4	0,994	6,560
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4,2		4	0,994	8,350
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4		4	0,994	7,952
			2	5,3		4	0,994	10,536
			2	12		4	0,994	23,856
			2	6,3		4	0,994	12,524
			2	5,3		4	0,994	10,536
			2	12		4	0,994	23,856
			2	4		4	0,994	7,952
			2	4		4	0,994	7,952
			2	12		4	0,994	23,856
			2	12		4	0,994	23,856
			2	5,5		5	1,552	17,072
			284	1,42		2	0,248	100,013
								0,000
V-233			3	3,5		6	2,235	23,468
			2	3		6	2,235	13,410
			3	4		5	1,552	18,624
			3	6,5		6	2,235	43,583
			2	6,3		6	2,235	28,161
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,7		7	3,042	61,144
			2	5,5		6	2,235	24,585
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,6		7	3,042	60,232
			2	5,5		5	1,552	17,072
			3	3,9		5	1,552	18,158
			3	10		7	3,042	91,260
			2	9		5	1,552	27,936
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,3		6	2,235	42,242
			2	7		7	3,042	42,588
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,2		6	2,235	41,571
			2	7		7	3,042	42,588
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,2		6	2,235	41,571
			2	7		7	3,042	42,588
			3	3,8		5	1,552	17,693

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	8,2		7	3,042	74,833
			2	7,5		6	2,235	33,525
			4	9,2		4	0,994	36,579
			3	9,3		5	1,552	43,301
			3	12		5	1,552	55,872
			3	12		5	1,552	55,872
			2	3,5		6	2,235	15,645
			3	3,3		5	1,552	15,365
			4	7,95		4	0,994	31,609
			3	8,05		5	1,552	37,481
			2	8,15		6	2,235	36,431
			3	8,35		5	1,552	38,878
			3	12		5	1,552	55,872
			2	5,8		4	0,994	11,530
			3	10,6		5	1,552	49,354
			3	6,5		6	2,235	43,583
			2	6,5		7	3,042	39,546
			290	1,7		3	0,560	276,080
			290	0,69		3	0,560	112,056
			40	3,3		3	0,560	73,920
			40	1,49		3	0,560	33,376
			40	1,94		3	0,560	43,456
			40	1,12		3	0,560	25,088
			3	3,5		6	2,235	23,468
			2	3,5		7	3,042	21,294
			3	4		5	1,552	18,624
			3	6,5		6	2,235	43,583
			2	6,3		6	2,235	28,161
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,7		7	3,042	61,144
			2	5,5		6	2,235	24,585
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,6		7	3,042	60,232
			2	5,5		5	1,552	17,072
			3	3,9		5	1,552	18,158
			3	10		7	3,042	91,260
			2	9		5	1,552	27,936
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,3		6	2,235	42,242
			2	7		7	3,042	42,588
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,2		6	2,235	41,571
		V-234	2	7		7	3,042	42,588
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,2		6	2,235	41,571
			2	7		7	3,042	42,588
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	8,2		7	3,042	74,833
			2	7,5		6	2,235	33,525
			3	12		5	1,552	55,872
			3	12		5	1,552	55,872
			2	9,5		6	2,235	42,465

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	12		5	1,552	55,872
			3	9,2		5	1,552	42,835
			3	7,5		5	1,552	34,920
			2	5,8		4	0,994	11,530
			3	12		5	1,552	55,872
			3	9,5		5	1,552	44,232
			2	6,5		7	3,042	39,546
			3	6,5		6	2,235	43,583
			373	1,7		3	0,560	355,096
			373	0,69		3	0,560	144,127
			2	3,5		6	2,235	15,645
			2	3,5		6	2,235	15,645
			3	4		5	1,552	18,624
			3	6,5		6	2,235	43,583
			2	6,3		6	2,235	28,161
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,7		7	3,042	61,144
			2	5,5		6	2,235	24,585
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,6		7	3,042	60,232
			2	5,5		5	1,552	17,072
			3	3,9		5	1,552	18,158
			3	10		7	3,042	91,260
			2	9		5	1,552	27,936
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,3		6	2,235	42,242
			2	7		7	3,042	42,588
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,2		6	2,235	41,571
			2	7		7	3,042	42,588
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,2		6	2,235	41,571
			2	7		7	3,042	42,588
	V-235		3	3,8		5	1,552	17,693
			3	8,2		7	3,042	74,833
			2	7,5		6	2,235	33,525
			4	9,2		4	0,994	36,579
			3	9,3		5	1,552	43,301
			3	12		5	1,552	55,872
			3	11,3		5	1,552	52,613
			2	9,5		6	2,235	42,465
			3	3,6		5	1,552	16,762
			4	7,95		4	0,994	31,609
			3	8,05		5	1,552	37,481
			3	8,9		5	1,552	41,438
			3	12		5	1,552	55,872
			2	5,8		4	0,997	11,565
			3	9,5		5	1,552	44,232
			3	6,5		6	2,235	43,583
			2	6,5		7	3,042	39,546
			290	1,7		3	0,560	276,080
			290	0,69		3	0,560	112,056

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO HOSPITAL COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			42	3,3		3	0,560	77,616
			42	1,49		3	0,560	35,045
			42	1,94		3	0,560	45,629
			42	1,12		3	0,560	26,342
V-236			3	12		7	3,042	109,512
			3	7		7	3,042	63,882
			3	6,9		7	3,042	62,969
			3	12		7	3,042	109,512
			3	6,3		9	5,028	95,029
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	6,3		8	3,973	75,090
			2	5,4		6	2,235	24,138
			2	6		6	2,235	26,820
			107	1,7		3	0,560	101,864
			107	0,69		3	0,560	41,345
V-237			3	12		7	3,042	109,512
			3	7		7	3,042	63,882
			3	6,9		7	3,042	62,969
			3	12		7	3,042	109,512
			3	6,3		7	3,042	57,494
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	6,3		8	3,973	75,090
			2	5,4		6	2,235	24,138
			2	6		6	2,235	26,820
			107	1,7		3	0,560	101,864
			107	0,69		3	0,560	41,345
V-238			3	12		7	3,042	109,512
			3	7		7	3,042	63,882
			3	6,9		7	3,042	62,969
			3	12		7	3,042	109,512
			3	6,3		7	3,042	57,494
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	6,3		8	3,973	75,090
			2	5,4		6	2,235	24,138
			2	6		6	2,235	26,820
			107	1,7		3	0,560	101,864
			107	0,69		3	0,560	41,345
V-239			3	12		7	3,042	109,512
			3	7		7	3,042	63,882
			3	6,9		7	3,042	62,969
			3	12		7	3,042	109,512
			3	6,3		7	3,042	57,494
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	6,3		8	3,973	75,090

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	5,4		6	2,235	24,138
			2	6		6	2,235	26,820
			107	1,7		3	0,560	101,864
			107	0,69		3	0,560	41,345
			3	12		7	3,042	109,512
			3	7		7	3,042	63,882
			3	6,9		7	3,042	62,969
			3	12		7	3,042	109,512
			3	6,3		7	3,042	57,494
V-240			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	6,3		8	3,973	75,090
			2	5,4		6	2,235	24,138
			2	6		6	2,235	26,820
			107	1,7		3	0,560	101,864
			107	0,69		3	0,560	41,345
			3	12		7	3,042	109,512
			3	7		7	3,042	63,882
			3	6,9		7	3,042	62,969
			3	12		7	3,042	109,512
			3	6,3		7	3,042	57,494
V-241			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	6,3		8	3,973	75,090
			2	5,4		6	2,235	24,138
			2	6		6	2,235	26,820
			107	1,7		3	0,560	101,864
			107	0,69		3	0,560	41,345
			3	12		7	3,042	109,512
			3	7		7	3,042	63,882
			3	6,9		7	3,042	62,969
			3	12		7	3,042	109,512
			3	6,3		7	3,042	57,494
V-242			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	6,3		8	3,973	75,090
			2	5,4		6	2,235	24,138
			2	6		6	2,235	26,820
			107	1,7		3	0,560	101,864
			107	0,69		3	0,560	41,345
			3	12		7	3,042	109,512
			3	7		7	3,042	63,882
			3	6,9		7	3,042	62,969
			3	12		7	3,042	109,512
			3	6,3		7	3,042	57,494
V-243			3	3,2		7	3,042	29,203
			3	3,2		7	3,042	29,203
			3	6,3		8	3,973	75,090
			2	5,4		6	2,235	24,138

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	6		6	2,235	26,820
			118	1,7		3	0,560	112,336
			118	0,69		3	0,560	45,595
			3	12		7	3,042	109,512
			3	7		7	3,042	63,882
			3	6,9		7	3,042	62,969
			3	12		7	3,042	109,512
			3	6,3		7	3,042	57,494
V-244			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	3,8		8	3,973	45,292
			3	6,3		8	3,973	75,090
			2	5,4		6	2,235	24,138
			2	6		6	2,235	26,820
			117	1,7		3	0,560	111,384
			117	0,69		3	0,560	45,209
			3	12		7	3,042	109,512
			3	7		7	3,042	63,882
			3	6,9		7	3,042	62,969
			3	12		7	3,042	109,512
V-245			3	6,3		8	3,973	75,090
			3	3		6	2,235	20,115
			3	3		6	2,235	20,115
			109	1,7		3	0,560	103,768
			109	0,69		3	0,560	42,118
			3	12		5	1,552	55,872
			3	6,6		5	1,552	30,730
			3	6,3		5	1,552	29,333
			3	12		5	1,552	55,872
V-246			3	6		5	1,552	27,936
			3	3,2		5	1,552	14,899
			3	3,2		5	1,552	14,899
			80	1,7		3	0,560	76,160
			80	0,69		3	0,560	30,912
			6	12		6	2,235	160,920
			6	7		6	2,235	93,870
			6	6,6		6	2,235	88,506
			6	12		6	2,235	160,920
V-233A			4	3,3		7	3,042	40,154
			6	5,5		7	3,042	100,386
			4	3,3		7	3,042	40,154
			160	1,7		3	0,560	152,320
			160	0,69		3	0,560	61,824
MODULO 3 CUBIERTA								
			3	2,8		6	2,235	18,774
			3	2,7		5	1,552	12,571
			3	10		5	1,552	46,560
			3	5		6	2,235	33,525
			3	10		5	1,552	46,560
			3	5,8		7	3,042	52,931

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	6		5	1,552	27,936
			3	5,8		6	2,235	38,889
			3	10,8		5	1,552	50,285
			3	5,8		6	2,235	38,889
			3	12		6	2,235	80,460
			3	5,8		5	1,552	27,005
			3	8		6	2,235	53,640
			3	5,8		5	1,552	27,005
			3	9		6	2,235	60,345
	V-260		3	10		6	2,235	67,050
			3	10,7		6	2,235	71,744
			3	7,1		6	2,235	47,606
			3	12		5	1,552	55,872
			3	9,4		5	1,552	43,766
			3	9,2		5	1,552	42,835
			3	9,2		5	1,552	42,835
			3	6		5	1,552	27,936
			3	12		5	1,552	55,872
			2	8		5	1,552	24,832
			3	9,8		6	2,235	65,709
			2	5		6	2,235	22,350
			3	10		5	1,552	46,560
			358	1,7		3	0,560	340,816
			358	0,69		3	0,560	138,331
								0,000
			3	2,8		7	3,042	25,553
			3	10		5	1,552	46,560
			3	5		6	2,235	33,525
			3	10		5	1,552	46,560
			3	5,8		7	3,042	52,931
			3	6		5	1,552	27,936
			3	5,8		6	2,235	38,889
			3	10,8		5	1,552	50,285
			3	5,8		6	2,235	38,889
			3	12		6	2,235	80,460
			3	5,8		5	1,552	27,005
			3	8		6	2,235	53,640
			3	5,8		5	1,552	27,005
			3	9		6	2,235	60,345
	V-261		3	10		6	2,235	67,050
			3	10,7		6	2,235	71,744
			3	7,1		6	2,235	47,606
			3	12		5	1,552	55,872
			3	9,4		5	1,552	43,766
			3	9,2		5	1,552	42,835
			3	9,2		5	1,552	42,835
			3	6		5	1,552	27,936
			3	12		5	1,552	55,872
			2	8		6	2,235	35,760
			3	9,8		6	2,235	65,709
			2	5		6	2,235	22,350
			3	10		5	1,552	46,560
			358	1,7		3	0,560	340,816

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			358	0,69		3	0,560	138,331
			3	4,8		5	1,552	22,349
			3	2,5		6	2,235	16,763
			3	5,7		6	2,235	38,219
			2	4,5		5	1,552	13,968
			3	12		5	1,552	55,872
			3	5,8		6	2,235	38,889
			3	6,7		6	2,235	44,924
			3	5,3		5	1,552	24,677
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,5		6	2,235	43,583
			2	4,5		5	1,552	13,968
			3	3,8		5	1,552	17,693
			2	6,8		7	3,042	41,371
			2	5,3		5	1,552	16,451
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	6,8		6	2,235	45,594
			2	5		5	1,552	15,520
			3	3,8		5	1,552	17,693
			3	10,5		7	3,042	95,823
			2	8,5		6	2,235	37,995
V-262			3	9,8		6	2,235	65,709
			3	7		5	1,552	32,592
			3	12		6	2,235	80,460
			3	4,1		6	2,235	27,491
			4	6,4		4	0,994	25,446
			4	12		4	0,994	47,712
			3	12		6	2,235	80,460
			3	6,4		6	2,235	42,912
			3	7,9		6	2,235	52,970
			3	12		6	2,235	80,460
			3	7,9		6	2,235	52,970
			4	7,95		4	0,994	31,609
			3	8,25		7	3,042	75,290
			3	9,25		6	2,350	65,213
			2	4,5		6	2,350	21,150
			264	1,7		3	0,560	251,328
			264	0,69		3	0,560	102,010
			62	3,3		3	0,560	114,576
			62	1,49		3	0,560	51,733
			62	1,94		3	0,560	67,357
			62	1,12		3	0,560	38,886
			9	3,4		7	3,042	93,085
			9	12		5	1,552	167,616
			9	5,8		7	3,042	158,792
			9	6,5		5	1,552	90,792
V-263			9	3		6	2,235	60,345
			9	6,5		5	1,552	90,792
			9	12		5	1,552	167,616
			240	1,7		3	0,560	228,480
			240	0,69		3	0,560	92,736

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONCEJO DE COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
V-264			3	12		8	3,973	143,028
			3	6		8	3,973	71,514
			3	7,2		7	3,042	65,707
			3	6		7	3,042	54,756
			2	9,5		7	3,042	57,798
			3	7,1		7	3,042	64,795
			3	12		7	3,042	109,512
			2	3,4		6	2,235	15,198
			2	6		6	2,235	26,820
			1	3,5		5	1,552	5,432
			40	1,78		4	0,994	70,773
			40	0,77		4	0,994	30,615
			60	1,7		3	0,560	57,120
			60	0,69		3	0,560	23,184
V-265			21	12		8	3,973	1001,196
			21	6		8	3,973	500,598
			21	7,2		7	3,042	459,950
			21	7,1		7	3,042	453,562
			21	12		7	3,042	766,584
			14	6		6	2,235	187,740
			14	9,5		6	2,235	297,255
			14	3,4		5	1,552	73,875
			7	4		5	1,552	43,456
			735	1,7		3	0,560	699,720
			735	0,69		3	0,560	284,004
VT-260			2	4,3		4	0,994	8,548
			3	5,8		5	1,552	27,005
			3	3,3		4	0,994	9,841
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		5	1,552	18,624
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	6		5	1,552	27,936
			3	4		4	0,994	11,928
			3	3,8		4	0,994	11,332
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		4	0,994	11,928
			3	3,8		4	0,994	11,332
			3	5,8		5	1,552	27,005
			3	4		5	1,552	18,624
			3	3,8		4	0,994	11,332
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		5	1,552	18,624
			3	3,8		4	0,994	11,332
			3	9,3		4	0,994	27,733
			3	6,8		4	0,994	20,278
			2	10		4	0,994	19,880
			2	3,3		4	0,994	6,560
			2	4		4	0,994	7,952
			3	12		5	1,552	55,872

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			2	6		4	0,994	11,928
			3	6,4		4	0,994	19,085
			3	10,3		5	1,552	47,957
			3	12		4	0,994	35,784
			2	7,2		5	1,552	22,349
			3	12		4	0,994	35,784
			2	5,8		4	0,994	11,530
			3	10,1		4	0,994	30,118
			3	8,8		4	0,994	26,242
			2	5,5		4	0,994	10,934
			3	4,5		4	0,994	13,419
			274	1,42		2	0,248	96,492
			2	4,3		4	0,994	8,548
			3	5,8		5	1,552	27,005
			3	3,3		4	0,994	9,841
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		5	1,552	18,624
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	4		5	1,552	18,624
			3	5,8		4	0,994	17,296
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		4	0,994	11,928
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		5	1,552	18,624
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		5	1,552	18,624
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	9,3		4	0,994	27,733
		VT-261	3	6,8		4	0,994	20,278
			2	10		4	0,994	19,880
			3	3,3		4	0,994	9,841
			3	5,2		5	1,552	24,211
			2	12		4	0,994	23,856
			3	6,8		5	1,552	31,661
			3	7		5	1,552	32,592
			2	10		4	0,994	19,880
			2	4,8		4	0,994	9,542
			2	12		4	0,994	23,856
			1	3,8		4	0,994	3,777
			2	7		5	1,552	21,728
			2	4,8		4	0,994	9,542
			2	12		4	0,994	23,856
			3	5,8		4	0,994	17,296
			2	10,1		4	0,994	20,079
			3	8,8		4	0,994	26,242
			2	5,5		4	0,994	10,934
			2	4,5		4	0,994	8,946
			274	1,42		2	0,248	96,492

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			32	0,66		2	0,248	5,238
			2	4,3		4	0,994	8,548
			3	5,8		5	1,552	27,005
			3	3,3		4	0,994	9,841
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		5	1,552	18,624
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	4		5	1,552	18,624
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	3,8		4	0,994	11,332
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		4	0,994	11,928
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		5	1,552	18,624
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		5	1,552	18,624
			2	3,8		4	0,994	7,554
VT-262			3	9,3		4	0,994	27,733
			3	6,8		4	0,994	20,278
			2	10		4	0,994	19,880
			3	3,3		4	0,994	9,841
			3	12		5	1,552	55,872
			2	12		4	0,994	23,856
			3	11		5	1,552	51,216
			2	10		4	0,994	19,880
			2	4,8		4	0,994	9,542
			2	12		4	0,994	23,856
			1	3,8		4	0,994	3,777
			2	7		5	1,552	21,728
			2	4,8		4	0,994	9,542
			2	12		4	0,994	23,856
			3	5,8		4	0,994	17,296
			2	10,1		4	0,994	20,079
			3	8,8		4	0,994	26,242
			2	5,5		4	0,994	10,934
			2	4,5		4	0,994	8,946
			274	1,42		2	0,248	96,492
			44	0,66		2	0,248	7,202
								0,000
			2	4,3		4	0,994	8,548
			3	5,8		5	1,552	27,005
			3	3,3		4	0,994	9,841
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		5	1,552	18,624
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	4		5	1,552	18,624
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	3,8		4	0,994	11,332

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
VT-263			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		4	0,994	11,928
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		4	0,994	11,928
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	5,8		4	0,994	17,296
			3	4		4	0,994	11,928
			2	3,8		4	0,994	7,554
			3	9,3		4	0,994	27,733
			3	6,8		4	0,994	20,278
			2	10		4	0,994	19,880
			3	3,3		4	0,994	9,841
			3	12		5	1,552	55,872
			2	12		4	0,994	23,856
			3	11		5	1,552	51,216
			2	10		4	0,994	19,880
			2	4,8		4	0,994	9,542
			2	12		4	0,994	23,856
			1	3,8		4	0,994	3,777
			2	7		5	1,552	21,728
			2	4,8		4	0,994	9,542
			2	12		4	0,994	23,856
			3	5,8		4	0,994	17,296
			2	10,1		4	0,994	20,079
			3	8,8		4	0,994	26,242
			2	5,5		4	0,994	10,934
			2	4,5		4	0,994	8,946
			274	1,42		2	0,248	96,492
PASALERAS								
V-400			18	9,4		5	1,552	262,598
			6	6,3		5	1,552	58,666
			18	8,8		5	1,552	245,837
			18	9,3		4	0,994	166,396
			234	1,68		3	0,560	220,147
			234	0,39		3	0,560	51,106
V-401			24	9,4		5	1,552	350,131
			24	8,6		5	1,552	320,333
			24	9,3		4	0,994	221,861
			312	1,68		3	0,560	293,530
			312	0,39		3	0,560	68,141
V-402			6	9,4		5	1,552	87,533
			2	6,3		5	1,552	19,555
			6	8,8		5	1,552	81,946
			6	9,3		4	0,994	55,465
			78	1,68		3	0,560	73,382
			78	0,39		3	0,560	17,035
V-403			3	9,4		5	1,552	43,766
			2	8,8		5	1,552	27,315
			3	8,8		5	1,552	40,973

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			3	9,3		4	0,994	27,733
			39	1,68		3	0,560	36,691
			39	0,39		3	0,560	8,518
			9	9,4		5	1,552	131,299
			9	8,6		5	1,552	120,125
V-404			9	9,3		4	0,994	83,198
			117	1,68		3	0,560	110,074
			117	0,39		3	0,560	25,553
			6	9,4		5	1,552	87,533
			2	6,3		5	1,552	19,555
V-405			6	8,8		5	1,552	81,946
			6	9,3		4	0,994	55,465
			78	1,68		3	0,560	73,382
			78	0,39		3	0,560	17,035
			3	9,4		5	1,552	43,766
			2	8,8		5	1,552	27,315
V-406			3	8,8		5	1,552	40,973
			3	9,3		4	0,994	27,733
			39	1,68		3	0,560	36,691
			39	0,39		3	0,560	8,518
			9	9,4		5	1,552	131,299
			9	8,8		5	1,552	122,918
V-407			9	9,3		4	0,994	83,198
			117	1,68		3	0,560	110,074
			117	0,39		3	0,560	25,553
			12	12		6	2,235	321,840
			12	5,6		6	2,235	150,192
			12	8		6	2,235	214,560
			12	3,2		6	2,235	85,824
			12	3,4		6	2,235	91,188
			12	12		6	2,235	321,840
			8	6,5		5	1,552	80,704
V-408			8	10		5	1,552	124,160
			8	8,8		5	1,552	109,261
			16	3,2		5	1,552	79,462
			16	10		5	1,552	248,320
			16	12		5	1,552	297,984
			448	1,8		3	0,560	451,584
			448	1,84		3	0,560	461,619
			6	8,1		6	2,235	108,621
			6	8,1		6	2,235	108,621
V-409			4	8		5	1,552	49,664
			8	8		5	1,552	99,328
			86	1,8		3	0,560	86,688
			86	1,84		3	0,560	88,614
			6	6,9		6	2,235	92,529

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			6	6,9		6	2,235	92,529
V-410			4	6,8		5	1,552	42,214
			8	6,8		5	1,552	84,429
			74	1,8		3	0,560	74,592
			74	1,84		3	0,560	76,250
			6	6,4		5	1,552	59,597
			6	12		5	1,552	111,744
			6	7,3		5	1,552	67,978
V-411			6	11		5	1,552	102,432
			4	12		4	0,994	47,712
			4	6,2		4	0,994	24,651
			8	11		4	0,994	87,472
			8	7,2		4	0,994	57,254
			164	1,8		3	0,560	165,312
			164	2,04		3	0,560	187,354
			6	9,2		5	1,552	85,670
			6	9,2		5	1,552	85,670
V-412			4	9,1		4	0,994	36,182
			8	9,1		4	0,994	72,363
			82	1,8		3	0,560	82,656
			82	1,84		3	0,560	84,493
			6	9,2		5	1,552	85,670
			6	9,2		5	1,552	85,670
V-413			4	9,1		4	0,994	36,182
			8	9,1		4	0,994	72,363
			82	1,8		3	0,560	82,656
			82	2,04		3	0,560	93,677
			6	8		5	1,552	74,496
			6	8		5	1,552	74,496
V-414			4	7,9		4	0,994	31,410
			8	7,9		4	0,994	62,821
			86	1,8		3	0,560	86,688
			86	2,04		3	0,560	98,246
			6	6,8		5	1,552	63,322
			6	6,8		5	1,552	63,322
V-415			4	6,7		4	0,994	26,639
			8	6,7		4	0,994	53,278
			74	1,8		3	0,560	74,592
			74	2,04		3	0,560	84,538
			8	12		4	0,994	95,424
			4	4,8		4	0,994	19,085
			8	12		4	0,994	95,424
			4	4,8		4	0,994	19,085
			8	3		4	0,994	23,856
VT-400			4	5,8		4	0,994	23,061
			8	12		4	0,994	95,424
			4	2,5		4	0,994	9,940

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			8	12		4	0,994	95,424
			4	5,8		4	0,994	23,061
			8	2,8		4	0,994	22,266
			380	1,38		2	0,284	148,930
VT-401			8	12		4	0,994	95,424
			8	6,2		4	0,994	49,302
			8	12		4	0,994	95,424
			8	6		4	0,994	47,712
			264	1,38		2	0,284	103,467
								0,000
VT-402			4	7,9		4	0,994	31,410
			4	7,8		3	0,560	17,472
			52	1,38		2	0,248	17,796
VT-403			4	7,8		3	0,560	17,472
			4	7,8		3	0,560	17,472
			52	1,38		2	0,248	17,796
VT-404			4	8		4	0,994	31,808
			4	8		4	0,994	31,808
			52	1,38		2	0,284	20,380
VT-405			4	7,9		3	0,560	17,696
			4	7,9		3	0,560	17,696
			52	1,38		2	0,248	17,796
S 30X40			6	47,4		5	1,552	441,389
			432	1,3		3	0,560	314,496
S 20X40			4	28,8		5	1,552	178,790
			288	1,1		3	0,560	177,408
R1 -4.27 MODULO 1 NIVEL 1								
			9	6		4	0,994	53,676
			89	1,38		3	0,560	68,779
PLACA VOLADIZO REFUERZO MODULO 1 NIVEL +.06								
EJE G			16	43,88		3	0,560	393,165
			270	1,95		3	0,560	295,058
			270	1,6		3	0,560	242,099
								0,000
EJE I3			16	41,06		3	0,560	367,898
			251	1,95		3	0,560	274,529
			251	1,6		3	0,560	225,254
								0,000
EJE I8			16	53,6		3	0,560	480,256
			337	1,95		3	0,560	368,368
			337	1,6		3	0,560	302,251
PLACA VOLADIZO -0.06 MODULO 2								
EJE D			16	56,76		3	0,560	508,570
			350	1,95		3	0,560	382,637
			350	1,6		3	0,560	313,958

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO HOSPITAL COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
EJE F			16	56,76		3	0,560	508,570
			350	1,95		3	0,560	382,637
			350	1,6		3	0,560	313,958
PLACA VOLADIZO -0.06 MODULO 3								
EJE A			20	77,3		3	0,560	865,760
			485	1,95		3	0,560	529,620
			485	1,6		3	0,560	434,560
							0,560	0,000
EJE C			20	35,83		3	0,560	401,296
			240	1,95		3	0,560	262,080
			240	1,6		3	0,560	215,040
R1 -0.06 MODULO 2								
			4	6		4	0,994	23,856
			35	1,4		3	0,560	27,440
R1 -0.06 MODULO 3								
			10	6		4	0,994	59,640
			92	1,4		3	0,560	72,128
PLACA VOLADIZO MODULO 1 + 4.67								
EJE G			12	97,8		3	0,56	657,216
			620	1,95		3	0,56	677,040
			620	1,6		3	0,56	555,520
							0,56	0,000
EJE I3			12	97,8		3	0,56	657,216
			620	1,95		3	0,56	677,040
			620	1,6		3	0,56	555,520
PLACA VOLADIZO -0.06 MODULO 2								
EJE D			12	81,4		3	0,56	547,008
			550	1,95		3	0,56	600,600
			550	1,6		3	0,56	492,800
							0,56	0,000
EJE F			12	81,4		3	0,56	547,008
			550	1,95		3	0,56	600,600
			550	1,6		3	0,56	492,800
PLACA VOLADIZO -0.06 MODULO 3								
EJE A			12	78,15		3	0,56	525,168
			490	1,95		3	0,56	535,080
			490	1,6		3	0,56	439,040
							0,56	0,000
EJE C			12	78,15		3	0,56	525,168
			490	1,95		3	0,56	535,080
			490	1,6		3	0,56	439,040
R1 MODULO 1								
			245	6		4	0,99	1461,180
			2240	1,38		3	0,56	1731,072
R1 MODULO 2								
			120	6		4	0,99	715,680
			1260	1,4		3	0,56	987,840
R1 MODULO 3								
			80	6		4	0,99	477,120
			754	1,4		3	0,56	591,136
COLUMNETAS MODULO 2								

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2023			HOSPITAL DE COVEÑAS			MEMORIA DE CANTIDADES		
OBJETO:			CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE					
ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
			32	0,441		2	0,25	3,500
			14	1,4		3	0,56	10,976
MURO DE CONTENCION MODULO 1								
			370	6,15		4	0,99	2261,847
			72	36		4	0,99	2576,448
			180	1,44		3	0,56	145,152
			8	36,5		5	1,55	453,184
			1	180,442		1	1,00	180,442
			104	1,2		4	0,99	124,449
MURO DE CONTENCION MODULO 2								
			370	6,15		4	0,99	2261,847
			72	36		4	0,99	2576,448
			180	1,45		3	0,56	146,160
			8	36,5		5	1,55	453,184
			113	1,2		4	0,99	134,786
MURO DE CONTENCION MODULO 3								
			90	2,88		4	0,99	257,645
			36	114,8		4	0,99	4108,003
			12	2,1		5	1,55	39,110
			110	1,4		4	0,99	153,076
ACERO ESCALERAS								
			7	1,5		3	0,56	5,88
			7	1,5		3	0,56	5,88
			7	1,5		3	0,56	5,88
			7	1,3		3	0,56	5,10
PASARELA 4			7	3,9		3	0,56	15,29
			7	1,5		3	0,56	5,88
			7	3		3	0,56	11,76
			7	1,5		3	0,56	5,88
			56	0,8		3	0,56	25,09
				1,74		3	0,56	0,00
			2					
			2	4,45		4	0,994	8,85
			2	5,22		4	0,994	10,38
			2	5,55		4	0,994	11,03
			2	5,55		4	0,994	11,03
			2	5		4	0,994	9,94
			5	3,65		4	0,994	18,14
			5	1,55		3	0,56	4,34
ESCALERA DE EMERGENCIA			5	1,15		3	0,56	3,22
			5	2,65		3	0,56	7,42
			5	1,15		3	0,56	3,22
			5	2,65		3	0,56	7,42
			6	1,5		3	0,56	5,04
			6	1,55		3	0,56	5,21
			6	4,15		3	0,56	13,94
			6	4,72		3	0,56	15,86
			6	2,25		3	0,56	7,56
			77	1,5		3	0,56	64,68
TANQUE DE ALMACENAMIENTO								
EJE 9			25	9,7		4	0,99	241,05
EJE 9			25	8,05		4	0,99	200,04
ENTRE 9-10			25	7,65		4	0,99	190,10

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · COVEÑAS 2024	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
ENTRE 9-10			25	5,2		4	0,99	129,22
ENTRE 9-10			25	1,4		4	0,99	34,79
EJE 10			25	4,55		4	0,99	113,07
EJE 10			25	6,7		4	0,99	166,50
ENTRE 10 - 10´			25	5,65		4	0,99	140,40
ENTRE 10 - 10´			25	5,65		4	0,99	140,40
EJE 10´			25	5,3		4	0,99	131,71
EJE 10´			25	4,35		4	0,99	108,10
ENTRE 10´-11			25	1,35		4	0,99	33,55
ENTRE 10´-11			25	4,6		4	0,99	114,31
ENTRE 10´-11			25	2,5		4	0,99	62,13
MURO ENTRE 10´-11			25	2,5		4	0,99	62,13
MURO ENTRE 10´-11			25	2,5		4	0,99	62,13
EJE 11			25	3,85		4	0,99	95,67
EJE 11			25	5,5		4	0,99	136,68
EJE 9			48	3,55		4	0,99	169,38
EJE 9			48	4		4	0,99	190,85
EJE 9			48	4		4	0,99	190,85
EJE 9			48	4		4	0,99	190,85
EJE 9			48	4		4	0,99	190,85
EJE 10			26	3,55		4	0,99	91,75
EJE 10			26	3,55		4	0,99	91,75
EJE 10´			24	3,55		4	0,99	84,69
EJE 10´			24	3,55		4	0,99	84,69
MURO ENTRE 10´-11			21	3,55		4	0,99	74,10
MURO ENTRE 10´-11			21	3,55		4	0,99	74,10
EJE 11			25	3,55		4	0,99	88,22
EJE 11			25	4		4	0,99	99,40
EJE 11			25	4		4	0,99	99,40
EJE 11			25	4		4	0,99	99,40
EJE 11			25	4		4	0,99	99,40
EJE G			28	9		4	0,99	250,49
EJE G			28	6		4	0,99	166,99
EJE G			28	11		4	0,99	306,15
CASI EJE H			28	11		4	0,99	306,15
CASI EJE H			28	9		4	0,99	250,49
CASI EJE H			28	6		4	0,99	166,99
COMPLEMENTO PLACA MODULO 1 -4.67								
GRAFIL 5 MM			157	0,7		5.0 mm	0,154	16,92
#3 @0.15			2462	1		3	0,560	1378,72
COMPLEMENTO PLACA MODULO 2 -4.67								
GRAFIL 5 MM			202	0,7		5.0 mm	0,154	21,73
#3 @0.15			1894	1		3	0,560	1060,64
COMPLEMENTO PLACA MODULO 1 -.06								
GRAFIL 5 MM			515	0,7		5.0 mm	0,154	55,56
#3 @0.15			5395	1		3	0,560	3021,20
COMPLEMENTO PLACA MODULO 2 -.06								
GRAFIL 5 MM			666	0,7		5.0 mm	0,154	71,84
#3 @0.15			4876	1		3	0,560	2730,56
COMPLEMENTO PLACA MODULO 3 -.06								
GRAFIL 5 MM			572	0,7		5.0 mm	0,154	61,70
#3 @0.15			3598	1		3	0,560	2014,88
COMPLEMENTO PLACA MODULO 1 +4.67								

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2021	HOSPITAL DE COVEÑAS	MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

ITEM :	3.00.11	PLANO No. :	E29			FECHA :		
GRAFIL 5 MM			693	0,7		5.0 mm	0,154	74,75
#3 @0.15			5240	1		3	0,560	2934,40
COMPLEMENTO PLACA MODULO 2 +4.67								
GRAFIL 5 MM			666	0,7		5.0 mm	0,154	71,84
#3 @0.15			4180	1		3	0,560	2340,80
COMPLEMENTO PLACA MODULO 3 +4.67								
GRAFIL 5 MM			572	0,7		5.0 mm	0,154	61,70
#3 @0.15			3650	1		3	0,560	2044,00
TOTAL ACERO								**269666,39**

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2021	MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

MEMORIA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
					ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	RESTA		
ITEM	4.00.15	UNIDAD	m2	M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m							
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	8,38		4,11	34,44		34,44	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	7,46		3,66	27,30		27,30	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	5,50		4,11	22,61		22,61	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	4,15		3,66	15,19		15,19	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	8,07		0,55	4,44		4,44	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	3,88		0,55	2,13		2,13	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	8,07		0,55	4,44		4,44	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	3,88		0,55	2,13		2,13	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	3,12		0,55	1,72		1,72	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	18,13		0,55	9,97		9,97	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	3,12		0,55	1,72		1,72	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	18,13		0,55	9,97		9,97	
BLOQUE 1		PISO 2 ES		1,00	7,84		2,85	22,34	22,17	0,17	
BLOQUE 1		PISO 2 ES		1,00	7,72		2,85	22,00	22,00	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	5,60		2,96	16,58	16,24	0,34	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	0,80		2,91	2,33	2,32	0,01	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,87		2,90	22,82	22,82	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,84		2,84	22,27	22,10	0,17	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,87		2,85	22,43	22,43	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,87		2,85	22,43	22,43	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	6,52		2,85	18,58	18,55	0,03	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	3,65		2,85	10,40	10,40	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	3,30		2,85	9,41	9,41	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,87		2,85	22,43	22,43	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,87		2,85	22,43	22,43	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,87		2,85	22,43	22,43	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	2,97		2,91	8,64	8,46	0,18	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,87		2,91	22,90	22,30	0,60	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,97		2,91	23,19	22,71	0,48	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,97		2,85	22,71	22,71	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	5,32		2,85	15,16	15,16	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,87		3,50	27,55	27,55	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,85		2,80	21,98	21,78	0,20	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	3,34		2,91	9,72	9,52	0,20	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	3,50		2,86	10,01	9,97	0,04	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	2,72		0,43	1,17	1,17	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	3,14		0,50	1,57	1,57	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	5,64		0,23	1,30		1,30	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	2,91		0,23	0,67		0,67	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	5,64		0,23	1,30		1,30	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	2,91		0,23	0,67		0,67	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	2,38		2,90	6,90	6,76	0,14	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	6,23		2,86	17,82	17,76	0,06	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	6,79		2,85	19,35	19,35	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,87		2,85	22,43	22,43	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	7,87		2,85	22,43	22,43	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	6,79		2,85	19,35	19,35	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	2,69		0,50	1,35	1,35	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	5,54		0,50	2,77	2,77	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	0,99		1,10	1,09	1,09	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	0,97		1,54	1,49	1,49	0,00	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	5,64		0,23	1,30		1,30	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	2,91		0,23	0,67		0,67	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	5,64		0,23	1,30		1,30	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 2		1,00	2,91		0,23	0,67		0,67	
BLOQUE 1		CUBIERTA ES		1,00	7,96		0,25	1,99		1,99	
BLOQUE 1		CUBIERTA ES		1,00	9,57		0,25	2,39		2,39	
BLOQUE 1		PLANTA PISO 1		1,00	0,12		1,15	0,14		0,14	


BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	7,39		2,66	19,66	2,15	17,51	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,54		4,11	10,44	3,05	7,39	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	8,41		4,11	34,57	0,49	34,08	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,60		4,11	2,47	0,96	1,51	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,80		4,11	3,29	0,60	2,69	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,70		4,11	2,88		2,88	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,92		3,81	3,51	0,23	3,28	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,92		3,81	3,51		3,51	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	3,33		4,60	15,32	2,51	12,81	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,16		4,60	0,74	0,30	0,44	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	7,46		4,11	30,66	0,16	30,50	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,96		4,11	8,06	0,02	8,04	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,03		4,11	4,23	2,63	1,60	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,46		4,11	6,00	0,50	5,50	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,72		4,11	11,18	4,17	7,01	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,09		4,11	8,59	0,49	8,10	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,09		4,11	8,59	0,49	8,10	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,15		4,11	8,84	0,24	8,60	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,00		4,11	4,11	2,47	1,64	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	3,94		4,11	16,19	5,02	11,17	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,85		4,11	7,60	0,49	7,11	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	8,41		4,11	34,57	0,49	34,08	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	4,51		4,11	18,54	2,73	15,81	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	4,85		4,10	19,89	0,47	19,41	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	4,92		4,10	20,17	4,63	15,54	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	4,14		4,10	16,97	3,00	13,97	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	6,19		4,11	25,44	5,40	20,04	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	5,07		4,60	23,32	6,65	16,67	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,24		4,60	5,70	0,27	5,43	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,70		4,11	6,99	0,23	6,76	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,70		4,11	6,99	0,23	6,76	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,70		4,11	6,99	0,23	6,76	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,70		4,11	6,99	0,23	6,76	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,31		4,11	5,38	0,48	4,90	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,13		4,11	8,75	4,40	4,35	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,76		4,11	11,34	0,25	11,09	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,85		4,11	7,60	3,29	4,31	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	6,58		4,10	26,98	7,05	19,93	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,49		4,11	2,01	0,24	1,77	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,32		4,11	1,32	0,24	1,08	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,31		4,11	5,38	0,48	4,90	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	4,27		4,11	17,55	7,49	10,06	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,72		4,11	11,18	0,16	11,02	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,34		4,11	9,62	0,41	9,21	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,71		4,11	2,92	0,25	2,67	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	7,87		2,91	22,90	22,82	0,08	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	7,87		2,91	22,90	22,82	0,08	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,72		4,11	11,18		11,18	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	6,99		4,11	28,73	0,26	28,47	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,03		4,11	8,34	0,24	8,10	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,15		2,57	2,96		2,96	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,30		2,57	0,77	0,01	0,76	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,04		2,57	5,24	1,81	3,43	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,00		2,63	2,63	0,50	2,13	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,31		2,57	0,80		0,80	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,09		2,57	2,80	0,15	2,65	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,34		4,11	9,62	0,41	9,21	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,46		4,11	6,00	0,50	5,50	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,15		2,63	3,02		3,02	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,31		2,63	0,82	0,04	0,78	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	2,04		2,62	5,34	1,80	3,54	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,79		1,54	2,76	2,76	0,00	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,99		1,54	1,52	1,52	0,00	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,00		2,63	2,63	0,50	2,13	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,31		2,63	0,82		0,82	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,09		2,63	2,87	0,16	2,71	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,97		1,54	1,49	1,49	0,00	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,91		1,54	2,94	2,94	0,00	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,73		4,11	7,11	0,51	6,60	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,91		4,11	7,85	0,25	7,60	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,55		4,11	6,37	0,01	6,36	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,45		4,11	5,96	0,49	5,47	


BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,53		4,11	6,29	0,00	6,29	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,45		4,11	5,96	0,49	5,47	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	2,51		1,14	2,86		2,86	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,89		1,14	1,01		1,01	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50		0,50	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	2,03		1,14	2,31	0,07	2,24	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,98		1,14	2,26		2,26	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50		0,50	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,97		1,14	2,25		2,25	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50		0,50	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	2,18		1,14	2,49		2,49	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,72		1,14	1,96		1,96	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	**733,21**
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	7,90		3,66	28,91		28,91	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	7,90		3,66	28,91		28,91	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	3,11		2,66	8,27	0,32	7,95	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	2,73		2,66	7,26		7,26	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	3,11		2,66	8,27	0,32	7,95	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	2,73		2,66	7,26		7,26	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	3,11		2,66	8,27	0,32	7,95	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	3,11		2,66	8,27	0,32	7,95	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	4,90		2,66	13,03	1,43	11,60	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	2,73		2,66	7,26		7,26	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	7,40		2,66	19,68	8,76	10,92	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	7,69		2,60	19,99	4,34	15,65	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	3,50		2,60	9,10		9,10	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	3,50		2,60	9,10		9,10	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,73		2,60	7,10		7,10	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	12,62		4,61	58,18	0,26	57,92	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	11,97		3,81	45,61	0,27	45,34	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	7,69		2,60	19,99		19,99	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,33		4,11	17,80	0,48	17,32	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,33		4,11	17,80	4,10	13,70	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,52		4,10	6,23	0,50	5,73	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	3,77		4,11	15,49	0,27	15,22	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	13,81		4,10	56,62	0,23	56,39	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,44		3,66	5,27	0,43	4,84	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,47		4,11	6,04	0,47	5,57	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,93		4,11	12,04	2,31	9,73	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,60		4,11	10,69	2,09	8,60	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	13,44		4,10	55,10	10,10	45,00	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,28		4,11	17,59	0,51	17,08	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,28		4,11	17,59	0,51	17,08	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	1,47		3,81	5,60	0,23	5,37	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,95		4,67	4,44	0,27	4,17	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,95		4,67	4,44	0,27	4,17	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	1,47		3,81	5,60	0,23	5,37	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,28		4,11	17,59	0,51	17,08	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,96		4,11	12,17	4,19	7,98	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,31		4,11	5,38	3,26	2,12	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,86		4,11	3,53		3,53	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,01		4,11	16,48		16,48	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	3,41		4,11	14,02	0,27	13,75	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,72		4,11	11,18	0,00	11,18	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,75		4,11	3,08	0,23	2,85	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,75		4,11	3,08	0,23	2,85	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,32		4,11	5,43	0,24	5,19	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,08		4,11	8,55	4,15	4,40	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,33		4,11	17,80	0,48	17,32	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	10,10		4,11	41,51	3,44	38,07	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,31		4,11	5,38	2,77	2,61	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,28		4,11	17,59	0,51	17,08	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	8,56		4,11	35,18	6,06	29,12	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,41		4,11	9,91	3,23	6,68	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	1,69		3,36	5,68	0,01	5,67	

BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,00		4,61	9,22	3,13	6,09	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	5,68		4,11	23,34	0,00	23,34	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,28		4,11	17,59	0,51	17,08	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,47		4,11	6,04	0,51	5,53	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,46		4,11	6,00	0,51	5,49	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,93		4,11	12,04	2,33	9,71	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	3,07		4,11	12,62	2,25	10,37	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,33		4,11	17,80	0,50	17,30	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,45		4,11	1,85		1,85	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,45		4,11	1,85	0,27	1,58	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,86		4,11	3,53	0,22	3,31	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,26		4,11	17,51	5,65	11,86	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,71		4,11	7,03	0,27	6,76	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,71		4,11	7,03	0,27	6,76	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,17		4,11	17,14	0,43	16,71	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,17		4,11	17,14	2,82	14,32	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,03		4,11	4,23	0,22	4,01	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,77		4,11	3,16	0,26	2,90	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,19		4,11	0,78	0,25	0,53	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,32		4,11	5,43	0,52	4,91	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,63		4,61	12,12	2,59	9,53	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	1,86		4,61	8,57	0,55	8,02	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,63		4,61	12,12	2,56	9,56	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	1,91		4,61	8,81	0,27	8,54	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,63		4,61	12,12	2,56	9,56	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	1,82		4,61	8,39	0,29	8,10	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,63		4,61	12,12	2,56	9,56	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	1,89		4,61	8,71	0,30	8,41	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,63		4,61	12,12	2,56	9,56	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	1,84		4,61	8,48	0,28	8,20	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,63		4,61	12,12	2,58	9,54	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,04		4,61	9,40	0,56	8,84	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,59		4,61	11,94	2,55	9,39	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,66		4,61	12,26	3,25	9,01	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,32		4,55	10,56	0,03	10,53	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,58		4,61	11,89	2,84	9,05	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,72		4,61	12,54	2,59	9,95	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	4,08		4,61	18,81	2,85	15,96	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,24		1,14	2,55	0,07	2,48	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,60		1,14	2,96		2,96	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,32		4,55	10,56		10,56	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	7,90		4,61	36,42		36,42	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,38		4,61	1,75		1,75	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,89		4,61	4,10	0,26	3,84	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,49		4,61	11,48	0,27	11,21	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,45		4,10	10,05		10,05	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,96		4,11	8,06	0,24	7,82	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,52		4,10	6,23	0,50	5,73	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,58		4,61	11,89	0,57	11,32	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,32		4,11	5,43	1,10	4,33	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,20		4,11	9,04	0,49	8,55	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,00		3,81	7,62	2,33	5,29	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,27		3,36	0,91	0,27	0,64	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	1,69		3,36	5,68	0,01	5,67	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,00		3,81	7,62	3,15	4,47	

BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,28		3,36	0,94	0,27	0,67	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,63		4,61	12,12		12,12	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,64		4,61	12,17	0,30	11,87	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,56		4,61	11,80	0,56	11,24	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,70		4,61	12,45	0,58	11,87	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	4,95		2,66	13,17	5,83	7,34	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	4,90		2,66	13,03	5,82	7,21	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	4,95		2,66	13,17	1,44	11,73	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,54		4,11	10,44		10,44	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,41		4,11	1,69	0,50	1,19	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,47		4,11	6,04	0,51	5,53	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,44		3,66	5,27	0,43	4,84	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,16		4,61	9,96	0,59	9,37	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,33		4,61	10,74	0,54	10,20	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,33		4,61	10,74	0,54	10,20	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,94		4,61	4,33	0,56	3,77	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,44		4,61	2,03	0,02	2,01	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,94		4,61	4,33	0,56	3,77	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,50		4,61	2,31	0,30	2,01	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,94		4,61	4,33	0,56	3,77	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,50		4,61	2,31	0,30	2,01	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	5,03		1,14	5,73		5,73	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50		0,50	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,62		1,14	2,99		2,99	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50		0,50	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	3,83		1,14	4,37	0,01	4,36	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	4,03		1,14	4,59		4,59	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,18		1,14	2,49		2,49	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	2,68		1,14	3,06		3,06	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,58		0,82	0,48	0,01	0,47	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,18		4,61	0,83		0,83	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 2	1,00	0,97		4,61	4,47	0,07	4,40	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,12		1,16	0,14		0,14	1.389,52
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	8,21		4,61	37,85		37,85	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	7,95		4,61	36,65		36,65	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	1,08		1,50	1,62	1,62	0,00	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	7,01		0,65	4,56	0,01	4,55	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	0,90		0,65	0,59		0,59	
BLOQUE 3	PISO 2 ES	1,00	1,25		0,64	0,80	0,05	0,75	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	4,40		2,90	12,76	12,76	0,00	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	3,28		1,14	3,74		3,74	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,82	0,50	0,05	0,45	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	0,56		0,82	0,46	0,05	0,41	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,35	0,21		0,21	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	2,94		1,14	3,35		3,35	
BLOQUE 3	PLANTA PISO 2	1,00	0,61		0,35	0,21		0,21	88,76
TOTAL									2.211,49

MEMORIA

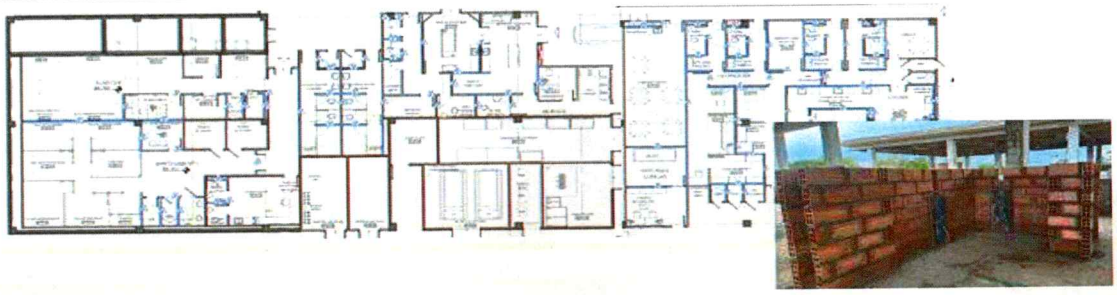

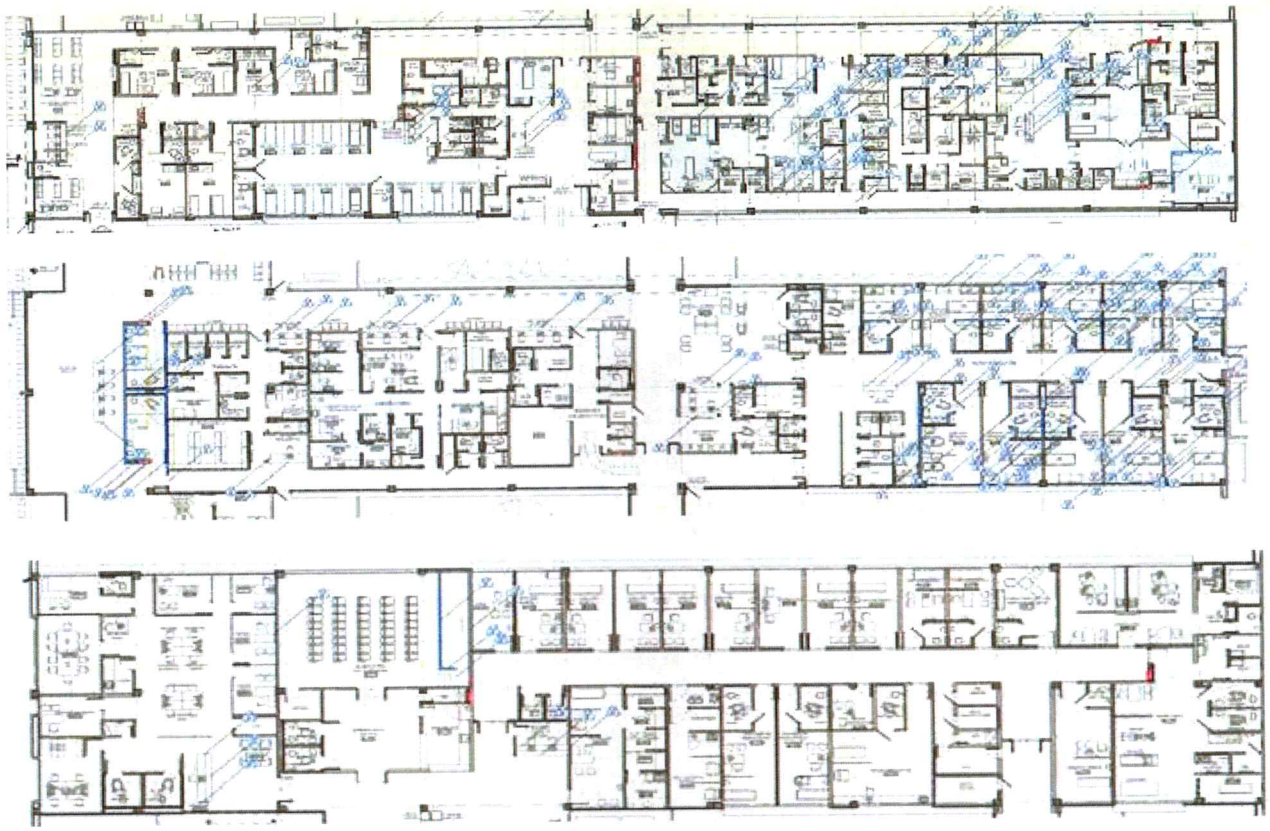

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

MEMORIA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
					ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	RESTA		
ITEM	4.00.20	UNIDAD	m2	M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0.115 mts mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m							
		PISO 1 ES		1,00	7,90		2,79	22,04		22,04	**22,04**
		PLANTA CUBIERTA		1,00	7,90		2,96	23,38		23,38	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	5,53		0,35	1,94		1,94	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	5,53		0,35	1,94		1,94	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	3,48		0,35	1,22		1,22	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	3,48		0,35	1,22		1,22	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	2,76		0,35	0,97		0,97	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	2,76		0,35	0,97		0,97	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	6,77		0,35	2,37		2,37	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	6,77		0,35	2,37		2,37	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	2,78		0,35	0,97		0,97	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	1,84		0,35	0,64		0,64	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	2,78		0,35	0,97		0,97	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	1,84		0,35	0,64		0,64	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	2,67		0,35	0,93		0,93	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	2,67		0,35	0,93		0,93	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	4,77		0,35	1,67		1,67	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	1,80		0,35	0,63		0,63	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	1,80		0,35	0,63		0,63	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	1,49		0,35	0,52		0,52	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	1,49		0,35	0,52		0,52	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
		PLANTA CUBIERTA		1,00	1,86		0,35	0,65		0,65	

	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	1,86		0,35	0,65		0,65	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,84		0,35	0,29		0,29	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,41		0,35	0,84		0,84	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,84		0,35	0,29		0,29	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,41		0,35	0,84		0,84	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	23,76		0,35	8,32		8,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	23,76		0,35	8,32		8,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	4,10		0,35	1,44		1,44	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	4,10		0,35	1,44		1,44	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,07		0,35	0,72		0,72	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,07		0,35	0,72		0,72	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,68		0,35	0,94		0,94	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,70		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,26		0,35	0,79		0,79	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,70		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,26		0,35	0,79		0,79	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,42		0,35	0,85		0,85	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,42		0,35	0,85		0,85	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	5,16		0,35	1,81		1,81	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	5,16		0,35	1,81		1,81	**100,22**
	CUBIERTA BAJA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	CUBIERTA BAJA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	CUBIERTA BAJA	1,00	1,32		0,35	0,46		0,46	
	CUBIERTA BAJA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	CUBIERTA BAJA	1,00	1,32		0,35	0,46		0,46	
	CUBIERTA BAJA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	CUBIERTA BAJA	1,00	1,32		0,35	0,46		0,46	
	CUBIERTA BAJA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	**2,65**
	PLANTA PISO 1	1,00	1,32		0,35	0,46		0,46	
	PLANTA PISO 1	1,00	2,03		0,19	0,39		0,39	
	PLANTA PISO 1	1,00	1,03		0,19	0,20		0,20	
	PLANTA PISO 1	1,00	1,03		0,19	0,20		0,20	
	PLANTA PISO 1	1,00	2,30		0,95	2,19		2,19	
	PLANTA PISO 1	1,00	2,22		0,95	2,11		2,11	
	PLANTA PISO 1	1,00	3,64		0,95	3,46		3,46	
	PLANTA PISO 1	1,00	11,83		0,95	11,24	5,64	5,60	
	PLANTA PISO 1	1,00	11,91		0,95	11,31	5,62	5,69	**20,28**
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,00		0,95	1,90		1,90	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	5,09		0,35	1,78		1,78	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	5,09		0,35	1,78		1,78	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	**8,01**
	PLANTA PISO 2	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA PISO 2	1,00	2,03		0,19	0,39		0,39	
	PLANTA PISO 2	1,00	1,03		0,19	0,20		0,20	**0,83**
	PLANTA CUBIERTA	1,00	1,03		0,19	0,20		0,20	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	


	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	1,84		0,35	0,64		0,64	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,62		0,35	0,22		0,22	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,62		0,35	0,22		0,22	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,92		0,35	0,32		0,32	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	1,84		0,35	0,64		0,64	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	1,84		0,35	0,64		0,64	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,68		0,35	0,94		0,94	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,23		0,35	0,78		0,78	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	2,23		0,35	0,78		0,78	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	4,80		0,35	1,68		1,68	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	4,80		0,35	1,68		1,68	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,78		0,35	0,27		0,27	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,78		0,35	0,27		0,27	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,78		0,35	0,27		0,27	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	4,95		0,35	1,73		1,73	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	5,07		0,35	1,77		1,77	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,70		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,70		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,84		0,35	0,29		0,29	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,84		0,35	0,29		0,29	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	**31,31**
	PLANTA PISO 1	1,00	0,72		0,35	0,25		0,25	**0,25**

	PISO 1 ES	1,00	3,80		4,17	15,85	3,07	12,78	**12,78**
	PLANTA PISO 1	1,00	1,43		4,22	6,03		6,03	
	PLANTA PISO 1	1,00	1,01		0,81	0,82		0,82	
	PLANTA PISO 1	1,00	1,01		0,81	0,82		0,82	
	PLANTA PISO 1	1,00	0,85		0,81	0,69		0,69	
	PLANTA PISO 1	1,00	3,80		4,17	15,85		15,85	
	PLANTA PISO 1	1,00	7,70		1,69	13,01		13,01	
	PLANTA PISO 1	1,00	0,43		1,69	0,73		0,73	**37,95**
	PLANTA CUBIERTA	1,00	0,98		1,69	1,66		1,66	**1,66**
	PLANTA PISO 1	1,00	4,77		0,35	1,67		1,67	
	PLANTA PISO 1	1,00	0,97		3,66	3,55		3,55	
	PLANTA PISO 1	1,00	4,49		3,66	16,43	6,01	10,42	
	PLANTA PISO 1	1,00	5,20		3,71	19,29	3,01	16,28	
	PLANTA PISO 1	1,00	0,56		4,05	2,27		2,27	**34,19**
	PISO 1 ES	1,00	0,73		4,05	2,96		2,96	
	PISO 1 ES	1,00	4,14		2,16	8,94		8,94	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		0,55	4,35		4,35	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		0,64	5,06		5,06	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		2,16	17,06		17,06	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		1,00	7,90		7,90	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		2,16	17,06		17,06	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		2,16	17,06		17,06	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		2,56	20,22		20,22	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		2,55	20,15		20,15	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		2,55	20,15		20,15	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		1,10	8,69		8,69	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		2,55	20,15		20,15	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		1,00	7,90		7,90	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		1,45	11,46		11,46	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		1,45	11,46		11,46	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		2,46	19,43		19,43	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		1,75	13,83		13,83	**233,81**
	PLANTA PISO 1	1,00	3,00		2,45	7,35		7,35	
	PLANTA PISO 1	1,00	8,05		2,79	22,46		22,46	
	PLANTA PISO 1	1,00	8,00		1,65	13,20		13,20	
	PLANTA PISO 1	1,00	8,00		2,79	22,32		22,32	
	PLANTA PISO 1	1,00	7,95		2,79	22,18		22,18	
	PLANTA PISO 1	1,00	3,00		2,04	6,12		6,12	
	PLANTA PISO 1	1,00	8,05		2,65	21,33		21,33	
	PLANTA PISO 1	1,00	8,05		3,05	24,55		24,55	
	PLANTA PISO 1	1,00	3,10		3,79	11,75		11,75	
	PLANTA PISO 1	1,00	7,90		3,49	27,57		27,57	
	PLANTA PISO 1	1,00	3,00		3,29	9,87		9,87	
	PLANTA PISO 1	1,00	7,95		2,99	23,77		23,77	
	PLANTA PISO 1	1,00	8,00		2,94	23,52		23,52	
	PLANTA PISO 1	1,00	8,00		2,00	16,00		16,00	
	PLANTA PISO 1	1,00	8,05		2,50	20,13		20,13	
	PLANTA PISO 1	1,00	7,90		1,60	12,64		12,64	
	PLANTA PISO 1	1,00	7,90		2,69	21,25		21,25	
	PLANTA PISO 1	1,00	5,50		2,69	14,80		14,80	
	PLANTA PISO 1	1,00	7,86		2,70	21,22		21,22	
	PLANTA PISO 1	1,00	7,92		1,25	9,90		9,90	
	PLANTA PISO 1	1,00	5,50		1,60	8,80		8,80	**360,73**
	PISO 1 ES	1,00	3,76		1,60	6,02		6,02	
	PISO 1 ES	1,00	3,00		2,16	6,48		6,48	**12,50**
	PLANTA PISO 1	1,00	3,00		2,56	7,68		7,68	
	PLANTA PISO 1	1,00	7,90		2,17	17,14		17,14	**24,82**
	PISO 1 ES	1,00	3,10		2,17	6,73		6,73	
	PISO 1 ES	1,00	7,90		2,16	17,06		17,06	**23,79**
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	7,90		2,55	20,15		20,15	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	5,78		3,66	21,15	7,72	13,43	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	4,86		4,11	19,97		19,97	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	7,64		4,10	31,32	10,90	20,42	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,32		3,66	1,17		1,17	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	7,90		3,60	28,44	5,94	22,50	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	3,02		3,66	11,05		11,05	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,32		3,66	1,17		1,17	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	1,11		3,60	4,00		4,00	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	5,52		4,17	23,02	10,26	12,76	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	2,78		4,04	11,23	3,80	7,43	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,23		4,05	0,93		0,93	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,80		4,05	7,29		7,29	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,95		1,00	1,95		1,95	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,11		0,90	1,00		1,00	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,11		0,90	1,00		1,00	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,20		2,63	3,16	2,10	1,06	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,20		2,63	3,16		3,16	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	2,07		0,90	1,86		1,86	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,05		0,90	0,95		0,95	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,05		0,90	0,95		0,95	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	1,20		2,56	3,07	2,03	1,04	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,20		2,63	3,16		3,16	**158,39**
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,12		4,16	8,82	3,37	5,45	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	7,90		3,66	28,91	3,24	25,67	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,12		3,71	7,87		7,87	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	3,70		3,66	13,54		13,54	

BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	3,70		3,71	13,73	6,20	7,53	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,46		3,71	5,42		5,42	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,54		3,71	5,71	3,70	2,01	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	7,90		3,66	28,91	2,20	26,71	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	3,89		3,66	14,24		14,24	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,44		3,66	8,93	2,27	6,66	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,51		3,66	5,53	2,65	2,88	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,26		3,66	4,61	1,92	2,69	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	3,70		3,66	13,54		13,54	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,52		4,04	6,14	2,27	3,87	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,52		3,60	5,47	2,80	2,67	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	2,61		3,66	9,55	3,23	6,32	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	3,37		3,66	12,33		12,33	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	1,52		3,71	5,64		5,64	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	4,23		3,66	15,48	5,20	10,28	**175,33**
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	5,43		4,04	21,94		21,94	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	25,86		0,40	10,34		10,34	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	33,68		0,40	13,47		13,47	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	31,11		0,40	12,44		12,44	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,42		3,80	1,60		1,60	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,43		4,00	1,72		1,72	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,51		2,70	1,38		1,38	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		2,16	1,08		1,08	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,38		3,60	1,37		1,37	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,53		3,60	1,91		1,91	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,37		3,60	1,33		1,33	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,92		1,20	1,10		1,10	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	1,26		0,07	0,09		0,09	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,51		1,60	0,82		0,82	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	2,12		3,60	7,63		7,63	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		3,72	1,86		1,86	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,16	1,08		1,08	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,26	1,13		1,13	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,16	1,08		1,08	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,16	1,08		1,08	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,16	1,08		1,08	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,16	1,08		1,08	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,96	1,48		1,48	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,56	1,28		1,28	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,56	1,28		1,28	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,31	1,16		1,16	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,55	1,28		1,28	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,06	1,03		1,03	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,36	1,18		1,18	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,36	1,18		1,18	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		2,46	1,23		1,23	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		2,76	1,38		1,38	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,40		2,79	1,12		1,12	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,40		2,79	1,12		1,12	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,40		2,79	1,12		1,12	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,40		2,79	1,12		1,12	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		2,79	1,40		1,40	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		2,79	1,40		1,40	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,40		4,00	1,60		1,60	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,41		4,00	1,64		1,64	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		3,79	1,90		1,90	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		3,29	1,65		1,65	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		3,29	1,65		1,65	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,40		2,99	1,20		1,20	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,40		2,94	1,18		1,18	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,40		2,95	1,18		1,18	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,40		2,49	1,00		1,00	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		2,49	1,25		1,25	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		2,69	1,35		1,35	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,51		2,69	1,37		1,37	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,52		1,60	0,83		0,83	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,51		1,60	0,82		0,82	
BLOQUE 1	PISO 1 ES	1,00	0,50		1,60	0,80		0,80	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		2,55	1,28		1,28	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		2,17	1,09		1,09	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,43		2,17	0,93		0,93	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		3,60	1,80		1,80	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,53		3,60	1,91		1,91	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	17,30		3,60	62,28		62,28	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		3,66	1,83		1,83	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		3,66	1,83		1,83	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	16,82		3,60	60,55		60,55	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	6,70		3,60	24,12	5,53	18,59	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	5,13		3,60	18,47	2,00	16,47	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	6,02		3,60	21,67	2,84	18,83	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,52		3,60	1,87		1,87	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	4,75		4,05	19,24	4,82	14,42	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,25		2,63	0,66		0,66	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,25		2,63	0,66		0,66	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 2	1,00	0,25		2,63	0,66		0,66	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,25		2,63	0,66		0,66	

BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	4,61		3,60	16,60	2,00	14,60	
BLOQUE 1	PLANTA PISO 1	1,00	0,51		3,60	1,84		1,84	348,45
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	40,13		0,40	16,05	4,38	11,67	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		3,66	1,83		1,83	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,52		3,66	1,90		1,90	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,52		3,66	1,90		1,90	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		3,66	1,83		1,83	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,52		3,66	1,90		1,90	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	0,52		3,66	1,90		1,90	
BLOQUE 2	PLANTA PISO 1	1,00	0,50		3,72	1,86		1,86	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	0,50		3,66	1,83		1,83	
BLOQUE 2	PISO 1 ES	1,00	0,50		3,72	1,86		1,86	
		1,00	0,50		3,72	1,86		1,86	30,35
TOTAL									1.640,34


MEMORIA

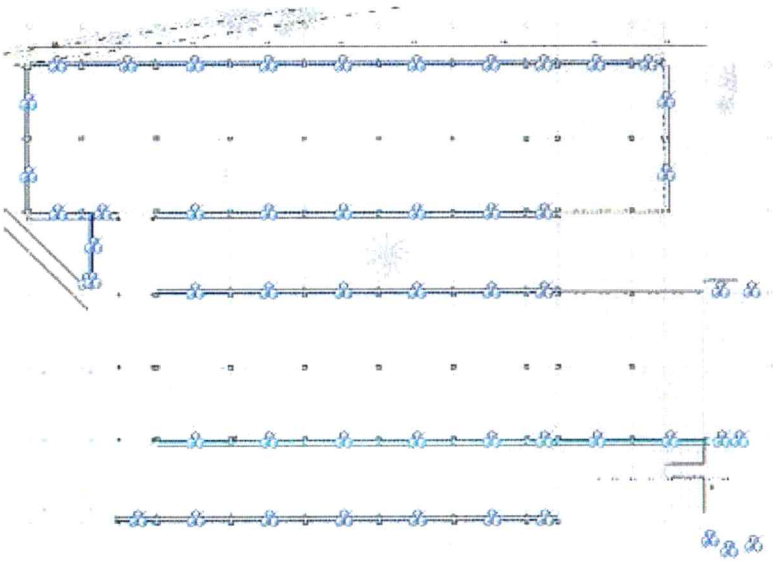














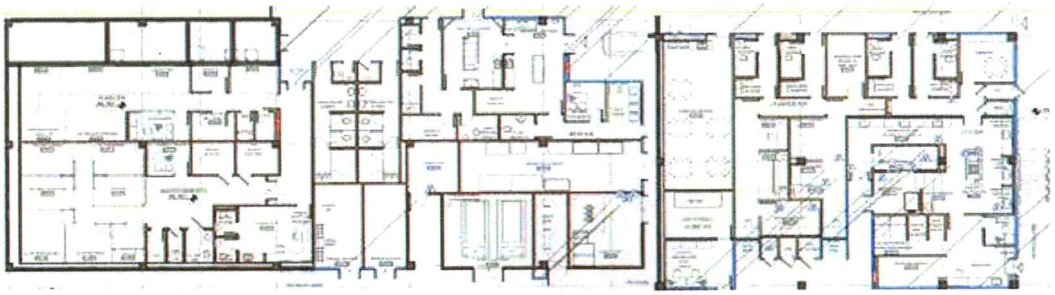



MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA


HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura / COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE / CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024									MEMORIA DE CANTIDADES	
OBJETO:				CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE							
MEMORIA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
					ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	4.00.21	UNIDAD	m	COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa, incl. Refuerzo según diseño							
BLOQUE 1		PISO 1		70,00			0,55			38,50	
BLOQUE 1		PISO 1		2,00			1,15			2,30	
BLOQUE 1		PISO 1		5,00			2,66			13,30	
BLOQUE 1		PISO 1		148,00			4,11			608,28	
BLOQUE 1		PISO 1		20,00			0,23			4,60	
BLOQUE 1		PISO 1		2,00			1,10			2,20	
BLOQUE 1		PISO 1		2,00			1,54			3,08	
BLOQUE 1		PISO 1		14,00			2,57			35,98	
BLOQUE 1		PISO 1		2,00			2,63			5,26	**713,50**
BLOQUE 1		PISO 2		5,00			2,96			14,80	
BLOQUE 1		PISO 2		45,00			2,91			130,95	
BLOQUE 1		PISO 2		84,00			2,85			239,40	
BLOQUE 1		PISO 2		6,00			3,50			21,00	
BLOQUE 1		PISO 2		6,00			2,80			16,80	
BLOQUE 1		PISO 2		9,00			2,86			25,74	
BLOQUE 1		PISO 2		18,00			0,50			9,00	
BLOQUE 1		PISO 2		20,00			0,23			4,60	
BLOQUE 1		PISO 2		4,00			3,81			15,24	
BLOQUE 1		PISO 2		11,00			4,60			50,60	
BLOQUE 1		PISO 2		13,00			2,63			34,19	
BLOQUE 1		PISO 2		21,00			1,14			23,94	
BLOQUE 1		PISO 2		18,00			0,82			14,76	**601,02**
BLOQUE 2		PISO 1		45,00			2,66			119,70	
BLOQUE 2		PISO 1		19,00			2,60			49,40	
BLOQUE 2		PISO 1		178,00			4,11			731,58	
BLOQUE 2		PISO 1		4,00			3,66			14,64	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00			1,16			2,32	**917,64**
BLOQUE 2		PISO 2		145,00			4,61			668,45	
BLOQUE 2		PISO 2		23,00			3,81			87,63	
BLOQUE 2		PISO 2		24,00			0,82			19,68	
BLOQUE 2		PISO 2		2,00			4,67			9,34	
BLOQUE 2		PISO 2		10,00			3,36			33,60	
BLOQUE 2		PISO 2		6,00			4,55			27,30	
BLOQUE 2		PISO 2		38,00			1,14			43,32	**889,32**
BLOQUE 3		PISO 2		12,00			4,61			55,32	
BLOQUE 3		PISO 2		12,00			0,65			7,80	
BLOQUE 3		PISO 2		8,00			1,14			9,12	
BLOQUE 3		PISO 2		4,00			0,82			3,28	
BLOQUE 3		PISO 2		4,00			0,35			1,40	
BLOQUE 3		PISO 2		19,00			0,25			4,75	**81,67**
TOTAL											3.262,36
MEMORIA											













MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA


HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA


Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024										MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:				CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE							
MEMORIA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
					ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	6.00.02	UNIDAD	m2	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse							
BLOQUE 1		PISO 1		4,00		1,68	2,70	4,54		18,14	
BLOQUE 1		PISO 1		4,00		2,59	2,70	6,99		27,97	
BLOQUE 1		PISO 1		5,00		1,32	2,70	3,56		17,82	
BLOQUE 1		PISO 1		3,00		0,09	2,70	0,24		0,73	
BLOQUE 1		PISO 1		2,00		1,62	2,70	4,37		8,75	
BLOQUE 1		PISO 1		1,00		0,63	2,70	1,70		1,70	
BLOQUE 1		PISO 1		1,00		1,79	2,70	4,83		4,83	
BLOQUE 1		PISO 1		1,00		6,93	2,70	18,71		18,71	
BLOQUE 1		PISO 1		1,00		1,77	2,70	4,77		4,77	
BLOQUE 1		PISO 1		1,00		1,67	2,70	4,51		4,51	
BLOQUE 1		PISO 1		2,00		0,14	2,70	0,38		0,76	
BLOQUE 1		PISO 1		1,00		3,89	2,70	10,50		10,50	**118,02**
BLOQUE 2		PISO 1		8,00		1,39	2,70	3,75		30,02	
BLOQUE 2		PISO 1		3,00		1,66	2,70	4,48		13,45	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		0,30	2,70	0,81		1,62	
BLOQUE 2		PISO 1		10,00		0,10	2,70	0,27		2,70	
BLOQUE 2		PISO 1		13,00		0,18	2,70	0,49		6,32	
BLOQUE 2		PISO 1		5,00		1,01	2,70	2,73		13,64	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		1,61	2,70	4,35		8,69	
BLOQUE 2		PISO 1		5,00		1,45	2,70	3,92		19,58	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		0,20	2,70	0,54		1,08	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		2,22	2,70	5,99		11,99	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		1,11	2,70	3,00		5,99	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		1,56	2,70	4,21		4,21	
BLOQUE 2		PISO 1		6,00		1,64	2,70	4,43		26,57	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		0,73	2,70	1,97		1,97	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		1,24	2,70	3,35		3,35	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		1,74	2,70	4,70		9,40	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		0,56	2,70	1,51		1,51	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		0,50	2,70	1,35		1,35	
BLOQUE 2		PISO 1		4,00		0,61	2,70	1,65		6,59	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		0,12	2,70	0,32		0,65	
BLOQUE 2		PISO 1		3,00		1,19	2,70	3,21		9,64	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		0,16	2,70	0,43		0,43	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		1,71	2,70	4,62		9,23	
BLOQUE 2		PISO 1		4,00		1,78	2,70	4,81		19,22	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		0,08	2,70	0,22		0,43	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		2,50	2,70	6,75		6,75	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		1,48	2,70	4,00		7,99	
BLOQUE 2		PISO 1		4,00		1,32	2,70	3,56		14,26	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		2,37	2,70	6,40		6,40	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		1,52	2,70	4,10		4,10	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		0,80	2,70	2,16		4,32	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		1,92	2,70	5,18		10,37	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		2,24	2,70	6,05		6,05	
BLOQUE 2		PISO 1		2,00		2,40	2,70	6,48		12,96	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		0,28	2,70	0,76		0,76	
BLOQUE 2		PISO 1		4,00		2,30	2,70	6,21		24,84	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		2,37	2,70	6,40		6,40	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		2,20	2,70	5,94		5,94	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		0,75	2,70	2,03		2,03	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		1,35	2,70	3,65		3,65	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		0,98	2,70	2,65		2,65	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		2,59	2,70	6,99		6,99	
BLOQUE 2		PISO 1		3,00		0,70	2,70	1,89		5,67	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		0,41	2,70	1,11		1,11	
BLOQUE 2		PISO 1		1,00		1,80	2,70	4,86		4,86	**345,40**
BLOQUE 2		PISO 2		1,00		1,32	2,70	3,56		3,56	
BLOQUE 2		PISO 2		1,00		0,40	2,70	1,08		1,08	
BLOQUE 2		PISO 2		2,00		0,12	2,70	0,32		0,65	

BLOQUE 2	PISO 2	1,00		0,42	2,70	1,13		1,13	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		1,34	2,70	3,62		3,62	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		5,59	2,70	15,09		15,09	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		5,69	2,70	15,36		15,36	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		5,48	2,70	14,80		14,80	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		5,38	2,70	14,53		14,53	
BLOQUE 2	PISO 2	3,00		1,72	2,70	4,64		13,93	
BLOQUE 2	PISO 2	2,00		2,77	2,70	7,48		14,96	
BLOQUE 2	PISO 2	2,00		1,68	2,70	4,54		9,07	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		0,10	2,70	0,27		0,27	
BLOQUE 2	PISO 2	5,00		1,44	2,70	3,89		19,44	
BLOQUE 2	PISO 2	7,00		2,54	2,70	6,86		48,01	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		1,81	2,70	4,89		4,89	
BLOQUE 2	PISO 2	8,00		1,86	2,70	5,02		40,18	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		1,54	2,70	4,16		4,16	
BLOQUE 2	PISO 2	2,00		1,42	2,70	3,83		7,67	
BLOQUE 2	PISO 2	2,00		1,75	2,70	4,73		9,45	
BLOQUE 2	PISO 2	2,00		0,12	2,70	0,32		0,65	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		1,04	2,70	2,81		2,81	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		1,51	2,70	4,08		4,08	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		0,14	2,70	0,38		0,38	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		2,59	2,70	6,99		6,99	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		1,00	2,70	2,70		2,70	
BLOQUE 2	PISO 2	2,00		1,92	2,70	5,18		10,37	
BLOQUE 2	PISO 2	1,00		1,94	2,70	5,24		5,24	
BLOQUE 2	PISO 2	2,00		0,18	2,70	0,49		0,97	
									274,26

TOTAL	537,68

MEMORIA

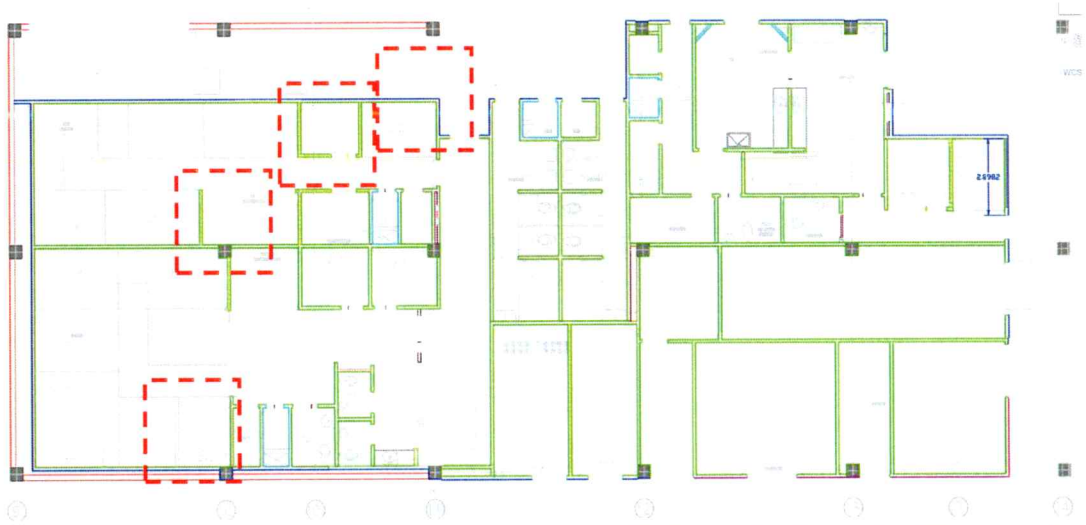

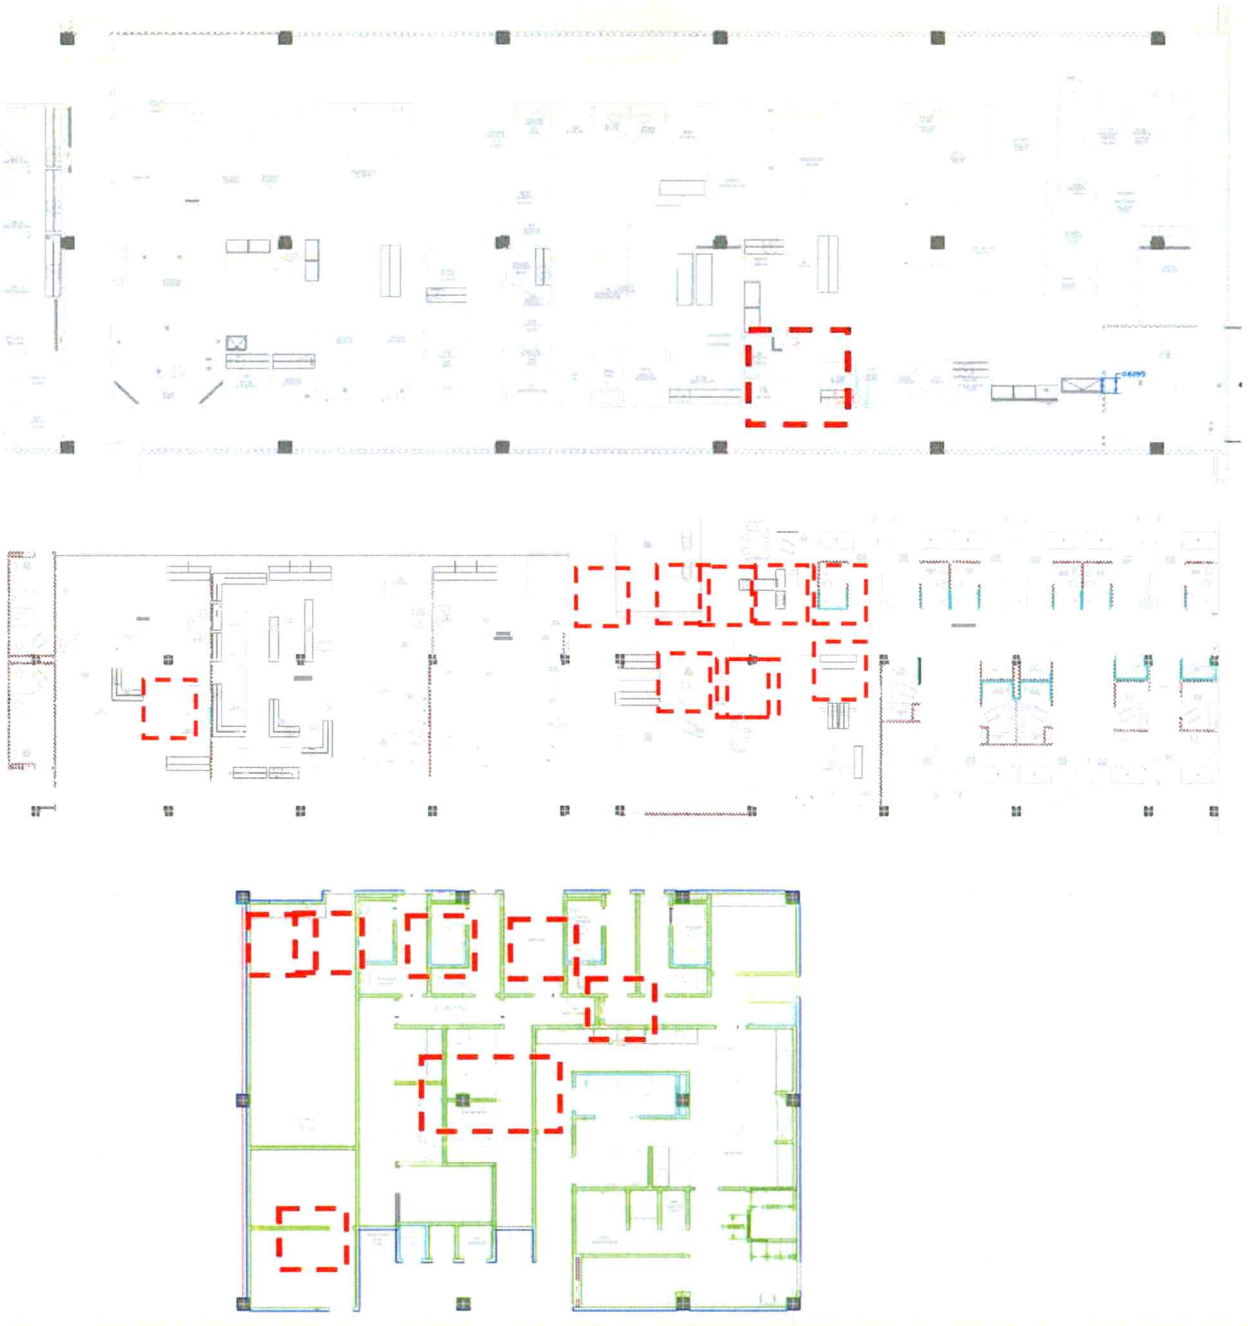


MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA


HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024		MEMORIA DE CANTIDADES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	

MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM 7.00.03	UNIDAD m	BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LÍNEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales							
BLOQUE 1	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		90,64					181,28
BLOQUE 1	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		19,78					39,56
BLOQUE 1	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		87,73					175,46
BLOQUE 1	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		16,99					33,98
BLOQUE 2	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		19,70					39,40
BLOQUE 2	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		16,99					33,98
BLOQUE 2	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		75,45					150,90
BLOQUE 2	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		72,76					145,52
BLOQUE 3	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		72,69					145,38
BLOQUE 3	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		19,78					39,56
BLOQUE 3	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		69,63					139,26
BLOQUE 3	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		16,82					33,64
PASARELA 1	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		6,93					13,86
PASARELA 2	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		6,89					13,78
PASARELA 3	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		6,70					13,40
PASARELA 4	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		6,70					13,40
ACCESO 1	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		6,86					13,72
ACCESO 1	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		3,03					6,06
ACCESO 2	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		6,86					13,72
ACCESO 2	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		3,03					6,06
CUARTO DE ASEO	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		3,36					6,72
CUARTO DE ASEO	BORDILLO PERIMETRAL	2,00		18,45					36,91
TOTAL									815,55

MEMORIA

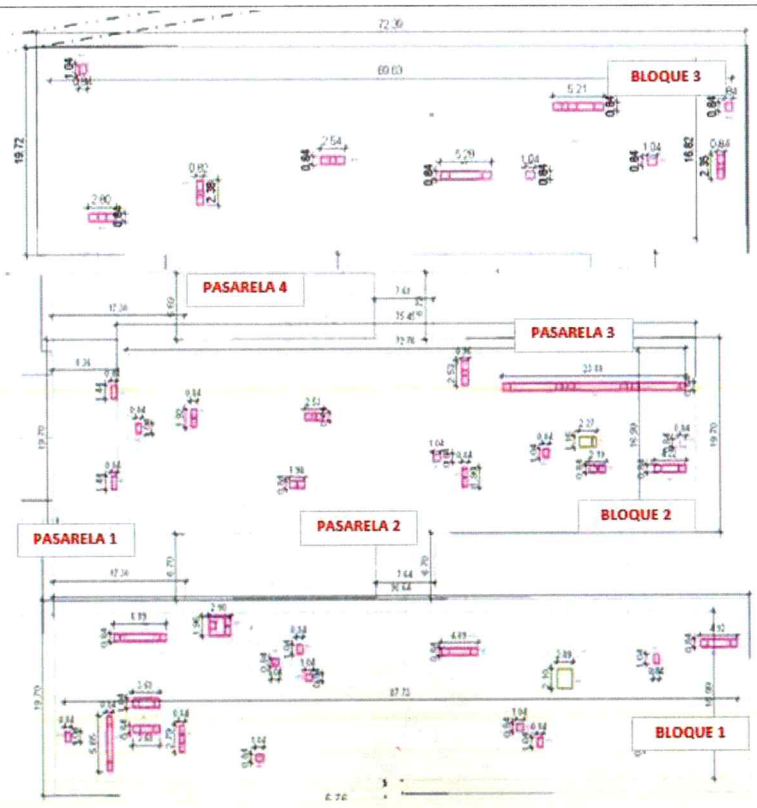

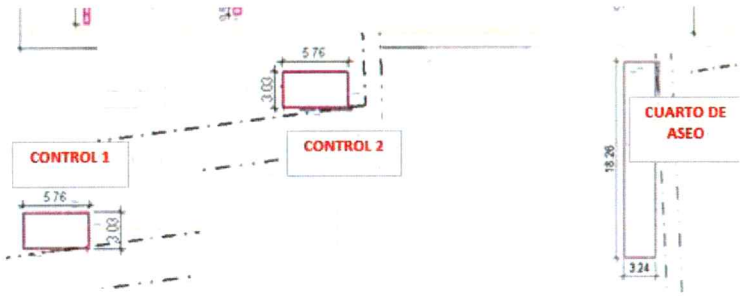

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA


HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2021	MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

MEMORIA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
					ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	9.00.03	UNIDAD	m2	PLACA DE YESO PERFORADA DE LADO A LADA, ZONA POSTERIOR CARTÓN ROSA Y LA CARA VISTA CARTÓN MARFIL, PERFORACIÓN EN BLOQUE DISEÑO B4 12/25R EN LAMINAS DE 1.2X2.40 E=12.5MM INCL. VELO DE FIBRA ACÚSTICA ESTÁNDAR COLOR BLANCO SOBRE EL REVERSO DE LA PLACA, SEGÚN RECOMENDACIÓN DE ACUSTEC, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse							
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		2,90		109,45		109,45	**109,45**
PISO 2		BLOQUE 2		1,00		2,70		80,41		80,41	
PISO 2		BLOQUE 2		1,00		2,70		74,81		74,81	
PISO 2		BLOQUE 2		1,00		2,70		86,69		86,69	
PISO 2		BLOQUE 2		1,00		2,90		2,72		2,72	
PISO 2		BLOQUE 2		1,00		2,90		2,72		2,72	**247,35**
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		3.00		89,39		89,39	
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		2.70		8,39		8,39	
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		2.90		3,65		3,65	
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		2.70		8,28		8,28	
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		2.70		6,03		6,03	
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		2.70		104,01		104,01	
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		2.70		7,80		7,80	
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		2.70		19,22		19,22	
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		2.70		10,36		10,36	
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		2.70		20,18		20,18	
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		2.70		11,40		11,40	**288,71**
TOTAL											545,51

MEMORIA

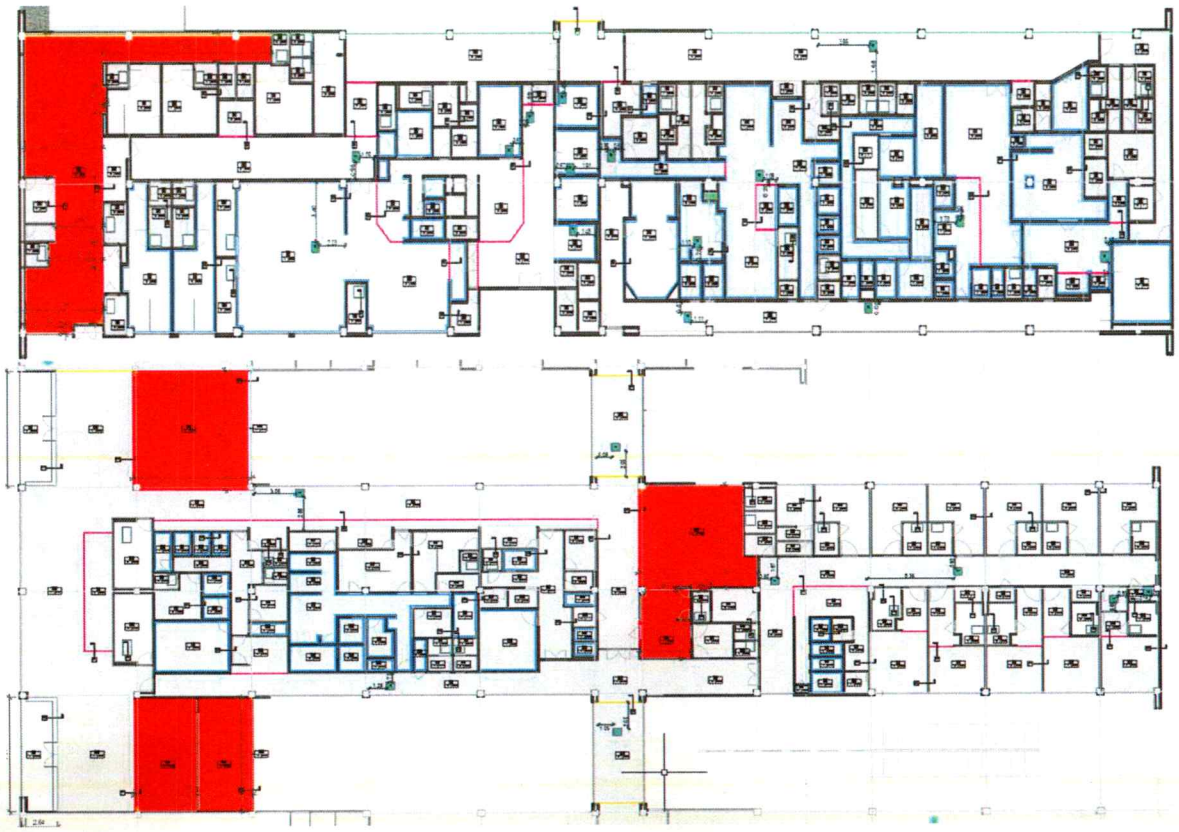



MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA


HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	INP 11	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación							
	CODOS	397,00						397,00	397,00
	REDUCCION	46,00						46,00	46,00
	TEE	9,00						9,00	9,00
TOTAL									452,00


MEMORIA

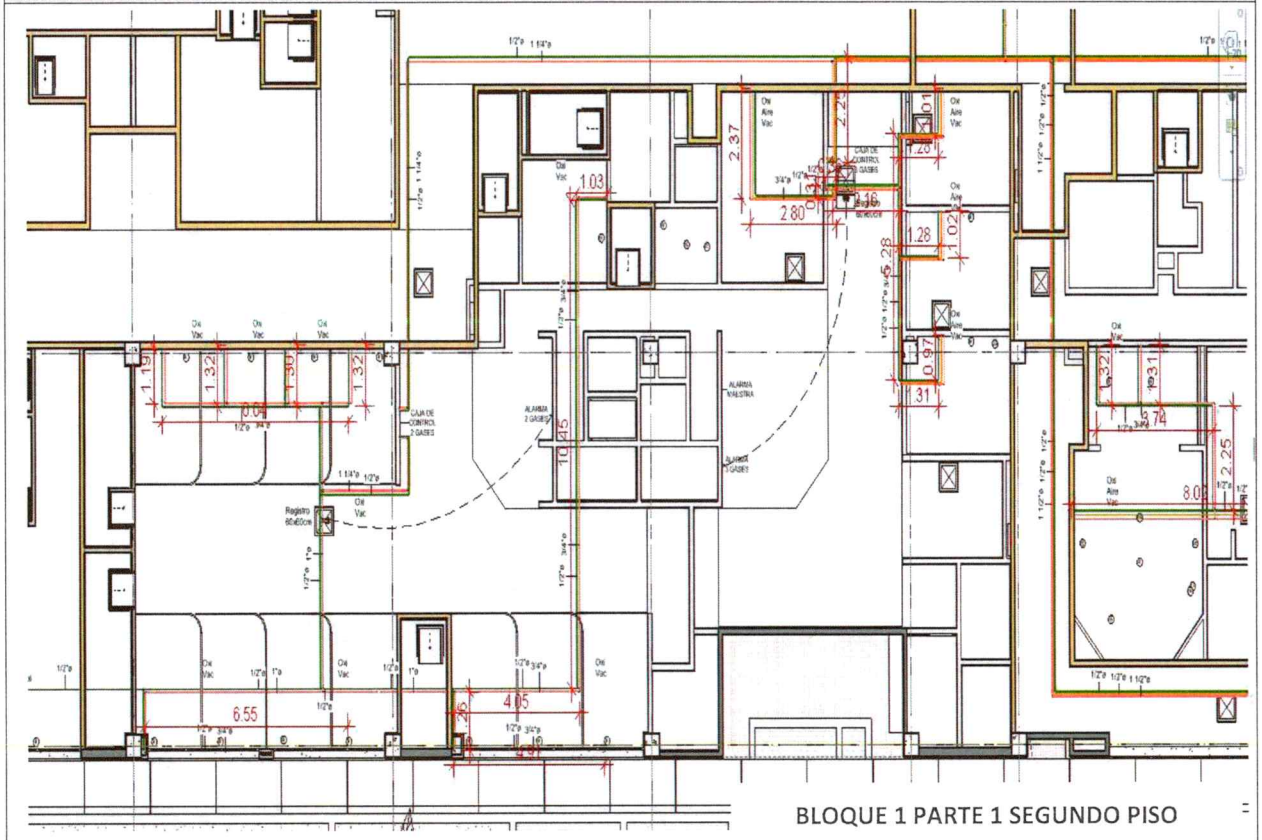


BLOQUE 1 PARTE 1 SEGUNDO PISO

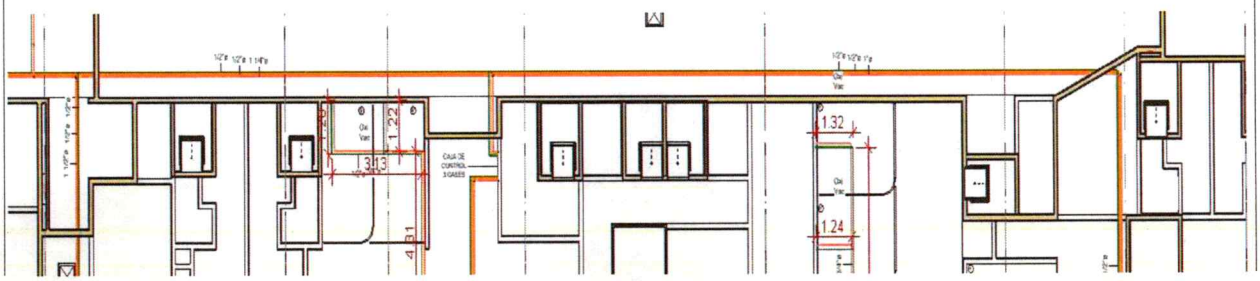

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura / COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE / CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024									MEMORIA DE CANTIDADES	
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE								
MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES						SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)			
ITEM	INP 11	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación								

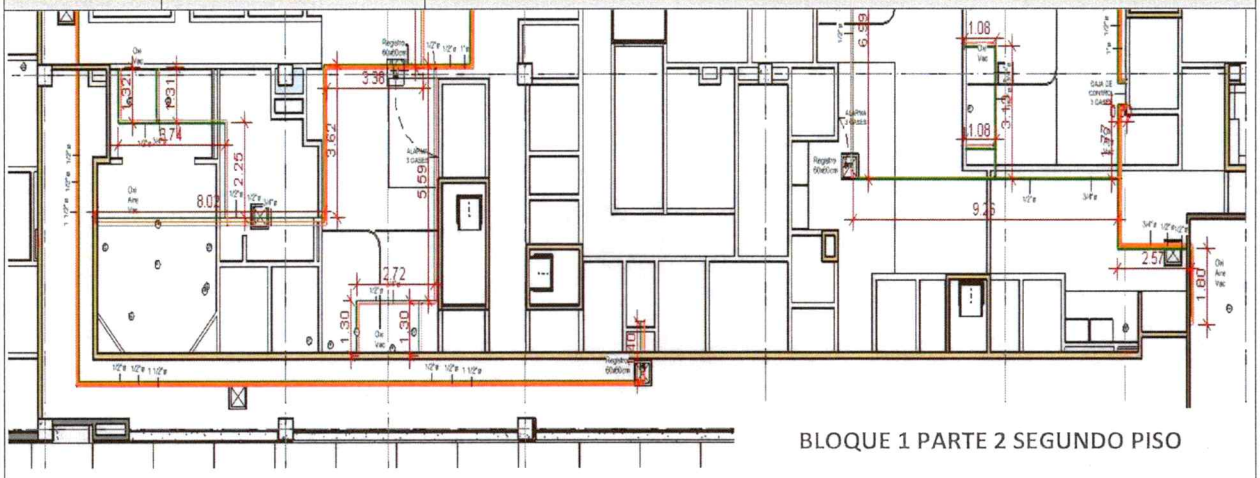

BLOQUE 1 PARTE 2 SEGUNDO PISO

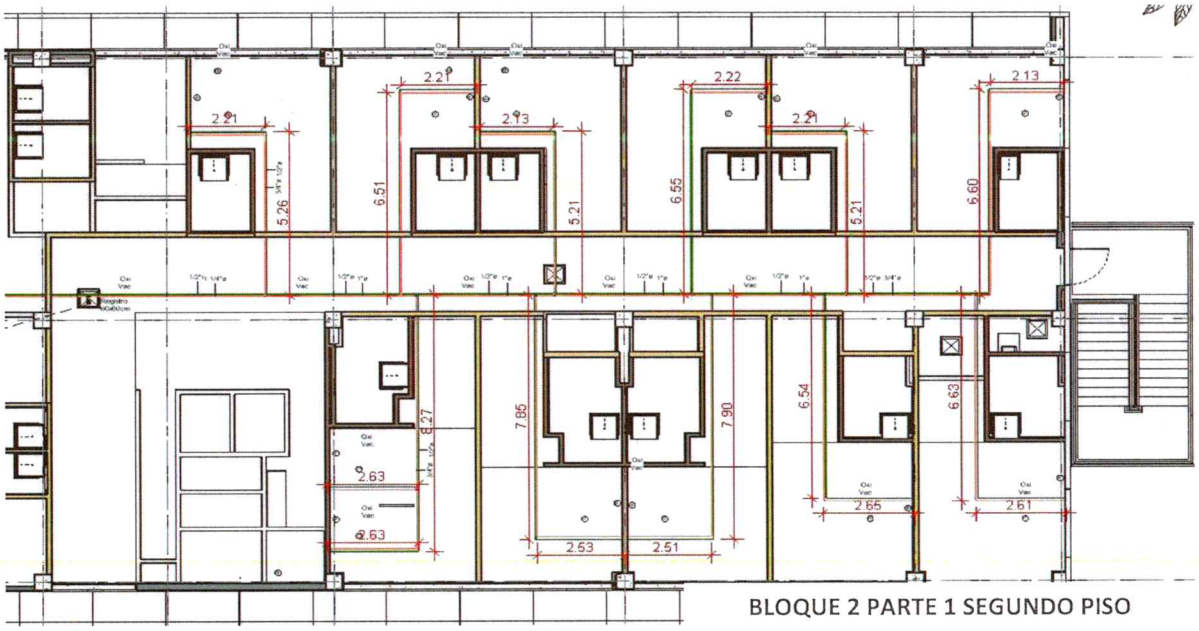


BLOQUE 2 PARTE 1 SEGUNDO PISO

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura / COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE / CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024								MEMORIA DE CANTIDADES	
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE							
MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	INP 12	Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación							
	CODO	77,00						77,00	77,00
	REDUCCION	4,00						4,00	4,00
	TEE	24,00						24,00	24,00
TOTAL									105,00

MEMORIA

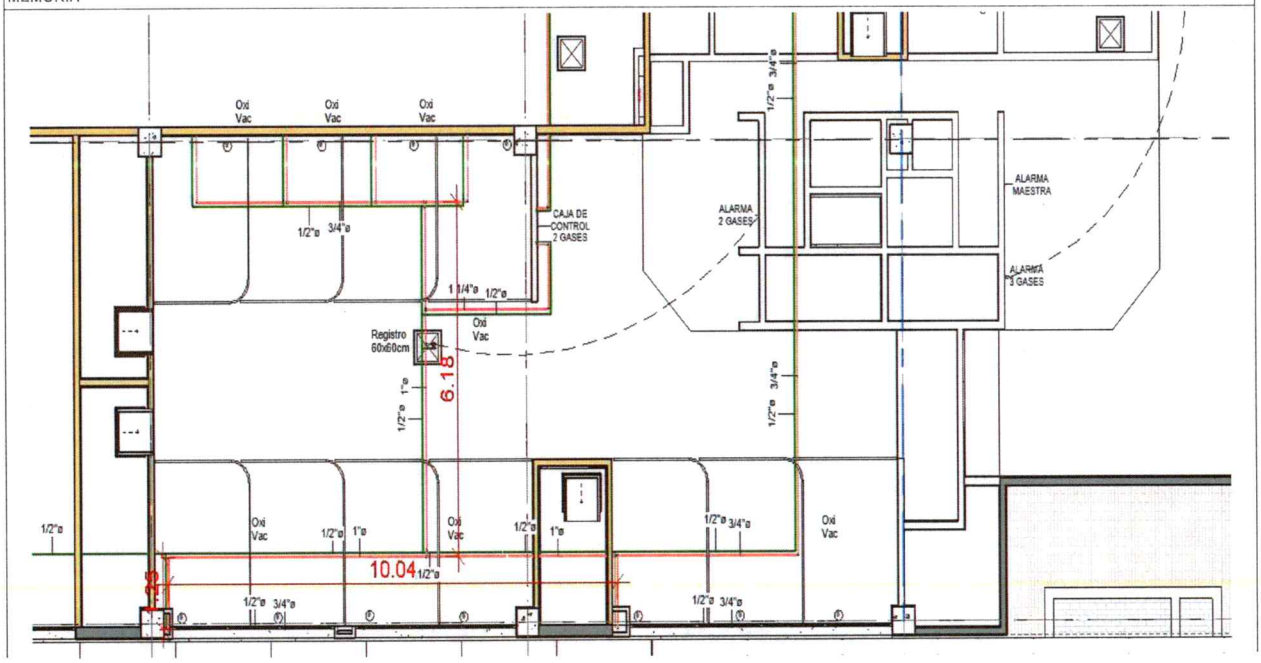


Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE


MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	INP 12	Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación							

BLOQUE 1 PARTE 1 SEGUNDO PISO

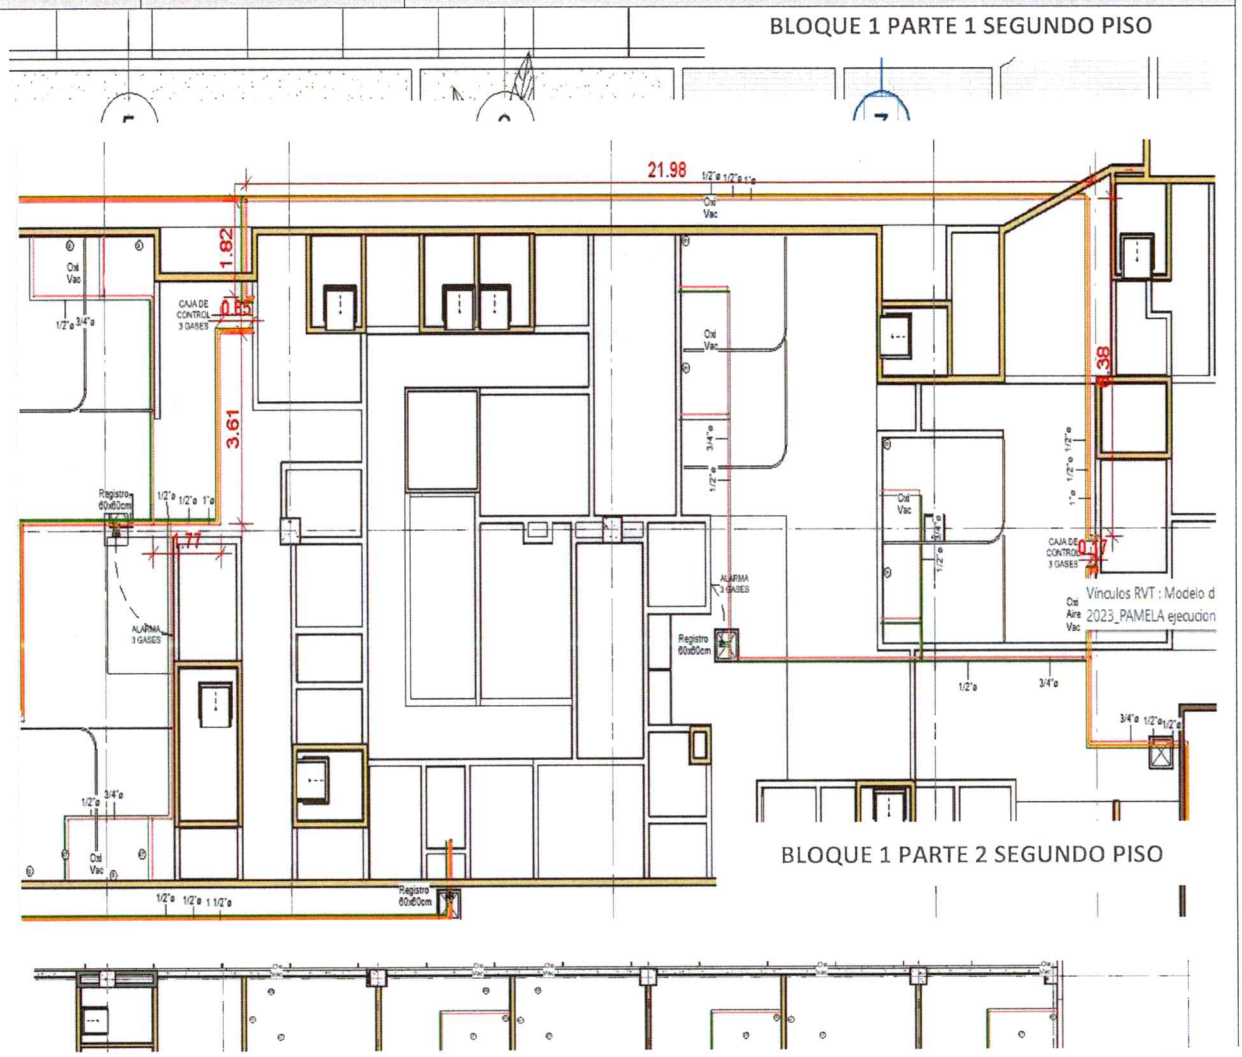

BLOQUE 1 PARTE 2 SEGUNDO PISO

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024									MEMORIA DE CANTIDADES	
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE								
MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES						SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)			
ITEM	INP 12	Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación								

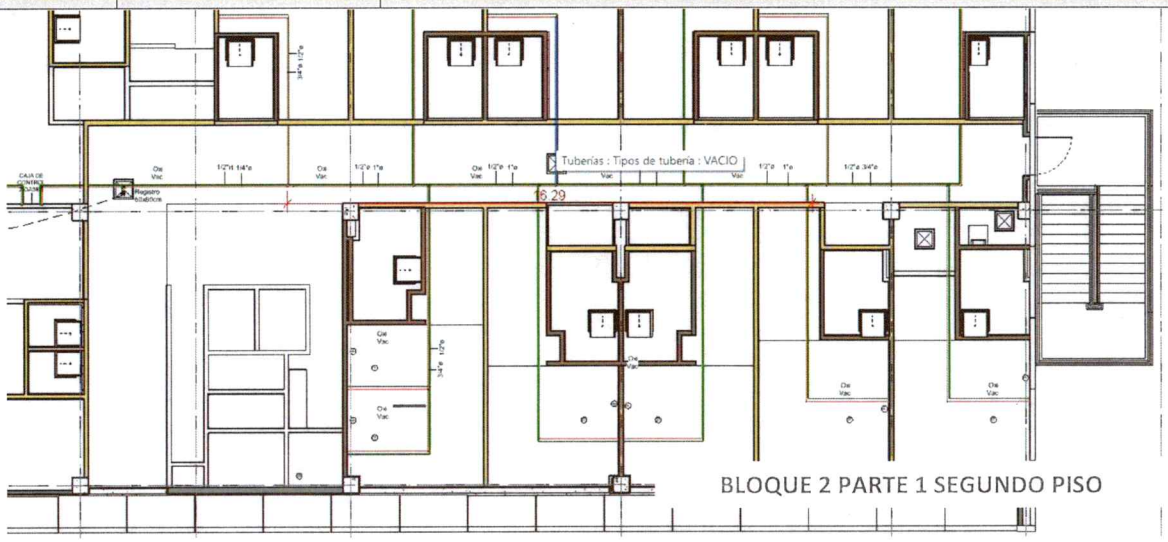

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA


HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	INP 13	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación							
	CODO	24,00						24,00	24,00
	REDUCCION	24,00						24,00	24,00
	TEE	14,00						14,00	14,00
	UNION	14,00							
TOTAL									62,00

MEMORIA

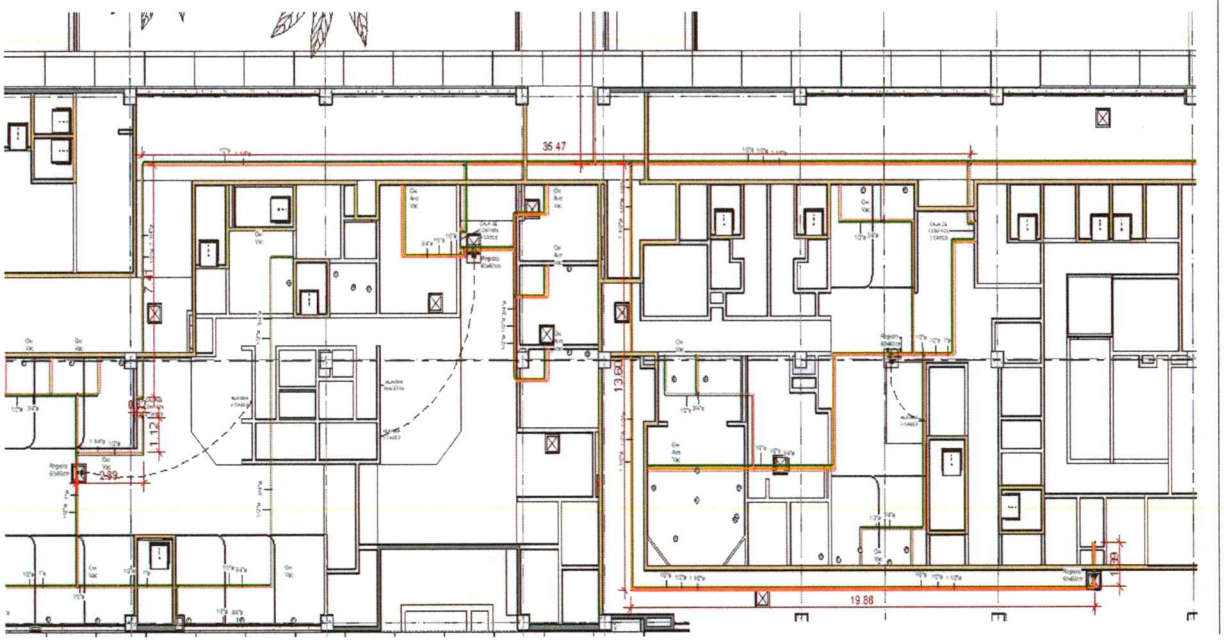

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura / COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE / CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024									MEMORIA DE CANTIDADES	
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE								
MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES						SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)			
ITEM	INP 13	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación								

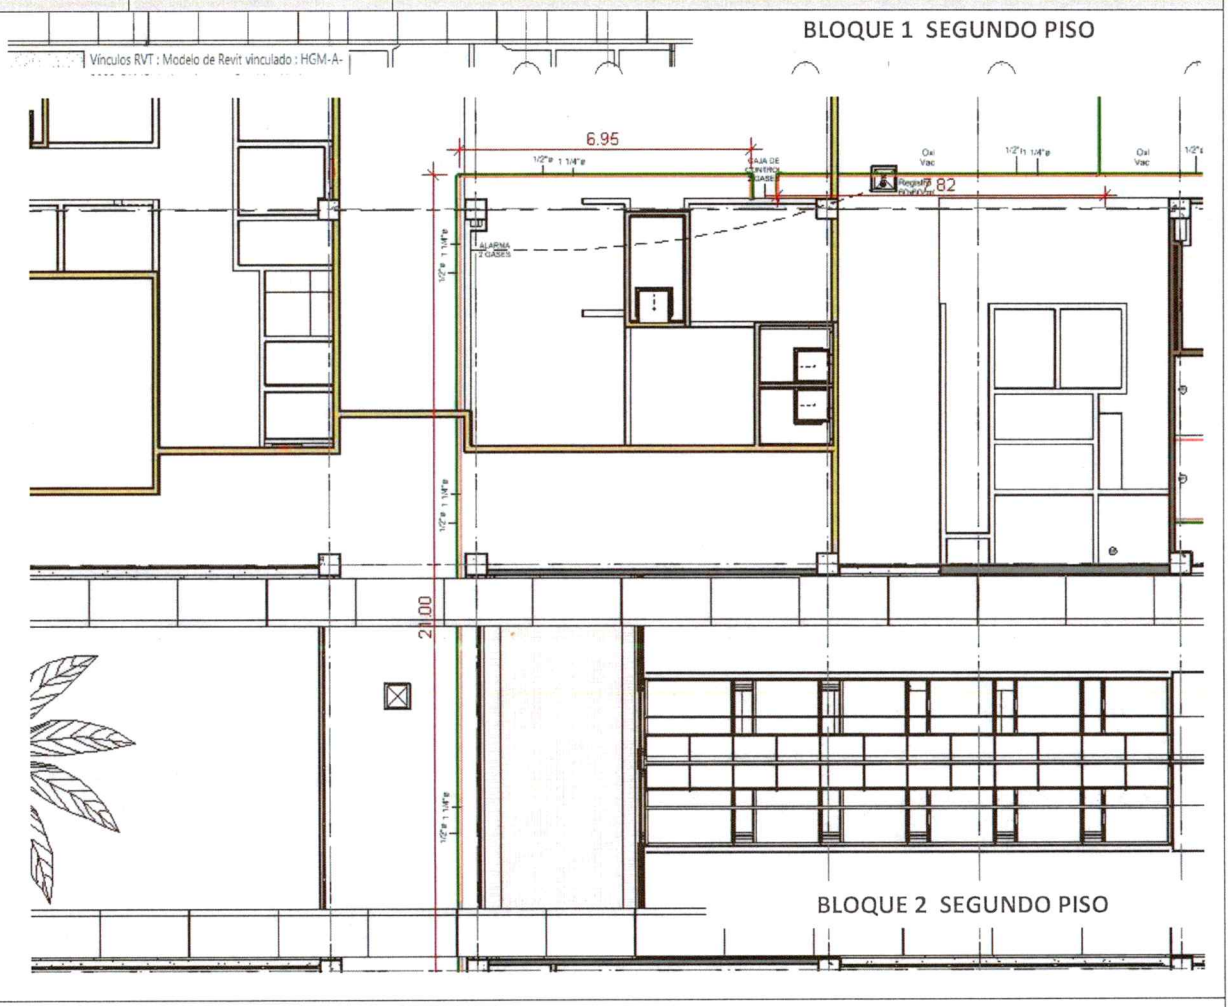

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA


HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA


Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	INP 14	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación							
	CODO	17,00						17,00	17,00
	REDUCCION	23,00						23,00	23,00
	TEE	6,00						6,00	6,00
TOTAL									46,00

MEMORIA

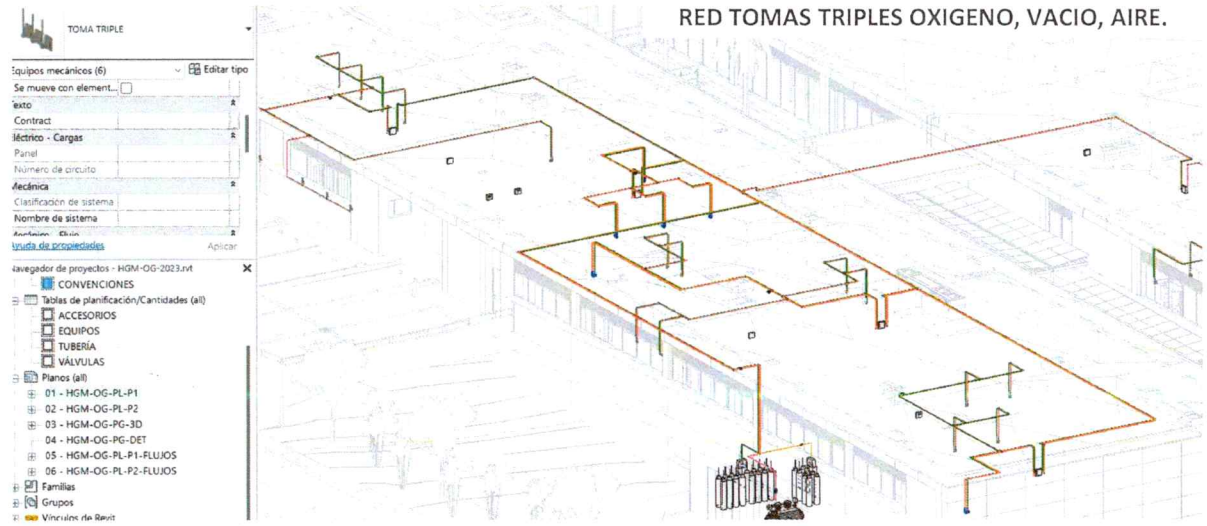

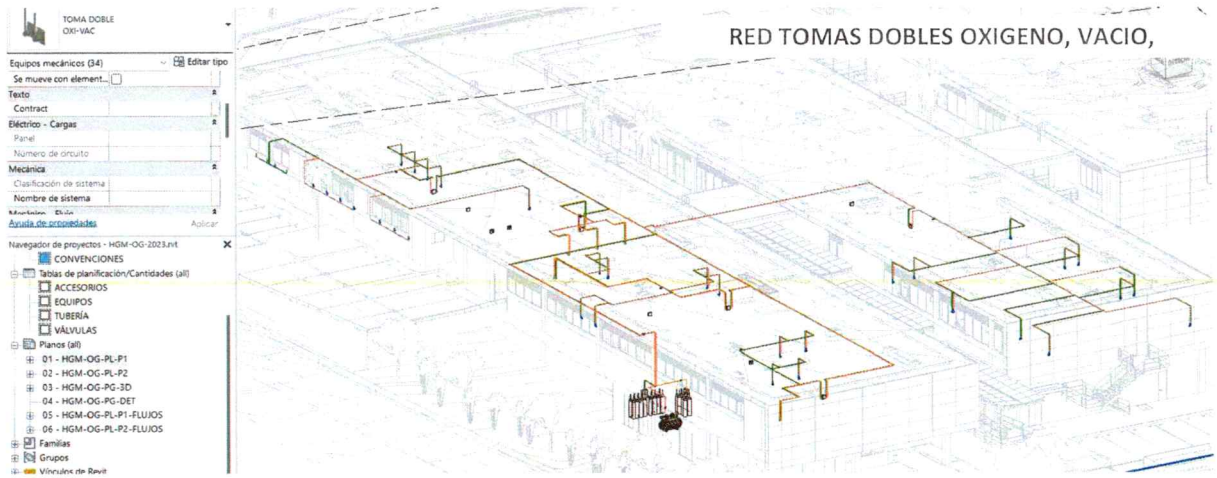


MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024								MEMORIA DE CANTIDADES	
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE							
MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	INP. 15	Soportaría En Riel Chanel Dos Varillas, Y Abrazaderas Metálicas Para Red De Gases Medicinales							
		3,00		598,00				144,00	144,00
									0,00
									0,00
TOTAL									144,00

MEMORIA

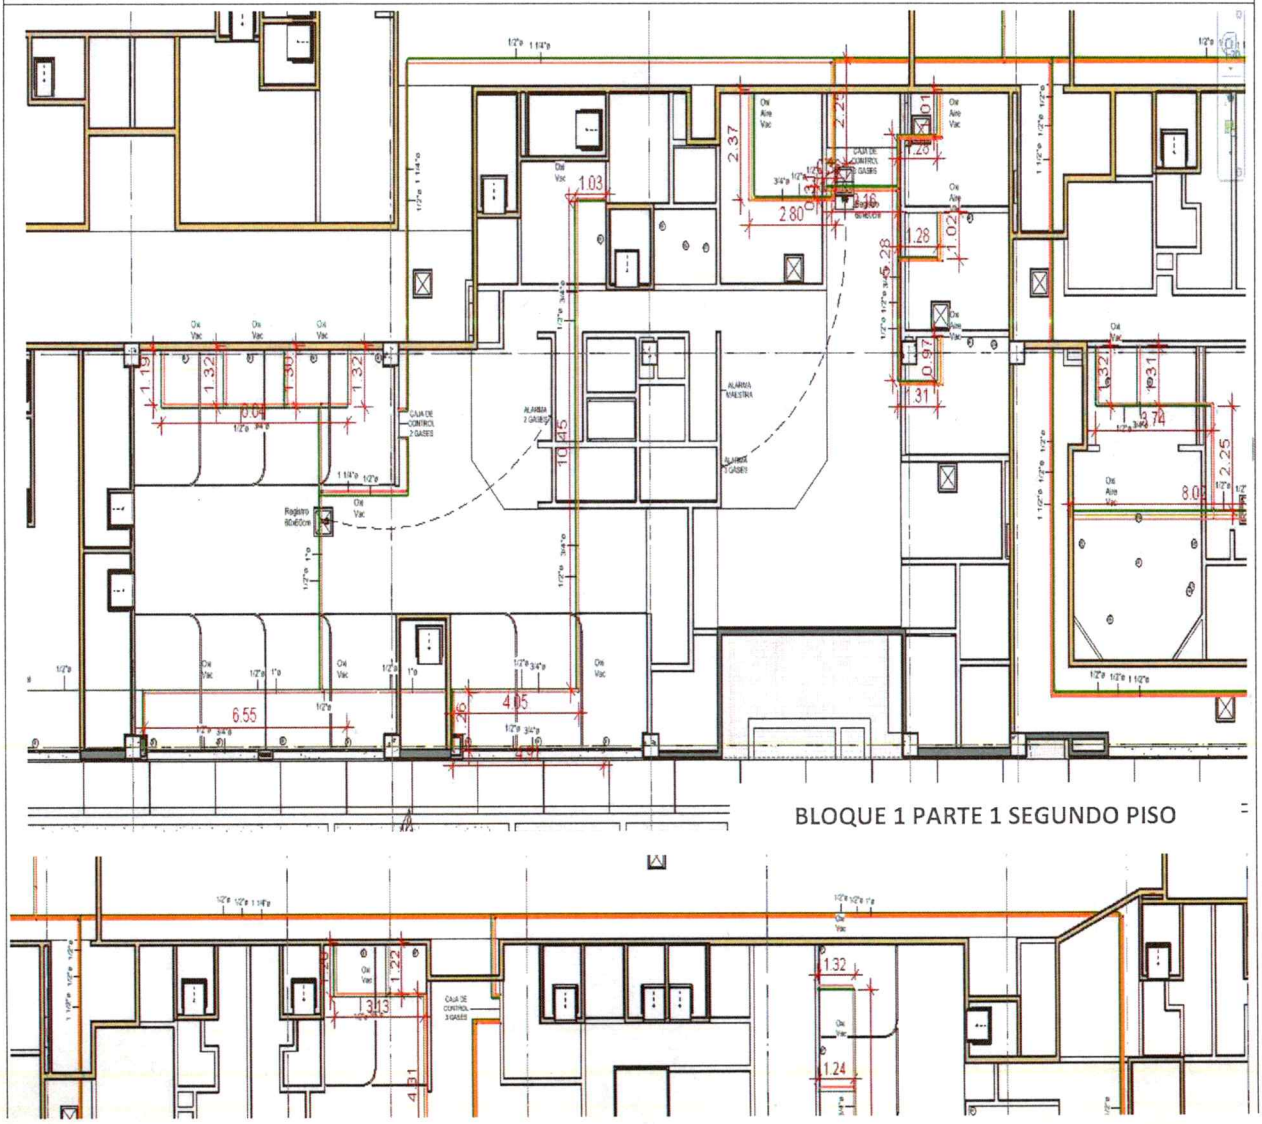


BLOQUE 1 PARTE 1 SEGUNDO PISO


Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

MEMORIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
			ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	INP. 15	Soportaría En Riel Chanel Dos Varillas, Y Abrazaderas Metálicas Para Red De Gases Medicinales							

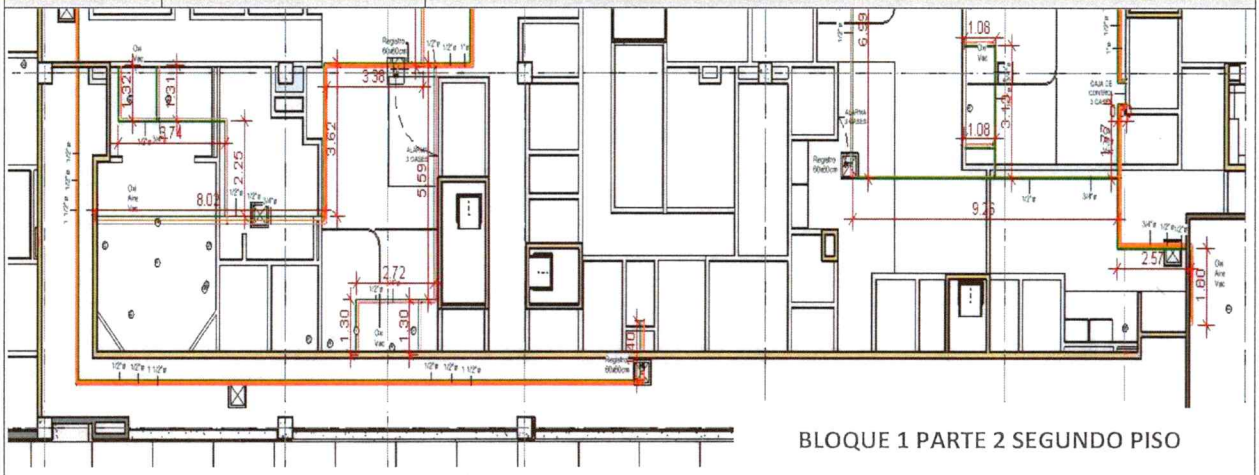

BLOQUE 1 PARTE 2 SEGUNDO PISO

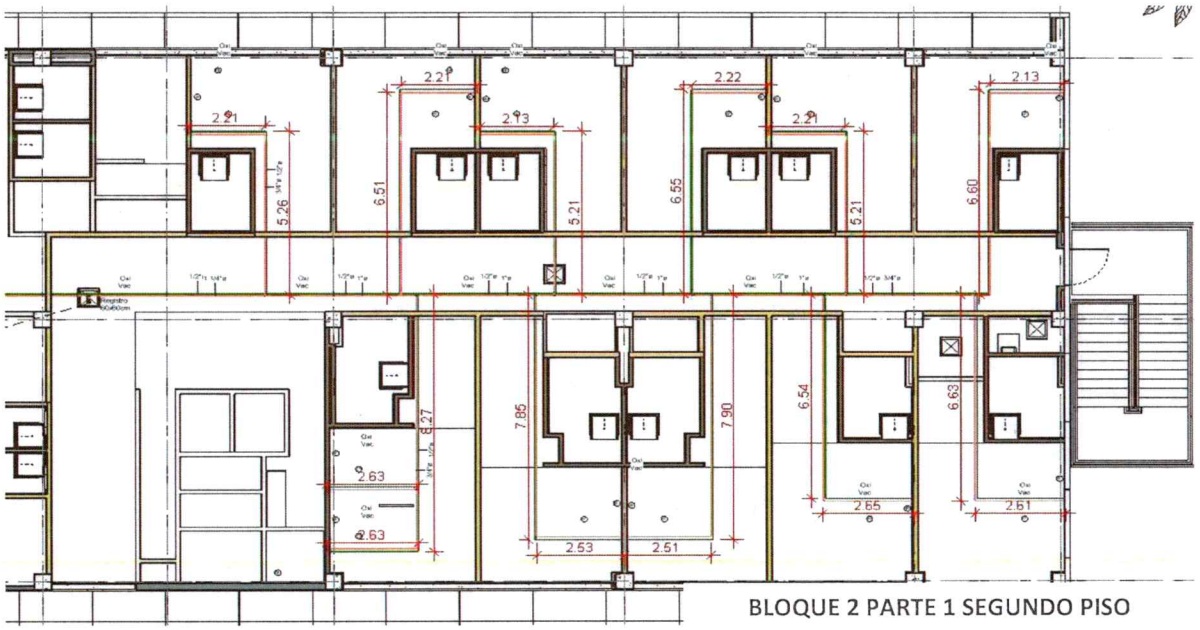


BLOQUE 2 PARTE 1 SEGUNDO PISO


MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura / COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE / CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024										MEMORIA DE CANTIDADES	
OBJETO:				CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE							
MEMORIA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
					ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	12.03.04	UNIDAD	m	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø4"							
RED PISO 1		CONEXIÓN A BOMBA				9,49					9,49
RED PISO 1		RED DISTRIBUCION PISO 1				6,21					6,21
RED PISO 1		RED DISTRIBUCION PISO 1				3,19					3,19
RED PISO 1		RED DISTRIBUCION PISO 1				1,45					1,45
RED PISO 1		RED DISTRIBUCION PISO 1				0,63					0,63
RED PISO 1		BAJANTE				8,00					8,00
RED PISO 2		RED DISTRIBUCION PISO 2				23,90					23,90
RED PISO 2		RED DISTRIBUCION PISO 2				22,53					22,53
RED PISO 2		RED PISO 2 PASARELA				4,20					4,20
RED PISO 2		RED PISO 2 PASARELA				4,15					4,15
TOTAL											83,75

MEMORIA

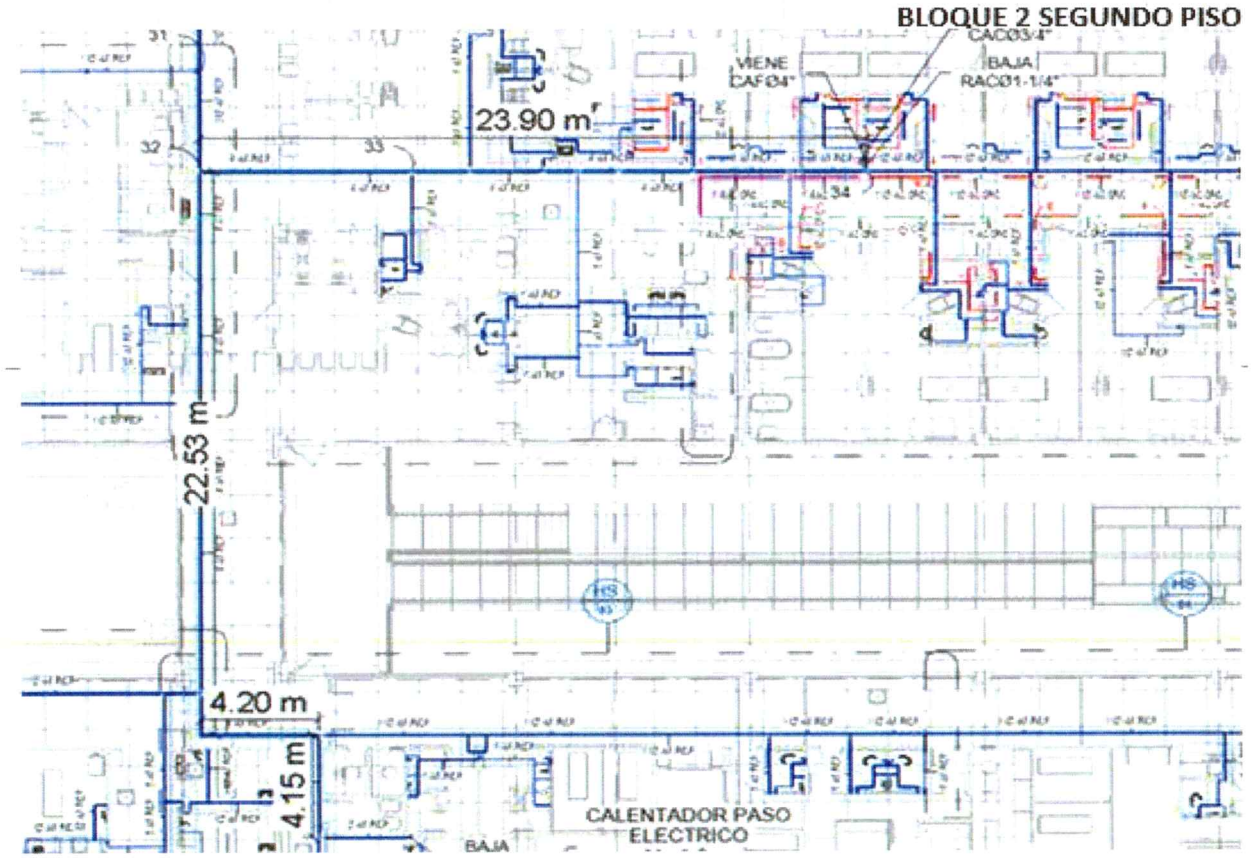

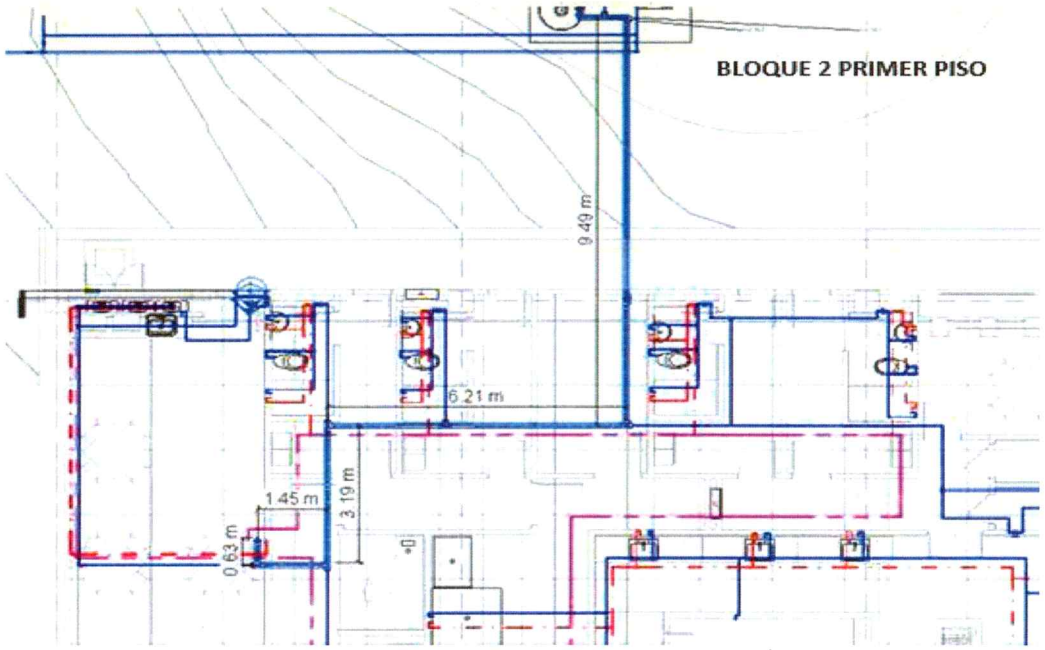


MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA


Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024									MEMORIA DE CANTIDADES	
OBJETO:				CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE						
MEMORIA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					SUBTOTAL	TOTAL
					ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	12.03.16	UNIDAD	m	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/2"							
PISO 1		BLOQUE 1		1,00		9,78					9,78
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		32,45					32,45
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		8,99					8,99
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		19,80					17,85
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		4,82					4,82
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		5,80					5,80
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		14,14					14,14
PISO 2		BLOQUE 2		1,00		30,98					30,98
PISO 2		BLOQUE 2		1,00		5,29					5,29
PISO 2		BLOQUE 2		1,00		10,62					10,62
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		1,10					1,10
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		13,34					13,34
TOTAL											155,15


MEMORIA

BLOQUE 1 PRIMER PISO

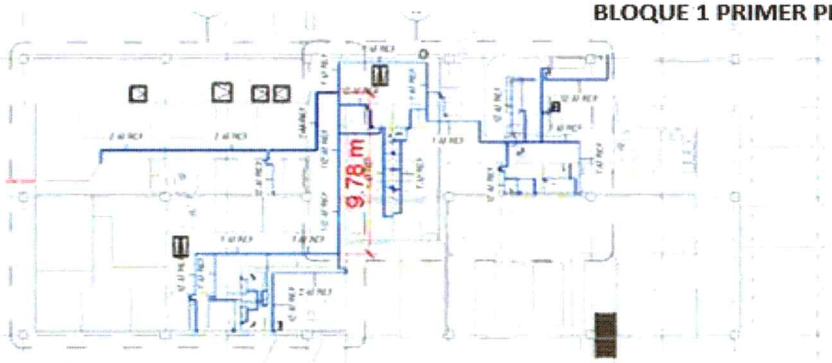

BLOQUE 3 SEGUNDO PISO

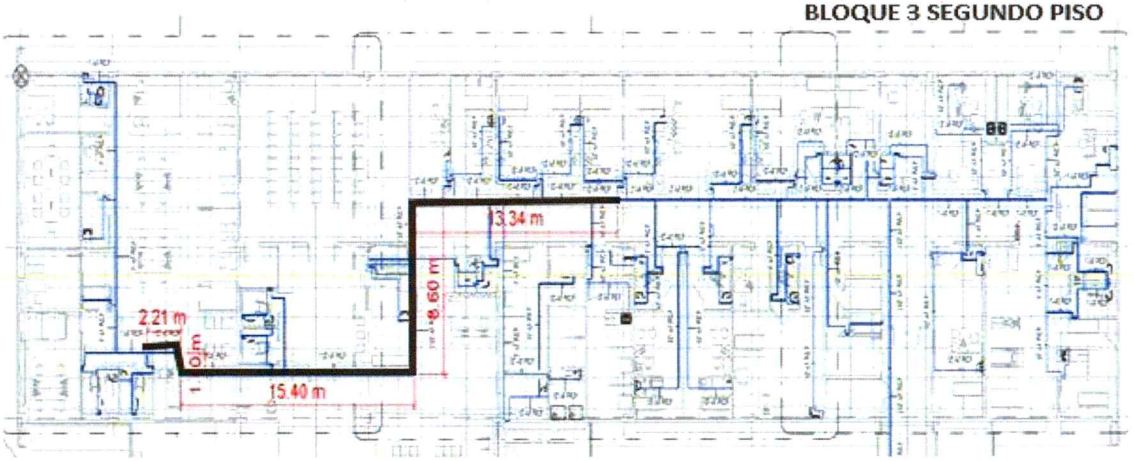


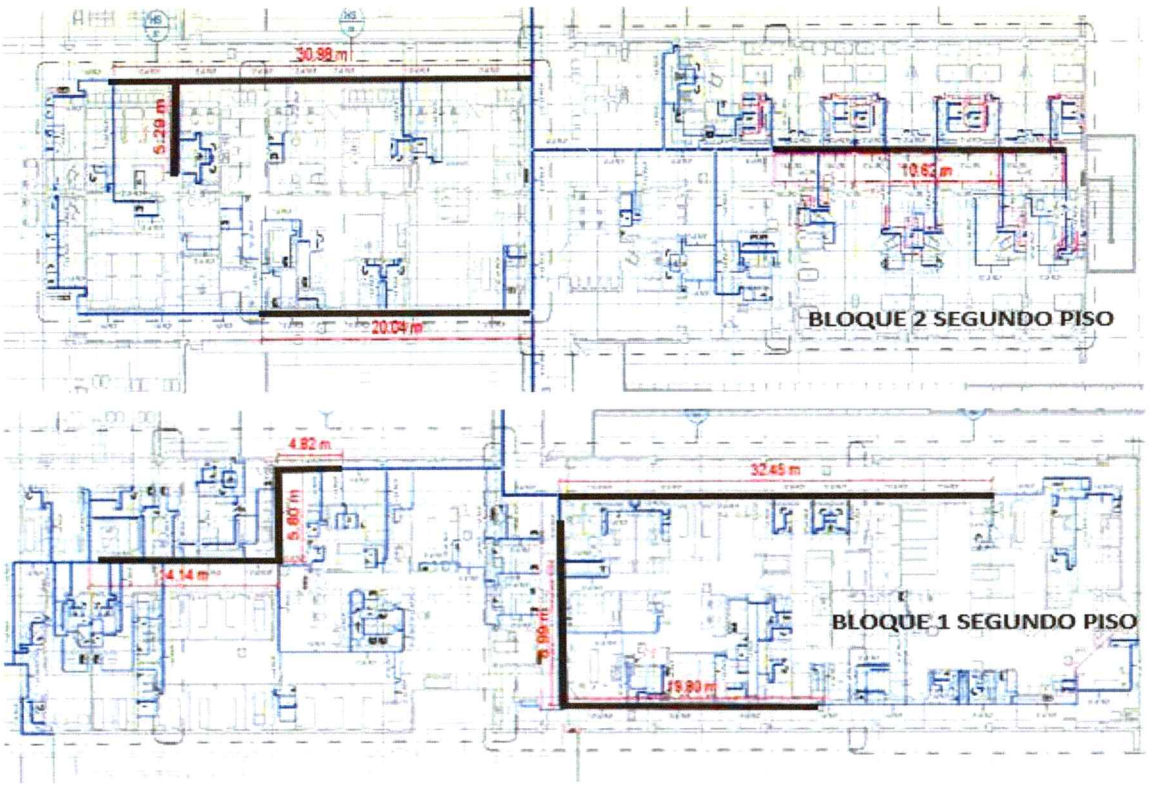



MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024									MEMORIA DE CANTIDADES	
OBJETO:				CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE							
MEMORIA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (UN)	DIMENSIONES					UNIDAD POR M	TOTAL
					ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)		
ITEM	12.03.18	UNIDAD	un	ABRAZADERAS 1-1/2"							
PISO 1		BLOQUE 1		1,00		9,78					
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		32,45					
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		8,99					
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		19,80					
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		4,82					
PISO 2		BLOQUE 1		1,00		14,14					
PISO 2		BLOQUE 2		1,00		1,00					
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		1,10					
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		15,40					
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		8,60					
PISO 2		BLOQUE 3		1,00		13,34					
						129,42				0,80	**151,00**
TOTAL											151,00
MEMORIA											

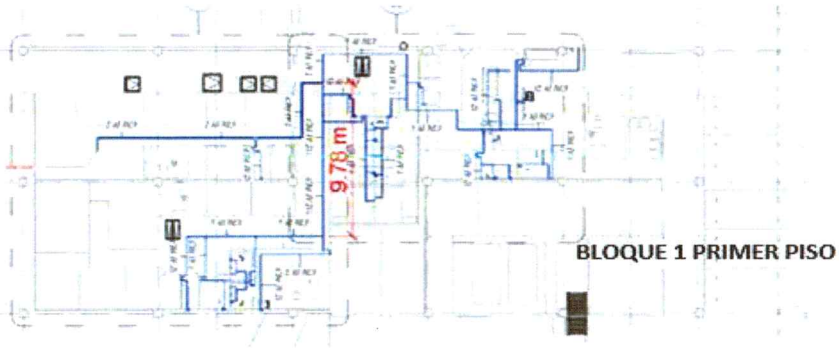

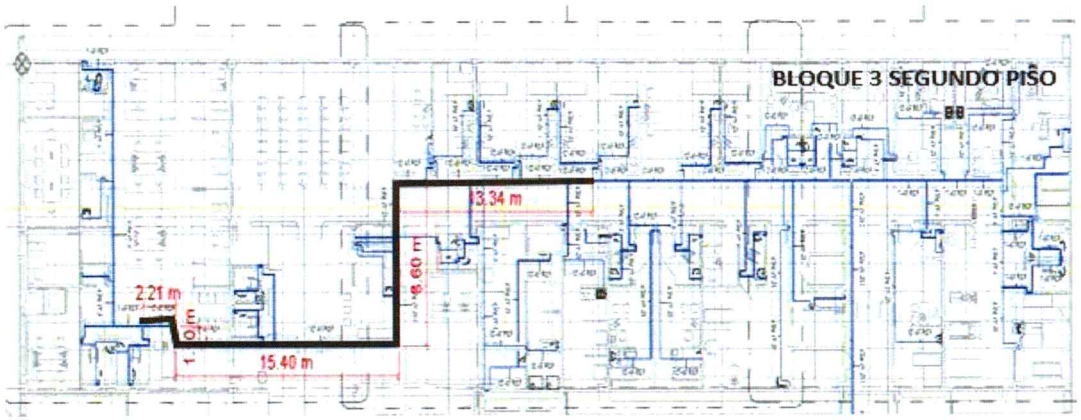

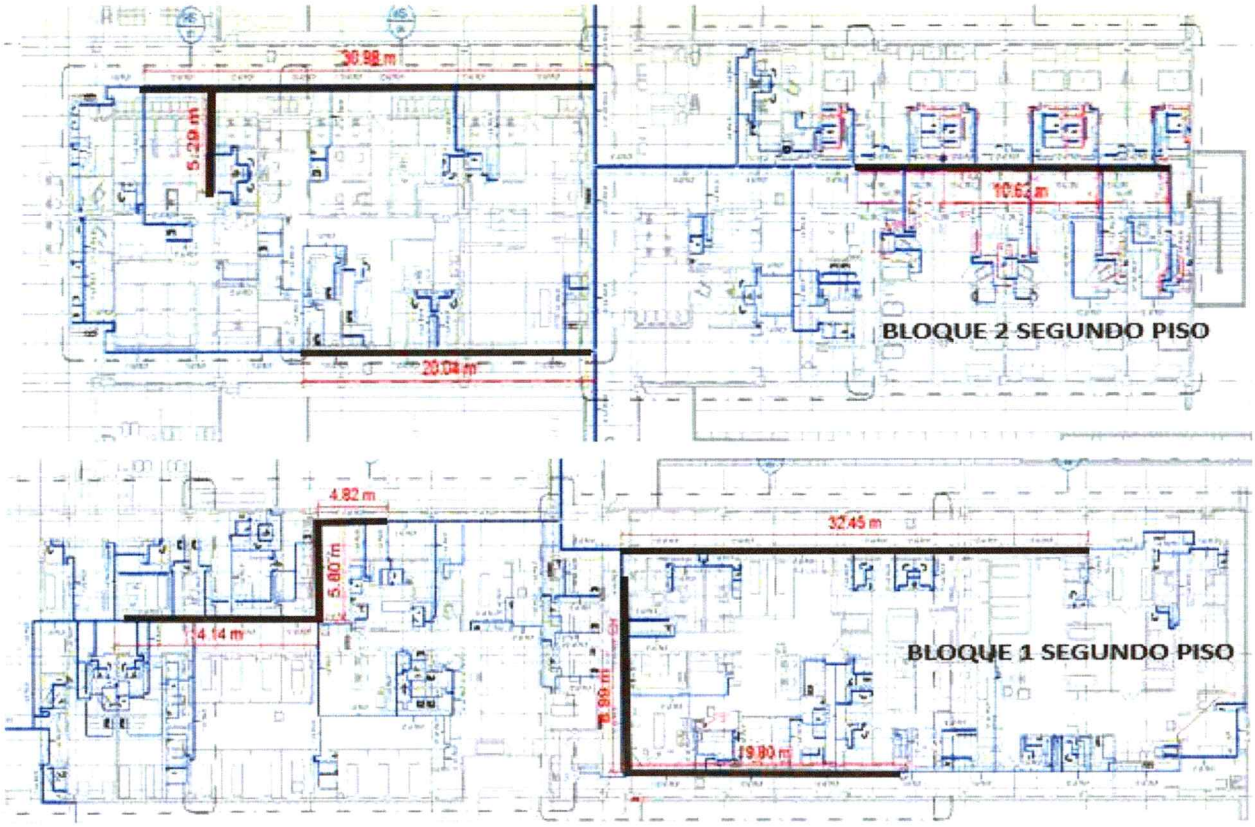

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORIA EXTERNA
