Valledupar Cesar, 27/01/2026

Señores:
Consejo superior de la judicatura dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Valledupar

REFERENCIA: INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.8720503**

INFORME DE EJECUCION	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO Y SERVICIO
NÚMERO DE CONTRATO	**CO1.PCCNTR.8720503**
OBJETIVO	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD CONFORMADO POR LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN UBICADOS EN DISTINTAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.".
FECHA DEL CONTRATO	22/12/2025
FECHA DE EJECUCIÓN	22/12/2025 – 31/12/2025
CONTRATISTA	**NEGOCIOS E INVERSIONES SINGS S.A.S** con **NIT 901.131.489-8**. Representada legalmente por **FREDDY ALFONSO MOSQUERA LUQUE** con **CC 77.190.135** de Valledupar.
VALOR DEL CONTRATO	La entidad cuenta con un presupuesto oficial correspondiente a la suma de TREINTA MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($30.069.092) M/CTE incluido IVA e impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El valor del contrato comprende todos los costos directos e indirectos, que resulten necesarios como imprevistos, utilidades, impuestos, tasas y contribuciones de ley. El contrato será financiado con recursos del Presupuesto Nacional, correspondientes a la vigencia fiscal 2025. Los valores unitarios para cada uno de los ítems serán los ofrecidos por el contratista en su propuesta objeto de la presente aceptación.
FORMA DE PAGO	La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, pagará al contratista el valor del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección, en moneda legal colombiana por mensualidad vencida de acuerdo con los servicios prestados, dicho pago se tramitará previa presentación de los documentos que se relacionan a continuación, con el aval del Supervisor del contrato: • Certificación expedida por el supervisor del contrato donde conste que verificó el cumplimiento del objeto del contrato.

Este documento es propiedad de NEGOCIOS E INVERSIONES SINGS S.A.S., por lo tanto, queda prohibida su reproducción o copia.
Copyright © 2022 – Colaboración de SR-Profesionales Asociados, Contexto Intelectual para su actualización.

	• Presentación de la cuenta de cobro o factura del contratista, según el régimen Tributario que figure en el correspondiente en el RUT; si está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con los dispuesto en la Resolución expedida por la DIAN No. 042 del 5 de mayo de 2020. • Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar junto con las planillas de pago correspondientes, donde se muestre el listado de personal contratado. • Proyecto de Acta de Liquidación (en el último pago). En todo caso, los pagos estipulados en el presente punto quedan sujetos a los recursos que la Dirección General del Tesoro – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situé a la entidad. **Nota 1.** La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar efectuará las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que correspondan a: Retención en la fuente, retención por IVA, retención de industria y comercio, impuestos departamentales y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del contribuyente o contratista y a

Este documento es propiedad de NEGOCIOS E INVERSIONES SINGS S.A.S., por lo tanto, queda prohibida su reproducción o copia.
Copyright © 2022 – Colaboración de SR-Profesionales Asociados, Contexto Intelectual para su actualización.

	las tablas establecidas en la ley, según información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su responsabilidad. **Nota 2**. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Seccional al contratista, los términos se reiniciarán con la nueva radicación. **Nota 3**. No habrá lugar a desembolso de anticipos y los pagos estipulados en el presente punto se sujetarán a los recursos que la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda sitúe a la Entidad. **Nota 4:** El oferente seleccionado deberá mantener durante la vigencia del contrato los precios unitarios ofertados. En ningún caso el pago de las obligaciones de nómina y seguridad social del contratista frente a su personal estará sujeto al pago de facturas que realice la Dirección Seccional.

INFORME DE SERVICIOS

NEGOCIOS E INVERSIONES SINGS S.A.S, puso en marcha el contrato en la tarde del 26 de diciembre del 2025, se ejecutó el contrato en proporción a la disponibilidad de cada una de las sedes en el departamento, dado que se encontraban en vacancia judicial y algunos y terminaron de ejecutar en enero 2026, lo cual se soporta en los anexos del presente informe, donde se evidencia hallazgos y servicios ejecutados en cada sede.

Atentamente,

QUIEN ENTREGA

FREDDY ALFONSO MOSQUERA LUQUE
Representante Legal

Este documento es propiedad de NEGOCIOS E INVERSIONES SINGS S.A.S., por lo tanto, queda prohibida su reproducción o copia.
Copyright © 2022 – Colaboración de SR-Profesionales Asociados, Contexto Intelectual para su actualización.

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	7/01/2026	MUNICIPIO	CHIRIGUANA
TECNICO A CARGO	JEFRI FERNANDEZ	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUNTRAN 13 CAMARAS DE LA CUAL 3 EN MAL FUNCIONAMIENTO. (LENTE DEFECTUOSO)
	GABINETE EN MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO EN MAL ESTADO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	PUNTO DE RED AL DVR EN MAL ESTADO
	TELEVISOR EN MALA UBICACIÓN


	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	SE INSTALA DVR NUEVO PARA REEMPLAZAR EL D VR QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO Y SE AGREGA AL NUEVO DVR. (SE REALIZA PATCH CORD DE 10 M PARA EL DVR)
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE INSTALAN CAMARAS DE SEGURIDAD NUEVA PARA REEMPLAZAR LAS CAMRAS EN MAL FUNCIONAMIENTO
	SE REUBICA TELEVISOR Y SOPORTE DE TELEVISOR A UNA UBICACIÓN VISIBLE


	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 13 CAMARAS INSTALADA

OBSERVACIONES: N/A

EVIDENCIAS:

ANTES

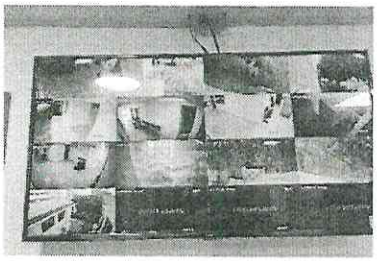







DESPUES

















ENTREGA:

TC. JEFRI FERNANDEZ

CC.

RECIBE:

NOMBRE:

CC: 77163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	9/01/2026	MUNICIPIO	CHIMICHAGUA
TECNICO A CARGO	CRISTIAN BUELVAS	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 8 CAMARAS EN BUEN ESTADO
	GABINETE EN MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD.
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR


	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%

OBSERVACIONES: _____


_____

EVIDENCIAS:

ANTES









DESPUES















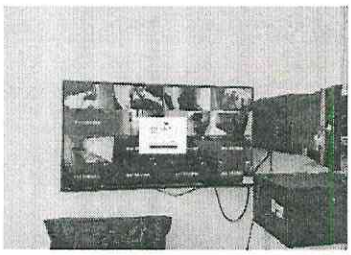





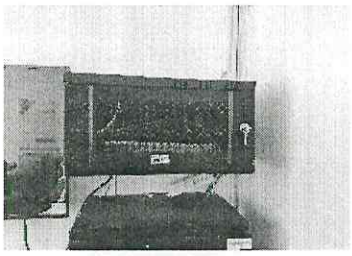









ENTREGA:

TC. CRISTIAN BUELVAS
CC.

RECIBE:

NOMBRE: AD ALBERTO CORONEL
CC: 72163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	14/01/2026	MUNICIPIO	MANAURE
TECNICO A CARGO	CRISTIAN BUELVAS	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 8 CAMARAS INSTALADA DE LA CUAL 1 ESTAN EN MAL ESTADO
	GABINET MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	SE ENCUENTRA LA NECESIDAD DE UNA CAMARA PARA EL MONITOREO DEL GABINETE.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	SE REALIZA LIMPIEZA AMBIENTAL PARA CORREGIR CAMARAS EN MAL FUNCIONAMIENTO.
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA MONITOREO DEL GABINTE.
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR

	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 8 CAMARAS INSTALADA

OBSERVACIONES: _____

_____

EVIDENCIAS:

ANTES **DESPUES**



























ENTREGA:

TC. CRISTIAN BUELVAS
CC.

RECIBE:

NOMBRE: ADALBERTO CORONEL M.
CC: 77163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SING.S
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	14/01/2026	MUNICIPIO	LA PAZ
TECNICO A CARGO	CRISTIAN BUELVAS	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 7 CAMARAS DE LA CUAL 2 SE ENCUENTRA EN MAL FUNCIONAMIENTO
	GABINET MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR
	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA CAMARA EN MAL ESTADO LOGRANDO SOLUCIONAR LA FALLA
	SE INSTALA CAMARA NUEVA PARA REEMPLAZAR UNA CAMARA EN MAL ESTADO


	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 7 CAMARAS INSTALADA


OBSERVACIONES: _____

_____


EVIDENCIAS:


ANTES






DESPUES

















TC. CRISTIAN BUELVAS
CC.

NOMBRE: ADALBERTO CORONADO
CC: 7716367

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	9/01/2025	MUNICIPIO	TAMALAMEQUE
TECNICO A CARGO	CRISTIAN BUELVAS	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUNTRAN 8 CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CUAL 2 ESTAN EN MAL FUNVIONAMIENTO.
	GABINETE EN MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR EN MAL ESTADO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO Y PARA CAMBIO DE BATERIAS.
	CAMARA EN UN MAL LUGAR PROPENSA A DAÑOS A CORTO PLAZO.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	SE INSTALA DVR NUEVO PARA REEMPLAZAR EL DVR DAÑADO.
	SE REALIZA CAMBIO DE BATERIAS A LA UPS.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR
	SE REUBICA CAMARA PARA ALARGAR SU VIDA UTIL

	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 8 CAMARAS INSTALADA

OBSERVACIONES: N/A

EVIDENCIAS:

ANTES







DESPUES












ENTREGA:

TC. CRISTIAN BUELVAS
CC.

RECIBE:

NOMBRE: JOHN ALBERTO CORONELL B
CC: 77163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	27/12/2025	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
TECNICO A CARGO	KANDRA ARDILA	LUGAR	EDIFICIO CAJA AGRARIA
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 7 CAMARAS INSTALADA EN BUEN ESTADO
	GABINET MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR

	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%

OBSERVACIONES: N/A

EVIDENCIAS:


ANTES








DESPUES







PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	16/01/2026	MUNICIPIO	LA GLORIA
TECNICO A CARGO	JEFRI FERNANDEZ	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUNTRAN 8 CAMARAS EN MAL ESTADO POR SUCIEDAD
	GABINETE EN MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR EN MAL FUNCIONANIMENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	SE REALIZA CAMBIO DE FUENTE NUEVA AL DVR PARA SOLUCIONAR FALLA
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR
	SE DESCONECTA UNA CAMARA EN LA OFICINA DE LA DOCTORA POR PETICIÓN DE ELLA

	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 7 CAMARAS INSTALADA

OBSERVACIONES: _____

_____


EVIDENCIAS:


ANTES







DESPUES

















ENTREGA:

TC. JEFRI FERNANDEZ
CC.

RECIBE:

NOMBRE: ADALBERTO CORONEL
CC: 7716377

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	9/01/2025	MUNICIPIO	AGUACHICA
TECNICO A CARGO	CRISTIAN BUELVAS	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 13 CAMARAS DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO.
	GABINETE EN MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	SE ENCUENTRA LA NECESIDAD DE TRANSLADAR CAMARAS A LAS ZONAS NUEVAS O INSTALAR NUEVAS CAMRAS EN PUNTOS CIEGOS DE LA NUEVA OBRA.


	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD.
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR

	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 13 CAMARAS INSTALADA


EVIDENCIAS:

ANTES









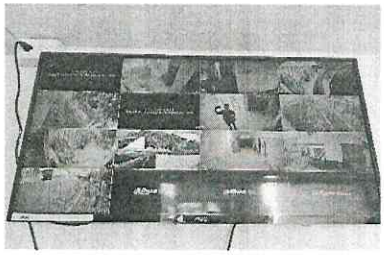


DESPUES

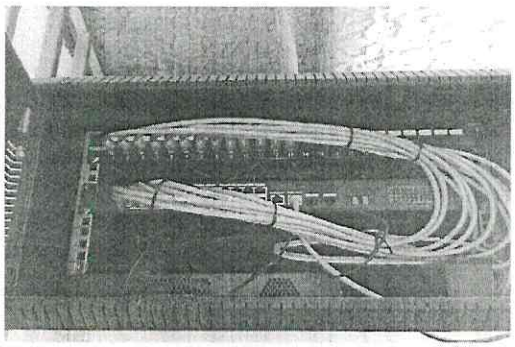









OBSERVACIONES:	**EL PALACIO SE ENCUENTRA EN REMODELACIÓN Y OBRA, ES NECESARIO TRASLADAR CAMARAS A LAS ZONAS REMODELADAS Y CUBRIR LOS PUNTOS CIEGOS DE LA NUEVA OBRA**

ENTREGA:	**RECIBE:**
TC. CRISTIAN BUELVAS	NOMBRE: ADALBERTO CORONEL
CC.	CC: 77163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	7/01/2026	MUNICIPIO	CURUMANI
TECNICO A CARGO	JEFRI FERNANDEZ	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUNTRAN 10 CAMARAS DE LA CUAL 1 EN MAL FUNCIONAMIENTO.
	GABINETE EN MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN MAL ESTADO.
	TELEVISOR QUEMADO.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	SE INSTALA UPS NUEVA PARA REEMPLAZAR LA UPS EN MAL ESTADO.
	SE REALIZA INSTLACION DE BASE PARA TELEVISOR Y SE INSTALA NUEVO TELEVISOR PARA CAMARAS
	SE INSTALAN CAMARAS DE SEGURIDAD NUEVA PARA REEMPLAZAR LAS CAMRAS EN MAL FUNCIONAMIENTO

	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 10 CAMARAS INSTALADA

OBSERVACIONES: N/A

EVIDENCIAS:

ANTES









DESPUES


















ENTREGA:

TC. JEFRI FERNANDEZ
CC.

RECIBE:

NOMBRE: ADALBERTO CORONADO
CC: 7716369

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	6/01/2026	MUNICIPIO	CODAZZI
TECNICO A CARGO	JEFRI FERNANDEZ	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUNTRAN 10 CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CUAL 1 ESTA QUEMADA.
	GABINETE EN MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	SE INSTALA CAMARA NUEVA PARA REEMPLAZAR LA CAMARA QUE ESTA QUEMADA (SE CAMBIA VIDEO BALUM Y FUENTE).
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA MONITOREO DEL GABINTE.
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR


	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 10 CAMARAS INSTALADA

OBSERVACIONES: N/A


EVIDENCIAS:


ANTES **DESPUES**




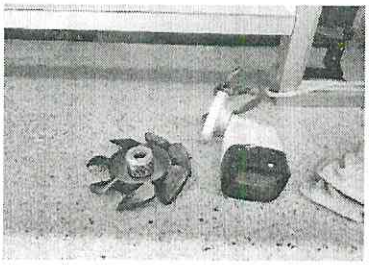





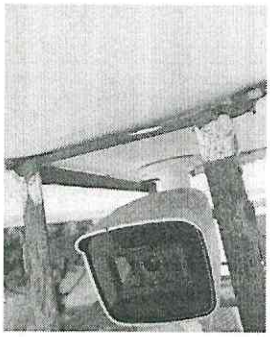


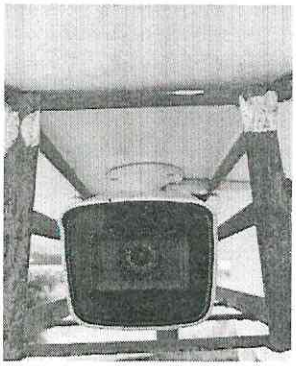

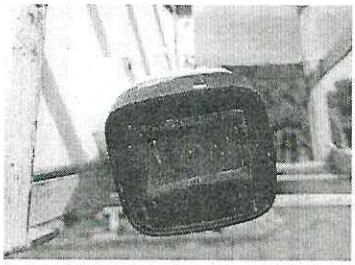

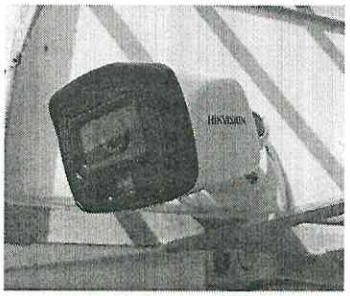

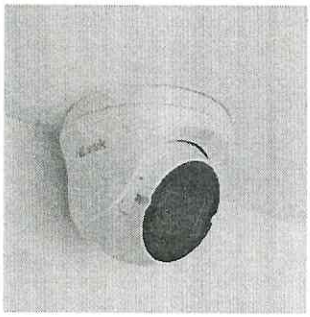

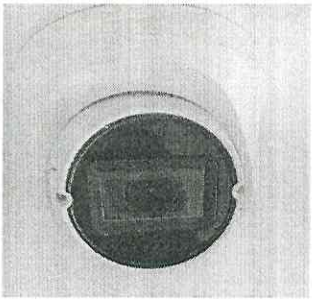

ENTREGA:

TC. JEFRI FERNANDEZ
CC.

RECIBE:

ANALBERTO CORONELL
NOMBRE:
CC: 77163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	6/01/2026	MUNICIPIO	BECERILL
TECNICO A CARGO	JEFRY FERNANDEZ	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 8 CAMARAS INSTALADA DE LA CUAL 1 EN MAL FUNCIONAMIENTO
	GABINET MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.


	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMARA EN MAL FUNCIONAMIENTO (CAMBIO DE FUENTE A CAMARA QUE NO PRESENTABA IMAGEN)
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR


	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 8 CAMARAS INSTALADA

OBSERVACIONES: N/A

EVIDENCIAS:

ANTES








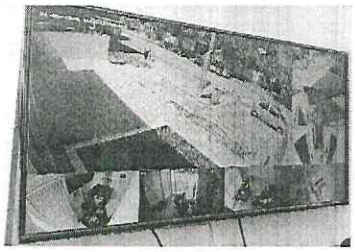



DESPUES








ENTREGA:

TC. JEFRY FERNANDEZ
CC.

RECIBE:

NOMBRE: ANIBERTO BROWN
CC: 77163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	26/12/2025	MUNICIPIO	EDIFICIO SAGRADO CORAZON
TECNICO A CARGO	KANDRA ARDILA	LUGAR	VALLEDUPAR
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 11 CAMARAS INSTALADA DE LAS CUAL 3 PRESENTAN MAL FUNCIONAMIENTO.
	GABINET MAL ESTADO POR SUCIEDAD (UTILIZAN EL MISMO GABINETE DE COMUNICACIONES)
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIAN 3 VIDEO BALUM Y SE REALIZAN AJUSTES EN LAS DEMAS CAMARAS YA QUE NO PRESENTABAN IMAGEN) .

	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 11 CAMARAS INSTALADA


OBSERVACIONES: N/A


EVIDENCIAS:










ANTES **DESPUES**
















TC. KANDRA ARDILA
CC.

NOMBRE: ADALBERTO CORONEL B
CC: 77163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	24/12/2025	MUNICIPIO	EDIFICIO ANTIGUO TELECOM
TECNICO A CARGO	YEFRI FERNANDEZ	LUGAR	VALLEDUPAR
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 22 CAMARAS INSTALADA DE LAS CUAL 1 PRESENTA MAL FUNCIONAMIENTO.
	GABINET MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.


	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 22 CAMARAS INSTALADA

OBSERVACIONES: N/A




EVIDENCIAS:



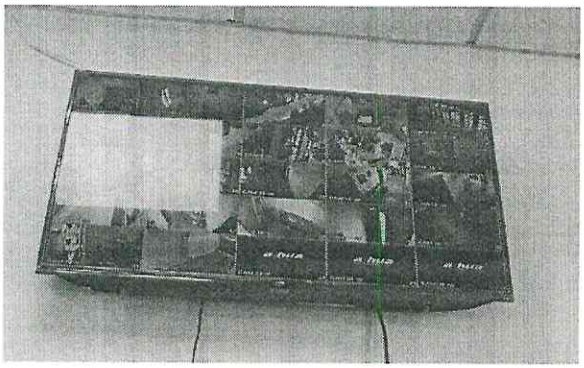


















ANTES **DESPUES**










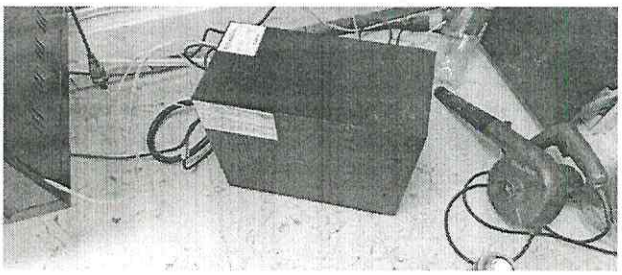






















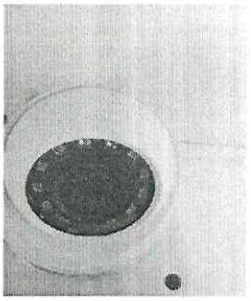









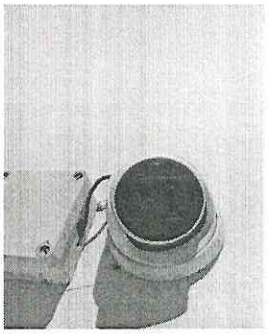


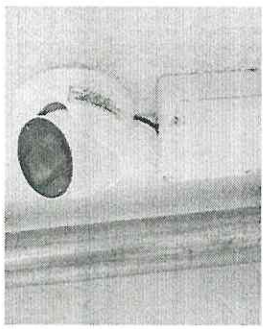

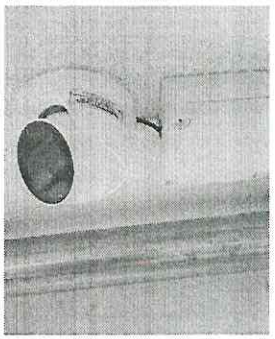














TC. JEFRI FERNANDEZ
CC.

NOMBRE: ADALBERTO CORONEL B.
CC: 7716367 7

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	26/12/2025	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
TECNICO A CARGO	KANDRA ARDILA	LUGAR	EDIFICIO LESLIE
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 13 CAMARAS INSTALADA DE LA CUAL 5 NO PRESENTABAN IMAGEN
	GABINET MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	1 DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	1 UPS EN LINEA QUE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA
	2 UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.


	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.(1)
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA. (2)
	REPARACION DE LAS CAMARAS QUE NO PRESENTABAN IMAGEN (CAMBIO DE VIDEO BALUM Y AJUSTE) (5 VIDEO BALUM)


	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 5 CAMARAS MAS FUNCIONIANDO, DANDO UN TOTAL DE 13 CAMARAS EN FUNCIONAMIENTO Y EN BUEN ESTADO

OBSERVACIONES: N/A


EVIDENCIAS:

ANTES **DESPUES**




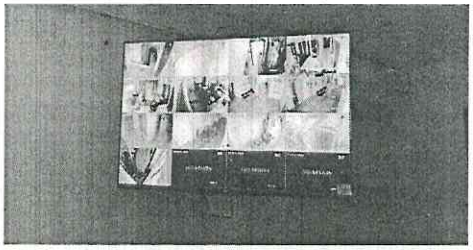




















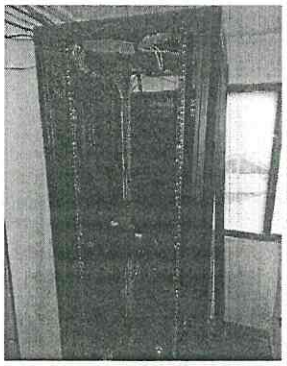









ENTREGA:

TC. KANDRA ARDILA
CC.

RECIBE:

NOMBRE: Gustavo Coronel D
CC: 77163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	7/01/2026	MUNICIPIO	CHIRIGUANA
TECNICO A CARGO	JEFRI FERNANDEZ	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUNTRAN 11 CAMARAS DE LA CUAL 3 EN MAL FUNCIONAMIENTO. (LENTE DEFECTUOSO)
	GABINETE EN MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO EN MAL ESTADO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	PUNTO DE RED AL DVR EN MAL ESTADO
	TELEVISOR EN MALA UBICACIÓN


	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	SE INSTALA DVR NUEVO PARA REEMPLAZAR EL D VR QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO Y SE AGREGA AL NUEVO DVR. (SE REALIZA PATCH CORD DE 10 M PARA EL DVR)
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE INSTALAN CAMARAS DE SEGURIDAD NUEVA PARA REEMPLAZAR LAS CAMRAS EN MAL FUNCIONAMIENTO
	SE REUBICA TELEVISOR Y SOPORTE DE TELEVISOR A UNA UBICACIÓN VISIBLE


	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 11 CAMARAS INSTALADA

OBSERVACIONES: N/A

EVIDENCIAS:

ANTES

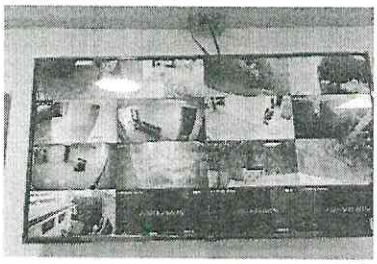







DESPUES


















ENTREGA:

TC. JEFRI FERNANDEZ
CC.

RECIBE:

NOMBRE: ADALBERTO CORONEL
CC: 7716377

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SING.S
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	31/12/2025	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
TECNICO A CARGO	KANDRA ARDILA	LUGAR	CALLE 14 #14-46
		CONTACTO	


	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 6 CAMARAS INSTALADA EN BUEN ESTADO
	GABINET MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	NVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR



	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%








OBSERVACIONES: N/A



EVIDENCIAS:





ANTES **DESPUES**




TC. KANDRA ARDILA
CC.

NOMBRE: ADALBERTO CORDELL.
CC: 77163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	29/12/2025, 30/12/2025, 05/01/2026	MUNICIPIO	EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
TECNICO A CARGO	KANDRA ARDILA	LUGAR	VALLEDUPAR
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 72 CAMARAS INSTALADA DE LAS CUAL 12 PRESENTAN MAL FUNCIONAMIENTO. (PRESENTA ERROR "DIRECCION IP - NO PUEDE ENCONTRAR AL HOST DE RED)
	GABINET MAL ESTADO POR SUCIEDAD (UTILIZAN EL MISMO GABINETE DE COMUNICACIONES)
	4 NVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	SPLITER EN MAL ESTADO


	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA.
	SE REALIZA CAMBIO DE SWITCH QUEMADO POR UNO SWITCH NUEVO LOGRANDO RESOLVER EL ERROR DE LAS 12 CAMARAS EN MAL FUNCIONAMIENTO.

	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 72 CAMARAS INSTALADA

OBSERVACIONES: N/A


EVIDENCIAS:


ANTES








DESPUES

























TC. KANDRA ARDILA
CC.

NOMBRE: ADALBERTO CORONEL
CC: 72163677

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA CCTV - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR 2025

SINGS
SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNA MARCA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SING'S S.A.S

GENERALES		CLIENTE	
FECHA	6/01/2026	MUNICIPIO	LAS JAGUA DE IBIRICO
TECNICO A CARGO	CRISTIAN BUELVAS	LUGAR	
		CONTACTO	

	DIAGNOSTICO INICIAL
	SE ENCUENTRAN 8 CAMARAS INSTALADA DE LA CUAL 2 ESTAN EN MAL ESTADO (LENTE DEFECTUOSO)
	GABINET MAL ESTADO POR SUCIEDAD.
	DVR ACTIVO A FALTA DE MANTENIMIENTO.
	UPS EN LINEA A FALTA DE MANTENIMIENTO Y FALLA DE BATERIAS.

	PROCEDIMIENTOS
	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
	SE INSTALAN CAMARAS SE SEGURIDAD NUEVAS PARA REMPLAZAR LAS DAÑADAS.(VIDEO BALUM Y FUENTE)
	MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO DE EL DVR, SE REVISA EL ESTADO DEL DISCO DURO.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LOGICO DE UPS, SE DEJA EN LINEA ADEMAS SE CAMBIAN LAS BATERIAS POR UNAS NUEVAS (6 BATERIAS)
	SE REALIZA LIMPIEZA FISICA A TELEVISOR

	REPORTE DE ENTREGA
	EL SISTEMA SE ENTREGA A SATIFACCION FUNCINANDO AL 100%
	EL SISTEMA DE CAMARAS QUEDA CON 8 CAMARAS INSTALADA


OBSERVACIONES: N/A

EVIDENCIAS:

ANTES















DESPUES









ENTREGA:

TC. CRISTIAN BUELVAS
CC.

RECIBE:

NOMBRE: ADALBERTO CORONEL B.
CC: 77163677
