ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero 2024

Puerto López, 23 de enero de 2025

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 01-02-26 Hora: 10:41 **SI 150.35-076-01-2026**
Recibido por: Andrés Pam

Doctora:
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe oficina de contratación
Puerto López - Meta

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 26/01/26 Hora: 08:51am
Recibido por: André P.

Asunto: Entrega de documentación de la solicitud de Prórroga No. 01 del contrato de OBRA No. 103.13.09.005-2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente la secretaria de Infraestructura del municipio de Puerto López – Meta, hace entrega de la documentación de la solicitud de Prórroga No. 01 del contrato de OBRA No. 103.13.09.005-2025, con objeto "**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META.**"

Sin otro particular,

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: EDDUIN HERNEY ABRIL REYES	Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Cargo: Profesional especializado	Cargo: secretaria de Infraestructura	Cargo: secretaria de Infraestructura
Fecha: 23/01/2026	Fecha: 23/01/2026	Fecha: 23/01/2026

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	LISTA DE CHEQUEO PRORROGA-SUSPENSIÓN-AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN -REINICIO	Código: F - 262
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de

PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

Fecha: 23/01/2026

PRORROGA - SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN - REINICIO	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
SOLICITUD Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio (Descripcion detallada de la justificación y sus correspondientes pruebas)	F-098	SI
INFORME DE OBRA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio	N/A	SI
REPROGRAMACIÓN DE OBRA EN PROJECT (V°B° interventoria aplica para prorroga y reinicio)	N/A	SI
FLUJO DE CAJA EN PROJECT (V°B° interventoria) Porcentajes y costos planeados.	N/A	N/A
INFORME DE INTERVENTORÍA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio	F-095	N/A
ACTA COMITÉ (Particip. RL.Contratista, RL. Interventoria, Director Operativo de Ejecucion y Control de proyectos, Apoyo a la Supervisión o supervisor)	F-166	SI
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del acto administrativo, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	N/A	N/A
MINUTA. Aplica cuando modifique las condiciones del contrato. Excepto, cuando modifica la vigencia de un proyecto y esta al alcance de la vigencia del contrato, esta sera perfeccionada mediante el acta de comité.		
UNA VEZ FIRMADA LA MINUTA, se debe garantizar el siguiente tramite:		
ACTA REINICIO DE OBRA (Aplica para suspensión)		
Suscrita la MINUTA CORRESPONDIENTE, la interventoria deberá asegurarse que la ENTIDAD realice la publicación en el SECOP de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; a falta de publicación oportuna, la interventoria debera comunicar		
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Garantia Unica de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual)		

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
R/L CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATISTA

Firma N/A
Nombre: NO APLICA
R/L
INTERVENTOR

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ PRORROGA ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°:	103.13.09.005-2025
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	15 (DÍAS)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	23/01/2026
FECHA DE FINALIZACION INICIAL DEL CONTRATO	6/02/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 823,366,756.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GRL
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	MARYLIN FONSECA CRUZ
CARGO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: N/A

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: N/A

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($): N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VA VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($): N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 823,366,756.00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	15	DIAS	0	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	6/02/2026			

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ PRORROGA ☑

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN	☐	al contrato anteriormente citado por valor de	$	
			TIEMPO	
			MES	DIAS
PRORROGA	☑	al contrato anteriormente citado de	3	18

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia veintitrés (23) del mes de enero de 2026. El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 0,00% contra un avance programado del 0,00%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 823,366,756.00
Valor facturado ($)	$ 0.00
Valor facturado reajustes ($)	0
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0.00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0.00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE PRORROGA Y/O ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO REFERENCIADO

La presente solicitud de prórroga se fundamenta en lo expuesto y analizado durante el Comité Técnico No. 01, en el cual se evidenció que el plazo contractual inicialmente establecido de quince (15) días calendario resultó insuficiente para la ejecución adecuada del objeto contractual, conforme a la programación detallada de las actividades a desarrollar. Durante la elaboración de la programación de obra, el contratista verificó que los tiempos inicialmente previstos no permiten atender de manera técnica y secuencial los procesos requeridos, tales como la adquisición y suministro de materiales, la organización y habilitación de los frentes de trabajo y la ejecución ordenada de las actividades conforme al alcance del proyecto. En consecuencia, y con el fin de garantizar una ejecución técnica ordenada, eficiente y acorde con las condiciones contractuales, se solicita la prórroga del plazo contractual por un término de tres (3) meses y dieciocho (18) días, de acuerdo con la programación de obra ajustada y bajo el seguimiento de la Supervisión.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

La Supervisión, de conformidad con lo analizado y expuesto en el Comité Técnico No. 01, realizó la revisión técnica de la solicitud de prórroga presentada por el contratista de obra, así como de la programación de obra ajustada, evidenciando que el plazo contractual inicialmente establecido de quince (15) días calendario resultaba insuficiente para el desarrollo adecuado del objeto contractual, de acuerdo con el alcance y la secuencia de las actividades programadas. En ese sentido, se concluye que la prórroga solicitada por un término de tres (3) meses y dieciocho (18) días resulta técnicamente justificada, necesaria y proporcional, razón por la cual la Supervisión emite concepto favorable, al considerar que dicha medida permitirá garantizar la correcta ejecución de las actividades conforme a la programación aprobada y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 823,366,756.00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	3	DIAS	4	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	23/05/2026			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los ventitres (23) días del mes de enero del año 2026.

Nombre del Contratista : CONSORCIO OBRAS GRL **Representante Legal Contratista: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ** **Firma**	N/A **Nombre de la Interventoria : NO APLICA** **Representante Legal Interventoria:** **Firma**
Nombre del Supervisor Asignado: MARYLIN FONSECA CRUZ **Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE COMITE	Código: F – 166
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

Acta N°:	1		Fecha (dd/mm/aa):	23/01/2026
Ubicación:	ALCALDIA MUNICIPAL		Hora Inicio:	9:00 am
			Hora Final:	9:30 am
Responsable:	SUPERVISION		Contrato:	103.13.09.005-2025 (OBRA)
Objetivo de la reunión:	Seguimiento al contrato y definición de aspectos contractuales como el reinicio y prorroga a los contratos de obra e interventoría.			
Dirige la Reunión:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	Diligencia la presenta acta:		MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ

1. **Asistentes**

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS GRL	
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MUNICIPAL	

2. **Agenda de la reunión (Temas)**

1.	PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA

3. **Seguimiento a compromisos de Comités anteriores**

Compromiso	Responsable	Cumplido /No Cumplido	Observación
N/A	N/A	N/A	N/A

4. **Desarrollo de Temas agendados para la reunión**

1	Da inicio el Comité Técnico No. 1 del Contrato de Obra No. 103.13.09.005-2025, cuyo objeto corresponde a: **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META."** El contrato fue suscrito el 31 de diciembre de 2025, con fecha de inicio el **23 de enero de 2026**, un plazo inicial de **quince (15) días calendario** y fecha de terminación prevista para el **06 de febrero de 2026**.
2	El contratista de obra manifiesta que, en el marco del presente Comité Técnico, y una vez elaborada la programación detallada de las actividades a ejecutar, verificó la necesidad de contar con un mayor plazo de ejecución que permita desarrollar de manera adecuada el objeto contractual. En consecuencia, presenta formalmente solicitud de **prórroga del plazo contractual por un término de tres (3) meses y dieciocho (18) días**, estableciendo como nueva fecha de terminación el **23 de mayo de 2026**. Como soporte de la solicitud, el contratista presenta: • El Informe de Solicitud de Prórroga del Contrato de Obra.

	• La programación de obra ajustada. El contratista sustenta la solicitud de prórroga del plazo contractual en el alcance del proyecto y en la complejidad de las actividades previstas, las cuales requieren una ejecución técnica y secuencial conforme a las especificaciones establecidas. Así mismo, se deben considerar los procesos administrativos asociados a la adquisición y suministro de materiales, la organización y habilitación de los frentes de trabajo y la adecuada planificación de las actividades. Adicionalmente, teniendo en cuenta la época decembrina, periodo durante el cual las empresas no operan de manera regular debido a recesos y cierres por las festividades, se han presentado dificultades en la consecución oportuna de los materiales y en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. En consecuencia, el plazo adicional otorgado corresponde al tiempo real necesario para garantizar una ejecución ordenada, eficiente y conforme a las condiciones técnicas, legales y contractuales.
3	Durante el desarrollo del Comité Técnico, la Supervisión realiza la revisión técnica del informe de solicitud de prórroga y de la programación de obra ajustada, verificando la coherencia entre las actividades programadas, los tiempos de ejecución propuestos y el alcance del proyecto. Como resultado de dicho análisis, la Supervisión considera que la programación presentada refleja de manera adecuada la secuencia constructiva y los tiempos necesarios para la ejecución del objeto contractual, siempre y cuando el contratista se comprometa a cumplir estrictamente con el cronograma aprobado; en este sentido, la supervisión considera necesaria la aprobación de la prórroga.
4	En atención a la solicitud elevada por el contratista de obra y a la justificación técnica sustentada en la programación de obra ajustada y en los tiempos reales de ejecución requeridos, la Supervisión emite **concepto favorable** y **aprueba la prórroga del plazo contractual por un término de tres (3) meses y dieciocho (18) días**, al considerar que el nuevo plazo propuesto resulta proporcional, coherente con el alcance del proyecto y necesario para garantizar una ejecución adecuada, controlada y conforme a los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad contractual.

5. Compromisos adquiridos

Compromiso	Responsable	Fecha Probable	Observación
Iniciar labores de obra según programación de obra.	CONTRATISTA DE OBRA	23/01/2026	
Finalizar labores en concordancia a la programación de obra presentada.	CONTRATISTA DE OBRA	23/05/2026	

6. Información de la próxima Reunión

Fecha: N/A
Hora: N/A
Lugar: N/A
Convocados: N/A

7. Agenda de la próxima reunión (Temas)

1	

INFORME N° 01
PERIODO DEL *23,01,26* ***AL*** *23, 01, 26*
FECHA DE PRESETANCION: *23, 01, 26*
PRORROGA No. 01

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO :	*OBRA*			
CONTRATO N° :	*103.13.09.005-2025*			
OBJETO CONTRATO :	*ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META*			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($823.366.756,00)*			
CONTRATISTA:	*CONSORCIO OBRAS GRL*			
CORREO ELECTRONICO:	*consorcioobrasgrl@gmail.com*			
FECHA DE INICIACIÓN:	*23 – 01 – 2026*			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*0*	***Meses***	*1*	***Días***
FECHA DE TERMINACIÓN:	*23 – 01 – 2026*			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*NO APLICA*			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*NO APLICA*			
CORREO ELECTRONICO:	*NO APLICA*			
SUPERVISOR ASIGNADO:	*MARYLIN FONSECA CRUZ*			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	*31/12/2025*			
CORREO ELECTRONICO:	*secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co*			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N° XX:				*N/A*
TIEMPO:	***N/A***	***Meses***	***N/A***	***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				*N/A*
SUSPENSIÓN N° 01:				*N/A*
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co


AMPLIACION N° XX A SUSPENSION N°XX:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
REINICIO N° XX:				*N/A*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :				*N/A*
MODIFICACIÓN N°XX:				*N/A*
VALOR MODIFICADO:				*N/A*
FECHA ADICIONAL N° XX:				*N/A*
VALOR ADICIONAL :				*N/A*
VALOR ACTUALIZADO :				*N/A*
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:				*23 – 01 – 2026*

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	***PUERTO LÓPEZ***	***VEREDA:***	• ***Humapo*** • ***La Victoria***
CORREGIMIENTO:	*NO APLICA*	***BARRIO:***	• ***Policarpa*** • ***Julio Flores*** • ***La Laguna*** • ***Clemente Naranjo*** • ***Villa Suiza*** • ***Juana Sofía*** • ***El Prado*** • ***El C.I.C*** • ***Complejo Deportivo***
COORDENADAS:			

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

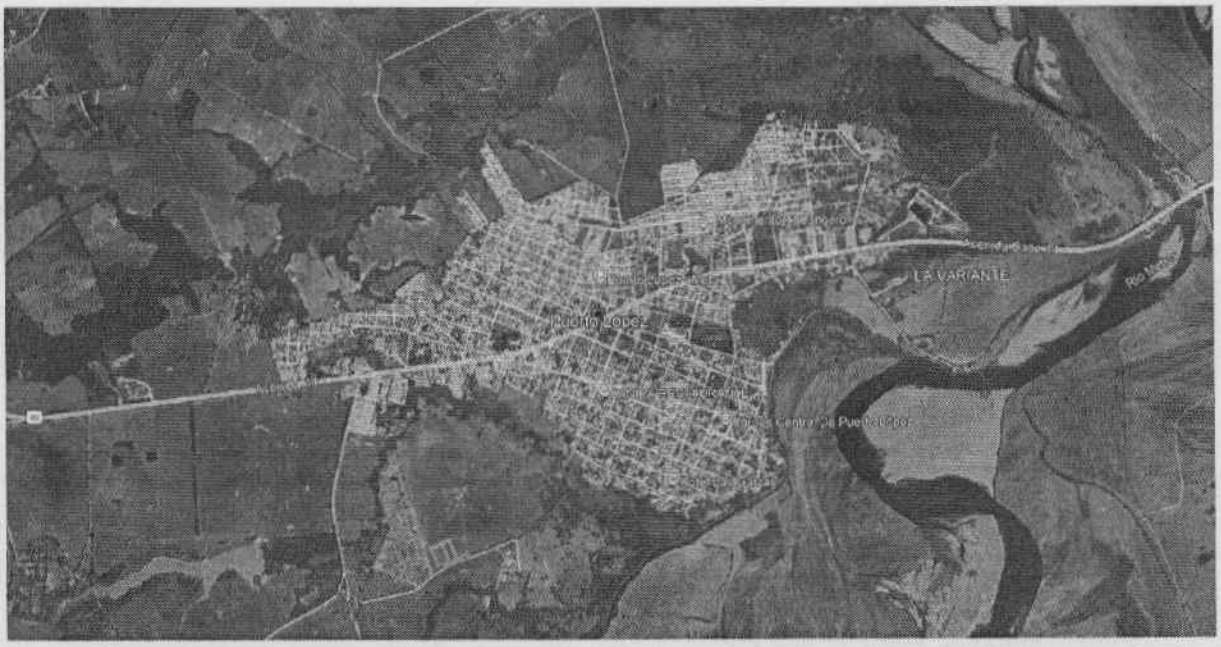

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico


ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
N/A	%	$	%	$	%	$	%	$

Durante el período evaluado, la Supervisión realizó el seguimiento a la programación contractual, evidenciando que no se registran avances en la ejecución física de la obra, toda vez que el contrato inició el día 23 de enero de 2026 y, en la misma fecha, el contratista presentó formalmente la solicitud de prórroga del plazo contractual, situación que hizo inviable el inicio efectivo de las actividades de obra. Así mismo, la Supervisión efectuó la revisión de la programación de obra ajustada presentada por el contratista, verificando su coherencia técnica y la secuencia lógica de las actividades programadas, la cual fue avalada como soporte técnico

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

para el trámite de la prórroga y para la correcta ejecución del objeto contractual dentro del nuevo plazo solicitado.

Grafica Avance Físico

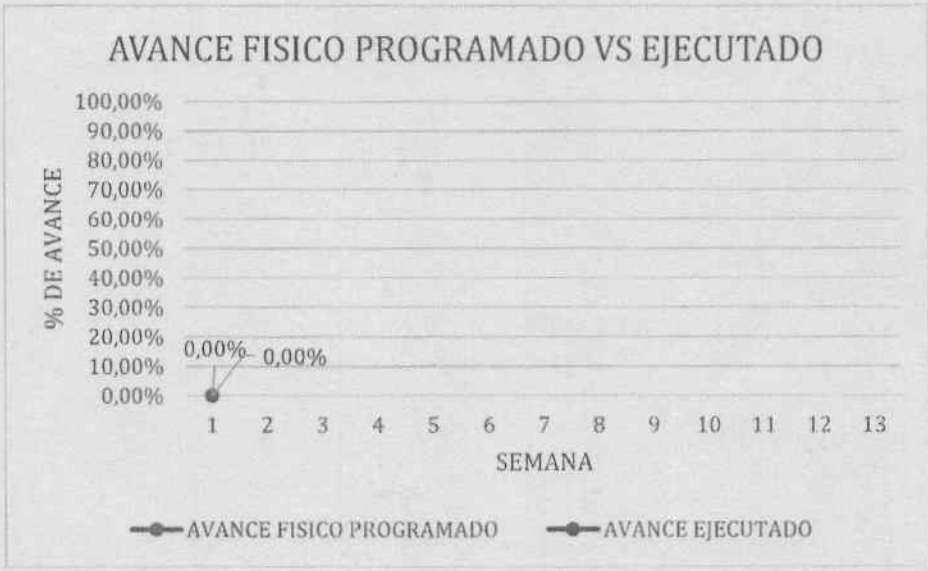

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Relacionar Oficios y documentos proyectados, durante el desarrollo del contrato en el periodo reportado en el presente informe, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados, requerimientos y demás.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
-	-	-	-	-

2.1. COMITÉS , REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	FECHA	ASPECTOS TRATADOS
COMITÉ No. 01	23/01/2026	Prorroga No. 01 al contrato obra.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Nota :

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

A la fecha no se han ejecutado ninguna actividad contractual.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
A la fecha no se ha realizado ninguna actividad contractual.	*N/A*	*N/A*

Nota : *Dar aplicabilidad al F -251 Acta Resumen Ensayos y Pruebas de Laboratorio, remitir como anexo al presente informe*

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
N/A	***N/A***	***N/A***

Nota : *Diligenciar F- 261 Control de Seguridad Industrial, remitir como anexo al presente informe*

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
N/A	***N/A***	***N/A***

Nota : *Diligenciar F- 253 Implementación Plan de Manejo Ambiental, remitir como anexo al presente informe*

C. INFORME ADMINISTRATIVO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES

Nota: *En el caso que durante el periodo reportado en el presente informe existió cambio de personal propuesto inicialmente por el contratista. Es necesario diligenciar, aprobar por las partes el F-243 Acta Aprobación Personal Obra y presentarlo como anexo al presente informe.*

- *A la fecha no se ha contratado personal de obra para el inicio de actividades.*

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:						
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL

Nota: *Diligenciar F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, remitir como anexo al presente informe*

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
-	-	-

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN
-	-	-

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

-	-	-

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. **ACTA DE VISITA PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

- ***N/A.***

3. **ACTA DE SOCIALIZACIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

- ***N/A.***

4. **ACTA DE VISITA PREVIA A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

- ***N/A.***

5. **ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ENTREGA A LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

- ***N/A.***

6. ***GARANTIAS:***

<Describa las pólizas actualizadas de acuerdo a cada uno de los actos administrativos celebrado>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	***620 47 994000059577***
ANEXO N°	***0***
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	***620 74 994000014263***
ANEXO N°	***0***
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*09/01/2026*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*003*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	***Aseguradora Solidaria de Colombia***

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CUMPLIMIENTO	31/12/2025	30/04/2026	$ 82.336.676,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	31/12/2025	31/12/2028	$ 41.168.338,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	-	-	$ 82.336.676,00
CALIDAD DEL BIEN	31/12/2025	30/04/2026	$ 82.336.676,00
RCE	31/12/2025	31/01/2026	$ 350,000,000.00

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

E. INFORME FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
01996	*31/10/2025*	*03.2.3.43.4302.1604-9*	*$ 150.620.767,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 127.149.540,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 281.360.549,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 121.237.535,97*
		03.2.3.43.4302.1604-10	*$ 189.722.206,03*

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
02857	*31/12/2025*	*03.2.3.43.4302.1604-9*	*$ 150.620.767,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 127.149.540,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 281.360.549,00*
		03.2.3.43.4302.1604-9	*$ 121.237.535,97*
		03.2.3.43.4302.1604-10	*$ 142.998.364,03*

PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPLEJO DEPORTIVO				
1.1	CAFETERIA Y BAÑOS				

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

1.1.1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	230.00	$ 16,091.95	$ 3,701,149.00
1.1.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	210.00	$ 19,335.70	$ 4,060,497.00
1.1.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1.00	$ 720,163.13	$ 720,163.00
1.1.4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	10.00	$ 147,001.93	$ 1,470,019.00
1.1.5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	188.00	$ 33,512.27	$ 6,300,307.00
Subtotal					$ 16.252.135,00
1.2	CANCHA TENIS				
1.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	183.64	$ 8,883.15	$ 1,631,302.00
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	177.30	$ 92,490.43	$ 16,398,553.00
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA	U	4.00	$ 913,237.36	$ 3,652,949.00
1.2.4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	221.63	$ 24,426.06	$ 5,413,548.00
1.2.5	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	M2	625.00	$ 10,323.35	$ 6,452,094.00
1.2.6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	800.00	$ 85,364.43	$ 68,291,544.00
Subtotal					$ 101.839.990,00
1.3	PLAZOLETAS INTERIORES				
1.3.1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	260.00	$ 16,091.95	$ 4,183,907.00
1.3.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	110.00	$ 19,335.70	$ 2,126,927.00
Subtotal					$ 6.310.834,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

1.4	CANCHA MICROFUTBOL				
1.4.1	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	200.00	$ 63,807.49	$ 12,761,498.00
Subtotal					$ 12.761.498,00
COSTO SUBTOTAL					$ 137.164.457,00
2	POLIDEPORTIVO BARRIO POLICARPA				
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	21.60	$ 4,745.45	$ 102,502.00
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3.24	$ 92,910.16	$ 301,029.00
2.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	M3	1.08	$ 873,625.42	$ 943,515.00
2.4	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	M3	6.00	$ 996,810.87	$ 5,980,865.00
2.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16.10	$ 50,466.36	$ 812,508.00
2.6	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	196.96	$ 8,883.15	$ 1,749,625.00
2.7	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	19.20	$ 19,335.70	$ 371,245.00
2.8	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	112.96	$ 24,426.06	$ 2,759,168.00
2.9	SELLADOR HIDROPOROTECTOR	M2	84.00	$ 47,721.57	$ 4,008,612.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR				
2.10	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
2.11	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
2.12	REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 502,474.45	$ 4,019,796.00
2.13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	200.00	$ 18,314.49	$ 3,662,898.00
2.14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	8.00	$ 1,179,064.64	$ 9,432,517.00
Subtotal					$ 77.760.968,00
3	POLIDEPORTIVO LA LAGUNA				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10mm INC DEMARCACION	M2	2.00	$ 1,938,736.75	$ 3,877,474.00
3.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	83.76	$ 24,426.06	$ 2,045,927.00
Subtotal					$ 5.923.401,00
4	POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ				
4.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	395.64	$ 8,883.15	$ 3,514,529.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

4.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	75.60	$ 19,335.70	$ 1,461,779.00
4.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	320.64	$ 24,426.06	$ 7,831,972.00
4.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	78.00	$ 47,721.57	$ 3,722,282.00
4.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
4.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 921,501.56	$ 7,372,012.00
4.7	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	2.00	$ 1,179,064.64	$ 2,358,129.00
4.8	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16. LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	50.00	$ 238,164.39	$ 11,908,220.00
4.9	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	72.00	$ 36,256.30	$ 2,610,454.00
4.10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	$ 8,568.05	$ 154,225.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18.00	$ 136,910.89	$ 2,464,396.00
Subtotal					$ 45.160.011,00
5	POLIDEPORTIVO PRADO				
5.1	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	31.20	$ 19,335.70	$ 603,274.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

5.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	154.44	$ 24,426.06	$ 3,772,361.00
5.3	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	72.00	$ 47,721.57	$ 3,435,953.00
5.4	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
5.5	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 921,501.56	$ 7,372,012.00
5.6	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
5.7	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	M	2.00	$ 1,179,064.64	$ 2,358,129.00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	U	1.00	$ 913,237.36	$ 913,237.00
5.9	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	M2	15.00	$ 5,161.68	$ 77,425.00
Subtotal					$ 62.149.079,00
6	POLIDEPORTIVO VILLA SUIZA				
6.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	158.64	$ 8,883.15	$ 1,409,223.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

6.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	48.80	$ 19,335.70	$ 943,582.00
6.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	$ 24,426.06	$ 3,230,102.00
6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	32.40	$ 47,721.57	$ 1,546,179.00
6.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
6.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 921,501.56	$ 7,372,012.00
6.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
6.8	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	144.00	$ 18,314.49	$ 2,637,287.00
6.9	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	M	2.00	$ 1,179,064.64	$ 2,358,129.00
Subtotal					$ 63.113.202,00
7	POLIDEPORTIVO LA VICTORIA				
7.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40.00	$ 9,225.88	$ 369,035.00
7.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28.80	$ 20,124.82	$ 579,595.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

7.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	$ 25,276.84	$ 3,342,609.00
7.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40.00	$ 49,958.02	$ 1,998,321.00
7.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,821,409.20	$ 1,821,409.00
7.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 980,372.57	$ 7,842,981.00
7.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 22,395,922.36	$ 44,791,845.00
7.8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	4.00	$ 1,238,417.18	$ 4,953,669.00
7.9	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	$ 8,627.17	$ 155,289.00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18.00	$ 141,151.46	$ 2,540,726.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	24.00	$ 173,985.13	$ 4,175,643.00
Subtotal					$ 72.571.122,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

8	POLIDEPORTIVO HUMAPO				
8.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40.00	$ 9,225.88	$ 369,035.00
8.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28.80	$ 20,124.82	$ 579,595.00
8.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	$ 25,276.84	$ 3,342,609.00
8.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40.00	$ 49,958.02	$ 1,998,321.00
8.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,821,409.20	$ 1,821,409.00
8.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 980,372.57	$ 7,842,981.00
8.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 22,395,922.36	$ 44,791,845.00
8.8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	8.00	$ 1,238,417.18	$ 9,907,337.00
8.9	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	$ 8,627.17	$ 155,289.00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO	M2	18.00	$ 141,151.46	$ 2,540,726.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA				
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EM MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	88.00	$ 173,985.13	$ 15,310,691.00
Subtotal					$ 88.659.838,00
9	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA				
9.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	18.20	$ 4,745.45	$ 86,367.00
9.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	7.28	$ 42,177.47	$ 307,052.00
9.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	7.28	$ 940,067.85	$ 6,843,694.00
9.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.28	$ 1,397,940.94	$ 3,187,305.00
9.5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.36	$ 1,881,081.80	$ 2,558,271.00
9.6	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.91	$ 2,522,150.56	$ 2,295,157.00
9.7	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	3.80	$ 187,678.00	$ 713,176.00
9.8	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	313.50	$ 10,987.21	$ 3,444,490.00
9.9	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI)	KG	246.09	$ 10,987.21	$ 2,703,843.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE				
9.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	19.88	$ 24,426.06	$ 485,590.00
9.11	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	176.00	$ 164,497.75	$ 28,951,604.00
9.13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
Subtotal					$ 95.193.237,00
10	POLIDEPORTIVO EL C.I.C				
10.1	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	U	1.00	$ 110,996.67	$ 110,997.00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	2.00	$ 955,932.00	$ 1,911,864.00
10.3	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10x0.20x0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	4.82	$ 75,834.06	$ 365,520.00
10.4	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2.41	$ 50,466.36	$ 121,624.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

10.5	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	158.88	$ 16,091.95	$ 2,556,689.00
10.6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	449.04	$ 19,335.70	$ 8,682,503.00
10.7	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	303.28	$ 24,426.06	$ 7,407,935.00
10.8	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	M2	214.80	$ 164,497.75	$ 35,334,117.00
10.10	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	62.48	$ 8,883.15	$ 555,019.00
10.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1.00	$ 720,163.13	$ 720,163.00
10.12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	53.00	$ 147,001.93	$ 7,791,102.00
10.13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	10.96	$ 21,041.40	$ 230,614.00
10.14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
10.15	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 1,569,982.31	$ 3,139,965.00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Subtotal					$ 112.544.800,00
11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE				
11.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	80.00	$ 8,883.15	$ 710,652.00
11.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	39.60	$ 19,335.70	$ 765,694.00
11.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	101.76	$ 24,426.06	$ 2,485,596.00
11.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	108.00	$ 47,721.57	$ 5,153,930.00
11.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
11.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10.00	$ 921,501.56	$ 9,215,016.00
11.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
11.8	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	1.00	$ 1,179,064.64	$ 1,179,065.00
Subtotal					$ 63.126.641,00
SUBTOTAL OBRAS					$ 823.366.756,00

PAGOS REALIZADOS


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *23/01/2026 AL 23/01/2026*

Avance fisico ejecutado 0,00 % y avance financiero ejecutado 0,00 %

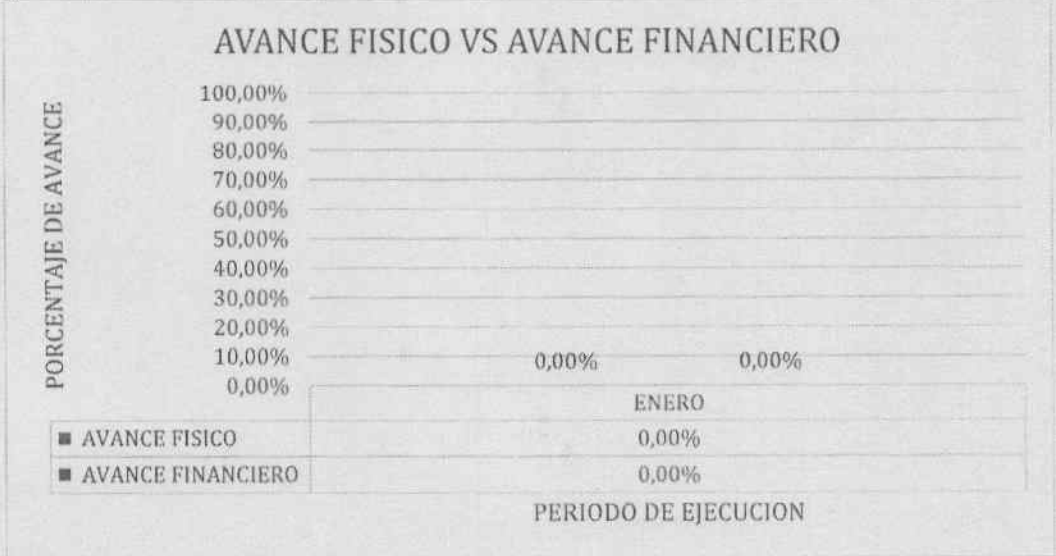

INVERSION ANTICIPO

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: *Diligenciar F-226 Acta Plan de Inversión del Anticipo y F-259 Informe Plan Inversión Anticipo Obra, remitir como anexo al presente informe cuando aplique.*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Conforme a lo analizado y expuesto en el Comité Técnico No. 01, la Supervisión evidenció que durante el período evaluado no fue posible adelantar actividades de ejecución, debido al alcance del proyecto y la complejidad de las actividades a desarrollar. Así mismo, se identificaron limitaciones operativas asociadas a la adquisición y disponibilidad de los materiales necesarios para la ejecución del proyecto.

Ante esta situación, y una vez evaluadas las causas que dieron origen a la necesidad de ajustar el plazo contractual, el contratista de obra presentó formalmente la solicitud de prórroga del plazo, acompañada de la programación de obra ajustada, la cual fue revisada y avalada técnicamente por la Supervisión como la medida adecuada y necesaria para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a las condiciones técnicas, contractuales y de planeación establecidas.

G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

A la fecha del presente informe, el contrato de obra presenta un ***avance físico del cero por ciento (0%)****, toda vez que no se han ejecutado actividades constructivas. Lo anterior obedece a que, conforme a lo analizado en el Comité Técnico No. 01, por el alcance del proyecto y la complejidad de las actividades previstas, las cuales requieren una ejecución técnica y secuencial conforme a las especificaciones establecidas, considerando los tiempos requeridos para la organización de los frentes de trabajo, la adquisición y disponibilidad de materiales, y la adecuada planificación de las actividades. En consecuencia, y con el fin de salvaguardar la adecuada ejecución del objeto contractual y evitar reprocesos técnicos, no se dio inicio a la ejecución física de la obra durante el período evaluado.*

H. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE REPORTADO A LA FECHA.

A la fecha del presente informe no se cuenta con registro fotográfico de avance de obra, toda vez que no se han ejecutado actividades físicas en el proyecto. Lo anterior obedece a que, conforme a lo analizado en el Comité Técnico No. 01, el contrato no presentó ejecución efectiva durante el período evaluado, razón por la cual no se generaron evidencias fotográficas asociadas al avance físico del contrato.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	-	EJECUTADO	%

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	REGISTRO FOTOGRAFICO 7X9
	OBSERVACIONES
	Hacer una descripción técnica del avance de la actividad, observaciones que considere necesario

G. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE PRORROGA

Con fundamento en lo analizado y expuesto durante el Comité Técnico No. 01, la supervisión verificó que, debido al alcance del proyecto, a la complejidad de las actividades previstas y a las dificultades asociadas a la adquisición y disponibilidad de materiales, no ha sido posible realizar la ejecución adecuada del objeto del contrato, conforme a la programación detallada de las actividades a desarrollar. La revisión técnica de la solicitud presentada por el contratista, así como de la programación de obra ajustada, permitió evidenciar que los tiempos propuestos son coherentes con el alcance del proyecto y necesarios para garantizar una ejecución ordenada, eficiente y conforme a las condiciones técnicas y contractuales.

*En este sentido, la Supervisión considera que la solicitud de prórroga del plazo contractual por un término de **tres (3) meses y dieciocho (18) días** resulta técnicamente justificada, viable y proporcional, constituyéndose en una medida necesaria para asegurar el cumplimiento del objeto contractual, bajo los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad contractual.*

H. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE MODIFICACION – ADICION PRESUPUESTAL

N/A.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el período evaluado, el contrato de obra no presentó avances físicos ni financieros, debido al alcance del proyecto, a la complejidad de las actividades previstas y a las dificultades asociadas a la adquisición y disponibilidad de materiales, no ha sido posible realizar la ejecución adecuada del objeto del contrato.

El análisis realizado en el Comité Técnico No. 01 permitió establecer que la solicitud de prórroga presentada por el contratista se encuentra debidamente justificada desde el punto de vista técnico, soportada en la programación de obra ajustada y alineada con los requerimientos reales de ejecución del objeto contractual.

La Supervisión concluye que la prórroga solicitada por un término de **tres (3) meses y dieciocho (18) días** resulta necesaria, proporcional y viable para garantizar una ejecución ordenada, eficiente y conforme a las condiciones técnicas y contractuales del proyecto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2026

H. ANEXOS

- Actas de comité técnico.
- Informe de Contratista
- Programación de Obra en Project.

Firma

MARYLIN FONSECA CRUZ
SUPERVISOR ASIGNADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CONSORCIO OBRAS GRL

INFORME DE OBRA
PRORROGA No.1

CONTRATO DE OBRA No. 103.13.09.005-2025
CONSORCIO OBRAS GRL
NIT 902.021.128-6
R/L. ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META"

PUERTO LOPEZ – META
ENERO 2026

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

1. OBJETIVO

El presente proyecto tiene como objetivo principal la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos del casco urbano y rural del municipio de Puerto López – Meta, con el fin de mejorar las condiciones físicas, funcionales y estéticas de dichos espacios, garantizando ambientes adecuados para la recreación, el deporte y el esparcimiento de la comunidad beneficiaria. Estas intervenciones buscan no solo atender las necesidades actuales de la población, sino también fortalecer la práctica deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre en condiciones seguras y dignas.

El presente informe tiene como finalidad realizar la solicitud, por parte del contratista de obra, de la prórroga No. 01 del contrato referido, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas, administrativas y contractuales descritas en el presente documento.

2. UBICACIÓN


2.1 UBICACIÓN GENERAL



Puerto Lopez – Meta

2.2 UBICACIÓN ESPECIFICA

	Coordenadas
Latitud	4° 05'49.16"N
Longitud	72°57'20.14"O

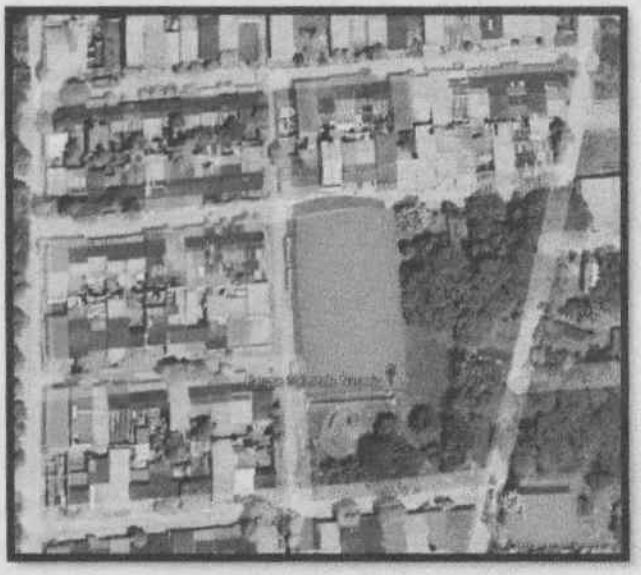


Barrio Clemente Naranjo, Polideportivo Clemente Naranjo, Puerto Lopez – Meta

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	Coordenadas
Latitud	4° 05'42.20"N
Longitud	72°57'24.97"O

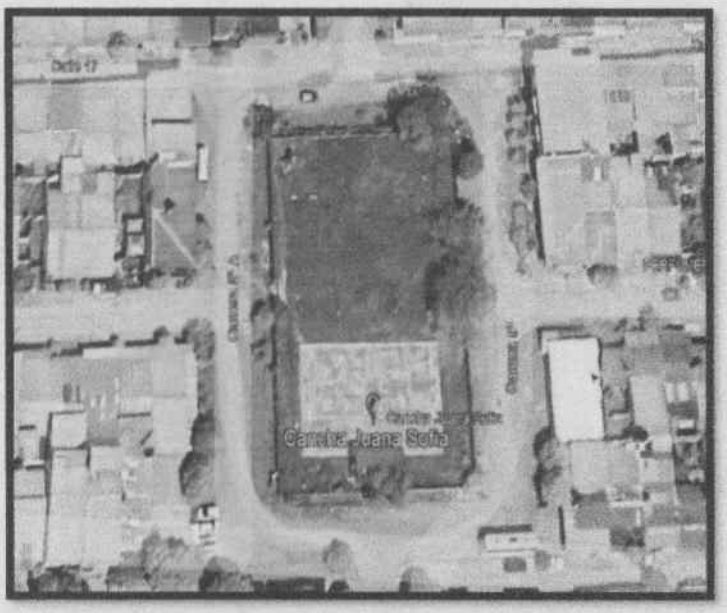

Barrio Juana Sofía, Polideportivo Juana Sofía, Puerto Lopez – Meta

CONSOLIDADO POLIDEPORTIVOS A INTERVENIR

- Barrio Policarpa
- Barrio Julio Flores
- Barrio La Laguna
- Barrio Clemente Naranjo
- Barrio Villa Suiza
- Barrio Juana Sofía
- Polideportivo El Prado
- Polideportivo El C.I.C
- Resguardos Indígena De Humapo
- Resguardos Indígena De La Victoria
- Complejo Deportivo

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

3. INFORMACION DEL CONTRATO

	DATOS GENERALES
CONTRATO No.	103.13.09.005-2025
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 823.366.756,00
LOCALIZACION DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GRL
PLAZO INICIAL	15 DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIO INICIAL	06 DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR ASIGNADO	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

4. RELACION DE POLIZAS

4.1. POLIZAS ACTA DE INICIO

Aseguradora Solidaria de Colombia	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	620 47 994000059577
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	620 74 994000014263
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*09/01/2026*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*003*

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	31/12/2025	30/04/2026	$ 82.336.676,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	31/12/2025	31/12/2028	$ 41.168.338,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	-	-	$ 82.336.676,00
CALIDAD DEL BIEN	31/12/2025	30/04/2026	$ 82.336.676,00
RCE	31/12/2025	31/01/2026	$ 350,000,000.00

5. PRESUPUETO DE OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPLEJO DEPORTIVO				
1.1	CAFETERIA Y BAÑOS				
1.1.1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	230.00	$ 16,091.95	$ 3,701,149.00
1.1.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	210.00	$ 19,335.70	$ 4,060,497.00
1.1.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1.00	$ 720,163.13	$ 720,163.00
1.1.4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	10.00	$ 147,001.93	$ 1,470,019.00
1.1.5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	188.00	$ 33,512.27	$ 6,300,307.00
Subtotal					$ 16.252.135,00
1.2	CANCHA TENIS				
1.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	183.64	$ 8,883.15	$ 1,631,302.00
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	177.30	$ 92,490.43	$ 16,398,553.00
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA	U	4.00	$ 913,237.36	$ 3,652,949.00
1.2.4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	221.63	$ 24,426.06	$ 5,413,548.00
1.2.5	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	M2	625.00	$ 10,323.35	$ 6,452,094.00
1.2.6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	800.00	$ 85,364.43	$ 68,291,544.00
Subtotal					$ 101.839.990,00
1.3	PLAZOLETAS INTERIORES				
1.3.1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	260.00	$ 16,091.95	$ 4,183,907.00

CONSORCIO OBRAS GRL

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.3.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	110.00	$ 19,335.70	$ 2,126,927.00
Subtotal					$ 6.310.834,00
1.4	CANCHA MICROFUTBOL				
1.4.1	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	200.00	$ 63,807.49	$ 12,761,498.00
Subtotal					$ 12.761.498,00
COSTO SUBTOTAL					$ 137.164.457,00
2	POLIDEPORTIVO BARRIO POLICARPA				
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	21.60	$ 4,745.45	$ 102,502.00
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3.24	$ 92,910.16	$ 301,029.00
2.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	M3	1.08	$ 873,625.42	$ 943,515.00
2.4	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	M3	6.00	$ 996,810.87	$ 5,980,865.00
2.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16.10	$ 50,466.36	$ 812,508.00
2.6	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	196.96	$ 8,883.15	$ 1,749,625.00
2.7	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	19.20	$ 19,335.70	$ 371,245.00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.8	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	112.96	$ 24,426.06	$ 2,759,168.00
2.9	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	84.00	$ 47,721.57	$ 4,008,612.00
2.10	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
2.11	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
2.12	REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 502,474.45	$ 4,019,796.00
2.13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	200.00	$ 18,314.49	$ 3,662,898.00
2.14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	8.00	$ 1,179,064.64	$ 9,432,517.00
Subtotal					$ 77.760.968,00
3	POLIDEPORTIVO LA LAGUNA				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10mm INC DEMARCACION	M2	2.00	$ 1,938,736.75	$ 3,877,474.00
3.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	83.76	$ 24,426.06	$ 2,045,927.00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Subtotal					$ 5.923.401,00
4	POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ				
4.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	395.64	$ 8,883.15	$ 3,514,529.00
4.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	75.60	$ 19,335.70	$ 1,461,779.00
4.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	320.64	$ 24,426.06	$ 7,831,972.00
4.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	78.00	$ 47,721.57	$ 3,722,282.00
4.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
4.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 921,501.56	$ 7,372,012.00
4.7	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	2.00	$ 1,179,064.64	$ 2,358,129.00
4.8	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16. LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	50.00	$ 238,164.39	$ 11,908,220.00
4.9	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	72.00	$ 36,256.30	$ 2,610,454.00
4.10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	$ 8,568.05	$ 154,225.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18.00	$ 136,910.89	$ 2,464,396.00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Subtotal					$ 45.160.011,00
5	POLIDEPORTIVO PRADO				
5.1	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	31.20	$ 19,335.70	$ 603,274.00
5.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	154.44	$ 24,426.06	$ 3,772,361.00
5.3	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	72.00	$ 47,721.57	$ 3,435,953.00
5.4	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
5.5	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 921,501.56	$ 7,372,012.00
5.6	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
5.7	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	M	2.00	$ 1,179,064.64	$ 2,358,129.00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	U	1.00	$ 913,237.36	$ 913,237.00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.9	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	M2	15.00	$ 5,161.68	$ 77,425.00
Subtotal					$ 62.149.079,00
6	POLIDEPORTIVO VILLA SUIZA				
6.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	158.64	$ 8,883.15	$ 1,409,223.00
6.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	48.80	$ 19,335.70	$ 943,582.00
6.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	$ 24,426.06	$ 3,230,102.00
6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	32.40	$ 47,721.57	$ 1,546,179.00
6.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
6.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 921,501.56	$ 7,372,012.00
6.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
6.8	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	144.00	$ 18,314.49	$ 2,637,287.00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.9	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	M	2.00	$ 1,179,064.64	$ 2,358,129.00
Subtotal					$ 63.113.202,00
7	POLIDEPORTIVO LA VICTORIA				
7.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40.00	$ 9,225.88	$ 369,035.00
7.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28.80	$ 20,124.82	$ 579,595.00
7.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	$ 25,276.84	$ 3,342,609.00
7.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40.00	$ 49,958.02	$ 1,998,321.00
7.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,821,409.20	$ 1,821,409.00
7.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 980,372.57	$ 7,842,981.00
7.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 22,395,922.36	$ 44,791,845.00
7.8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	4.00	$ 1,238,417.18	$ 4,953,669.00
7.9	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC.	M2	18.00	$ 8,627.17	$ 155,289.00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO				
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18.00	$ 141,151.46	$ 2,540,726.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	24.00	$ 173,985.13	$ 4,175,643.00
Subtotal					$ 72.571.122,00
8	POLIDEPORTIVO HUMAPO				
8.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40.00	$ 9,225.88	$ 369,035.00
8.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28.80	$ 20,124.82	$ 579,595.00
8.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	$ 25,276.84	$ 3,342,609.00
8.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40.00	$ 49,958.02	$ 1,998,321.00
8.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,821,409.20	$ 1,821,409.00
8.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	$ 980,372.57	$ 7,842,981.00
8.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS.	U	2.00	$ 22,395,922.36	$ 44,791,845.00

CONSORCIO OBRAS GRL

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
8.8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	8.00	$ 1,238,417.18	$ 9,907,337.00
8.9	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	$ 8,627.17	$ 155,289.00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18.00	$ 141,151.46	$ 2,540,726.00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EM MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	88.00	$ 173,985.13	$ 15,310,691.00
Subtotal					$ 88.659.838,00
9	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA				
9.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	18.20	$ 4,745.45	$ 86,367.00
9.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	7.28	$ 42,177.47	$ 307,052.00
9.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	7.28	$ 940,067.85	$ 6,843,694.00
9.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.28	$ 1,397,940.94	$ 3,187,305.00
9.5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.36	$ 1,881,081.80	$ 2,558,271.00
9.6	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.91	$ 2,522,150.56	$ 2,295,157.00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

9.7	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	3.80	$ 187,678.00	$ 713,176.00
9.8	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	313.50	$ 10,987.21	$ 3,444,490.00
9.9	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	246.09	$ 10,987.21	$ 2,703,843.00
9.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	19.88	$ 24,426.06	$ 485,590.00
9.11	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	176.00	$ 164,497.75	$ 28,951,604.00
9.13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00
Subtotal					$ 95.193.237,00
10	POLIDEPORTIVO EL C.I.C				
10.1	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO	U	1.00	$ 110,996.67	$ 110,997.00

	DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO				
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	2.00	$ 955,932.00	$ 1,911,864.00
10.3	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10x0.20x0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	4.82	$ 75,834.06	$ 365,520.00
10.4	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2.41	$ 50,466.36	$ 121,624.00
10.5	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	158.88	$ 16,091.95	$ 2,556,689.00
10.6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	449.04	$ 19,335.70	$ 8,682,503.00
10.7	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	303.28	$ 24,426.06	$ 7,407,935.00
10.8	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	M2	214.80	$ 164,497.75	$ 35,334,117.00
10.10	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	62.48	$ 8,883.15	$ 555,019.00
10.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1.00	$ 720,163.13	$ 720,163.00
10.12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	53.00	$ 147,001.93	$ 7,791,102.00
10.13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	10.96	$ 21,041.40	$ 230,614.00
10.14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00

	HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
10.15	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	$ 1,569,982.31	$ 3,139,965.00
Subtotal					$ 112.544.800,00
11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE				
11.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	80.00	$ 8,883.15	$ 710,652.00
11.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	39.60	$ 19,335.70	$ 765,694.00
11.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	101.76	$ 24,426.06	$ 2,485,596.00
11.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	108.00	$ 47,721.57	$ 5,153,930.00
11.5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	$ 1,762,012.99	$ 1,762,013.00
11.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10.00	$ 921,501.56	$ 9,215,016.00
11.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS.	U	2.00	$ 20,927,337.28	$ 41,854,675.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
11.8	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	1.00	$ 1,179,064.64	$ 1,179,065.00
Subtotal					$ 63.126.641,00
SUBTOTAL OBRAS					$ 823.366.756,00

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (23 DE ENERO DE 2026 al 23 DE ENERO DE 2026) Avance físico de contrato 0,00%, avance financiero ejecutado 0,00 %. Paro el periodo comprendido del presente informe el contrato de obra no se presentan porcentajes de avances.

JUSTIFICACIÓN

Durante el período comprendido entre el **23 de enero de 2026 y el 23 de enero de 2026**, el contrato de obra no presenta avances físicos ni financieros, toda vez que, pese a la suscripción del Acta de Inicio, no fue posible adelantar la ejecución efectiva de las actividades contractuales. Lo anterior obedece a que, debido al alcance del proyecto y la complejidad de las actividades a desarrollar, las cuales requieren una ejecución técnica y secuencial conforme a las especificaciones establecidas, considerando la consecución oportuna para la adquisición y suministro de materiales, la organización y habilitación de los frentes de trabajo y la correcta ejecución del objeto contractual.

Dicha situación fue informada oportunamente por el contratista de obra y socializada en el **Comité Técnico No. 01**, en el cual se expusieron las condiciones técnicas, logísticas y de planeación que impedían el inicio real de las actividades dentro del término inicial, concluyéndose que iniciar la ejecución sin contar con materiales y la adecuada planificación de actividades podría afectar la calidad de la obra y generar reprocesos técnicos. En atención a lo anterior, y con el fin de salvaguardar la correcta ejecución del objeto contractual, durante el período evaluado no se ejecutaron actividades de obra, razón por la cual no se registran porcentajes de avance físico ni financiero.

Así mismo, como resultado del análisis efectuado y con base en la programación de obra ajustada, el contratista de obra presentó formalmente la **solicitud de prórroga del plazo contractual** por un término de **tres (3) meses y dieciocho (18) días**, acompañada del respectivo cronograma elaborado en Microsoft Project, el cual fue revisado y avalado técnicamente por la Supervisión, como soporte para garantizar

una ejecución integral, ordenada y conforme a los alcances y obligaciones establecidos en el contrato.

6. CONTROL AFILIACION PARAFISCAL.

NOMBRE	CEDULA	SALUD	PENSION	ARL	CCF	VALOR TOTAL


7. CONCLUSIONES

- Durante el período evaluado no se registran avances físicos ni financieros del contrato de obra, en razón a que, debió a que las empresas por la época de fin de año no operan de manera regular, dificultando la adquisición de materiales y en cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, no fue posible adelantar la ejecución efectiva de las actividades dentro del término evaluado.
- La no ejecución de actividades durante el período permitió preservar las condiciones técnicas, administrativas y financieras del proyecto, evitando la realización de trabajos sin contar con la disponibilidad de materiales y las condiciones operativas necesarias para una correcta ejecución del objeto contractual.
- El **Comité Técnico No. 01**, realizado el **23 de enero de 2026**, permitió formalizar la presentación de la **solicitud de prórroga No. 01** del contrato de obra por un término de **tres (3) meses y dieciocho (18) días**, debidamente soportada mediante la programación de obra ajustada y revisada técnicamente por la Supervisión.
- Se concluye que la solicitud de prórroga resulta técnica, administrativa y contractualmente viable, y constituye una medida necesaria y proporcional para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la correcta ejecución del proyecto, conforme a los estándares de calidad, plazo y alcance definidos en el contrato.

Atentamente

ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS GRL


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**COMPLEJO DEPORTIVO**	**24.75 días**	**vie 23/01/26**	**sáb 21/02/26**
2	**CAFETERIA Y BAÑOS**	**7 días**	**vie 23/01/26**	**sáb 31/01/26**
3	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	3 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26
4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	3 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26
5	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26
6	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	2 días	mar 27/01/26	jue 29/01/26
7	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	3 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26
8	**CANCHA TENIS**	**16 días**	**jue 29/01/26**	**mié 18/02/26**
9	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	2 días	mar 3/02/26	jue 5/02/26

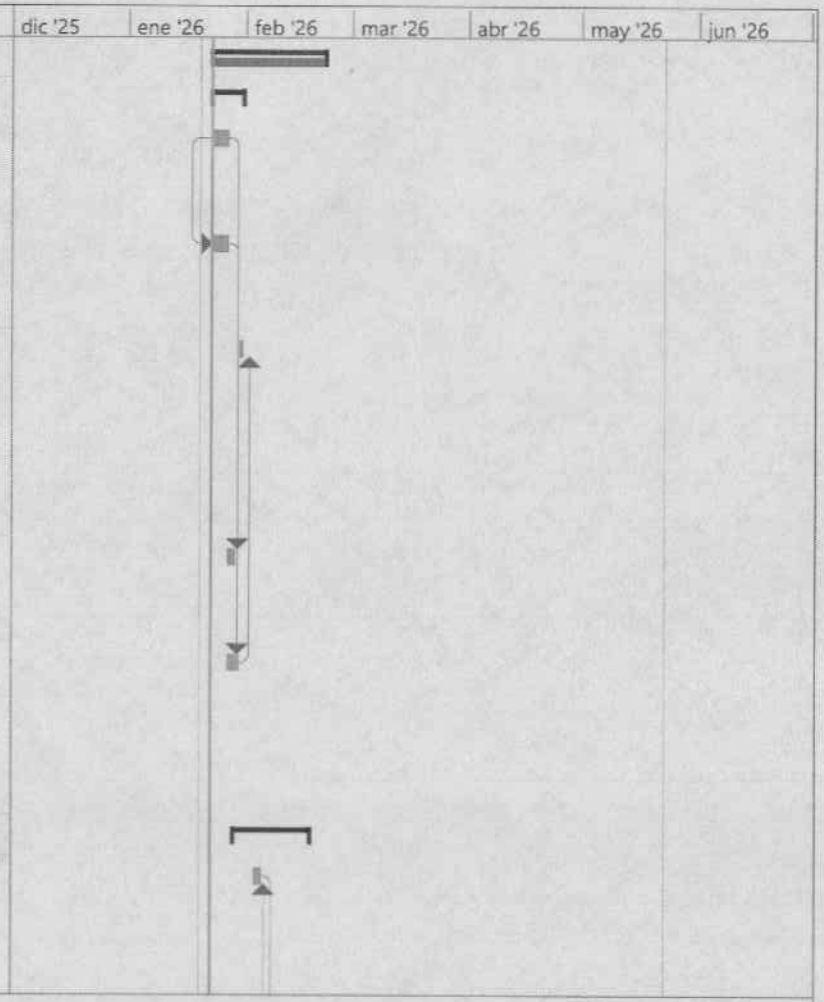

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
10	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26
12	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	4 días	mié 11/02/26	mar 17/02/26
13	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	4 días	jue 29/01/26	mar 3/02/26
14	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26
15	**SALON ADMINISTRATIVO**	**3 días**	**jue 5/02/26**	**lun 9/02/26**

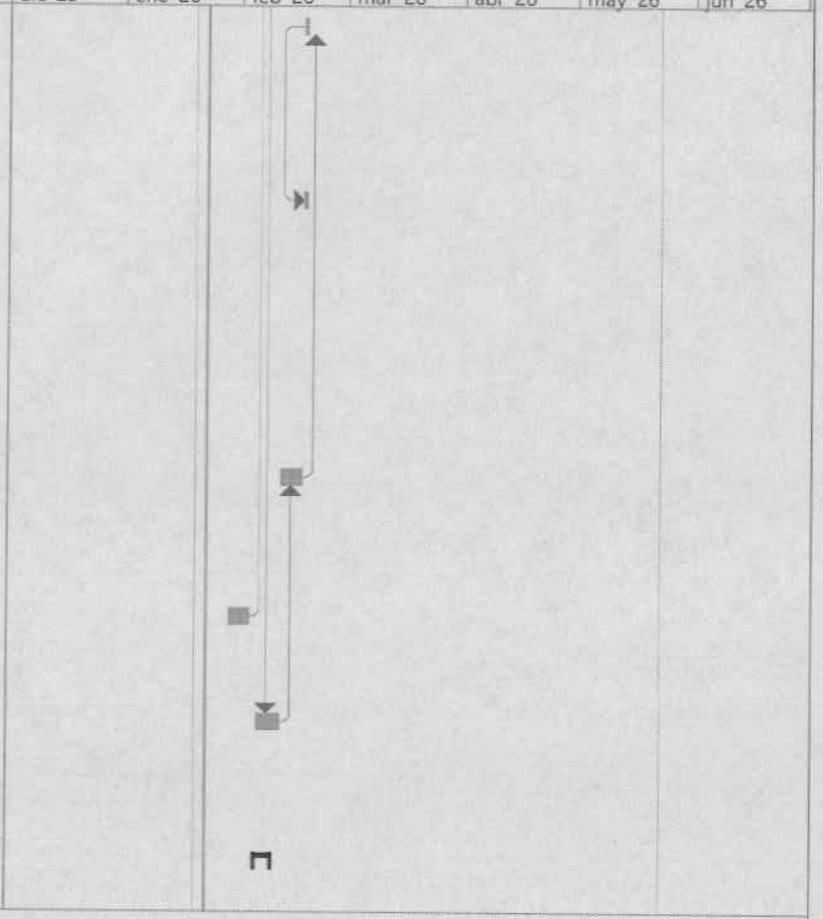

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
16	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	3 días	jue 5/02/26	lun 9/02/26
17	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	3 días	jue 5/02/26	lun 9/02/26
18	**CANCHA MICROFUTBOL**	**3.25 días**	**jue 19/02/26**	**sáb 21/02/26**
19	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	3.25 días	jue 19/02/26	sáb 21/02/26
20	**POLIDEPORTIVO BARRIO POLICARPA**	**17.88 días**	**lun 23/02/26**	**lun 16/03/26**

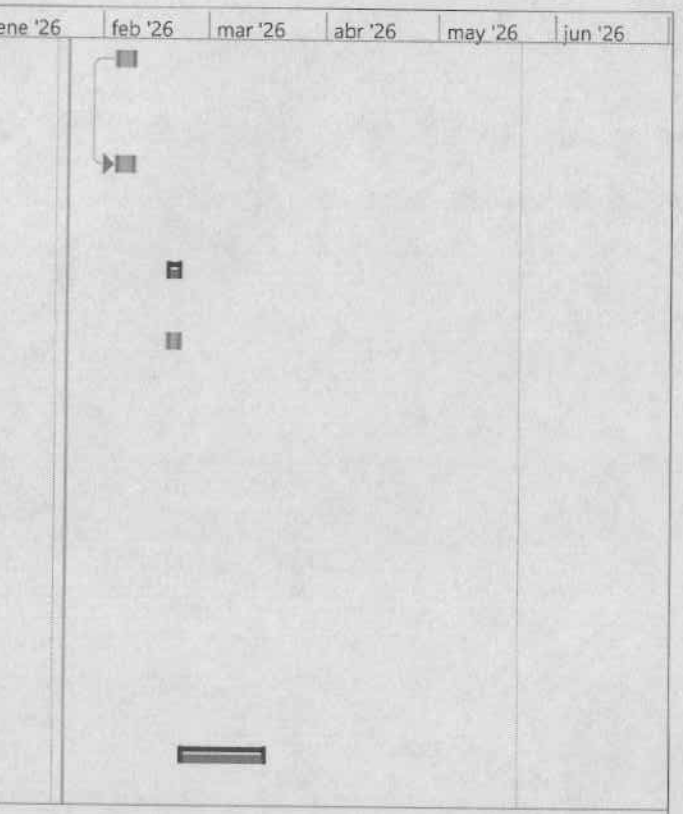

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
21	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26
22	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	3 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26
23	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	3 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26
24	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	4 días	vie 27/02/26	mié 4/03/26
25	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	jue 5/03/26	vie 6/03/26

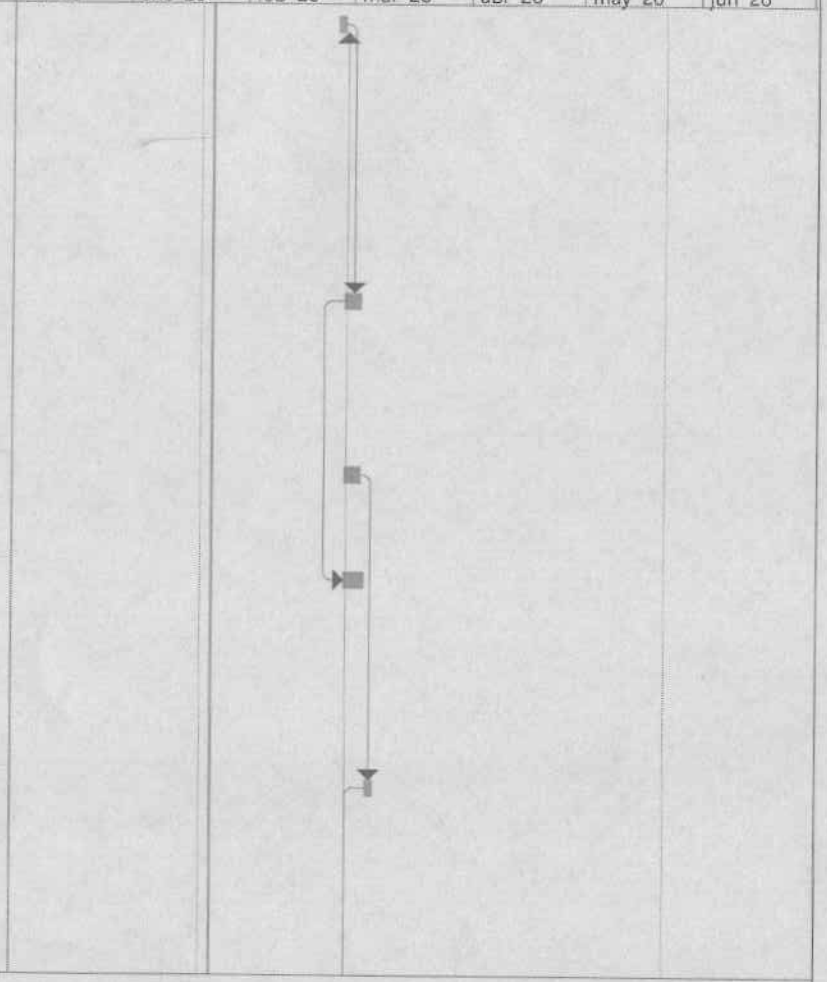

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
26	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	1 día	sáb 7/03/26	lun 9/03/26
27	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	3 días	mié 11/03/26	vie 13/03/26
28	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	4 días	mié 11/03/26	lun 16/03/26
29	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	1 día	jue 5/03/26	jue 5/03/26
30	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	2 días	mar 3/03/26	mié 4/03/26

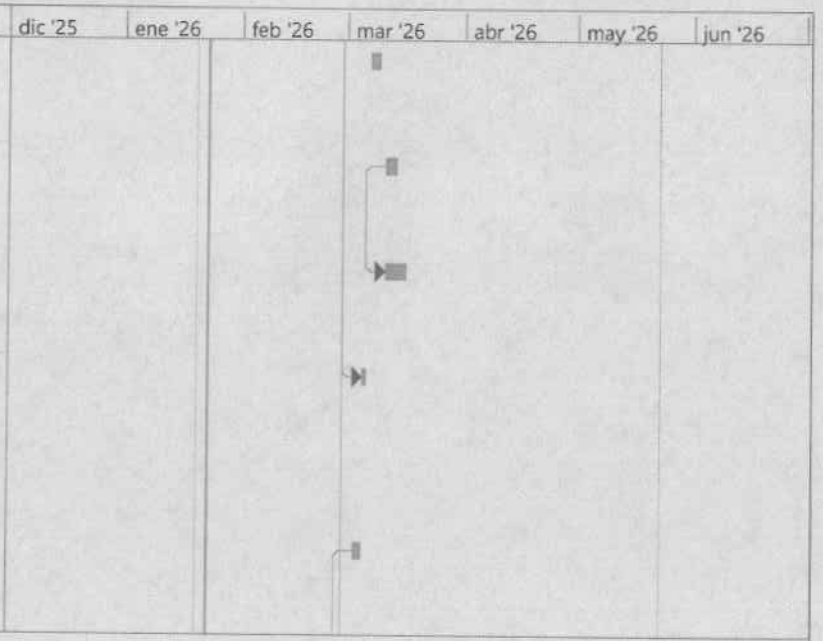

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
31	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTR	2 días	sáb 7/03/26	mar 10/03/26
32	REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26
33	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	2 días	sáb 7/03/26	mar 10/03/26
34	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	3 días	mar 3/03/26	jue 5/03/26

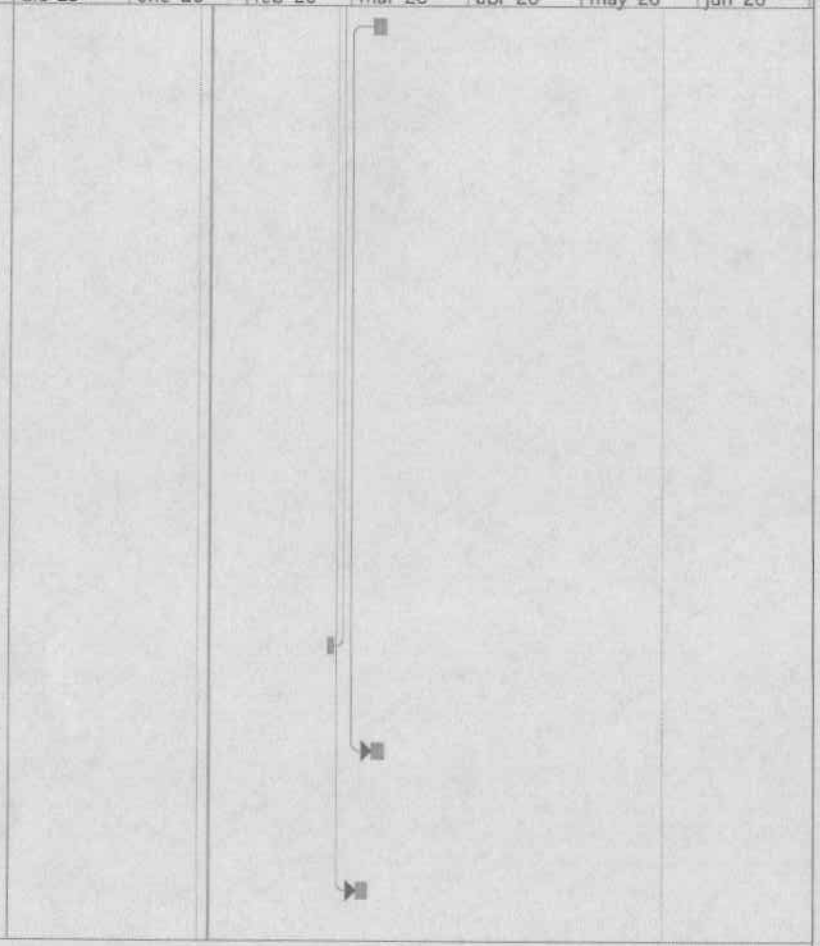

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
35	**POLIDEPORTIVO LA LAGUNA**	**4.25 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 21/03/26**
36	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10mm INC DEMARCACION	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26
37	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	3 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26
38	**POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ**	**27.13 días**	**vie 20/03/26**	**mié 22/04/26**
39	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26
40	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	3 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26
41	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	4 días	vie 17/04/26	mié 22/04/26
42	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	1 día	vie 17/04/26	vie 17/04/26

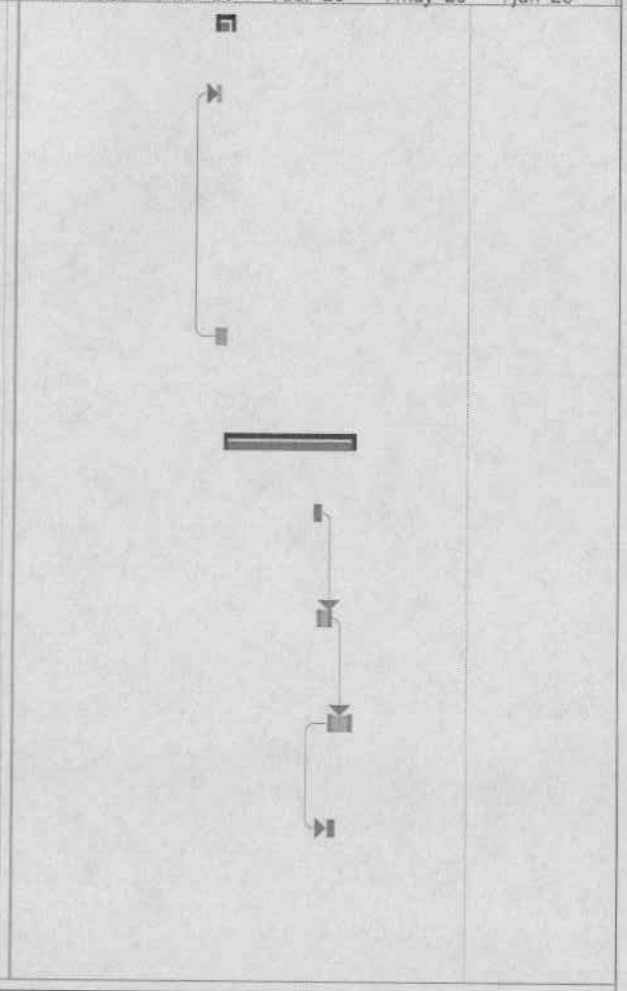

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
43	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	2 días	mié 15/04/26	jue 16/04/26
44	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3.63 días	mié 8/04/26	sáb 11/04/26
45	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	3 días	vie 3/04/26	mar 7/04/26
46	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16. LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	3 días	mar 31/03/26	jue 2/04/26
47	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4 PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	jue 26/03/26	lun 30/03/26
48	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	2 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26

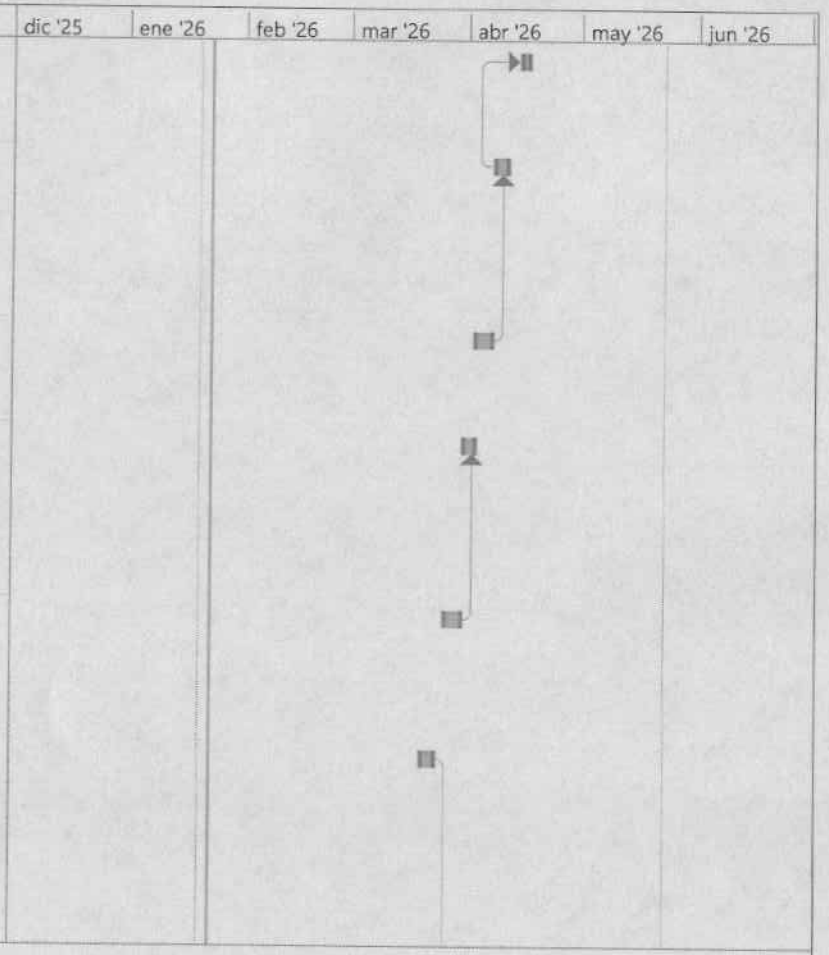

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26
50	**POLIDEPORTIVO PRADO**	**24.5 días**	**jue 23/04/26**	**vie 22/05/26**
51	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	4 días	sáb 9/05/26	jue 14/05/26
52	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	5.63 días	sáb 16/05/26	vie 22/05/26
53	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26
54	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26
55	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26

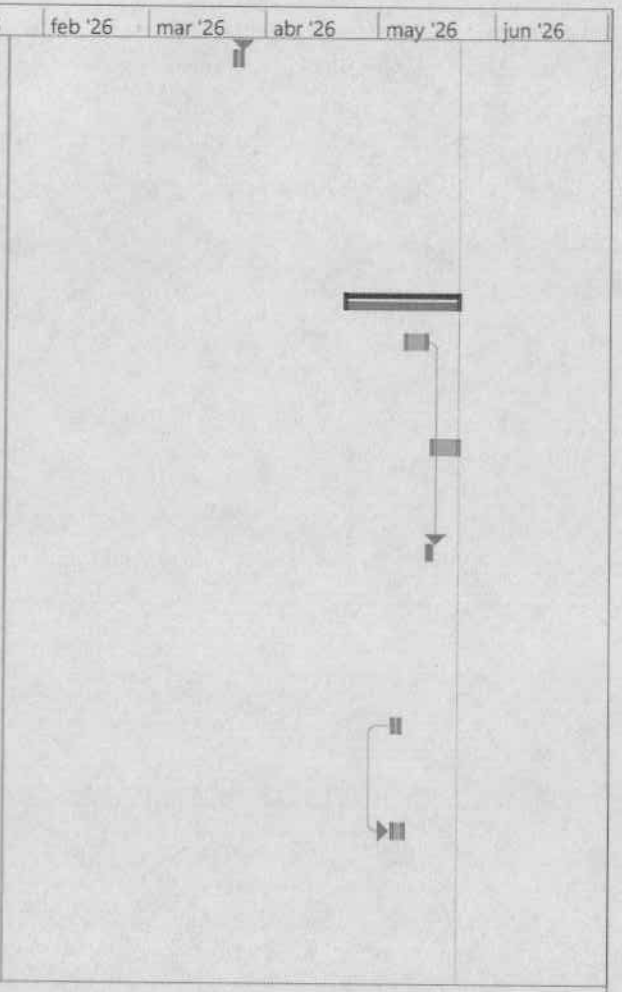

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
56	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2 y 3. PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO	2 días	sáb 2/05/26	mar 5/05/26
57	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	3 días	sáb 25/04/26	mié 29/04/26
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	2 días	jue 30/04/26	vie 1/05/26

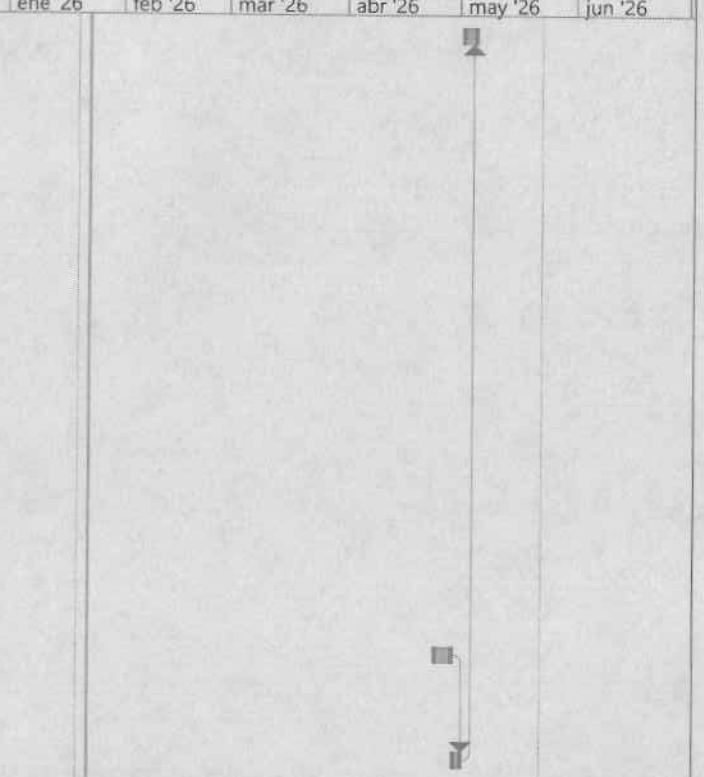

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
59	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	2 días	jue 23/04/26	vie 24/04/26
60	**POLIDEPORTIVO VILLA SUIZA**	**15.88 días**	**jue 5/03/26**	**mar 24/03/26**
61	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	1 día	jue 5/03/26	jue 5/03/26
62	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	2 días	mar 17/03/26	mié 18/03/26
63	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	4 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26
64	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26
65	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 día	sáb 14/03/26	lun 16/03/26
66	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	sáb 14/03/26	mar 17/03/26

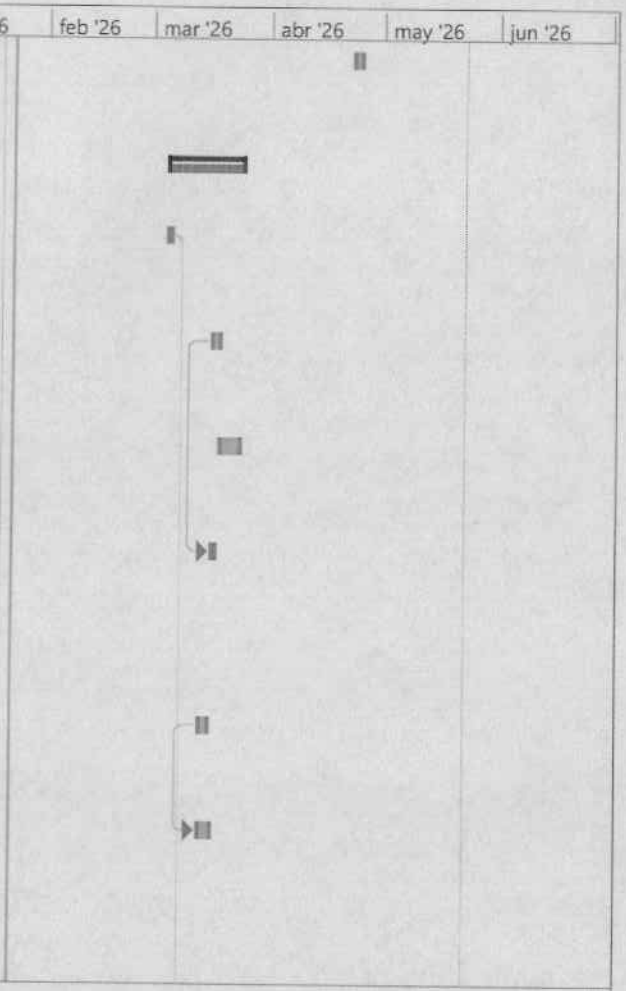

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
67	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2 y 3. PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO	2 días	sáb 7/03/26	mar 10/03/26
68	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2 (L). TAPAS, <, PL	3 días	mar 10/03/26	vie 13/03/26
69	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	1 día	vie 6/03/26	vie 6/03/26
70	**POLIDEPORTIVO LA VICTORIA**	**22.13 días**	**lun 16/02/26**	**vie 13/03/26**

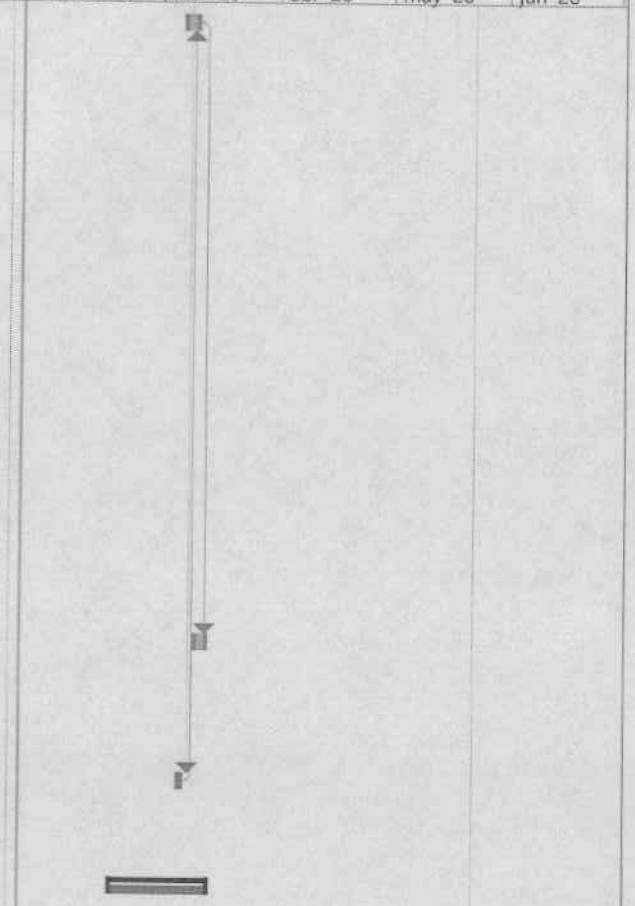

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
71	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26
72	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	2 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26
73	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	4 días	vie 6/03/26	mié 11/03/26
74	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	1 día	jue 5/03/26	jue 5/03/26
75	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26
76	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26

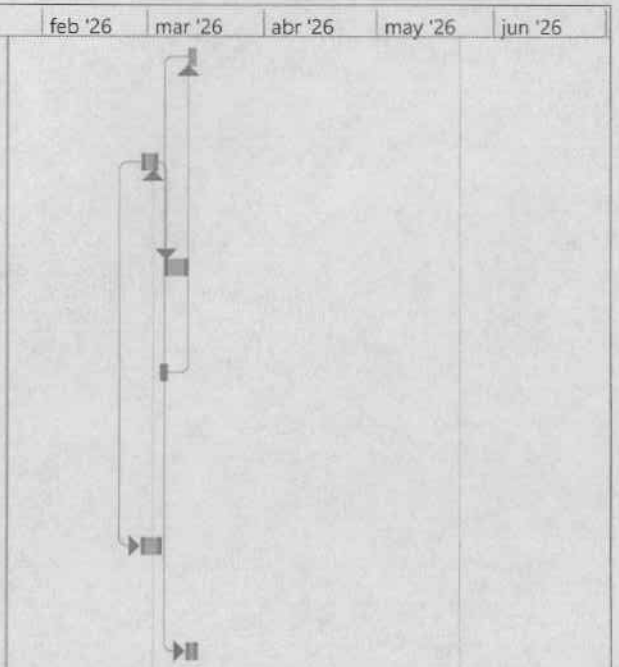

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
77	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2 y 3. PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO	2 días	jue 26/02/26	vie 27/02/26
78	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	3 días	sáb 21/02/26	mié 25/02/26
79	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26

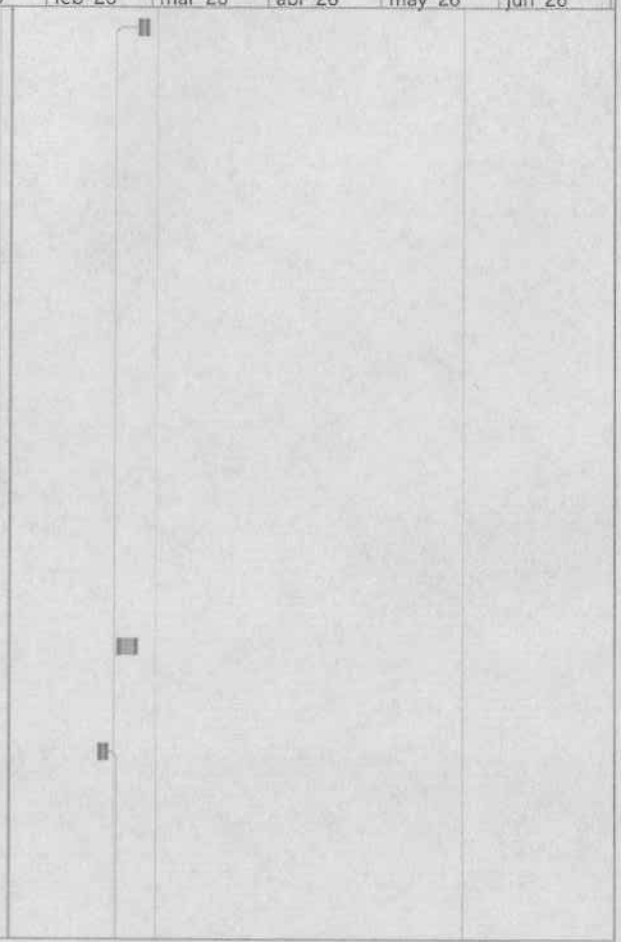

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	3 días	mié 18/02/26	vie 20/02/26
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	2 días	jue 26/02/26	vie 27/02/26
82	**POLIDEPORTIVO HUMAPO**	**19.25 días**	**vie 23/01/26**	**lun 16/02/26**
83	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	2 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26
84	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26
85	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	4 días	vie 6/02/26	mié 11/02/26
86	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26

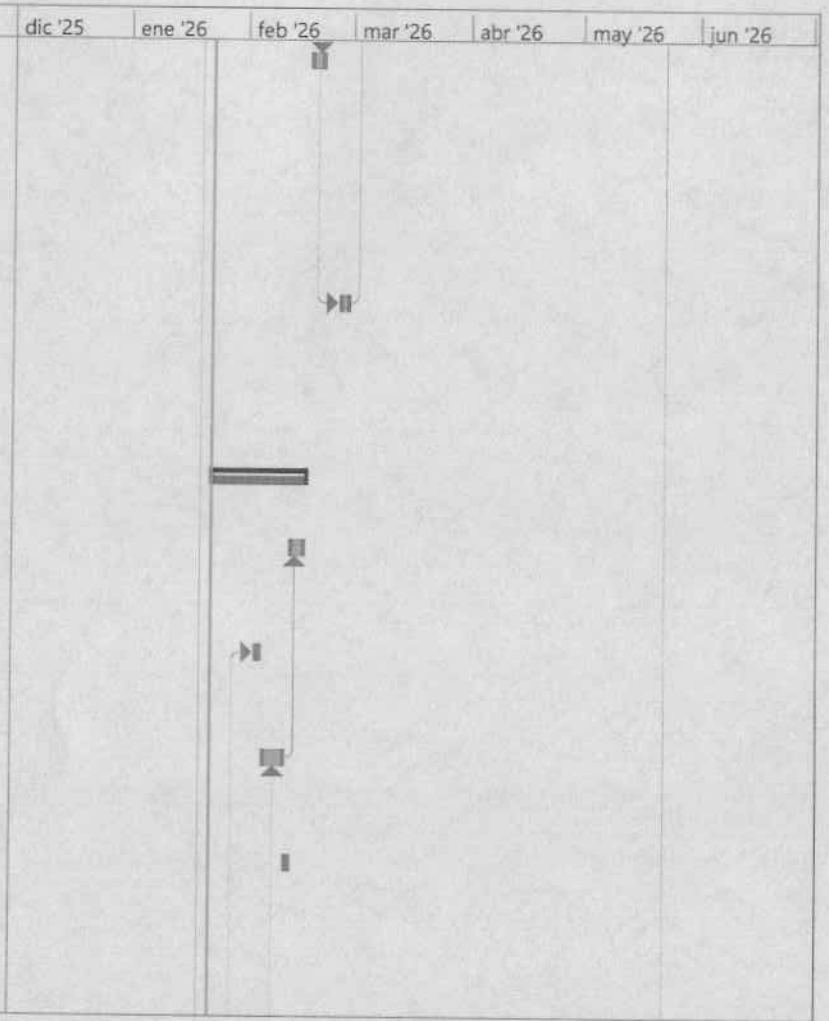

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
87	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	2 días	mié 4/02/26	jue 5/02/26
88	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	vie 6/02/26	mar 10/02/26
89	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2 y 3. PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO	2 días	mié 28/01/26	jue 29/01/26

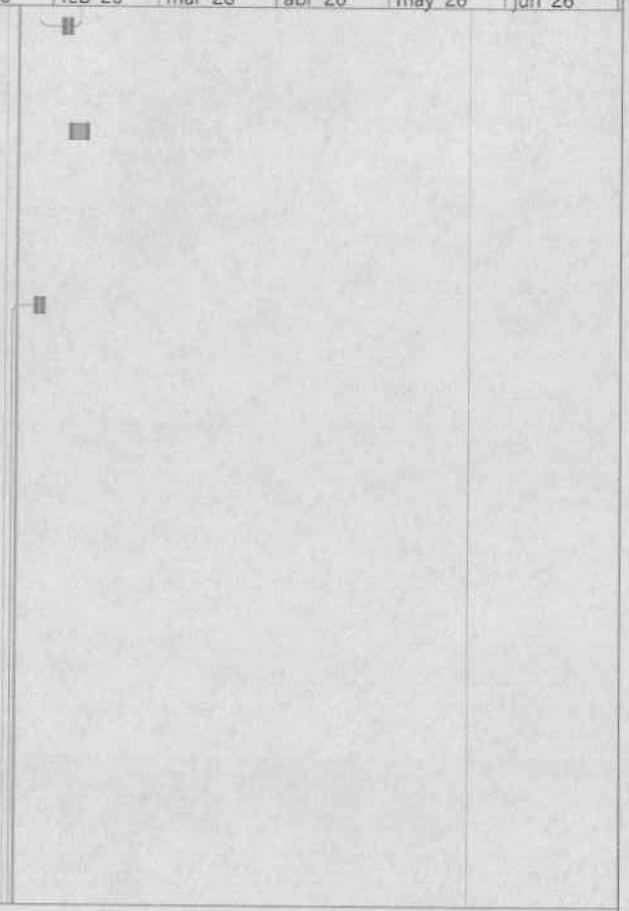

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
90	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	3 días	vie 30/01/26	mar 3/02/26
91	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	2 días	vie 23/01/26	lun 26/01/26
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	3 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EM MALLA PROTECCION CANCHAS	2 días	mié 28/01/26	jue 29/01/26
94	**POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA**	**29.13 días**	**vie 13/03/26**	**vie 17/04/26**

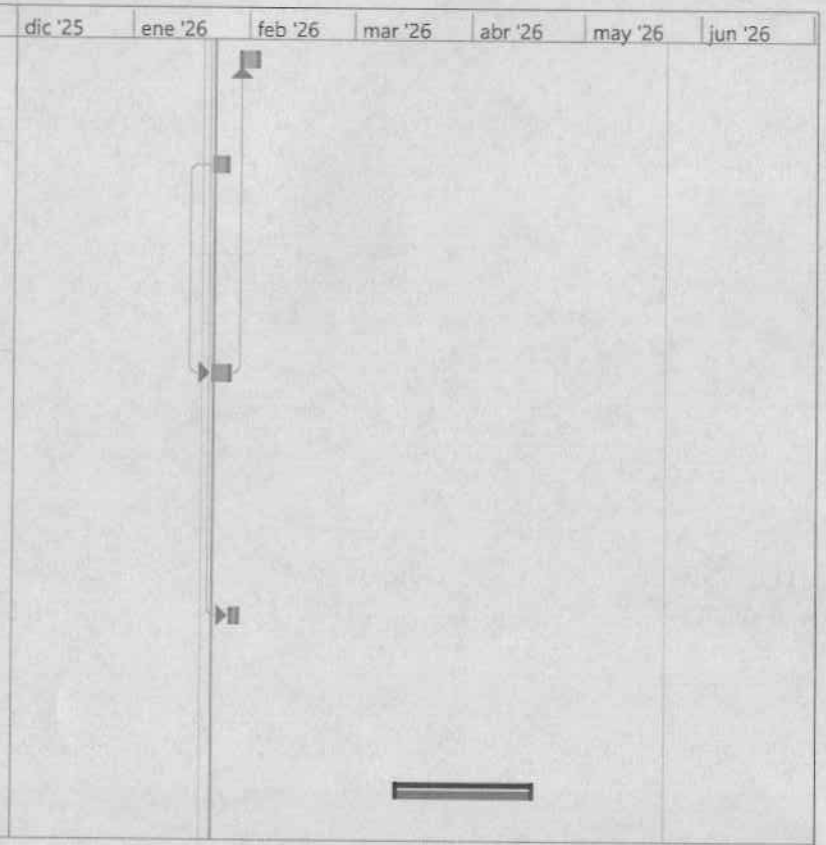

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
95	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	3 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26
96	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	3 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26
97	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	4 días	mar 7/04/26	vie 10/04/26
98	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3 días	jue 2/04/26	lun 6/04/26
99	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3 días	jue 2/04/26	lun 6/04/26

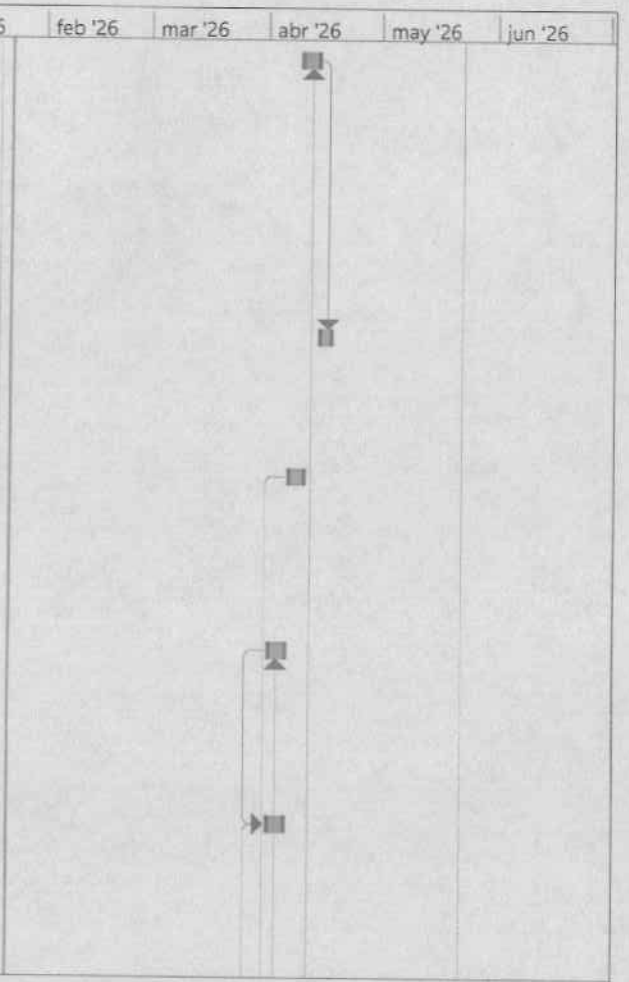

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
100	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3 días	jue 2/04/26	lun 6/04/26
101	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	3 días	mar 7/04/26	jue 9/04/26
102	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	3 días	sáb 28/03/26	mié 1/04/26
103	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	3 días	vie 13/03/26	mar 17/03/26

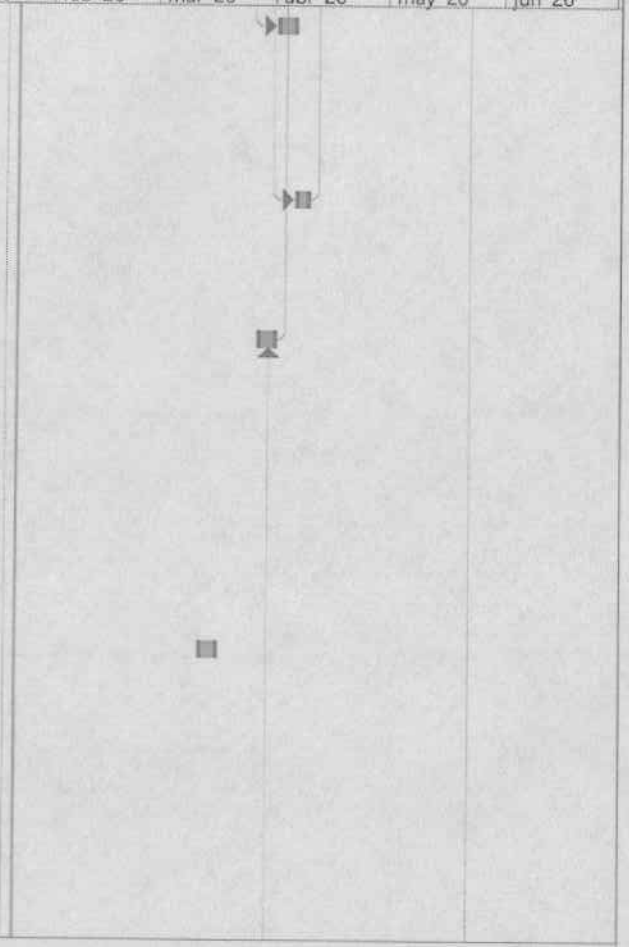

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
104	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	4 días	vie 20/03/26	mié 25/03/26
105	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	2 días	jue 26/03/26	vie 27/03/26
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	2 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26

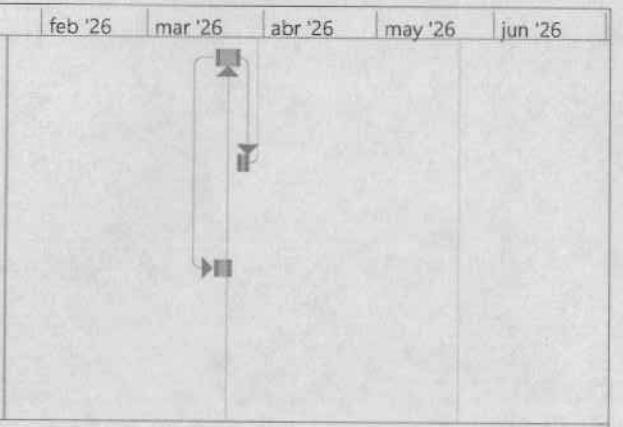

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
107	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2 y 3. PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26
108	**POLIDEPORTIVO EL C.I.C**	**16.88 días**	**sáb 18/04/26**	**vie 8/05/26**
109	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	1 día	sáb 18/04/26	lun 20/04/26



Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	1 día	mar 21/04/26	mar 21/04/26
111	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10x0.20x0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	2 días	mié 29/04/26	jue 30/04/26
112	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26
113	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	2 días	mié 22/04/26	jue 23/04/26
114	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	2 días	mié 22/04/26	jue 23/04/26
115	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	4 días	vie 24/04/26	mié 29/04/26
116	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26

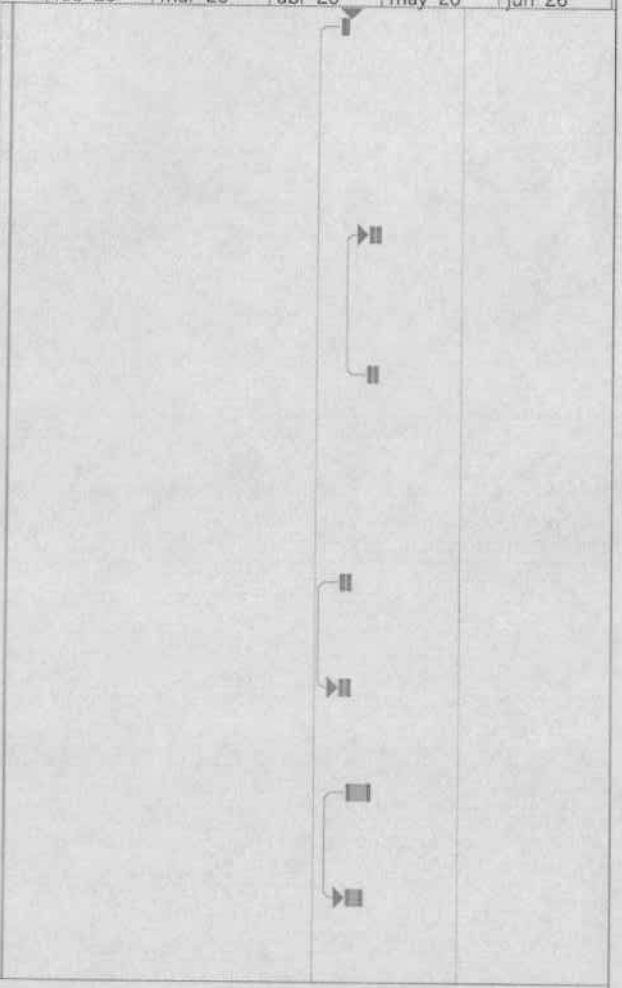

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	2 días	mié 8/04/26	jue 9/04/26
118	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	1 día	mar 21/04/26	mar 21/04/26
119	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	1 día	mié 8/04/26	mié 8/04/26
120	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	3 días	mar 5/05/26	jue 7/05/26
121	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	1 día	vie 1/05/26	vie 1/05/26

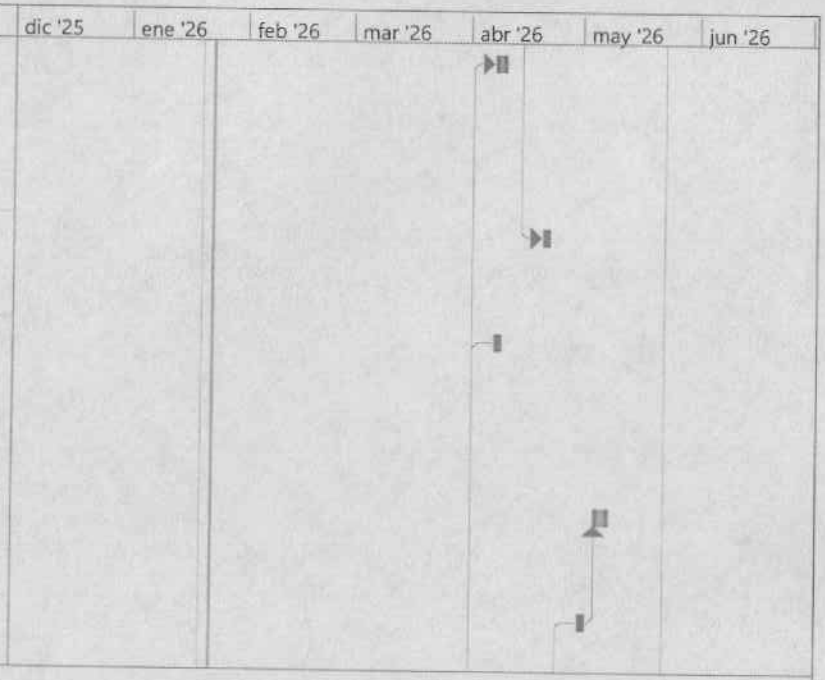

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
122	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2 y 3. PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO	2 días	vie 1/05/26	lun 4/05/26

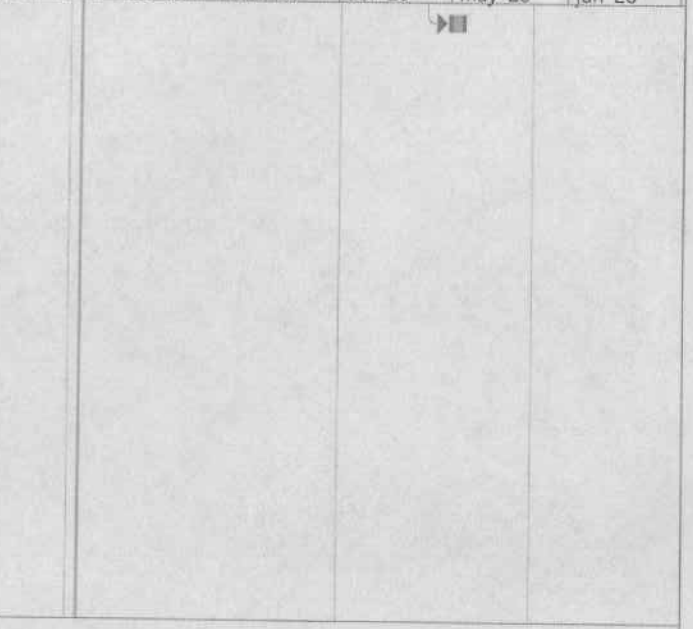

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
123	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1, FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mié 8/04/26	mié 8/04/26
124	**POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE**	**11.25 días**	**sáb 9/05/26**	**vie 22/05/26**
125	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	1 día	sáb 9/05/26	lun 11/05/26
126	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	2 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26
127	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	4 días	lun 11/05/26	jue 14/05/26
128	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26

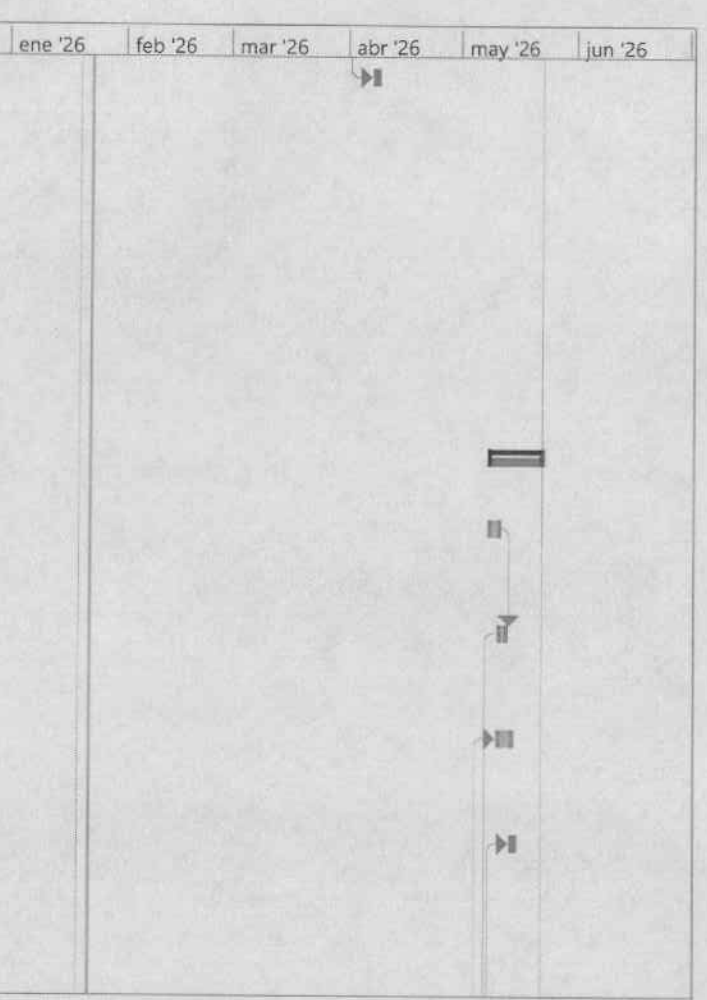

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
129	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
130	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26
131	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2 y 3. PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO	4 días	mar 19/05/26	vie 22/05/26
132	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	2 días	vie 15/05/26	lun 18/05/26

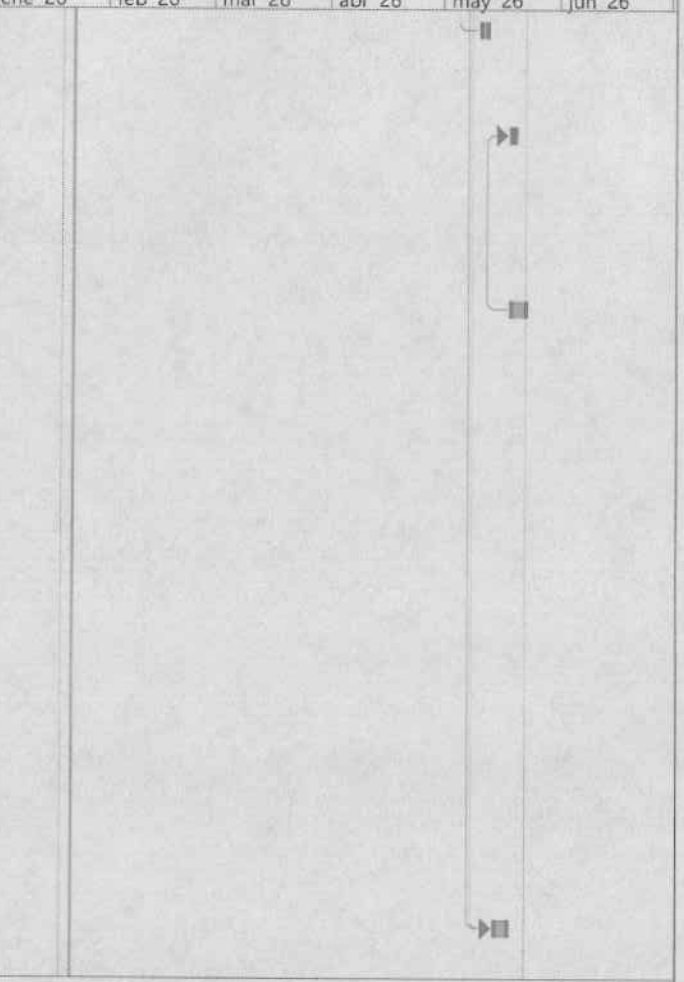

Proyecto: CRONOGRAMA PUER
Fecha: vie 23/01/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		
