EL SUSCRITO SUPERVISOR
DEL CONTRATO DE OBRA
C-019 DEL 10 DE JULIO DE 2025

CERTIFICA:

Que el suscrito **CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA** identificado con el **NIT 901961696-7**, prestó a satisfacción el servicio como interventor del contrato, según los compromisos y responsabilidades contemplados en el contrato No. C-020-2025 suscrito con La Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto es: **"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER".** Se debe cancelar teniendo en cuenta los siguientes rubros presupuestales. Así:

VALOR TOTAL UNIDAD 04…….....…… $980.004.799

CONTRATO DE OBRA C-19-2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.467.318.989,00
VALOR ADICIONAL	$0
VALOR PRESENTE ACTA No4	$ 980.004.799,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No4	$ 980.004.799,00

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los nueve (09) días del mes de febrero de 2026.

HELBERS MARTINEZ SANCHEZ
INGENIERO UNIVERSITARIO GRADO 9
Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta
Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN
Contrato de obra No. C-019 de 2025
Contrato de Interventoría No. C-020 de 2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Obra

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No. :	C-019 del 10 de julio de 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Licitación Pública
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	LP-001 DE 2025
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN:	Ocaña, Norte de Santander
VALOR:	$ 7.467.318.989
PLAZO:	Hasta 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
SUSPENSIÓN:	30 de diciembre de 2025
REINICIACIÓN:	13 de enero de 2026
TERMINACIÓN:	23 de julio de 2026
CONTRATISTA:	Consorcio Adecuaciones Cúcuta OBRICON SAS 40% - TAYFER DE COLOMBIA SAS 50% - PRIMUTAF SAS 10 %
CONSULTOR INTERVENTORÍA:	Julio Andrés Castro González

Interventoría

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No. :	C-020 del 11 de julio de 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Concurso de Méritos
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	CM-001 DE 2025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO · "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"
LOCALIZACIÓN:	Ocaña, Norte de Santander
VALOR:	$ 397.727.100
PLAZO:	Hasta 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
SUSPENSIÓN:	30 de diciembre de 2025
REINICIACIÓN:	13 de enero de 2026
TERMINACIÓN:	23 de julio de 2026
CONTRATISTA:	Julio Andrés Castro González
SUPERVISOR:	Helbers Martinez Sanchez

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la RESOLUCIÓN 6531del 30 de mayo de 2025 del contrato de obra No. C-019 DE 2025 y la Resolución 6424 de 03 de junio de 2025 del contrato de interventoría N°C-020 2025 de interventoría por medio del cual del cual “, me permito informar el desarrollo de la ejecución, correspondiente a la ejecución del contrato durante el periodo comprendido entre el 13 de enero al 31 de enero, en los siguientes aspectos:

- El día veintiocho (25) de julio de 2025, se suscribió el Acta de Inicio al contrato N°C-18-2025 y contrato N°C-20-2025 consultoría e interventoría respectivamente, con fecha de terminación inicial el 31 de diciembre de 2025.

- El día 29 de diciembre de 2025 al contrato de interventoría No C-020-2025 se realizó adición 01 por un valor de **TRECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTITRES PESOS M/CTE ($333.864.033)** y prórroga hasta 6.32 meses hasta el 9 de julio 2026.

- El día 30 de diciembre de 2025 mediante acta N°2-061 de 2025, se suspende el contrato de obra N° C-019-2025 y el contrato de interventoría N° C-053-2025, por motivos debido a circunstancias que afectan directamente la continuidad técnica y administrativa del proyecto. Durante la temporada de fin de año se presenta una inactividad parcial y, en algunos casos, total por parte de las empresas proveedoras de materiales, equipos y accesorios especializados, los cuales son indispensables para el desarrollo normal de las actividades constructivas programadas.

- El Contratista de interventoría externa presentó un informe acompañado de un registro fotográfico que evidencia el servicio ejecutado durante el periodo correspondiente a este informe.

2.1. ALCANCE DEL PROYECTO:

En el marco del cumplimiento del deber funcional de esta Dirección Seccional de Administración Judicial, se adelantan las actividades necesarias para conservar y mantener en óptimo estado los inmuebles propios de la Rama Judicial, garantizando que la infraestructura cumpla plenamente con las disposiciones legales y constitucionales vigentes.

El alcance del presente proyecto comprende la ejecución de las intervenciones requeridas para asegurar que las instalaciones brinden condiciones seguras, adecuadas y funcionales para el desarrollo de las actividades de los funcionarios, empleados y usuarios de la administración de justicia.

Durante la ejecución de la obra se desarrollan acciones orientadas a corregir, mejorar y preservar los elementos constructivos, técnicos y operativos del inmueble, de manera que las labores propias de la operación judicial se lleven a cabo en un entorno que cumpla con los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad definidos para tal fin

Se han designado las siguientes actividades de acuerdo con el presupuesto contractual inicial del contrato:

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
30-12-2026	190 DÍAS	39.48%	Durante el periodo evaluado se evidenció avance en la ejecución de actividades en obra, destacándose el inicio de los trabajos de reforzamiento de columnas y armado de acero de refuerzo de muros de pantalla en la zona posterior del edificio, así como la finalización de las actividades de instalación de la cubierta, y la continuidad de labores en mampostería e instalaciones.

2.2. REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO DEL SUPERVISOR											
¿El contrato se está ejecutando normalmente?				**¿El contrato presenta retraso?**				**¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**			
SI	☐	NO	■	SI	■	NO	☐	SI	■	NO	☐

3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

OBRA

CONTRATO C-019 DE 2025	
REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$7.467.318.989**
VALOR ADICIONAL	$0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$0
VALOR PAGOS REALIZADOS	$1.962.620.590
SALDO POR PAGAR	$5.504.698.399

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTO DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.467.318.989). La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará en Pagos Parciales el valor total del contrato según el avance de ejecución.

INTERVENTORIA

CONTRATO C-020 DE 2025	
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO · "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 397.727.100**
VALOR ADICIONAL	$333.864.033
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$731.591.133
VALOR PAGOS REALIZADOS	$88.281.649
SALDO POR PAGAR	$643.309.484

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($731.591.133). La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará en Pagos Parciales el valor total del contrato según el avance de ejecución.

3.1. PAGOS REALIZADOS

OBRA

PAGOS REALIZADOS CONTRATO C-019-2025		
No. O.P.	**Fecha**	**Valor bruto**
292651525	22/08/2025	$ 2.240.195.696,00
400852425	21/10/2025	$ 344.488.546,00
459486525	24/11/2025	$ 655.312.187,00

INTERVENTORIA

PAGOS REALIZADOS CONTRATO C-020-2025		
No. O.P.	**Fecha**	**Valor bruto**
521690725	19/12/2025	$ 88.281.648

4. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
25/07/2025	HASTA EL 31/12/2025	0	2 MESES Y 3 DÍAS	31/12/2025

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
25/07/2025	HASTA EL 31/12/2025	1	6MESES Y 32 DIAS	9/07/2026

4.2. ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZAS

OBRA

PÓLIZA DE SEGURO CONTRATO DE OBRA

Mediante póliza de cumplimiento N° 62-44-101021629, actualizada con expedición 15 de julio por la compañía aseguradora solidaria de Colombia, se ampara lo establecido en el contrato principal N°C-019-2025

Póliza de Cumplimiento	62-44-101021629		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	62-40-101012361		
Expedida por:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
Fecha de expedición	JULIO 15 DE 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	15/07/2025	30/06/2026	$1.493.463.797,80

Buen manejo y Correcta inversión del anticipo	15/07/2025	30/06/2026	$2.240.195.696,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15/07/2025	31/12/2028	$746.731.898,90
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	31/12/2025	31/12/2030	$1.493.463.797,80
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	31/12/2025	31/12/2026	$1.493.463.797,80
Responsabilidad Civil	15/07/2025	31/12/2025	$711.750.000,00

Póliza de Seguro Todo Riesgo	62-18-101000020		
Expedida por:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
Fecha de expedición	JULIO 23 DE 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Básicos	16/07/2025	31/12/2025	$ 7,547,279,148.00
B-Terremoto, temblor, erupción volcánica huelga, asonada, commocion civil popular	16/07/2025	31/12/2025	$ 7,547,279,148.00
C - Huracán, tifon, tornado y ciclon	16/07/2025	31/12/2025	$ 7,547,279,148.00
Hurto calificado	16/07/2025	31/12/2025	$ 50,000,000.00

INTERVENTORIA

PÓLIZA DE SEGURO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mediante póliza de cumplimiento N° 310-47-994000016883, actualizada con expedición 16 de julio por la compañía aseguradora solidaria de Colombia, se ampara lo establecido en el contrato principal N°C-020-2025

Póliza de Cumplimiento	310-47-994000016883		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	310-74-994000005965		
Expedida por:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
Fecha de expedición	JULIO 16 DE 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento	11/07/2025	30/06/2026	$79,545,420.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	11/07/2025	31/12/2028	$39,772,710.00
Calidad del servicio	31/12/2025	31/12/2030	$79,545,420.00
Responsabilidad Civil	15/07/2025	31/12/2025	$711.750.000,00

4.3. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

Luego del análisis técnico, administrativo y financiero correspondiente, se concluye que no se presentan riesgos significativos durante el periodo de ejecución que puedan afectar la correcta ejecución del contrato ni el desarrollo del proyecto.

Durante el periodo del informe de seguimiento no se presentaron accidentes laborales, informados por el contratista de obra. No se presentaron reclamaciones laborales o de pagos informados por el contratista de obra

SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD

FORMULA O MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE CÁLCULO	FRECUENCIA
(N° de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes+n°de días cargados en el mes/N° de trabajadores en el mes)*100	PORCENTAJE (%)	MENSUAL


Severidad de accidentalidad					
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	Severidad de accidentalidad	FÓRMULA PARA EL CÁLCULO	(N° de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + n° de días cargados en el mes/N° de trabajadores en el mes)*100		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron "X" días por accidente de trabajo.		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Mensual	UNIDAD DEL INDICADOR	Porcentaje		
FUENTE DE INFORMACIÓN	Reportes del FURAT ARL	RESPONSABLE(S)	Profesional SST		
RESULTADOS PARA EL AÑO 2025					
Mes	Número de trabajadores	Días cargados	Días de incapacidad	Resultado	Interpretación
Agosto	19	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Septiembre	24	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Octubre	26	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Noviembre	31	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Diciembre	36	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo



FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

FORMULA O MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE CÁLCULO	FRECUENCIA
(N° de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/N° de trabajadores en el mes)*100	PORCENTAJE (%)	MENSUAL

Frecuencia de accidentalidad					
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	Frecuencia de accidentalidad	FÓRMULA PARA EL CÁLCULO	(N° de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/N° de trabajadores en el mes)*100		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada cien (100) trabajadores que laboran en el mes se presentaron "X" accidentes de trabajo.		
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Mensual	UNIDAD DEL INDICADOR	Porcentaje		
FUENTE DE INFORMACIÓN	Reportes del FURAT ARL	RESPONSABLE(S)	Profesional SST		
RESULTADOS PARA EL AÑO 2025					
Mes	Número de trabajadores	Accidentes de trabajo	Días de incapacidad	Resultado	Interpretación
Agosto	19	0	0	0,00	Por cada 100 trabajadores que laboraron en Agosto, se presentaron 0 accidentes de trabajo
Septiembre	24	0	0	0,00	Por cada 100 trabajadores que laboraron en septiembre, se presentaron 0 accidentes de trabajo
Octubre	26	0	0	0,00	Por cada 100 trabajadores que laboraron en octubre, se presentaron 0 accidentes de trabajo
Noviembre	31	0	0	0,00	Por cada 100 trabajadores que laboraron en noviembre, se presentaron 0 accidentes de trabajo
Diciembre	36	0	0	0,00	Por cada 100 trabajadores que laboraron en diciembre, se presentaron 0 accidentes de trabajo



AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

FORMULA O MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE CÁLCULO	FRECUENCIA
(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/Número de días de trabajo programados en el mes)*100	PORCENTAJE (%)	MENSUAL


Ausentismo por Causa Médica

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	Ausentismo por Causa Médica	FÓRMULA PARA EL CÁLCULO	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/Número de días de trabajo programados en el mes)*100
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica.
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	Mensual	UNIDAD DEL INDICADOR	Porcentaje
FUENTE DE INFORMACIÓN	Reportes de Ausentismo ARL	RESPONSABLE(S)	Profesional SST

RESULTADOS PARA EL AÑO 2025

Mes	Número de trabajadores	Accidentes de trabajo	Días de incapacidad	N° de días de trabajo programado	Indicador	Interpretación
Agosto	19	5	24	456	5,26	En el mes se perdió 5,26% de días programados de trabajo por incapacidad médica.
Septiembre	24	0	0	576	0,00	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.
Octubre	26	0	0	624	0,00	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.
Noviembre	31	0	0	744	0,00	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.
Diciembre	36	0	0	648	0,00	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.



JULIO ANDRES CASTRO GOMEZ
ARQUITECTO

Interventoría: Durante este periodo en la interventoría no reporta accidente de trabajo

USO DE DOTACIÓN Y EPP

Interventoría:
El personal utiliza los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos conforme a las actividades asignadas y según lo establecido en la matriz de EPP de la empresa. Durante el proceso de inducción, así como en los momentos en que las labores lo demandan, se brinda capacitación sobre el uso correcto y el adecuado mantenimiento de dichos elementos.

Contratista:
En las visitas de seguimiento realizadas en campo, se evidencia el uso adecuado de los elementos de protección personal y los sistemas de protección contra caídas por parte del contratista y su personal subcontratado durante el desarrollo de las actividades.

5. MODIFICACIÓN REALIZADA

ADICION N°1: El día 29 de diciembre de 2025 al contrato de interventoría No C-020-2025 se realizó adición 01 por un valor de **TRECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTITRES PESOS M/CTE ($333.864.033)** y prórroga hasta 6.32 meses hasta el 9 de julio 2026.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acero Figurado 1/4" – 1. Tanque RCI



Concreto Tanque 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación. Tanque Agua Potable.



Vigas de Cimentación en concreto de 21 Mpa (3000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación. Cuarto 9léctrico



Suministro e instalación de cubierta liviana, sistema compuesto de cubierta en teja metálica sin traslapo tipo “Metal roof Grado 40” o similar, con cama de aislamiento termoacústico en poliuretano y capa superior de impermeabilización con membrana TPO. In



Suministro e instalación de cubierta liviana, sistema compuesto de cubierta en teja metálica sin traslapo tipo “Metal roof Grado 40” o similar, con cama de aislamiento termoacústico en poliuretano y capa superior de impermeabilización con membrana TPO. I



Visita técnica especialista en Redes Rci



Relleno en recebo común compactado mecánicamente



Nivelación de terreno con material seleccionado para mejoramiento de piso



Estación Manual. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento



Acero Figurado 1/4" – 1. Tanque RCI



Acero Figurado 1/4" – 1. Tanque Agua Potable



Actividades ejecutadas en zona de cuarto piso



Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos,andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación. Zona cuarto eléctrico



Media caña con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación



EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN. Red sanitaria piso 1



Encofrado de tanque Agua Potable



Antepechos cubierta, en panel Kinwall E=60mm 28/26 acanalado y/o liso, incluye perfil de soporte inferior e intermedio en Angulo Gal C-16 de 5x5 ctms



Concreto de 3000 p.s.i placa de contrapiso 10cm



Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación. Zona cuarto eléctrico



Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , con division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para tomas e iluminacion , incluyendo cable desnudo



Curado de tanque Agua Potable



Antepechos cubierta, en panel Kinwall E=60mm 28/26 acanalado y/o liso, incluye perfil de soporte inferior e intermedio en Angulo Gal C-16 de 5x5 ctms



Encofrado de tanque Agua RCI.



Concreto Tanque 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación. Tanque Agua Potable

6.1. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 39.8% y presupuestal del 25% a 30 de enero de 2026.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1.1	Demoliciones	m2	881.70
1.2	Construcción, Montaje, Manteniemiento y Desmonte de Campamentos y Cerramientos (incluye todas las adecuaciones provisionales en obra, incluye cargue y retiro a centro de disposición autorizado)	Und	1.00
1.3	Construcción de provisionales de energia y acueducto, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00
1.4	Obras Plan de Manejo de Ambiental, incluye todo lo necesario, contemplado el PGAS	gb	1.00
1.5	Obras Plan de Manejo de Tráfico	gb	1.00
1.6	Señalización de zonas intervenidas	un	50.00
1.7	Barrera de delimitación con delineador tubular, tela sintética verde y cinta reflectiva plástica de seguridad	m	201.56
1.8	Desmonte de puertas (todos los materiales y estructuras - incluye marcos) incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	un	21.00
1.9	Desmonte de cielo-raso (todos los materiales y estructuras) incluye cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	495.67
1.10	Desmonte teja fibro-cemento y otros materiales, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	452.67
1.11	Demolición placa de contrapiso hasta e<0.15m, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	422.14
1.12	Demolición de vigas y columnas (vigas de cubierta), incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m3	37.66
1.13	Demolición de muros con mampostería de arcilla o cemento espesor máx. de 0.20m, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1735.00
1.14	Desmonte de aparatos sanitarios	un	6.00
1.16	Demolicion de Tortas placas aereas, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1053.68
2.1	Excavacion mecanica a cielo abierto Sotano 1	m3	346.37
2.2	Excavacion manual vigas/zapatas	m3	25.07
2.3	Relleno material seleccionado	m3	13.02
3.3	Suministro, transporte e instalción de Acero Figurado 1/4" - 1", incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	kg	3436.79
3.4	Bombeo de concreto. incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	50.03
3.5	Localizacion y replanteo, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	121.77
3.6	Concreto de Limpieza 1500 PSI, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	46.58
3.7	Concreto Tanque 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	34.75
4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	5034.81
4.2	Ensayo Rotura Cilindros a compresión	un	24.00

4.3	Bombeo de concreto	m3	81.10
4.5	Escaleras en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	5.60
4.6	Muros en concreto y columnas en concreto de 31 Mpa (4500 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	1.17
4.8	Localizacion y replanteo	m2	1543.12
4.10	Concreto recalce placas/Losas/Escaleras. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	8.85
4.12	Concreto recalce vigas aéreas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	33.90
4.17	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	1076.00
4.18	Malla electrosoldada estandar.Incluye suministro, corte, amarre y colocación.	kg	2325.80
5.126	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00
5.127	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00
5.128	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00
5.129	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00
5.301	TUBERÍA PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	15.66
5.302	TUBERÍA PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	7.47
5.303	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	12.00
5.304	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	43.91
5.305	TUBERÍA PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	9.00
5.306	TUBERÍA PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	77.60

5.307	ACCESORIO PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00
5.308	ACCESORIO PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00
5.309	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00
5.310	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	50.00
5.311	ACCESORIO PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00
5.312	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	76.00
5.313	SOPORTE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	30.00
5.314	SOPORTE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00
5.315	SOPORTE 1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00
5.401	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00
5.402	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00
5.403	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00
5.501	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00
5.502	PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIO DE PUSH ANTIVANDALICO Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00
5.504	PUNTO HIDRAULICO PARA POCETAS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00

5.506	PUNTO HIDRAULICO PARA RECAMARA DE AIRE pvcp 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	13.00
5.507	PUNTO HIDRAULICO PARA ORINAL ø1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00
5.601	PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	24.00
5.602	PUNTO SANITARIO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	23.00
5.604	PUNTO SANITARIO PARA ORINAL Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00
5.605	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00
5.606	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	23.00
5.701	TUBERÍA PVC-L Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	37.50
5.702	TUBERÍA PVC-L Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00
5.801	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	108.35
5.802	TUBERÍA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	5.50
5.803	TUBERÍA PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	22.50
5.804	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	96.00
5.805	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	15.00
5.806	ACCESORIOS PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	134.00

5.810	JUNTA EXPANSIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00
5.812	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00
5.901	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	60.00
5.902	TUBERÍA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	12.00
5.903	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	30.00
5.904	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00
5.912	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00
5.101	CAJA DE INSPECCION 0,70*0,70. Incluye tapa en concreto y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	1.00
5.121	EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN	M3	13.51
5.123	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	13.51
6.101	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tuberíaEMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con polo a tierra,15 A, 120V,y seguro de giro, cable encauchetado 3x14AGW, para derivacion del tomacorriete a la clavija de conexión de la luminaria ,conductor de cobre CABLE 3No12 AWG THHN TC LS-ZH, (FASE-NEUTRO-TIERRA) para elcircuito ramal según lo mostrado en los planos, conectores tipo resorte, marquillas de identificacion y demásaccesorios que hagan parte de esta actividad. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	120.25
6.201	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica normal, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH(FASE-NEUTRO-TIERRA), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conectores tipo resortemarquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	63.25
6.202	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasicaregulada, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH TC(FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipohospitalario conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte marquillas deidentificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UN	28.00

6.203	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica conproteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto EMT, de ½", conductor de cobre CABLE 3No12 AWG, TC LS-ZH TC LS-ZH (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A,120V, conectores tipo resorte marquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LASALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UN	4.00
6.901	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , con division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para tomas e iluminacion , incluyendo cable desnudo No 6.	ML	47.51
6.101	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPO DE MEDIDA CD-GENERAL Malla de puesta a tierra para el CD-GEN, independiente según ART 15 RETIE, incluyendo 4 varillas de cobrede 5/8" x 2.44 m, 50m de conductor de cobre desnudo No 2/0, preparación de tierra, y 1 pozo de inspeccion, y conexiones con soldadura tipo cadwell	UN	1.00
6.111	Tendido de tubería Ø 3/4" IMC, desde la cubierta hasta el terreno. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	48.00
6.112	Tendido de conductor de cobre THHN # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	37.00
6.113	Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	90.30
6.114	Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 " . Abrazadera para fijación de cable, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	9.00
6.116	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00
6.117	Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	7.00
6.118	Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8' . Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00
7.105	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2" . Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	4.40

7.201	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	125.48
7.202	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	105.00
7.205	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	55.65
7.206	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	337.00
7.207	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	83.85
7.208	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	25.00
7.209	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	127.42
7.210	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	160.00
7.211	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	68.41
7.212	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	390.00
7.213	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	285.50
7.214	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	110.00
7.216	VALVULA RISER CHECK + TRIM LISTADA UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00
7.218	GABINETE CLASE III, INCLUYE, CAJA EN LAMINA DE ACERO, VIDRIO TEMPLADO DE 4mm, VALVULA ANGULO UL/FM 1.1/2", VALVULA DE ANGULO UL/FM DE 2.1/2", HACHA DE 2LBS, LLAVE PARA LAS VALVULAS, EXTINTOR DE 20 LBS. 30METROS DE MANGUERA DE POLIURETANO Y BOQUILLA DE POLICARBONATO DE 1.1/2" y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.90
7.226	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos,	UN	4.00

	andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)		
7.227	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	36.00
7.229	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	29.00
7.230	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	20.00
7.231	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	10.00
8.1	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	393.01
8.2	Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (ml). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	9.80
8.5	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	153.91
8.8	Grafil 4.0 mm. Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	63.83
8.15	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	115.00
9.1	Marquesina en cubierta policarbonato incluye Estructura. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	27.99
9.4	Suministro e instalación de cubierta liviana, sistema compuesto de cubierta en teja metálica sin traslapo tipo "Metal roof Grado 40" o similar, con cama de aislamiento termoacústico en poliuretano y capa superior de impermeabilización con membrana TPO. Incluye estructura y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	225.00
9.5	Media caña con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	248.00
9.8	Afinado pisos impermeabilizado - Cubierta. Incluye suministro, nivelación, vaciado y extendida de mortero, impermeabilizante y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	113.27
10.7	Filos y Dilataciones en Revoque/pañete Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	149.40
10.9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	704.55

14.3	Cielo Raso en drywall egún indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	288.57
21.3	Equipo Incendio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	0.95
NP01	DESMONTE DE LAMPARAS, consiste en el desmote técnico de las luminarias, y su posterior traslado a sitio de recolección por parte del contratante, incluye mano de obra, Epp, Andamios y demás elementos para el desarrollo de la actividad	Und	54.00
NP02	DESMONTE DE VENTANERIA, consiste en el desmote técnico de las ventanas existentes, y su posterior traslado a sitio de recolección por parte del contratante, incluye mano de obra, Epp, Andamios y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M2	132.35
NP03	RETIRO CASETON EN GUADUA EXISTENTE, consiste en el desmote técnico de los casetones de guadua incrustados en las placas de contrapiso existentes, incluye mano de obra, Epp, Andamios, retiro y disposición final de los residuos y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M	1132.51
NP04	RECUBRIMIENTO DE ACERO DE REFUERZO EN VIGUETAS, debido a problemas constructivos evidenciados en el momento de retirar la torta inferior de las placas aligeradas de entrepiso existentes, como hormigueos por vibrado, y otros derivados del retiro de los casetones, y por recomendación del Ing. Consultor se deben hacer reparaciones puntuales en la sección de las viguetas para resolver los aceros expuestos mediante la aplicación de un mortero de reparación que garantice el recubrimiento mínimo, según las evidencias encontradas en obra las viguetas deben ser reparadas en aproximadamente el 30% de su área superficial, la tarea consiste en aplicación de Mortero tixotrópico, para la reparación del concreto, que no requiere puente de adherencia, en espesor minimo de 2.5 cm sobre aceros expuestos, esta intervencion no garantiza niveles hilos o filos por lo que su finalidad es unicamente la proteccion de los aceros en un area que luego sera recubierta por cielorasos, incluye limpieza y retiro de material suelto, aplicacion de mortero de reparacion con llana de madera, mano de obra Epp, Andamios, y demás elementos necesarios para su correcta aplicación, se pagara por el total de las viguetas existentes en el proyecto.	M	683.80
NP05	DESMANTELAMIENTO REDES ELECTRICAS EXISTENTES, consiste en la desconexión y retiro de conductores existentes en el proyecto.	GL	1.00
NP06	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ACABADOS DE PISO Y AFINADOS, consiste en la demolición técnica de acabados de tableta de granito o cerámicos y su consecuente afinado de piso, en las placas de la edificación existente que buscan llegara el nivel original de la placa de entrepiso o contrapiso existentes para lograr las alturas de máximas, esta labor incluye herramienta menor y equipos y retiro de escombros	M2	1259.77
NP07	CONTRAPLACA EN LOSAS DE ENTREPISO, se requiere la construcción de contraplaca para garantizar una losa resistente toda vez que las existentes en el proyecto carecen de aceros de refuerzo, esta actividad consiste en aplicacion de concreto para recalce de placas de 3.000 PSI grava comun de concreto bombeable, en espesor de 50 mm, incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada Q2 (4mmX4mm 150mmX150mm) y mano de obra, sobre la misma se requiere pendientados afinados de piso pues no es de acabado final	M2	879.14

NP08	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	M2	651.65
NP009	Construcción de cárcamo porta cable en concreto de 3000 psi, con sección libre de 30x30, espesor de muros 10cm, incluye excavación manual, relleno en material seleccionado y compactación, concreto de limpieza, acero de refuerzo formaletas y en general todos los materiales y accesorios para su correcta construcción, se paga por ml a eje de cárcamo construido.	ML	10.55
NP010	Concreto superfluido para recalce, concreto grava fina 1/2", con plastificante y acelerante resistencia a la compresión de 4.000 psi mezclado en obra.	M3	0.48
NP011	Demolicion controlada de superficies de concreto para llegar a aceros de refuerzo en elementos a reforzar	M3	0.62
NP012	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12	ML	127.20
NP014	SUMINISTRO E INSTALACION PLÁSTICO NEGRO CAL 3.5 EN SUPERFIECIE PLACAS DE CONRAPISO	M2	271.34
NP015	CONCRETO DE 3000 P.S.I PLACA DE CONTRAPISO 10CM	M2	271.34
NP017	Acompañamiento certificación equipo	UND	1.00
NP018	Suministro e instalación de poste de concreto de 12mts x 1500kg. Trabajos con cuadrilla de línea energizada.	UN	1.00
NP019	Suministro e instalación de estructura de paso sencillo pin trifásica en bandera 523A para 13.2kv. Trabajos con cuadrilla de línea energizada.	UN	1.00
NP020	Desmonte de estructuras y postes existentes con cuadrilla de línea energizada.	UN	1.00
NP023	Fundida de bases de postes de concreto de 12 mts	UN	1.00
NP024	Suministro e instalacion de transformador trifásico convencional de 150 KVA 13200/220-127V. Incluye estructura para montaje de equipo separado de fachada para cumplimiento de distancias de seguridad.	UN	1.00
NP025	Suministro e instalación de protecciones para transformador trifásico tipo 711 hasta 13.2 KV y SPT. Incluye cortacircuitos con camara apagachispa.	UN	1.00
NP026	Suministro e instalación de dos (2) ductos conduit galvanizados imc de 4"	ML	1.00
NP027	Suministro e instalación de banco de tres (3) ductos conduit pvc de 4". Incluye demolición de piso de concreto, excavación, compactación y resanes.	ML	8.00
NP028	Suministro e instalación de ocho 2x(3F+1N) conductores en cable de cobre THHN 2x(3No. 4/0 +1No. 4/0 awg) + 1No. 2T awg, desde bornes del transformador hasta protección principal en celda de dsitribución general de BT.	ML	20.00
NP029	Suministro e instalación de grupo de medida indirecta para nivel 2, 3 elementos para 13.2 KV, uso exterior y calibrado.	UN	1.00
NP030	Elaboración de memorias de calculo, planos eléctricos y tramites de aprobacion diseño ante el operador de red.	UN	1.00
NP031	Antepechos cubierta, en panel Kinwall E=60mm 28/26 acanalado y/o liso, incluye perfil de soporte inferior e intermedio en Angulo Gal C-16 de 5x5 ctms	M2	180.00
NP032	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	24.00
NP033	Demolición y retiro de elementos masivos de comcreto en cimentaciones profundas	M3	27.15

NP034	Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	M2	212.00
NP035	Relleno en bloque de arcilla No 4 / 5 como material aligerante en placas de contrapiso	M3	10.71
NP036	Revisión integral y validacion cambios en recorridos para la red contraincendios, apoyo técnico en la definición de los parámetros hidráulicos y constructivos requeridos para mantener el sistema, en consecuencia de cambios en el diseño arquitectónico de cielorrasos y validación de alturas libres de la edificación. Incluye Planos de nuevo recorrido de RCI- Memorias de Cálculo (verificación de la presión y caudal del punto crítico de la red).	UN	1.00
NP038	Vigas de Cimentación en concreto de 21 Mpa (3000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M3	0.48
NP039	Suministro e instalacion cinta PVC O22 o similar	ML	33.94

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo de ejecución de la obra, conforme a la documentación aportada por el contratista.

La supervisión constato que el contratista ejecuto las actividades acordes a lo establecido en el contrato y que los trabajos, se desarrollaron con la dirección de los profesionales según las propuesta y personal capacitado para las diferentes actividades, con las herramientas y materiales adecuados, en buen estado y de buena calidad a disposición de la obra.

8. EVALUACION DEL CONTRATISTA:

La evaluación es parcial, con corte al 31 de enero de 2026, y corresponde a una calificación de 3.5 Esta calificación se otorga teniendo en cuenta el adecuado tiempo de respuesta a los requerimientos, la disposición en la prestación del servicio y, en general, el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Como aspecto a mejorar, se resalta que la oportunidad en la prestación del servicio no ha sido totalmente óptima, principalmente debido a situaciones imprevistas de carácter técnico y operativo que han retrasado la ejecución del cronograma. No obstante, se reconoce el esfuerzo del contratista por dar continuidad al proceso y atender las necesidades planteadas.

HELBERS MARTINEZ SANCHEZ
INGENIERO UNIVERSITARIO GRADO 9
Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta
Supervisor

ACTA 004

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Contrato No. C-019 DE 2025

Objeto del contrato:

“REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

FACTURA ELECTRÓNICA

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

CR 53 # 131 A - 72 BL 3 AP 302
ing.nalvarez@gmail.com
TEL: (601) 6145878

NIT 901961696-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764097517634
Fecha 25/08/2025 - 25/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1 al FEV-500 - No somos Grandes Contribuyentes; No somos Autorretenedores de Renta, Iva e Ica
Actividad Económica 4330 Tarifa ICA 6.9 x 1000
Email: 901961696@recepciondefacturas.co
Teléfono: 3163477044

Departamento	Fecha		
Norte de Santander	23	01	2026

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° FEV - 5

Nombre o Razón Social:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	**NIT:**	800165874-0	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ETA P 2	**Departamento:**	Norte de Santander	**Teléfono:**	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Enero 26 del 2026	**Hora emisión:**	20:00:32-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	26/01/2026				
Nombre Comercial:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	**Total de Lineas:**	4		

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	Costo Directo Contrato C-019 DE 2025OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.	WSD				$714.601.721,00	$714.601.721,00
2	02	1,00	Administración Administración 26%	WSD				$185.796.447,00	$185.796.447,00
3	03	1,00	Imprevistos Imprevistos 4%	WSD				$28.584.069,00	$28.584.069,00
4	04	1,00	Utilidad Utilidad 6%	WSD	IVA	19%	$8.146.460,00	$42.876.103,00	$42.876.103,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado		30,00	$294.001.439,00

Notas:
#$27-01-02-017;C0192025;hmartins@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

SON: (seiscientos ochenta y seis millones tres mil trescientos sesenta y un pesos)
CUFE:

Subtotal:	$971.858.340,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.146.460,00
Total de la operación:	$980.004.800,00
Descuentos globales:	$294.001.439,00
Total:	$686.003.361,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$42.876.103,00	19,00%	$8.146.460,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141189058658

(415)7707212489984(8020) 000014118905865 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
901961696	7	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 53 # 131 A - 72 BL 3 AP 302

42. Correo electrónico: ing.nalvarez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
111111	6016145878	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4330	20250627	4290	20250627			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ALVAREZ GONZALEZ NICOLAS

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141189058658

(415)7707212489984(8020) **000014118905865 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 1 6 9 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 6 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141189058658

(415)7707212489984(8020) **000014118905865 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 1 6 9 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 1 8 2 7 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	GONZALEZ	NICOLAS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 0 1 9 1 6 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRIETO	MUÑETON	CARLOS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141189058658

(415)7707212489984(8020) **000014118905865 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 1 6 9 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 1 9 7 3 2	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: OBRICON S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 5 0 6 1 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 6 6 5 0 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TAYFER DE COLOMBIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 5 0 6 1 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 0 9 3 3 6	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PRIMUTAF S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 6 1 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO BANCARIO.

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Oficina Principal - Bogota

CERTIFICA QUE:

El Cliente CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA, identificado con Nit. 901.961.696:

Tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros No. 051204388301, con apertura el día 2025/07/09, la cual se encuentra Activa a la fecha.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 09 de mes de Julio del año 2025.

Atentamente,



_____
Colaborador Bancoomeva
Usuario:JJBC5178

ACTA PARCIAL DE OBRA

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
	TRABAJOS PRELIMINARES				**$ 469,824,659.32**		**$ 442,493,447.13**		**$ 442,493,447.13**		**$ 442,517,835.09**		**$ 447,193,402.89**									
1.1	Demoliciones	m2	798.40	$60,486.00	$ 48,292,215.96	798.00	$ 48,267,828	798.00	$ 48,267,828	798.40	$ 48,292,216	875.703	$ 52,967,784	875.70	$ 52,967,783.76		$ -	875.70	$ 52,967,784	100%	0.0	$ -
1.2	Construcción, Montaje, Manteniemiento y Desmonte de Campamentos y Cerramientos (incluye todas las adecuaciones provisionales en obra, incluye cargue y retiro a centro de disposición autorizado)	Und	1.00	$96,677,827.00	$ 96,677,827.00	1.00	$ 96,677,827	1.00	$ 96,677,827	1.00	$ 96,677,827	1.00	$ 96,677,827	1.00	$ 96,677,827.00		$ -	1.00	$ 96,677,827	100%	0.0	$ -
1.3	Construcción de provisionales de energia y acueducto, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00	$73,341,428.00	$ 73,341,428.00	1.00	$ 73,341,428	1.00	$ 73,341,428	1.00	$ 73,341,428	1.00	$ 73,341,428	1.00	$ 73,341,428.00		$ -	1.00	$ 73,341,428	100%	0.0	$ -
1.4	Obras Plan de Manejo de Ambiental, incluye todo lo necesario, contemplado el PGAS	gb	1.00	$11,029,422.00	$ 11,029,422.00	1.00	$ 11,029,422	1.00	$ 11,029,422	1.00	$ 11,029,422	1.00	$ 11,029,422	1.00	$ 11,029,422.00		$ -	1.00	$ 11,029,422	100%	0.0	$ -
1.5	Obras Plan de Manejo de Tráfico	gb	1.00	$5,839,106.00	$ 5,839,106.00	1.00	$ 5,839,106	1.00	$ 5,839,106	1.00	$ 5,839,106	1.00	$ 5,839,106	1.00	$ 5,839,106.00		$ -	1.00	$ 5,839,106	100%	0.0	$ -
1.6	Señalización de zonas intervenidas	un	50.00	$14,381.00	$ 719,050.00	50.00	$ 719,050	50.00	$ 719,050	50.00	$ 719,050	50.00	$ 719,050	50.00	$ 719,050.00		$ -	50.00	$ 719,050	100%	0.0	$ -
1.7	Barrera de delimitación con delineador tubular, tela sintética verde y cinta reflectiva plástica de seguridad	m	200.00	$70,321.00	$ 14,064,200.00	201.56	$ 14,173,901	201.56	$ 14,173,901	201.56	$ 14,173,901	201.56	$ 14,173,901	201.56	$ 14,173,900.76		$ -	201.56	$ 14,173,901	100%	0.0	$ -
1.8	Desmonte de puertas (todos los materiales y estructuras - incluye marcos) incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	un	21.00	$43,968.00	$ 923,328.00	21.00	$ 923,328	21.00	$ 923,328	21.00	$ 923,328	21.00	$ 923,328	21.00	$ 923,328.00		$ -	21.00	$ 923,328	100%	0.0	$ -
1.9	Desmonte de cielo-raso (todos los materiales y estructuras) incluye cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1762.00	$18,003.00	$ 31,721,286.00	495.67	$ 8,923,547	495.67	$ 8,923,547	495.67	$ 8,923,547	495.67	$ 8,923,547	495.67	$ 8,923,547.01		$ -	495.67	$ 8,923,547	100%	0.0	$ -
1.10	Desmonte teja fibro-cemento y otros materiales, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	461.00	$22,434.00	$ 10,342,074.00	452.67	$ 10,155,199	452.67	$ 10,155,199	452.67	$ 10,155,199	452.67	$ 10,155,199	452.67	$ 10,155,198.78		$ -	452.67	$ 10,155,199	100%	0.0	$ -
1.11	Demolición placa de contrapiso hasta e<0.15m, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	390.00	$60,759.00	$ 23,696,010.00	422.14	$ 25,648,804	422.14	$ 25,648,804	422.14	$ 25,648,804	422.14	$ 25,648,804	422.14	$ 25,648,804.26		$ -	422.14	$ 25,648,804	100%	0.0	$ -
1.12	Demolición de vigas y columnas (vigas de cubierta), incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m3	80.00	$341,516.00	$ 27,321,280.00	80.00	$ 27,321,280	80.00	$ 27,321,280	80.00	$ 27,321,280	80.00	$ 27,321,280	37.66	$ 12,861,492.56		$ -	37.66	$ 12,861,493	47%	42.3	$ 14,459,787.44
1.13	Demolición de muros con mamposteria de arcilla o cemento espesor máx. de 0.20m, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1735.00	$18,814.00	$ 32,642,290.00	1735.00	$ 32,642,290	1735.00	$ 32,642,290	1735.00	$ 32,642,290	1735.00	$ 32,642,290	1735.00	$ 32,642,290.00		$ -	1735.00	$ 32,642,290	100%	0.0	$ -
1.14	Desmonte de aparatos sanitarios	un	20.00	$35,313.00	$ 706,260.00	6.00	$ 211,878	6.00	$ 211,878	6.00	$ 211,878	6.00	$ 211,878	6.00	$ 211,878.00		$ -	6.00	$ 211,878	100%	0.0	$ -
1.15	Reparación afectacion reforz columnas internas incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	un	27.00	$533,933.00	$ 14,416,191.00	27.00	$ 14,416,191	27.00	$ 14,416,191	27.00	$ 14,416,191	27.00	$ 14,416,191	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	27.0	$ 14,416,191.00
1.16	Demolicion de Tortas placas aereas, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1139.64	$68,524.00	$ 78,092,691.36	1053.68	$ 72,202,368	1053.68	$ 72,202,368	1053.68	$ 72,202,368	1053.68	$ 72,202,368	1053.68	$ 72,202,368.32		$ -	1053.68	$ 72,202,368	100%	0.0	$ -
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 26,018,278.77**		**$ 26,018,278.77**		**$ 26,018,278.77**		**$ 30,614,624.84**		**$ 30,614,624.84**				$ -					
2.1	Excavacion mecanica a cielo abierto Sotano 1	m3	431.75	$56,031.00	$ 24,191,384.25	431.75	$ 24,191,384	431.75	$ 24,191,384	431.75	$ 24,191,384	431.75	$ 24,191,384	346.37	$ 19,407,457.47		$ -	346.37	$ 19,407,457	80%	85.4	$ 4,783,926.78
2.2	Excavacion manual vigas/zapatas	m3	9.36	$107,633.00	$ 1,007,444.88	9.36	$ 1,007,445	9.36	$ 1,007,445	52.96	$ 5,700,244	52.96	$ 5,700,244	25.07	$ 2,698,359.31	2.80	$ 301,372	27.87	$ 2,999,732	53%	25.1	$ 2,700,511.97
2.3	Relleno material seleccionado	m3	30.84	$26,571.00	$ 819,449.64	30.84	$ 819,450	30.84	$ 819,450	27.21	$ 722,997	27.21	$ 722,997	13.02	$ 345,954.42		$ -	13.02	$ 345,954	48%	14.2	$ 377,042.49
3	**CIMENTACIÓN**				**$ 149,493,472.89**		**$ 167,157,070.71**		**$ 167,157,070.71**		**$ 101,418,037.81**		**$ 109,515,611.35**				$ -					
3.1	Zapata en concreto de 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	9.16	$1,143,096.00	$ 10,470,759.36	9.16	$ 10,470,759	9.16	$ 10,470,759	3.05	$ 3,486,443		$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
3.2	Pedestal en concreto de 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	0.25	$1,143,096.00	$ 285,774.00	0.25	$ 285,774	0.25	$ 285,774	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
3.3	Suministro, transporte e instalción de Acero Figurado 1/4" - 1", incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	kg	7170.00	$5,889.00	$ 42,224,130.00	7170.00	$ 42,224,130	7170.00	$ 42,224,130	5202.94	$ 30,640,114	7170.00	$ 42,224,130	1308.59	$ 7,706,286.51	2290.73	$ 13,490,109	3599.32	$ 21,196,395	50%	3570.7	$ 21,027,734.52
3.4	Bombeo de concreto. incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	68.21	$49,177.00	$ 3,354,363.17	68.21	$ 3,354,363	68.21	$ 3,354,363	68.21	$ 3,354,363	68.21	$ 3,354,363	15.30	$ 752,408.10	29.31	$ 1,441,378	44.61	$ 2,193,786	65%	23.6	$ 1,160,577.20
3.5	Localizacion y replanteo, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	123.36	$9,783.00	$ 1,206,830.88	1928.90	$ 18,870,429	1928.90	$ 18,870,429	128.76	$ 1,259,659	128.76	$ 1,259,659	0.00	$ -	79.53	$ 778,042	79.53	$ 778,042	62%	49.2	$ 481,617.09
3.6	Concreto de Limpieza 1500 PSI, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	123.36	$49,663.00	$ 6,126,427.68	123.36	$ 6,126,428	123.36	$ 6,126,428	86.77	$ 4,309,259	86.77	$ 4,309,259	37.63	$ 1,868,818.69	49.14	$ 2,440,440	86.77	$ 4,309,259	100%	0.000	$ -
3.7	Concreto Tanque 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	56.84	$1,493,039.00	$ 84,864,336.76	56.84	$ 84,864,337	56.84	$ 84,864,337	38.45	$ 57,407,350	38.45	$ 57,407,350	15.30	$ 22,843,496.70	20.38	$ 30,428,135	35.68	$ 53,271,632	93%	2.8	$ 4,135,718.03
3.8	Perfilada Excavación, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	123.36	$7,789.00	$ 960,851.04	123.36	$ 960,851	123.36	$ 960,851	123.36	$ 960,851	123.36	$ 960,851	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	123.4	$ 960,851.04
4	**ESTRUCTURA**				**$ 468,325,806.23**		**$ 468,325,806.23**		**$ 468,325,806.23**		**$ 424,854,128.56**		**$ 424,854,128.56**				$ -					
4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	17143.00	$5,889.00	$ 100,955,127.00	17143.00	$ 100,955,127	17143.00	$ 100,955,127	17143.00	$ 100,955,127	17143.00	$ 100,955,127	4969.93	$ 29,267,928.49	64.74	$ 381,244	5034.67	$ 29,649,173	29%	12108.3	$ 71,305,954.07
4.2	Ensayo Rotura Cilindros a compresión	un	40.00	$8,113.00	$ 324,520.00	40.00	$ 324,520	40.00	$ 324,520	40.00	$ 324,520	40.00	$ 324,520	24.00	$ 194,712.00		$ -	24.00	$ 194,712	60%	16.0	$ 129,808.00
4.3	Bombeo de concreto	m3	54.00	$49,177.00	$ 2,655,558.00	54.00	$ 2,655,558	54.00	$ 2,655,558	54.00	$ 2,655,558	54.00	$ 2,655,558	40.29	$ 1,981,341.33	13.20	$ 649,136	53.49	$ 2,630,478	99%	0.5	$ 25,080.27
4.4	Placa aérea vigas descolgadas H=0.40 m en concreto de 28 Mpa (4000 psi). , Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación.	m2	399.11	$413,492.00	$ 165,028,792.12	399.11	$ 165,028,792	399.11	$ 165,028,792	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
4.5	Escaleras en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	13.00	$2,242,852.00	$ 29,157,076.00	13.00	$ 29,157,076	13.00	$ 29,157,076	13.29	$ 29,807,503	13.29	$ 29,807,503	5.60	$ 12,559,971.20		$ -	5.60	$ 12,559,971	42%	7.7	$ 17,247,531.88
4.6	Muros en concreto y columnas en concreto de 31 Mpa (4500 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	32.65	$1,326,092.00	$ 43,296,903.80	32.65	$ 43,296,904	32.65	$ 43,296,904	110.45	$ 146,466,861	110.45	$ 146,466,861	1.17	$ 1,551,527.64		$ -	1.17	$ 1,551,528	1%	109.3	$ 144,915,333.76
4.7	Conector empalme mecánico	un	60.00	$22,002.00	$ 1,320,120.00	60.00	$ 1,320,120	60.00	$ 1,320,120	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
4.8	Localizacion y replanteo	m2	108.15	$9,783.00	$ 1,058,031.45	108.15	$ 1,058,031	108.15	$ 1,058,031	1928.90	$ 18,870,429	1928.90	$ 18,870,429	100.00	$ 978,300.00	1427.80	$ 13,968,155	1527.80	$ 14,946,455	79%	401.1	$ 3,923,974.02
4.9	Escarafiación de superficies de elementos estructurales (vigas y columnas). Incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m2	1630.00	$8,278.00	$ 13,493,140.00	1630.00	$ 13,493,140	1630.00	$ 13,493,140	1630.00	$ 13,493,140	1630.00	$ 13,493,140	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1630.0	$ 13,493,140.00
4.10	Concreto recalce placas/Losas/Escaleras. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	16.82	$1,131,650.00	$ 19,034,353.00	16.82	$ 19,034,353	16.82	$ 19,034,353	7.77	$ 8,792,921	7.77	$ 8,792,921	6.89	$ 7,797,068.50	0.88	$ 995,852	7.77	$ 8,792,921	100%	0.000	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
4.11	Concreto recalce columnas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	1.89	$1,272,098.00	$ 2,404,265.22	1.89	$ 2,404,265	1.89	$ 2,404,265	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
4.12	Concreto recalce vigas aéreas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	11.69	$1,279,624.00	$ 14,958,804.56	11.69	$ 14,958,805	11.69	$ 14,958,805	34.37	$ 43,980,677	34.37	$ 43,980,677	33.90	$ 43,379,253.60		$ -	33.90	$ 43,379,254	99%	0.47	$ 601,423.28
4.13	Anclaje de acero de vigas en columnas (Incluye perforación hasta 0.15m y epóxico) Ø 7/8. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	1263.00	$24,835.00	$ 31,366,605.00	1263.00	$ 31,366,605	1263.00	$ 31,366,605	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
4.14	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	2730.60	$5,889.00	$ 16,080,503.40	2730.60	$ 16,080,503	2730.60	$ 16,080,503	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
4.15	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, color contrastante, resistente a humedad y de aplicación con brocha o rodillo, con un rendimiento aproximado de 0.5 kg/m². Incluye preparación de superficies, herramientas, aplicación, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	60.00	$146,570.00	$ 8,794,200.00	60.00	$ 8,794,200	60.00	$ 8,794,200	60.00	$ 8,794,200	60.00	$ 8,794,200	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	60.0	$ 8,794,200.00
4.16	Suministro y aplicación de inhibidor migratorio de corrosión para acero embebido en concreto, base aminas orgánicas, compatible con estructuras de concreto armado, de baja viscosidad, aplicación por aspersión o brocha, con capacidad de penetración mínima de 20 mm, que actúe por migración hacia la superficie del acero, formando una capa protectora que reduzca la velocidad de corrosión. Incluye preparación de superficies, aplicación y materiales auxiliares.	kg	60.00	$30,329.00	$ 1,819,740.00	60.00	$ 1,819,740	60.00	$ 1,819,740	60.00	$ 1,819,740	60.00	$ 1,819,740	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	60.0	$ 1,819,740.00
4.17	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	1061.00	$10,927.00	$ 11,593,547.00	1061.00	$ 11,593,547	1061.00	$ 11,593,547	1061.00	$ 11,593,547	1061.00	$ 11,593,547	1060.00	$ 11,582,620.00	1.00	$ 10,927	1061.00	$ 11,593,547	100%	0.0	$ -
4.18	Malla electrosoldada estandar.Incluye suministro, corte, amarre y colocación.	kg	783.36	$6,363.00	$ 4,984,519.68	783.36	$ 4,984,520	783.36	$ 4,984,520	5862.00	$ 37,299,906	5862.00	$ 37,299,906	1062.54	$ 6,760,942.02	1201.95	$ 7,648,035	2264.49	$ 14,408,977	39%	3597.5	$ 22,890,928.70
5	**INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA - HYS**																$ -					
5.1	**CUARTO DE BOMBAS**				**$ 40,008,414.00**		**$ 40,008,414.00**		**$ 40,008,414.00**		**$ 40,008,414.00**		**$ 40,008,414.00**				$ -					
5.101	TUBERIA POLIPROPILENO 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	13.00	$83,167.00	$ 1,081,171.00	13.00	$ 1,081,171	13.00	$ 1,081,171	13.00	$ 1,081,171	13.00	$ 1,081,171	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	13.0	$ 1,081,171.00
5.102	ACCESORIOS POLIPROPILENO 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	9.00	$59,362.00	$ 534,258.00	9.00	$ 534,258	9.00	$ 534,258	9.00	$ 534,258	9.00	$ 534,258	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.0	$ 534,258.00
5.103	TUBERIA POLIPROPILENO 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	16.00	$69,306.00	$ 1,108,896.00	16.00	$ 1,108,896	16.00	$ 1,108,896	16.00	$ 1,108,896	16.00	$ 1,108,896	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 1,108,896.00
5.104	ACCESORIOS POLIPROPILENO 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	28.00	$49,468.00	$ 1,385,104.00	28.00	$ 1,385,104	28.00	$ 1,385,104	28.00	$ 1,385,104	28.00	$ 1,385,104	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	28.0	$ 1,385,104.00
5.105	TUBERIA POLIPROPILENO 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	2.00	$55,445.00	$ 110,890.00	2.00	$ 110,890	2.00	$ 110,890	2.00	$ 110,890	2.00	$ 110,890	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 110,890.00
5.106	ACCESORIOS POLIPROPILENO 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	5.00	$39,574.00	$ 197,870.00	5.00	$ 197,870	5.00	$ 197,870	5.00	$ 197,870	5.00	$ 197,870	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 197,870.00
5.107	TUBERIA POLIPROPILENO 6.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	4.00	$46,524.00	$ 186,096.00	4.00	$ 186,096	4.00	$ 186,096	4.00	$ 186,096	4.00	$ 186,096	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 186,096.00
5.108	ACCESORIOS POLIPROPILENO 6.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	9.00	$36,236.00	$ 326,124.00	9.00	$ 326,124	9.00	$ 326,124	9.00	$ 326,124	9.00	$ 326,124	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.0	$ 326,124.00
5.109	VALVULA DE PIE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,397,234.00	$ 1,397,234.00	1.00	$ 1,397,234	1.00	$ 1,397,234	1.00	$ 1,397,234	1.00	$ 1,397,234	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,397,234.00
5.110	VALVULA PASO DIRECTO 3"	UN	3.00	$2,006,350.00	$ 6,019,050.00	3.00	$ 6,019,050	3.00	$ 6,019,050	3.00	$ 6,019,050	3.00	$ 6,019,050	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 6,019,050.00
5.111	VALVULA PASO DIRECTO 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$1,561,626.00	$ 6,246,504.00	4.00	$ 6,246,504	4.00	$ 6,246,504	4.00	$ 6,246,504	4.00	$ 6,246,504	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 6,246,504.00
5.112	VALVULA PASO DIRECTO 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$959,042.00	$ 959,042.00	1.00	$ 959,042	1.00	$ 959,042	1.00	$ 959,042	1.00	$ 959,042	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 959,042.00
5.113	VALVULA PASO DIRECTO 6.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$597,491.00	$ 1,194,982.00	2.00	$ 1,194,982	2.00	$ 1,194,982	2.00	$ 1,194,982	2.00	$ 1,194,982	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,194,982.00
5.114	VALVULA CHEQUE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$2,452,897.00	$ 4,905,794.00	2.00	$ 4,905,794	2.00	$ 4,905,794	2.00	$ 4,905,794	2.00	$ 4,905,794	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 4,905,794.00
5.115	VALVULA CHEQUE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$453,550.00	$ 453,550.00	1.00	$ 453,550	1.00	$ 453,550	1.00	$ 453,550	1.00	$ 453,550	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 453,550.00
5.116	JUNTA DE EXPANSIÓN 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$474,908.00	$ 949,816.00	2.00	$ 949,816	2.00	$ 949,816	2.00	$ 949,816	2.00	$ 949,816	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 949,816.00
5.117	JUNTA DE EXPANSIÓN 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$474,908.00	$ 1,424,724.00	3.00	$ 1,424,724	3.00	$ 1,424,724	3.00	$ 1,424,724	3.00	$ 1,424,724	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 1,424,724.00
5.118	BRIDA 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$126,789.00	$ 507,156.00	4.00	$ 507,156	4.00	$ 507,156	4.00	$ 507,156	4.00	$ 507,156	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 507,156.00
5.119	BRIDA 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$105,659.00	$ 633,954.00	6.00	$ 633,954	6.00	$ 633,954	6.00	$ 633,954	6.00	$ 633,954	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 633,954.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.120	SOPORTE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	11.00	$21,369.00	$ 235,059.00	11.00	$ 235,059	11.00	$ 235,059	11.00	$ 235,059	11.00	$ 235,059	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 235,059.00
5.121	SOPORTE 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00	$20,586.00	$ 288,204.00	14.00	$ 288,204	14.00	$ 288,204	14.00	$ 288,204	14.00	$ 288,204	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 288,204.00
5.122	SOPORTE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$20,287.00	$ 40,574.00	2.00	$ 40,574	2.00	$ 40,574	2.00	$ 40,574	2.00	$ 40,574	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 40,574.00
5.123	SOPORTE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$19,527.00	$ 78,108.00	4.00	$ 78,108	4.00	$ 78,108	4.00	$ 78,108	4.00	$ 78,108	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 78,108.00
5.124	MANÓMETRO. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$127,217.00	$ 381,651.00	3.00	$ 381,651	3.00	$ 381,651	3.00	$ 381,651	3.00	$ 381,651	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 381,651.00
5.125	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$952,503.00	$ 952,503.00	1.00	$ 952,503	1.00	$ 952,503	1.00	$ 952,503	1.00	$ 952,503	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 952,503.00
5.126	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$2,145,096.00	$ 2,145,096.00	1.00	$ 2,145,096	1.00	$ 2,145,096	1.00	$ 2,145,096	1.00	$ 2,145,096	0.00	$ -	1.00	$ 2,145,096	1.00	$ 2,145,096	100%	0.0	$ -
5.127	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$1,608,822.00	$ 4,826,466.00	3.00	$ 4,826,466	3.00	$ 4,826,466	3.00	$ 4,826,466	3.00	$ 4,826,466	3.00	$ 4,826,466.00		$ -	3.00	$ 4,826,466	100%	0.0	$ -
5.128	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,072,548.00	$ 1,072,548.00	1.00	$ 1,072,548	1.00	$ 1,072,548	1.00	$ 1,072,548	1.00	$ 1,072,548	0.00	$ -	1.00	$ 1,072,548	1.00	$ 1,072,548	100%	0.0	$ -
5.129	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$365,990.00	$ 365,990.00	1.00	$ 365,990	1.00	$ 365,990	1.00	$ 365,990	1.00	$ 365,990	0.00	$ -	1.00	$ 365,990	1.00	$ 365,990	100%	0.0	$ -
5.2	**ACOMETIDA**				**$ 4,367,385.00**		**$ 4,367,385.00**		**$ 4,367,385.00**		**$ 4,367,385.00**		**$ 4,367,385.00**		$ -		$ -					
5.201	TUBERÍA PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	26.00	$10,126.00	$ 263,276.00	26.00	$ 263,276	26.00	$ 263,276	26.00	$ 263,276	26.00	$ 263,276	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	26.0	$ 263,276.00
5.202	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$2,435.00	$ 29,220.00	12.00	$ 29,220	12.00	$ 29,220	12.00	$ 29,220	12.00	$ 29,220	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.0	$ 29,220.00
5.203	TUBERIA POLIPROPILENO 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	16.00	$12,016.00	$ 192,256.00	16.00	$ 192,256	16.00	$ 192,256	16.00	$ 192,256	16.00	$ 192,256	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 192,256.00
5.204	ACCESORIOS POLIPROPILENO 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	23.00	$10,901.00	$ 250,723.00	23.00	$ 250,723	23.00	$ 250,723	23.00	$ 250,723	23.00	$ 250,723	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	23.0	$ 250,723.00
5.205	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y	UN	4.00	$120,668.00	$ 482,672.00	4.00	$ 482,672	4.00	$ 482,672	4.00	$ 482,672	4.00	$ 482,672	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 482,672.00
5.206	VALVULA CHEQUE 1/2. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$109,992.00	$ 109,992.00	1.00	$ 109,992	1.00	$ 109,992	1.00	$ 109,992	1.00	$ 109,992	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 109,992.00
5.207	MEDIDOR 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,203,935.00	$ 1,203,935.00	1.00	$ 1,203,935	1.00	$ 1,203,935	1.00	$ 1,203,935	1.00	$ 1,203,935	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,203,935.00
5.208	FILTRO Y 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$184,604.00	$ 184,604.00	1.00	$ 184,604	1.00	$ 184,604	1.00	$ 184,604	1.00	$ 184,604	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 184,604.00
5.209	CAJA PARA MEDIDOR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$855,619.00	$ 855,619.00	1.00	$ 855,619	1.00	$ 855,619	1.00	$ 855,619	1.00	$ 855,619	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 855,619.00
5.210	VALVULA Y FLOTADOR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$397,544.00	$ 795,088.00	2.00	$ 795,088	2.00	$ 795,088	2.00	$ 795,088	2.00	$ 795,088	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 795,088.00
5.3	**RED DE AGUA FRIA**				**$ 7,527,146.00**		**$ 7,527,146.00**		**$ 7,527,146.00**		**$ 7,849,398.00**		**$ 7,849,398.00**		$ -		$ -					
5.301	TUBERÍA PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	14.00	$43,177.00	$ 604,478.00	14.00	$ 604,478	14.00	$ 604,478	14.00	$ 604,478	14.00	$ 604,478	0.00	$ -	13.91	$ 600,592	13.91	$ 600,592	99%	0.1	$ 3,885.93
5.302	TUBERÍA PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	14.00	$35,347.00	$ 494,858.00	14.00	$ 494,858	14.00	$ 494,858	14.00	$ 494,858	14.00	$ 494,858	0.00	$ -	8.24	$ 291,259	8.24	$ 291,259	59%	5.8	$ 203,598.72
5.303	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	17.00	$23,695.00	$ 402,815.00	17.00	$ 402,815	17.00	$ 402,815	17.00	$ 402,815	17.00	$ 402,815	0.00	$ -	14.53	$ 344,288	14.53	$ 344,288	85%	2.5	$ 58,526.65
5.304	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	91.00	$18,956.00	$ 1,724,996.00	91.00	$ 1,724,996	91.00	$ 1,724,996	91.00	$ 1,724,996	91.00	$ 1,724,996	0.00	$ -	45.45	$ 861,550	45.45	$ 861,550	50%	45.6	$ 863,445.80
5.305	TUBERÍA PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	7.00	$18,956.00	$ 132,692.00	7.00	$ 132,692	7.00	$ 132,692	24.00	$ 454,944	24.00	$ 454,944	0.00	$ -	18.36	$ 348,032	18.36	$ 348,032	77%	5.6	$ 106,911.84
5.306	TUBERÍA PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	53.00	$10,126.00	$ 536,678.00	53.00	$ 536,678	53.00	$ 536,678	53.00	$ 536,678	53.00	$ 536,678	0.00	$ -	52.97	$ 536,374	52.97	$ 536,374	100%	0.0	$ 303.78
5.307	ACCESORIO PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	13.00	$48,410.00	$ 629,330.00	13.00	$ 629,330	13.00	$ 629,330	13.00	$ 629,330	13.00	$ 629,330	0.00	$ -	13.00	$ 629,330	13.00	$ 629,330	100%	0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.308	ACCESORIO PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	11.00	$16,721.00	$ 183,931.00	11.00	$ 183,931	11.00	$ 183,931	11.00	$ 183,931	11.00	$ 183,931	0.00	$ -	4.00	$ 66,884	4.00	$ 66,884	36%	7.0	$ 117,047.00
5.309	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00	$14,603.00	$ 146,030.00	10.00	$ 146,030	10.00	$ 146,030	10.00	$ 146,030	10.00	$ 146,030	0.00	$ -	6.00	$ 87,618	6.00	$ 87,618	60%	4.0	$ 58,412.00
5.310	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	153.00	$10,431.00	$ 1,595,943.00	153.00	$ 1,595,943	153.00	$ 1,595,943	153.00	$ 1,595,943	153.00	$ 1,595,943	0.00	$ -	50.00	$ 521,550	50.00	$ 521,550	33%	103.0	$ 1,074,393.00
5.311	ACCESORIO PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	20.00	$5,524.00	$ 110,480.00	20.00	$ 110,480	20.00	$ 110,480	20.00	$ 110,480	20.00	$ 110,480	0.00	$ -	12.00	$ 66,288	12.00	$ 66,288	60%	8.0	$ 44,192.00
5.312	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	79.00	$2,435.00	$ 192,365.00	79.00	$ 192,365	79.00	$ 192,365	79.00	$ 192,365	79.00	$ 192,365	0.00	$ -	76.00	$ 185,060	76.00	$ 185,060	96%	3.0	$ 7,305.00
5.313	SOPORTE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$14,878.00	$ 59,512.00	4.00	$ 59,512	4.00	$ 59,512	4.00	$ 59,512	4.00	$ 59,512	0.00	$ -	4.00	$ 59,512	4.00	$ 59,512	100%	0.0	$ -
5.314	SOPORTE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$13,143.00	$ 78,858.00	6.00	$ 78,858	6.00	$ 78,858	6.00	$ 78,858	6.00	$ 78,858	0.00	$ -	2.00	$ 26,286	2.00	$ 26,286	33%	4.0	$ 52,572.00
5.315	SOPORTE 1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	35.00	$12,881.00	$ 450,835.00	35.00	$ 450,835	35.00	$ 450,835	35.00	$ 450,835	35.00	$ 450,835	0.00	$ -	8.00	$ 103,048	8.00	$ 103,048	23%	27.0	$ 347,787.00
5.316	SOPORTE 1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$12,623.00	$ 37,869.00	3.00	$ 37,869	3.00	$ 37,869	3.00	$ 37,869	3.00	$ 37,869	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 37,869.00
5.317	SOPORTE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$12,123.00	$ 145,476.00	12.00	$ 145,476	12.00	$ 145,476	12.00	$ 145,476	12.00	$ 145,476	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.0	$ 145,476.00
5.4	**VALVULAS**				**$ 6,825,748.00**		**$ 6,825,748.00**		**$ 6,825,748.00**		**$ 6,825,748.00**		**$ 6,825,748.00**		$ -		$ -					
5.401	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00	$289,640.00	$ 4,054,960.00	14.00	$ 4,054,960	14.00	$ 4,054,960	14.00	$ 4,054,960	14.00	$ 4,054,960	3.00	$ 868,920.00	10.00	$ 2,896,400	13.00	$ 3,765,320	93%	1.0	$ 289,640.00
5.402	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$231,712.00	$ 926,848.00	4.00	$ 926,848	4.00	$ 926,848	4.00	$ 926,848	4.00	$ 926,848	0.00	$ -	3.00	$ 695,136	3.00	$ 695,136	75%	1.0	$ 231,712.00
5.403	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	13.00	$120,668.00	$ 1,568,684.00	13.00	$ 1,568,684	13.00	$ 1,568,684	13.00	$ 1,568,684	13.00	$ 1,568,684	1.00	$ 120,668.00	2.00	$ 241,336	3.00	$ 362,004	23%	10.0	$ 1,206,680.00
5.404	VALVULA EXPULSORA DE AIRE Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$68,814.00	$ 275,256.00	4.00	$ 275,256	4.00	$ 275,256	4.00	$ 275,256	4.00	$ 275,256	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 275,256.00
5.5	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE**				**$ 4,661,409.00**		**$ 4,661,409.00**		**$ 4,661,409.00**		**$ 4,661,409.00**		**$ 4,661,409.00**		$ -		$ -					
5.501	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$51,859.00	$ 829,744.00	16.00	$ 829,744	16.00	$ 829,744	16.00	$ 829,744	16.00	$ 829,744	0.00	$ -	10.00	$ 518,590	10.00	$ 518,590	63%	6.0	$ 311,154.00
5.502	PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIO DE PUSH ANTIVANDALICO Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$138,319.00	$ 2,213,104.00	16.00	$ 2,213,104	16.00	$ 2,213,104	16.00	$ 2,213,104	16.00	$ 2,213,104	0.00	$ -	10.00	$ 1,383,190	10.00	$ 1,383,190	63%	6.0	$ 829,914.00
5.503	PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERAØ=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$51,859.00	$ 155,577.00	3.00	$ 155,577	3.00	$ 155,577	3.00	$ 155,577	3.00	$ 155,577	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 155,577.00
5.504	PUNTO HIDRAULICO PARA POCETAS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$51,859.00	$ 207,436.00	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	0.00	$ -	3.00	$ 155,577	3.00	$ 155,577	75%	1.0	$ 51,859.00
5.505	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAPLATOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y	UN	2.00	$51,859.00	$ 103,718.00	2.00	$ 103,718	2.00	$ 103,718	2.00	$ 103,718	2.00	$ 103,718	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 103,718.00
5.506	PUNTO HIDRAULICO PARA RECAMARA DE AIRE pvcp 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	41.00	$23,034.00	$ 944,394.00	41.00	$ 944,394	41.00	$ 944,394	41.00	$ 944,394	41.00	$ 944,394	0.00	$ -	13.00	$ 299,442	13.00	$ 299,442	32%	28.0	$ 644,952.00
5.507	PUNTO HIDRAULICO PARA ORINAL ø1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$51,859.00	$ 207,436.00	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	0.00	$ -	3.00	$ 155,577	3.00	$ 155,577	75%	1.0	$ 51,859.00
5.6	**SALIDAS SANITARIAS**				**$ 7,201,369.00**		**$ 7,201,369.00**		**$ 7,201,369.00**		**$ 7,201,369.00**		**$ 7,201,369.00**		$ -		$ -					
5.601	PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$123,508.00	$ 1,976,128.00	16.00	$ 1,976,128	16.00	$ 1,976,128	16.00	$ 1,976,128	16.00	$ 1,976,128	10.00	$ 1,235,080.00	6.00	$ 741,048	16.00	$ 1,976,128	100%	0.0	$ -
5.602	PUNTO SANITARIO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$145,486.00	$ 2,327,776.00	16.00	$ 2,327,776	16.00	$ 2,327,776	16.00	$ 2,327,776	16.00	$ 2,327,776	10.00	$ 1,454,860.00	6.00	$ 872,916	16.00	$ 2,327,776	100%	0.0	$ -
5.603	PUNTO SANITARIO PARA LAVAPLATOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$123,508.00	$ 247,016.00	2.00	$ 247,016	2.00	$ 247,016	2.00	$ 247,016	2.00	$ 247,016	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 247,016.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.604	PUNTO SANITARIO PARA ORINAL Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$123,508.00	$ 494,032.00	4.00	$ 494,032	4.00	$ 494,032	4.00	$ 494,032	4.00	$ 494,032	3.00	$ 370,524.00	1.00	$ 123,508	4.00	$ 494,032	100%	0.0	$ -
5.605	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y	UN	5.00	$126,621.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	3.00	$ 379,863.00	2.00	$ 253,242	5.00	$ 633,105	100%	0.0	$ -
5.606	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$95,207.00	$ 1,523,312.00	16.00	$ 1,523,312	16.00	$ 1,523,312	16.00	$ 1,523,312	16.00	$ 1,523,312	10.00	$ 952,070.00	6.00	$ 571,242	16.00	$ 1,523,312	100%	0.0	$ -
5.7	**VENTILACIONES Y REVENTILACIONES**				**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**		$ -		$ -					
5.701	TUBERÍA PVC-L Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	49.00	$21,086.00	$ 1,033,214.00	49.00	$ 1,033,214	49.00	$ 1,033,214	49.00	$ 1,033,214	49.00	$ 1,033,214	25.50	$ 537,693.00	23.50	$ 495,521	49.00	$ 1,033,214	100%	0.00	$ -
5.702	TUBERÍA PVC-L Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00	$30,596.00	$ 550,728.00	18.00	$ 550,728	18.00	$ 550,728	18.00	$ 550,728	18.00	$ 550,728	0.00	$ -	18.00	$ 550,728	18.00	$ 550,728	100%	0.0	$ -
5.8	**RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES**				**$ 32,324,270.00**		**$ 32,324,270.00**		**$ 32,324,270.00**		**$ 32,358,256.00**		**$ 32,358,256.00**		$ -		$ -					
5.801	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	95.00	$40,442.00	$ 3,841,990.00	95.00	$ 3,841,990	95.00	$ 3,841,990	95.00	$ 3,841,990	95.00	$ 3,841,990	9.75	$ 394,309.50	85.25	$ 3,447,681	95.00	$ 3,841,990	100%	0.00	$ -
5.802	TUBERÍA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	38.00	$32,308.00	$ 1,227,704.00	38.00	$ 1,227,704	38.00	$ 1,227,704	38.00	$ 1,227,704	38.00	$ 1,227,704	0.00	$ -	5.50	$ 177,694	5.50	$ 177,694	14%	32.5	$ 1,050,010.00
5.803	TUBERÍA PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	60.00	$22,284.00	$ 1,337,040.00	60.00	$ 1,337,040	60.00	$ 1,337,040	60.00	$ 1,337,040	60.00	$ 1,337,040	0.00	$ -	22.50	$ 501,390	22.50	$ 501,390	38%	37.5	$ 835,650.00
5.804	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	120.00	$30,875.00	$ 3,705,000.00	120.00	$ 3,705,000	120.00	$ 3,705,000	120.00	$ 3,705,000	120.00	$ 3,705,000	42.00	$ 1,296,750.00	54.00	$ 1,667,250	96.00	$ 2,964,000	80%	24.0	$ 741,000.00
5.805	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	15.00	$19,951.00	$ 299,265.00	15.00	$ 299,265	15.00	$ 299,265	15.00	$ 299,265	15.00	$ 299,265	10.00	$ 199,510.00	5.00	$ 99,755	15.00	$ 299,265	100%	0.0	$ -
5.806	ACCESORIOS PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	144.00	$12,234.00	$ 1,761,696.00	144.00	$ 1,761,696	144.00	$ 1,761,696	144.00	$ 1,761,696	144.00	$ 1,761,696	54.00	$ 660,636.00	80.00	$ 978,720	134.00	$ 1,639,356	93%	10.0	$ 122,340.00
5.807	TUBERÍA PVC-ALC Ø=6". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	13.00	$68,382.00	$ 888,966.00	13.00	$ 888,966	13.00	$ 888,966	13.00	$ 888,966	13.00	$ 888,966	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	13.0	$ 888,966.00
5.808	ABRAZADERAS Ø=2 Y 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	20.00	$6,640.00	$ 132,800.00	20.00	$ 132,800	20.00	$ 132,800	20.00	$ 132,800	20.00	$ 132,800	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 132,800.00
5.809	ABRAZADERAS Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	25.00	$14,777.00	$ 369,425.00	25.00	$ 369,425	25.00	$ 369,425	25.00	$ 369,425	25.00	$ 369,425	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 369,425.00
5.810	JUNTA EXPANSIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00	$45,316.00	$ 362,528.00	8.00	$ 362,528	8.00	$ 362,528	8.00	$ 362,528	8.00	$ 362,528	0.00	$ -	3.00	$ 135,948	3.00	$ 135,948	38%	5.0	$ 226,580.00
5.811	JUNTA EXPANSIÓN Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$33,986.00	$ 101,958.00	3.00	$ 101,958	3.00	$ 101,958	4.00	$ 135,944	4.00	$ 135,944	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 135,944.00
5.812	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$40,785.00	$ 244,710.00	6.00	$ 244,710	6.00	$ 244,710	6.00	$ 244,710	6.00	$ 244,710	0.00	$ -	3.00	$ 122,355	3.00	$ 122,355	50%	3.0	$ 122,355.00
5.813	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MINIVENT Ø2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$172,150.00	$ 688,600.00	4.00	$ 688,600	4.00	$ 688,600	4.00	$ 688,600	4.00	$ 688,600	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 688,600.00
5.814	TUBERÍA PVC-P Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00	$115,340.00	$ 2,076,120.00	18.00	$ 2,076,120	18.00	$ 2,076,120	18.00	$ 2,076,120	18.00	$ 2,076,120	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.0	$ 2,076,120.00
5.815	ACCESORIO PVC-P Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	22.00	$89,821.00	$ 1,976,062.00	22.00	$ 1,976,062	22.00	$ 1,976,062	22.00	$ 1,976,062	22.00	$ 1,976,062	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	22.0	$ 1,976,062.00
5.816	VALVULA PASO DIRECTO TIPO PESADO 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$3,570,884.00	$ 7,141,768.00	2.00	$ 7,141,768	2.00	$ 7,141,768	2.00	$ 7,141,768	2.00	$ 7,141,768	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 7,141,768.00
5.817	VALVULA CHEQUE TIPO PESADO ø4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$2,356,643.00	$ 4,713,286.00	2.00	$ 4,713,286	2.00	$ 4,713,286	2.00	$ 4,713,286	2.00	$ 4,713,286	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 4,713,286.00
5.818	VÁLVULA UNIVERSAL ø4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$727,676.00	$ 1,455,352.00	2.00	$ 1,455,352	2.00	$ 1,455,352	2.00	$ 1,455,352	2.00	$ 1,455,352	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,455,352.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.9	**RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 27,518,763.00**		**$ 27,518,763.00**		**$ 27,518,763.00**		**$ 27,518,763.00**		**$ 27,518,763.00**		$ -		$ -					
5.901	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	136.00	$40,442.00	$ 5,500,112.00	136.00	$ 5,500,112	136.00	$ 5,500,112	136.00	$ 5,500,112	136.00	$ 5,500,112	0.00	$ -	60.00	$ 2,426,520	60.00	$ 2,426,520	44%	76.0	$ 3,073,592.00
5.902	TUBERÍA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	70.00	$32,308.00	$ 2,261,560.00	70.00	$ 2,261,560	70.00	$ 2,261,560	70.00	$ 2,261,560	70.00	$ 2,261,560	0.00	$ -	12.00	$ 387,696	12.00	$ 387,696	17%	58.0	$ 1,873,864.00
5.903	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	74.00	$30,875.00	$ 2,284,750.00	74.00	$ 2,284,750	74.00	$ 2,284,750	74.00	$ 2,284,750	74.00	$ 2,284,750	0.00	$ -	30.00	$ 926,250	30.00	$ 926,250	41%	44.0	$ 1,358,500.00
5.904	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	42.00	$19,951.00	$ 837,942.00	42.00	$ 837,942	42.00	$ 837,942	42.00	$ 837,942	42.00	$ 837,942	0.00	$ -	4.00	$ 79,804	4.00	$ 79,804	10%	38.0	$ 758,138.00
5.905	TUBERÍA PVC-C Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	3.00	$40,442.00	$ 121,326.00	3.00	$ 121,326	3.00	$ 121,326	3.00	$ 121,326	3.00	$ 121,326	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 121,326.00
5.906	GRAVA PARA FILTRO	M3	3.00	$253,503.00	$ 760,509.00	3.00	$ 760,509	3.00	$ 760,509	3.00	$ 760,509	3.00	$ 760,509	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 760,509.00
5.907	GEOTEXTIL NO TEJIDO REF. 1600. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	10.00	$31,636.00	$ 316,360.00	10.00	$ 316,360	10.00	$ 316,360	10.00	$ 316,360	10.00	$ 316,360	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 316,360.00
5.908	GEODREN H TOTAL 4.50m. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	5.00	$286,554.00	$ 1,432,770.00	5.00	$ 1,432,770	5.00	$ 1,432,770	5.00	$ 1,432,770	5.00	$ 1,432,770	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 1,432,770.00
5.909	ABRAZADERAS Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	30.00	$6,640.00	$ 199,200.00	30.00	$ 199,200	30.00	$ 199,200	30.00	$ 199,200	30.00	$ 199,200	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 199,200.00
5.910	ABRAZADERAS Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$14,777.00	$ 236,432.00	16.00	$ 236,432	16.00	$ 236,432	16.00	$ 236,432	16.00	$ 236,432	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 236,432.00
5.911	JUNTA EXPANSIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	18.00	$45,316.00	$ 815,688.00	18.00	$ 815,688	18.00	$ 815,688	18.00	$ 815,688	18.00	$ 815,688	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.0	$ 815,688.00
5.912	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$40,785.00	$ 81,570.00	2.00	$ 81,570	2.00	$ 81,570	2.00	$ 81,570	2.00	$ 81,570	0.00	$ -	2.00	$ 81,570	2.00	$ 81,570	100%	0.0	$ -
5.913	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$30,588.00	$ 91,764.00	3.00	$ 91,764	3.00	$ 91,764	3.00	$ 91,764	3.00	$ 91,764	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 91,764.00
5.914	TUBERÍA PVC-P Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	24.00	$58,032.00	$ 1,392,768.00	24.00	$ 1,392,768	24.00	$ 1,392,768	24.00	$ 1,392,768	24.00	$ 1,392,768	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.0	$ 1,392,768.00
5.915	ACCESORIO PVC-P Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	48.00	$67,366.00	$ 3,233,568.00	48.00	$ 3,233,568	48.00	$ 3,233,568	48.00	$ 3,233,568	48.00	$ 3,233,568	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	48.0	$ 3,233,568.00
5.916	CODO 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$145,486.00	$ 436,458.00	3.00	$ 436,458	3.00	$ 436,458	3.00	$ 436,458	3.00	$ 436,458	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 436,458.00
5.917	SIFONES 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$145,486.00	$ 872,916.00	6.00	$ 872,916	6.00	$ 872,916	6.00	$ 872,916	6.00	$ 872,916	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 872,916.00
5.918	SIFONES 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$126,621.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 633,105.00
5.919	CODO 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$126,621.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 633,105.00
5.920	VALVULA PASO DIRECTO TIPO PESADO ø3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$1,248,415.00	$ 2,496,830.00	2.00	$ 2,496,830	2.00	$ 2,496,830	2.00	$ 2,496,830	2.00	$ 2,496,830	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 2,496,830.00
5.921	VALVULA CHEQUE TIPO PESADO ø3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$894,258.00	$ 1,788,516.00	2.00	$ 1,788,516	2.00	$ 1,788,516	2.00	$ 1,788,516	2.00	$ 1,788,516	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,788,516.00
5.922	VÁLVULA UNIVERSAL ø3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$545,757.00	$ 1,091,514.00	2.00	$ 1,091,514	2.00	$ 1,091,514	2.00	$ 1,091,514	2.00	$ 1,091,514	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,091,514.00
5.10	**ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO**				**$ 5,998,949.00**		**$ 5,998,949.00**		**$ 5,998,949.00**		**$ 5,998,949.00**		**$ 5,998,949.00**		$ -		$ -					
5.101	CAJA DE INSPECCION 0,70*0,70. Incluye tapa en concreto y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	2.00	$818,423.00	$ 1,636,846.00	2.00	$ 1,636,846	2.00	$ 1,636,846	2.00	$ 1,636,846	2.00	$ 1,636,846	0.00	$ -	1.00	$ 818,423	1.00	$ 818,423	50%	1.0	$ 818,423.00
5.102	POZO DE BOMBEO CUARTO DE BOMBAS. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	1.00	$3,690,043.00	$ 3,690,043.00	1.00	$ 3,690,043	1.00	$ 3,690,043	1.00	$ 3,690,043	1.00	$ 3,690,043	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 3,690,043.00
5.103	CONEXIÓN A RED EXISTENTE. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	1.00	$672,060.00	$ 672,060.00	1.00	$ 672,060	1.00	$ 672,060	1.00	$ 672,060	1.00	$ 672,060	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 672,060.00
5.11	**MONTAJE DE APARATOS**				**$ 4,106,674.00**		**$ 4,106,674.00**		**$ 4,106,674.00**		**$ 4,106,674.00**		**$ 4,106,674.00**		$ -		$ -					
5.111	LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$84,890.00	$ 1,358,240.00	16.00	$ 1,358,240	16.00	$ 1,358,240	16.00	$ 1,358,240	16.00	$ 1,358,240	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 1,358,240.00
5.112	SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$102,804.00	$ 1,644,864.00	16.00	$ 1,644,864	16.00	$ 1,644,864	16.00	$ 1,644,864	16.00	$ 1,644,864	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 1,644,864.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.113	LLAVE MANGUERAØ=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$84,890.00	$ 254,670.00	3.00	$ 254,670	3.00	$ 254,670	3.00	$ 254,670	3.00	$ 254,670	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 254,670.00
5.114	POCETAS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$84,890.00	$ 339,560.00	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 339,560.00
5.115	LAVAPLATOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$84,890.00	$ 169,780.00	2.00	$ 169,780	2.00	$ 169,780	2.00	$ 169,780	2.00	$ 169,780	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 169,780.00
5.116	ORINAL ø1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$84,890.00	$ 339,560.00	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 339,560.00
5.12	**EXCAVACIONES**				**$ 14,976,552.00**		**$ 14,976,552.00**		**$ 14,976,552.00**		**$ 14,976,552.00**		**$ 14,976,552.00**		$ -		$ -					
5.121	EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN	M3	103.00	$28,358.00	$ 2,920,874.00	103.00	$ 2,920,874	103.00	$ 2,920,874	103.00	$ 2,920,874	103.00	$ 2,920,874	9.30	$ 263,729.40	4.21	$ 119,444	13.51	$ 383,173	13%	89.5	$ 2,537,700.70
5.122	RELLENO EN ARENA	M3	66.00	$109,967.00	$ 7,257,822.00	66.00	$ 7,257,822	66.00	$ 7,257,822	66.00	$ 7,257,822	66.00	$ 7,257,822	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	66.0	$ 7,257,822.00
5.123	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	32.00	$48,785.00	$ 1,561,120.00	32.00	$ 1,561,120	32.00	$ 1,561,120	32.00	$ 1,561,120	32.00	$ 1,561,120	9.30	$ 453,700.50	4.21	$ 205,482	13.51	$ 659,183	42%	18.5	$ 901,937.08
5.124	RETIRO DE SOBRANTES	M3	128.00	$25,287.00	$ 3,236,736.00	128.00	$ 3,236,736	128.00	$ 3,236,736	128.00	$ 3,236,736	128.00	$ 3,236,736	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	128.0	$ 3,236,736.00
5.13	**EQUIPOS**				**$ 8,962,377.00**		**$ 8,962,377.00**		**$ 8,962,377.00**		**$ -**		**$ -**		$ -		$ -					
5.131	EQUIPO EYECTOR CUARTO DE BOMBAS 2 BOMBAS SUMERGIBLES TIPO PIRAÑA AUTOCEBANTES PARA EL 100% CON ALTERNANCIA AUTOMÁTICA QT=7,9 L/S; CDT= 9 M.C.A. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	GL	1.00	$8,962,377.00	$ 8,962,377.00	1.00	$ 8,962,377	1.00	$ 8,962,377	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
5.14	**DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**				**$ 1,390,408.00**		**$ 1,390,408.00**		**$ 1,390,408.00**		**$ 1,390,408.00**		**$ -**		$ -		$ -					
5.141	DESINFECCIÓN	GL	1.00	$1,390,408.00	$ 1,390,408.00	1.00	$ 1,390,408	1.00	$ 1,390,408	1.00	$ 1,390,408	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
5.15	**ELABORACIÓN DE PLANOS RÉCORD**				**$ 4,865,928.00**		**$ 4,865,928.00**		**$ 4,865,928.00**		**$ 4,865,928.00**		**$ -**		$ -		$ -					
5.151	PLANOS RÉCORD SEGÚN ESPECIFICACIONES	UN	18.00	$250,273.00	$ 4,504,914.00	18.00	$ 4,504,914	18.00	$ 4,504,914	18.00	$ 4,504,914	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
5.152	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	UN	1.00	$361,014.00	$ 361,014.00	1.00	$ 361,014	1.00	$ 361,014	1.00	$ 361,014	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														$ -		$ -					
6.1	**SALIDAS DE ALUMBRADO**				**$ 63,078,821.00**		**$ 63,078,821.00**		**$ 63,078,821.00**		**$ 63,078,821.00**		**$ 63,078,821.00**		$ -		$ -					
6.101	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tuberíaEMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con polo a tierra,15 A, 120V,y seguro de giro, cable encauchetado 3x14AGW, para derivacion del tomacorriete a la clavija de conexión de la luminaria ,conductor de cobre CABLE 3No12 AWG THHN TC LS-ZH, (FASE-NEUTRO-TIERRA) para elcircuito ramal según lo mostrado en los planos, conectores tipo resorte, marquillas de identificacion y demásaccesorios que hagan parte de esta actividad. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	481.00	$131,141.00	$ 63,078,821.00	481.00	$ 63,078,821	481.00	$ 63,078,821	481.00	$ 63,078,821	481.00	$ 63,078,821	32.00	$ 4,196,512.00	88.25	$ 11,573,193	120.25	$ 15,769,705	25%	360.8	$ 47,309,115.75
6.20	**SALIDAS PARA TOMAS**				**$ 45,480,648.00**		**$ 45,480,648.00**		**$ 45,480,648.00**		**$ 45,480,648.00**		**$ 45,480,648.00**		$ -	0.00	$ -					
6.201	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica normal, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH(FASE-NEUTRO-TIERRA), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conectores tipo resortemarquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	253.00	$116,728.00	$ 29,532,184.00	253.00	$ 29,532,184	253.00	$ 29,532,184	253.00	$ 29,532,184	253.00	$ 29,532,184	0.00	$ -	64.00	$ 7,470,592	64.00	$ 7,470,592	25%	189.0	$ 22,061,592.00
6.202	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasicaregulada, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH TC(FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipohospitalario conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte marquillas deidentificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UN	112.00	$118,511.00	$ 13,273,232.00	112.00	$ 13,273,232	112.00	$ 13,273,232	112.00	$ 13,273,232	112.00	$ 13,273,232	0.00	$ -	28.00	$ 3,318,308	28.00	$ 3,318,308	25%	84.0	$ 9,954,924.00
6.203	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica conproteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto EMT, de ½", conductor de cobre CABLE 3No12 AWG, TC LS-ZH TC LS-ZH (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A,120V, conectores tipo resorte marquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LASALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UN	16.00	$167,202.00	$ 2,675,232.00	16.00	$ 2,675,232	16.00	$ 2,675,232	16.00	$ 2,675,232	16.00	$ 2,675,232	0.00	$ -	4.00	$ 668,808	4.00	$ 668,808	25%	12.0	$ 2,006,424.00
6.3	**ALIMENTADORES A TABLEROS ELECTRICOS**				**$ 83,745,090.00**		**$ 83,745,090.00**		**$ 83,745,090.00**		**$ 83,745,090.00**		**$ 83,745,090.00**		$ -		$ -					
6.301	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-1	ML	5.00	$125,131.00	$ 625,655.00	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 625,655.00
6.302	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-2	ML	20.00	$125,131.00	$ 2,502,620.00	20.00	$ 2,502,620	20.00	$ 2,502,620	20.00	$ 2,502,620	20.00	$ 2,502,620	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 2,502,620.00
6.303	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-3	ML	25.00	$125,131.00	$ 3,128,275.00	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 3,128,275.00
6.304	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-4	ML	30.00	$125,131.00	$ 3,753,930.00	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 3,753,930.00
6.305	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA	ML	25.00	$125,131.00	$ 3,128,275.00	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 3,128,275.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.306	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-1	ML	5.00	$101,526.00	$ 507,630.00	5.00	$ 507,630	5.00	$ 507,630	5.00	$ 507,630	5.00	$ 507,630	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 507,630.00
6.307	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-2	ML	20.00	$101,526.00	$ 2,030,520.00	20.00	$ 2,030,520	20.00	$ 2,030,520	20.00	$ 2,030,520	20.00	$ 2,030,520	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 2,030,520.00
6.308	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-3	ML	25.00	$101,526.00	$ 2,538,150.00	25.00	$ 2,538,150	25.00	$ 2,538,150	25.00	$ 2,538,150	25.00	$ 2,538,150	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 2,538,150.00
6.309	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-4	ML	30.00	$101,526.00	$ 3,045,780.00	30.00	$ 3,045,780	30.00	$ 3,045,780	30.00	$ 3,045,780	30.00	$ 3,045,780	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 3,045,780.00
6.310	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-1	ML	5.00	$125,131.00	$ 625,655.00	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 625,655.00
6.311	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-2	ML	30.00	$125,131.00	$ 3,753,930.00	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 3,753,930.00
6.312	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-3	ML	35.00	$125,131.00	$ 4,379,585.00	35.00	$ 4,379,585	35.00	$ 4,379,585	35.00	$ 4,379,585	35.00	$ 4,379,585	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	35.0	$ 4,379,585.00
6.313	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-4	ML	40.00	$125,131.00	$ 5,005,240.00	40.00	$ 5,005,240	40.00	$ 5,005,240	40.00	$ 5,005,240	40.00	$ 5,005,240	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	40.0	$ 5,005,240.00
6.314	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 2No8+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaTN-BOMBAS	ML	10.00	$77,868.00	$ 778,680.00	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 778,680.00
6.315	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 2No8+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaT-CASILLA	ML	10.00	$77,868.00	$ 778,680.00	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 778,680.00
6.316	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaT-BO-JOCKEY	ML	10.00	$101,526.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 1,015,260.00
6.317	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaT-BO-EYEC	ML	10.00	$101,526.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 1,015,260.00
6.318	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaT-BO-AGPO	ML	10.00	$101,526.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 1,015,260.00
6.319	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No2+1No2+1No6T AWG, THHN-THHW, cobre en 1Ø2"incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hasta T-BOMBAS	ML	10.00	$229,872.00	$ 2,298,720.00	10.00	$ 2,298,720	10.00	$ 2,298,720	10.00	$ 2,298,720	10.00	$ 2,298,720	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 2,298,720.00
6.320	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No1/0+1No4/0+1No2T AWG, THHN-THHW, cobreinstalado en carcamo, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaCD-REG, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	ML	10.00	$330,086.00	$ 3,300,860.00	10.00	$ 3,300,860	10.00	$ 3,300,860	10.00	$ 3,300,860	10.00	$ 3,300,860	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 3,300,860.00
6.321	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No250kcmil+1No250kcmil+1No2T, AWG,THHN-THHW cobre, instalado en carcamo, incluyendo conductores, conexionado,accesorios y pruebas desde,PLANTA ELECTRICA hasta CD-PLANTA	ML	10.00	$513,699.00	$ 5,136,990.00	10.00	$ 5,136,990	10.00	$ 5,136,990	10.00	$ 5,136,990	10.00	$ 5,136,990	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 5,136,990.00
6.322	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 2(3No250kcmil+1No250kcmil+1No2T, AWG,THHN-THHW, Ø3" cobre), incluyendo conductores, conexionado,accesorios y pruebas desde, BORNES DETRASFORMADOR hasta CD-GEN	ML	25.00	$513,699.00	$ 12,842,475.00	25.00	$ 12,842,475	25.00	$ 12,842,475	25.00	$ 12,842,475	25.00	$ 12,842,475	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 12,842,475.00
6.323	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No10+1N"10+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BO-EYEC hastaBOMBAS	ML	20.00	$82,154.00	$ 1,643,080.00	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 1,643,080.00
6.324	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No10+1N"10+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BO-AGPO hastaBOMBAS	ML	20.00	$82,154.00	$ 1,643,080.00	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 1,643,080.00
6.325	Suministro, transporte e instalación de cable siete hilos 3No12 cobre, AWG, TC LS-ZH instalado enDUCTO PORTACABLES, desde tableros de distribucion circuitos ramales tomas e iluminacion hasta caja depaso para salida de circuitos ramales, incluyendo conductores, conexionado,accesorios y pruebas.	ML	3500.00	$4,929.00	$ 17,251,500.00	3500.00	$ 17,251,500	3500.00	$ 17,251,500	3500.00	$ 17,251,500	3500.00	$ 17,251,500	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3500.0	$ 17,251,500.00
6.4	**TABLEROS DE DISTRIBUCION**				**$ 2,473,544.00**		**$ 2,473,544.00**		**$ 2,473,544.00**		**$ 2,473,544.00**		**$ 2,473,544.00**		$ -		$ -					
6.401	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución trifasico con espacio para totalizador de 18circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura,chapa y tapa, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$254,788.00	$ 1,019,152.00	4.00	$ 1,019,152	4.00	$ 1,019,152	4.00	$ 1,019,152	4.00	$ 1,019,152	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 1,019,152.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA							5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		%		
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.402	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución trifasico con espacio para totalizador de 24circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura,chapa y tapa, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$262,282.00	$ 1,049,128.00	4.00	$ 1,049,128	4.00	$ 1,049,128	4.00	$ 1,049,128	4.00	$ 1,049,128	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 1,049,128.00
6.403	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución monofasico de 6 circuitos de 3 hilos, 125V, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$202,632.00	$ 405,264.00	2.00	$ 405,264	2.00	$ 405,264	2.00	$ 405,264	2.00	$ 405,264	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 405,264.00
6.5	**BREAKERS**				**$ 4,831,726.00**		**$ 4,831,726.00**		**$ 4,831,726.00**		**$ 4,831,726.00**		**$ -**		$ -		$ -					
6.501	Suministro, transporte e instalacion Breaker tipo enchufable de 1x15A 10KA, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	32.00	$19,783.00	$ 633,056.00	32.00	$ 633,056	32.00	$ 633,056	32.00	$ 633,056	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
6.502	Suministro, transporte e instalacion Breaker tipo enchufable de 1x20A 10KA, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	62.00	$23,881.00	$ 1,480,622.00	62.00	$ 1,480,622	62.00	$ 1,480,622	62.00	$ 1,480,622	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
6.503	Suministro, transporte e instalacion Breaker tipo industrial de 3x40A 25kA, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00	$339,756.00	$ 2,718,048.00	8.00	$ 2,718,048	8.00	$ 2,718,048	8.00	$ 2,718,048	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
6.6	**TABLEROS GENERALES**				**$ 21,273,669.00**		**$ 21,273,669.00**		**$ 21,273,669.00**		**$ 21,273,669.00**		**$ 21,273,669.00**		$ -		$ -					
6.601	Suministro, transporte e instalación de gabinetes metálicos construidos en lámina Cold Rolled calibre No16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidaciónY lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno de los siguientestableros segun el diagrama unifilar:		0.00	$0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
6.602	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución CD-GEN con totalizador general de 3X500A, TERMICO AJUSTABLE 0,8-1In 25kA1 breaker tipo industrial de 3x200A 25kA4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x30A 25kACaracterísticas DPS clase I Tablero general (Protección contra rayos)Corriente de descarga =12,5 kACorriente de impulso 50kATensión máxima de operación continua =132VacNivel de protección =2,5kV3 X DPS con Uc =132Vac1 X DPS con Uc =132VacCorriente interna admisible de cortocircuito: 25 KAUn sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A..4 reservasUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico	UN	1.00	$8,530,780.00	$ 8,530,780.00	1.00	$ 8,530,780	1.00	$ 8,530,780	1.00	$ 8,530,780	1.00	$ 8,530,780	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 8,530,780.00
6.603	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución CD-PLANTA con totalizador general de 3X200A, TERMICO AJUSTABLE 0,8-1In 25kA1 breaker tipo industrial de 3x100A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x80A 25kA4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x30A 25kA1 Breaker tipo RIEL de 1x30A 10KACaracterísticas DPS clase II Tableros de distribución (Protección contra sobre tensiones)Capacidad de derivación 10kATensión máxima de operación continua =132VacNivel de protección =1,8 kV3 X DPS con Uc =132Vac1 X DPS con Uc =132VacCorriente interna admisible de cortocircuito: 25 KA4 reservasUn sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A..Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico	UN	1.00	$6,426,674.00	$ 6,426,674.00	1.00	$ 6,426,674	1.00	$ 6,426,674	1.00	$ 6,426,674	1.00	$ 6,426,674	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 6,426,674.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA							5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		%		
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.604	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado CD-REG dos totalizadores entrada y salida UPS, de 3X100A, 25kA, TIPO INDUSTRIAL 4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x30A 25kAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolitico montados sobre aisladores de resina.Un control de transferencia manual de 125A Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.4 reservasUn sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A..Características DPS clase II Tableros regulados (Protección contra sobre tensiones)Capacidad de derivación 1,5kATensión máxima de operación continua =132VacNivel de protección =1,5 kV3 X DPS con Uc 132V1 X DPS con Uc 120V, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	1.00	$3,672,406.00	$ 3,672,406.00	1.00	$ 3,672,406	1.00	$ 3,672,406	1.00	$ 3,672,406	1.00	$ 3,672,406	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 3,672,406.00
6.605	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución IP65, T-BOMBAS con totalizador generalTIPO INDUSTRIAL de 3X80A, 25KA4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 Breaker tipo RIEL de 1x30A 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolitico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico	UN	1.00	$2,643,809.00	$ 2,643,809.00	1.00	$ 2,643,809	1.00	$ 2,643,809	1.00	$ 2,643,809	1.00	$ 2,643,809	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 2,643,809.00
6.7	**TABLEROS REGULADOS**				**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059.00**		$ -		$ -					
6.701	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-1 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 9 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolitico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico9 reservas	UN	1.00	$1,659,125.00	$ 1,659,125.00	1.00	$ 1,659,125	1.00	$ 1,659,125	1.00	$ 1,659,125	1.00	$ 1,659,125	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,659,125.00
6.702	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-2 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 10 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolitico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico8 reservas, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	1.00	$1,747,551.00	$ 1,747,551.00	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,747,551.00
6.703	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-3 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 10 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolitico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico8 reservas	UN	1.00	$1,747,551.00	$ 1,747,551.00	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,747,551.00
6.704	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-4 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 13 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolitico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico5 reservas	UN	1.00	$2,012,832.00	$ 2,012,832.00	1.00	$ 2,012,832	1.00	$ 2,012,832	1.00	$ 2,012,832	1.00	$ 2,012,832	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 2,012,832.00
6.8	**CANALETA**				**$ 25,186,700.00**		**$ 25,186,700.00**		**$ 25,186,700.00**		**$ 25,186,700.00**		**$ 25,186,700.00**		$ -		$ -					
6.801	Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todoslos elementos de fijacion y cable desnudo No 10 todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	350.00	$71,962.00	$ 25,186,700.00	350.00	$ 25,186,700	350.00	$ 25,186,700	350.00	$ 25,186,700	350.00	$ 25,186,700	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	350.0	$ 25,186,700.00
6.9	**DUCTO PORTACABLES CERRADO**				**$ 28,523,340.00**		**$ 28,523,340.00**		**$ 28,523,340.00**		**$ 28,523,340.00**		**$ 28,523,340.00**		$ -		$ -					
6.901	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , con division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para tomas e iluminacion , incluyendo cable desnudo No 6.	ML	150.00	$158,463.00	$ 23,769,450.00	150.00	$ 23,769,450	150.00	$ 23,769,450	150.00	$ 23,769,450	150.00	$ 23,769,450	32.40	$ 5,134,201.20	15.11	$ 2,394,376	47.51	$ 7,528,577	32%	102.5	$ 16,240,872.87
6.902	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , sin division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para circuitos alimentadores , incluyendo cable desnudo No 6.	ML	30.00	$158,463.00	$ 4,753,890.00	30.00	$ 4,753,890	30.00	$ 4,753,890	30.00	$ 4,753,890	30.00	$ 4,753,890	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 4,753,890.00
6.10	**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**				**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**		$ -		$ -					
6.101	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPO DE MEDIDA CD-GENERAL Malla de puesta a tierra para el CD-GEN, independiente según ART 15 RETIE, incluyendo 4 varillas de cobrede 5/8" x 2.44 m, 50m de conductor de cobre desnudo No 2/0, preparación de tierra, y 1 pozo de inspeccion, y conexiones con soldadura tipo cadwell	UN	1.00	$21,678,431.00	$ 21,678,431.00	1.00	$ 21,678,431	1.00	$ 21,678,431	1.00	$ 21,678,431	1.00	$ 21,678,431	1.00	$ 21,678,431.00	0.00	$ -	1.00	$ 21,678,431	100%	0.0	$ -
6.11	**SISTEMA DE PARARRAYOS**				**$ 26,932,187.00**		**$ 26,932,187.00**		**$ 26,932,187.00**		**$ 26,932,187.00**		**$ 26,932,187.00**		$ -		$ -					
6.111	Tendido de tubería Ø 3/4" IMC, desde la cubierta hasta el terreno. Incluye suministro, instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	80.00	$41,672.00	$ 3,333,760.00	80.00	$ 3,333,760	80.00	$ 3,333,760	80.00	$ 3,333,760	80.00	$ 3,333,760	0.00	$ -	48.00	$ 2,000,256	48.00	$ 2,000,256	60%	32.0	$ 1,333,504.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.112	Tendido de conductor de cobre THHN # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	100.00	$61,586.00	$ 6,158,600.00	100.00	$ 6,158,600	100.00	$ 6,158,600	100.00	$ 6,158,600	100.00	$ 6,158,600	0.00	$ -	37.00	$ 2,278,682	37.00	$ 2,278,682	37%	63.0	$ 3,879,918.00
6.113	Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	120.00	$9,954.00	$ 1,194,480.00	120.00	$ 1,194,480	120.00	$ 1,194,480	120.00	$ 1,194,480	120.00	$ 1,194,480	0.00	$ -	90.30	$ 898,846	90.30	$ 898,846	75%	29.7	$ 295,633.80
6.114	Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 " . Abrazadera para fijación de cable, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	11.00	$127,694.00	$ 1,404,634.00	11.00	$ 1,404,634	11.00	$ 1,404,634	11.00	$ 1,404,634	11.00	$ 1,404,634	0.00	$ -	9.00	$ 1,149,246	9.00	$ 1,149,246	82%	2.0	$ 255,388.00
6.115	Tendido de conductor de cobre desnudo # 2/0 AWG, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, incluyendo preparacion del terreno, canalizacion, y soldaduras tipo cadwell, y todoslos acccesorios y todos	ML	120.00	$88,561.00	$ 10,627,320.00	120.00	$ 10,627,320	120.00	$ 10,627,320	120.00	$ 10,627,320	120.00	$ 10,627,320	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	120.0	$ 10,627,320.00
6.116	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$442,577.00	$ 2,212,885.00	5.00	$ 2,212,885	5.00	$ 2,212,885	5.00	$ 2,212,885	5.00	$ 2,212,885	2.00	$ 885,154.00		$ -	2.00	$ 885,154	40%	3.0	$ 1,327,731.00
6.117	Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$291,103.00	$ 1,455,515.00	5.00	$ 1,455,515	5.00	$ 1,455,515	5.00	$ 1,455,515	5.00	$ 1,455,515	2.00	$ 582,206.00	3.00	$ 873,309	5.00	$ 1,455,515	100%	0.0	$ -
6.118	Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8' . Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$331,825.00	$ 331,825.00	1.00	$ 331,825	1.00	$ 331,825	1.00	$ 331,825	1.00	$ 331,825	1.00	$ 331,825.00		$ -	1.00	$ 331,825	100%	0.0	$ -
6.119	Via de chispas de separacion para interconectar la puesta a tierra del pararrayos y la puesta a tierra del sistema electrico	UN	1.00	$48,035.00	$ 48,035.00	1.00	$ 48,035	1.00	$ 48,035	1.00	$ 48,035	1.00	$ 48,035	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 48,035.00
6.120	Suministro un barraje de 5mm x 50mm x 400mm, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, las conexiones al barraje serán con conectores certificados de compresión de dos huecos o soldadura exotérmica, y debe ser aislada de su soporte por lo menos 50mm. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$165,133.00	$ 165,133.00	1.00	$ 165,133	1.00	$ 165,133	1.00	$ 165,133	1.00	$ 165,133	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 165,133.00
6.12	**CANALIZACIONES**				**$ 1,281,520.00**		**$ 1,281,520.00**		**$ 1,281,520.00**		**$ 1,281,520.00**		**$ 1,281,520.00**		$ -		$ -					
6.121	Canalización subterránea en dos (2) ductos de P.V.C. DB de 3" con excavación rellenos y compactación, según norma del operador de red, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	ML	20.00	$64,076.00	$ 1,281,520.00	20.00	$ 1,281,520	20.00	$ 1,281,520	20.00	$ 1,281,520	20.00	$ 1,281,520	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 1,281,520.00
6.13	**REGATAS**				**$ 4,977,000.00**		**$ 4,977,000.00**		**$ 4,977,000.00**		**$ 4,977,000.00**		**$ 4,977,000.00**		$ -		$ -					
6.131	Construccion de regatas. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	ML	600.00	$8,295.00	$ 4,977,000.00	600.00	$ 4,977,000	600.00	$ 4,977,000	600.00	$ 4,977,000	600.00	$ 4,977,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	600.0	$ 4,977,000.00
6.14	**CERTIFICACION RETIE Y DERECHOS DE CONEXIÓN**				**$ 22,481,370.00**		**$ 22,481,370.00**		**$ 22,481,370.00**		**$ 22,481,370.00**		**$ 22,481,370.00**		$ -		$ -					
6.141	Certificacion RETIE y RETILAP	UN	1.00	$15,736,959.00	$ 15,736,959.00	1.00	$ 15,736,959	1.00	$ 15,736,959	1.00	$ 15,736,959	1.00	$ 15,736,959	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 15,736,959.00
6.142	Derechos de conexión ante el operador de red	UN	1.00	$6,744,411.00	$ 6,744,411.00	1.00	$ 6,744,411	1.00	$ 6,744,411	1.00	$ 6,744,411	1.00	$ 6,744,411	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 6,744,411.00
7	**RED CONTRA INCENDIO**														$ -		$ -					
7.1	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**				**$ 56,575,895.00**		**$ 56,575,895.00**		**$ 56,575,895.00**		**$ 56,575,895.00**		**$ 61,878,679.00**		$ -		$ -					
7.101	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	19.00	$149,026.00	$ 2,831,494.00	19.00	$ 2,831,494	19.00	$ 2,831,494	19.00	$ 2,831,494	19.00	$ 2,831,494	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.0	$ 2,831,494.00
7.102	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$119,133.00	$ 1,906,128.00	16.00	$ 1,906,128	16.00	$ 1,906,128	16.00	$ 1,906,128	16.00	$ 1,906,128	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 1,906,128.00
7.103	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2.1/2" . Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	2.00	$130,345.00	$ 260,690.00	2.00	$ 260,690	2.00	$ 260,690	2.00	$ 260,690	2.00	$ 260,690	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 260,690.00
7.104	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$90,252.00	$ 90,252.00	1.00	$ 90,252	1.00	$ 90,252	1.00	$ 90,252	1.00	$ 90,252	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 90,252.00
7.105	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2" . Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	6.00	$73,527.00	$ 441,162.00	6.00	$ 441,162	6.00	$ 441,162	6.00	$ 441,162	6.00	$ 441,162	0.00	$ -	4.40	$ 323,519	4.40	$ 323,519	73%	1.6	$ 117,643.20

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.106	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$54,288.00	$ 325,728.00	6.00	$ 325,728	6.00	$ 325,728	6.00	$ 325,728	6.00	$ 325,728	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 325,728.00
7.107	TUBERIA ACERO GALVANIZADO DE 3/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	4.00	$27,417.00	$ 109,668.00	4.00	$ 109,668	4.00	$ 109,668	4.00	$ 109,668	4.00	$ 109,668	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 109,668.00
7.108	ACCESORIOS ROSCADOS ASME B.16.3 DE 3/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$5,456.00	$ 10,912.00	2.00	$ 10,912	2.00	$ 10,912	2.00	$ 10,912	2.00	$ 10,912	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 10,912.00
7.109	TUBERIA ACERO GALVANIZADO DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00	$27,417.00	$ 493,506.00	18.00	$ 493,506	18.00	$ 493,506	18.00	$ 493,506	18.00	$ 493,506	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.0	$ 493,506.00
7.110	ACCESORIOS ROSCADOS ASME B.16.3 DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00	$5,456.00	$ 54,560.00	10.00	$ 54,560	10.00	$ 54,560	10.00	$ 54,560	10.00	$ 54,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 54,560.00
7.111	TUBERIA CU TL ASTM B 88 DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	16.00	$59,047.00	$ 944,752.00	16.00	$ 944,752	16.00	$ 944,752	16.00	$ 944,752	16.00	$ 944,752	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 944,752.00
7.112	ACCESORIOS CU TK ASTM B 88 DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	11.00	$13,761.00	$ 151,371.00	11.00	$ 151,371	11.00	$ 151,371	11.00	$ 151,371	11.00	$ 151,371	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 151,371.00
7.113	VALVULA OS&Y 3" LISTADA UL CON SUPERVISIÓN. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$2,098,176.00	$ 8,392,704.00	4.00	$ 8,392,704	4.00	$ 8,392,704	4.00	$ 8,392,704	4.00	$ 8,392,704	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 8,392,704.00
7.114	VALVULA CHEQUE LISTADA UL 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$799,708.00	$ 1,599,416.00	2.00	$ 1,599,416	2.00	$ 1,599,416	2.00	$ 1,599,416	2.00	$ 1,599,416	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,599,416.00
7.115	VALVULA CHEQUE LISTADA UL 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$623,369.00	$ 623,369.00	1.00	$ 623,369	1.00	$ 623,369	1.00	$ 623,369	1.00	$ 623,369	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 623,369.00
7.116	VALVULA CHEQUE BRONCE DE CORTINA 2" PARA 200 PSI. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$311,751.00	$ 311,751.00	1.00	$ 311,751	1.00	$ 311,751	1.00	$ 311,751	1.00	$ 311,751	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 311,751.00
7.117	VALVULA BRONCE DE ALIVIO 3/4" x 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$470,365.00	$ 470,365.00	1.00	$ 470,365	1.00	$ 470,365	1.00	$ 470,365	1.00	$ 470,365	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 470,365.00
7.118	JUNTA ACERO INOXIDABLE 3" UNION BRIDA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$1,891,306.00	$ 3,782,612.00	2.00	$ 3,782,612	2.00	$ 3,782,612	2.00	$ 3,782,612	2.00	$ 3,782,612	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 3,782,612.00
7.119	JUNTA ACERO INOXIDABLE 2" UNION BRIDA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$1,162,967.00	$ 2,325,934.00	2.00	$ 2,325,934	2.00	$ 2,325,934	2.00	$ 2,325,934	2.00	$ 2,325,934	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 2,325,934.00
7.120	CHEQUE PERFORADO (3/32") DE CORTINA 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$93,178.00	$ 372,712.00	4.00	$ 372,712	4.00	$ 372,712	4.00	$ 372,712	4.00	$ 372,712	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 372,712.00
7.121	VALVULA BRONCE DE COMPUERTA 2" PARA 200 PSI. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$660,559.00	$ 1,321,118.00	2.00	$ 1,321,118	2.00	$ 1,321,118	2.00	$ 1,321,118	2.00	$ 1,321,118	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,321,118.00
7.122	COPA EXCENTRICA 3"x2.1/2" HF (SEGÚN BOMBA). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$777,215.00	$ 777,215.00	1.00	$ 777,215	1.00	$ 777,215	1.00	$ 777,215	1.00	$ 777,215	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 777,215.00
7.123	COPA CONCENTRICA 3"x2.1/2" HF (SEGÚN BOMBA). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$741,888.00	$ 741,888.00	1.00	$ 741,888	1.00	$ 741,888	1.00	$ 741,888	1.00	$ 741,888	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 741,888.00
7.124	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 3" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$16,380.00	$ 81,900.00	5.00	$ 81,900	5.00	$ 81,900	5.00	$ 81,900	5.00	$ 81,900	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 81,900.00
7.125	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST	UN	1.00	$16,380.00	$ 16,380.00	1.00	$ 16,380	1.00	$ 16,380	1.00	$ 16,380	1.00	$ 16,380	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 16,380.00
7.126	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$15,527.00	$ 15,527.00	1.00	$ 15,527	1.00	$ 15,527	1.00	$ 15,527	1.00	$ 15,527	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 15,527.00
7.127	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 3/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$14,066.00	$ 28,132.00	2.00	$ 28,132	2.00	$ 28,132	2.00	$ 28,132	2.00	$ 28,132	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 28,132.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.128	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$13,747.00	$ 164,964.00	12.00	$ 164,964	12.00	$ 164,964	12.00	$ 164,964	12.00	$ 164,964	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.0	$ 164,964.00
7.129	PINTURA ANTICORROSIVA 3". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	19.00	$18,399.00	$ 349,581.00	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.0	$ 349,581.00
7.130	PINTURA ANTICORROSIVA 2.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	2.00	$18,399.00	$ 36,798.00	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 36,798.00
7.131	PINTURA ANTICORROSIVA 2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	6.00	$16,760.00	$ 100,560.00	6.00	$ 100,560	6.00	$ 100,560	6.00	$ 100,560	6.00	$ 100,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 100,560.00
7.132	PINTURA ANTICORROSIVA 3/4" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	4.00	$15,420.00	$ 61,680.00	4.00	$ 61,680	4.00	$ 61,680	4.00	$ 61,680	4.00	$ 61,680	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 61,680.00
7.133	PINTURA ANTICORROSIVA 1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$15,239.00	$ 518,126.00	34.00	$ 518,126	34.00	$ 518,126	34.00	$ 518,126	34.00	$ 518,126	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.0	$ 518,126.00
7.134	PINTURA ESMALTE ROJO 3" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	19.00	$18,399.00	$ 349,581.00	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.0	$ 349,581.00
7.135	PINTURA ESMALTE ROJO 2.1/2" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	2.00	$18,399.00	$ 36,798.00	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 36,798.00
7.136	PINTURA ESMALTE ROJO 2" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	6.00	$17,796.00	$ 106,776.00	6.00	$ 106,776	6.00	$ 106,776	6.00	$ 106,776	6.00	$ 106,776	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 106,776.00
7.137	PINTURA ESMALTE ROJO 3/4" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	4.00	$12,848.00	$ 51,392.00	4.00	$ 51,392	4.00	$ 51,392	4.00	$ 51,392	4.00	$ 51,392	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 51,392.00
7.138	PINTURA ESMALTE ROJO 1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$12,848.00	$ 436,832.00	34.00	$ 436,832	34.00	$ 436,832	34.00	$ 436,832	34.00	$ 436,832	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.0	$ 436,832.00
7.139	BRIDA ACERO ANSI B 16.5 PARA 150 PSI 3" RANURADA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$183,901.00	$ 735,604.00	4.00	$ 735,604	4.00	$ 735,604	4.00	$ 735,604	4.00	$ 735,604	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 735,604.00
7.140	BRIDA ACERO ANSI B 16.5 PARA 150 PSI 2" RANURADA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$151,416.00	$ 605,664.00	4.00	$ 605,664	4.00	$ 605,664	4.00	$ 605,664	4.00	$ 605,664	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 605,664.00
7.141	SIAMESA BRONCE 4" X 2.1/2" X 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$2,735,972.00	$ 2,735,972.00	1.00	$ 2,735,972	1.00	$ 2,735,972	1.00	$ 2,735,972	1.00	$ 2,735,972	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 2,735,972.00
7.142	VALVULA CHEQUE LISTADA UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$905,651.00	$ 905,651.00	1.00	$ 905,651	1.00	$ 905,651	1.00	$ 905,651	1.00	$ 905,651	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 905,651.00
7.143	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$2,190,674.00	$ 6,572,022.00	3.00	$ 6,572,022	3.00	$ 6,572,022	3.00	$ 6,572,022	3.00	$ 6,572,022	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 6,572,022.00
7.144	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$1,643,006.00	$ 4,929,018.00	3.00	$ 4,929,018	3.00	$ 4,929,018	3.00	$ 4,929,018	6.00	$ 9,858,036	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 9,858,036.00
7.145	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 3/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$422,774.00	$ 422,774.00	1.00	$ 422,774	1.00	$ 422,774	1.00	$ 422,774	1.00	$ 422,774	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 422,774.00
7.146	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$373,766.00	$ 373,766.00	1.00	$ 373,766	1.00	$ 373,766	1.00	$ 373,766	2.00	$ 747,532	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 747,532.00
7.147	DESFOGUE MOTOR DIESEL ACERO ø4"	ML	18.00	$339,160.00	$ 6,104,880.00	18.00	$ 6,104,880	18.00	$ 6,104,880	18.00	$ 6,104,880	18.00	$ 6,104,880	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.0	$ 6,104,880.00
7.148	RECUBRIMIENTO DESFOGUE MOTOR DIESEL EN FRIBRA DE VIDRIO, FORRADO CON LIENCILLO	ML	10.00	$147,421.00	$ 1,474,210.00	10.00	$ 1,474,210	10.00	$ 1,474,210	10.00	$ 1,474,210	10.00	$ 1,474,210	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 1,474,210.00
7.149	LÁMINA DE ALUMINIO PARA DESFOGUE MOTOR DIESEL. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	10.00	$102,200.00	$ 1,022,000.00	10.00	$ 1,022,000	10.00	$ 1,022,000	10.00	$ 1,022,000	10.00	$ 1,022,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 1,022,000.00
7.2	**RED INTERNA**				**$ 219,911,154.00**		**$ 219,911,154.00**		**$ 219,911,154.00**		**$ 219,911,154.00**		**$ 219,911,154.00**		$ -		$ -					
7.201	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	68.00	$236,030.00	$ 16,050,040.00	68.00	$ 16,050,040	68.00	$ 16,050,040	68.00	$ 16,050,040	68.00	$ 16,050,040	5.90	$ 1,392,577.00	62.04	$ 14,643,301	67.94	$ 16,035,878	100%	0.1	$ 14,161.80
7.202	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	65.00	$158,845.00	$ 10,324,925.00	65.00	$ 10,324,925	65.00	$ 10,324,925	65.00	$ 10,324,925	65.00	$ 10,324,925	13.00	$ 2,064,985.00	52.00	$ 8,259,940	65.00	$ 10,324,925	100%	0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.203	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	34.00	$149,026.00	$ 5,066,884.00	34.00	$ 5,066,884	34.00	$ 5,066,884	34.00	$ 5,066,884	34.00	$ 5,066,884	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.0	$ 5,066,884.00
7.204	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00	$119,133.00	$ 1,667,862.00	14.00	$ 1,667,862	14.00	$ 1,667,862	14.00	$ 1,667,862	14.00	$ 1,667,862	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 1,667,862.00
7.205	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	122.00	$130,345.00	$ 15,902,090.00	122.00	$ 15,902,090	122.00	$ 15,902,090	122.00	$ 15,902,090	122.00	$ 15,902,090	0.00	$ -	88.65	$ 11,555,084	88.65	$ 11,555,084	73%	33.4	$ 4,347,005.75
7.206	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	145.00	$90,252.00	$ 13,086,540.00	145.00	$ 13,086,540	145.00	$ 13,086,540	145.00	$ 13,086,540	145.00	$ 13,086,540	145.00	$ 13,086,540.00	0.00	$ -	145.00	$ 13,086,540	100%	0.0	$ -
7.207	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	70.00	$130,345.00	$ 9,124,150.00	70.00	$ 9,124,150	70.00	$ 9,124,150	70.00	$ 9,124,150	70.00	$ 9,124,150	36.85	$ 4,803,213.25	0.00	$ -	36.85	$ 4,803,213	53%	33.2	$ 4,320,936.75
7.208	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	57.00	$90,252.00	$ 5,144,364.00	57.00	$ 5,144,364	57.00	$ 5,144,364	57.00	$ 5,144,364	57.00	$ 5,144,364	1.00	$ 90,252.00	24.00	$ 2,166,048	25.00	$ 2,256,300	44%	32.0	$ 2,888,064.00
7.209	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	128.00	$67,490.00	$ 8,638,720.00	128.00	$ 8,638,720	128.00	$ 8,638,720	128.00	$ 8,638,720	128.00	$ 8,638,720	9.73	$ 656,677.70	118.00	$ 7,963,820	127.73	$ 8,620,498	100%	0.3	$ 18,222.30
7.210	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	160.00	$35,054.00	$ 5,608,640.00	160.00	$ 5,608,640	160.00	$ 5,608,640	160.00	$ 5,608,640	160.00	$ 5,608,640	55.00	$ 1,927,970.00	105.00	$ 3,680,670	160.00	$ 5,608,640	100%	0.0	$ -
7.211	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	98.00	$49,396.00	$ 4,840,808.00	98.00	$ 4,840,808	98.00	$ 4,840,808	98.00	$ 4,840,808	98.00	$ 4,840,808	19.54	$ 965,197.84	78.46	$ 3,875,610	98.00	$ 4,840,808	100%	0.000	$ -
7.212	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	152.00	$29,038.00	$ 4,413,776.00	152.00	$ 4,413,776	152.00	$ 4,413,776	152.00	$ 4,413,776	152.00	$ 4,413,776	89.00	$ 2,584,382.00	63.00	$ 1,829,394	152.00	$ 4,413,776	100%	0.0	$ -
7.213	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	232.00	$35,678.00	$ 8,277,296.00	232.00	$ 8,277,296	232.00	$ 8,277,296	232.00	$ 8,277,296	232.00	$ 8,277,296	0.00	$ -	150.50	$ 5,369,539	150.50	$ 5,369,539	65%	81.5	$ 2,907,757.00
7.214	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	208.00	$25,857.00	$ 5,378,256.00	208.00	$ 5,378,256	208.00	$ 5,378,256	208.00	$ 5,378,256	208.00	$ 5,378,256	0.00	$ -	110.00	$ 2,844,270	110.00	$ 2,844,270	53%	98.0	$ 2,533,986.00
7.215	VALVULA MARIPOSA LISTADA UL CON SUPERVISIÓN E INDICADOR DE POSICIÓN 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$892,849.00	$ 3,571,396.00	4.00	$ 3,571,396	4.00	$ 3,571,396	4.00	$ 3,571,396	4.00	$ 3,571,396	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 3,571,396.00
7.216	VALVULA RISER CHECK + TRIM LISTADA UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$2,574,865.00	$ 10,299,460.00	4.00	$ 10,299,460	4.00	$ 10,299,460	4.00	$ 10,299,460	4.00	$ 10,299,460	0.00	$ -	2.00	$ 5,149,730	2.00	$ 5,149,730	50%	2.0	$ 5,149,730.00
7.217	SENSOR DE FLUJO PARA TUBERIA DE ACERO DE 2.1/2". LISTADO UL. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$771,305.00	$ 3,085,220.00	4.00	$ 3,085,220	4.00	$ 3,085,220	4.00	$ 3,085,220	4.00	$ 3,085,220	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 3,085,220.00
7.218	GABINETE CLASE III, INCLUYE, CAJA EN LAMINA DE ACERO, VIDRIO TEMPLADO DE 4mm, VALVULA ANGULO UL/FM 1.1/2", VALVULA DE ANGULO UL/FM DE 2.1/2", HACHA DE 2LBS, LLAVE PARA LAS VALVULAS, EXTINTOR DE 20 LBS. 30METROS DE MANGUERA DE POLIURETANO Y BOQUILLA DE POLICARBONATO DE 1.1/2" y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$2,027,455.00	$ 8,109,820.00	4.00	$ 8,109,820	4.00	$ 8,109,820	4.00	$ 8,109,820	4.00	$ 8,109,820	1.90	$ 3,852,164.50		$ -	1.90	$ 3,852,165	48%	2.1	$ 4,257,655.50
7.219	VALVULA de ANGULO 2,1/2". ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT, SALIDA ROSCA MACHO NH, BRONCE PARA 300 PSI, BRONCE LISTADA UL. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00	$814,437.00	$ 6,515,496.00	8.00	$ 6,515,496	8.00	$ 6,515,496	8.00	$ 6,515,496	8.00	$ 6,515,496	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	8.0	$ 6,515,496.00
7.220	REGADERA ESTANDAR 1/2 LISTADA UL, K=5.6 RESPUESTA RAPIDA ORIENTACIÓN PENDIENTE O MONTANTE. TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN 68°C. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	182.00	$85,679.00	$ 15,593,578.00	182.00	$ 15,593,578	182.00	$ 15,593,578	182.00	$ 15,593,578	182.00	$ 15,593,578	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	182.0	$ 15,593,578.00
7.221	REGADERA ESTANDAR 1/2 LISTADA UL, K=5.6 RESPUESTA RAPIDA ORIENTACIÓN LATERAL. TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN 68°C. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$106,209.00	$ 531,045.00	5.00	$ 531,045	5.00	$ 531,045	5.00	$ 531,045	5.00	$ 531,045	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 531,045.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.222	PUNTO ROCIADOR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	187.00	$86,806.00	$ 16,232,722.00	187.00	$ 16,232,722	187.00	$ 16,232,722	187.00	$ 16,232,722	187.00	$ 16,232,722	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	187.0	$ 16,232,722.00
7.223	VALVULA DE ANGULO DE BRONCE PARA DRENAJE 1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$580,383.00	$ 2,321,532.00	4.00	$ 2,321,532	4.00	$ 2,321,532	4.00	$ 2,321,532	4.00	$ 2,321,532	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 2,321,532.00
7.224	VALVULA BOLA DE BRONCE PARA 200 PSI EN 1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$624,533.00	$ 1,873,599.00	3.00	$ 1,873,599	3.00	$ 1,873,599	3.00	$ 1,873,599	3.00	$ 1,873,599	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 1,873,599.00
7.225	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y	UN	3.00	$859,206.00	$ 2,577,618.00	3.00	$ 2,577,618	3.00	$ 2,577,618	3.00	$ 2,577,618	3.00	$ 2,577,618	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 2,577,618.00
7.226	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	23.00	$16,618.00	$ 382,214.00	23.00	$ 382,214	23.00	$ 382,214	23.00	$ 382,214	23.00	$ 382,214	4.00	$ 66,472.00		$ -	4.00	$ 66,472	17%	19.0	$ 315,742.00
7.227	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	41.00	$16,380.00	$ 671,580.00	41.00	$ 671,580	41.00	$ 671,580	41.00	$ 671,580	41.00	$ 671,580	36.00	$ 589,680.00		$ -	36.00	$ 589,680	88%	5.0	$ 81,900.00
7.228	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	24.00	$15,527.00	$ 372,648.00	24.00	$ 372,648	24.00	$ 372,648	24.00	$ 372,648	24.00	$ 372,648	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.0	$ 372,648.00
7.229	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	43.00	$14,377.00	$ 618,211.00	43.00	$ 618,211	43.00	$ 618,211	43.00	$ 618,211	43.00	$ 618,211	29.00	$ 416,933.00		$ -	29.00	$ 416,933	67%	14.0	$ 201,278.00
7.230	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	59.00	$14,268.00	$ 841,812.00	59.00	$ 841,812	59.00	$ 841,812	59.00	$ 841,812	59.00	$ 841,812	20.00	$ 285,360.00		$ -	20.00	$ 285,360	34%	39.0	$ 556,452.00
7.231	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	134.00	$14,066.00	$ 1,884,844.00	134.00	$ 1,884,844	134.00	$ 1,884,844	134.00	$ 1,884,844	134.00	$ 1,884,844	10.00	$ 140,660.00		$ -	10.00	$ 140,660	7%	124.0	$ 1,744,184.00
7.232	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$131,443.00	$ 262,886.00	2.00	$ 262,886	2.00	$ 262,886	2.00	$ 262,886	2.00	$ 262,886	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 262,886.00
7.233	SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$129,785.00	$ 389,355.00	3.00	$ 389,355	3.00	$ 389,355	3.00	$ 389,355	3.00	$ 389,355	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 389,355.00
7.234	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	9.00	$131,443.00	$ 1,182,987.00	9.00	$ 1,182,987	9.00	$ 1,182,987	9.00	$ 1,182,987	9.00	$ 1,182,987	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.0	$ 1,182,987.00
7.235	SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$129,785.00	$ 1,557,420.00	12.00	$ 1,557,420	12.00	$ 1,557,420	12.00	$ 1,557,420	12.00	$ 1,557,420	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.0	$ 1,557,420.00
7.236	SOPORTE SISMORESISTENTE 4 VIAS UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$197,165.00	$ 1,182,990.00	6.00	$ 1,182,990	6.00	$ 1,182,990	6.00	$ 1,182,990	6.00	$ 1,182,990	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 1,182,990.00
7.237	PINTURA ANTICCORROSIVA 4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	68.00	$19,761.00	$ 1,343,748.00	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	68.0	$ 1,343,748.00
7.238	PINTURA ANTICCORROSIVA 3". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$18,399.00	$ 625,566.00	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.0	$ 625,566.00
7.239	PINTURA ANTICORROSIVA 2.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	145.00	$18,399.00	$ 2,667,855.00	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	145.0	$ 2,667,855.00
7.240	PINTURA ANTICORROSIVA 2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	70.00	$17,796.00	$ 1,245,720.00	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	70.0	$ 1,245,720.00
7.241	PINTURA ANTICORROSIVA 1.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	160.00	$16,760.00	$ 2,681,600.00	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	160.0	$ 2,681,600.00
7.242	PINTURA ANTICORROSIVA 1.1/4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	98.00	$16,520.00	$ 1,618,960.00	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	98.0	$ 1,618,960.00
7.243	PINTURA ANTICORROSIVA 1". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	232.00	$12,848.00	$ 2,980,736.00	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	232.0	$ 2,980,736.00
7.244	PINTURA ESMALTE ROJO 4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	68.00	$19,761.00	$ 1,343,748.00	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	68.0	$ 1,343,748.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.245	PINTURA ESMALTE ROJO 3". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$18,399.00	$ 625,566.00	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.0	$ 625,566.00
7.246	PINTURA ESMALTE ROJO 2.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	145.00	$18,399.00	$ 2,667,855.00	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	145.0	$ 2,667,855.00
7.247	PINTURA ESMALTE ROJO 2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	70.00	$17,796.00	$ 1,245,720.00	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	70.0	$ 1,245,720.00
7.248	PINTURA ESMALTE ROJO 1.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	160.00	$16,760.00	$ 2,681,600.00	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	160.0	$ 2,681,600.00
7.249	PINTURA ESMALTE ROJO 1.1/4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	98.00	$16,520.00	$ 1,618,960.00	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	98.0	$ 1,618,960.00
7.250	PINTURA ESMALTE ROJO 1" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	232.00	$12,848.00	$ 2,980,736.00	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	232.0	$ 2,980,736.00
7.3	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				**$ 14,016,777.00**		**$ 14,016,777.00**		**$ 14,016,777.00**		**$ 7,520,516.00**		**$ 7,520,516.00**		$ -		$ -					
7.301	MANUAL DE MANTENIMIENTO	UN	1.00	$519,253.00	$ 519,253.00	1.00	$ 519,253	1.00	$ 519,253	1.00	$ 519,253	1.00	$ 519,253	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 519,253.00
7.302	PLANOS RECORD DE OBRA	UN	11.00	$340,236.00	$ 3,742,596.00	11.00	$ 3,742,596	11.00	$ 3,742,596	11.00	$ 3,742,596	11.00	$ 3,742,596	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 3,742,596.00
7.303	GABINETE PARA ROCIADORES DE RESERVA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$456,993.00	$ 456,993.00	1.00	$ 456,993	1.00	$ 456,993	1.00	$ 456,993	1.00	$ 456,993	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 456,993.00
7.304	PRUEBAS	GL	1.00	$720,286.00	$ 720,286.00	1.00	$ 720,286	1.00	$ 720,286	1.00	$ 720,286	1.00	$ 720,286	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 720,286.00
7.305	EXTINTOR PQS 20 LB. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00	$217,967.00	$ 2,179,670.00	10.00	$ 2,179,670	10.00	$ 2,179,670	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
7.306	EXTINTOR CO2 20 LB. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,967,733.00	$ 1,967,733.00	1.00	$ 1,967,733	1.00	$ 1,967,733	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
7.307	EXTINTOR AFFF 40B. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$2,164,506.00	$ 2,164,506.00	1.00	$ 2,164,506	1.00	$ 2,164,506	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
7.308	EXTINTOR H2O 20 LB. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$184,352.00	$ 184,352.00	1.00	$ 184,352	1.00	$ 184,352	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
7.309	CÁRCAMO PROTECCIÓN TUBERÍAS RCI. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	4.00	$520,347.00	$ 2,081,388.00	4.00	$ 2,081,388	4.00	$ 2,081,388	4.00	$ 2,081,388	4.00	$ 2,081,388	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 2,081,388.00
8	**MAMPOSTERIA**				**$ 223,584,269.44**		**$ 223,584,269.44**		**$ 223,584,269.44**		**$ 204,843,412.22**		**$ 204,843,412.22**		$ -		$ -					
8.1	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	445.82	$63,838.00	$ 28,460,257.16	445.82	$ 28,460,257	445.82	$ 28,460,257	573.00	$ 36,579,174	573.00	$ 36,579,174	136.74	$ 8,729,208.12	383.18	$ 24,461,445	519.92	$ 33,190,653	91%	53.1	$ 3,388,521.04
8.2	Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (ml). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	115.00	$41,800.00	$ 4,807,000.00	115.00	$ 4,807,000	115.00	$ 4,807,000	115.00	$ 4,807,000	115.00	$ 4,807,000	0.00	$ -	9.80	$ 409,640	9.80	$ 409,640	9%	105.2	$ 4,397,360.00
8.3	Dinteles en concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes	ml	591.30	$39,964.00	$ 23,630,713.20	591.30	$ 23,630,713	591.30	$ 23,630,713	591.30	$ 23,630,713	591.30	$ 23,630,713	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	591.3	$ 23,630,713.20
8.4	Bordillos concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes	ml	278.61	$37,028.00	$ 10,316,371.08	278.61	$ 10,316,371	278.61	$ 10,316,371	278.61	$ 10,316,371	278.61	$ 10,316,371	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	278.6	$ 10,316,371.08
8.5	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	3388.00	$5,889.00	$ 19,951,932.00	3388.00	$ 19,951,932	3388.00	$ 19,951,932	3388.00	$ 19,951,932	3388.00	$ 19,951,932	0.00	$ -	236.59	$ 1,393,279	236.59	$ 1,393,279	7%	3151.4	$ 18,558,653.49
8.6	Ensayos (Morteros, muretes, ladrillo, bloque, acero, elementos no estructurales)	un	1.00	$7,308,265.00	$ 7,308,265.00	1.00	$ 7,308,265	1.00	$ 7,308,265	1.00	$ 7,308,265	1.00	$ 7,308,265	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 7,308,265.00
8.7	Enchape ladrillo borde placa H=0.40m Gran Formato. Incluye angulos y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	60.00	$160,349.00	$ 9,620,940.00	60.00	$ 9,620,940	60.00	$ 9,620,940	60.00	$ 9,620,940	60.00	$ 9,620,940	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	60.0	$ 9,620,940.00
8.8	Grafil 4.0 mm. Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	1445.00	$5,810.00	$ 8,395,450.00	1445.00	$ 8,395,450	1445.00	$ 8,395,450	1445.00	$ 8,395,450	1445.00	$ 8,395,450	0.00	$ -	64.36	$ 373,932	64.36	$ 373,932	4%	1380.6	$ 8,021,518.40
8.9	Muro en concreto 28 Mpa (4000 psi) no estructural fundido en sitio. Incluye refuerzo y anclaje y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m3	4.00	$1,712,454.00	$ 6,849,816.00	4.00	$ 6,849,816	4.00	$ 6,849,816	4.00	$ 6,849,816	4.00	$ 6,849,816	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 6,849,816.00
8.10	Muro en Ladrillo en gran formato (ml). Muro en mamposteria a la vista de arcilla de fachada extruida gran formato tipo "santafe" ladrillo gran formato cobrizo 39cmx11cmx5cmo similar. Incluye anclajes según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	162.00	$118,323.00	$ 19,168,326.00	162.00	$ 19,168,326	162.00	$ 19,168,326	162.00	$ 19,168,326	162.00	$ 19,168,326	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	162.0	$ 19,168,326.00
8.11	Muro bloque Cemento gris 12x19x39cm tipo "Decoblock bloque liso divisorio de 9cm" o similar, incluye refuerzo y anclaje según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	325.98	$82,397.00	$ 26,859,774.06	325.98	$ 26,859,774	325.98	$ 26,859,774		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
8.12	Enchape Ladrillo Gran Formato - m2. Incluye angulos y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	71.05	$201,472.00	$ 14,314,585.60	71.05	$ 14,314,586	71.05	$ 14,314,586	71.05	$ 14,314,586	71.05	$ 14,314,586	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	71.1	$ 14,314,585.60
8.13	Muro en Ladrillo Gran Formato (M2). Muro en mamposteria a la vista de arcilla de fachada extruida gran formato tipo "santafe" ladrillo gran formato cobrizo 39cmx11cmx5cmo similar. Incluye anclajes según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	82.14	$191,931.00	$ 15,765,212.34	82.14	$ 15,765,212	82.14	$ 15,765,212	82.14	$ 15,765,212	82.14	$ 15,765,212	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	82.1	$ 15,765,212.34
8.14	Dovelas en Grouting. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	1216.00	$15,329.00	$ 18,640,064.00	1216.00	$ 18,640,064	1216.00	$ 18,640,064	1216.00	$ 18,640,064	1216.00	$ 18,640,064	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1216.0	$ 18,640,064.00
8.15	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	869.00	$10,927.00	$ 9,495,563.00	869.00	$ 9,495,563	869.00	$ 9,495,563	869.00	$ 9,495,563	869.00	$ 9,495,563	0.00	$ -	116.00	$ 1,267,532	116.00	$ 1,267,532	13%	753.0	$ 8,228,031.00
9	**CUBIERTA**				**$ 271,920,299.30**		**$ 271,920,299.30**		**$ 271,920,299.30**		**$ 253,267,965.29**		**$ 253,267,965.29**		$ -		$ -					
9.1	Marquesina en cubierta policarbonato incluye Estructura. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	27.99	$574,040.00	$ 16,067,379.60	27.99	$ 16,067,380	27.99	$ 16,067,380	27.99	$ 16,067,380	27.99	$ 16,067,380	0.00	$ -	25.46	$ 14,615,058	25.46	$ 14,615,058	91%	2.5	$ 1,452,321.20
9.2	Canal metalica tipo amazonas. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	112.10	$179,980.00	$ 20,175,758.00	112.10	$ 20,175,758	112.10	$ 20,175,758	3.50	$ 629,930	3.50	$ 629,930	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.5	$ 629,930.00
9.3	Flanche metalico con pintura Electrostatica. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	139.02	$101,737.00	$ 14,143,477.74	139.02	$ 14,143,478	139.02	$ 14,143,478	139.02	$ 14,143,478	139.02	$ 14,143,478	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	139.0	$ 14,143,477.74
9.4	Suministro e instalación de cubierta liviana, sistema compuesto de cubierta en teja metálica sin traslapo tipo "Metal roof Grado 40" o similar, con cama de aislamiento termoacústico en poliuretano y capa superior de impermeabilización con membrana TPO. Incluye estructura y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	250.20	$794,567.00	$ 198,800,663.40	250.20	$ 198,800,663	250.20	$ 198,800,663	250.20	$ 198,800,663	250.20	$ 198,800,663	78.88	$ 62,675,444.96	171.32	$ 136,125,218	250.20	$ 198,800,663	100%	0.000	$ -
9.5	Media caña con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	248.00	$13,243.00	$ 3,284,264.00	248.00	$ 3,284,264	248.00	$ 3,284,264	248.00	$ 3,284,264	248.00	$ 3,284,264	0.00	$ -	190.00	$ 2,516,170	190.00	$ 2,516,170	77%	58.0	$ 768,094.00
9.6	Regata con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	248.00	$20,044.00	$ 4,970,912.00	248.00	$ 4,970,912	248.00	$ 4,970,912	248.00	$ 4,970,912	248.00	$ 4,970,912	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	248.0	$ 4,970,912.00
9.7	Bordillo fundido en sitio - Cubierta en concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes	ml	23.72	$29,398.00	$ 697,320.56	23.72	$ 697,321	23.72	$ 697,321	23.72	$ 697,321	23.72	$ 697,321	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	23.7	$ 697,320.56
9.8	Afinado pisos impermeabilizado - Cubierta. Incluye suministro, nivelación, vaciado y extendida de mortero, impermeabilizante y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	132.00	$76,959.00	$ 10,158,588.00	132.00	$ 10,158,588	132.00	$ 10,158,588	143.61	$ 11,052,082	143.61	$ 11,052,082	113.27	$ 8,717,145.93		$ -	113.27	$ 8,717,146	79%	30.3	$ 2,334,936.06
9.9	Gancho Anclajes certificados. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	12.00	$301,828.00	$ 3,621,936.00	12.00	$ 3,621,936	12.00	$ 3,621,936	12.00	$ 3,621,936	12.00	$ 3,621,936	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.0	$ 3,621,936.00
10	**PAÑETES, REVOQUES Y RESANES**				**$ 193,001,244.53**		**$ 151,760,585.33**		**$ 151,760,585.33**		**$ 151,760,585.33**		**$ 151,760,585.33**		$ -		$ -					
10.1	Filos y Dilataciones en pañete Fachada	ml	246.43	$9,120.00	$ 2,247,441.60	246.43	$ 2,247,442	246.43	$ 2,247,442	246.43	$ 2,247,442	246.43	$ 2,247,442	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	246.4	$ 2,247,441.60
10.2	Pañete borde placa h=0.50. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	436.21	$27,073.00	$ 11,809,513.33	436.21	$ 11,809,513	436.21	$ 11,809,513	436.21	$ 11,809,513	436.21	$ 11,809,513	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	436.2	$ 11,809,513.33
10.3	Pañete Muros de fachada (m2). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	283.25	$41,239.00	$ 11,680,946.75	283.25	$ 11,680,947	283.25	$ 11,680,947	283.25	$ 11,680,947	283.25	$ 11,680,947	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	283.3	$ 11,680,946.75
10.4	Pañete Muros de fachada (ml). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	192.90	$30,096.00	$ 5,805,518.40	192.90	$ 5,805,518	192.90	$ 5,805,518	192.90	$ 5,805,518	192.90	$ 5,805,518	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	192.9	$ 5,805,518.40
10.5	Pañete Bajo Escalera. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	40.60	$39,030.00	$ 1,584,618.00	40.60	$ 1,584,618	40.60	$ 1,584,618	40.60	$ 1,584,618	40.60	$ 1,584,618	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	40.6	$ 1,584,618.00
10.6	Repello Interior Tanque. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	51.04	$26,340.00	$ 1,344,393.60	51.04	$ 1,344,394	51.04	$ 1,344,394	51.04	$ 1,344,394	51.04	$ 1,344,394	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	51.0	$ 1,344,393.60
10.7	Filos y Dilataciones en Revoque/pañete Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	1137.95	$7,216.00	$ 8,211,476.07	1137.95	$ 8,211,476	1137.95	$ 8,211,476	1137.95	$ 8,211,476	1137.95	$ 8,211,476	0.00	$ -	508.80	$ 3,671,501	508.80	$ 3,671,501	45%	629.2	$ 4,539,975.27
10.8	Pañete/Revoque Muros - Impermeable Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	49.62	$45,547.00	$ 2,260,042.14	49.62	$ 2,260,042	49.62	$ 2,260,042	49.62	$ 2,260,042	49.62	$ 2,260,042	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	49.6	$ 2,260,042.14
10.9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	2479.16	$39,038.00	$ 96,781,448.08	2479.16	$ 96,781,448	2479.16	$ 96,781,448	2479.16	$ 96,781,448	2479.16	$ 96,781,448	278.11	$ 10,856,858.18	745.37	$ 29,097,754	1023.48	$ 39,954,612	41%	1455.7	$ 56,826,835.84
10.10	Pañete/Revoque Muros (ml) Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	337.76	$29,711.00	$ 10,035,187.36	337.76	$ 10,035,187	337.76	$ 10,035,187	337.76	$ 10,035,187	337.76	$ 10,035,187	0.00	$ -	29.40	$ 873,503	29.40	$ 873,503	9%	308.4	$ 9,161,683.96
10.11	Pañete bajo placa. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	1056.64	$39,030.00	$ 41,240,659.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
11	**ENCHAPES CERAMICOS Y PORCELANATO**				**$ 119,658,065.82**		**$ 119,658,065.82**		**$ 119,658,065.82**		**$ 146,366,417.51**		**$ 146,366,417.51**		$ -		$ -					
11.1	Enchape Muros en Porcelanato de 30x60cm, incluye pega, boquilla y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	80.66	$189,616.00	$ 15,294,426.56	80.66	$ 15,294,427	80.66	$ 15,294,427	218.73	$ 41,474,708	218.73	$ 41,474,708	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	218.7	$ 41,474,707.68
11.2	Piso en marmol Royal veta 20mm, instalado según despiece de planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	93.05	$234,479.00	$ 21,818,270.95	93.05	$ 21,818,271	93.05	$ 21,818,271	93.05	$ 21,818,271	93.05	$ 21,818,271	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	93.1	$ 21,818,270.95
11.3	Piso Terrazo grano de marmol fundido en sitio, destroncado, pulido y brillado, espesor 30mm, con dilatadores en bronce. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta	m2	324.62	$237,838.00	$ 77,206,971.56	324.62	$ 77,206,972	324.62	$ 77,206,972	324.62	$ 77,206,972	324.62	$ 77,206,972	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	324.6	$ 77,206,971.56
11.4	Guardaescoba Marmol royal veta 20x70mm acabado pulido sobre puesto en muro. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	38.59	$44,413.00	$ 1,713,897.67	38.59	$ 1,713,898	38.59	$ 1,713,898	50.48	$ 2,241,968	50.48	$ 2,241,968	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	50.5	$ 2,241,968.24
11.5	Mediacaña Granito fundido en sitio, pulida y brillada. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	84.06	$43,118.00	$ 3,624,499.08	84.06	$ 3,624,499	84.06	$ 3,624,499	84.06	$ 3,624,499	84.06	$ 3,624,499	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	84.1	$ 3,624,499.08
12	**PISOS**				**$ 204,736,415.10**		**$ 204,736,415.10**		**$ 204,736,415.10**		**$ 153,747,565.84**		**$ 153,747,565.84**		$ -		$ -					
12.1	Afinado pisos con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	1097.88	$56,266.00	$ 61,773,316.08	1097.88	$ 61,773,316	1097.88	$ 61,773,316	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
12.2	Afinado Tanque con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	58.46	$56,266.00	$ 3,289,310.36	58.46	$ 3,289,310	58.46	$ 3,289,310	25.01	$ 1,407,213	25.01	$ 1,407,213	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 1,407,212.66
12.3	Afinado escalera Descansos con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	18.77	$56,266.00	$ 1,056,112.82	18.77	$ 1,056,113	18.77	$ 1,056,113	124.08	$ 6,981,485	124.08	$ 6,981,485	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	124.1	$ 6,981,485.28
12.4	Afinado paso escalera con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	28.56	$22,226.00	$ 634,774.56	28.56	$ 634,775	28.56	$ 634,775	137.92	$ 3,065,410	137.92	$ 3,065,410	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	137.9	$ 3,065,409.92
12.5	Piso Vinilo de 2mm de espesor, referencia "Imparck Pixel clear". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta	m2	736.54	$148,091.00	$ 109,074,945.14	736.54	$ 109,074,945	736.54	$ 109,074,945	736.54	$ 109,074,945	736.54	$ 109,074,945	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	736.5	$ 109,074,945.14
12.6	Concreto 21 Mpa (3000 psi) endurecido pisos, pulido, esmaltado y brillado. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, malla electrosoldada, retiro y disposición de los sobrantes, y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	257.71	$101,530.00	$ 26,165,296.30	257.71	$ 26,165,296	257.71	$ 26,165,296	190.58	$ 19,349,587	190.58	$ 19,349,587	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	190.6	$ 19,349,587.40
12.7	Guardaescobas madera pieza en aglomerado MDF 70x10mm sellada con acabado en pintura esmalte color blanco mate instalada sobrepuesta en muro fijada con tornilleria oculta. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	108.56	$25,264.00	$ 2,742,659.84	108.56	$ 2,742,660	108.56	$ 2,742,660	548.96	$ 13,868,925	548.96	$ 13,868,925	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	549.0	$ 13,868,925.44
13	**IMPERMEABILIZACION**				**$ 57,804,106.99**		**$ 57,804,106.99**		**$ 57,804,106.99**		**$ 71,713,791.83**		**$ 71,713,791.83**		$ -		$ -					
13.1	Impermeabilización Foso de Ascensor según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	18.58	$115,256.00	$ 2,141,456.48	18.58	$ 2,141,456	18.58	$ 2,141,456	18.58	$ 2,141,456	18.58	$ 2,141,456	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.6	$ 2,141,456.48
13.2	Impermeabilizacion piso/muro zonas humedas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	120.05	$41,652.00	$ 5,000,322.60	120.05	$ 5,000,323	120.05	$ 5,000,323	288.62	$ 12,021,600	288.62	$ 12,021,600	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	288.6	$ 12,021,600.24
13.3	Impermeabilizacion cubiertas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	132.00	$151,904.00	$ 20,051,328.00	132.00	$ 20,051,328	132.00	$ 20,051,328	148.95	$ 22,626,101	148.95	$ 22,626,101	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	149.0	$ 22,626,100.80
13.4	Impermeabilización Interior Tanque según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	109.50	$138,840.00	$ 15,202,980.00	109.50	$ 15,202,980	109.50	$ 15,202,980	133.23	$ 18,497,653	133.23	$ 18,497,653	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	133.2	$ 18,497,653.20
13.5	Impermeabilización Exterior Igol denso Tanque según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta	m2	51.04	$24,146.00	$ 1,232,411.84	51.04	$ 1,232,412	51.04	$ 1,232,412	93.24	$ 2,251,373	93.24	$ 2,251,373	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	93.2	$ 2,251,373.04
13.6	Impermeabilización Muros Ladrillo según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	146.53	$19,565.00	$ 2,866,859.45	146.53	$ 2,866,859	146.53	$ 2,866,859	146.53	$ 2,866,859	146.53	$ 2,866,859	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	146.5	$ 2,866,859.45
13.7	Impermeabilizacion de Balcones y terrazas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	77.87	$145,226.00	$ 11,308,748.62	77.87	$ 11,308,749	77.87	$ 11,308,749	77.87	$ 11,308,749	77.87	$ 11,308,749	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	77.9	$ 11,308,748.62
14	**CIELO RASOS Y PARTICIONES LIVIANAS**				**$ 246,349,058.40**		**$ 246,349,058.40**		**$ 246,349,058.40**		**$ 323,047,568.00**		**$ 256,329,364.49**		$ -		$ -					
14.1	Cielos rasos fibrocemento/superboard 6mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	162.81	$134,271.00	$ 21,860,661.51	162.81	$ 21,860,662	162.81	$ 21,860,662	90.62	$ 12,167,638	90.62	$ 12,167,638	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	90.6	$ 12,167,638.02
14.2	Dilatacion cielos Z. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	378.00	$14,324.00	$ 5,414,472.00	378.00	$ 5,414,472	378.00	$ 5,414,472	378.00	$ 5,414,472	378.00	$ 5,414,472	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	378.0	$ 5,414,472.00
14.3	Cielo Raso en drywall egún indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	293.27	$106,783.00	$ 31,316,250.41	293.27	$ 31,316,250	293.27	$ 31,316,250	1154.29	$ 123,258,549	1154.29	$ 123,258,549	0.00	$ -	200.42	$ 21,401,449	200.42	$ 21,401,449	17%	953.9	$ 101,857,100.21
14.4	Tapas inspeccion cielo raso 20x20cm. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	16.00	$229,389.00	$ 3,670,224.00	16.00	$ 3,670,224	16.00	$ 3,670,224	16.00	$ 3,670,224	16.00	$ 3,670,224	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 3,670,224.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
14.5	Dinteles Especiales en Estructura Metalica 0.10 x 0.32. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	85.00	$164,224.00	$ 13,959,040.00	85.00	$ 13,959,040	85.00	$ 13,959,040	85.00	$ 13,959,040	85.00	$ 13,959,040	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	85.0	$ 13,959,040.00
14.6	tapas cielo rasos. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	120.00	$36,182.00	$ 4,341,840.00	120.00	$ 4,341,840	120.00	$ 4,341,840	120.00	$ 4,341,840	120.00	$ 4,341,840	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	120.0	$ 4,341,840.00
14.7	Muro Super board - fibrocemento dos cara 10mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	361.20	$157,143.00	$ 56,760,051.60	361.20	$ 56,760,052	361.20	$ 56,760,052	424.57	$ 66,718,204	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
14.8	Muro Super board - fibrocemento una cara 8mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	763.11	$112,781.00	$ 86,064,308.91	763.11	$ 86,064,309	763.11	$ 86,064,309	763.11	$ 86,064,309	763.11	$ 86,064,309	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	763.1	$ 86,064,308.91
14.9	Cielo raso en yeso perforado 12,5mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	83.91	$184,828.00	$ 15,508,917.48	83.91	$ 15,508,917	83.91	$ 15,508,917	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
15.10	Superboad de fachada 10mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	47.43	$157,143.00	$ 7,453,292.49	47.43	$ 7,453,292	47.43	$ 7,453,292	47.43	$ 7,453,292	47.43	$ 7,453,292	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	47.4	$ 7,453,292.49
15	**VENTANERIA Y VIDRIO**				**$ 519,867,712.69**		**$ 519,867,712.69**		**$ 519,867,712.69**		**$ 519,867,712.69**		**$ 519,867,712.69**		$ -		$ -					
15.1	Rejillas en aluminio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	45.00	$498,647.00	$ 22,439,115.00	45.00	$ 22,439,115	45.00	$ 22,439,115	45.00	$ 22,439,115	45.00	$ 22,439,115	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	45.0	$ 22,439,115.00
15.2	Ventaneria en vidrio en Aluminio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	264.30	$855,984.00	$ 226,236,571.20	264.30	$ 226,236,571	264.30	$ 226,236,571	264.30	$ 226,236,571	264.30	$ 226,236,571	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	264.3	$ 226,236,571.20
15.3	Puertas Ventanas y puertas en Vidrio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	74.94	$966,492.00	$ 72,428,910.48	74.94	$ 72,428,910	74.94	$ 72,428,910	74.94	$ 72,428,910	74.94	$ 72,428,910	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	74.9	$ 72,428,910.48
15.4	Fachada vidrio Ascensor según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	100.09	$1,207,069.00	$ 120,815,536.21	100.09	$ 120,815,536	100.09	$ 120,815,536	100.09	$ 120,815,536	100.09	$ 120,815,536	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	100.1	$ 120,815,536.21
15.5	Divisiones En vidrio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	80.65	$966,492.00	$ 77,947,579.80	80.65	$ 77,947,580	80.65	$ 77,947,580	80.65	$ 77,947,580	80.65	$ 77,947,580	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	80.7	$ 77,947,579.80
16	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 130,441,622.34**		**$ 130,441,622.34**		**$ 130,441,622.34**		**$ 130,441,622.34**		**$ 130,441,622.34**		$ -		$ -					
16.1	Pasamanos metalico según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	51.62	$152,266.00	$ 7,859,970.92	51.62	$ 7,859,971	51.62	$ 7,859,971	51.62	$ 7,859,971	51.62	$ 7,859,971	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	51.6	$ 7,859,970.92
16.2	Baranda metalica Escalera según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	24.84	$327,782.00	$ 8,142,104.88	24.84	$ 8,142,105	24.84	$ 8,142,105	24.84	$ 8,142,105	24.84	$ 8,142,105	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.8	$ 8,142,104.88
16.3	Escotilla según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	3.00	$370,765.00	$ 1,112,295.00	3.00	$ 1,112,295	3.00	$ 1,112,295	3.00	$ 1,112,295	3.00	$ 1,112,295	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 1,112,295.00
16.4	Puertas de emergencia Cortafuego (0.9-1.2 X 2.4) según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	11.00	$2,414,625.00	$ 26,560,875.00	11.00	$ 26,560,875	11.00	$ 26,560,875	11.00	$ 26,560,875	11.00	$ 26,560,875	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 26,560,875.00
16.5	Puerta Metalicas Sencillas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	22.00	$954,688.00	$ 21,003,136.00	22.00	$ 21,003,136	22.00	$ 21,003,136	22.00	$ 21,003,136	22.00	$ 21,003,136	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	22.0	$ 21,003,136.00
16.6	Puerta Metalicas Doble hoja (1.10 - 2.55) según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	14.00	$1,459,140.00	$ 20,427,960.00	14.00	$ 20,427,960	14.00	$ 20,427,960	14.00	$ 20,427,960	14.00	$ 20,427,960	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 20,427,960.00
16.7	Puerta Metalica Emergencia Doble cortafuego según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$5,028,457.00	$ 5,028,457.00	1.00	$ 5,028,457	1.00	$ 5,028,457	1.00	$ 5,028,457	1.00	$ 5,028,457	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 5,028,457.00
16.8	Puerta metalica Corrediza según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	4.00	$1,134,076.00	$ 4,536,304.00	4.00	$ 4,536,304	4.00	$ 4,536,304	4.00	$ 4,536,304	4.00	$ 4,536,304	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 4,536,304.00
16.9	Puerta acceso Peatonal según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$3,325,247.00	$ 3,325,247.00	1.00	$ 3,325,247	1.00	$ 3,325,247	1.00	$ 3,325,247	1.00	$ 3,325,247	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 3,325,247.00
16.10	Escalera Gato según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	2.00	$1,430,665.00	$ 2,861,330.00	2.00	$ 2,861,330	2.00	$ 2,861,330	2.00	$ 2,861,330	2.00	$ 2,861,330	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 2,861,330.00
16.11	Barandas terrazas/vacios según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	9.78	$851,155.00	$ 8,324,295.90	9.78	$ 8,324,296	9.78	$ 8,324,296	9.78	$ 8,324,296	9.78	$ 8,324,296	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.8	$ 8,324,295.90
16.12	Fachadas metalicas/celosia según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	39.12	$543,447.00	$ 21,259,646.64	39.12	$ 21,259,647	39.12	$ 21,259,647	39.12	$ 21,259,647	39.12	$ 21,259,647	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	39.1	$ 21,259,646.64

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
17	**CARPINTERIA MADERA**				**$ 11,866,063.00**		**$ 11,866,063.00**		**$ 11,866,063.00**		**$ 11,866,063.00**		**$ 11,866,063.00**		$ -		$ -					
17.1	Puerta sencilla en madera sencilla según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	11.00	$1,078,733.00	$ 11,866,063.00	11.00	$ 11,866,063	11.00	$ 11,866,063	11.00	$ 11,866,063	11.00	$ 11,866,063	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 11,866,063.00
18	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 96,293,982.00**		**$ 96,293,982.00**		**$ 96,293,982.00**		**$ 81,669,637.00**		**$ 77,544,033.00**		$ -		$ -					
18.1	Rejilla piso -baño redonda 3" X 2" plastica. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	30.00	$15,230.00	$ 456,900.00	30.00	$ 456,900	30.00	$ 456,900	30.00	$ 456,900	30.00	$ 456,900	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 456,900.00
18.2	Sanitario Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	16.00	$995,321.00	$ 15,925,136.00	16.00	$ 15,925,136	16.00	$ 15,925,136	16.00	$ 15,925,136	16.00	$ 15,925,136	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 15,925,136.00
18.3	Lavamanos Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	16.00	$735,934.00	$ 11,774,944.00	16.00	$ 11,774,944	16.00	$ 11,774,944	16.00	$ 11,774,944	16.00	$ 11,774,944	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 11,774,944.00
18.4	Griferia lavamanos Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	16.00	$332,857.00	$ 5,325,712.00	16.00	$ 5,325,712	16.00	$ 5,325,712	16.00	$ 5,325,712	16.00	$ 5,325,712	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 5,325,712.00
18.5	Meson Baños. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	25.00	$803,180.00	$ 20,079,500.00	25.00	$ 20,079,500	25.00	$ 20,079,500	25.00	$ 20,079,500	25.00	$ 20,079,500	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 20,079,500.00
18.6	Rejilla ventilacion. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	6.00	$31,318.00	$ 187,908.00	6.00	$ 187,908	6.00	$ 187,908	6.00	$ 187,908	6.00	$ 187,908	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 187,908.00
18.7	Sensor Lavamanos/Sanitario/Orinal. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	32.00	$587,755.00	$ 18,808,160.00	32.00	$ 18,808,160	32.00	$ 18,808,160	32.00	$ 18,808,160	35.00	$ 20,571,425	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	35.0	$ 20,571,425.00
18.8	Extractor baños. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	5.00	$229,389.00	$ 1,146,945.00	5.00	$ 1,146,945	5.00	$ 1,146,945	5.00	$ 1,146,945	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.9	Orinal institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4.00	$793,811.00	$ 3,175,244.00	4.00	$ 3,175,244	4.00	$ 3,175,244	4.00	$ 3,175,244	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.10	Secador de manos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.00	$550,512.00	$ 7,156,656.00	13.00	$ 7,156,656	13.00	$ 7,156,656	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.11	Barras de seguridad en L. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4.00	$391,670.00	$ 1,566,680.00	4.00	$ 1,566,680	4.00	$ 1,566,680	4.00	$ 1,566,680	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.12	Dispensador De Jabon. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.00	$164,843.00	$ 2,142,959.00	13.00	$ 2,142,959	13.00	$ 2,142,959	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.13	Percha. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	15.00	$33,515.00	$ 502,725.00	15.00	$ 502,725	15.00	$ 502,725	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.14	Dispensador de papel higienico. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	14.00	$174,843.00	$ 2,447,802.00	14.00	$ 2,447,802	14.00	$ 2,447,802	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.15	Dispensador de toallas de papel. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.00	$182,631.00	$ 2,374,203.00	13.00	$ 2,374,203	13.00	$ 2,374,203	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.16	Poceta de aseo. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4.00	$805,627.00	$ 3,222,508.00	4.00	$ 3,222,508	4.00	$ 3,222,508	4.00	$ 3,222,508	4.00	$ 3,222,508	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 3,222,508.00
19	**COCINAS**				**$ 5,885,880.60**		**$ 5,885,880.60**		**$ 5,885,880.60**		**$ 5,885,880.60**		**$ 2,601,185.30**		$ -		$ -					
19.1	Meson cocina quarztone. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	2.38	$1,092,935.00	$ 2,601,185.30	2.38	$ 2,601,185	2.38	$ 2,601,185	2.38	$ 2,601,185	2.38	$ 2,601,185	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.4	$ 2,601,185.30
19.2	Salpicadero en quarztone. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	2.38	$1,092,935.00	$ 2,601,185.30	2.38	$ 2,601,185	2.38	$ 2,601,185	2.38	$ 2,601,185	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
19.3	Griferia lavaplatos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1.00	$361,065.00	$ 361,065.00	1.00	$ 361,065	1.00	$ 361,065	1.00	$ 361,065	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
19.4	lavaplatos submontar. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1.00	$322,445.00	$ 322,445.00	1.00	$ 322,445	1.00	$ 322,445	1.00	$ 322,445	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
20	**OBRAS EXTERIORES**				**$ 142,537,851.00**		**$ 142,537,851.00**		**$ 142,537,851.00**		**$ -**		**$ -**		$ -		$ -					
20.1	Paisajismo	un	1.00	$64,093,890.00	$ 64,093,890.00	1.00	$ 64,093,890	1.00	$ 64,093,890	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
20.2	Obra de Urbanismo Externo	un	1.00	$48,292,509.00	$ 48,292,509.00	1.00	$ 48,292,509	1.00	$ 48,292,509	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
20.3	Bordillo en concreto 21 Mpa (3000 psi) fundido en sitio -Pisos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	ml	97.00	$29,398.00	$ 2,851,606.00	97.00	$ 2,851,606	97.00	$ 2,851,606	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
20.4	Andenes en Adoquin en Concreto 10cm x 8cm x 20cm. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	M2	135.00	$150,385.00	$ 20,301,975.00	135.00	$ 20,301,975	135.00	$ 20,301,975	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
20.5	Sardineles prefabricado bordillos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	ml	97.00	$72,143.00	$ 6,997,871.00	97.00	$ 6,997,871	97.00	$ 6,997,871	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
21	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 481,589,895.00**		**$ 408,995,346.00**		**$ 408,995,346.00**		**$ 373,290,826.00**		**$ 373,290,826.00**		$ -		$ -					
21.1	Equipo Presion Agua potable según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$35,704,520.00	$ 35,704,520.00	1.00	$ 35,704,520	1.00	$ 35,704,520	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
21.2	Desmontaje y reinstalación de ascensor existente. Incluye el desmontaje cuidadoso del ascensor existente, compuesto por cabina, motor, rieles, puertas, contrapesos y demás componentes mecánicos y eléctricos. Se realizarán las labores de almacenamiento temporal en sitio o área designada, garantizando la integridad de los elementos. Posteriormente, se llevará a cabo la reinstalación en la misma ubicación, con ajuste y nivelación de rieles, conexión eléctrica, pruebas de funcionamiento y calibración del sistema, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad y operatividad del equipo.	un	1.00	$22,470,021.00	$ 22,470,021.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
21.3	Equipo Incendio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$373,290,826.00	$ 373,290,826.00	1.00	$ 373,290,826	1.00	$ 373,290,826	1.00	$ 373,290,826	1.00	$ 373,290,826	0.95	$ 354,626,284.70	0.05	$ 18,664,541	1.00	$ 373,290,826	100%	0.0	$ -
21.4	UPS 30 KVA 208-120V según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$50,124,528.00	$ 50,124,528.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22	**ILUMINACION**				**$ 70,970,829.00**		**$ 70,970,829.00**		**$ 70,970,829.00**		**$ 45,160,179.00**		**$ 26,980,269.00**		$ -		$ -					
22.1	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED PANEL DE 60x60cm, 40W, color 4000K (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	173.00	$144,285.00	$ 24,961,305.00	173.00	$ 24,961,305	173.00	$ 24,961,305	173.00	$ 24,961,305	47.00	$ 6,781,395	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	47.0	$ 6,781,395.00
22.2	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED PANEL CIRCULAR DE 18W, color 4000K RD 18W (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	120.00	$25,861.00	$ 3,103,320.00	120.00	$ 3,103,320	120.00	$ 3,103,320	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.3	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED HERMETICA DE SOBREPONER 40W, IP65, color 4000K (VER ESPECIFICACIONES TECNCIAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	un	43.00	$128,463.00	$ 5,523,909.00	43.00	$ 5,523,909	43.00	$ 5,523,909	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.4	Suministro, transporte e instalación de proyector LED 100W 120V. (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	3.00	$214,236.00	$ 642,708.00	3.00	$ 642,708	3.00	$ 642,708	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.5	Suministro, transporte e instalación de proyector LED 70W 120V. (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	4.00	$108,527.00	$ 434,108.00	4.00	$ 434,108	4.00	$ 434,108	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.6	Suministro, transporte e instalación de Luminaria APLIQUE DE PARED LED 7W, IP 65 para uso exterior, TIPO TORTUGA. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	4.00	$128,146.00	$ 512,584.00	4.00	$ 512,584	4.00	$ 512,584	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.7	Suministro, transporte e instalación de luminaria de EVACUACION Y EMERGENCIA , LED 4W 120V.(VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	109.00	$117,444.00	$ 12,801,396.00	109.00	$ 12,801,396	109.00	$ 12,801,396	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.8	Suministro, transporte e instalación de luminaria de EVACUACION Y EMERGENCIA , LED CON AVISO DE SALIDA LUMINOSO Fabricada por SYLVANIA REF: P33718 (VER ESPECIFICACIONES TECNCIAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	un	25.00	$111,705.00	$ 2,792,625.00	25.00	$ 2,792,625	25.00	$ 2,792,625	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.9	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de INTERRUPTOR SENCILLO, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZH(FASE-TIERRA), interruptor sencillo 15A, 120V conectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correctainstalación	un	48.00	$113,161.00	$ 5,431,728.00	48.00	$ 5,431,728	48.00	$ 5,431,728	48.00	$ 5,431,728	48.00	$ 5,431,728	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	48.0	$ 5,431,728.00
22.10	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de INTERRUPTOR DOBLE, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZH(FASE-TIERRA), interruptor doble 15A, 120V conectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	15.00	$116,728.00	$ 1,750,920.00	15.00	$ 1,750,920	15.00	$ 1,750,920	15.00	$ 1,750,920	15.00	$ 1,750,920	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	15.0	$ 1,750,920.00
22.11	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de INTERRUPTOR TRIPLE, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZH(FASE-TIERRA), interruptor doble 15A, 120V conectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	6.00	$118,511.00	$ 711,066.00	6.00	$ 711,066	6.00	$ 711,066	6.00	$ 711,066	6.00	$ 711,066	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 711,066.00
22.12	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo, infrarrojo-ultrasonico, amplitud de 360º, 1000W (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZHconectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	56.00	$219,735.00	$ 12,305,160.00	56.00	$ 12,305,160	56.00	$ 12,305,160	56.00	$ 12,305,160	56.00	$ 12,305,160	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	56.0	$ 12,305,160.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
23	**COMUNICACIONES**														$ -		$ -					
23.1	**SALIDAS**				**$ 30,823,171.00**		**$ 30,823,171.00**		**$ 30,823,171.00**		**$ 30,823,171.00**		**$ 30,823,171.00**		$ -		$ -					
23.101	Salida de Datos	Und	281.00	$109,691.00	$ 30,823,171.00	281.00	$ 30,823,171	281.00	$ 30,823,171	281.00	$ 30,823,171	281.00	$ 30,823,171	0.00	$ -	16.00	$ 1,755,056	16.00	$ 1,755,056	6%	265.0	$ 29,068,115.00
23.200	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 155,325,571.00**		**$ 155,325,571.00**		**$ 119,548,877.04**		**$ 152,345,146.00**		**$ 152,345,146.00**		$ -		$ -					
23.201	Cable UTP Cat 6A LZOH. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	9760.00	$ 10,556.00	$ 103,026,560.00	9760.00	$ 103,026,560	6370.77	$ 67,249,866	9760.00	$ 103,026,560	9760.00	$ 103,026,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9760.0	$ 103,026,560.00
23.202	Toma RJ45 Cat 6A para Puestos de trabajo. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 13,984.00	$ 3,929,504.00	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 3,929,504.00
23.203	Toma RJ45 Cat 6A para herraje en Rack. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 13,984.00	$ 3,929,504.00	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 3,929,504.00
23.204	Faceplate doble para cat 6A. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	175.00	$ 16,731.00	$ 2,927,925.00	175.00	$ 2,927,925	175.00	$ 2,927,925	175.00	$ 2,927,925	175.00	$ 2,927,925	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	175.0	$ 2,927,925.00
23.205	Modulo Angulado para faceplete doble. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	175.00	$ 7,578.00	$ 1,326,150.00	175.00	$ 1,326,150	175.00	$ 1,326,150	175.00	$ 1,326,150	175.00	$ 1,326,150	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	175.0	$ 1,326,150.00
23.206	Herraje de 24 Puertos Cat 6A. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	14.00	$ 273,448.00	$ 3,828,272.00	14.00	$ 3,828,272	14.00	$ 3,828,272	14.00	$ 3,828,272	14.00	$ 3,828,272	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 3,828,272.00
23.207	Organizador de 2UR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	14.00	$ 129,926.00	$ 1,818,964.00	14.00	$ 1,818,964	14.00	$ 1,818,964	14.00	$ 1,818,964	14.00	$ 1,818,964	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 1,818,964.00
23.208	Patch Cord Cat 6A de 1,5 mts azul para rack. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 31,173.00	$ 8,759,613.00	281.00	$ 8,759,613	281.00	$ 8,759,613	281.00	$ 8,759,613	281.00	$ 8,759,613	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 8,759,613.00
23.209	Patch Cord Cat 6A de 3 mts azul para rack. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 39,017.00	$ 10,963,777.00	281.00	$ 10,963,777	281.00	$ 10,963,777	281.00	$ 10,963,777	281.00	$ 10,963,777	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 10,963,777.00
23.210	Certificación de punto de red e informe impreso, validando el cumplimiento de las características dispuestas por el fabricante y los mínimos dispuestos en el documento de especificaciones técnicas. (La certificación debe ser realizada con el equipo debidamente calibrado)	Und	281.00	$ 23,532.00	$ 6,612,492.00	281.00	$ 6,612,492	281.00	$ 6,612,492	281.00	$ 6,612,492	281.00	$ 6,612,492	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 6,612,492.00
23.211	Marcación	Und	281.00	$ 18,585.00	$ 5,222,385.00	281.00	$ 5,222,385	281.00	$ 5,222,385	281.00	$ 5,222,385	281.00	$ 5,222,385	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 5,222,385.00
23.212	Rack de cableado de 60x60cm de 40UR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 993,475.00	$ 2,980,425.00	3.00	$ 2,980,425	3.00	$ 2,980,425	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.300	**SALAS DE AUDIENCIA**				**$ 11,339,800.00**		**$ 11,339,800.00**		**$ 11,339,800.00**		**$ -**		**$ -**		$ -		$ -					
23.301	Rack para salas de Audiencia de piso. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	6.00	$ 524,707.00	$ 3,148,242.00	6.00	$ 3,148,242	6.00	$ 3,148,242	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.302	Cámaras para grabación salas de audiencia. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	6.00	$ 273,760.00	$ 1,642,560.00	6.00	$ 1,642,560	6.00	$ 1,642,560	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
23.303	Micrófonos de salas de audiencia. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	31.00	$ 211,258.00	$ 6,548,998.00	31.00	$ 6,548,998	31.00	$ 6,548,998	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.400	**EQUIPOS IT**				**$ 19,117,917.00**		**$ 19,117,917.00**		**$ 19,117,917.00**		**$ -**		**$ -**		$ -		$ -					
23.401	Switch de 48 Puertos administrable para montaje en Rack (debe contar con puertos POE para alimentar las cámaras). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	7.00	$2,731,131.00	$ 19,117,917.00	7.00	$ 19,117,917	7.00	$ 19,117,917	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.500	**BACKBONE FIBRA**				**$ 3,040,138.00**		**$ 3,040,138.00**		**$ 3,040,138.00**		**$ 3,040,138.00**		**$ 3,040,138.00**		$ -		$ -					
23.501	Fibra Óptica multimodo de 6 Hilos para interior OM4 - Back bone en Piso. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	30.00	$ 40,470.00	$ 1,214,100.00	30.00	$ 1,214,100	30.00	$ 1,214,100	30.00	$ 1,214,100	30.00	$ 1,214,100	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 1,214,100.00
23.502	Conector SC para fibra óptica. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	24.00	$ 8,647.00	$ 207,528.00	24.00	$ 207,528	24.00	$ 207,528	24.00	$ 207,528	24.00	$ 207,528	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.0	$ 207,528.00
23.503	Bandeja de Fibra óptica para tres módulos cada uno con 6 espacios. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 132,822.00	$ 398,466.00	3.00	$ 398,466	3.00	$ 398,466	3.00	$ 398,466	3.00	$ 398,466	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 398,466.00
23.504	Modulo para fibra óptica de 6 espacios. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	4.00	$ 305,011.00	$ 1,220,044.00	4.00	$ 1,220,044	4.00	$ 1,220,044	4.00	$ 1,220,044	4.00	$ 1,220,044	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 1,220,044.00
23.600	**CCTV**				**$ 12,136,697.00**		**$ 6,661,497.00**		**$ 6,661,497.00**		**$ -**		**$ -**		$ -		$ -					
23.601	Cámara tipo domo de interior verificar. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	36.00	$ 273,760.00	$ 9,855,360.00	16.00	$ 4,380,160	16.00	$ 4,380,160	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.602	Cámara tipo PTZ para exterior ubicada en piso 4. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 335,950.00	$ 335,950.00	1.00	$ 335,950	1.00	$ 335,950	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.603	NVR con disco duro para grabación de mínimo 2 meses. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 617,211.00	$ 617,211.00	1.00	$ 617,211	1.00	$ 617,211	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.604	Puesta en marcha por personar cetificado por el fabricante	Und	1.00	$ 1,328,176.00	$ 1,328,176.00	1.00	$ 1,328,176	1.00	$ 1,328,176	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.700	**CONTROL DE ACCESO**				**$ 20,559,776.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		$ -		$ -					
23.701	Lectora de pared para control de acceso. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	20.00	$ 202,351.00	$ 4,047,020.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.702	Electroimán. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	10.00	$ 471,893.00	$ 4,718,930.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.703	Botón para Salida de Emergencia. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	10.00	$ 273,760.00	$ 2,737,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

OBRA: OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTA 004

CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
23.704	Controladora para 4 puertas, incluye fuentes de poder (2 fuentes por controladora). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 648,774.00	$ 1,946,322.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.705	Tarjeta de proximidad para controladora. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	100.00	$ 21,094.00	$ 2,109,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.706	Estación de enrolamiento para tarjetas. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 1,484,744.00	$ 1,484,744.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.707	Puesta en marcha por personar cetificado por el fabricante	Und	1.00	$ 3,515,760.00	$ 3,515,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.800	**CANALIZACION**				**$ 25,843,303.00**		**$ 25,843,303.00**		**$ 25,843,303.00**		**$ 25,843,303.00**		**$ 25,843,303.00**		$ -		$ -					
23.801	Tubería EMT de 1" para red de cableado estructurado, incluye accesorios de montaje. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	719.00	$ 32,488.00	$ 23,358,872.00	719.00	$ 23,358,872	719.00	$ 23,358,872	719.00	$ 23,358,872	719.00	$ 23,358,872	0.00	$ -	400.00	$ 12,995,200	400.00	$ 12,995,200	56%	319.0	$ 10,363,672.00
23.802	Tubería EMT de 1-1/2" para ingreso proveedores. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	25.00	$ 43,719.00	$ 1,092,975.00	25.00	$ 1,092,975	25.00	$ 1,092,975	25.00	$ 1,092,975	25.00	$ 1,092,975	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 1,092,975.00
23.803	Caja de paso de 15x15cm. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	5.00	$ 74,221.00	$ 371,105.00	5.00	$ 371,105	5.00	$ 371,105	5.00	$ 371,105	5.00	$ 371,105	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 371,105.00
23.804	Gabinete de 60x60 ingreso de proveedores telecomunicaciones, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00	$ 336,419.00	$ 336,419.00	1.00	$ 336,419	1.00	$ 336,419	1.00	$ 336,419	1.00	$ 336,419	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 336,419.00
23.805	Caja de piso exterior de 60x60 para ingreso de proveedores de telecomunicaciones. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 586,272.00	$ 586,272.00	1.00	$ 586,272	1.00	$ 586,272	1.00	$ 586,272	1.00	$ 586,272	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 586,272.00
23.806	Tubería PVC para comunicación de caja exterior con Gabinete de ingreso proveedores 1-1/2".Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	5.00	$ 19,532.00	$ 97,660.00	5.00	$ 97,660	5.00	$ 97,660	5.00	$ 97,660	5.00	$ 97,660	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 97,660.00
24	**SEGURIDAD Y CONTROL**														$ -		$ -					
24.100	**DETECCIÓN DE INCENDIO**				**$ 72,415,173.00**		**$ 72,415,173.00**		**$ 72,415,173.00**		**$ -**		**$ -**		$ -		$ -					
24.101	Detector de humo fotoeléctrico. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	90.00	$ 316,722.00	$ 28,504,980.00	90.00	$ 28,504,980	90.00	$ 28,504,980	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.102	Detector de Temperatura. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	2.00	$ 257,621.00	$ 515,242.00	2.00	$ 515,242	2.00	$ 515,242	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.103	Estación Manual. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	12.00	$ 666,784.00	$ 8,001,408.00	12.00	$ 8,001,408	12.00	$ 8,001,408	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.104	Alarma Audición visual. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	19.00	$ 530,397.00	$ 10,077,543.00	19.00	$ 10,077,543	19.00	$ 10,077,543	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
24.105	Modulo de Relé simple para integración con control de acceso, Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 507,968.00	$ 1,523,904.00	3.00	$ 1,523,904	3.00	$ 1,523,904	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.106	Panel de incendio, incluye baterías y accesorios para su correcto funcionamiento, debe contar con al menos 2 nacs 1 loops para 250 equipos y tarjeta expansora para un loop adiciona para 250 equipos, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00	$ 10,911,025.00	$ 10,911,025.00	1.00	$ 10,911,025	1.00	$ 10,911,025	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.107	Puesta en marcha por ingeniero certificado	GL	1.00	$ 12,881,071.00	$ 12,881,071.00	1.00	$ 12,881,071	1.00	$ 12,881,071	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.200	**INFRAESTRUCTURA**				**$ 37,884,966.00**		**$ 37,884,966.00**		**$ 37,884,966.00**		**$ 37,884,966.00**		**$ 37,884,966.00**		$ -		$ -					
24.201	Cableado 2x16. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	920.00	$ 10,238.00	$ 9,418,960.00	920.00	$ 9,418,960	920.00	$ 9,418,960	920.00	$ 9,418,960	920.00	$ 9,418,960	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	920.0	$ 9,418,960.00
24.202	Tuberías EMT de 3/4" con accesorios de instalación. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	580.00	$ 26,519.00	$ 15,381,020.00	580.00	$ 15,381,020	580.00	$ 15,381,020	580.00	$ 15,381,020	580.00	$ 15,381,020	0.00	$ -	300.00	$ 7,955,700	300.00	$ 7,955,700	52%	280.0	$ 7,425,320.00
24.203	Salidas para sensor, incluye cajas y accesorios de conexión. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	92.00	$ 106,382.00	$ 9,787,144.00	92.00	$ 9,787,144	92.00	$ 9,787,144	92.00	$ 9,787,144	92.00	$ 9,787,144	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	92.0	$ 9,787,144.00
24.204	Salidas para estación manual o señal audiovisual, incluye cajas y accesorios de conexión	Und	31.00	$ 106,382.00	$ 3,297,842.00	31.00	$ 3,297,842	31.00	$ 3,297,842	31.00	$ 3,297,842	31.00	$ 3,297,842	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	31.0	$ 3,297,842.00
25.000	**VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO**				**$ 101,065,840.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		$ -		$ -					
25.100	Minsplit 24000 BTU. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	20.00	$ 5,053,292.00	$ 101,065,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
26.000	**CERRADURAS**				**$ 4,245,669.00**		**$ 4,245,669.00**		**$ 4,245,669.00**		**$ 1,737,747.00**		**$ 1,737,747.00**		$ -		$ -					
26.100	Tope Puertas. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	113.00	$ 22,194.00	$ 2,507,922.00	113.00	$ 2,507,922	113.00	$ 2,507,922	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
26.200	Cerraduras puertas en madera. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	11.00	$ 157,977.00	$ 1,737,747.00	11.00	$ 1,737,747	11.00	$ 1,737,747	11.00	$ 1,737,747	11.00	$ 1,737,747	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 1,737,747.00
27.000	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 12,616,418.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		$ -		$ -					
27.100	Espejos 4 mm dilatado con marco negro. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	38.00	$ 332,011.00	$ 12,616,418.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
28	**PINTURA**				**$ 173,074,001.23**		**$ 172,877,528.64**		**$ 172,877,528.64**		**$ 167,278,496.39**		**$ 167,215,457.05**		$ -		$ -					
28.1	Pintura Bajo Escalera, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	40.60	$ 11,142.00	$ 452,365.20	40.60	$ 452,365	40.60	$ 452,365	40.60	$ 452,365	40.60	$ 452,365	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	40.6	$ 452,365.20
28.2	Filos y dilataciones en pintura (Fachada). Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	246.43	$ 9,473.00	$ 2,334,431.39	246.43	$ 2,334,431	246.43	$ 2,334,431	246.43	$ 2,334,431	246.43	$ 2,334,431	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	246.4	$ 2,334,431.39
28.3	Filos y dilataciones en pintura. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	1137.95	$ 8,477.00	$ 9,646,402.15	1114.77	$ 9,449,930	1114.77	$ 9,449,930	1114.77	$ 9,449,905	1107.33	$ 9,386,866	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1107.3	$ 9,386,865.95
28.4	Estuco y pintura 3 manos. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	2462.14	$ 38,571.00	$ 94,967,201.94	2462.14	$ 94,967,202	2462.14	$ 94,967,202	2316.98	$ 89,368,194	2316.98	$ 89,368,194	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2317.0	$ 89,368,193.96
28.5	Pintura bajo placa y cielo rasos. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	1762.00	$ 23,008.00	$ 40,540,096.00	1762.00	$ 40,540,096	1762.00	$ 40,540,096	1762.00	$ 40,540,096	1762.00	$ 40,540,096	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1762.0	$ 40,540,096.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
28.6	Pintura borde placa (Fachadas). Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ml	436.21	$ 17,053.00	$ 7,438,689.13	436.21	$ 7,438,689	436.21	$ 7,438,689	436.21	$ 7,438,689	436.21	$ 7,438,689	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	436.2	$ 7,438,689.13
28.7	Pintura (Fachadas). Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	283.25	$ 27,068.00	$ 7,667,011.00	283.25	$ 7,667,011	283.25	$ 7,667,011	283.25	$ 7,667,011	283.25	$ 7,667,011	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	283.3	$ 7,667,011.00
28.8	Demarcaciones. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	un	1.00	$ 7,105,633.00	$ 7,105,633.00	1.00	$ 7,105,633	1.00	$ 7,105,633	1.00	$ 7,105,633	1.00	$ 7,105,633	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 7,105,633.00
28.9	Pintura antihongo. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	49.62	$ 58,891.00	$ 2,922,171.42	49.62	$ 2,922,171	49.62	$ 2,922,171	49.62	$ 2,922,171	49.62	$ 2,922,171	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	49.6	$ 2,922,171.42
29	**ASEO-LIMPIEZA-MANTENIMIENTO**				**$ 53,441,316.52**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		$ -		$ -					
29.1	Limpieza escaleras	tra	6.00	$ 978,374.00	$ 5,870,244.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
29.2	Limpieza 3 manos	m2	1762.00	$ 13,546.00	$ 23,868,052.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
29.3	Limpieza vidrios	m2	1415.00	$ 13,095.00	$ 18,529,425.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
29.4	Limpieza Cubierta	m2	410.00	$ 6,906.00	$ 2,831,460.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
29.5	Limpieza aseo ladrillo	m2	146.53	$ 15,984.00	$ 2,342,135.52	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
30	**NO PREVISTOS**				$ -		**$ 316,857,845.68**		**$ 352,634,539.64**		**$ 746,914,848.85**		**$ 832,298,437.67**		$ -		$ -					
NP01	DESMONTE DE LAMPARAS, consiste en el desmote técnico de las luminarias, y su posterior traslado a sitio de recolección por parte del contratante, incluye mano de obra, Epp, Andamios y demás elementos para el desarrollo de la actividad	Und		$ 25,069.00		54.00	$ 1,353,726	54.00	$ 1,353,726	54.00	$ 1,353,726	54.00	$ 1,353,726	54.00	$ 1,353,726.00		$ -	54.00	$ 1,353,726	100%	0.0	$ -
NP02	DESMONTE DE VENTANERIA, consiste en el desmote técnico de las ventanas existentes, y su posterior traslado a sitio de recolección por parte del contratante, incluye mano de obra, Epp, Andamios y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M2		$ 27,576.00		132.35	$ 3,649,546	132.35	$ 3,649,546	132.35	$ 3,649,546	132.35	$ 3,649,546	132.35	$ 3,649,545.72		$ -	132.35	$ 3,649,546	100%	0.0	$ -
NP03	RETIRO CASETON EN GUADUA EXISTENTE, consiste en el desmote técnico de los casetones de guadua incrustados en las placas de contrapiso existentes, incluye mano de obra, Epp, Andamios, retiro y disposición final de los residuos y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M		$ 19,070.00		1132.37	$ 21,594,296	1132.37	$ 21,594,296	1132.37	$ 21,594,296	1301.54	$ 24,820,368	1132.51	$ 21,596,965.70		$ -	1132.51	$ 21,596,966	87%	169.0	$ 3,223,402.10
NP04	RECUBRIMIENTO DE ACERO DE REFUERZO EN VIGUETAS, debido a problemas constructivos evidenciados en el momento de retirar la torta inferior de las placas aligeradas de entrepiso existentes, como hormigueos por vibrado, y otros derivados del retiro de los casetones, y por recomendación del Ing. Consultor se deben hacer reparaciones puntuales en la sección de las viguetas para resolver los aceros expuestos mediante la aplicación de un mortero de reparación que garantice el recubrimiento mínimo, según las evidencias encontradas en obra las viguetas deben ser reparadas en aproximadamente el 30% de su área superficial, la tarea consiste en aplicación de Mortero tixotrópico, para la reparación del concreto, que no requiere puente de adherencia, en espesor minimo de 2.5 cm sobre aceros expuestos, esta intervencion no garantiza niveles hilos o filos por lo que su finalidad es unicamente la proteccion de los aceros en un area que luego sera recubierta por cielorasos, incluye limpieza y retiro de material suelto, aplicacion de mortero de reparacion con llana de madera, mano de obra Epp, Andamios, y demás elementos necesarios para su correcta aplicación, se pagara por el total de las viguetas existentes en el proyecto.	M		85513.0		1301.54	$ 111,298,590	1301.54	$ 111,298,590	1301.54	$ 111,298,590	1301.54	$ 111,298,590	683.80	$ 58,473,789.40		$ -	683.80	$ 58,473,789	53%	617.7	$ 52,824,800.62
NP05	DESMANTELAMIENTO REDES ELECTRICAS EXISTENTES, consiste en la desconexión y retiro de conductores existentes en el proyecto.	GL		$ 1,003,080.00		1.00	$ 1,003,080	1.00	$ 1,003,080	1.00	$ 1,003,080	1.00	$ 1,003,080	1.00	$ 1,003,080.00		$ -	1.00	$ 1,003,080	100%	0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
NP06	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ACABADOS DE PISO Y AFINADOS, consiste en la demolición técnica de acabados de tableta de granito o cerámicos y su consecuente afinado de piso, en las placas de la edificación existente que buscan llegara el nivel original de la placa de entrepiso o contrapiso existentes para lograr las alturas de máximas, esta labor incluye herramienta menor y equipos y retiro de escombros	M2		$ 46,105.53		1259.77	$ 58,082,364	1259.77	$ 58,082,364	1259.77	$ 58,082,364	1259.77	$ 58,082,364	1259.77	$ 58,082,363.53		$ -	1259.77	$ 58,082,364	100%	0.0	$ 0.00
NP07	CONTRAPLACA EN LOSAS DE ENTREPISO, se requiere la construcción de contraplaca para garantizar una losa resistente toda vez que las existentes en el proyecto carecen de aceros de refuerzo, esta actividad consiste en aplicacion de concreto para recalce de placas de 3.000 PSI grava comun de concreto bombeable, en espesor de 50 mm, incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada Q2 (4mmX4mm 150mmX150mm) y mano de obra, sobre la misma se requiere pendientados afinados de piso pues no es de acabado final	M2		$ 85,749.00		1397.99	$ 119,876,245	1397.99	$ 119,876,245	1397.99	$ 119,876,245	1000.00	$ 85,749,000	846.54	$ 72,589,958.46	36.62	$ 3,140,128	883.16	$ 75,730,087	88%	116.8	$ 10,018,913.16
NP08	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	M2		$ 48,574.00				736.54	$ 35,776,694	756.42	$ 36,742,345	756.42	$ 36,742,345	619.05	$ 30,069,734.70	137.37	$ 6,672,610	756.42	$ 36,742,345	100%	0.000	$ -
NP009	Construcción de cárcamo porta cable en concreto de 3000 psi, con sección libre de 30x30, espesor de muros 10cm, incluye excavación manual, relleno en material seleccionado y compactación, concreto de limpieza, acero de refuerzo formaletas y en general todos los materiales y accesorios para su correcta construcción, se paga por ml a eje de cárcamo construido.	ML		$ 344,171.00						10.55	$ 3,631,004	10.55	$ 3,631,004	0.00	$ -	8.05	$ 2,770,577	8.05	$ 2,770,577	76%	2.5	$ 860,427.50
NP010	Concreto superfluido para recalce, concreto grava fina 1/2", con plastificante y acelerante resistencia a la compresión de 4.000 psi mezclado en obra.	M3		$ 4,280,157.00						3.25	$ 13,910,510	3.25	$ 13,910,510	0.48	$ 2,054,475.36	1.07	$ 4,579,768	1.55	$ 6,634,243	48%	1.7	$ 7,276,266.90
NP011	Demolicion controlada de superficies de concreto para llegar a aceros de refuerzo en elementos a reforzar	M3		$ 2,171,554.00						3.25	$ 7,057,551	3.25	$ 7,057,551	0.48	$ 1,042,345.92	1.07	$ 2,323,563	1.55	$ 3,365,909	48%	1.7	$ 3,691,641.80
NP012	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12	ML		$ 75,548.00						400.00	$ 30,219,200	400.00	$ 30,219,200	52.50	$ 3,966,270.00	198.24	$ 14,976,636	250.74	$ 18,942,906	63%	149.3	$ 11,276,294.48
NP013	Placa aérea vigas descolgadas H= 0.30 a 0.40 m en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Edificio ampliado. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M2		$ 403,984.73						156.10	$ 63,062,016	156.10	$ 63,062,016	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	156.1	$ 63,062,016.36
NP014	SUMINISTRO E INSTALACION PLÁSTICO NEGRO CAL 3.5 EN SUPERFIECIE PLACAS DE CONRAPISO	M2		$ 2,625.00						388.10	$ 1,018,763	388.10	$ 1,018,763	0.00	$ -	275.84	$ 724,080	275.84	$ 724,080	71%	112.3	$ 294,682.50
NP015	CONCRETO DE 3000 P.S.I PLACA DE CONTRAPISO 10CM	M2		$ 132,935.00						388.10	$ 51,592,074	388.10	$ 51,592,074	0.00	$ -	275.84	$ 36,668,790	275.84	$ 36,668,790	71%	112.3	$ 14,923,283.10
NP016	Recuperación de equipo ascensor	UND		$ 3,539,363.45						1.00	$ 3,539,363	1.00	$ 3,539,363	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 3,539,363.45
NP017	Acompañamiento certificación equipo	UND		$ 2,690,818.48						1.00	$ 2,690,818	1.00	$ 2,690,818	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 2,690,818.48
NP018	Suministro e instalación de poste de concreto de 12mts x 1500kg. Trabajos con cuadrilla de línea energizada.	UN		$ 5,205,000.00						1.00	$ 5,205,000	1.00	$ 5,205,000	1.00	$ 5,205,000.00		$ -	1.00	$ 5,205,000	100%	0.0	$ -
NP019	Suministro e instalación de estructura de paso sencillo pin trifásica en bandera 523A para 13.2kv. Trabajos con cuadrilla de línea energizada.	UN		$ 2,902,800.00						1.00	$ 2,902,800	1.00	$ 2,902,800	0.00	$ -	1.00	$ 2,902,800	1.00	$ 2,902,800	100%	0.0	$ -
NP020	Desmonte de estructuras y postes existentes con cuadrilla de línea energizada.	UN		$ 3,785,000.00						1.00	$ 3,785,000	1.00	$ 3,785,000	0.00	$ -	1.00	$ 3,785,000	1.00	$ 3,785,000	100%	0.0	$ -
NP021	Traslado de estructura de derivación alimentador transformador Davivienda, con cuadrilla de línea energizada	UN		$ 3,415,000.00						1.00	$ 3,415,000	1.00	$ 3,415,000	0.00	$ -	1.00	$ 3,415,000	1.00	$ 3,415,000	100%	0.0	$ -
NP022	Cierre de puentes de cortacircuitos con cuadrilla de línea energizada.	UN		$ 905,000.00						3.00	$ 2,715,000	3.00	$ 2,715,000	0.00	$ -	3.00	$ 2,715,000	3.00	$ 2,715,000	100%	0.0	$ -
NP023	Fundida de bases de postes de concreto de 12 mts	UN		$ 186,836.00						1.00	$ 186,836	1.00	$ 186,836	1.00	$ 186,836.00	0.00	$ -	1.00	$ 186,836	100%	0.0	$ -
NP024	Suministro e instalacion de transformador trifásico convencional de 150 KVA 13200/220-127V. Incluye estructura para montaje de equipo separado de fachada para cumplimiento de distancias de seguridad.	UN		$ 27,454,400.00						1.00	$ 27,454,400	1.00	$ 27,454,400	0.95	$ 26,081,680.00	0.05	$ 1,372,720	1.00	$ 27,454,400	100%	0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 004

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	21 de enero de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
NP025	Suministro e instalación de protecciones para transformador trifásico tipo 711 hasta 13.2 KV y SPT. Incluye cortacircuitos con camara apagachispa.	UN		$ 4,750,500.00						1.00	$ 4,750,500	1.00	$ 4,750,500	0.00	$ -	1.00	$ 4,750,500	1.00	$ 4,750,500	100%	0.0	$ -
NP026	Suministro e instalación de dos (2) ductos conduit galvanizados imc de 4"	ML		$ 610,080.00						6.00	$ 3,660,480	6.00	$ 3,660,480	0.00	$ -	6.00	$ 3,660,480	6.00	$ 3,660,480	100%	0.0	$ -
NP027	Suministro e instalación de banco de tres (3) ductos conduit pvc de 4". Incluye demolición de piso de concreto, excavación, compactación y resanes.	ML		$ 106,200.00						8.00	$ 849,600	8.00	$ 849,600	0.00	$ -	8.00	$ 849,600	8.00	$ 849,600	100%	0.0	$ -
NP028	Suministro e instalación de ocho 2x(3F+1N) conductores en cable de cobre THHN 2x(3No. 4/0 +1No. 4/0 awg) + 1No. 2T awg, desde bornes del transformador hasta protección principal en celda de dsitribución general de BT.	ML		$ 1,103,600.00						20.00	$ 22,072,000	20.00	$ 22,072,000	0.00	$ -	20.00	$ 22,072,000	20.00	$ 22,072,000	100%	0.0	$ -
NP029	Suministro e instalación de grupo de medida indirecta para nivel 2, 3 elementos para 13.2 KV, uso exterior y calibrado.	UN		$ 33,131,000.00						1.00	$ 33,131,000	1.00	$ 33,131,000	0.00	$ -	1.00	$ 33,131,000	1.00	$ 33,131,000	100%	0.0	$ -
NP030	Elaboración de memorias de calculo, planos eléctricos y tramites de aprobacion diseño ante el operador de red.	UN		$ 7,740,000.00						1.00	$ 7,740,000	1.00	$ 7,740,000	0.00	$ -	1.00	$ 7,740,000	1.00	$ 7,740,000	100%	0.0	$ -
NP031	Antepechos cubierta, en panel Kinwall E=60mm 28/26 acanalado y/o liso, incluye perfil de soporte inferior e intermedio en Angulo Gal C-16 de 5x5 ctms	M2		$ 375,000.00						180.00	$ 67,500,000	180.00	$ 67,500,000	0.00	$ -	84.87	$ 31,825,913	84.87	$ 31,825,913	47%	95.1	$ 35,674,087.50
NP032	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3		$ 156,285.00						199.80	$ 31,225,743	199.80	$ 31,225,743	0.00	$ -	24.00	$ 3,750,840	24.00	$ 3,750,840	12%	175.8	$ 27,474,903.00
NP033	Demolición y retiro de elementos masivos de comcreto en cimentaciones profundas	M3		$ 913,101.00								27.15	$ 24,790,692	27.15	$ 24,790,692.15		$ -	27.15	$ 24,790,692	100%	0.0	$ -
NP034	Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	M2		$ 154,810.00								424.57	$ 65,727,682	0.00	$ -	174.80	$ 27,060,788	174.80	$ 27,060,788	41%	249.8	$ 38,666,893.70
NP035	Relleno en bloque de arcilla No 4 / 5 como material aligerante en placas de contrapiso	M3		$ 459,448.00								9.21	$ 4,231,516	9.21	$ 4,231,516.08	0.00	$ -	9.21	$ 4,231,516	100%	0.0	$ -
NP036	Revisión integral y validacion cambios en recorridos para la red contraincendios, apoyo técnico en la definición de los parámetros hidráulicos y constructivos requeridos para mantener el sistema, en consecuencia de cambios en el diseño arquitectónico de cielorrasos y validación de alturas libres de la edificación. Incluye Planos de nuevo recorrido de RCI- Memorias de Cálculo (verificación de la presión y caudal del punto crítico de la red).	UN		$ 9,579,500.00								1.00	$ 9,579,500	0.00	$ -	1.00	$ 9,579,500	1.00	$ 9,579,500	100%	0.0	$ -
NP037	Zapata en concreto de 21 Mpa (3000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M3		$ 1,210,150.00								3.05	$ 3,690,958	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.1	$ 3,690,957.50
NP038	Vigas de Cimentación en concreto de 21 Mpa (3000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M3		$ 1,433,053.00								3.00	$ 4,299,159	0.00	$ -	0.50	$ 716,527	0.50	$ 716,527	17%	2.5	$ 3,582,632.50
NP039	Suministro e instalacion cinta PVC O22 o similar	ML		$ 113,293.00								35.00	$ 3,965,255	12.22	$ 1,384,440.46	22.78	$ 2,580,815	35.00	$ 3,965,255	100%	0.0	$ -
														0.00	$ -			0.00	$ -	0%	0.0	$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 5,445,033,535.00		$ 5,445,033,535.00		$ 5,445,033,535.00		$ 5,445,033,535.00		$ 5,445,033,535.00		$ 1,431,107,405.00		$ 714,601,721.00		$ 2,145,709,096.00			$ 3,299,324,439.00
Administracion			26%		$ 1,415,708,719.00		$ 1,415,708,719.00		$ 1,415,708,719.00		$ 1,415,708,719.00		$ 1,415,708,719.00		$ 372,087,925.00		$ 185,796,447.00		$ 557,884,364.00			$ 857,824,354.00
Imprevistos			4%		$ 217,801,341.00		$ 217,801,341.00		$ 217,801,341.00		$ 217,801,341.00		$ 217,801,341.00		$ 57,244,296.00		$ 28,584,069.00		$ 85,828,364.00			$ 131,972,978.00
Utilidad			6%		$ 326,702,012.00		$ 326,702,012.00		$ 326,702,012.00		$ 326,702,012.00		$ 326,702,012.00		$ 85,866,444.00		$ 42,876,103.00		$ 128,742,546.00			$ 197,959,466.00
IVA sobre Utilidad			19%		$ 62,073,382.00		$ 62,073,382		$ 62,073,382		$ 62,073,382		$ 62,073,382.00		$ 16,314,624.36		$ 8,146,459.57		$ 24,461,083.74			$ 37,612,298.54
Total Obras					**$ 7,467,318,989.00**		**$ 7,467,318,989**		**$ 7,467,318,989**		**$ 7,467,318,989**		**$ 7,467,318,989**		**$ 1,962,620,694.36**		$ 980,004,799.57		$ 2,942,625,453.74			$ 4,524,693,535.54
																			$ 2,145,711,637.00			

VALOR TOTAL				$ 7,467,318,989
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		30%		$ 2,240,195,696.00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO				$ -
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN				$ 7,467,318,989.00
SALDO DEL CONTRATO				$ 4,524,693,535.54
SALDO POR AMORTIZAR				$ 1,357,408,060.00

VALOR DEL CONTRATO INICIAL				$ 7,467,318,989
VALOR CONTRATO ADICIONAL				$ -
PORCENTAJE DEL ANTICIPO				30%
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO				$ 2,240,195,696.00

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$			686,003,360.57

		$ 980,004,799.57	**$ 2,942,625,453.74**
		$ 294,001,439.00	**$ 882,787,636.00**
		$ 4,524,693,535.26	**$ 4,524,693,535.26**
		$ 1,357,408,060.00	**$ 1,357,408,060.00**

VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 1,962,620,694.36	**VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA**	$ 686,003,360.57
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$ 588,786,208.31	**SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:**	$ 4,524,693,535.54
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 980,004,799.57	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 1,357,408,060.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 294,001,439.00	**SALDO POR LIBERAR:**	$ -

ING. NICOLÁS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C.C. 80.182.734 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ARQ. JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
C.C. 79.696.673
INTERVENTOR

ING. Helberts Martinez
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 2.2	Excavacion manual vigas/zapatas	UNIDAD m3	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-200	Excavación manual Eje A(6-7)	4.20	0.40	0.7		1.18	1.00	1.18
		0.94	0.35	0.5		0.16	1.00	0.16
		3.4	0.35	0.42		0.50	1.00	0.50
ER-200 y ER-201	Zarpa muro eje D(6-7')	3.85	1.25	0.2		0.96	1.00	0.96
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 3.3	Suministro, transporte e instalción de Acero Figurado 1/4" - 1", incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD kg	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	PESO (KG)	Alto				
		TANQUE RCI						
	ER-202	ACERO #4. PLACA FONDO (ES 1)	8.45	1.00			8.45	26.00	219.70
			1.10	0.99			1.09	26.00	28.31
			1.30	0.99			1.29	26.00	33.46
			0.95	0.99			0.94	120.00	112.86
			2.70	0.99			2.67	100.00	267.30
		ACERO #4. MURO CORTO (ES 1)	3.80	0.99			3.76	20.00	75.24
			2.70	0.99			2.67	26.00	69.50
		ACERO #4. MURO CORTO CÁRCAMO (ES 1)	3.8	0.99			3.76	20.00	75.24
			2.7	0.99			2.67	32.00	85.54
		ACERO #4. MUROS LARGOS (SON 2)	3.2	0.99			3.17	160.00	506.88
			3.8	0.99			3.76	8.00	30.10
			9.25	0.99			9.16	52.00	476.19
		TAPA (ES 1)	9.25	0.99			9.16	15.00	137.36
			2.7	0.99			2.67	47.00	125.63
		ACERO #5. REF. PASAMUROS TUBO >= 2" (SON 6)	0.60	1.56			0.94	48.00	44.93
		ACERO #5. REF. PASAMUROS TUBO < 2" (ES 1)	0.40	1.56			0.62	4.00	2.50
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									2,290.73
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	2,290.73

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
3.4	Bombeo de concreto. incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación		m3	21 de enero de 2026

OBJETO:		CONTRATO DE OBRA
	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	C - 019 DE 2025





DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	ER-200, ER-202	**TANQUE RED CONTRA INCENDIOS EJ(7'-8)(A-B')**							
		PLACA FONDO	8.95	2.42	0.25		5.41	1.00	5.41
		MEDIA CAÑA FONDO	11.12	0.10	0.050		0.06	2.00	0.11
		MURO CORTO	2.42	0.25	2.53		1.53	1.00	1.53
		MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	3.13		1.89	1.00	1.89
		MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.60		0.36	1.00	0.36
		MURO LARGO TANQUE	8.45	0.25	2.53		5.34	2.00	10.69
		MURO TAPA LATERAL CÁRCAMO	0.55	0.25	0.60		0.08	2.00	0.17
		MEDIA CAÑA MUROS	2.53	0.10	0.050		0.01	2.00	0.03
		MEDIA CAÑA VERTICAL CÁRCAMO	0.60	0.10	0.050		0.00	2.00	0.01
		MEDIA CAÑA MUROS	3.13	0.10	0.050		0.02	2.00	0.03
		MEDIA CAÑA FONDO TANQUE	22.56	0.10	0.050		0.11	2.00	0.23
		TAPA TANQUE	8.95	2.42	0.12		2.60	1.00	2.60
	ER-200, ER-202	**TANQUE AGUA POTABLE EJ(7'-8)(C-D)**							
		PLACA FONDO	4.20	2.42	0.25		2.54	1.00	2.54
		MEDIA CAÑA FONDO	5.62	0.10	0.050		0.03	2.00	0.06
		MURO CORTO	2.42	0.25	2.53		1.53	1.00	1.53
		MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	3.13		1.89	1.00	1.89
		MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.60		0.36	1.00	0.36
		MURO LARGO TANQUE	3.70	0.25	2.53		2.34	2.00	4.68
		MURO TAPA LATERAL CÁRCAMO	0.50	0.25	0.60		0.08	2.00	0.15
		MEDIA CAÑA MUROS	2.53	0.10	0.050		0.01	2.00	0.03
		MEDIA CAÑA VERTICAL CÁRCAMO	0.60	0.10	0.050		0.00	2.00	0.01
		MEDIA CAÑA MUROS	3.13	0.10	0.050		0.02	2.00	0.03
		MEDIA CAÑA FONDO TANQUE	13.16	0.10	0.050		0.07	2.00	0.13
		TAPA TANQUE	4.20	2.42	0.12		1.22	1.00	1.22
	ER-200	MURO DE CONTENCIÓN EJE D(6-7')	3.95	1.00	0.4		1.58	1.00	1.58
			3.95	0.25	3.1		3.06	1.00	3.06
	ER-200	MURO DE CONTENCIÓN EJE a(6-7')	3.65	1.00	0.4		1.46	1.00	1.46
			3.65	0.25	3.1		2.83	1.00	2.83
		DESCONTAR PAGADO EN ACTA N° 3							-15.30
									29.31
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**29.31**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Localizacion y replanteo, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD	FECHA:	
3.5		m2	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

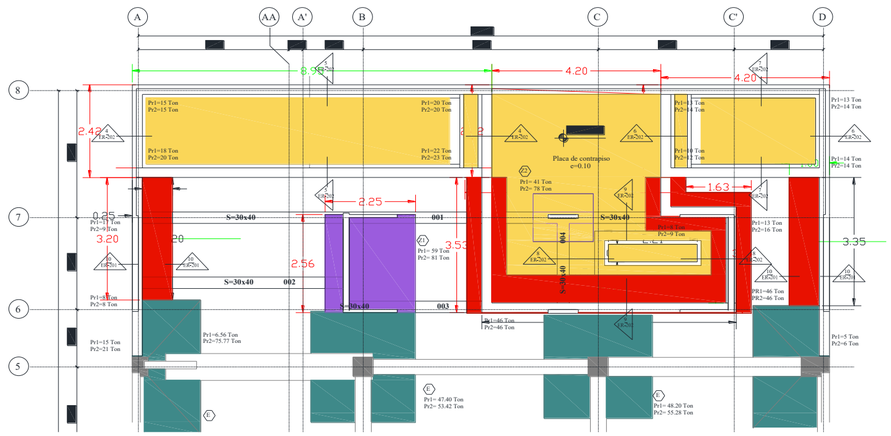

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-200	TANQUE DE AGUA POTABLE	4.2	2.42		10.16		1.00	10.16
ER-200	TANQUE DE RCI	8.95	2.42		21.66		1.00	21.66
ER-200	MURO DE CONTENCIÓN EJE D(6-7')	3.95	1.20		4.74		1.00	4.74
ER-200	MURO DE CONTENCIÓN EJE A(6-7')	3.65	1.20		4.38		1.00	4.38
ER-200	CUARTO DE BOMBAS EJES(B'-C')(6-8)	4.2	3.29		13.82		1.00	13.82
		7.08	3.53		24.99		1.00	24.99
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								79.75
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			79.75

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 3.5	Localizacion y replanteo, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD: m2	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

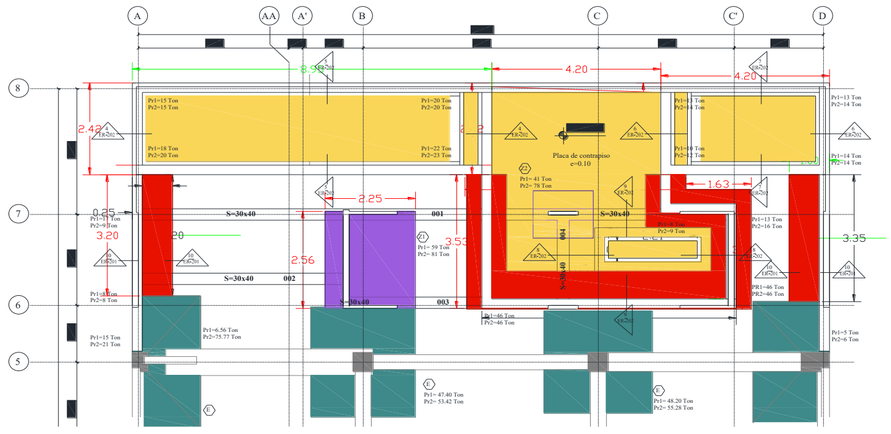

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-200	TANQUE DE AGUA POTABLE	4.2	2.42		10.16	-	1.00	10.16
ER-200	TANQUE DE RCI	8.95	2.42		21.66	-	1.00	21.66
ER-200	MURO DE CONTENCIÓN EJE D(6-7')	3.95	1.20		4.74	-	1.00	4.74
ER-200	MURO DE CONTENCIÓN EJE A(6-7')	6.31	1.20		7.58	-	1.00	7.58
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								44.14
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		44.14

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CA

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 3.7	Concreto Tanque 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD m3	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

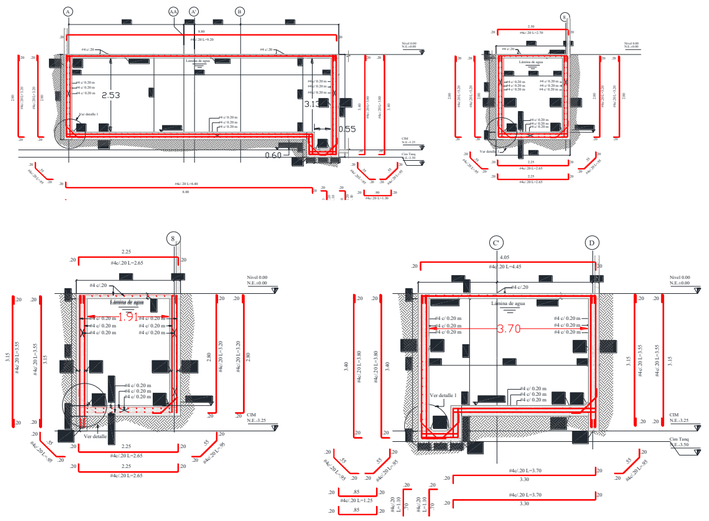

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-200, ER-202	**TANQUE RED CONTRA INCENDIOS EJ(7'-8)(A-B')**							
	PLACA FONDO	8.95	2.42	0.25		5.41	1.00	5.41
	MEDIA CAÑA FONDO	11.12	0.10	0.050		0.06	2.00	0.11
	MURO CORTO	2.42	0.25	2.53		1.53	1.00	1.53
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	3.13		1.89	1.00	1.89
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.60		0.36	1.00	0.36
	MURO LARGO TANQUE	8.45	0.25	2.53		5.34	2.00	10.69
	MURO TAPA LATERAL CÁRCAMO	0.55	0.25	0.60		0.08	2.00	0.17
	MEDIA CAÑA MUROS	2.53	0.10	0.050		0.01	2.00	0.03
	MEDIA CAÑA VERTICAL CÁRCAMO	0.60	0.10	0.050		0.00	2.00	0.01
	MEDIA CAÑA MUROS	3.13	0.10	0.050		0.02	2.00	0.03
	MEDIA CAÑA FONDO TANQUE	22.56	0.10	0.050		0.11	2.00	0.23
	TAPA TANQUE	8.95	2.42	0.12		2.60	1.00	2.60
ER-200, ER-202	**TANQUE AGUA POTABLE EJ(7'-8)(C-D)**							
	PLACA FONDO	4.20	2.42	0.25		2.54	1.00	2.54
	MEDIA CAÑA FONDO	5.62	0.10	0.050		0.03	2.00	0.06
	MURO CORTO	2.42	0.25	2.53		1.53	1.00	1.53
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	3.13		1.89	1.00	1.89
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.60		0.36	1.00	0.36
	MURO LARGO TANQUE	3.70	0.25	2.53		2.34	2.00	4.68
	MURO TAPA LATERAL CÁRCAMO	0.50	0.25	0.60		0.08	2.00	0.15
	MEDIA CAÑA MUROS	2.53	0.10	0.050		0.01	2.00	0.03
	MEDIA CAÑA VERTICAL CÁRCAMO	0.60	0.10	0.050		0.00	2.00	0.01
	MEDIA CAÑA MUROS	3.13	0.10	0.050		0.02	2.00	0.03
	MEDIA CAÑA FONDO TANQUE	13.16	0.10	0.050		0.07	2.00	0.13
	TAPA TANQUE	4.20	2.42	0.12		1.22	1.00	1.22
								-
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA N° 3							-15.30
								-
								20.38
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**20.38**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.		kg	21 de enero de 2026

OBJETO:		CONTRATO DE OBRA
	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Peso total (kg)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Peso(KG)	Alto				
	PLANTA ELÉCTRICA							
	VIGA APOYO EJE A'(1-2)	3.54	0.99			3.50	4.00	14.02
		0.60	1.00			0.60	4.00	2.40
		1.00	0.56			0.56	22.00	12.32
		4.9	1.00	1		4.90	4.00	19.60
		0.60	1.00			0.60	4.00	2.40
		1.00	0.56			0.56	25.00	14.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								64.74
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		64.74

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CA


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.3	Bombeo de concreto	UNIDAD m3	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



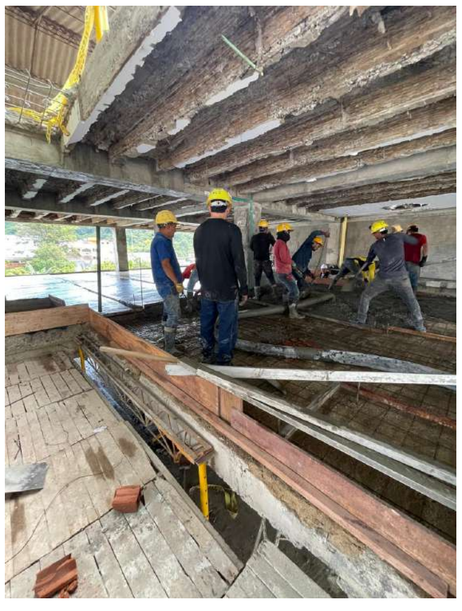

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
ER-700	**ESCALER EJ(2-2')(A-B) 1 a 2 P**							
	ZARPA	1.18	0.60	0.30		0.21	1.00	0.21
	CUELLO ZARPA	1.18	0.15	0.33		0.06	1.00	0.06
	CAMA TRAMO 1	0.80	1.18	0.15		0.14	1.00	0.14
	PASOS TRAMO 1	1.18	0.28	0.088		0.03	3.00	0.09
	DESCANSO	1.18	1.22	0.15		0.22	1.00	0.22
	DESCANSO	1.35	1.50	0.15		0.30	1.00	0.30
	CAMA TRAMO 2	4.73	1.23	0.20		1.16	1.00	1.16
	PASOS TRAMO 1	1.23	0.28	0.088		0.03	14.00	0.42
ER-700	**ESCALER EJ(2-2')(A-B) 2 a 3 P**							
	CAMA TRAMO	4.38	1.20	0.20		1.05	1.00	1.05
	PASOS TRAMO 1	1.20	0.28	0.093		0.03	14.00	0.44
ER-300 Y RE 301	**PLAC 2DO PIS EJES (2-3)(A-B)**							
	VIGA 101R EJ A(2-3)	4.80	0.33	0.40		0.63	1.00	0.63
	VIGA 102R EJ B(2-3)	4.80	0.30	0.40		0.58	1.00	0.58
	VIGA 108 EJ 2(A-B)	5.20	0.15	0.40		0.31	1.00	0.31
	VIGA 110 EJ A'(2-3)	3.45	0.15	0.40		0.21	1.00	0.21
	VIGA 111 EJ A'(2-3)	3.45	0.15	0.40		0.21	1.00	0.21
	VIGA 109 EJ A'(2-2')	1.15	0.25	0.40		0.12	1.00	0.12
	PLAC E=0.12	3.45	1.26	0.12		0.52	1.00	0.52
		3.45	1.08	0.12		0.45	1.00	0.45
		1.25	1.15	0.12		0.17	1.00	0.17
		4.75	1.43	0.12		0.82	1.00	0.82
ER-400 y RE-401	**PLAC 3ER PIS EJES (2-3)(A-B)**							
	VIGA 201R EJ A(2-3)	4.80	0.33	0.40		0.63	1.00	0.63
	VIGA 202R EJ B(2-3)	4.80	0.30	0.40		0.58	1.00	0.58
	VIGA 208 EJ 2(A-B)	5.17	0.15	0.40		0.31	1.00	0.31
	VIGA 210 EJ A'(2-3)	3.45	0.25	0.40		0.35	1.00	0.35
	VIGA 211 EJ A'(2-3)	3.45	0.15	0.40		0.21	1.00	0.21
	VIGA 209 EJ A'(2-2')	1.15	0.25	0.40		0.12	1.00	0.12
	PLAC E=0.12	3.45	1.26	0.12		0.52	1.00	0.52
		3.45	1.08	0.12		0.45	1.00	0.45
		1.25	1.15	0.12		0.17	1.00	0.17
		4.75	1.43	0.12		0.82	1.00	0.82
								12.24
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**12.24**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRI

OBSERVACIONES


Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
4.3	Bombeo de concreto	m3	0 de enero de 1900

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

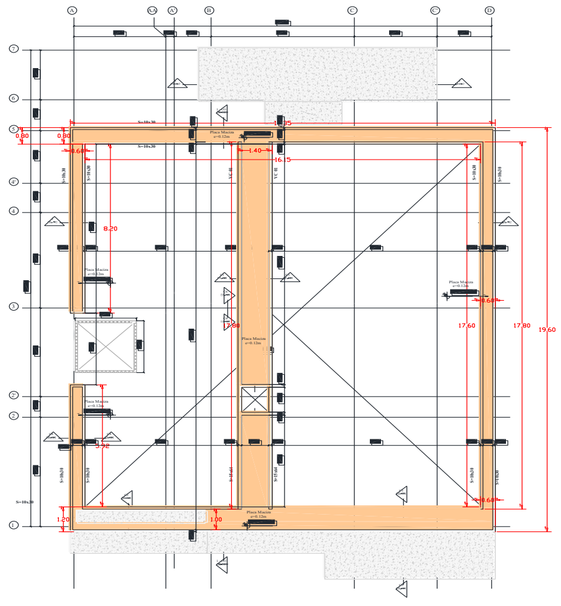

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-700	**ESCALER EJ(2-2')(A-B) 3 a 4 PISO**							
	CAMA TRAMO	4.70	1.20	0.20		1.13	1.00	1.13
	PASOS TRAMO 1	1.20	0.28	0.093		0.03	14.00	0.44
	VIGAS CUBIERTA EDIFICIO ANTIGUO. EJES (1-5)(A-D)							
ER-600	V 402R EJ 5(A-B)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
	V 402R EJ 5(B-C)	5.55	0.20	0.30		0.33	1.00	0.33
	V 402R EJ 5(C-D)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
ER-600	V 409R EJ 5(A-B)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
	V 409R EJ 5(B-C)	5.55	0.20	0.30		0.33	1.00	0.33
	V 409R EJ 5(C-D)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
ER-600	V 406R EJE 2'(A-B)	5.27	0.15	0.30		0.24	2.00	0.47
ER-600	V 414R EJE A'(2'-3)	3.58	0.15	0.30		0.16	2.00	0.32
ER-600	V 407R EJE 2''(C'-D)	3.28	0.15	0.30		0.15	2.00	0.30
ER-600	V 419R EJE C'(2-3)	5.00	0.12	0.30		0.18	2.00	0.36
ER- 501	V 301R EJE 2-3 A-B	4.80	0.40	0.20		0.38	1.00	0.38
	EJE (0-1')(A-B). VOLADIZO	5.75	1.10	0.12		0.76	1.00	0.76
	EJE (0-1)(B-C). VOLADIZO	6.00	1.45	0.12		1.04	1.00	1.04
	VIGAS CANAL EDIFICIO ANTIGUO. EJES (1-5)(A-D)							
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE 1(A-D)	15.25	0.10	0.30		0.46	1.00	0.46
		17.35	0.10	0.30		0.52	1.00	0.52
		17.35	1.00	0.12		2.08	1.00	2.08
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE 5(A-D)	17.35	0.10	0.30		0.52	1.00	0.52
		14.75	0.10	0.30		0.44	1.00	0.44
		17.35	1.00	0.12		2.08	1.00	2.08
						-		-
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE D (1-5)	19.25	0.10	0.30		0.58	1.00	0.58
		17.80	0.10	0.30		0.53	1.00	0.53
		17.60	0.40	0.12		0.84	1.00	0.84
						-		-
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE A (1-2´)	7.02	0.10	0.30		0.21	1.00	0.21
		5.92	0.10	0.30		0.18	1.00	0.18
		5.92	0.40	0.12		0.28	1.00	0.28
		0.40	0.10	0.15		0.01	1.00	0.01
								15.88
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**28.12**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CA

OBSERVACIONES


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.3	Bombeo de concreto	UNIDAD	m3	FECHA: 1 de enero de 1900

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





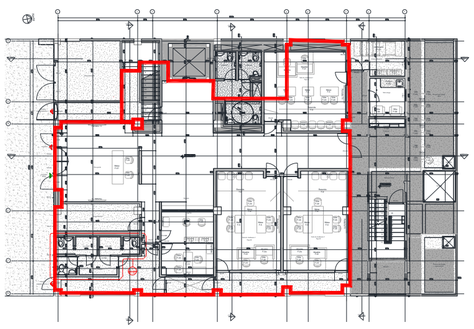

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE A (3-5)	8.81	0.10	0.30		0.26	1.00	0.26
		8.21	0.10	0.30		0.25	1.00	0.25
		8.21	0.40	0.12		0.39	1.00	0.39
		0.40	0.10	0.15		0.01	1.00	0.01
ER-600 y ER-602	PASARELA CENTRAL EJE B'(1-5)							
	VIGA VC 001	17.80	0.15	0.64		1.71	2.00	3.42
		17.80	1.10	0.12		2.35	1.00	2.35
	ESCOTILLA	1.10	1.20	0.12		0.16	-1.00	-0.16
	BORDE ESCOTILLA	1.10	0.15	0.20		0.03	2.00	0.07
	PLACA VOLADIZO. EJE 1(A-B)	5.75	2.25	0.12		1.55	1.00	1.55
	CONTRAPISO EDIFICIO ANTIGUO							
A-101	PLACA DE 1er PISO EDIFICIO REFORZADO. EJES (1-5)(A-D)			0.1	275.73		1.00	27.57
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								35.71
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		63.83

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 4.3	Bombeo de concreto	UNIDAD: m3	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

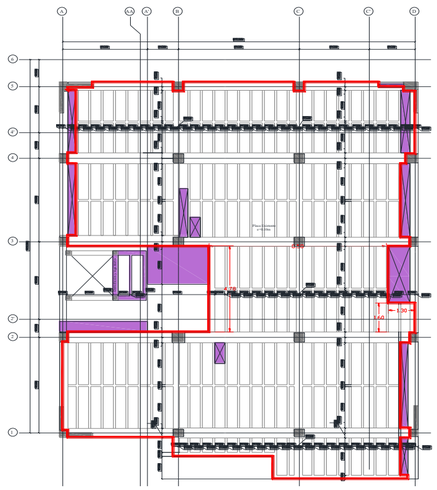

PLACA 2 PISO

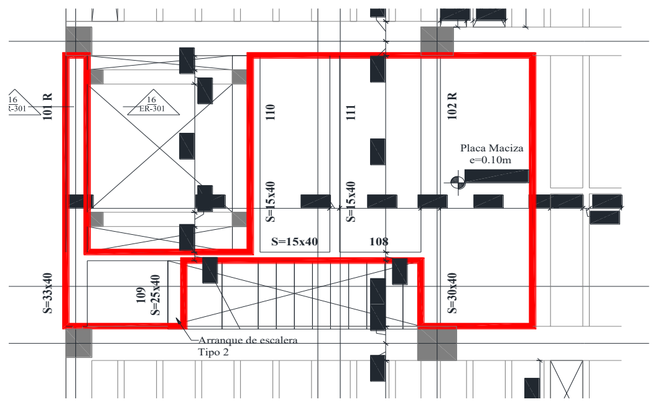



DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
	ER-300	CONTRA PLACA 2 PISO							
		EJE 3-5 y A-D	17.05	9.10	0.05		7.76	1.00	7.76
		EJE 2-3 y B'-D	8.57	4.75	0.05		2.04	1.00	2.04
			1.30	1.65	0.05		0.11	1.00	0.11
		EJE 1-2 Y A-B´	7.23	5.55	0.05		2.01	1.00	2.01
		EJE 1-2 Y B´-D	9.97	5.55	0.05		2.77	1.00	2.77
		EJE 0-1 Y B-B´	4.82	1.10	0.05		0.27	1.00	0.27
		EJE 0-1 Y B"-D	6.87	2.35	0.05		0.81	1.00	0.81
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
4.3	Bombeo de concreto		m3	0 de enero de 1900

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



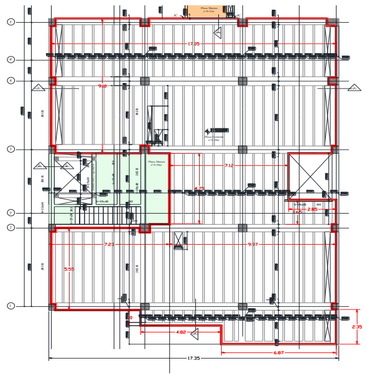

PLACA 3 PISO



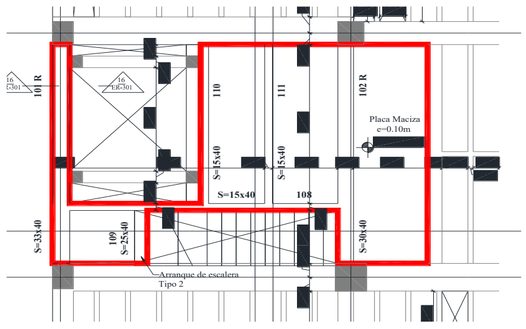


REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CONTRA PLACA 3PISO						15.53	
ER-500	EJE 3-5 y A-D	17.05	9.10	0.05		7.76	1.00	7.76
	EJE 2-3 y B'-D	7.12	4.75	0.05		1.69	1.00	1.69
		2.85	1.65	0.05		0.24	1.00	0.24
	EJE 1-2 Y A-B´	7.23	5.55	0.05		2.01	1.00	2.01
	EJE 1-2 Y B´-D	9.97	5.55	0.05		2.77	1.00	2.77
	EJE 0-1 Y B-B´	4.82	1.10	0.05		0.27	1.00	0.27
	EJE 0-1 Y B"-D	6.87	2.35	0.05		0.81	1.00	0.81
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
4.3	Bombeo de concreto		m3	0 de enero de 1900


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

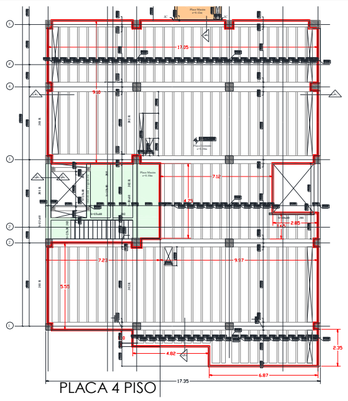


PLACA 4 PISO



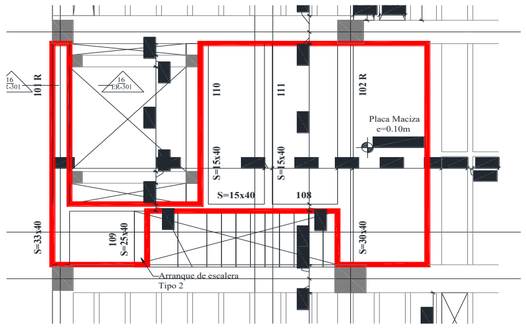

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CONTRA PLACA 4 PISO						18.86	
ER-500	EJE 3-5 y A-D	17.05	9.10	0.05		7.76	1.00	7.76
	EJE 2-3 y B'-D	7.12	4.75	0.05		1.69	1.00	1.69
		2.85	1.65	0.05		0.24	1.00	0.24
	EJE 1-2 Y A-B´	7.23	5.55	0.05		2.01	1.00	2.01
	EJE 1-2 Y B´-D	9.97	5.55	0.05		2.77	1.00	2.77
	EJE 0-1 Y B-B´	4.82	1.10	0.05		0.27	1.00	0.27
	EJE 0-1 Y B"-D	6.87	2.35	0.05		0.81	1.00	0.81
ER-500	**PLAC 4TO PIS EJES (2-3)(A-B)**							
	VIGA 301R EJ A(2-3)	4.80	0.33	0.40		0.63	1.00	0.63
	VIGA 302R EJ B(2-3)	4.80	0.30	0.40		0.58	1.00	0.58
	VIGA 308 EJ 2(A-B)	5.17	0.15	0.40		0.31	1.00	0.31
	VIGA310 EJ A'(2-3)	3.45	0.25	0.40		0.35	1.00	0.35
	VIGA311 EJ A'(2-3)	3.45	0.15	0.40		0.21	1.00	0.21
	VIGA 309 EJ A'(2-2')	1.15	0.25	0.40		0.12	1.00	0.12
	PLAC E=0.12	3.45	1.26	0.12		0.52	1.00	0.52
		3.45	1.08	0.12		0.45	1.00	0.45
		1.25	1.15	0.12		0.17	1.00	0.17
		4.75	1.43	0.12		0.82	1.00	0.82
								-
								-0.50
	DESCONTAR ACUMULADO PAGADO EN ACTAS 2 Y 3							-40.29
	DESCONTAR POR MAYOR CANTIDAD RESPECTO A LO QUE SE PUEDE COBRAR CON EL MODIFICATORIO No. 4							-74.04
								-
								-
								-95.16
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**-0.05**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.8	Localizacion y replanteo	UNIDAD: m2	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

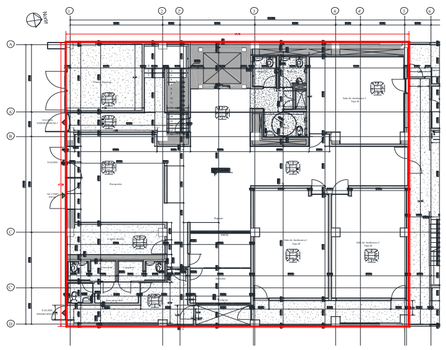


PRIMER PISO

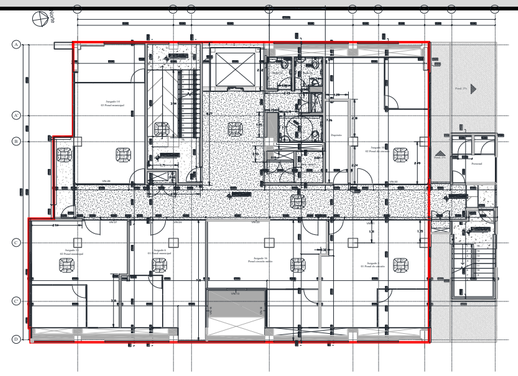

SEGUNDO PISO

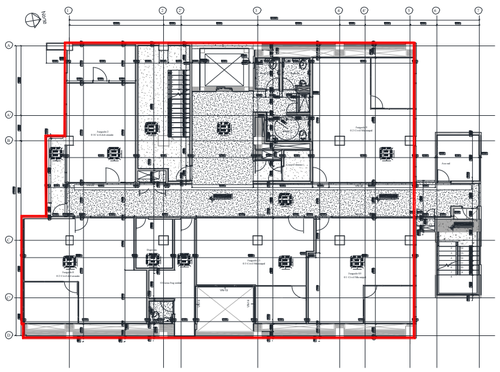

TERCER PISO

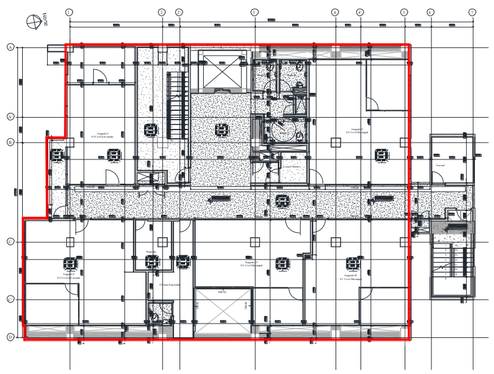

CUARTO PISO

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
A-301	PLACA DE 1er PISO EDIFICIO REFORZADO. EJES (1-5)(A-D)	19.7	17.35		341.80		1.00	341.80
A-302	PLACA DE 2do PISO EDIFICIO REFORZADO. EJES (1-5)(A-D)	19.7	17.35		341.80		1.00	341.80
		4.73	1.08		5.11		1.00	5.11
		7.15	2.45		17.52		1.00	17.52
A-303	PLACA DE 3er PISO EDIFICIO REFORZADO. EJES (1-5)(A-D)	19.7	17.35		341.80		1.00	341.80
		4.73	1.08		5.11		1.00	5.11
		7.15	2.45		17.52		1.00	17.52
A-304	PLACA DE 4to PISO EDIFICIO REFORZADO. EJES (1-5)(A-D)	19.7	17.35		341.80		1.00	341.80
		4.73	1.08		5.11		1.00	5.11
		7.15	2.45		17.52		1.00	17.52
	CANAL EJE 5(A-D)	17.35	1.00		17.35		1.00	17.35
	CANAL EJE 1(A-D)	17.35	1.20		20.82		1.00	20.82
	CANAL EJE D(1-5)	17.6	0.60		10.56		1.00	10.56
	PASARELA CANAL EJE B'(1-5)	17.6	1.40		24.64		1.00	24.64
	CANAL EJE A(1-2)	5.92	0.60		3.55		1.00	3.55
	CANAL EJE A(3-5)	8.2	0.60		4.92		1.00	4.92
	VOLADIZO EJE (0-1)(A-B')	10.38	1.05		10.90		1.00	10.90
								-
	DESCONTAR PAGADO ACTAS ANTERIORES							-100.00
								-
								-
								-
								-
								-
								1,427.80
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,427.80

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZA

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander				
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER				
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
	4.17	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

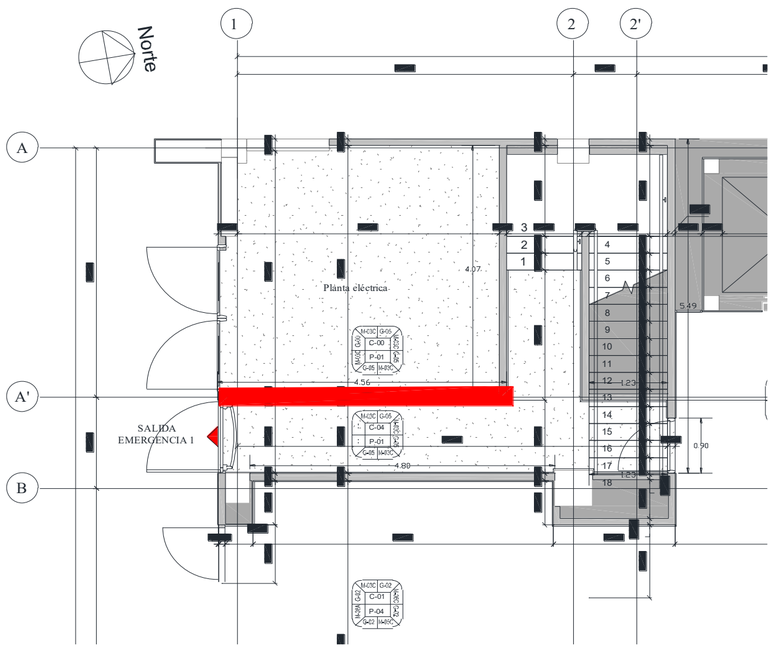

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	VIGA DE APOYO MAMPOSTERÍA 1er PISO. EJE A'(1-2)						8.00	8.00
	VIGA DE APOYO MAMPOSTERÍA 1er PISO. EJE 1'(A-A')						8.00	8.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								16.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		16.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZA

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Malla electrosoldada estandar.Incluye suministro, corte, amarre y colocación.	UNIDAD	FECHA:	
4.18		kg	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

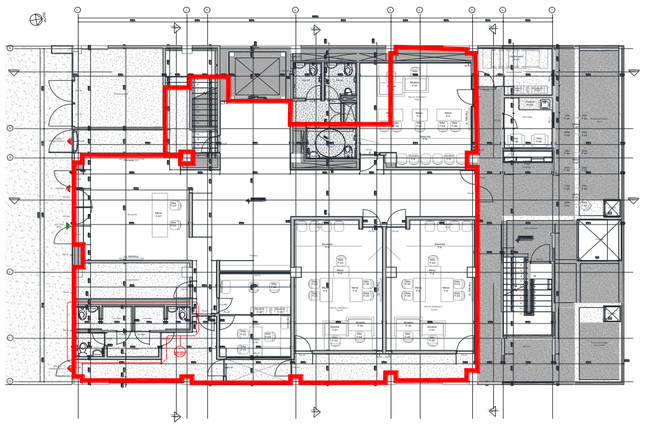DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones						
			Área (m2)	Área útil malla (m2)	Alto		Peso malla (kg)	No Elem.	Medida Total
	A-101	PLACA DE 1er PISO EDIFICIO REFORZADO. EJES (1-5)(A-D)	275.73	11.69			42.20	23.60	995.79
		PLACA DE 1er PISO PLANTA ELECTRIC. EJES (1-2)(A-A)	18.34	11.69			42.20	1.57	66.22
		PLACA DE 1er PISO PLANTA ELECTRIC. EJES (1-2)(A´´-B)	4.51	1.36			42.20	3.32	139.94
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									1,201.95
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,201.95

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
	5.126		UN	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

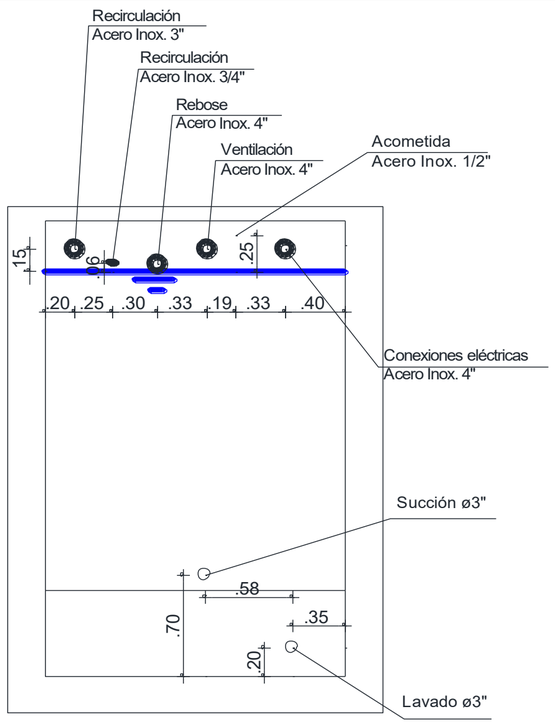

NIPLES PASAMURO
EN TANQUE DE RCI

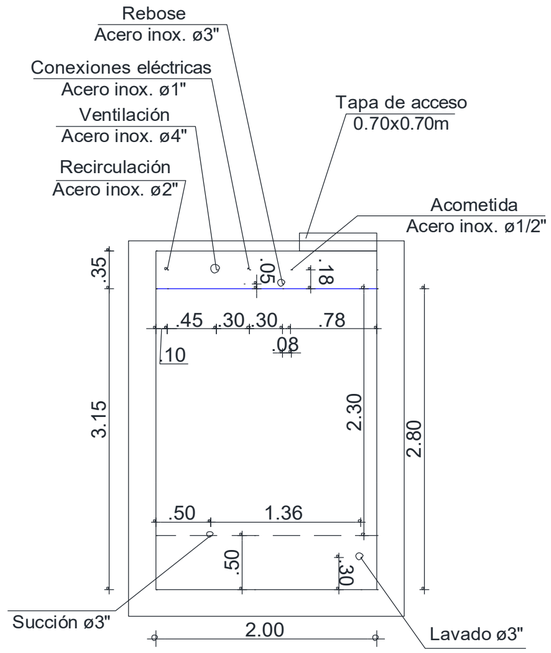

NIPLES PASAMURO EN
TANQUE DE AGUA POTABLE

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
RCI-09	TANQUE RCI						4.00	4.00
SUM-06	TANQUE AGUA POTABLE						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
	MAYOR CANTIDAD							-4.00
								-
								-
								-
								1.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.128		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

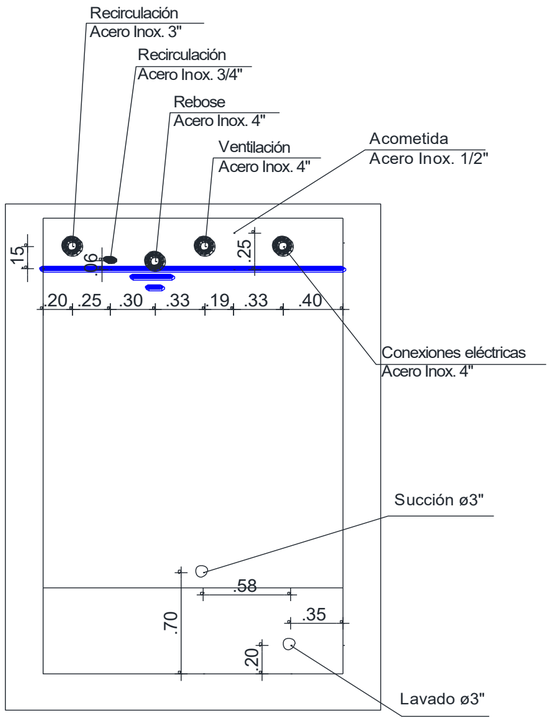

NIPLES PASAMURO
EN TANQUE DE RCI

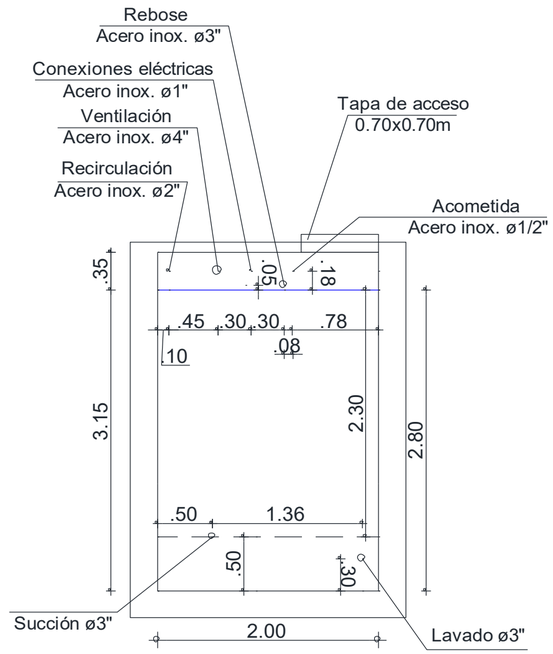


NIPLES PASAMURO EN
TANQUE DE AGUA POTABLE

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
RCI-09	TANQUE RCI						-	-
SUM-06	TANQUE AGUA POTABLE						1.00	1.00
								-
								-
								-


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.129	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

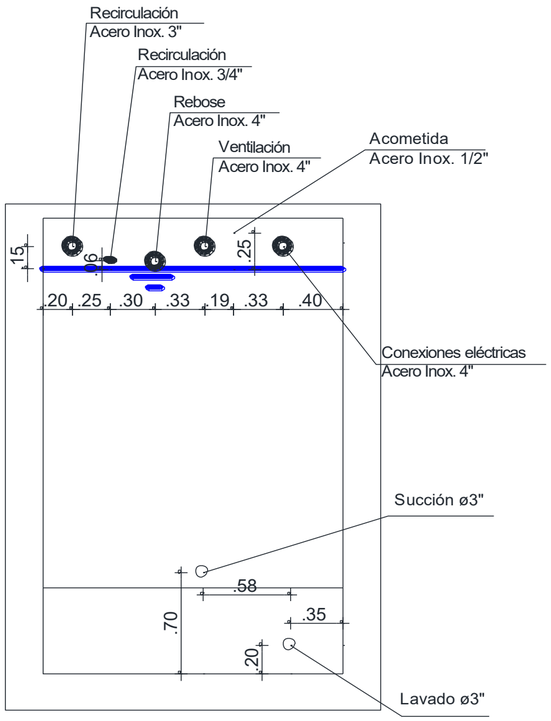

NIPLES PASAMURO
EN TANQUE DE RCI

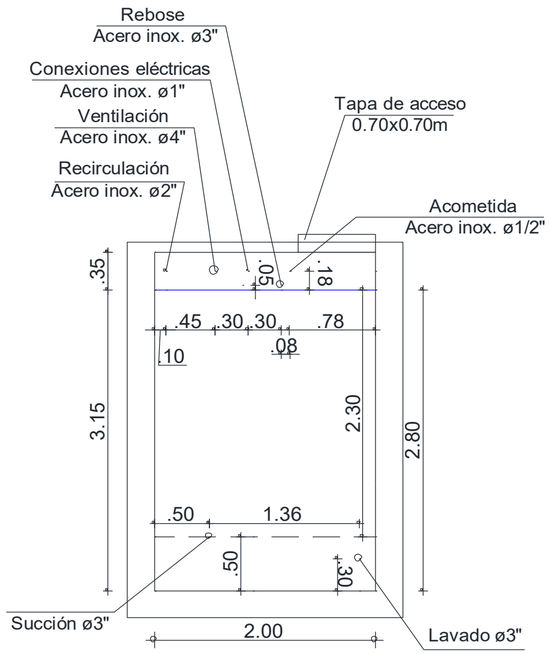

NIPLES PASAMURO EN
TANQUE DE AGUA POTABLE

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
RCI-09	TANQUE RCI						1.00	1.00
SUM-06	TANQUE AGUA POTABLE						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
	MAYOR CANTIDAD							-1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								1.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.301		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

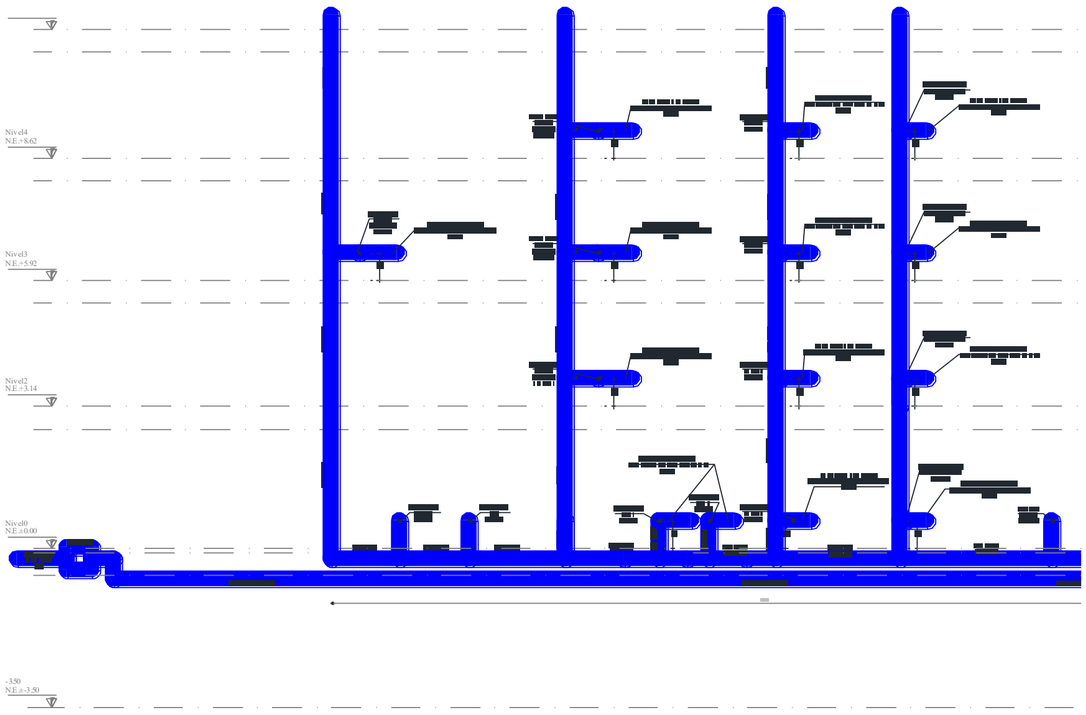

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	**HORIZONTAL TECHO 1er PISO**							
		7.13					1.00	7.13
		1.81					1.00	1.81
		4.23					1.00	4.23
		0.73					1.00	0.73
		1.76					1.00	1.76
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								15.66
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**15.66**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZA

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.302		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

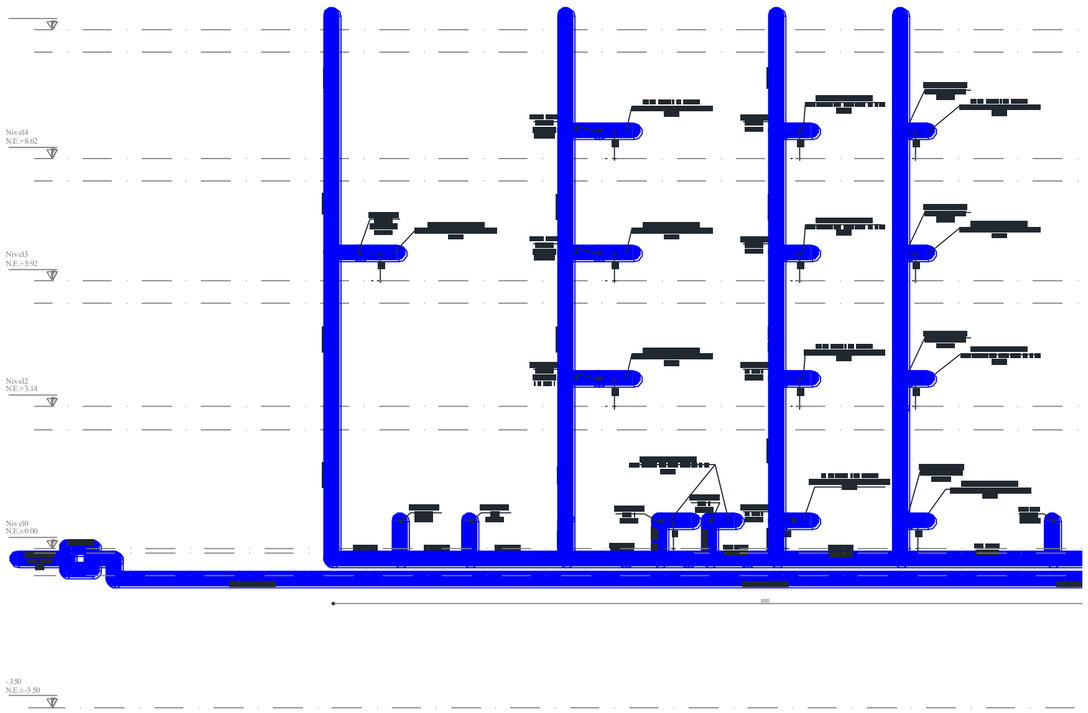

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE	5					1.00	5.00
		2.47					1.00	2.47
		0.77					1.00	0.77
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								8.24
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		8.24

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.303	TUBERIA PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ML	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

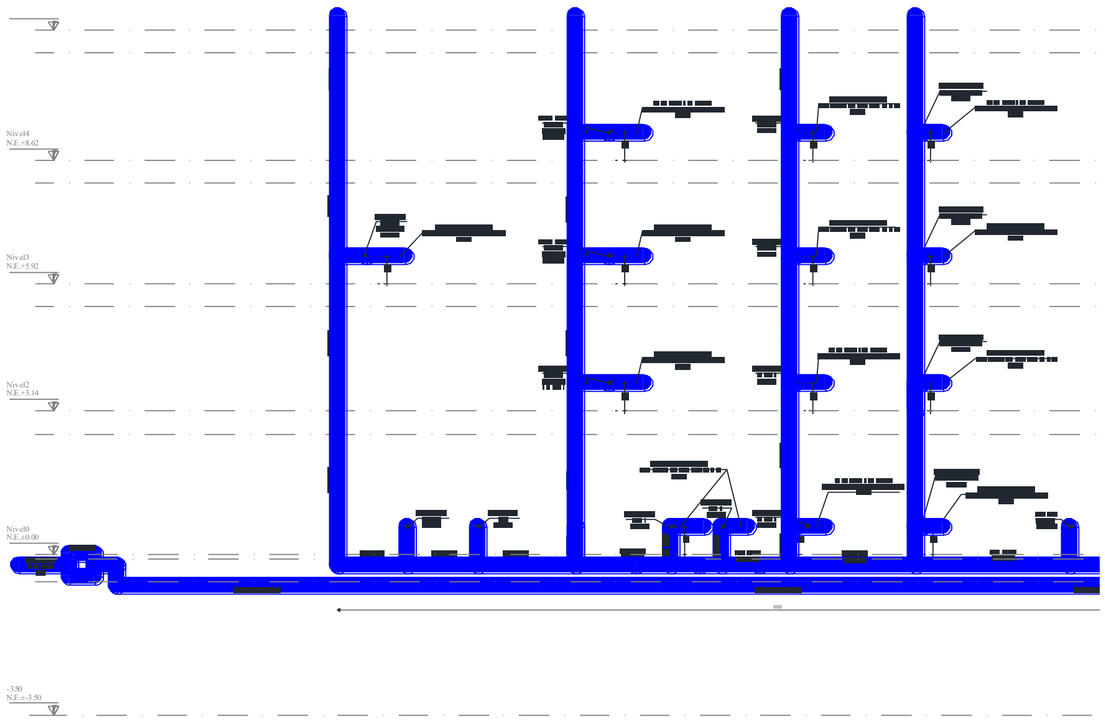

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE	2.78					1.00	2.78
		3.98					1.00	3.98
	HORIZONTAL CIELORRASO 1er PISO	2.22					1.00	2.22
		5.55					1.00	5.55
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								14.53
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		14.53

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.304	TUBERIA PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ML	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

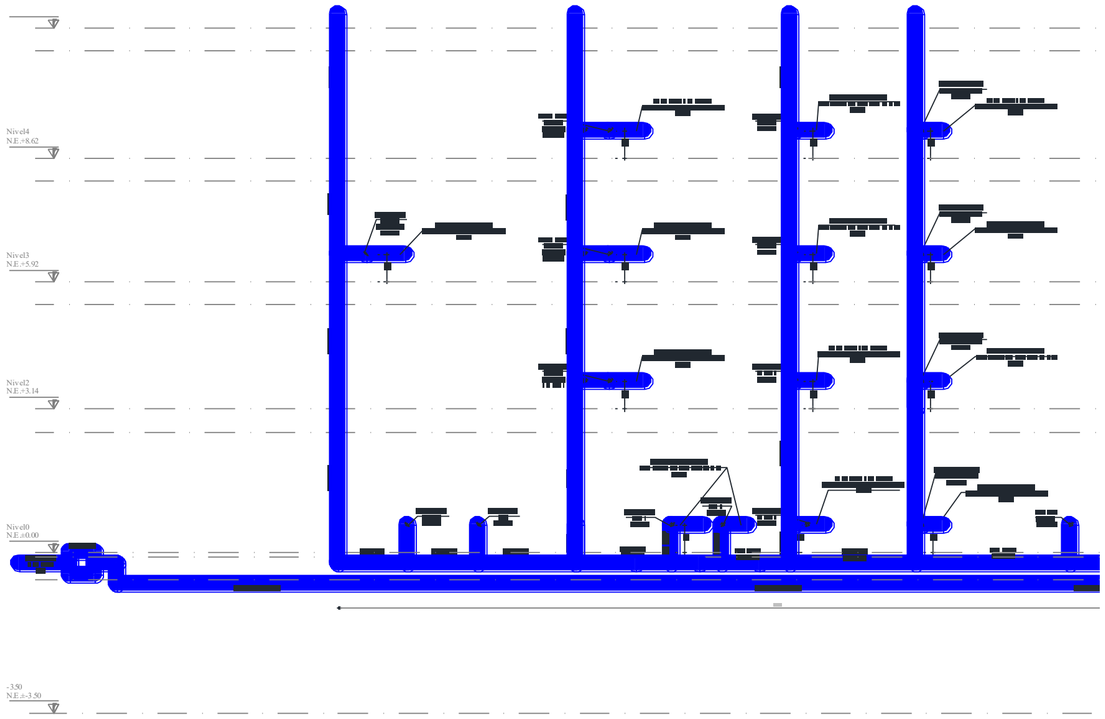

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE	6.76					1.00	6.76
		2.7					1.00	2.70
		5.48					1.00	5.48
		6.76					1.00	6.76
							1.00	-
		2.35					1.00	2.35
		1.63					1.00	1.63
		1.67					1.00	1.67
		1.17					1.00	1.17
		3.38					1.00	3.38
		2.29					1.00	2.29
		0.91					1.00	0.91
		0.78					1.00	0.78
		3.62					1.00	3.62
		0.24					1.00	0.24
		0.74					1.00	0.74
		0.29					1.00	0.29
		0.68					1.00	0.68
		0.40					1.00	0.40
		0.22					1.00	0.22
		0.60					1.00	0.60
		1.24					1.00	1.24
		0.73					1.00	0.73
		0.33					1.00	0.33
		0.48					1.00	0.48
								-
								-
								-
								-
								-
								45.45
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	45.45

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZA

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 5.305	TUBERIA PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ML	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

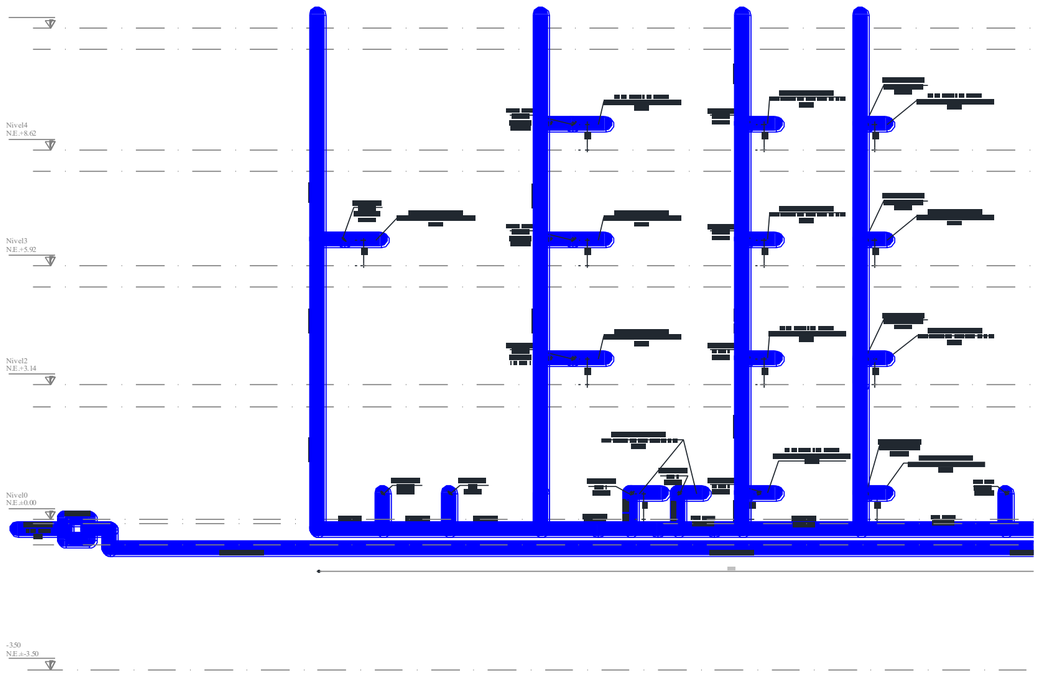

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE	2.7					1.00	2.70
		7.13					1.00	7.13
		1.81					1.00	1.81
		4.23					1.00	4.23
		0.73					1.00	0.73
		1.76					1.00	1.76
		9						
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								18.36
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		18.36

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZAL

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 5.306	TUBERIA PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ML	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

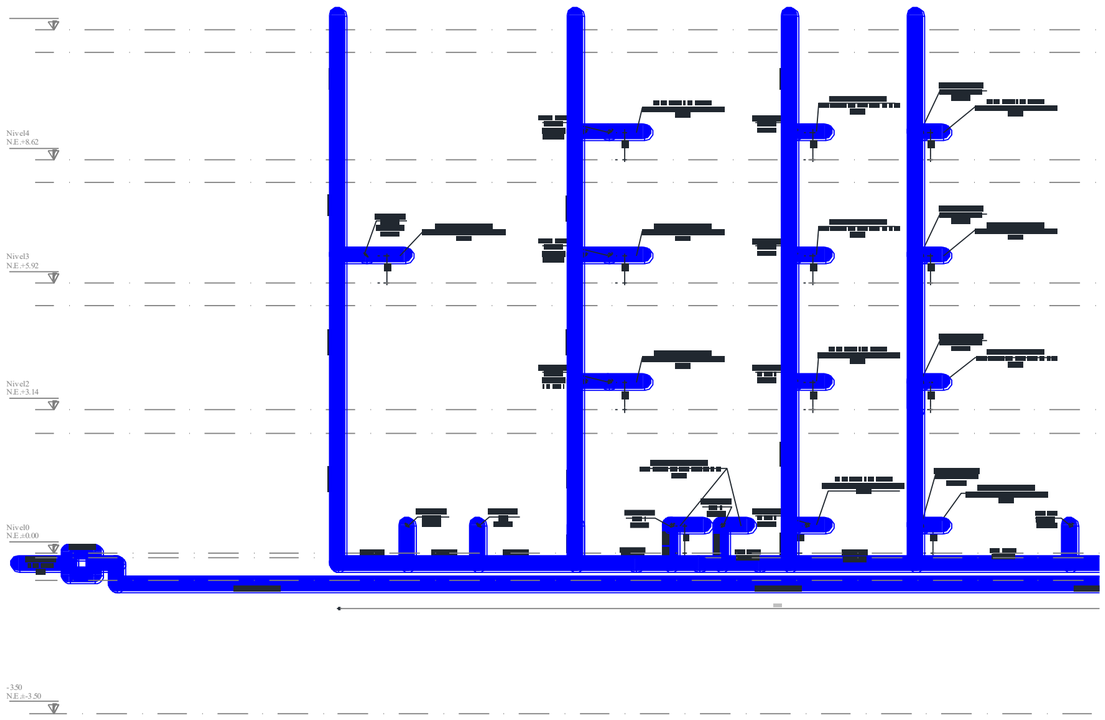

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE	2.7					1.00	2.70
		0.55					1.00	0.55
	HORIZONTAL CIELORRASO 1er PISO	0.32					1.00	0.32
		0.22					1.00	0.22
		0.29					1.00	0.29
		2.90					1.00	2.90
		2.14					1.00	2.14
		0.51					1.00	0.51
		0.22					1.00	0.22
		0.48					1.00	0.48
		0.66					1.00	0.66
		2.1					1.00	2.10
		0.41					1.00	0.41
		1.47					1.00	1.47
		6.29					1.00	6.29
		0.64					1.00	0.64
		1.99					1.00	1.99
		0.38					1.00	0.38
		1.27					1.00	1.27
		19.60					1.00	19.60
		1.64					1.00	1.64
		0.83					1.00	0.83
		2.53					1.00	2.53
		1.63					1.00	1.63
		0.50					1.00	0.50
		28.00					1.00	28.00
								-
								-
								-
								80.27
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	80.27

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALI

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIO PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.307		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

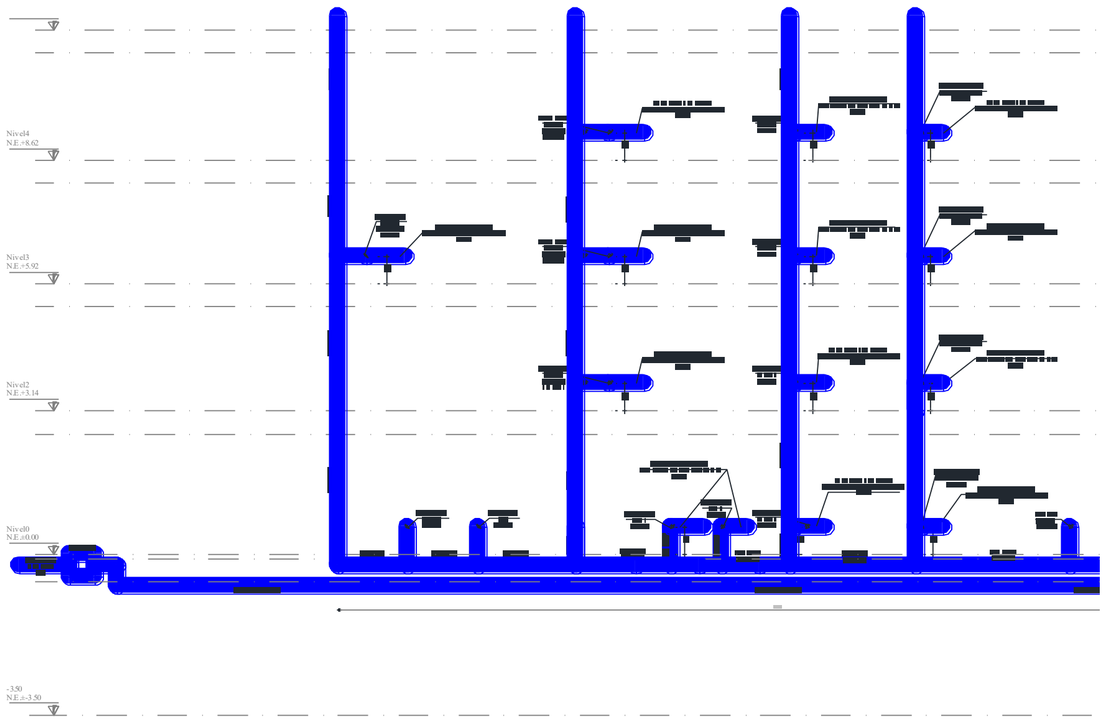

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE						52.97	52.97
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
14								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								52.97
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		52.97

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTR

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.308	ACCESORIO PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

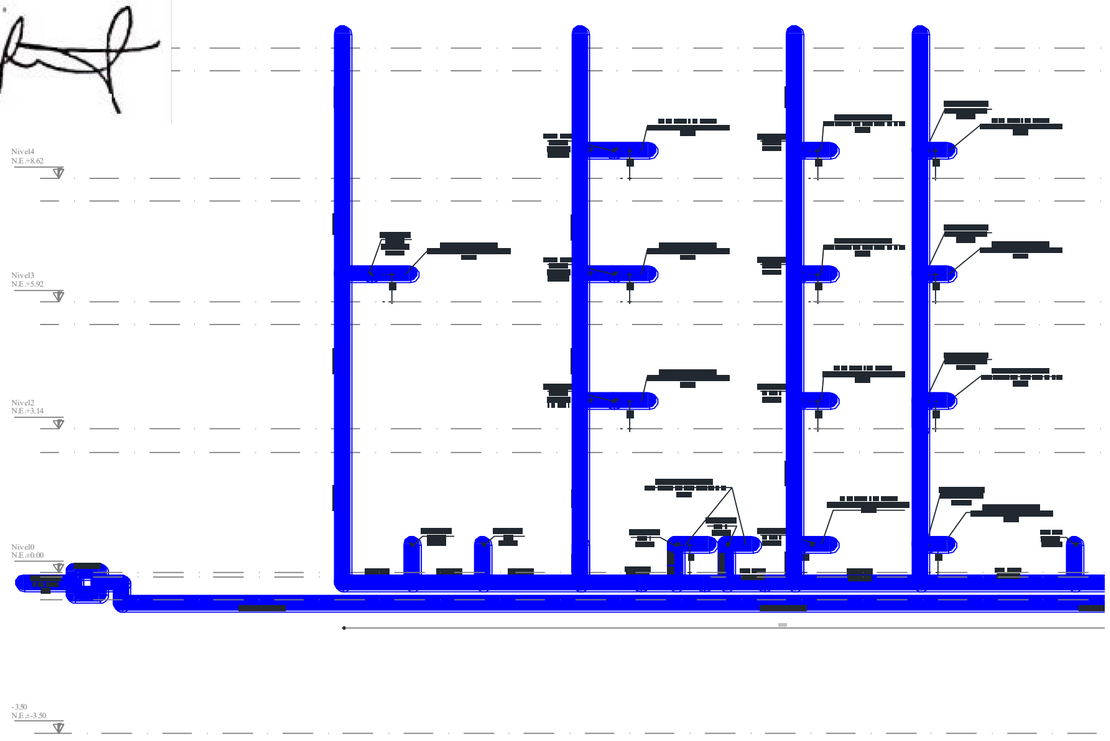


REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE						4.00	4.00
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.309		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

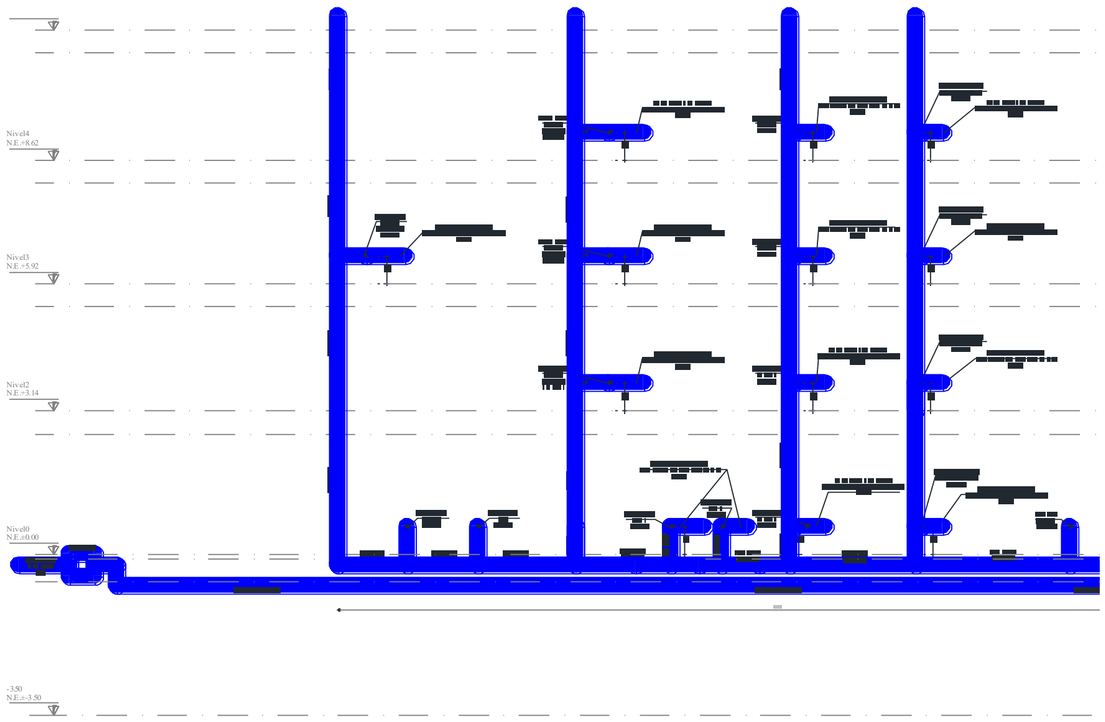


REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE						6.00	6.00
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.310		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

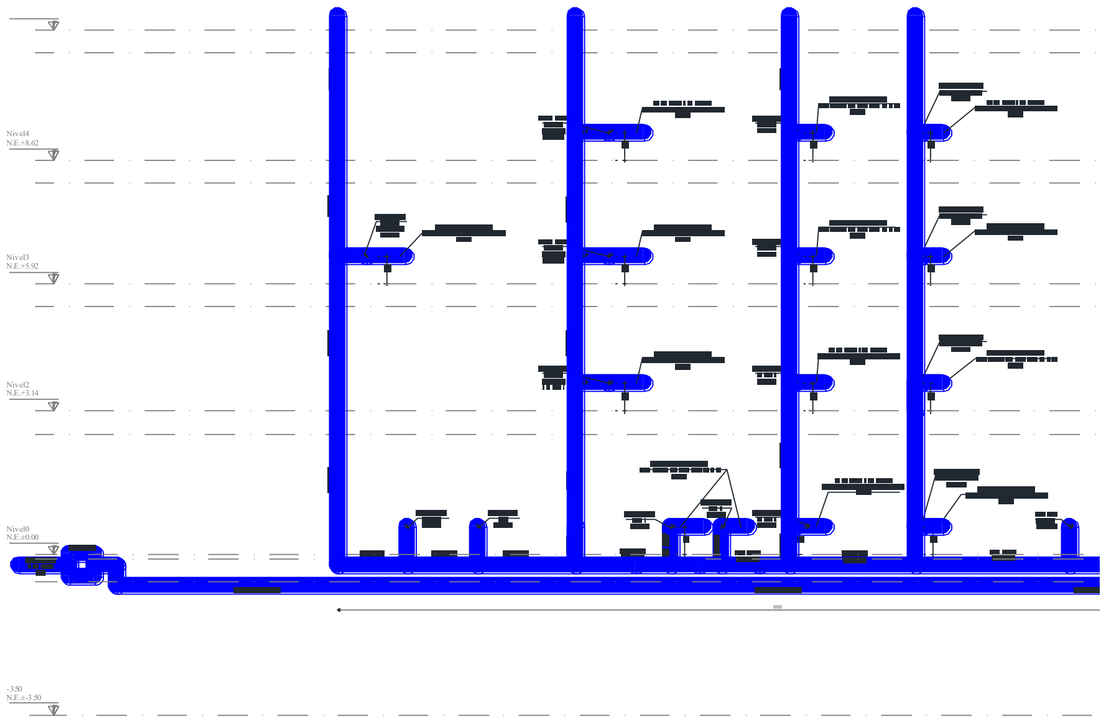


REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE						50.00	50.00
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.311	ACCESORIO PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

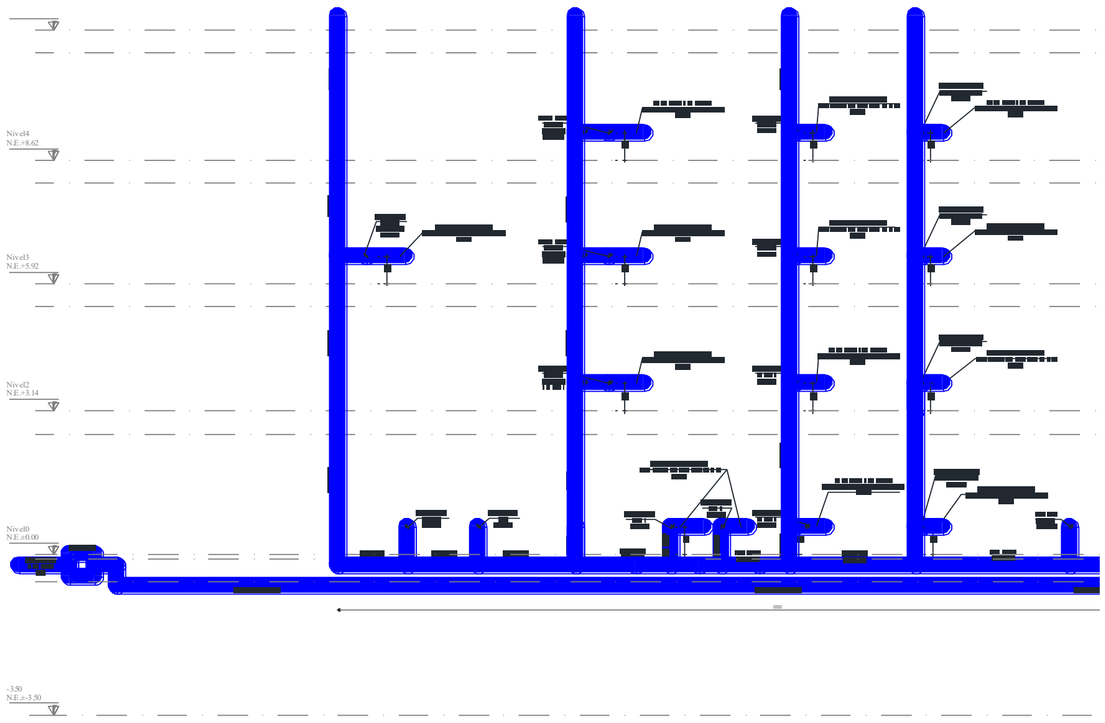

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE						12.00	12.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								12.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		12.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GON

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.312	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

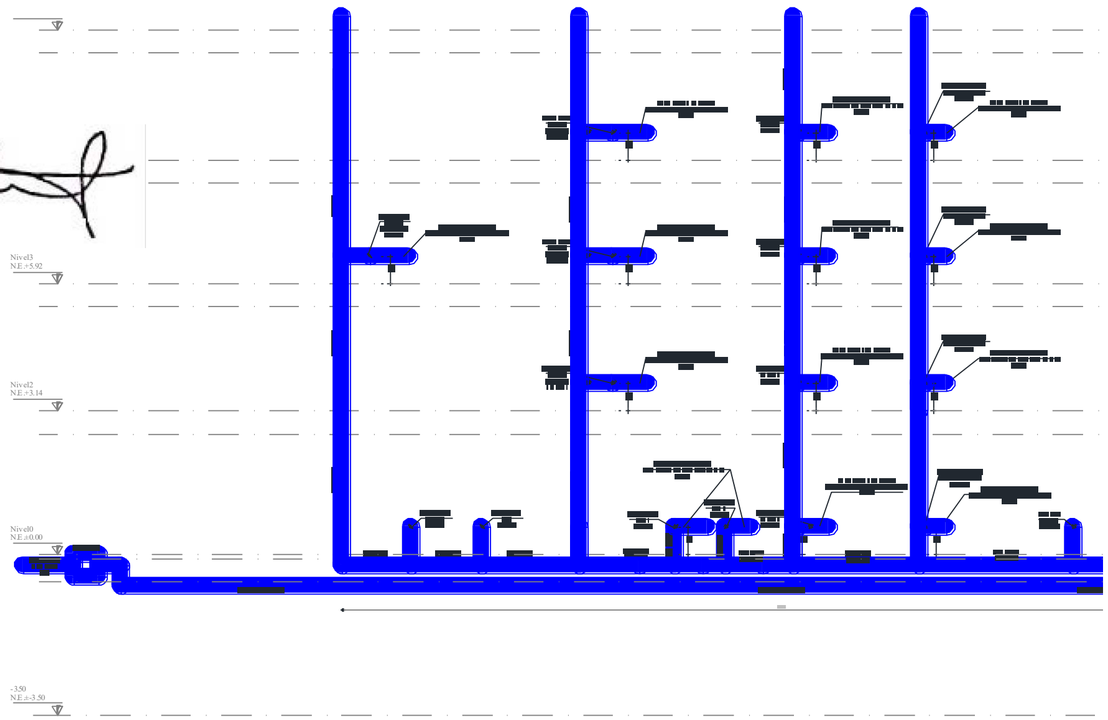


REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE						76.00	76.00
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	SOPORTE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.313		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

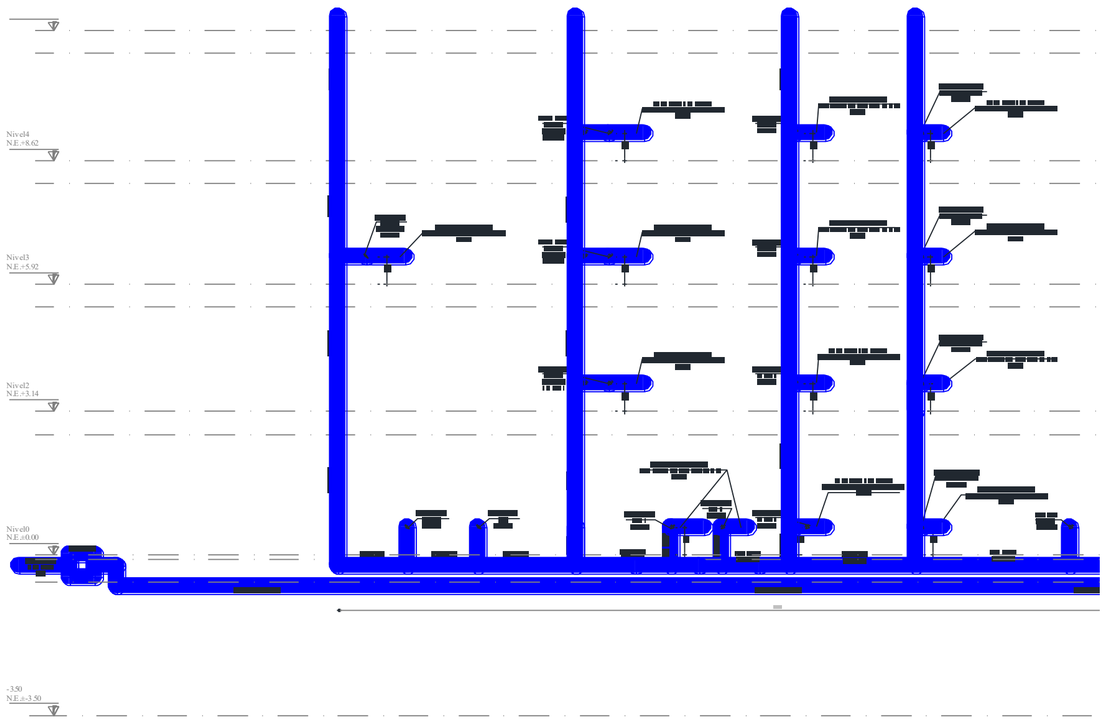

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE						76.00	76.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								76.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	76.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZAL

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.314	SOPORTE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

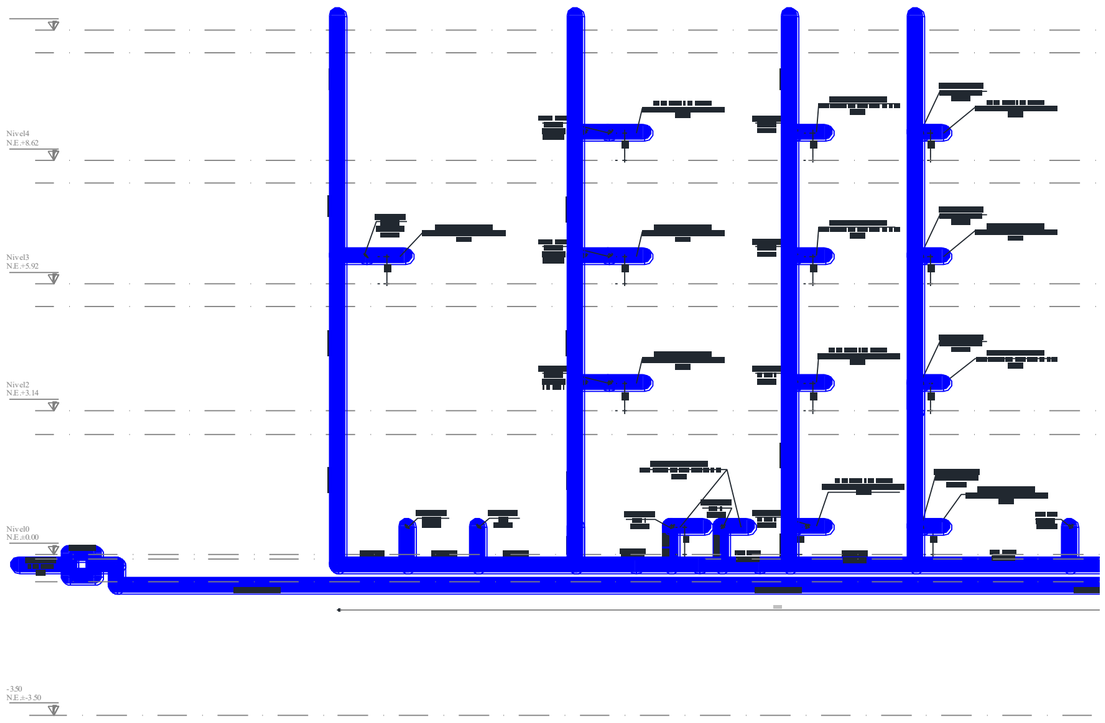


REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE						2.00	2.00
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.315	SOPORTE 1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

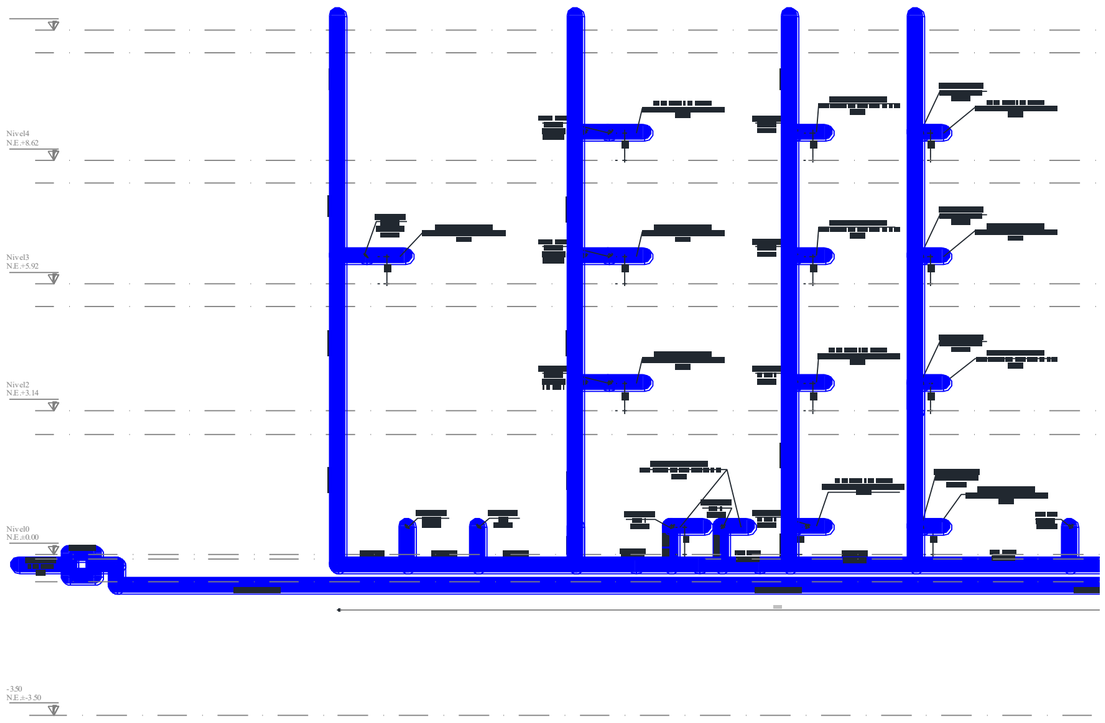

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUMINISTRO-PJ	BAJANTE						8.00	8.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								8.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		8.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander				
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER				
	ÍTEM No.:	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
	5.401		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

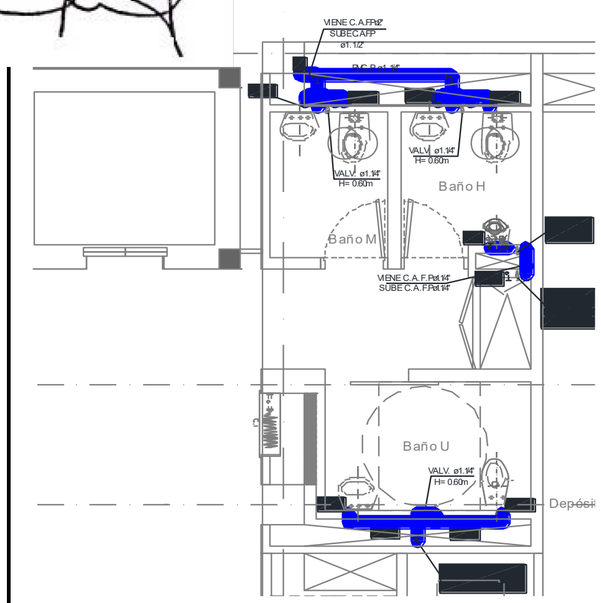

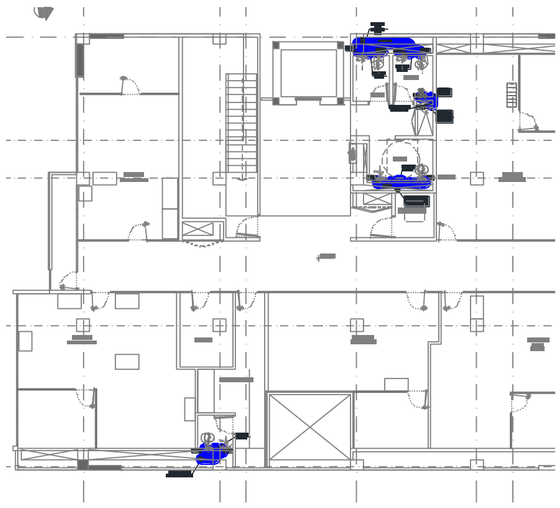

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
	TERCER PISO							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
	BAÑO SEGURIDAD						1.00	1.00
	cuarto PISO							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								10.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		10.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALI

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 5.402	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

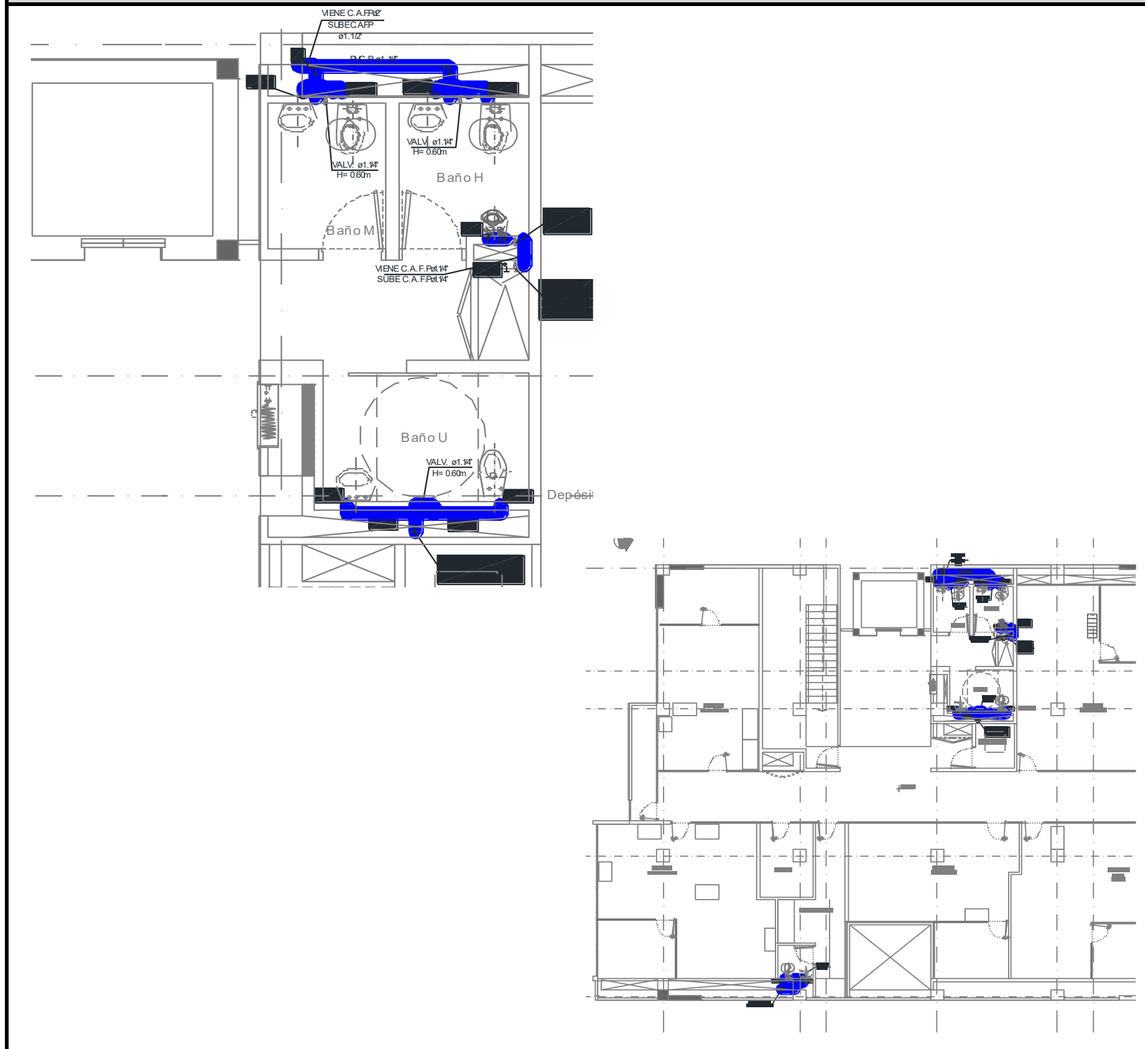

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	ORINAL BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	TERCER PISO							
	ORINAL BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								2.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**2.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTI

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.403		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		SEGUNDO PISO							
		POCETA DE ASEO						1.00	1.00
		TERCER PISO							
		POCETA DE ASEO						1.00	1.00
									-
									2.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		2.00

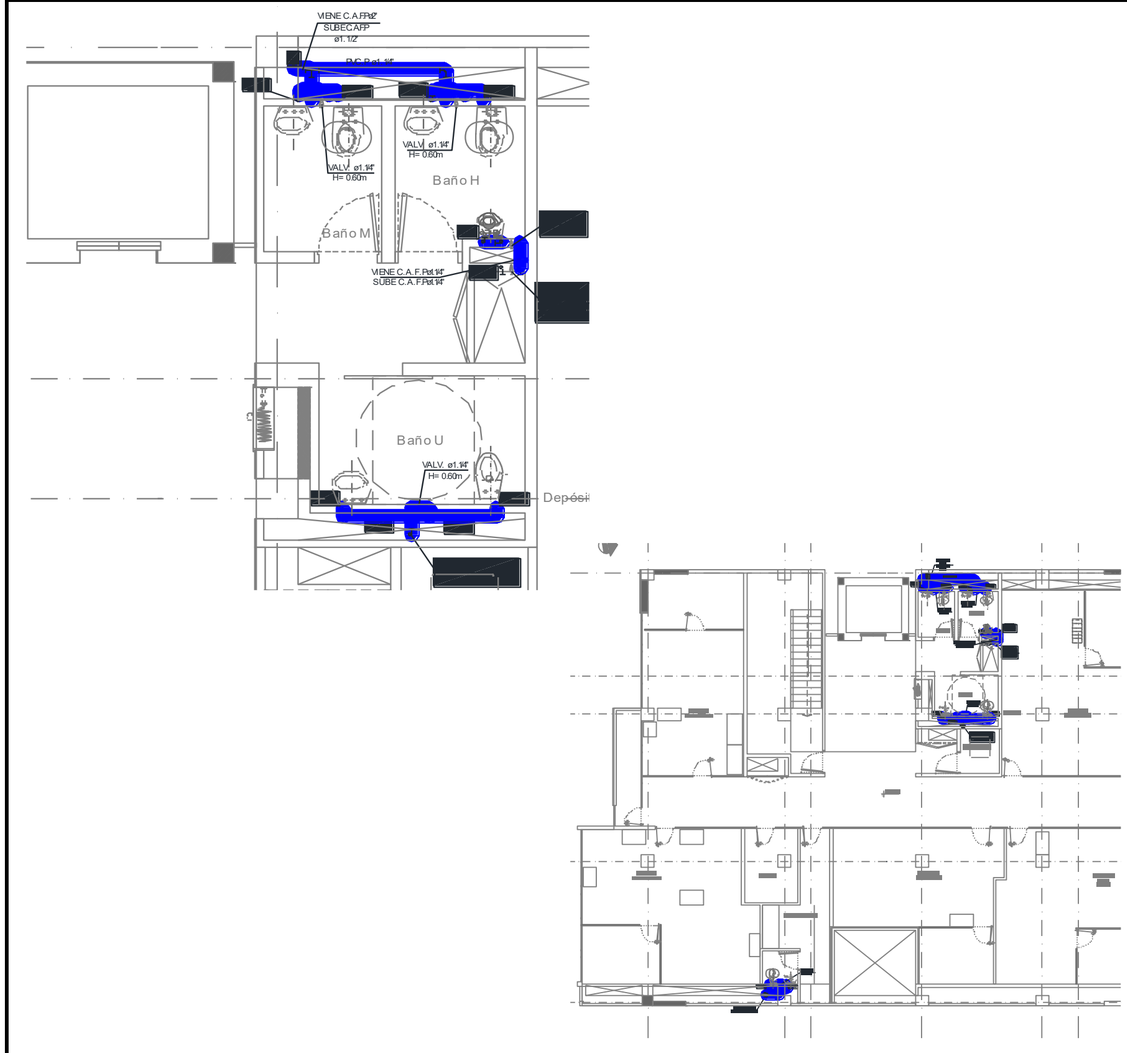

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.501		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

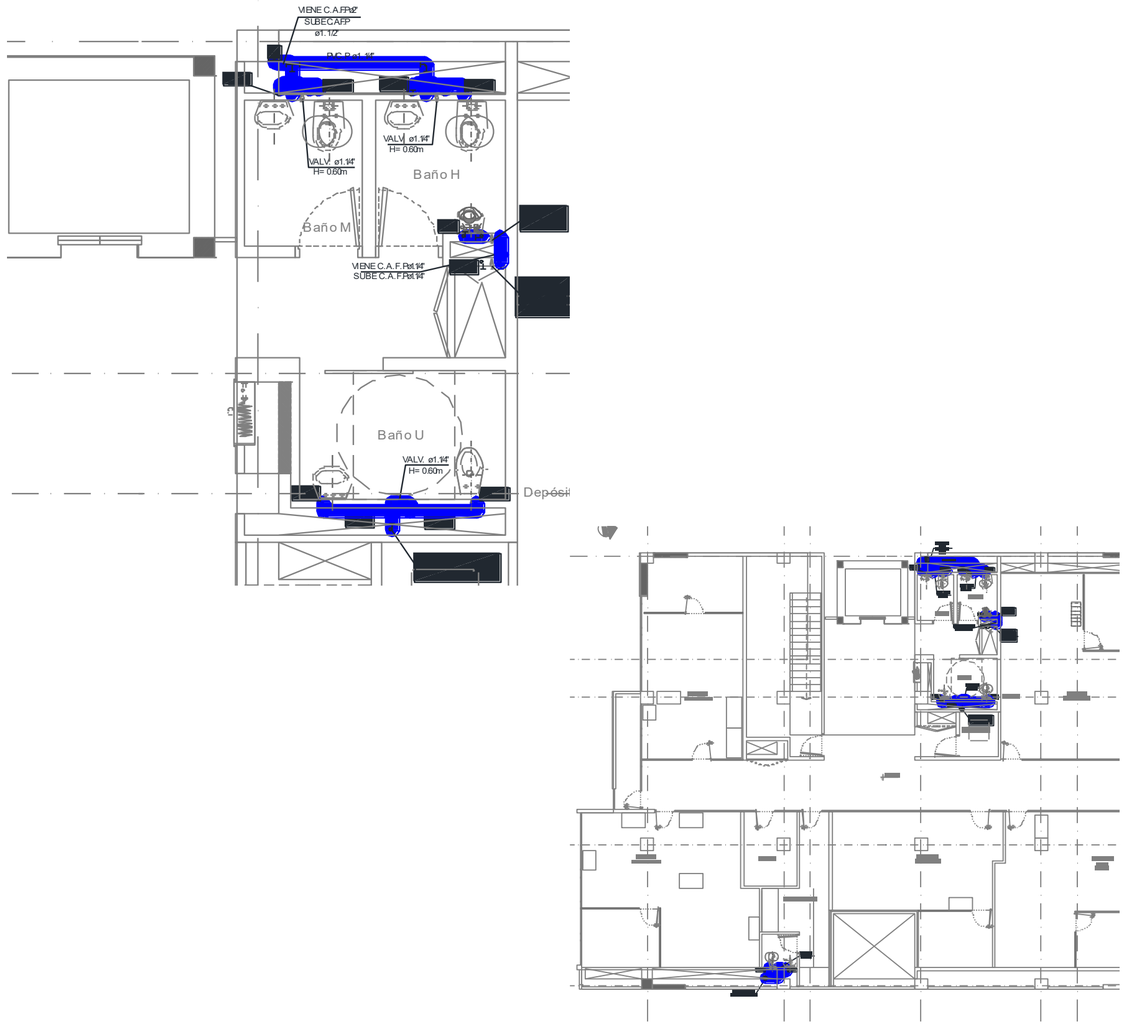

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUM-02	**SEGUNDO PISO**							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
SUM-03	**TERCER PISO**							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
	BAÑO SEGURIDAD						1.00	1.00
SUM-04	**CUARTOPISO**							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								10.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		10.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.501		UN	0 de enero de 1900	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

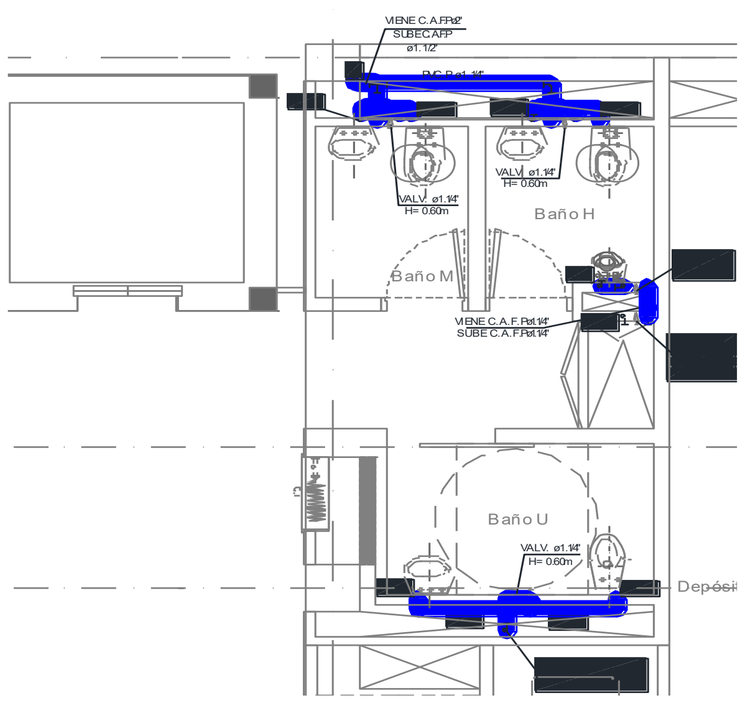

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
	TERCER PISO							
	SEGUNDO PISO							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
	BAÑO SEGURIDAD						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								7.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		7.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIO DE PUSH ANTIVANDALICO Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.502		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

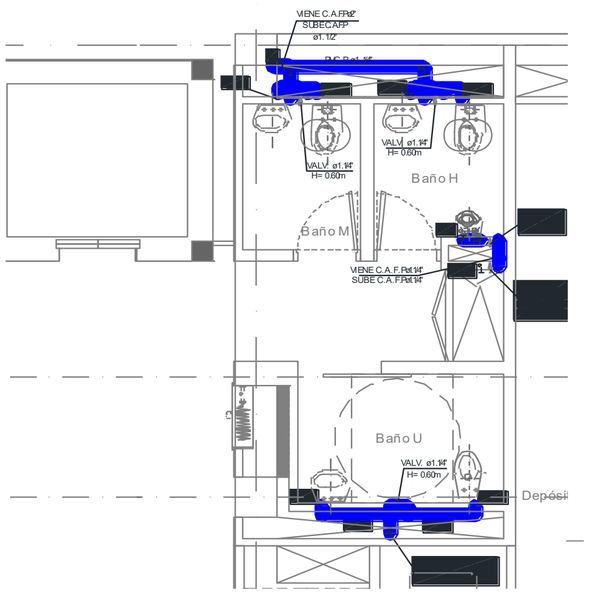

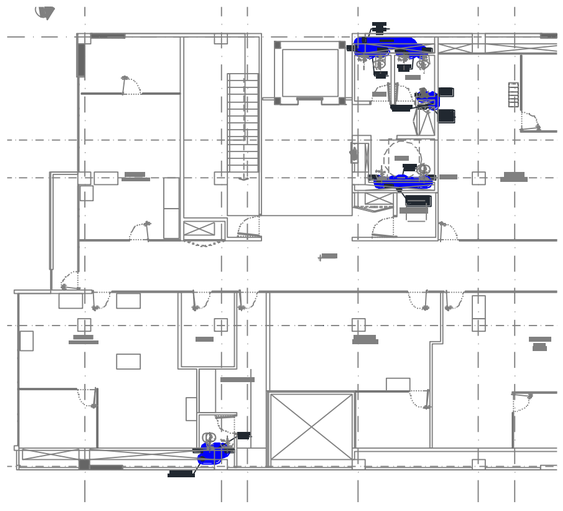

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUM-02	**SEGUNDO PISO**							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
SUM-03	**TERCER PISO**							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
	BAÑO SEGURIDAD						1.00	1.00
SUM-04	**CUARTOPISO**							
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO UNIVERSAL						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								10.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**10.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GON

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 5.504	PUNTO HIDRAULICO PARA POCETAS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

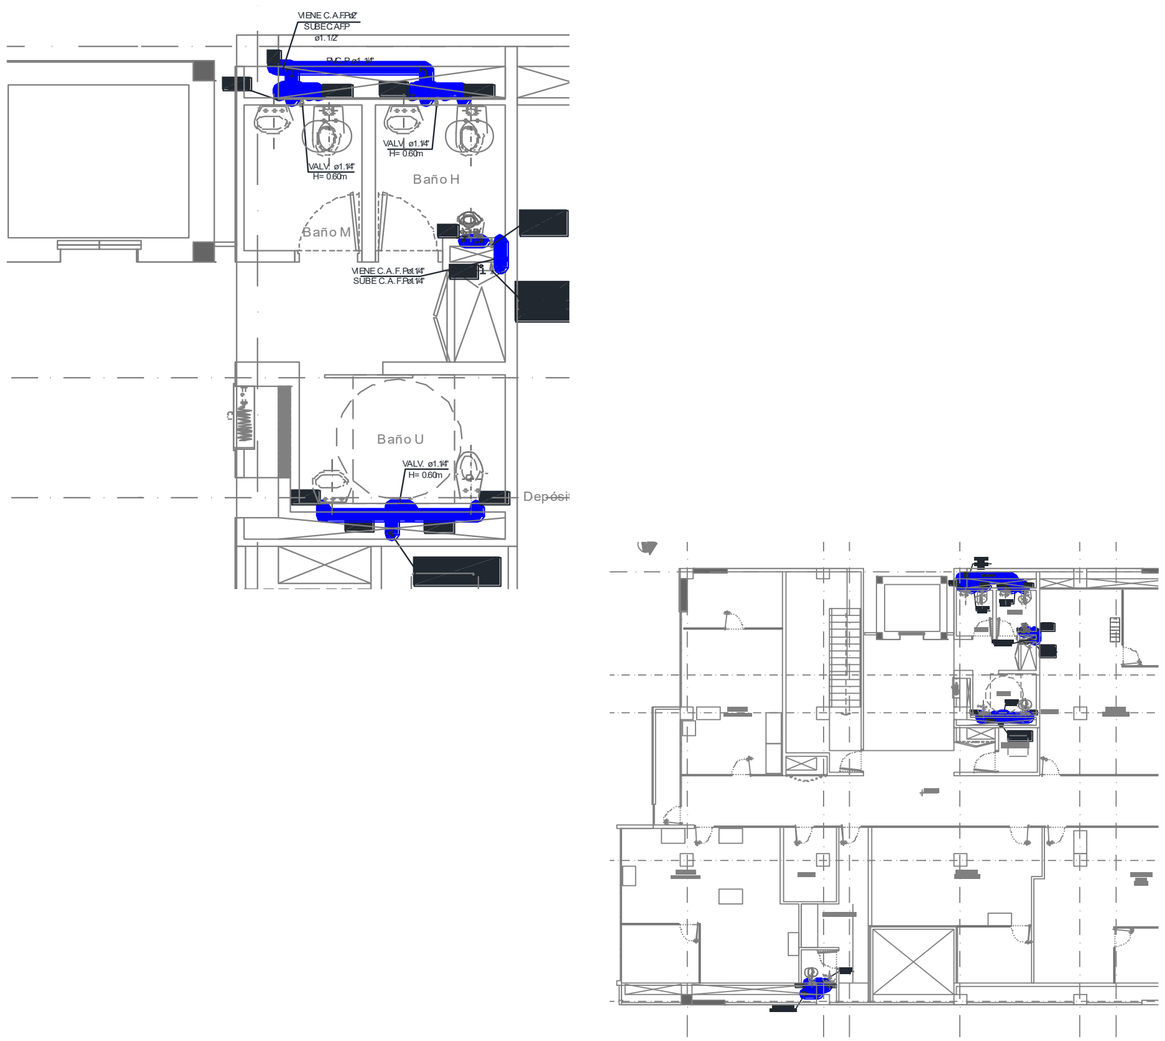

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUM-02	SEGUNDO PISO							
	POCETA ASE0						1.00	1.00
SUM-03	TERCER PISO							
	POCETA ASEO						1.00	1.00
SUM-04	TERCER PISO							
	POCETA ASEO						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								3.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		3.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO C

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 5.506	PUNTO HIDRAULICO PARA RECAMARA DE AIRE pvcp 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

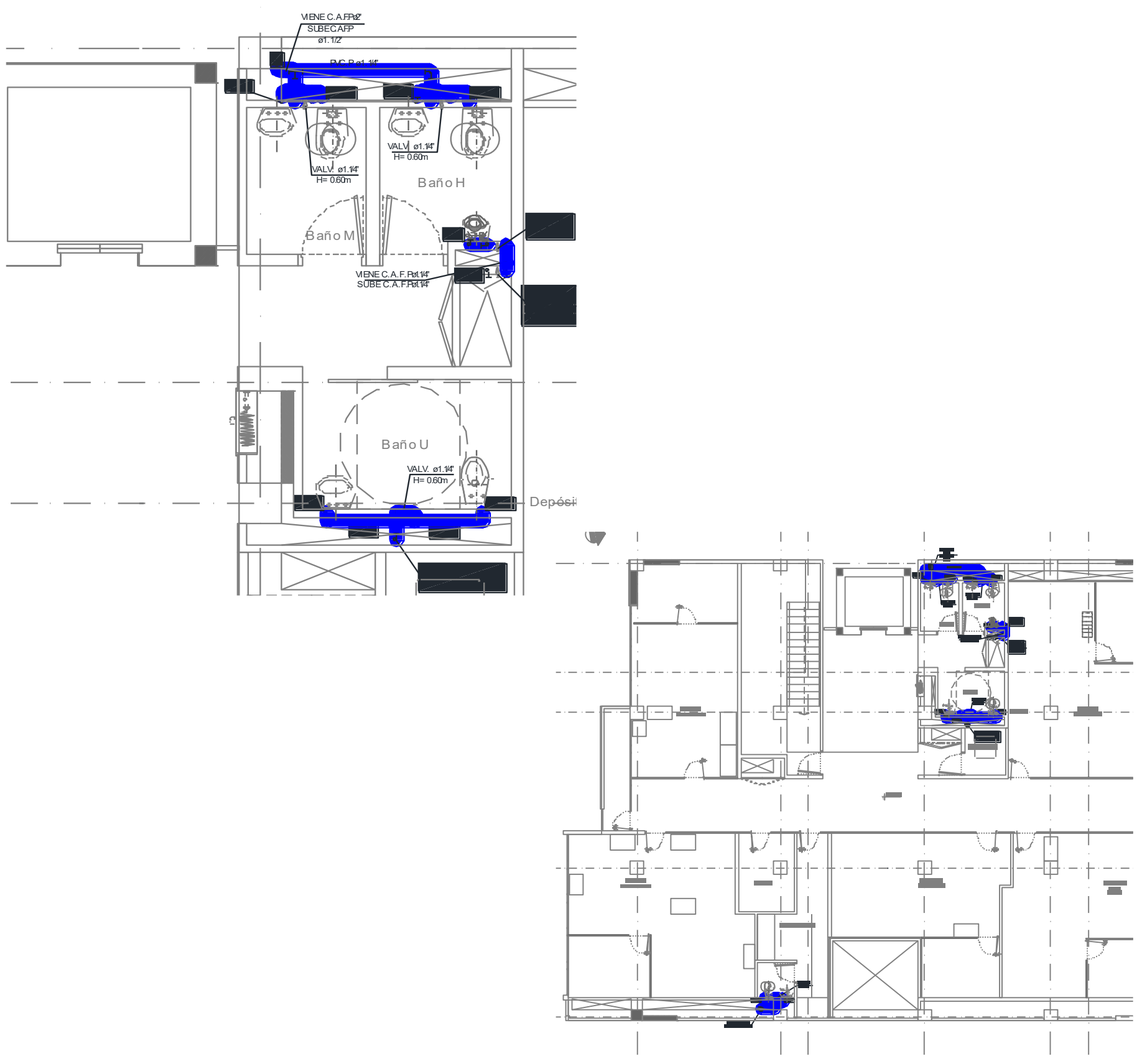

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUM-02	SEGUNDO PISO							
								-
	LAVAMANOS HOMBRES						1.00	1.00
	ORINAL HOMBRES						1.00	1.00
	LAVAMANOS MUJERES						1.00	1.00
	LAVAMANOS BAÑO U						1.00	1.00
								-
SUM-03	TERCER PISO							
								-
	LAVAMANOS HOMBRES						1.00	1.00
	ORINAL HOMBRES						1.00	1.00
	LAVAMANOS MUJERES						1.00	1.00
	LAVAMANOS BAÑO U						1.00	1.00
	LAVAMANOS BAÑO OF SEGURIDAD						1.00	1.00
SUM-04	CUARTO PISO							
								-
	LAVAMANOS HOMBRES						1.00	1.00
	ORINAL HOMBRES						1.00	1.00
	LAVAMANOS MUJERES						1.00	1.00
	LAVAMANOS BAÑO U						1.00	1.00
								-
								-
								-
								13.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		13.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO HIDRAULICO PARA ORINAL ø1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.507		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

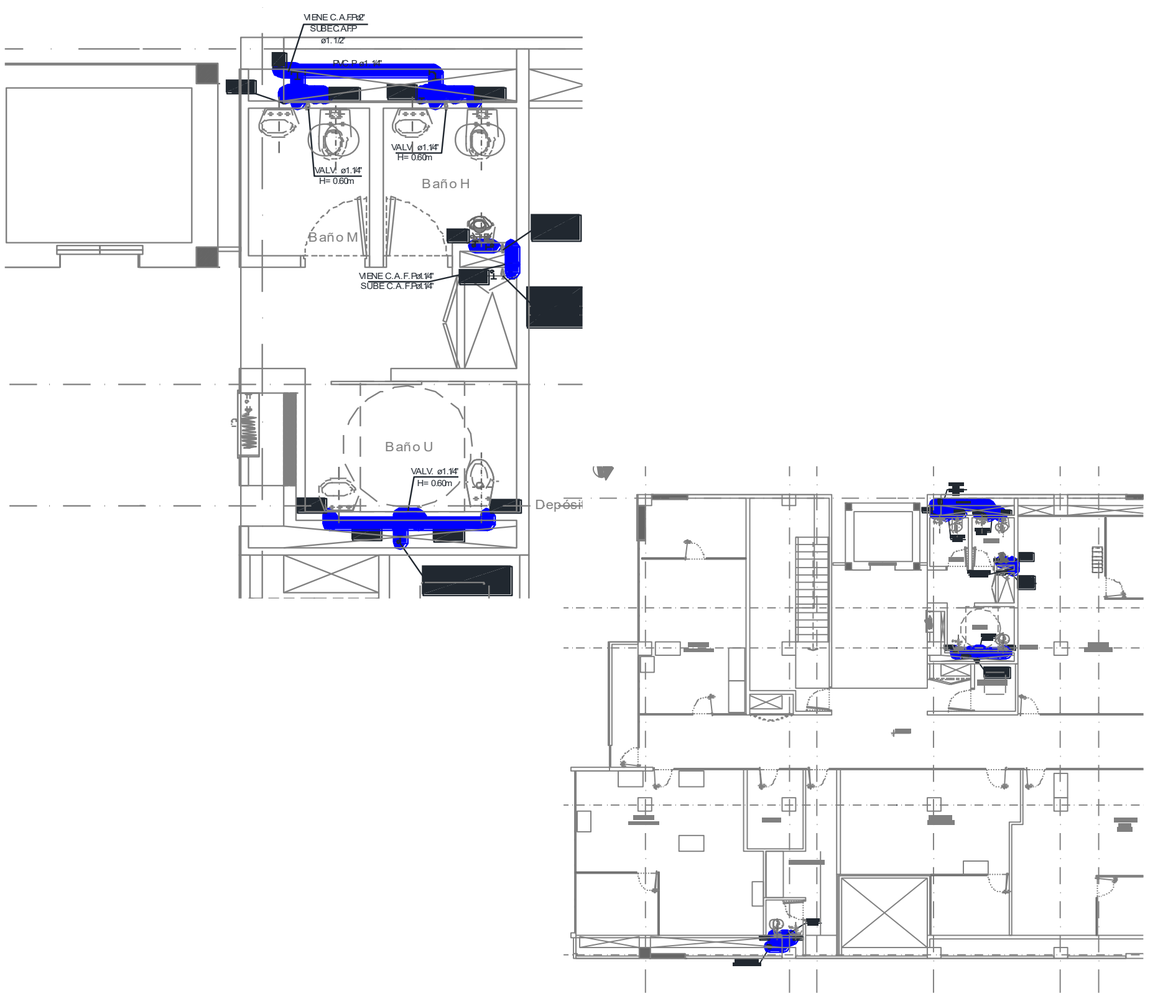

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SUM-02	SEGUNDO PISO							
								-
	ORINAL HOMBRES						1.00	1.00
								-
SUM-03	TERCER PISO							
								-
	ORINAL HOMBRES						1.00	1.00
SUM-04	CUARTO PISO							
								-
	ORINAL HOMBRES						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								3.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		3.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA



Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.601		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

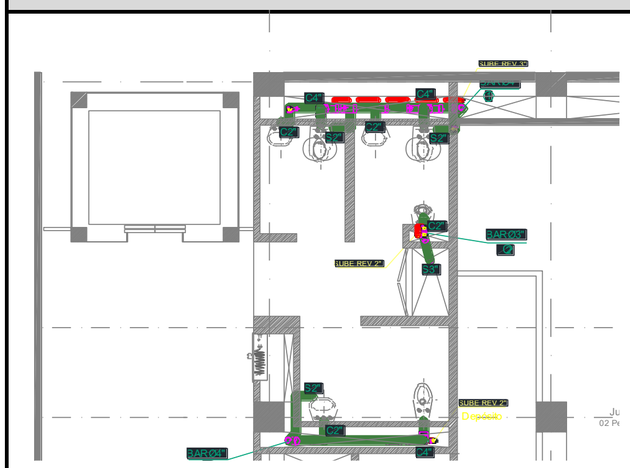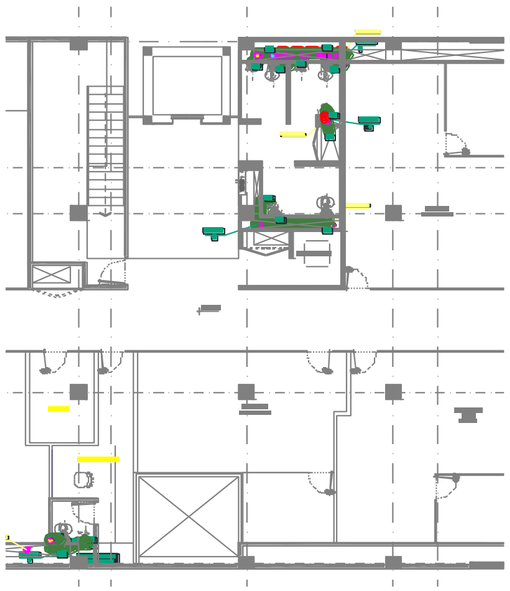DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
 									
	AR-02	SEGUNDO PISO							
									-
		LAVAMANOS HOMBRES						1.00	1.00
		LAVAMANOS MUJERES						1.00	1.00
		LAVAMANOS BAÑO U						1.00	1.00
									-
	AR-03	TERCER PISO							
									-
		LAVAMANOS HOMBRES						1.00	1.00
		LAVAMANOS MUJERES						1.00	1.00
		LAVAMANOS BAÑO U						1.00	1.00
									-
									-
									-
									6.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		6.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZA

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO SANITARIO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.602		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

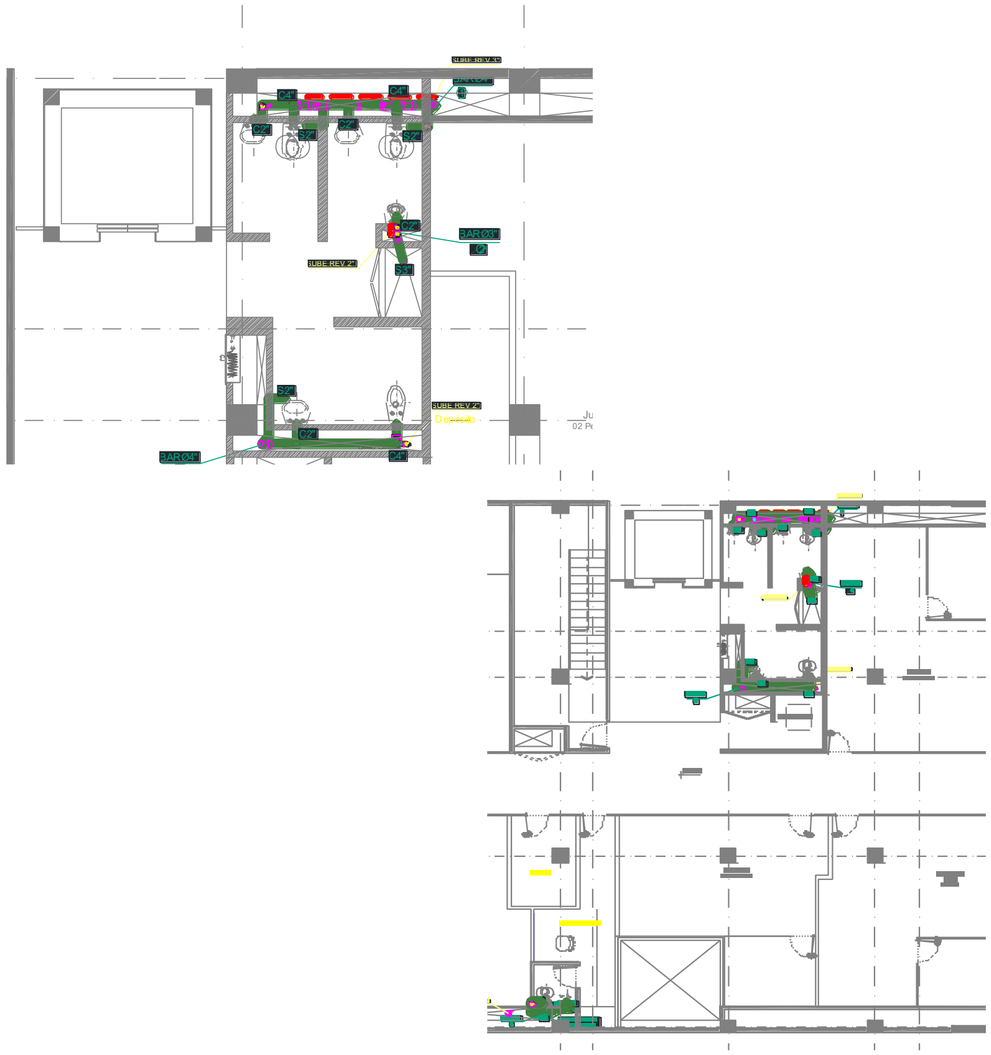

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AR-02	SEGUNDO PISO							
	SANITARIO HOMBRES						1.00	1.00
	SANITARIO MUJERES						1.00	1.00
	SANITARIO BAÑO U						1.00	1.00
AR-03	TERCER PISO							
	SANITARIO HOMBRES						1.00	1.00
	SANITARIO MUJERES						1.00	1.00
	SANITARIO BAÑO U						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								6.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	6.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	PUNTO SANITARIO PARA ORINAL Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
	5.604		UN	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

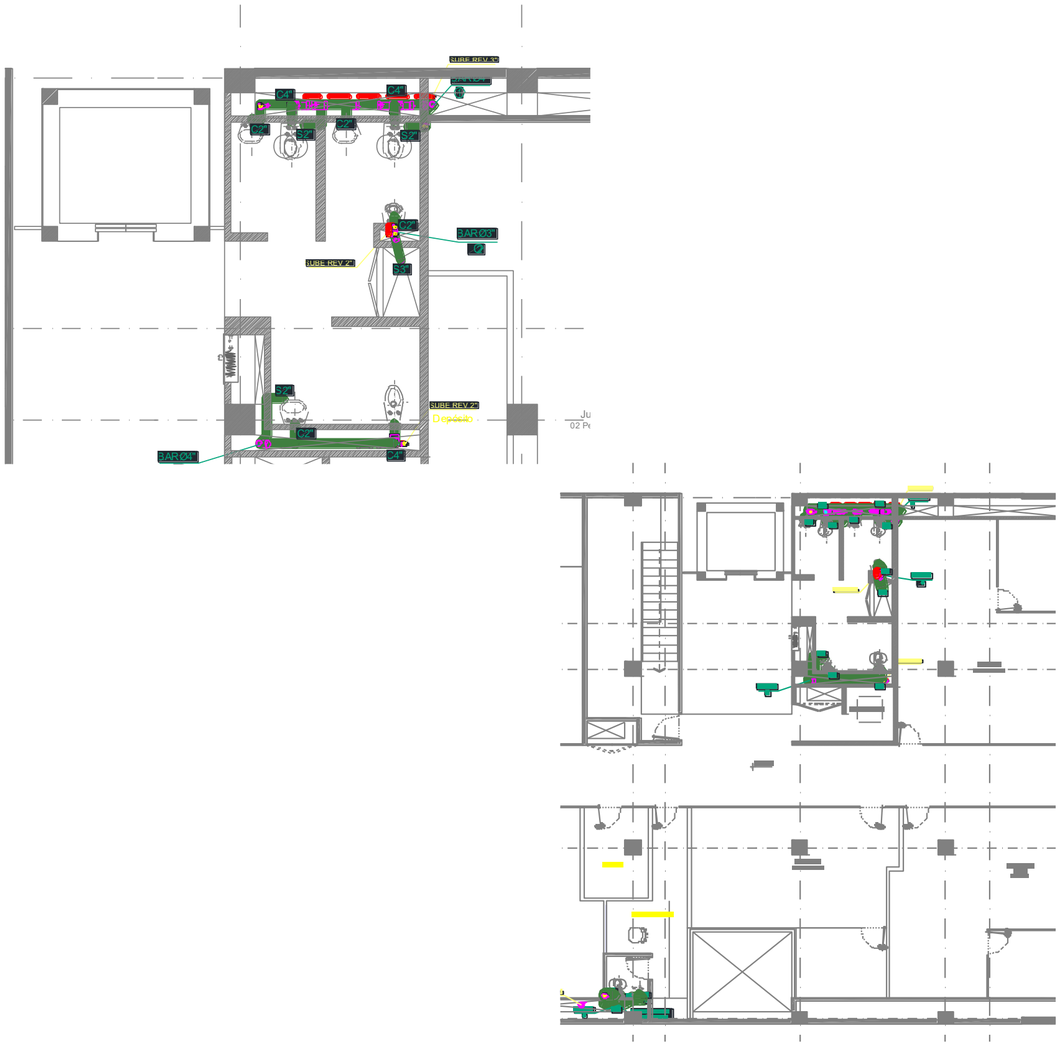

SUBE REV 2
SUBE REV 2
SUBE REV 2

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.605		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

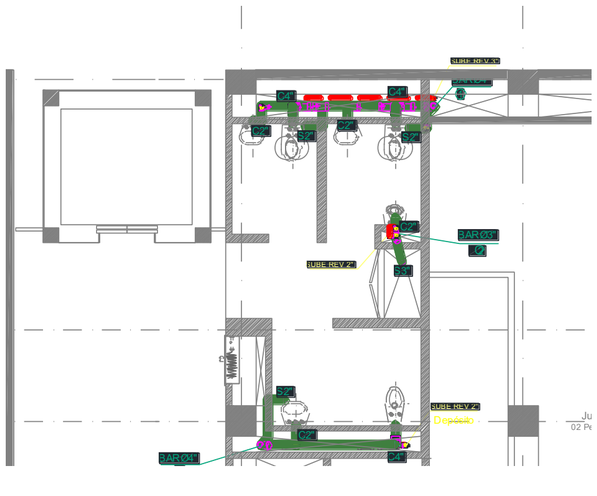

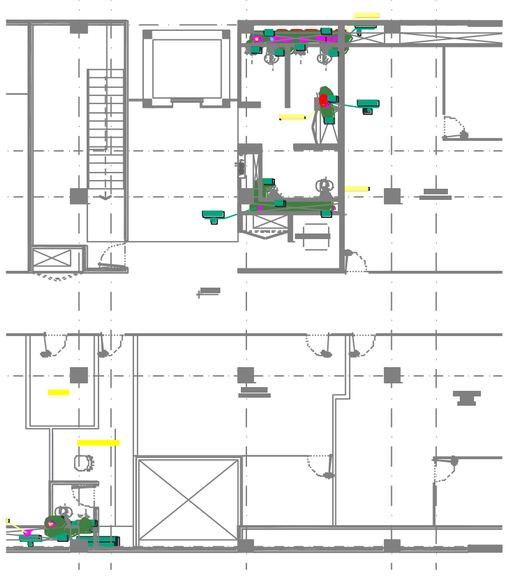

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AR-02	SEGUNDO PISO							
	POCETA ASEO						1.00	1.00
AR-03	TERCER PISO							
	POCETA ASEO						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								2.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		2.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GON

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.606		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

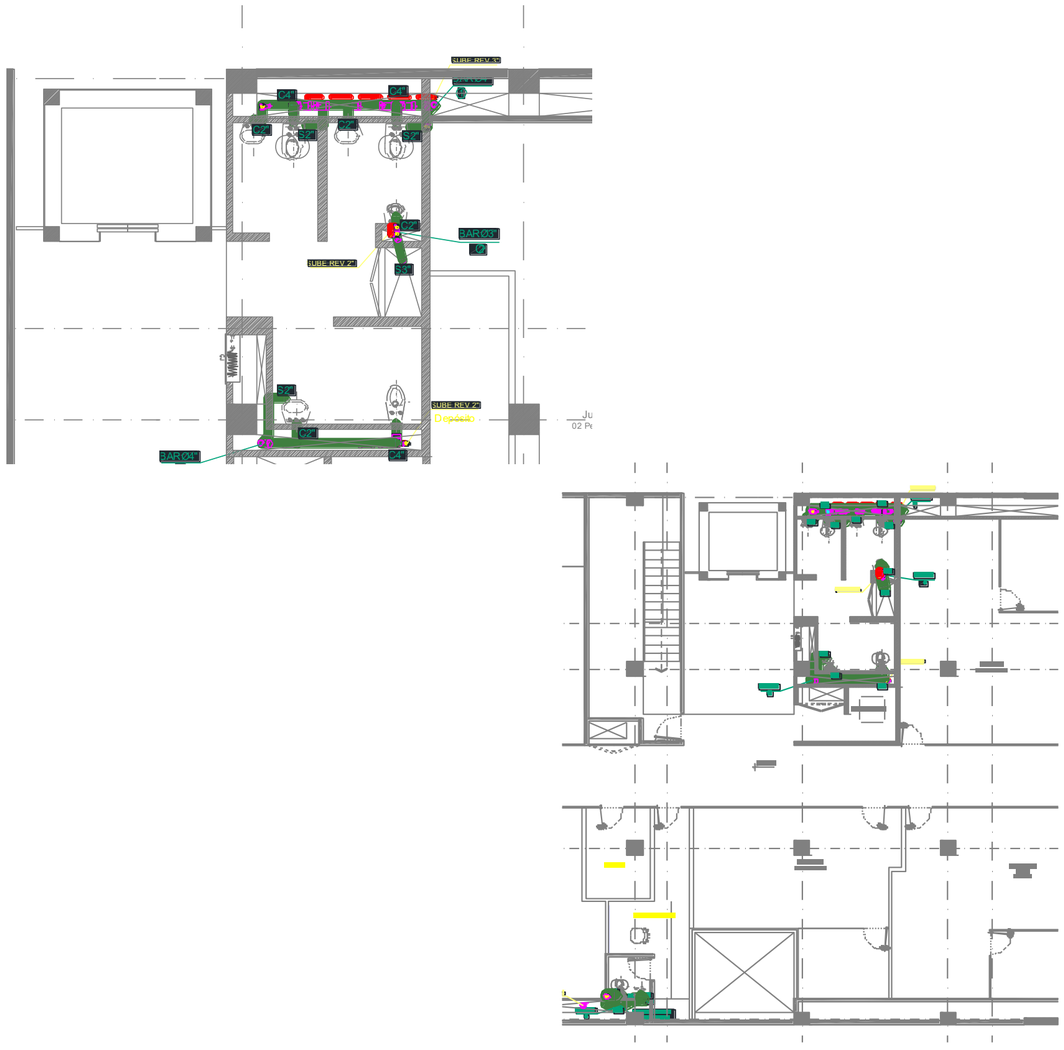

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AR-02	**SEGUNDO PISO**							
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO BAÑO U						1.00	1.00
AR-03	**TERCER PISO**							
	BAÑO HOMBRES						1.00	1.00
	BAÑO MUJERES						1.00	1.00
	BAÑO BAÑO U						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								6.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**6.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO G

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:	TUBERIA PVC-L Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.701		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

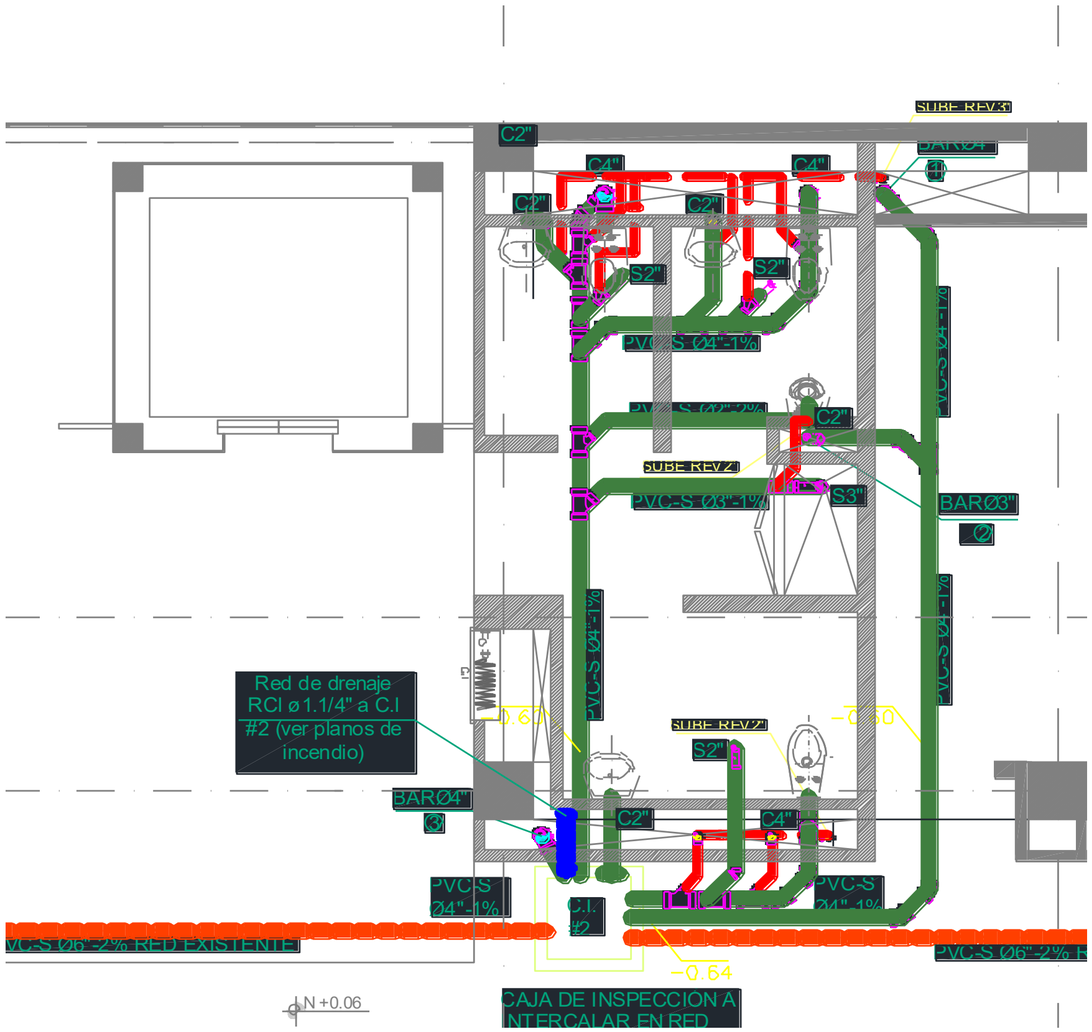

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
A.R.	BAJANTE	11.75					2.00	23.50
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								23.50
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	23.50

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO C

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	TUBERIA PVC-L Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
	5.702		ML	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
A.R.	BAJANTE	18					1.00	18.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								18.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		18.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.801	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ML	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

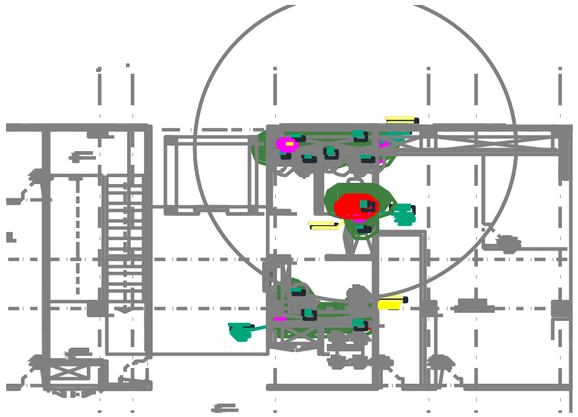

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO	5.00					1.00	5.00
		4.00					1.00	4.00
		2.8					1.00	2.80
		1.8					1.00	1.80
		4.00					1.00	4.00
		5.00					1.00	5.00
	TERCER PISO	6					1.00	6.00
		1					1.00	1.00
		4					1.00	4.00
		3					1.00	3.00
		3					1.00	3.00
		5					1.00	5.00
		3					1.00	3.00
		3.00					1.00	3.00
		34.65					1.00	34.65
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								85.25
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		85.25

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	TUBERÍA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
	5.802		ML	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

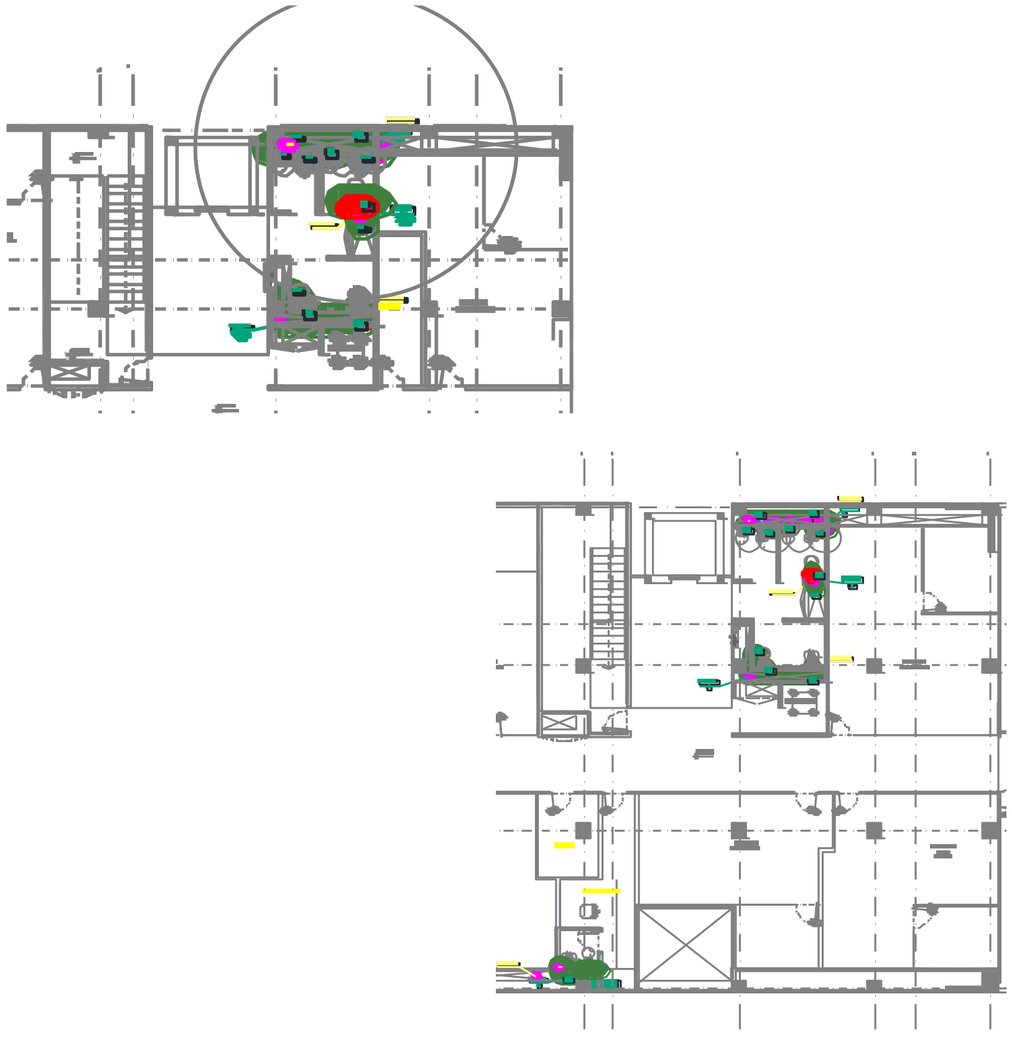

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	SEGUNDO PISO	1.00					1.00	1.00
	TERCER PISO	4.5					1.00	4.50
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								5.50
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		5.50

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.803		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		SEGUNDO PISO	4.50					1.00	4.50
		TERCER PISO	18					1.00	18.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									22.50
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		22.50

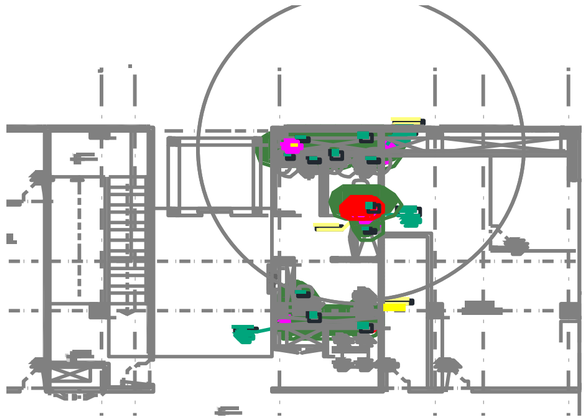



ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.804		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

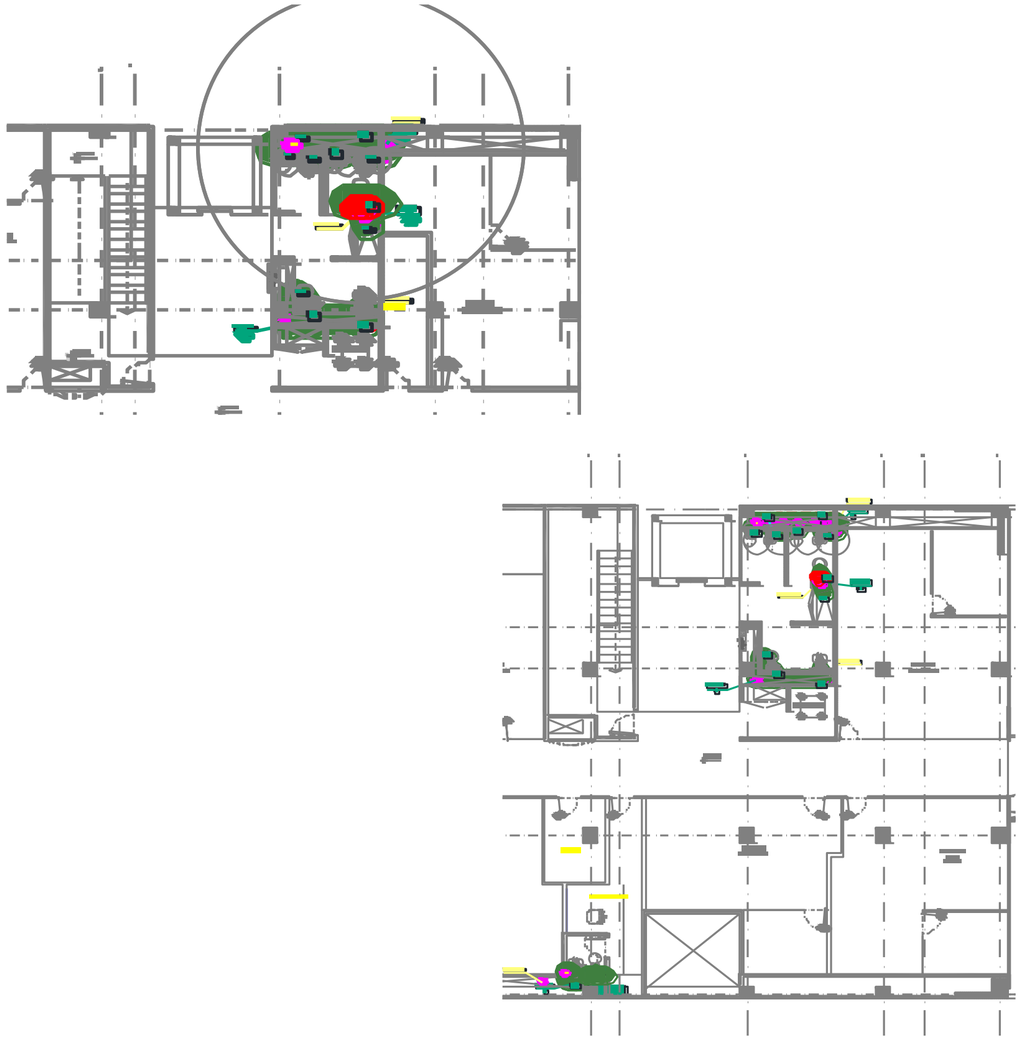

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	SEGUNDO PISO						4.00	4.00
	TERCER PISO						50.00	50.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								54.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		54.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.805		UN	21 de enero de 2026	


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		SEGUNDO PISO						3.00	3.00
		TERCER PISO						2.00	2.00
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.806		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

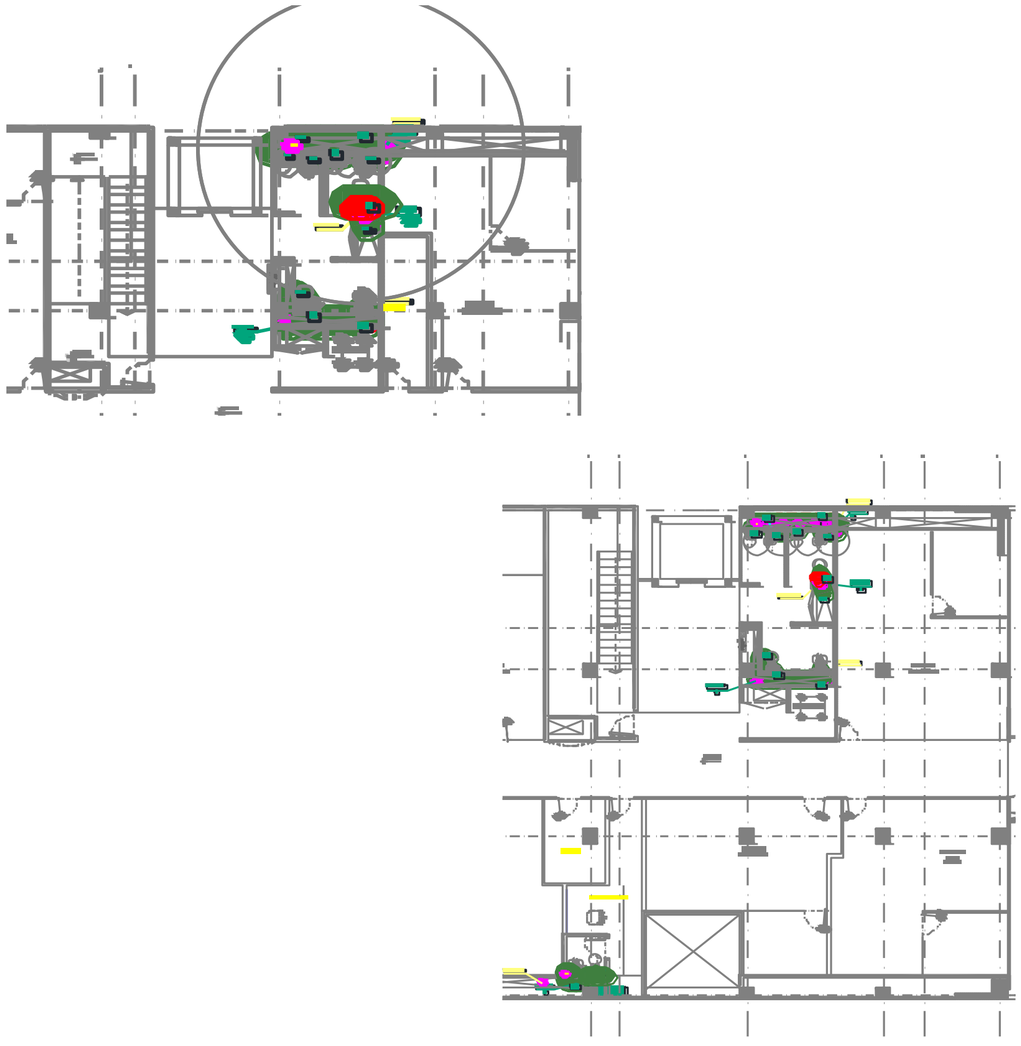

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	SEGUNDO PISO						30.00	30.00
	TERCER PISO						50.00	50.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								80.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		80.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 5.810	JUNTA EXPANSION Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

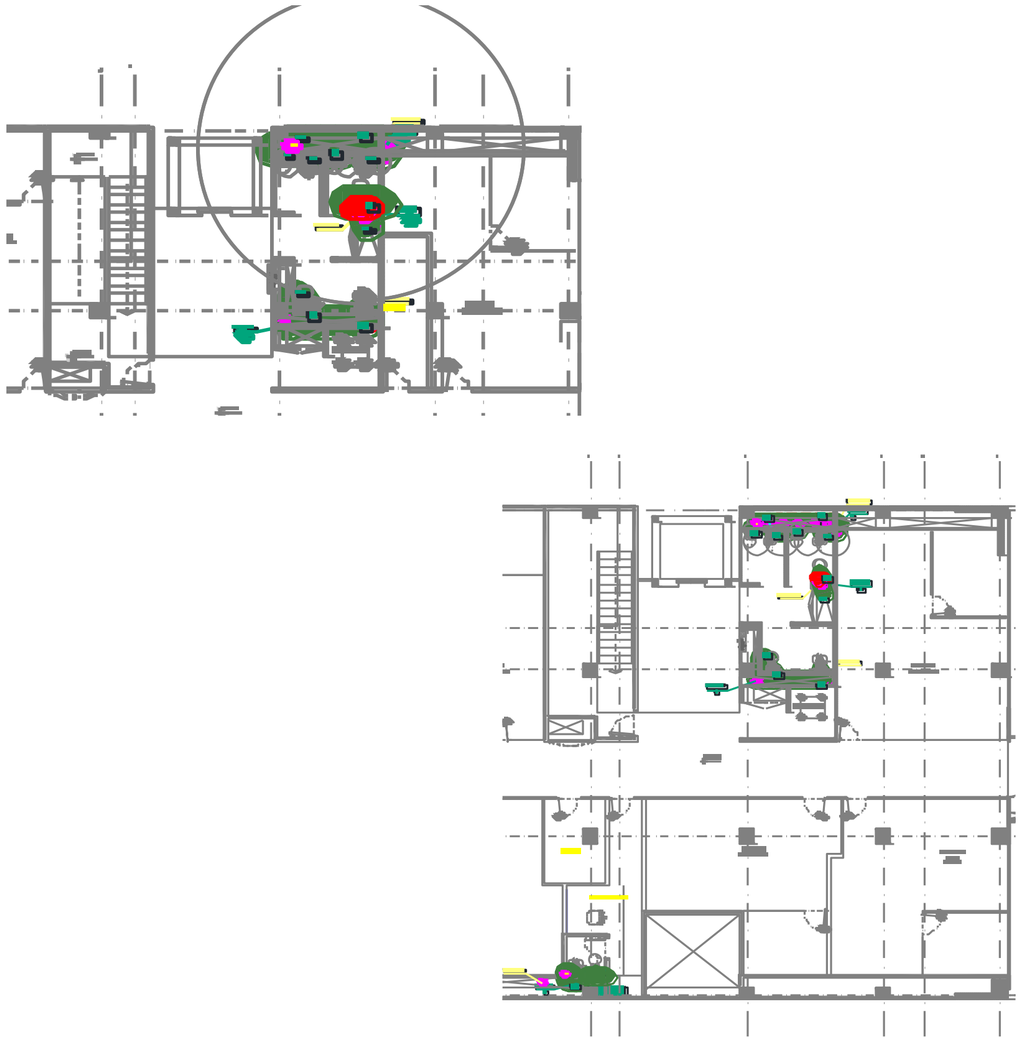

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	BAJANTES						3.00	3.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								3.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		3.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO G

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TAPON DE INSPECCION Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.812		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

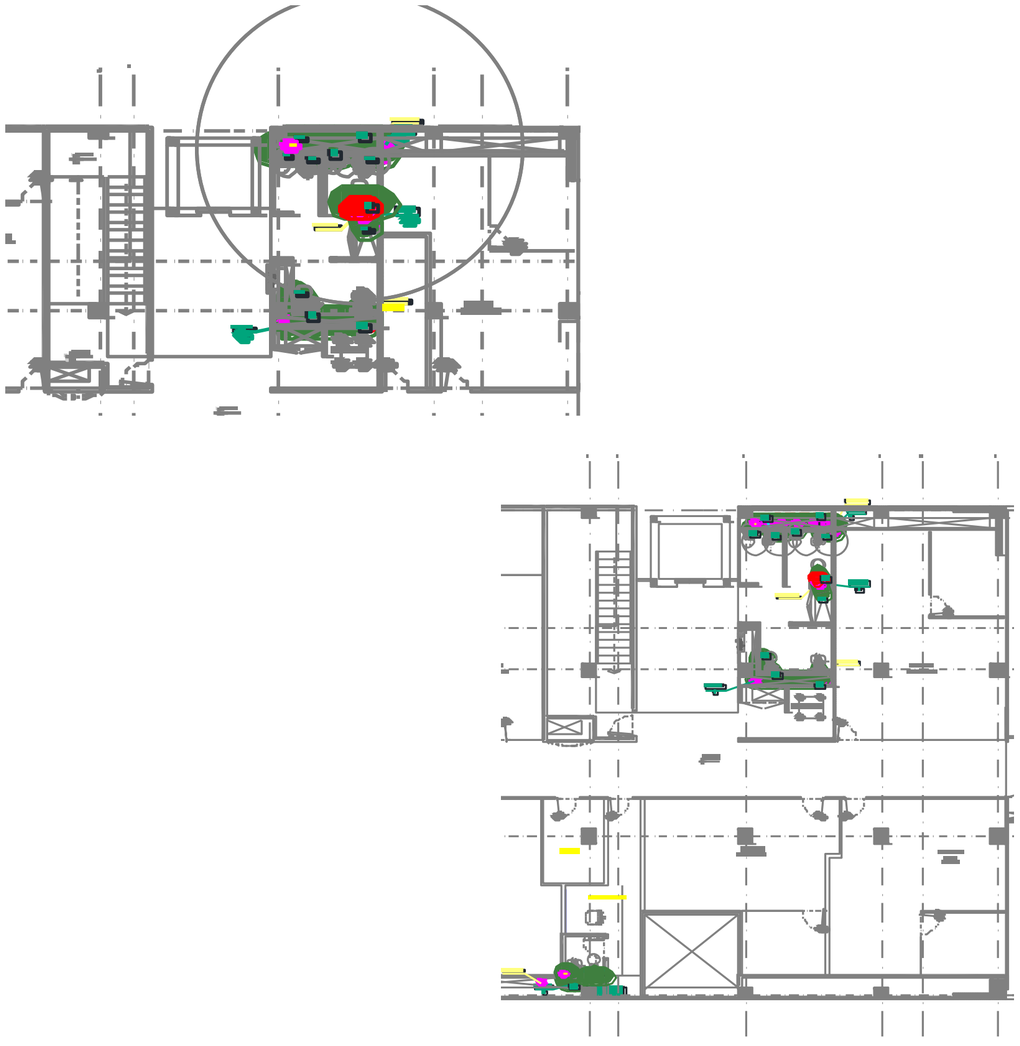

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	SEGUNDO PISO						1.00	1.00
	TERCER PISO						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								2.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	2.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO C

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.901		ML	21 de enero de 2026	


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		BAJANTES	12.00					5.00	60.00
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.902		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

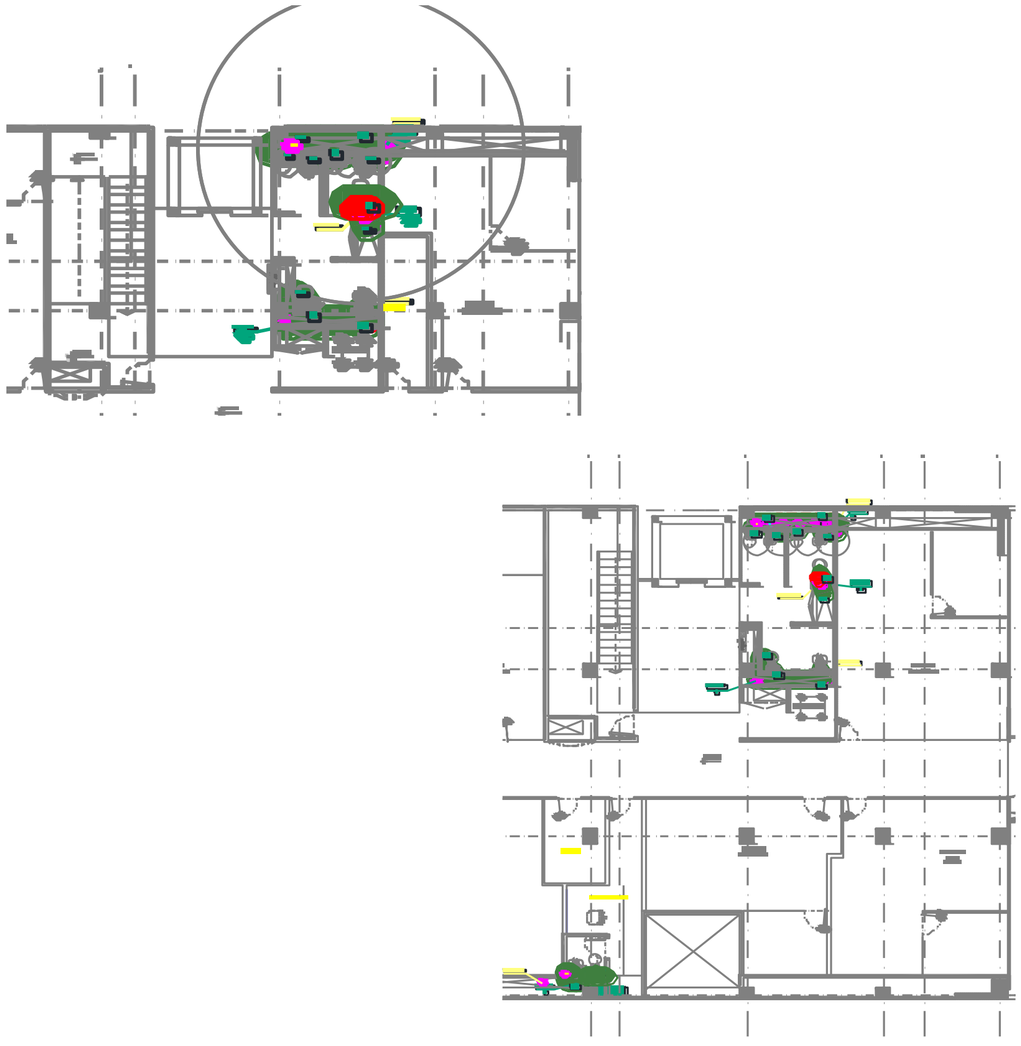

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	BAJANTES	12.00					1.00	12.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								12.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		12.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES

OBSERVACIONES


Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
5.903	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

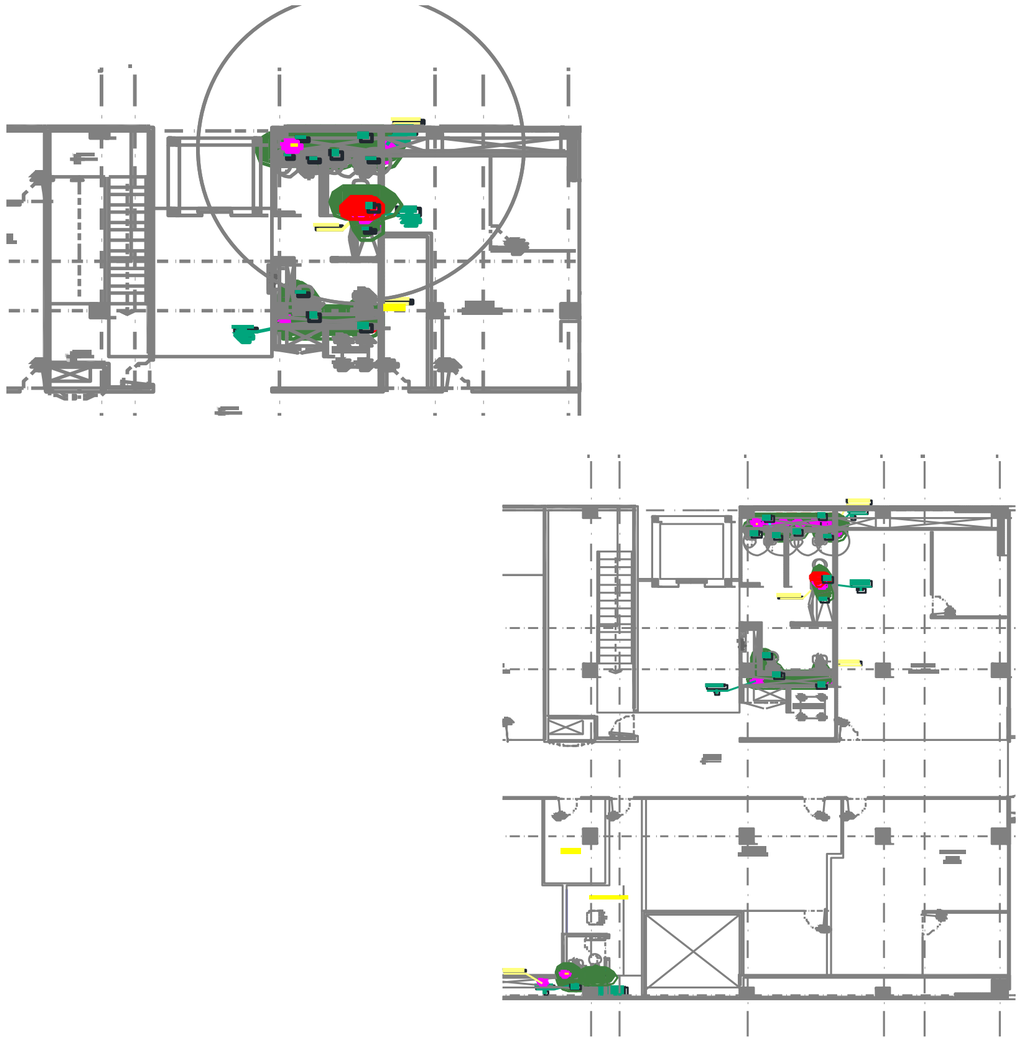

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO						15.00	15.00
	TERCER PISO						15.00	15.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								30.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		30.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO G

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TAPON DE INSPECCION Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.912		UN	21 de enero de 2026	


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		SEGUNDO PISO						2.00	2.00
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.904	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		SEGUNDO PISO						2.00	2.00
		TERCER PISO						2.00	2.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									4.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	4.00

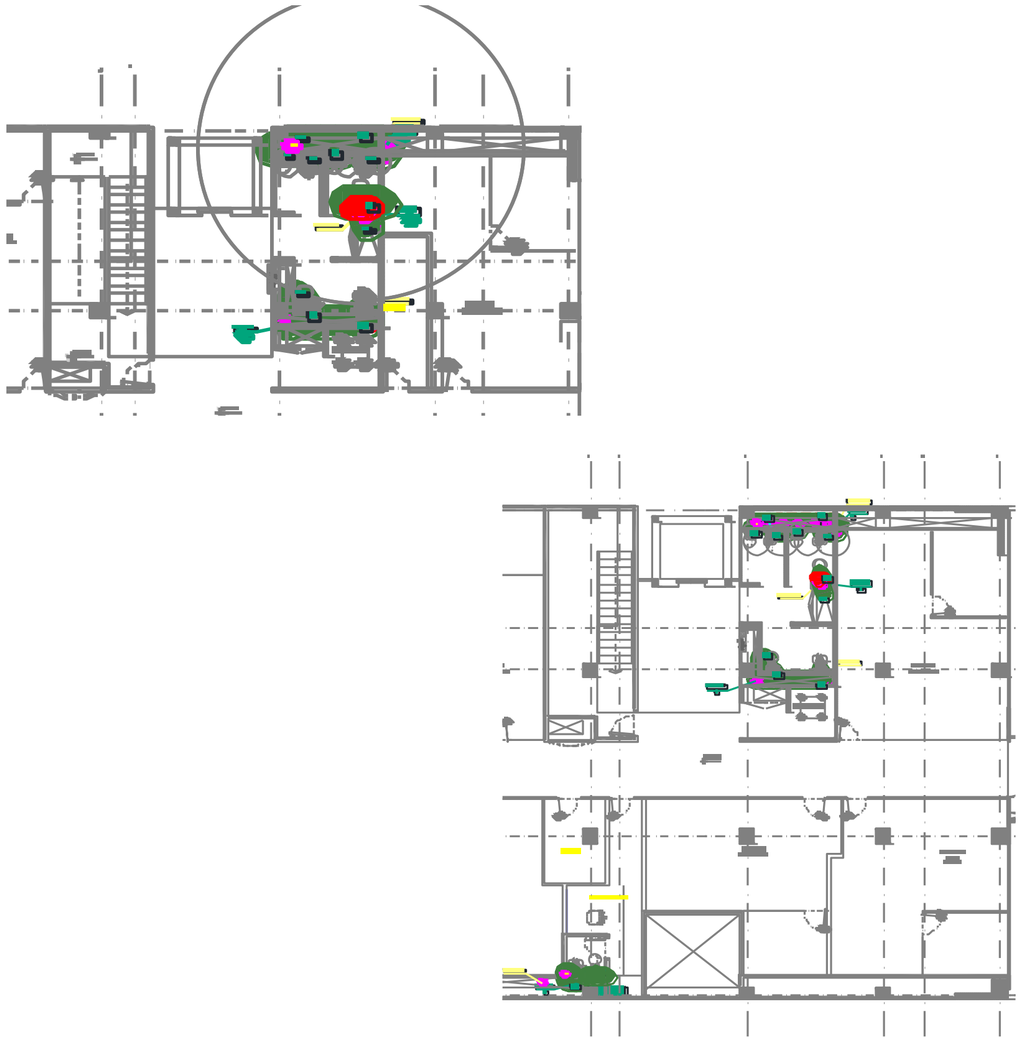

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO C

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA POLIPROPILENO 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD	FECHA:	
5.101		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		PRIMER PISO						1.00	1.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									1.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1.00

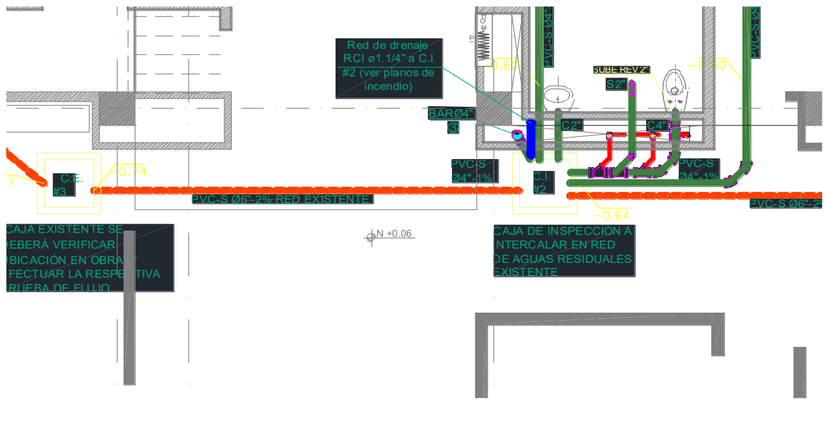

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 5.121	EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN	UNIDAD: M3	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

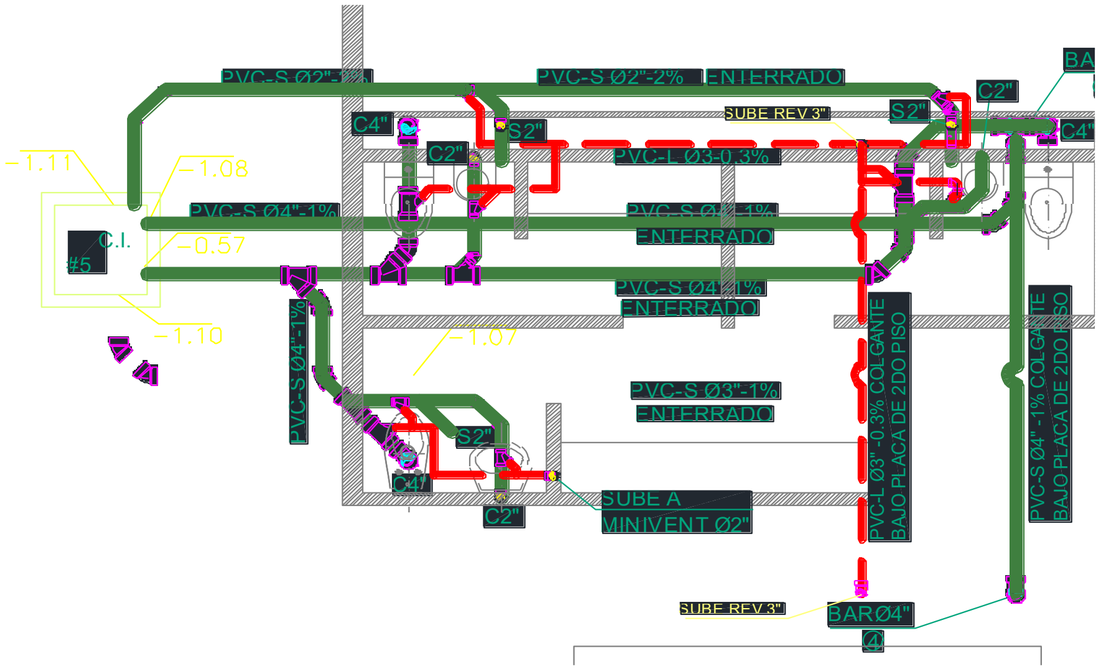

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PRIMER PISO. EJES (C-D)(1-2)	1.00	1.00	0.90		0.90	1.00	0.90
		5.00	0.30	0.30		0.45	1.00	0.45
		4.00	0.30	0.30		0.36	1.00	0.36
		2.80	0.30	0.30		0.25	1.00	0.25
		5.00	0.50	0.90		2.25	1.00	2.25
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								4.21
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		4.21

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTR

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.123	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UNIDAD M3	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

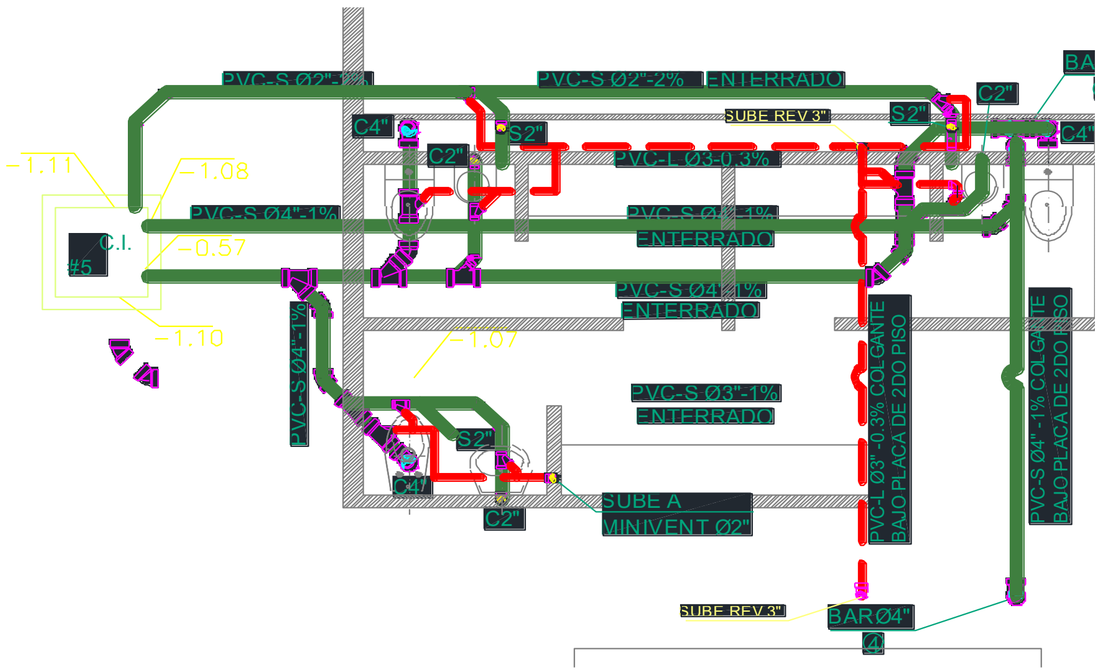

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PRIMER PISO. EJES (C-D)(1-2)	1.00	1.00	0.90		0.90	1.00	0.90
		5.00	0.30	0.30		0.45	1.00	0.45
		4.00	0.30	0.30		0.36	1.00	0.36
		2.80	0.30	0.30		0.25	1.00	0.25
		5.00	0.50	0.90		2.25	1.00	2.25
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								4.21
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		4.21

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica normal, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH(FASE-NEUTRO-TIERRA), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conectores tipo resortemarquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UNIDAD	FECHA:	
6.201		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO						32.00	32.00
	TERCER PISO						35.94	35.94
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								67.94
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		67.94

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasicaregulada, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH TC(FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipohospitalario conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte marquillas deidentificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UNIDAD	FECHA:
6.202		UN	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	SEGUNDO PISO						13.00	13.00
	TERCER PISO						13.00	13.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								26.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	26.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GON

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica conproteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto EMT, de ½", conductor de cobre CABLE 3No12 AWG, TC LS-ZH TC LS-ZH (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A,120V, conectores tipo resorte marquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LASALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UNIDAD	FECHA:	
6.203		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	SEGUNDO PISO						2.00	2.00
	TERCER PISO						2.00	2.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								4.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		4.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , con division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para tomas e iluminacion , incluyendo cable desnudo No 6.	UNIDAD	FECHA:
6.901		ML	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



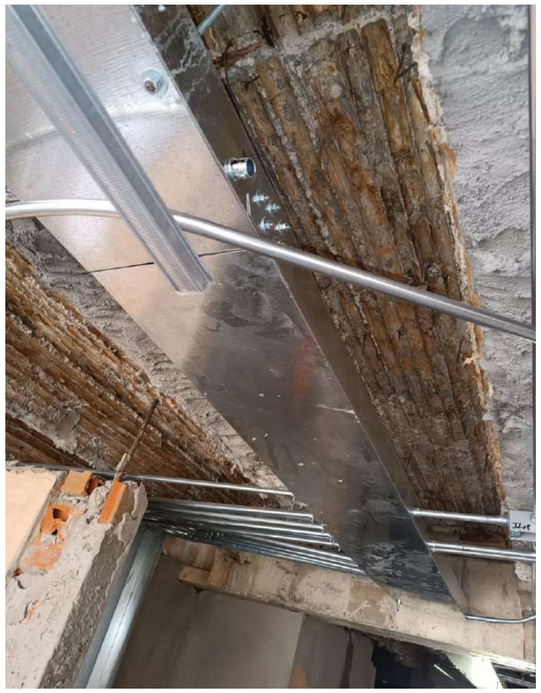

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	TERCER PISO						15.00	15.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								15.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		15.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTR

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPO DE MEDIDA CD-GENERAL Malla de puesta a tierra para el CD-GEN, independiente según ART 15 RETIE, incluyendo 4 varillas de cobrede 5/8" x 2.44 m, 50m de conductor de cobre desnudo No 2/0, preparación de tierra, y 1 pozo de inspeccion, y conexiones con soldadura tipo cadwell	UNIDAD	FECHA:	
6.101		UN	21 de enero de 2026	


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
								1.00	1.00
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 6.111	Tendido de tubería Ø 3/4" IMC, desde la cubierta hasta el terreno. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ML	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

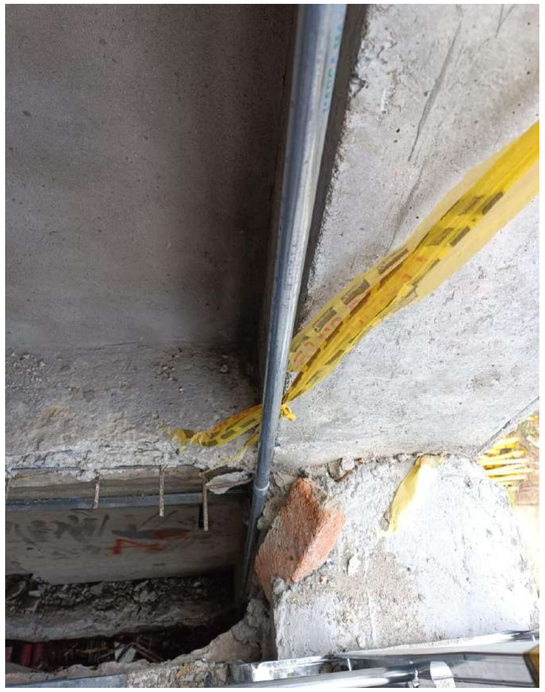



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	SEGUNDO PISO						24.00	24.00
	TERCER PISO						24.00	24.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								48.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	48.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Tendido de conductor de cobre THHN # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
6.112		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PRIMER PISO	17.00					1.00	17.00
		20.00					1.00	20.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								37.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	37.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZAL

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	6.113	Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUBIERTA	17.05					2.00	34.10
		23.10					2.00	46.20
		10					1.00	10.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								90.30
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		90.30

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GOI

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 " . Abrazadera para fijación de cable, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD	FECHA:
6.114		UN	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUBIERTA						9.00	9.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								9.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		9.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
6.117		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PRIMER PISO						3.00	3.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								3.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		3.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2" . Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
	7.105		ML	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		SEGUNDO PISO	4.40					1.00	4.40
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									4.40
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	4.40



ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO G

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	7.201	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

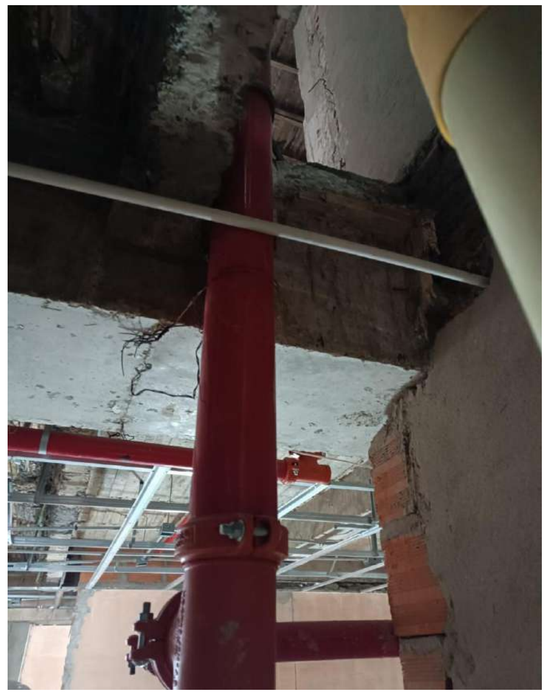



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	BAJANTE	2.70					1.00	2.70
		2.50					1.00	2.50
		2.17					1.00	2.17
		2.10					1.00	2.10
	TERCER PISO	52.57					1.00	52.57
								-
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
7.202		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
									
		SEGUNDO PISO						26.00	
		TERCR PISO PISO						26.00	
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
7.205		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
									
		SEGUNDO PISO						52.00	52.00
		TERCER PISO						52.00	52.00
									-
									104.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	104.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
7.208		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		SEGUNDO PISO						12.00	12.00
		TERCER PISO						12.00	12.00
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
7.209		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		SEGUNDO PISO						59.00	59.00
		TERCER PISO						59.00	59.00
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
7.2100		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
									
		SEGUNDO PISO						53.00	53.00
		TERCER PISO						52.00	52.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									105.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		105.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GC

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
7.211		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		SEGUNDO PISO						25.00	25.00
		TERCER PISO						53.46	53.46
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
7.212		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO						32.00	32.00
	TERCER PISO						31.00	31.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								63.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		63.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CAS

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
7.213		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
									
		SEGUNDO PISO						75.00	75.00
		TERCER PISO						75.50	75.50
									-
									150.50
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	150.50

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDR

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	7.214	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO						55.00	55.00
	TERCER PISO						55.00	55.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								110.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	110.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	VALVULA RISER CHECK + TRIM LISTADA UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
7.216		UN	21 de enero de 2026	


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
									
		GABINETE RCI 2do PISO						1.00	1.00
		GABINETE RCI 3er PISO						1.00	1.00
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 8.1	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD m2	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

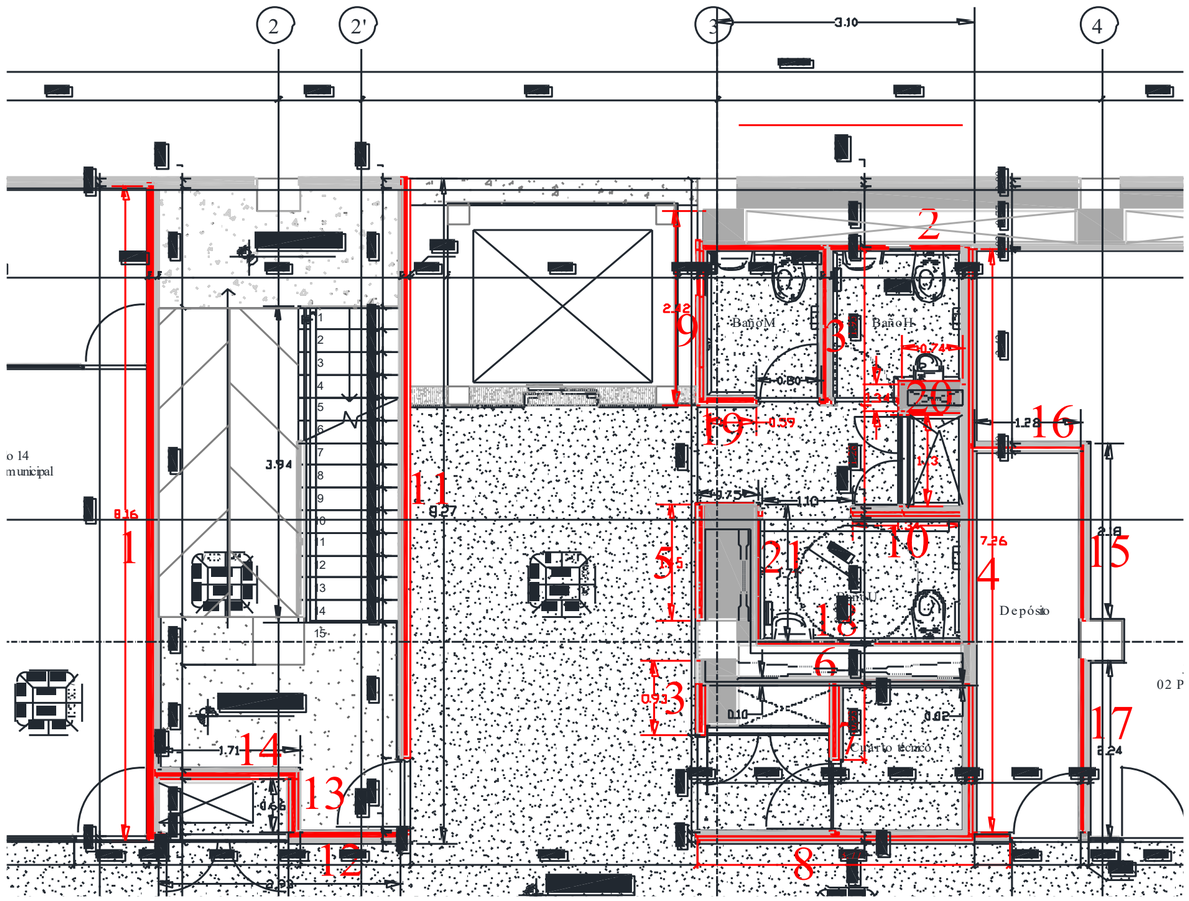

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 1	7.95		2.30	18.29		1.00	18.29
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 11	7.00		2.30	16.10		1.00	16.10
	EJES (A-B´) Y (1-2. MURO 12	1.35		2.30	3.11		1.00	3.11
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 13	0.70		2.30	1.61		1.00	1.61
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 14	1.35		2.30	3.11		1.00	3.11
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 2	3.49		2.30	8.02		1.00	8.02
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 3	2.00		2.30	4.60		1.00	4.60
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 4	7.50		2.30	17.25		1.00	17.25
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 5	1.50		2.30	3.45		1.00	3.45
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 6	2.82		2.30	6.49		1.00	6.49
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 7	0.93		2.30	2.14		1.00	2.14
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 8	3.77		2.30	8.67		1.00	8.67
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 9	2.00		2.30	4.60		1.00	4.60
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 10	1.34		2.30	3.08		1.00	3.08
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 15	1.88		2.30	4.32		1.00	4.32
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 16	1.23		2.30	2.83		1.00	2.83
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 17	2.24		2.30	5.15		1.00	5.15
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 18	2.82		2.30	6.49		1.00	6.49
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 19	0.60		2.30	1.38		1.00	1.38
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 20	1.82		2.30	4.19		1.00	4.19
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 21	1.96		2.30	4.51		1.00	4.51
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								129.36
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**129.36**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
8.1		m2	0 de enero de 1900	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

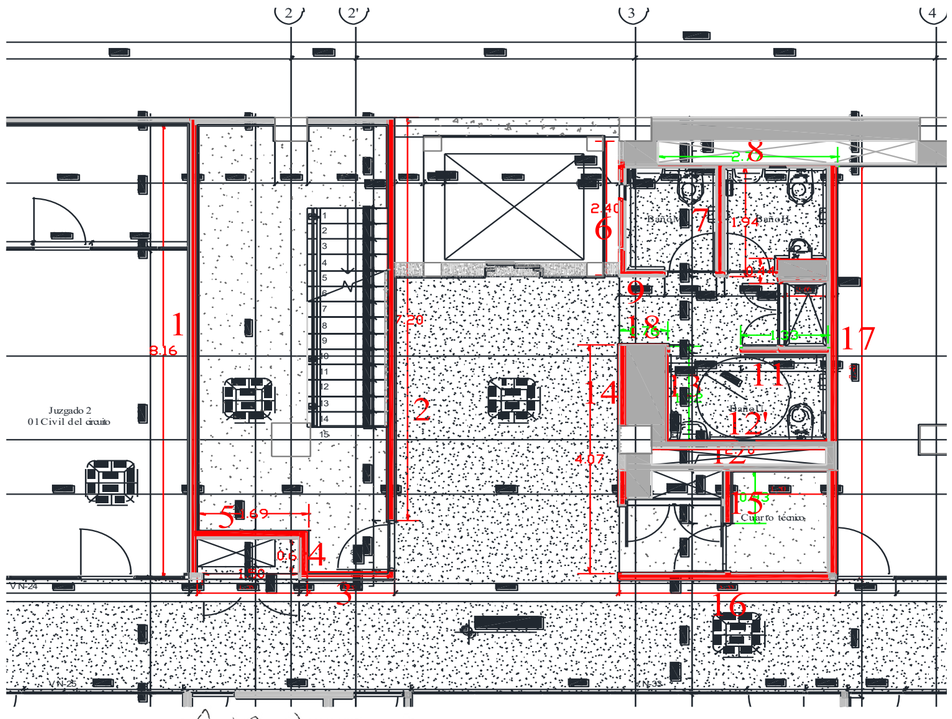

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	TERCER PISO							
	EJES (A-B´) Y (1-3). MURO 1	7.90		2.20	17.38		1.00	17.38
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO2	7.20		2.20	15.84		1.00	15.84
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 3	1.30		2.20	2.86		1.00	2.86
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 4	0.62		2.20	1.36		1.00	1.36
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 5	1.69		2.20	3.72		1.00	3.72
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 6	2.40		2.20	5.28		1.00	5.28
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 7	1.94		2.20	4.27		1.00	4.27
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 8	2.77		2.20	6.09		1.00	6.09
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 9	0.70		2.20	1.54		1.00	1.54
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 10	1.76		2.20	3.87		1.00	3.87
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 11	1.33		2.20	2.93		1.00	2.93
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 12	2.70		2.20	5.94		1.00	5.94
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 12'	2.70		2.20	5.94		1.00	5.94
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 13	1.62		2.20	3.57		1.00	3.57
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 14	4.07		2.20	8.95		1.00	8.95
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 15	5.47		2.20	12.03		1.00	12.03
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 16	3.35		2.20	7.37		1.00	7.37
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 17	7.40		2.20	16.28		1.00	16.28
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 18	0.76		2.20	1.67		1.00	1.67
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								126.91
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		256.27

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
8.1		m2	0 de enero de 1900	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

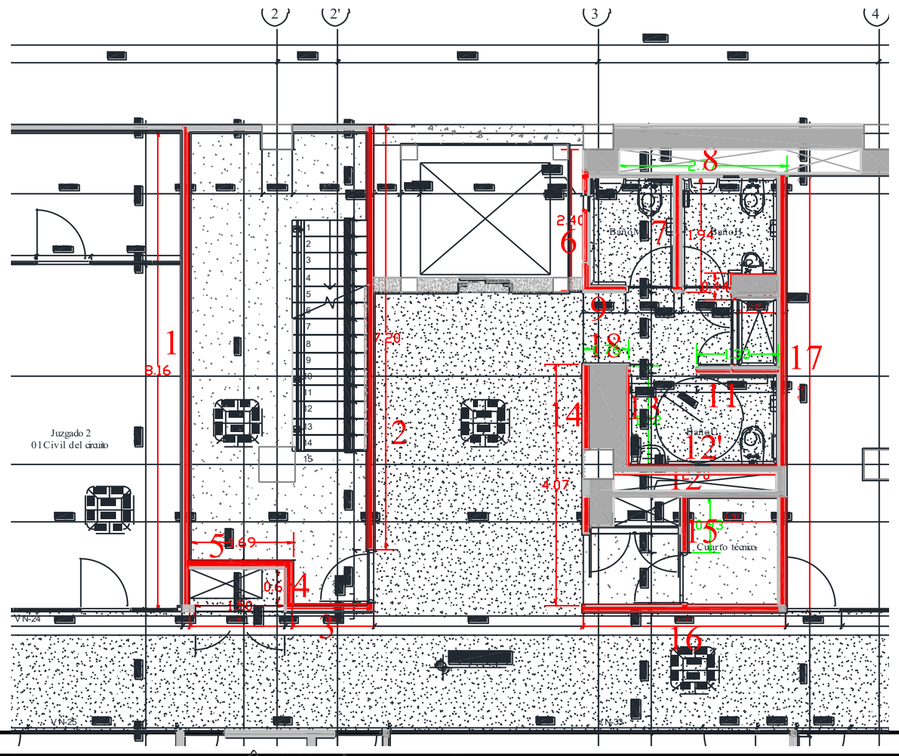

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUARTO PISO							
	EJES (A-B´) Y (1-3). MURO 1	7.90		2.20	17.38		1.00	17.38
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO2	7.20		2.20	15.84		1.00	15.84
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 3	1.30		2.20	2.86		1.00	2.86
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 4	0.62		2.20	1.36		1.00	1.36
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 5	1.69		2.20	3.72		1.00	3.72
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 6	2.40		2.20	5.28		1.00	5.28
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 7	1.94		2.20	4.27		1.00	4.27
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 8	2.77		2.20	6.09		1.00	6.09
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 9	0.70		2.20	1.54		1.00	1.54
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 10	1.76		2.20	3.87		1.00	3.87
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 11	1.33		2.20	2.93		1.00	2.93
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 12	2.70		2.20	5.94		1.00	5.94
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 12'	2.70		2.20	5.94		1.00	5.94
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 13	1.62		2.20	3.57		1.00	3.57
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 14	4.07		2.20	8.95		1.00	8.95
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 15	5.47		2.20	12.03		1.00	12.03
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 16	3.35		2.20	7.37		1.00	7.37
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 17	7.40		2.20	16.28		1.00	16.28
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 18	0.76		2.20	1.67		1.00	1.67
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								126.91
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		383.18

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 8.2	Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (ml). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD: ml	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

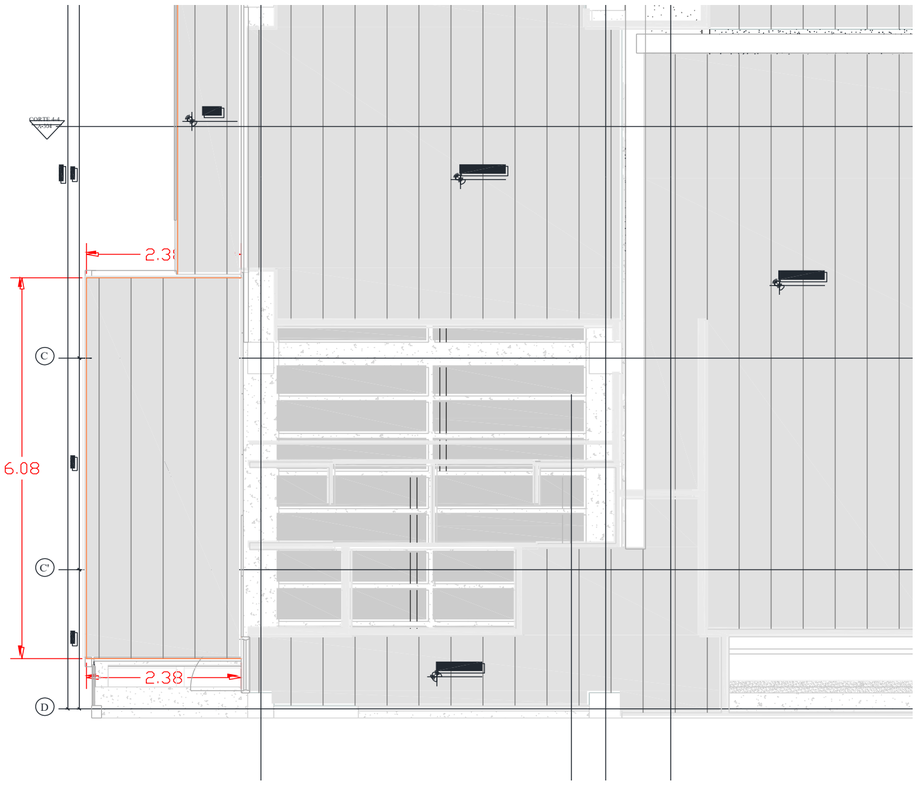

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUBIERTA EDIFICIO REFORZADO							
	EJE (B"-D)(0-1).ANTEPECHO	2.20			-		1.00	2.20
		5.40			-		1.00	5.40
		2.20			-		1.00	2.20
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								9.80
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			**9.80**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZA

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	8.5	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	PESO (KG/ML)	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		MAMPOSTERIA 2do PISO							
			2.00	1.56				28.00	87.36
			2.40	0.56				28.00	37.63
		MAMPOSTERIA 3er PISO							
			2.00	1.56				25.00	78.00
			2.40	0.56				25.00	33.60
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									236.59
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**236.59**



ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GON

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	8.8	Grafil 4.0 mm. Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			ML/M2	PESO (KG/ML)	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		MAMPOSTERIA 2do PISO							
		129.36	1.30	0.100		129.36		2.00	33.75
		MAMPOSTERIA 3er PISO							
		126.91	1.30	0.100		117.35		2.00	30.61
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	8.15	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	MAMPOSTERIA 2do PISO							
							56.00	56.00
								-
	MAMPOSTERIA 3er PISO							
							50.00	50.00
	MAMPOSTERIA CUBIERTA							
							10.00	10.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								116.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**116.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Marquesina en cubierta policarbonato incluye Estructura. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
9.1		m2	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

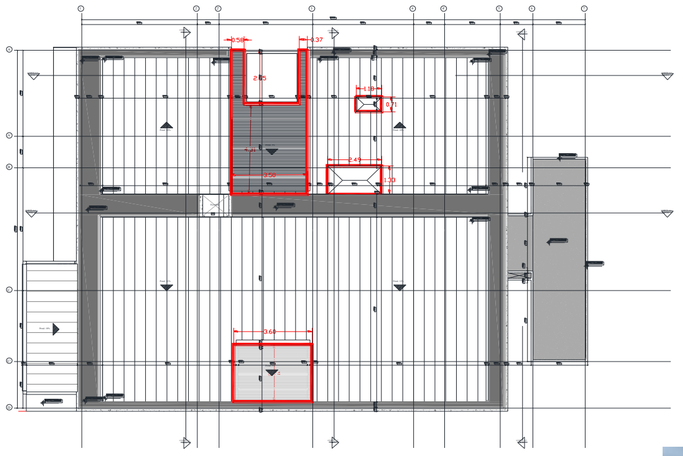



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
A-105	zona vacio	2.87	3.34		9.59		1.00	9.59
	policarbontao ascensor A	4.36	3.64		15.87		1.00	15.87
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								25.46
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		25.46

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GOI

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	Suministro e instalación de cubierta liviana, sistema compuesto de cubierta en teja metálica sin traslapo tipo "Metal roof Grado 40" o similar, con cama de aislamiento termoacústico en poliuretano y capa superior de impermeabilización con membrana TPO. Incluye estructura y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:
9.4		m2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

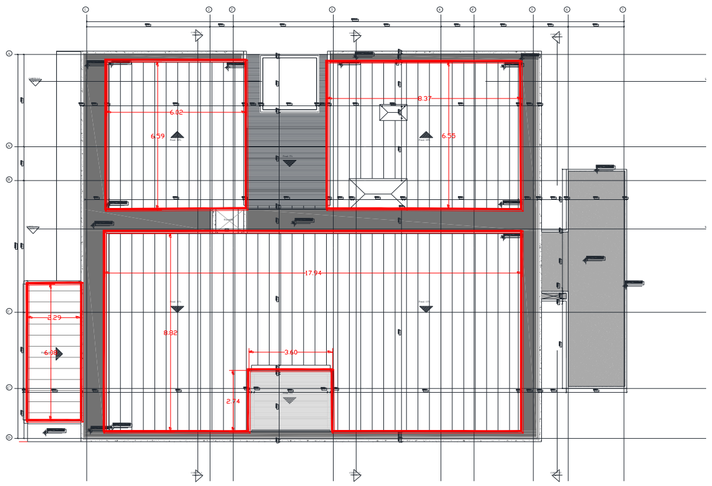

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
A-105	Modulo A	6.05	6.35		38.42		1.00	38.42
	Modulo B	8.12	6.43		52.21		1.00	52.21
	Modulo C	6.30	8.55		53.87		1.00	53.87
A-105	Modulo D	3.33	5.87		19.55		1.00	19.55
	Modulo E	8.12	8.87		71.98		1.00	71.98
	Modulo F	7.24	2.55		18.46		1.00	18.46
A-105								
A-105								
								-
								-
								-
								-
								-
	DESCONTAR MAYOR CANTIDAD							-83.16
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								171.32
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		171.32

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 9.5	Media caña con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD: ml	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

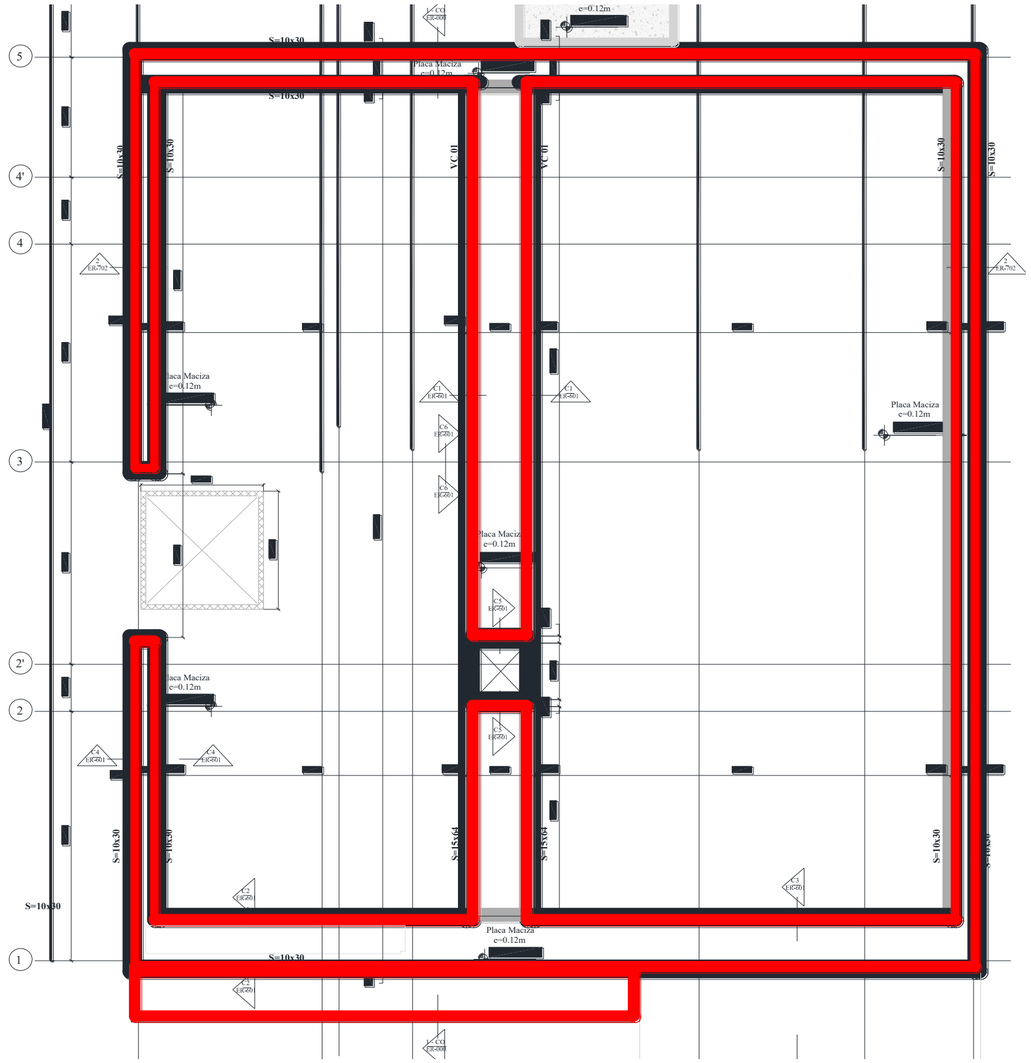

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	MEDIA CAÑA VIGAS CANALES							
	EJE 5(A-D)	17.15					1.00	17.15
		6.5					1.00	6.50
		8.75					1.00	8.75
	EJE D(1-5)	19.4					1.00	19.40
		17.8					1.00	17.80
	EJE B'(1-5). PASARELA	11.75					2.00	23.50
		1.1					2.00	2.20
		4.55					2.00	9.10
	EJE A(3-5)	8.8					1.00	8.80
		8.2					1.00	8.20
		0.4					1.00	0.40
	EJE A(1-2)	6.92					1.00	6.92
		5.92					1.00	5.92
		0.4					1.00	0.40
								-
	EJE 1(A-D)	17.45					1.00	17.45
		6.5					1.00	6.50
		8.75					1.00	8.75
								-
	EJES (0-1)(A-B'). VOLADIZO	10.18					2.00	20.36
		0.95					2.00	1.90
								-
								-
								-
								-
								-
								190.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**190.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CAS

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 10.7	Filos y Dilataciones en Revoque/pañete Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD: ml	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	DILATACIONES							
	MUROS INTERIORES 2do PISO			2.4			112.00	268.80
	MUROS INTERIORES 3er PISO			2.4			100.00	240.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								508.80
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		508.80

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES C

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 10.9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD m2	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

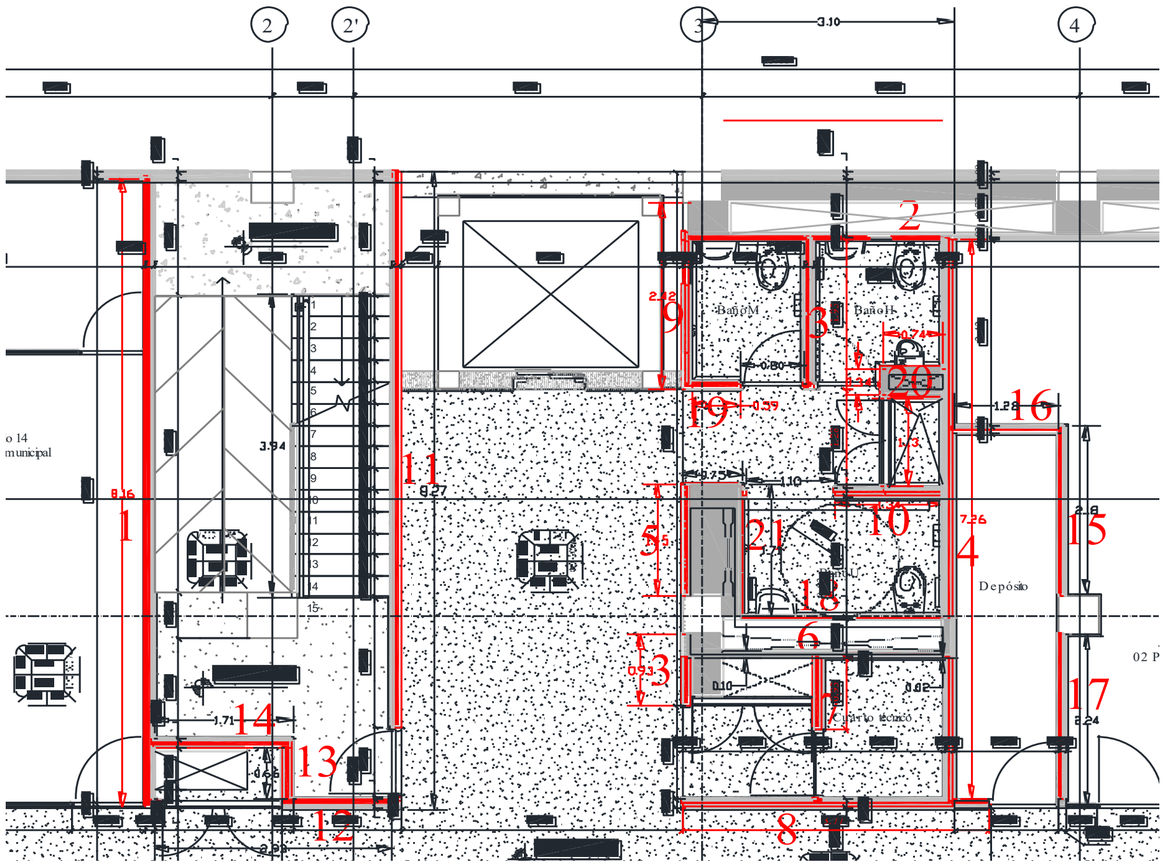

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 1	7.95		2.30	18.29		2.00	36.57
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 11	7.00		2.30	16.10		2.00	32.20
	EJES (A-B´) Y (1-2. MURO 12	1.35		2.30	3.11		2.00	6.21
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 13	0.70		2.30	1.61		2.00	3.22
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 14	1.35		2.30	3.11		2.00	6.21
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 2	3.49		2.30	8.02		1.00	8.02
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 3	2.00		2.30	4.60		2.00	9.20
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 4	7.50		2.30	17.25		2.00	34.50
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 5	1.50		2.30	3.45		2.00	6.90
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 6	2.82		2.30	6.49		1.00	6.49
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 7	0.93		2.30	2.14		2.00	4.28
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 8	3.77		2.30	8.67		2.00	17.34
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 9	2.00		2.30	4.60		2.00	9.20
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 10	1.34		2.30	3.08		2.00	6.16
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 15	1.88		2.30	4.32		2.00	8.65
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 16	1.23		2.30	2.83		2.00	5.66
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 17	2.24		2.30	5.15		2.00	10.30
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 18	2.82		2.30	6.49		1.00	6.49
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 19	0.60		2.30	1.38		2.00	2.76
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 20	1.82		2.30	4.19		2.00	8.37
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 21	1.96		2.30	4.51		2.00	9.02
								-
								-
								-
								237.74
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	237.74

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 10.9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD m2	FECHA: 0 de enero de 1900

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

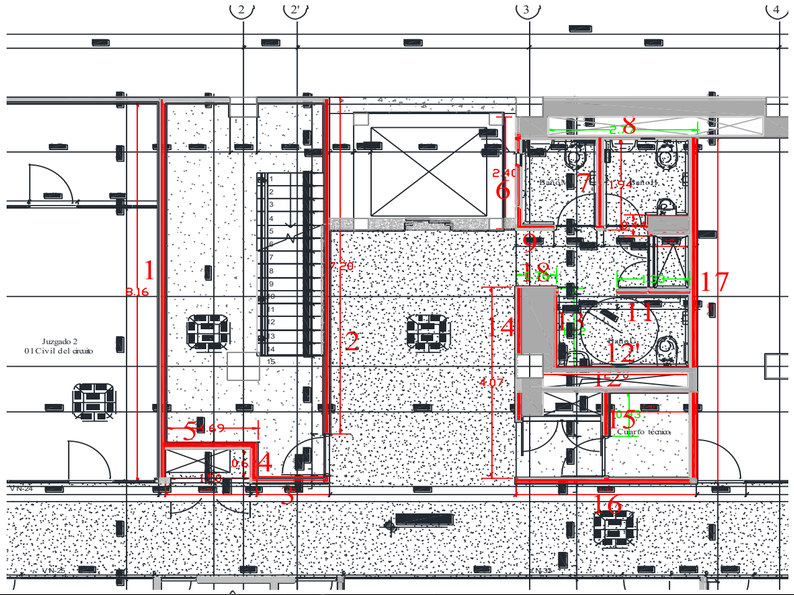

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	TERCER PISO							
	EJES (A-B´) Y (1-3). MURO 1	7.90		2.20	17.38		2.00	34.76
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO2	7.20		2.20	15.84		2.00	31.68
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 3	1.30		2.20	2.86		2.00	5.72
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 4	0.62		2.20	1.36		2.00	2.73
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 5	1.69		2.20	3.72		2.00	7.44
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 6	2.40		2.20	5.28		2.00	10.56
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 7	1.94		2.20	4.27		2.00	8.54
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 8	2.77		2.20	6.09		2.00	12.19
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 9	0.70		2.20	1.54		2.00	3.08
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 10	1.76		2.20	3.87		2.00	7.74
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 11	1.33		2.20	2.93		2.00	5.85
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 12	2.70		2.20	5.94		2.00	11.88
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 12'	2.70		2.20	5.94		2.00	11.88
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 13	1.62		2.20	3.57		2.00	7.15
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 14	4.07		2.20	8.95		2.00	17.91
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 15	5.47		2.20	12.03		2.00	24.07
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 16	3.35		2.20	7.37		2.00	14.74
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 17	7.40		2.20	16.28		2.00	32.56
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 18	0.76		2.20	1.67		2.00	3.34
								-
								-
								-
								-
								-
								253.81
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	491.55

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 10.9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD m2	FECHA: 0 de enero de 1900	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

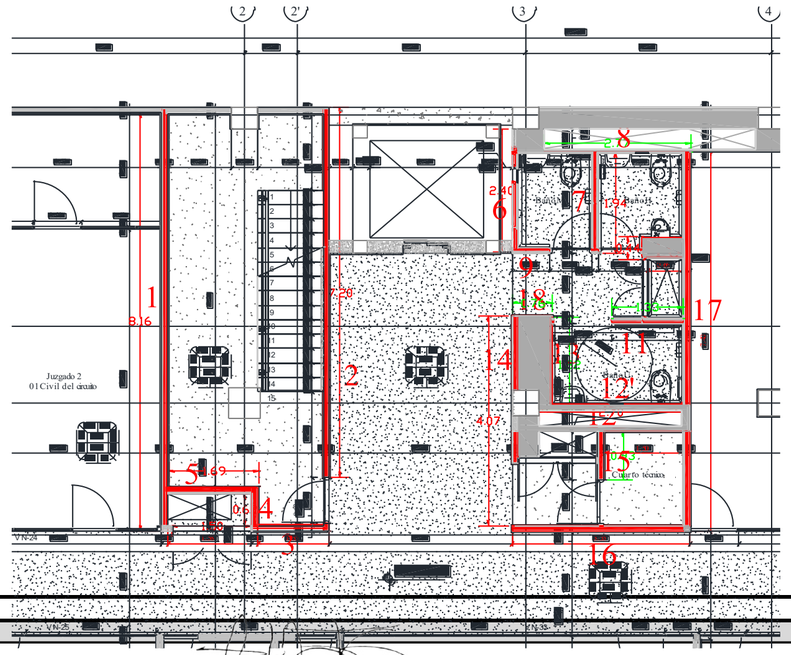DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		CUARTO PISO							
		EJES (A-B´) Y (1-3). MURO 1	7.90		2.20	17.38		2.00	34.76
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO2	7.20		2.20	15.84		2.00	31.68
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 3	1.30		2.20	2.86		2.00	5.72
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 4	0.62		2.20	1.36		2.00	2.73
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 5	1.69		2.20	3.72		2.00	7.44
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 6	2.40		2.20	5.28		2.00	10.56
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 7	1.94		2.20	4.27		2.00	8.54
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 8	2.77		2.20	6.09		2.00	12.19
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 9	0.70		2.20	1.54		2.00	3.08
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 10	1.76		2.20	3.87		2.00	7.74
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 11	1.33		2.20	2.93		2.00	5.85
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 12	2.70		2.20	5.94		2.00	11.88
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 12'	2.70		2.20	5.94		2.00	11.88
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 13	1.62		2.20	3.57		2.00	7.15
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 14	4.07		2.20	8.95		2.00	17.91
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 15	5.47		2.20	12.03		2.00	24.07
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 16	3.35		2.20	7.37		2.00	14.74
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 17	7.40		2.20	16.28		2.00	32.56
		EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 18	0.76		2.20	1.67		2.00	3.34
									-
									-
									-
									-
									-
									253.81
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		745.37

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 10.10	Pañete/Revoque Muros (ml) Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD: ml	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

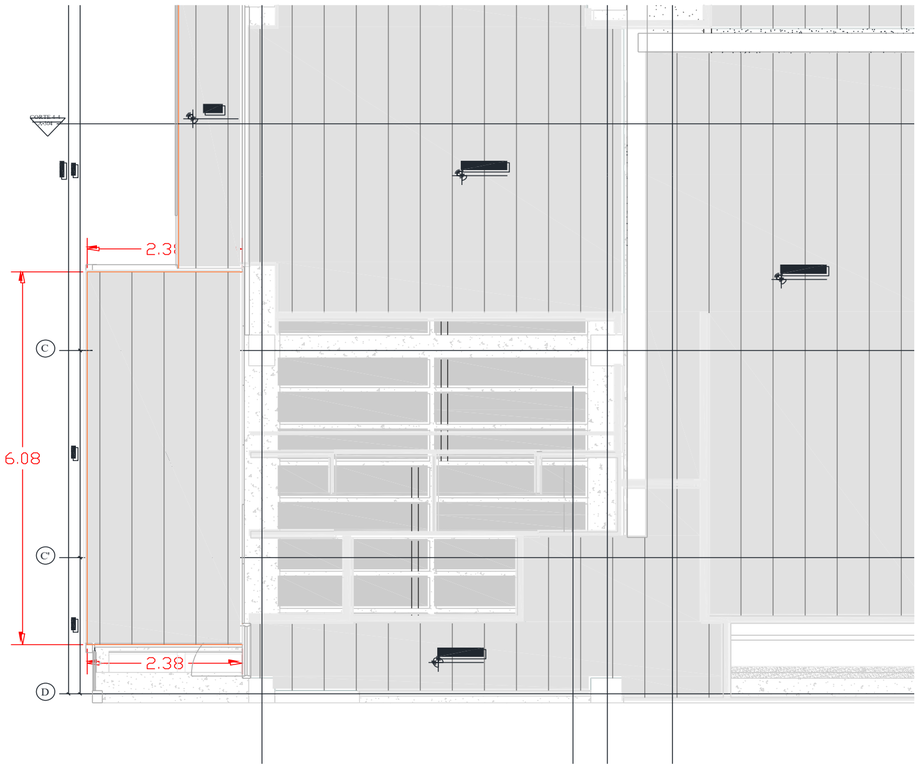DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		CUBIERTA EDIFICIO REFORZADO							
		EJE (B"-D)(0-1).ANTEPECHO	2.20			-		3.00	6.60
			5.40			-		3.00	16.20
			2.20			-		3.00	6.60
									-
									-
									-
									29.40
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	29.40

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 14.3	Cielo Raso en drywall egún indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD m2	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

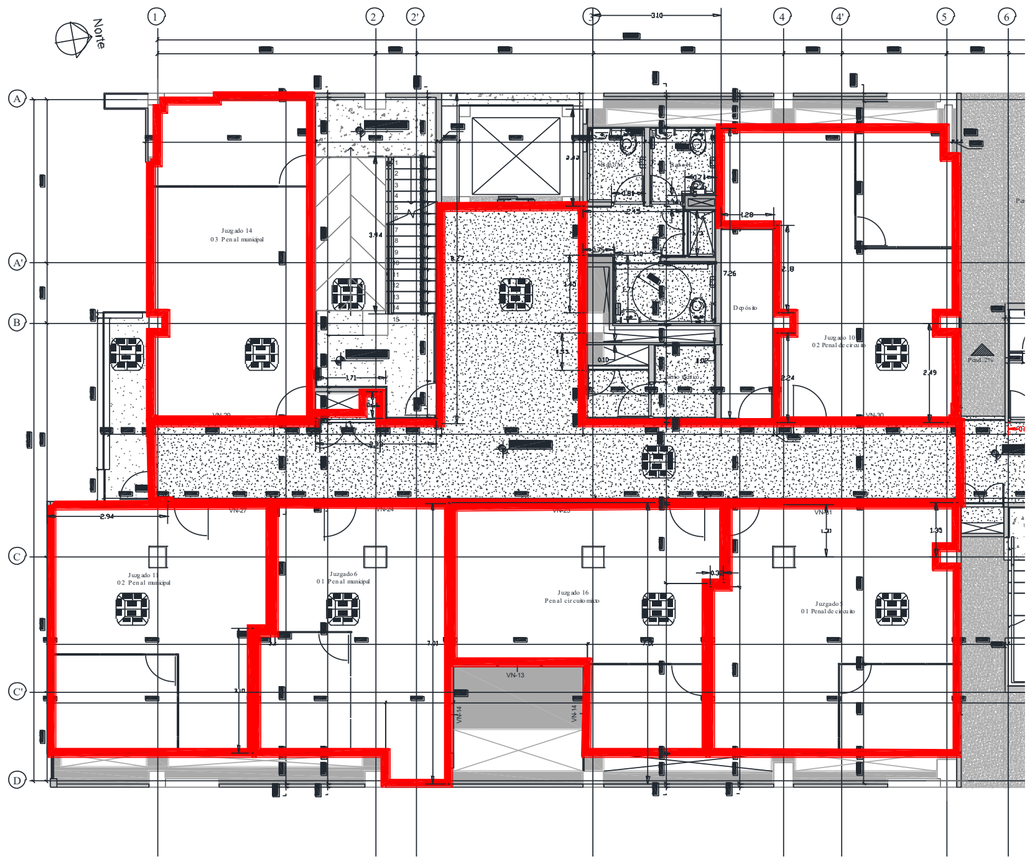

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	EJES (1-1'')(A-B'). JUZGADO 14	8	3.94		31.52		0.60	18.91
	EJES (2'-3)(A-B'). HALL ASCENSOR	5.4	3.45		18.63		0.60	11.18
	EJES (4-5)(A-B'). JUZGADO 10	4.94	4.45		21.98		0.60	13.19
		2.39	1.38		3.30		0.60	1.98
	EJES (1-5)(B'-B''). CIRCULACIÓN	19.71	2.05		40.41		0.60	24.24
	EJES (0-1')(C-D). JUZGADO 11	6.18	5.02		31.02		0.60	18.61
		3.24	0.55		1.78		0.60	1.07
	EJES (1'-2)(C-D). JUZGADO 6	6.18	4.45		27.50		0.60	16.50
		3.09	0.55		1.70		0.60	1.02
	EJES (2'-3')(C-D). JUZGADO 16	3.88	3.30		12.80		0.60	7.68
		6.13	2.85		17.47		0.60	10.48
		1.95	0.45		0.88		0.60	0.53
	EJES (3'-5)(C-D). JUZGADO 5	6.22	5.69		35.39		0.60	21.24
		4.25	0.45		1.91		0.60	1.15
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								147.78
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		147.78

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CA

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	14.3	Cielo Raso en drywall egún indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

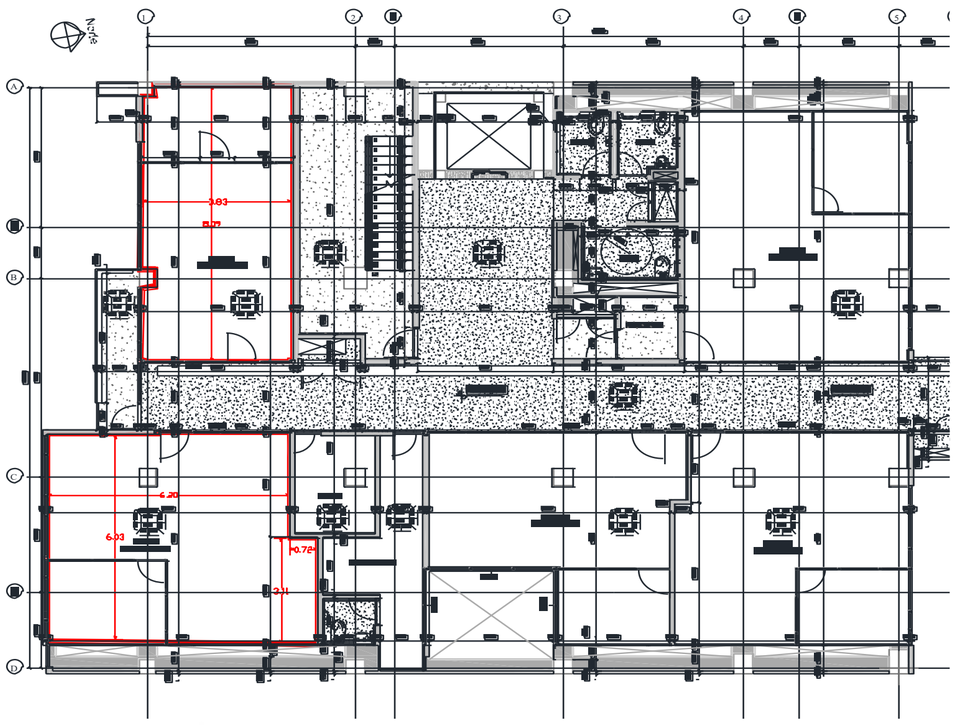

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	TERCER PISO							
	EJES (0-2)(B''-D). JUZGADO 8	6.2	6.03		37.39		0.60	22.43
		3.11	0.72		2.24		0.60	1.34
					-			
	EJES (1-2)(A-B'). JUZGADO 2	8.09	3.83		30.98		0.60	18.59
								42.37
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		190.15

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GON

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	Cielo Raso en drywall egún indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:
	14.3		m2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		CUARTO PISO							
		EJES (0-1)(B''-D). JUZGADO 15	6.14	2.79		17.13		0.60	10.28
						-			
									10.28
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		200.42

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Equipo Incendio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
21.300		Und	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
								0.50	0.50
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									0.50
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		0.50



ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 23.101	Salida de Datos	UNIDAD: Und	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

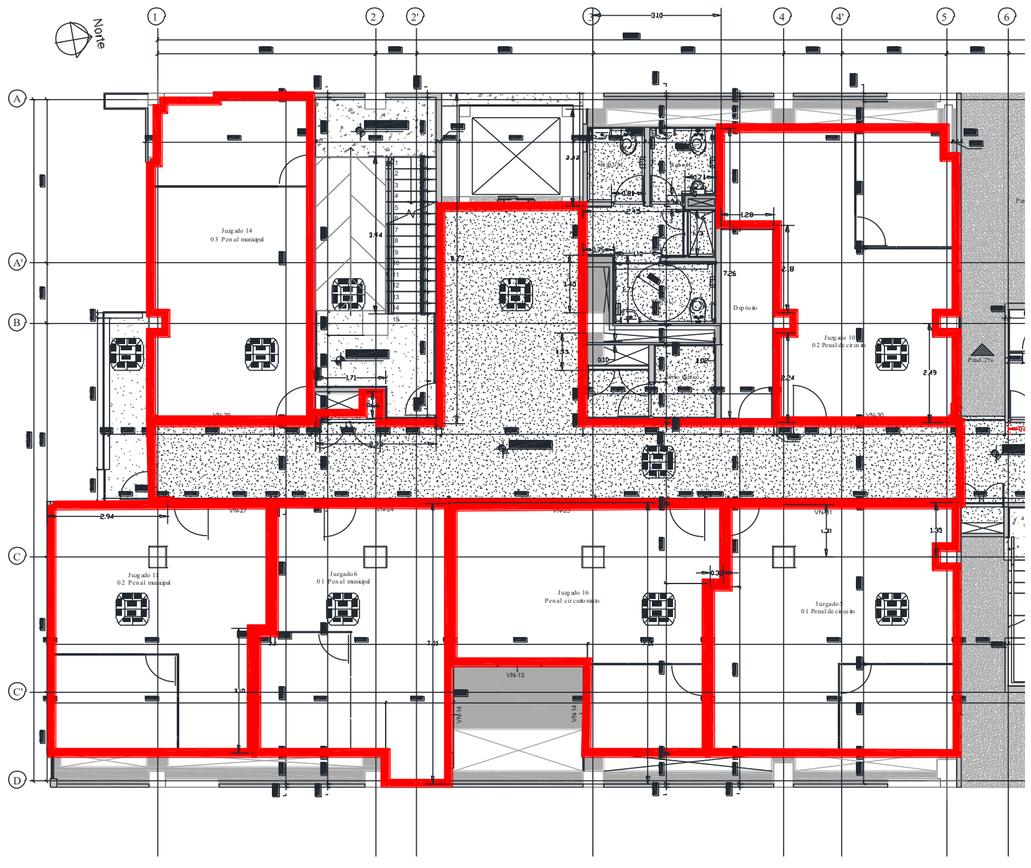

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	EJES (1-1'')(A-B'). JUZGADO 14	3					1.00	3.00
	EJES (2'-3)(A-B'). HALL ASCENSOR	3					1.00	3.00
	EJES (4-5)(A-B'). JUZGADO 10	4					1.00	4.00
		3					1.00	3.00
	EJES (1-5)(B'-B''). CIRCULACIÓN	3					1.00	3.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								16.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**16.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 23.801	Tubería EMT de 1" para red de cableado estructurado, incluye accesorios de montaje. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ml	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

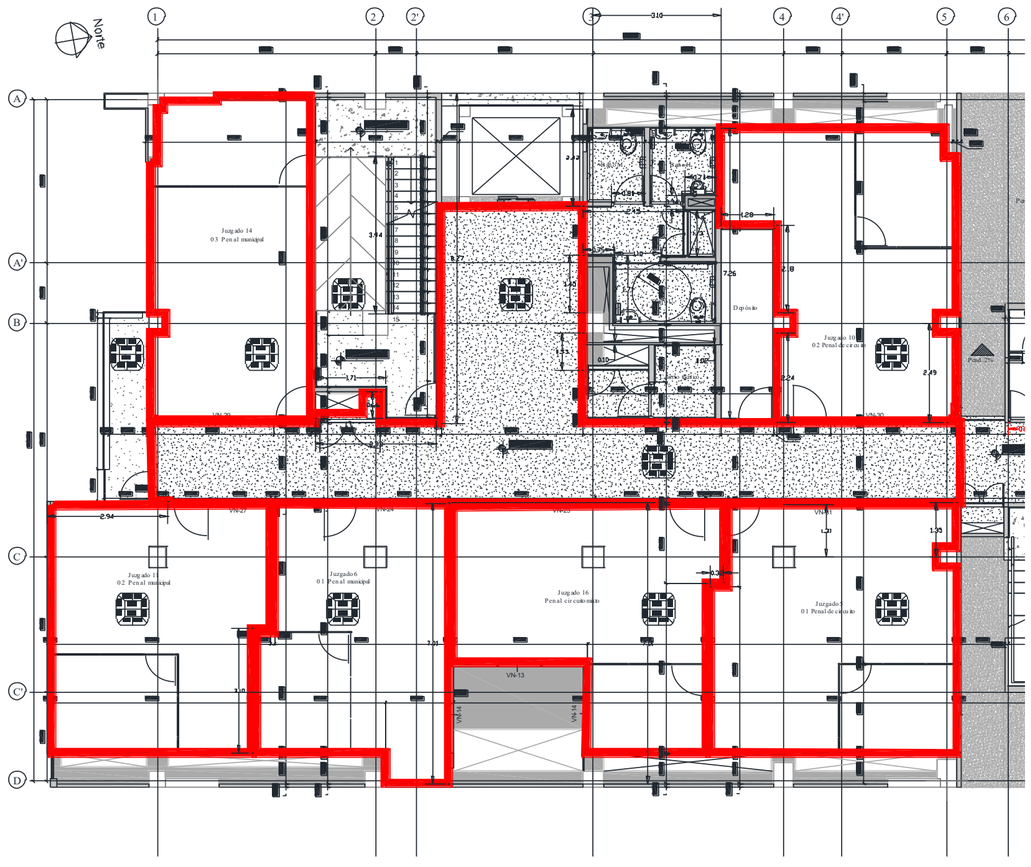

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	EJES (1-1'')(A-B'). JUZGADO 14	30					1.00	30.00
	EJES (2'-3)(A-B'). HALL ASCENSOR	85					1.00	85.00
	EJES (4-5)(A-B'). JUZGADO 10	4.94					1.00	4.94
		4					1.00	4.00
	EJES (1-5)(B'-B''). CIRCULACIÓN	40					1.00	40.00
	EJES (0-1')(C-D). JUZGADO 11	50					1.00	50.00
		50					1.00	50.00
	EJES (1'-2)(C-D). JUZGADO 6	5					1.00	5.00
		25					1.00	25.00
	EJES (2'-3')(C-D). JUZGADO 16	35					1.00	35.00
		20					1.00	20.00
		15					1.00	15.00
	EJES (3'-5)(C-D). JUZGADO 5	34					1.00	34.00
		2.06					1.00	2.06
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								400.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	400.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CAST

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	Tuberías EMT de 3/4" con accesorios de instalación. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
	24.20		ml	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

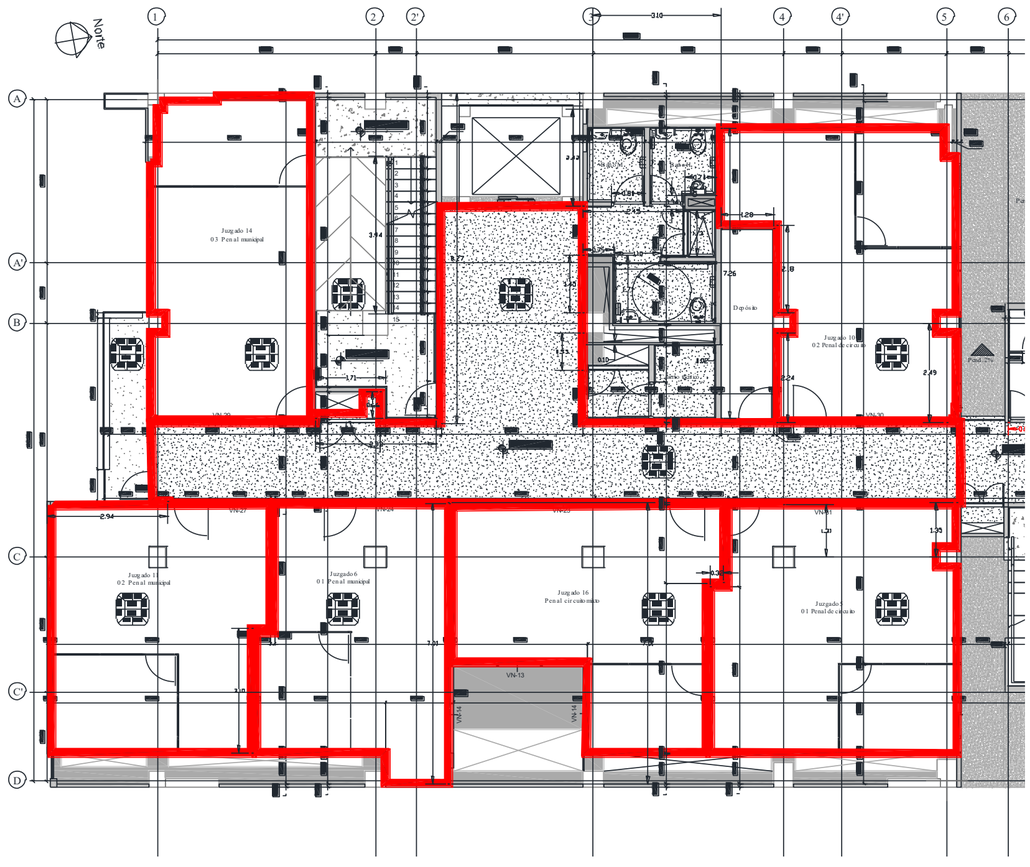

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	EJES (1-1'')(A-B'). JUZGADO 14	20					1.00	20.00
	EJES (2'-3)(A-B'). HALL ASCENSOR	45					1.00	45.00
	EJES (4-5)(A-B'). JUZGADO 10	4.94					1.00	4.94
		20					1.00	20.00
	EJES (1-5)(B'-B''). CIRCULACIÓN	20					1.00	20.00
	EJES (0-1')(C-D). JUZGADO 11	30					1.00	30.00
		25					1.00	25.00
	EJES (1'-2)(C-D). JUZGADO 6	5					1.00	5.00
		25					1.00	25.00
	EJES (2'-3')(C-D). JUZGADO 16	35					1.00	35.00
		20					1.00	20.00
		15					1.00	15.00
	EJES (3'-5)(C-D). JUZGADO 5	34					1.00	34.00
		1.06					1.00	1.06
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								300.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		300.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO G

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
NP07	CONTRAPLACA EN LOSAS DE ENTREPISO, se requiere la construcción de contraplaca para garantizar una losa resistente toda vez que las existentes en el proyecto carecen de aceros de refuerzo, esta actividad consiste en aplicacion de concreto para recalce de placas de 3.000 PSI grava comun de concreto bombeable, en espesor de 50 mm, incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada Q2 (4mmX4mm 150mmX150mm) y mano de obra, sobre la misma se requiere pendientados afinados de piso pues no es de acabado final	M2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

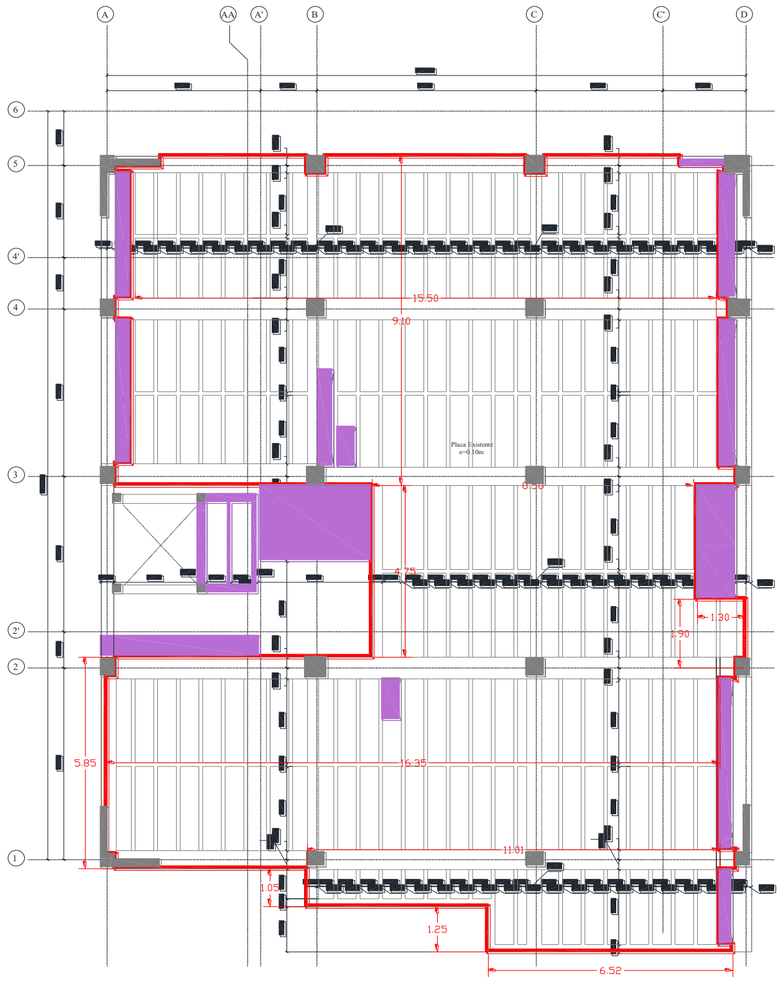

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PLACA 2do PISO							
ER-300	EJES (0-1)(B'-D)	6.52	1.25		8.15		1.00	8.15
	EJES (0-1)(B-D)	11.01	1.05		11.56		1.00	11.56
	EJES (1-2)(A-D)	16.35	5.85		95.65		1.00	95.65
	EJES (2-3)(B'-D)	6.58	4.75		31.26		1.00	31.26
	EJES (2-2')(C'-D)	1.9	1.30		2.47		1.00	2.47
	EJES (3-5)(A{D)	15.5	9.10		141.05		1.00	141.05
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								290.13
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**290.13**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GON

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	CONTRAPLACA EN LOSAS DE ENTREPISO, se requiere la construcción de contraplaca para garantizar una losa resistente toda vez que las existentes en el proyecto carecen de aceros de refuerzo, esta actividad consiste en aplicacion de concreto para recalce de placas de 3.000 PSI grava comun de concreto bombeable, en espesor de 50 mm, incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada Q2 (4mmX4mm 150mmX150mm) y mano de obra, sobre la misma se requiere pendientados afinados de piso pues no es de acabado final	UNIDAD	FECHA:
	NP07		M2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

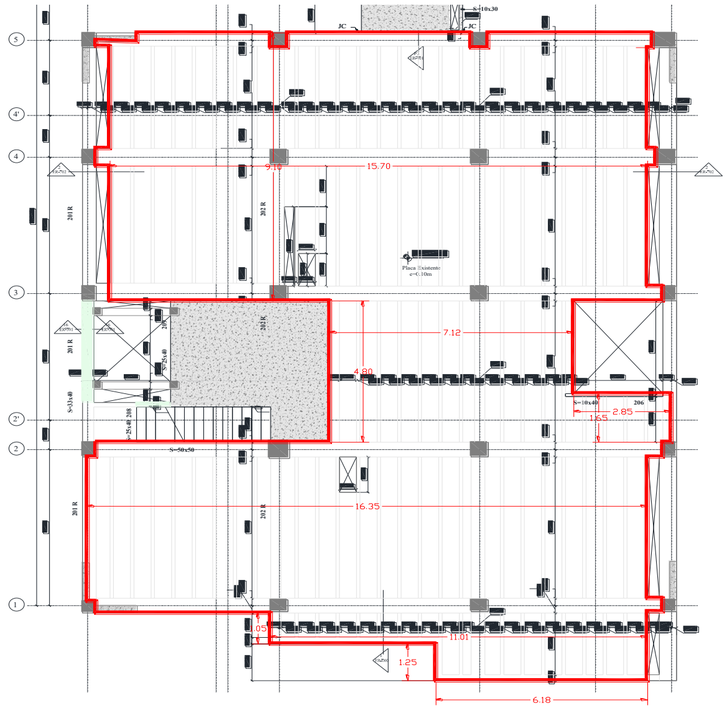

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PLACA 3er PISO							
ER-400	EJES (0-1)(B'-D)	6.18	1.25		7.73		1.00	7.73
	EJES (0-1)(B-D)	11.01	1.05		11.56		1.00	11.56
	EJES (1-2)(A-D)	16.35	5.85		95.65		1.00	95.65
	EJES (2-3)(B'-D)	7.12	4.80		34.18		1.00	34.18
	EJES (2-2')(C'-D)	2.85	1.65		4.70		1.00	4.70
	EJES (3-5)(A{D)	15.7	9.10		142.87		1.00	142.87
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								296.68
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	586.81

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GON

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	CONTRAPLACA EN LOSAS DE ENTREPISO, se requiere la construcción de contraplaca para garantizar una losa resistente toda vez que las existentes en el proyecto carecen de aceros de refuerzo, esta actividad consiste en aplicacion de concreto para recalce de placas de 3.000 PSI grava comun de concreto bombeable, en espesor de 50 mm, incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada Q2 (4mmX4mm 150mmX150mm) y mano de obra, sobre la misma se requiere pendientados afinados de piso pues no es de acabado final	UNIDAD	FECHA:
NP07		M2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

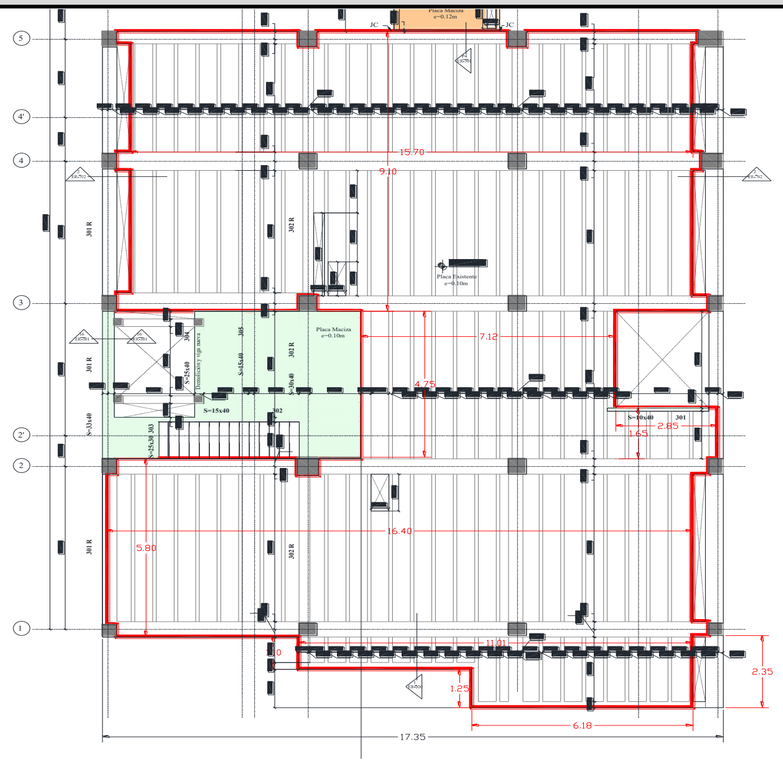

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PLACA 4to PISO							
ER-500	EJES (0-1)(B'-D)	6.18	1.25		7.73		1.00	7.73
	EJES (0-1)(B-D)	11.01	1.10		12.11		1.00	12.11
	EJES (1-2)(A-D)	16.4	5.80		95.12		1.00	95.12
	EJES (2-3)(B'-D)	7.12	4.75		33.82		1.00	33.82
	EJES (2-2')(C'-D)	2.85	1.65		4.70		1.00	4.70
	EJES (3-5)(A{D)	15.7	9.10		142.87		1.00	142.87
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
	DESCONTAR PAGADO ACTAS ANTERIORES							**-846.54**
								-
								-
								-
								-
								-
								-550.19
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**36.62**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO G


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
NP08	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	M2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

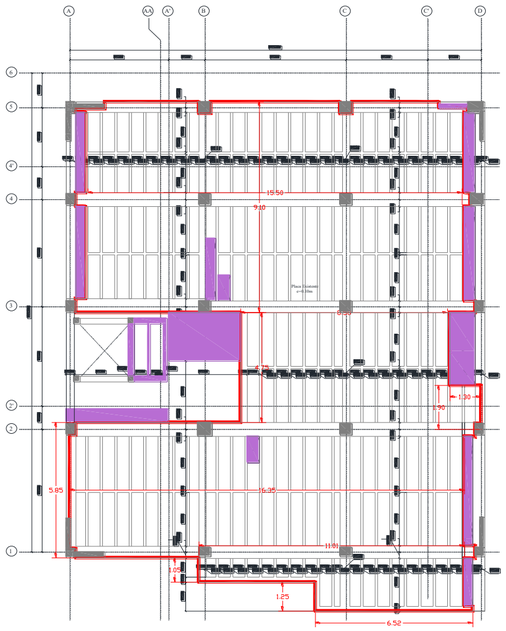

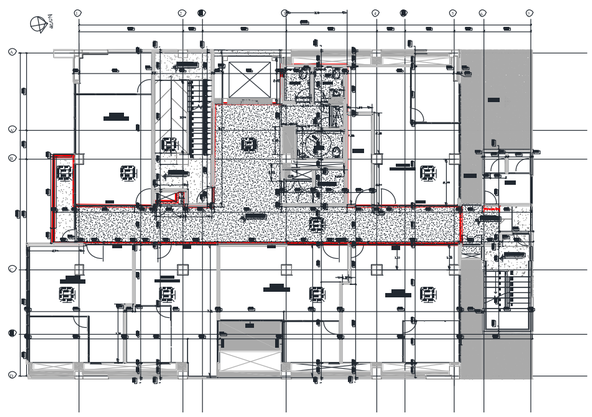

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PLACA 2do PISO							
ER-300	EJES (0-1)(B'-D)	6.52	1.25		8.15		1.00	8.15
	EJES (0-1)(B-D)	11.01	1.05		11.56		1.00	11.56
	EJES (1-2)(A-D)	16.35	5.85		95.65		1.00	95.65
	EJES (2-3)(B'-D)	6.58	4.75		31.26		1.00	31.26
	EJES (2-2')(C'-D)	1.9	1.30		2.47		1.00	2.47
	EJES (3-5)(A{D)	15.5	9.10		141.05		1.00	141.05
AD-302	DESCONTAR DEPRIMIDO PARA PISO TERRAZO	4.08	0.93		3.79		-1.00	-3.79
		19.75	1.98		39.11		-1.00	-39.11
		1.59	0.23		0.37		-1.00	-0.37
		0.5	0.43		0.22		-1.00	-0.22
		3.35	7.47		25.02		-1.00	-25.02
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								221.63
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		221.63

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GO


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	UNIDAD	FECHA:
NP08		M2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

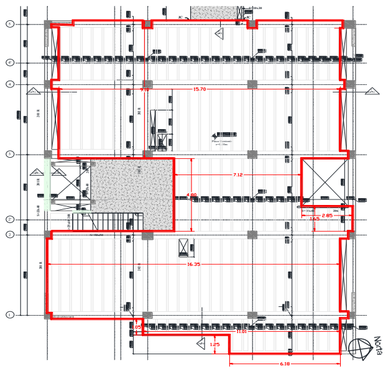

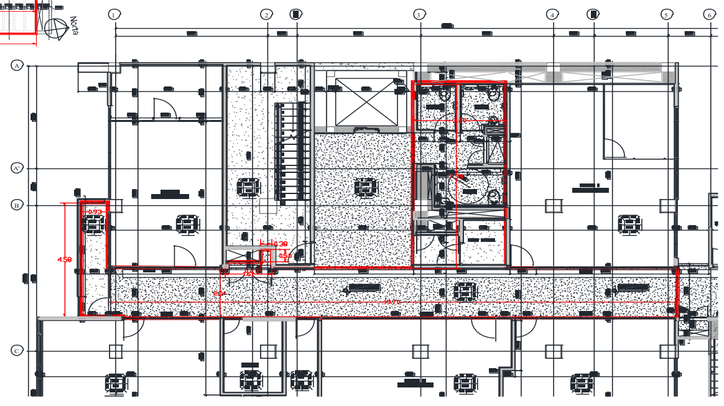

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
	PLACA 3er PISO							
ER-400	EJES (0-1)(B'-D)	6.18	1.25		7.73		1.00	7.73
	EJES (0-1)(B-D)	11.01	1.05		11.56		1.00	11.56
	EJES (1-2)(A-D)	16.35	5.85		95.65		1.00	95.65
	EJES (2-3)(B'-D)	7.12	4.80		34.18		1.00	34.18
	EJES (2-2')(C'-D)	2.85	1.65		4.70		1.00	4.70
	EJES (3-5)(A{D)	15.7	9.10		142.87		1.00	142.87
AD-303	DESCONTAR DEPRIMIDO PARA PISO TERRAZO	4.08	0.93		3.79		-1.00	-3.79
		19.7	2.00		39.40		-1.00	-39.40
		1.61	0.25		0.40		-1.00	-0.40
		0.5	0.38		0.19		-1.00	-0.19
		7.39	3.20		23.65		-1.00	-23.65
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								229.25
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		450.88

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALI


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	UNIDAD	FECHA:
NP08		M2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

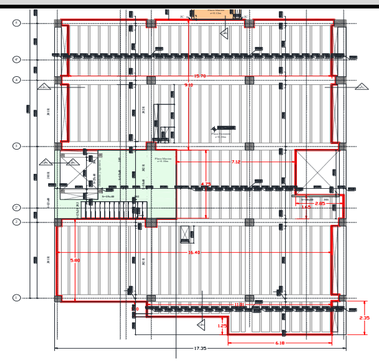

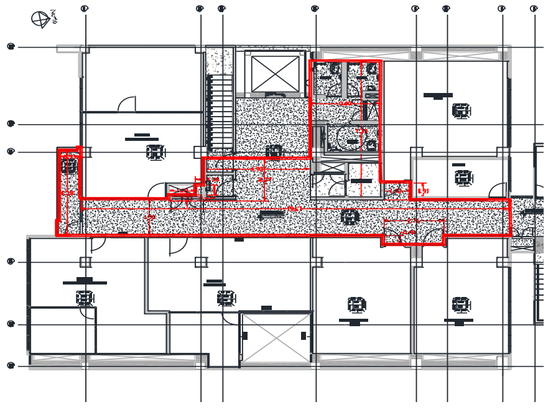

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
	PLACA 4to PISO							
ER-500	EJES (0-1)(B'-D)	4.58	0.93		4.26		1.00	4.26
	EJES (0-1)(B-D)	11.01	1.10		12.11		1.00	12.11
	EJES (1-2)(A-D)	16.4	5.80		95.12		1.00	95.12
	EJES (2-3)(B'-D)	7.12	4.75		33.82		1.00	33.82
	EJES (2-2')(C'-D)	2.85	1.65		4.70		1.00	4.70
	EJES (3-5)(A{D)	7.42	9.10		67.55		1.00	67.55
AD-304	DESCONTAR DEPRIMIDO PARA PISO TERRAZO	4.58	0.93		4.26		-1.00	-4.26
		19.67	1.90		37.37		-1.00	-37.37
		1.2	0.33		0.40		-1.00	-0.40
		0.5	0.38		0.19		-1.00	-0.19
		4.9	2.27		11.12		-1.00	-11.12
		7.33	3.20		23.46		-1.00	-23.46
		1.4	0.91		1.27		-1.00	-1.27
		2.76	0.48		1.32		-1.00	-1.32
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								138.17
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		589.04

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALI

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	UNIDAD	FECHA:
NP08		M2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

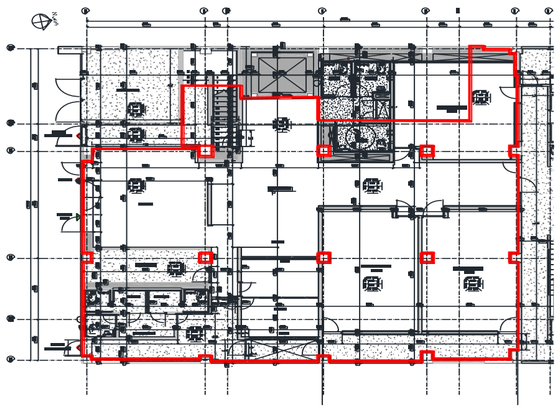

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PLACA 1er PISO							
A-101	PLACA DE 1er PISO EDIFICIO REFORZADO. EJES (1-5)(A-D)							275.73
A-101	DESCONTAR DEPRIMIDO PARA PISO TERRAZO							-108.35
	DESCONTAR PAGADO ACTAS ANTERIORES							**-619.05**
								-451.67
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**137.37**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CAS

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Construcción de cárcamo porta cable en concreto de 3000 psi, con sección libre de 30x30, espesor de muros 10cm, incluye excavación manual, relleno en material seleccionado y compactación, concreto de limpieza, acero de refuerzo formaletas y en general todos los materiales y accesorios para su correcta construcción, se paga por ml a eje de cárcamo construido.	UNIDAD	FECHA:	
NP009		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
			3.80					1.00	3.80
			2.75					1.00	2.75
			1.5					1.00	1.50
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									8.05
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	8.05

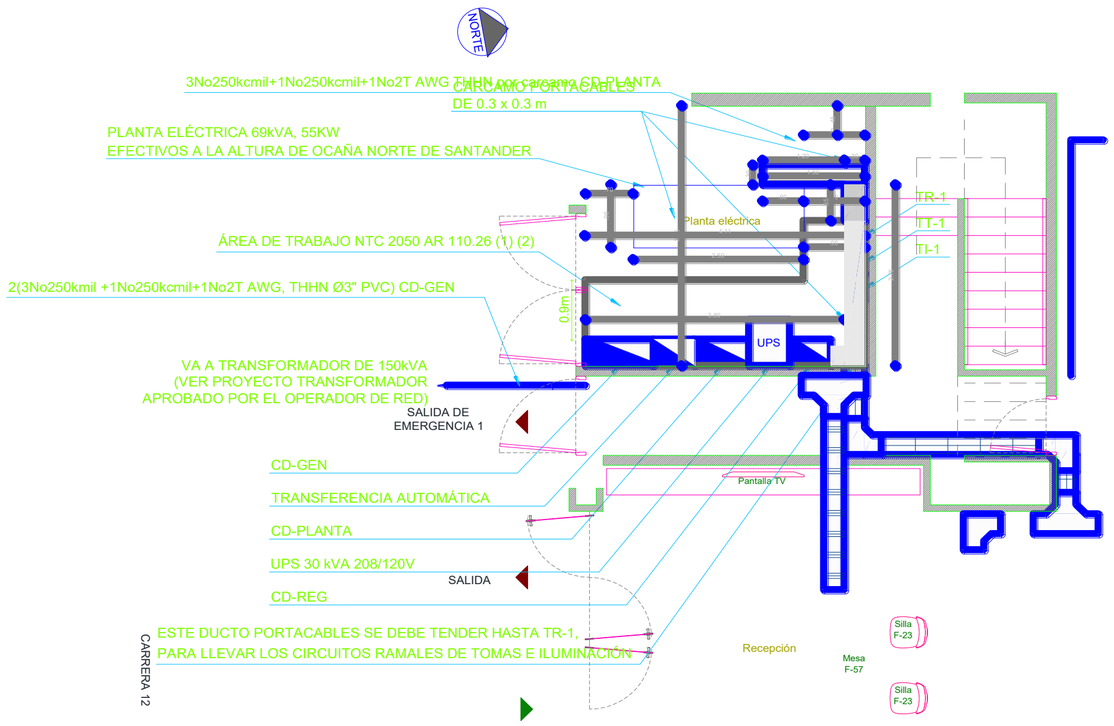

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: NP010	Concreto superfluido para recalce, concreto grava fina 1/2", con plastificante y acelerante resistencia a la compresión de 4.000 psi mezclado en obra.	UNIDAD: M3	FECHA: 21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	COLUMNA (B-2)							-
	1er piso	2.9	0.41	0.13		0.15	2.00	0.31
	2do piso	2.2	0.41	0.13		0.12	2.00	0.23
	3er piso	2.17	0.41	0.13		0.12	2.00	
	4to piso	2.4	0.41	0.13		0.13	2.00	
	COLUMNA (1-C)							
	1er piso	3.37	0.32	0.1		0.11	2.00	0.22
	2do piso	2.2	0.32	0.1		0.07	2.00	
	3er piso	2.17	0.32	0.1		0.07	2.00	
	4to piso	2.4	0.32	0.1		0.08	2.00	
								-
	COLUMNA (2-D)							-
	3er piso	2.17	0.32	0.1		0.07	2.00	
	4to piso	2.4	0.32	0.1		0.08	2.00	
								-
	PANTALLA (1-A)							-
	1er piso	0.55	0.1	3.66		0.20	2.00	0.40
	2do piso	0.55	0.1	2.2		0.12	2.00	
								-
	PANTALLA (5-A)							-
	1er piso	0.5	0.1	3.8		0.19	2.00	0.38
		0.1	0.05	2.2		0.01	1.00	0.01
	2do piso	0.55	0.1	2.2		0.12	2.00	
								-
								-
								-
	DESCONTAR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES							-0.48
								-
								-
								-
								1.07
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1.07

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTI

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	Demolicion controlada de superficies de concreto para llegar a aceros de refuerzo en elementos a reforzar	UNIDAD	FECHA:
NP011		M3	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	COLUMNA (B-2)							-
	1er piso	2.9	0.41	0.13		0.15	2.00	0.31
	2do piso	2.2	0.41	0.13		0.12	2.00	0.23
	3er piso	2.17	0.41	0.13		0.12	2.00	
	4to piso	2.4	0.41	0.13		0.13	2.00	
	COLUMNA (1-C)							
	1er piso	3.37	0.32	0.1		0.11	2.00	0.22
	2do piso	2.2	0.32	0.1		0.07	2.00	
	3er piso	2.17	0.32	0.1		0.07	2.00	
	4to piso	2.4	0.32	0.1		0.08	2.00	
								-
	COLUMNA (2-D)							-
	3er piso	2.17	0.32	0.1		0.07	2.00	
	4to piso	2.4	0.32	0.1		0.08	2.00	
								-
	PANTALLA (1-A)							-
	1er piso	0.55	0.1	3.66		0.20	2.00	0.40
	2do piso	0.55	0.1	2.2		0.12	2.00	
								-
	PANTALLA (5-A)							-
	1er piso	0.5	0.1	3.8		0.19	2.00	0.38
		0.1	0.05	2.2		0.01	1.00	0.01
	2do piso	0.55	0.1	2.2		0.12	2.00	
								-
								-
								-
	DESCONTAR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES							-0.48
								-
								-
								-
								1.07
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1.07

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CAS

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander				
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER				
	ÍTEM No.:	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12	UNIDAD	FECHA:	
	NP012		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	MAMPOSTERIA 2do PISO							
	COLUMNETAS	2.30					28.00	64.40
								-
	MAMPOSTERIA 3er PISO							
	COLUMNETAS	2.30					25.00	57.50
	MAMPOSTERIA 4to PISO							
	COLUMNETAS	2.30					25.00	57.50
	MAMPOSTERIA CUBIERTA							
	COLUMNETAS	0.80					10.00	8.00
	VIGA CINTA	10.84					1.00	10.84
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								198.24
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**198.24**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO AN

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	SUMINISTRO E INSTALACION PLÁSTICO NEGRO CAL 3.5 EN SUPERFIECIE PLACAS DE CONRAPISO	UNIDAD	FECHA:
NP014		M2	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

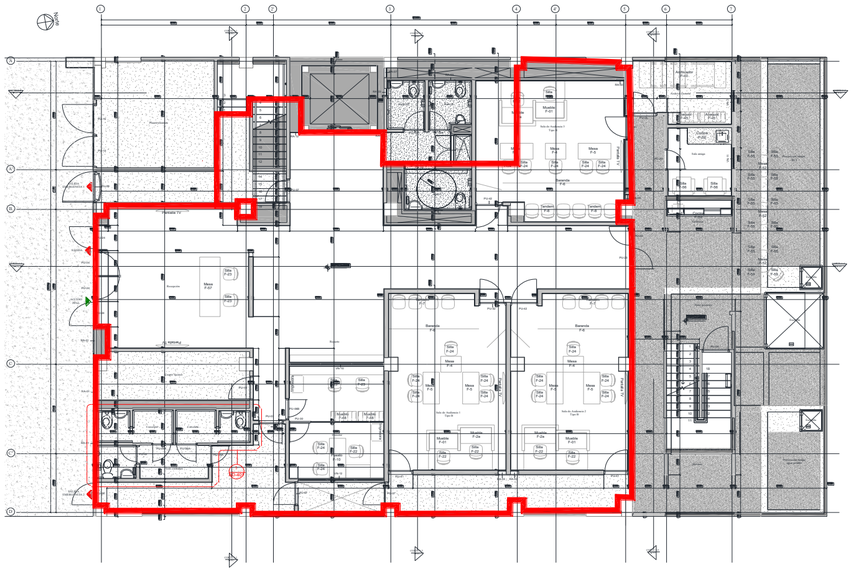

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
PRIMER PISO	(1-2)(B-D)	11.58	4.45					51.53
	(2-2')(A'-D)	14.99	2.86					42.87
	(2'-3)(A'-D)	14.48	3.59					51.98
	(3-4')(A'-D)	13.15	6.84					89.95
	(4'-5)(A-D)	18.63	2.12					39.51
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								275.84
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			275.84

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO G

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	CONCRETO DE 3000 P.S.I PLACA DE CONTRAPISO 10CM	UNIDAD	FECHA:	
NP015		M2	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

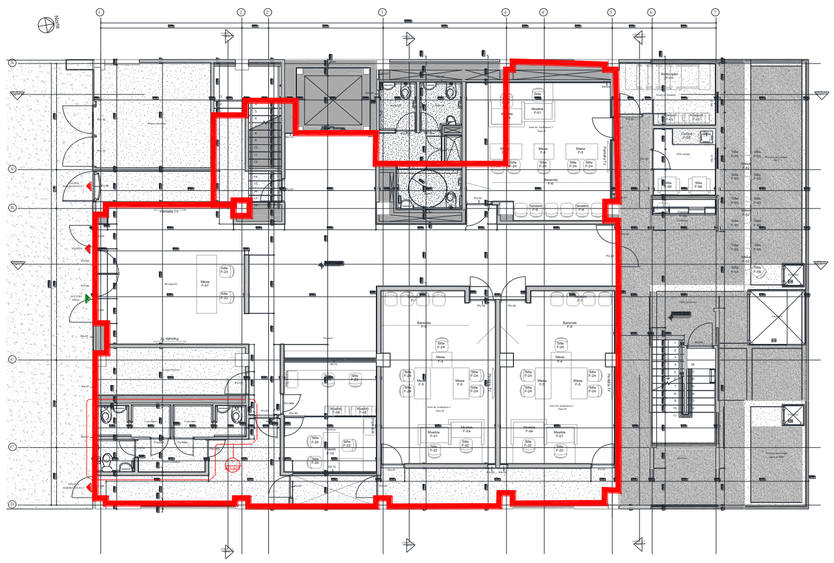DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
									
	A-101	PLACA DE 1er PISO EDIFICIO REFORZADO. EJES (1-5)(A-D)							275.73
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	Suministro e instalación de estructura de paso sencillo pin trifásica en bandera 523A para 13.2kv. Trabajos con cuadrilla de línea energizada.	UNIDAD	FECHA:
NP019		UN	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
									
								1.00	1.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									1.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GON

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Desmonte de estructuras y postes existentes con cuadrilla de línea energizada.	UNIDAD	FECHA:	
NP020		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
									
								1.00	1.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									1.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	Elaboración de memorias de calculo, planos eléctricos y tramites de aprobacion diseño ante el operador de red.	UNIDAD	FECHA:
NP021		UN	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

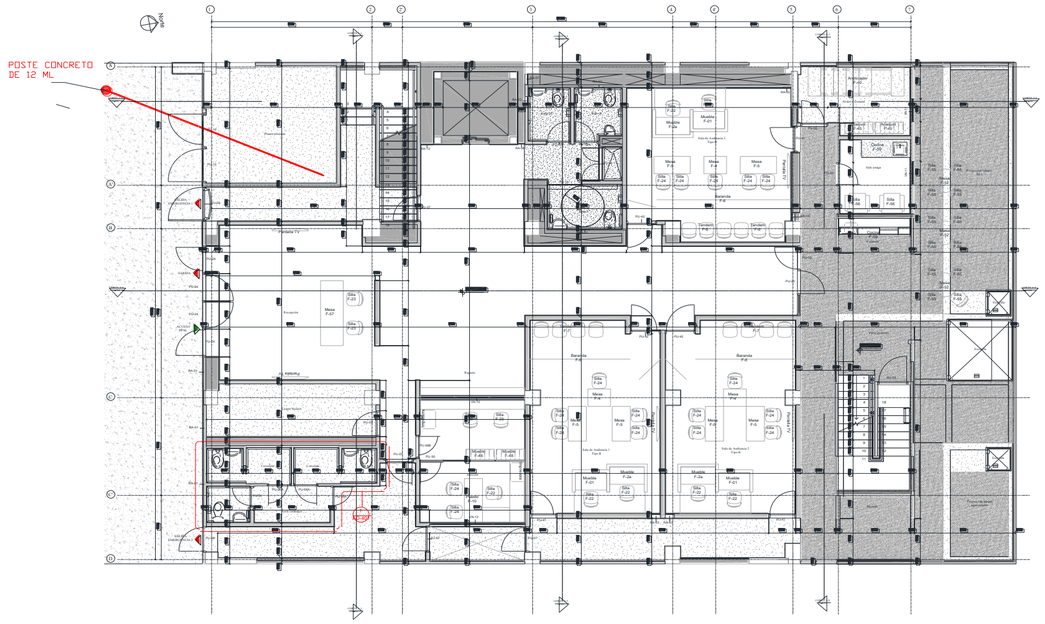

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	EDIFICIO ANTIGUO							
	ELABORACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO, PLANOS ELÉCTRICOS Y TRÁMITES						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								1.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Cierre de puentes de cortacircuitos con cuadrilla de linea energizada.	UNIDAD	FECHA:	
NP022		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

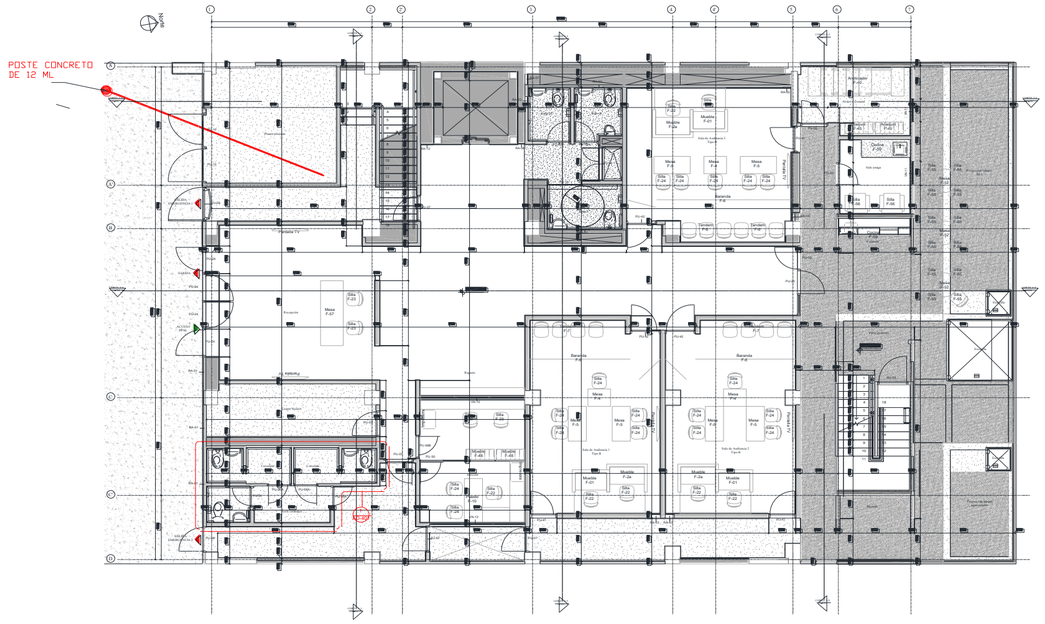

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	EDIFICIO ANTIGUO							
	Cierre de puentes de cortacircuitos con cuadrilla de linea energizada.						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								1.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES

OBSERVACIONES


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro e instalacion de transformador trifásico convencional de 150 KVA 13200/220-127V. Incluye estructura para montaje de equipo separado de fachada para cumplimiento de distancias de seguridad.	UNIDAD	FECHA:	
NP024		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
									
								1.00	1.00
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro e instalación de protecciones para transformador trifásico tipo 711 hasta 13.2 KV y SPT. Incluye cortacircuitos con camara apagachispa.	UNIDAD	FECHA:	
NP025		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

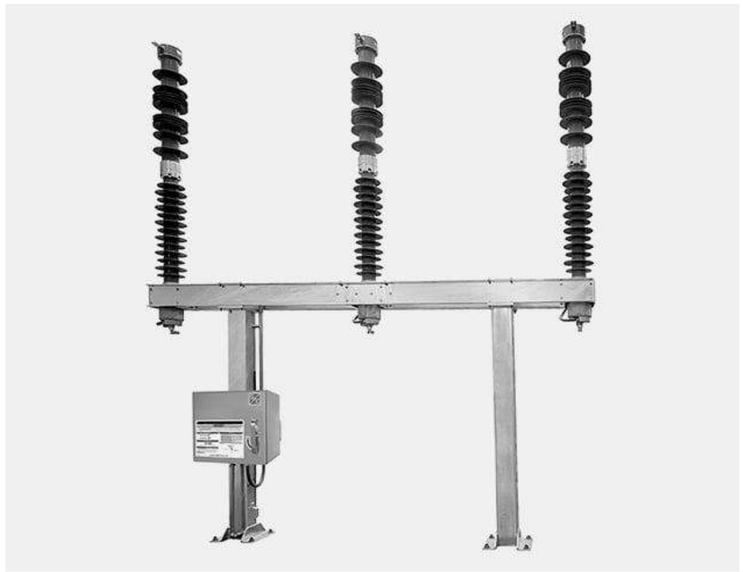DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
									
								1.00	1.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									1.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CAS

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro e instalación de dos (2) ductos conduit galvanizados imc de 4"	UNIDAD	FECHA:	
NP026		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

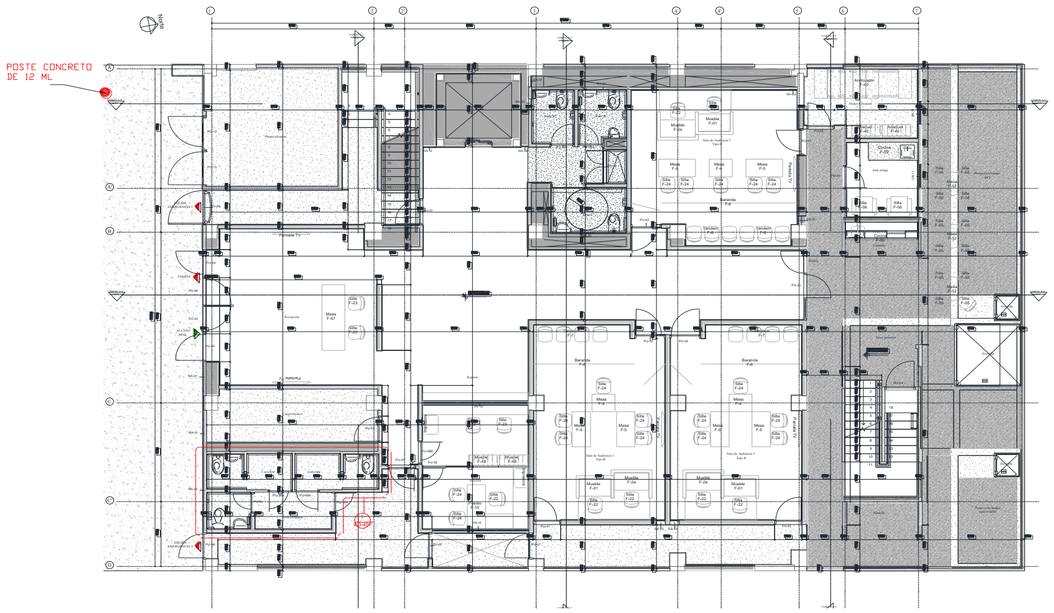

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	EDIFICIO ANTIGUO							
	DUCTOS CONDUIT 4" EN POSTE. DE BASE POSTE HASTA MITAD POSTE		6			1.00	6.00	6.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								6.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	6.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	Suministro e instalación de banco de tres (3) ductos conduit pvc de 4". Incluye demolición de piso de concreto, excavación, compactación y resanes.	UNIDAD	FECHA:
NP027		ML	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

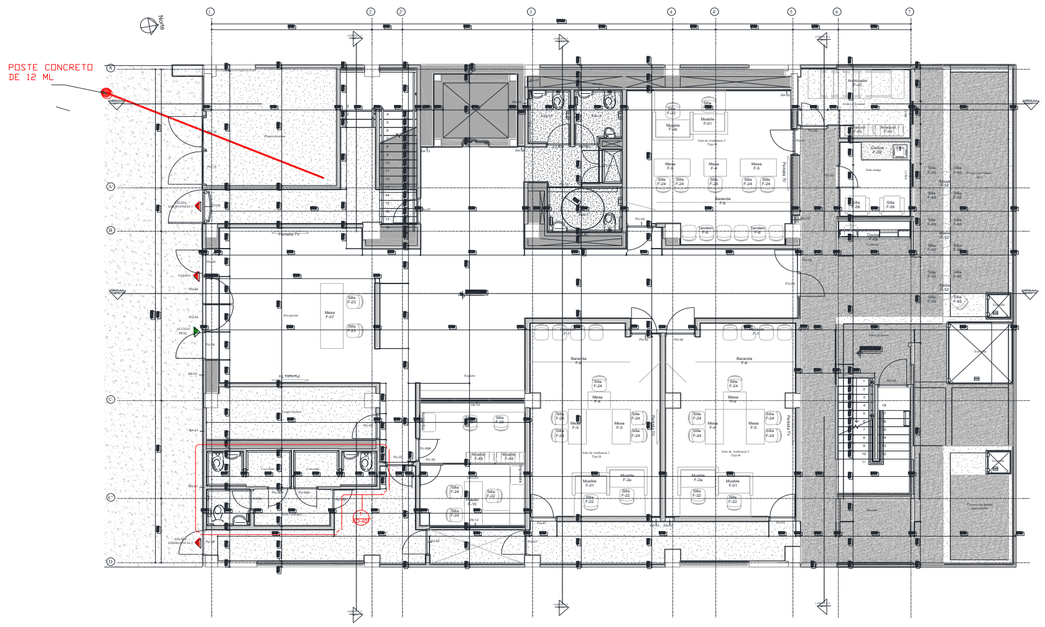

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	EDIFICIO ANTIGUO							
	DUCTOS CONDUIT PVC 4" DE POSTE A CD-GEN	8					1.00	8.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								8.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		8.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO G

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro e instalación de ocho 2x(3F+1N) conductores en cable de cobre THHN 2x(3No. 4/0 +1No. 4/0 awg) + 1No. 2T awg, desde bornes del transformador hasta protección principal en celda de dsitribución general de BT.	UNIDAD	FECHA:	
NP028		ML	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

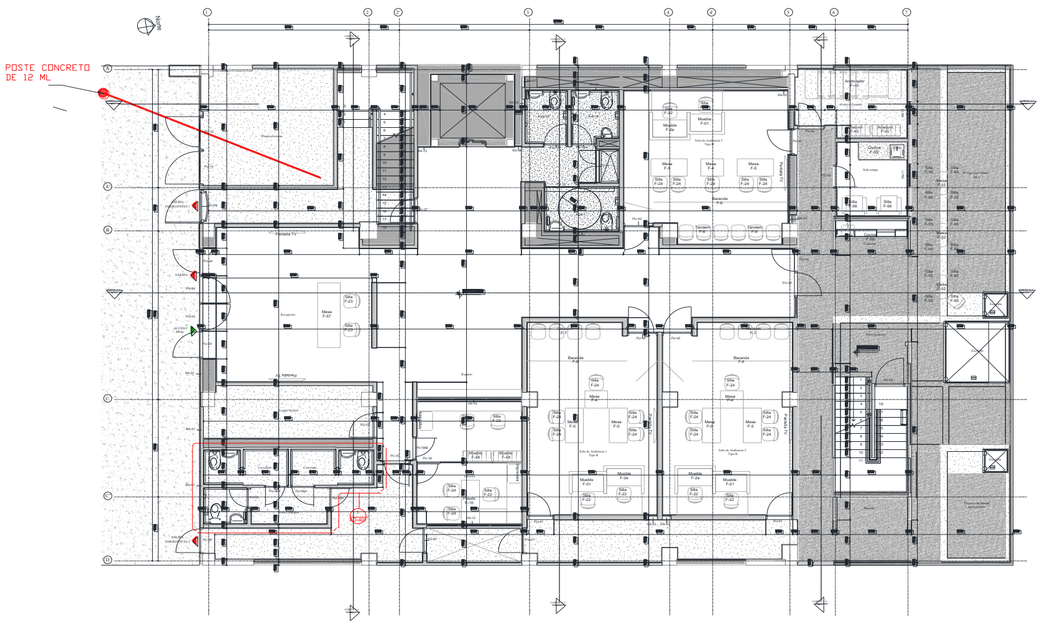

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	EDIFICIO ANTIGUO							
	ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR A BASE DE POSTE EN CONCRETO	10					1.00	10.00
	ACOMETIDA DE BASE DE POSTE EN CONCRETO A CD-GEN	10					1.00	10.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								20.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		20.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CA

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	Suministro e instalación de grupo de medida indirecta para nivel 2, 3 elementos para 13.2 KV, uso exterior y calibrado.	UNIDAD	FECHA:
NP029		UN	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

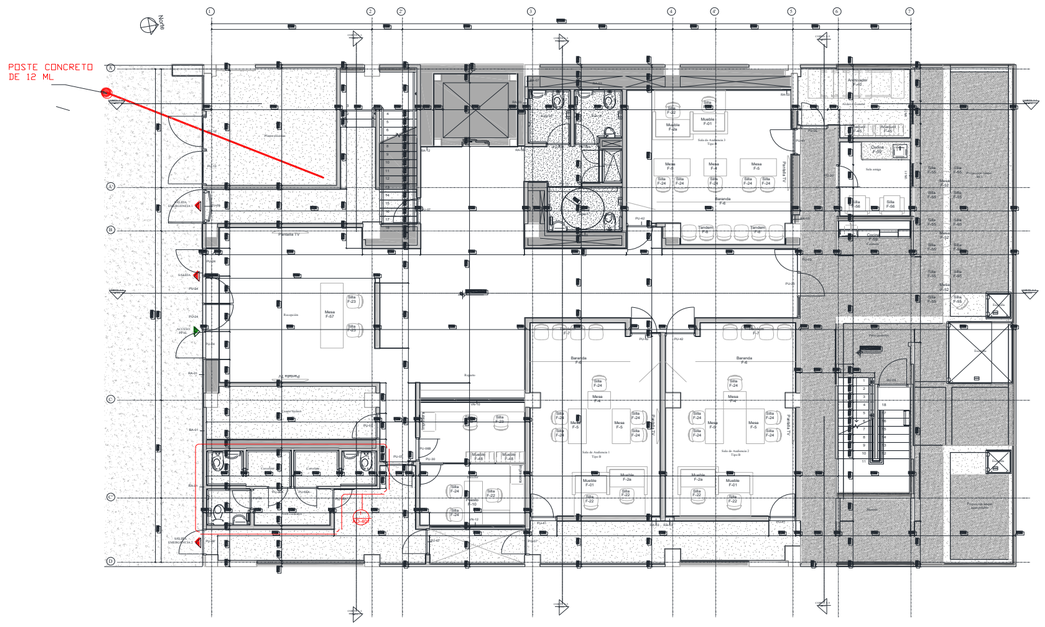DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
									
		EDIFICIO ANTIGUO							
		GRUPO DE MEDIDA INDIRECTA PARA NIVEL 2						1.00	1.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									1.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALI

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	Elaboración de memorias de calculo, planos eléctricos y tramites de aprobacion diseño ante el operador de red.	UNIDAD	FECHA:
NP030		UN	21 de enero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

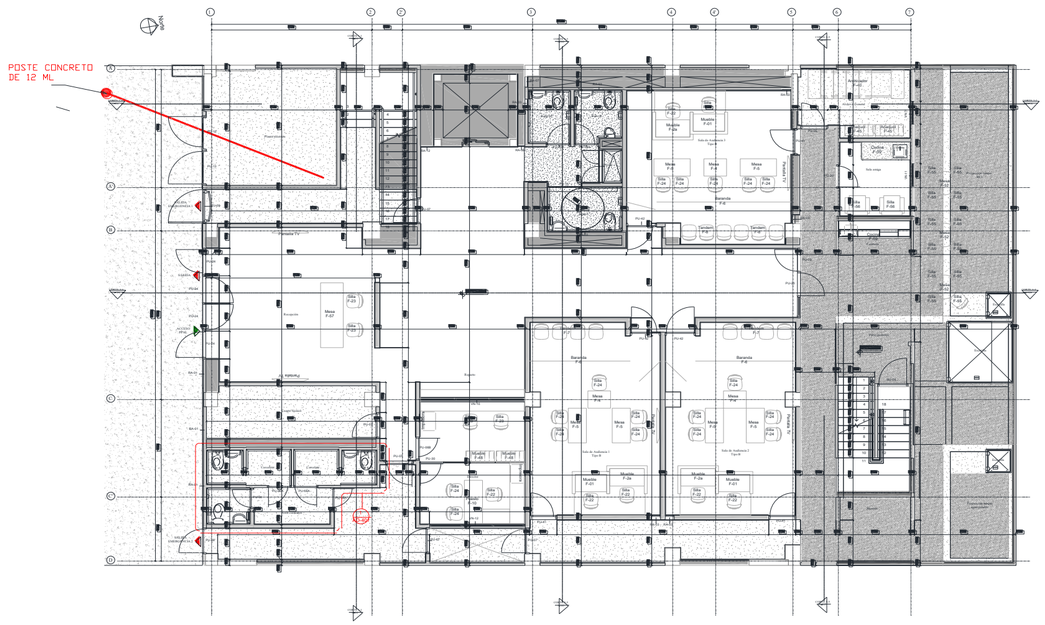

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	EDIFICIO ANTIGUO							
	ELABORACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO, PLANOS ELÉCTRICOS Y TRÁMITES						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								1.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALE


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Antepechos cubierta, en panel Kinwall E=60mm 28/26 acanalado y/o liso, incluye perfil de soporte inferior e intermedio en Angulo Gal C-16 de 5x5 ctms	UNIDAD	FECHA:	
NP031		M2	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

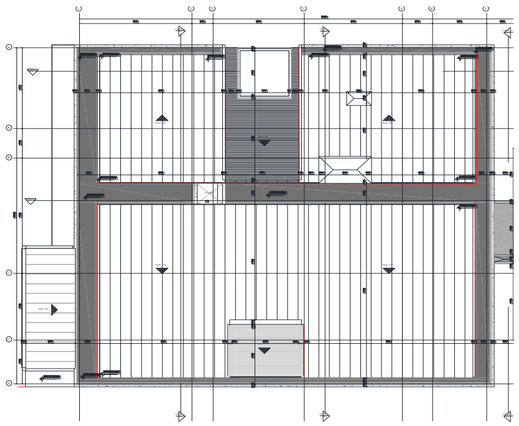

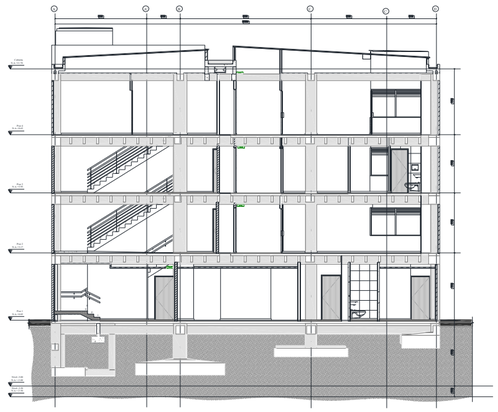





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUBIERTA							
AD-302, A-301	muro n°1	6.43		0.95	6.11		1.00	6.11
	muro n°2	6.83		1.54	10.52		1.00	10.52
	muro n°3	7.00		1.54	10.78		1.00	10.78
	muro n°4	6.43		0.95	6.11		1.00	6.11
	muro n°5	8.50		0.95	8.08		1.00	8.08
	muro n°6	2.87		1.54	4.42		1.00	4.42
	muro n°7	3.33		1.54	5.13		1.00	5.13
	muro n°8	2.87		1.54	4.42		1.00	4.42
	muro n°9	9.00		0.95	8.55		1.00	8.55
	muro n°10	6.05		0.95	5.75		1.00	5.75
	muro n°11	8.12		0.95	7.71		1.00	7.71
	muro n°12	2.50		1.54	3.85		1.00	3.85
	muro n°13	1.12		1.54	1.72		2.00	3.45
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								84.87
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	84.87

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	UNIDAD	FECHA:	
NP032		M3	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

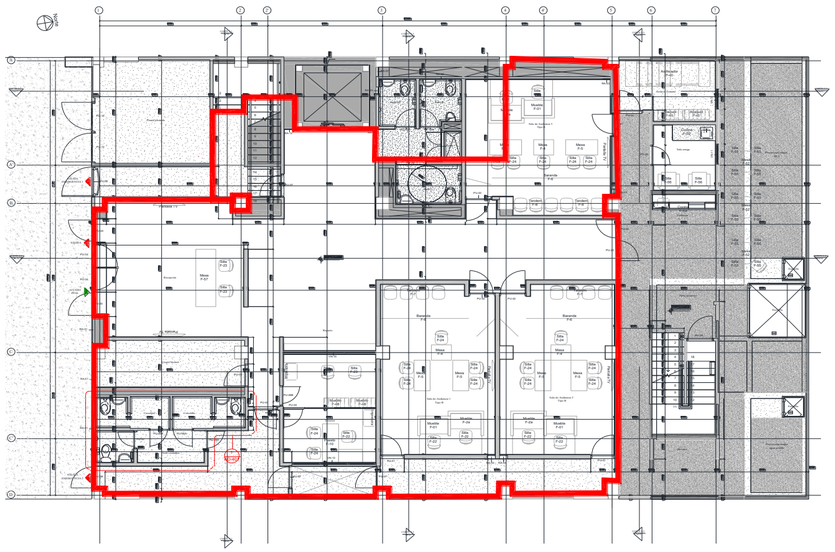


REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
PRIMER PISO	(1-2)(B-D)	11.58	4.45	0.087				4.49
	(2-2')(A'-D)	14.99	2.86	0.087				3.73
	(2'-3)(A'-D)	14.48	3.59	0.087				4.52
	(3-4')(A'-D)	13.15	6.84	0.087				7.83
	(4'-5)(A-D)	18.63	2.12	0.087				3.44
								-
								-
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
NP034		M2	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

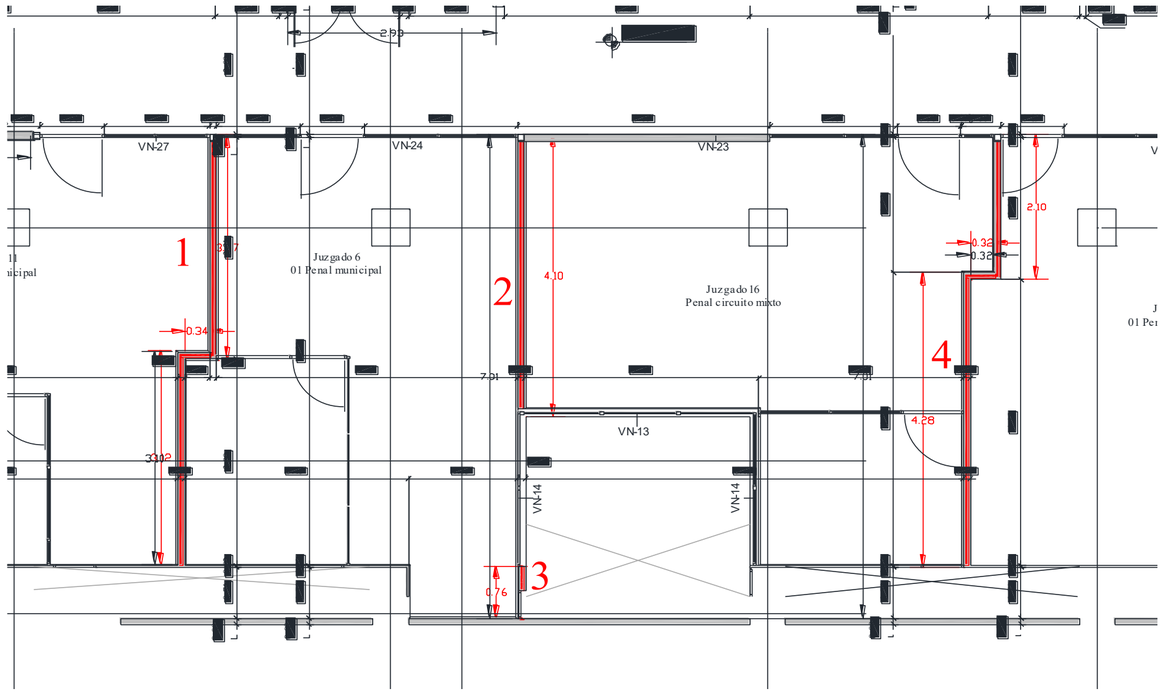


REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AD-301	**SEGUNDO PISO**							
	EJES (B-D)(1-5) (1)	3.27		2.30	7.52		1.00	7.52
		0.34		2.30	0.78		1.00	0.78
		3.12		2.30	7.18		1.00	7.18
	EJES (B-D)(1-5) (2)	4.10		2.30	9.43		1.00	9.43
	EJES (B-D)(1-5) (3)	0.76		2.30	1.75		1.00	1.75
	EJES (B-D)(1-5) (4)	2.10		2.30	4.83		1.00	4.83
		0.32		2.30	0.74		1.00	0.74
		4.28		2.30	9.84		1.00	9.84
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
NP034		M2	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

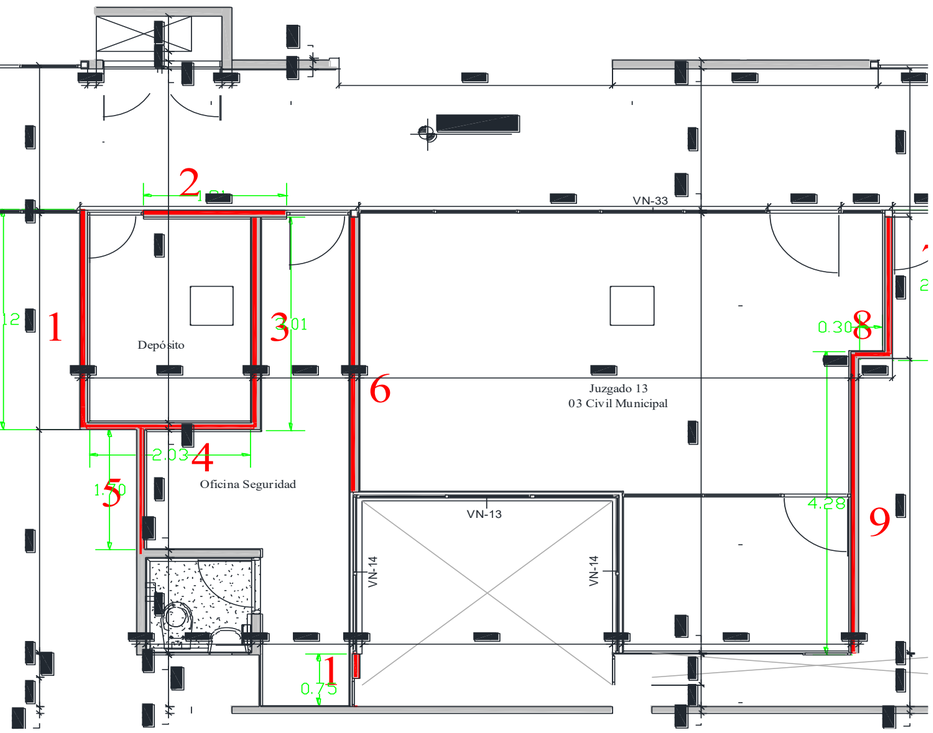

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AD-302	**TERCER PISO**							
	EJES (B-D)(1-5) (1)	3.12		2.30	7.18		1.00	7.18
	EJES (B-D)(1-5) (2)	1.81		2.30	4.16		1.00	4.16
	EJES (B-D)(1-5) (3)	3.01		2.30	6.92		1.00	6.92
	EJES (B-D)(1-5) (4)	2.03		2.30	4.67		1.00	4.67
	EJES (B-D)(1-5) (5)	1.70		2.30	3.91		1.00	3.91
	EJES (B-D)(1-5) (6)	4.05		2.30	9.32		1.00	9.32
	EJES (B-D)(1-5) (6')	0.76		2.30	1.75		1.00	1.75
	EJES (B-D)(1-5) (7)	2.12		2.30	4.88		1.00	4.88
								-
	EJES (B-D)(1-5) (8)	0.30		2.30	0.69		1.00	0.69
								-
	EJES (B-D)(1-5) (9)	4.28		2.30	9.84		1.00	9.84
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								53.31
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		95.38

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTR

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
NP034		M2	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

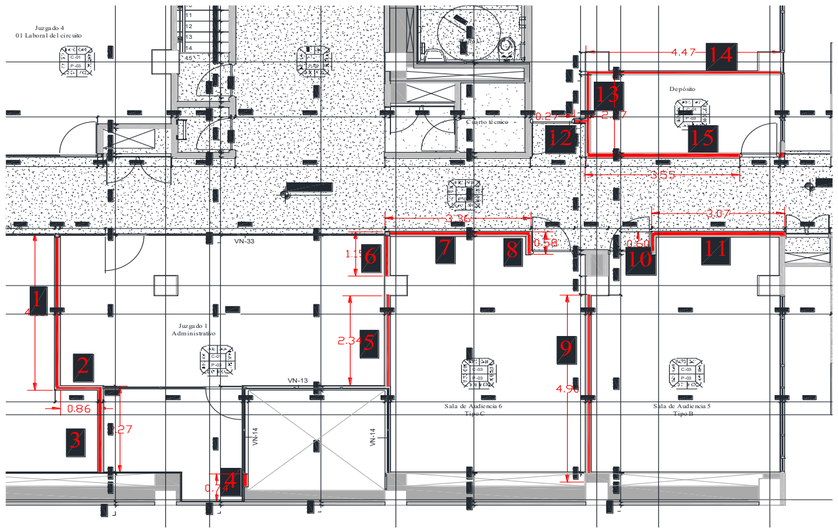

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AD-303	**CUARTO PISO**							
	EJES (B-D)(1-5) (1)	4.10		2.30	9.43		1.00	9.43
	EJES (B-D)(1-5) (2)	0.86		2.30	1.98		1.00	1.98
	EJES (B-D)(1-5) (3)	2.27		2.30	5.22		1.00	5.22
	EJES (B-D)(1-5) (4)	0.74		2.30	1.70		1.00	1.70
	EJES (B-D)(1-5) (5)	2.34		2.30	5.38		1.00	5.38
	EJES (B-D)(1-5) (6)	1.15		2.30	2.65		1.00	2.65
	EJES (B-D)(1-5) (7)	3.36		2.30	7.73		1.00	7.73
								-
	EJES (B-D)(1-5) (8)	0.58		2.30	1.33		1.00	1.33
								-
	EJES (B-D)(1-5) (9)	4.90		2.30	11.27		1.00	11.27
	EJES (B-D)(1-5) (10)	0.60		2.30	1.38		1.00	1.38
	EJES (B-D)(1-5) (11)	3.07		2.30	7.06		1.00	7.06
								-
	EJES (B-D)(1-5) (12)	0.27		2.30	0.62		1.00	0.62
								-
	EJES (B-D)(1-5)(13)	2.27		2.30	5.22		1.00	5.22
								-
	EJES (B-D)(1-5) (14)	4.47		2.30	10.28		1.00	10.28
								-
	EJES (B-D)(1-5) (15)	3.55		2.30	8.17		1.00	8.17
								-
								-
								-
								-
								-
								79.42
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		174.80

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Revisión integral y validacion cambios en recorridos para la red contraincendios, apoyo técnico en la definición de los parámetros hidráulicos y constructivos requeridos para mantener el sistema, en consecuencia de cambios en el diseño arquitectónico de cielorrasos y validación de alturas libres de la edificación. Incluye Planos de nuevo recorrido de RCI- Memorias de Cálculo (verificación de la presión y caudal del punto crítico de la red).	UNIDAD	FECHA:	
NP036		UN	21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
							1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								1.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP038	Vigas de Cimentación en concreto de 21 Mpa (3000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD M3	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

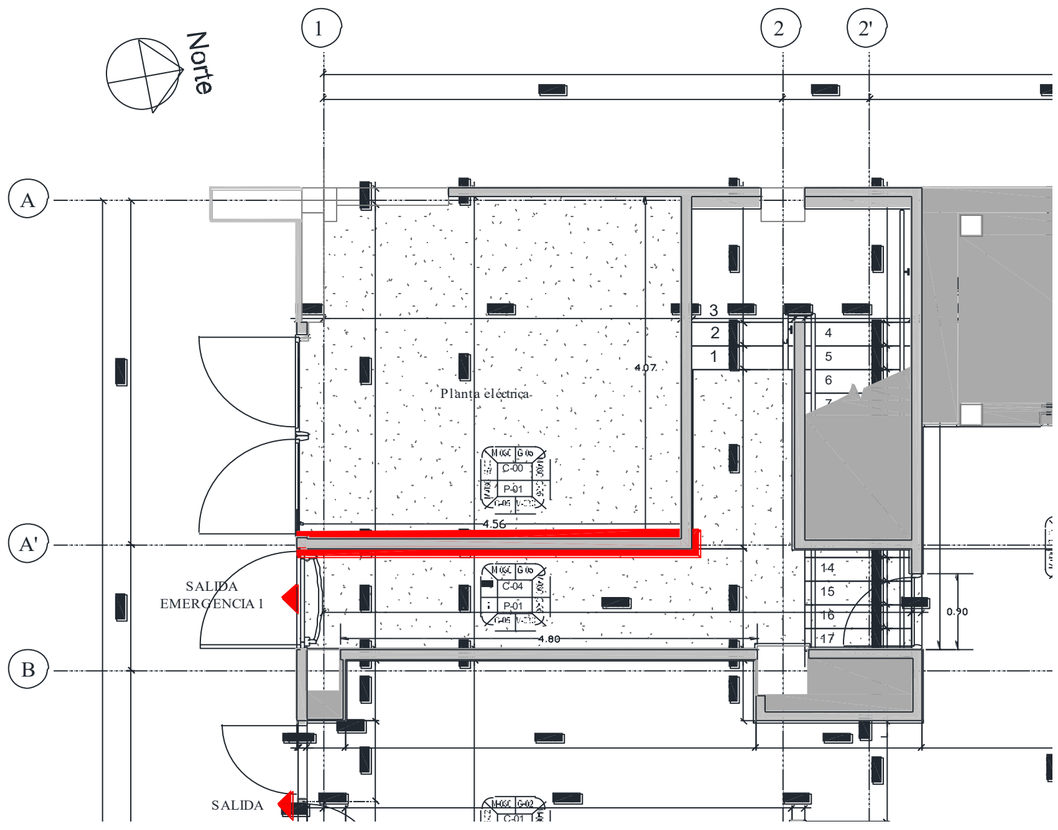


REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	VIGA CIMENTACIÓ EJE A(1-1")	4.56	0.25	0.25		0.29	1.00	0.29
	VIGA CIMENTACIÓ EJE 1'(A-A')	3.40	0.25	0.25		0.21	1.00	0.21
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP039	Suministro e instalacion cinta PVC O22 o similar	UNIDAD: ML	FECHA: 21 de enero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

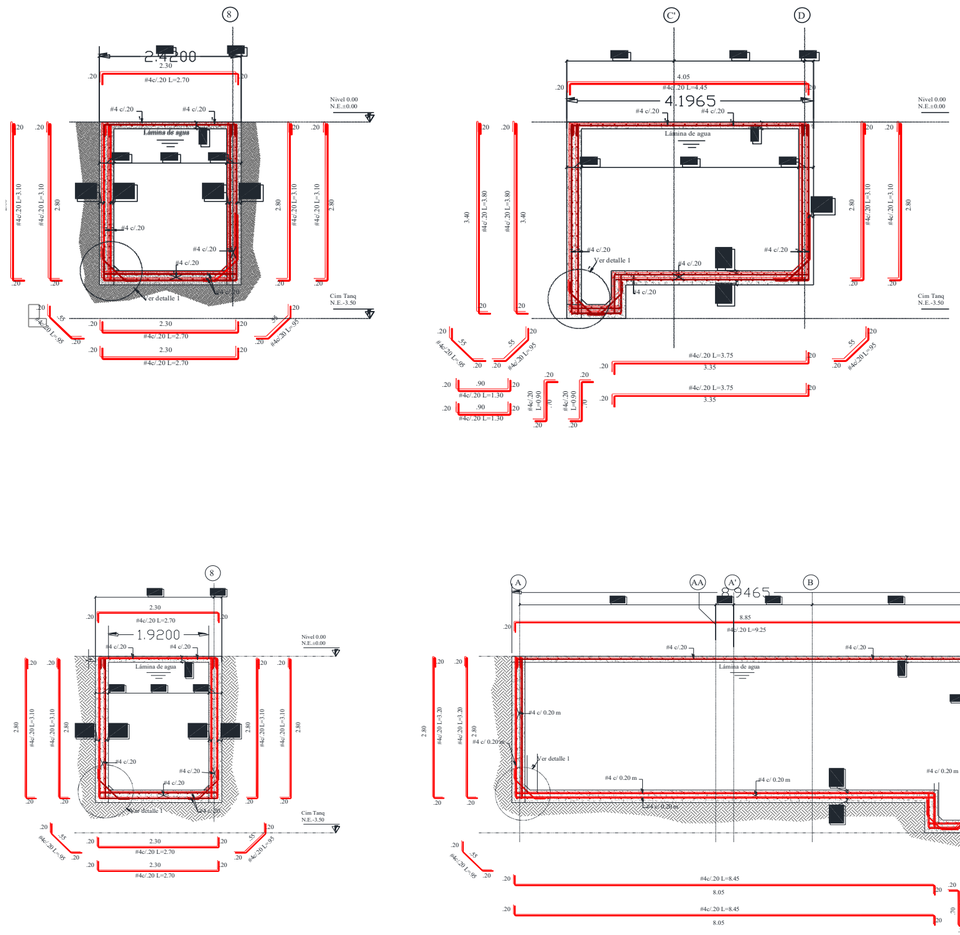

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	TANQUE AGUA POTABLE							
		1.04					1.00	1.04
		2.17					2.00	
	TANQUE RCI							
		8.70					2.00	17.40
		2.17					2.00	4.34
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								22.78
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			22.78

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZAL

OBSERVACIONES

REPORTE DE IMPREVISTOS

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

Bogotá D.C., 21 de Enero del 2026

Señores
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta-Norte de Santander
Calle 12 No 7 - 65, Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Bogotá - Colombia.
Cúcuta-Norte de Santander

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Asunto: Reporte de imprevistos contrato C-019

Estimados señores:

NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ en mi calidad de representante legal del CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA me permito informar que si bien se requiere adjuntar para el presente proceso de pago la justificación de los imprevistos del contrato aclaramos que la Obligación Específica 28 del contrato de obra de la referencia, no exige este informe como requisito sucesivo para cada factura, sino que condiciona el soporte a la ocurrencia de la circunstancia, actualmente nos encontramos analizando las condiciones que dan origen al reconocimiento de los imprevistos y su incidencia en el contrato, información que será consolidada y presentada el día Lunes 26 de enero de 2025

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C. a los 21 días del mes de Enero de 2026

NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ
REP. LEGAL CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
NIT: 901.961.696 - 7
C.C. 80.182.734 de Bogotá D.C

DOCUMENTACIÓN DE ANTICIPO

OF – 091 - 2025

Bogotá D.C., 23 de Diciembre de 2025.

Señor
JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
INTERVENTOR
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

ASUNTO: Informe de gestión fiduciaria mes de Noviembre

Cordial saludo;

En cumplimiento de las obligaciones contractuales nos permitimos remitir la siguiente información:

1. Relación detallada de los gastos efectuados con cargo al anticipo.
2. Comprobantes contables.
3. Extractos y conciliación bancaria de la cuenta exclusiva del contrato
4. Informe técnico de inversión del anticipo
5. Evidencia fotográfica
6. Certificado del contador público
7. Certificado representante legal
8. Informe mensual de los rendimientos

Sin nada más que agregar, agradezco la atención prestada

Cordialmente,



CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
R/L NICOLAS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C. C. No. 80.182.734 DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

NIT. 800141235

P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
CR 7 156 10 OF 1707
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 316300

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Noviembre 2025 **al** 30 Noviembre 2025 **Número de Encargo:** XXXXXX6067-8

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2025		$ 956.919.398,21
Aportes	$ 1.368.000,00	
Retiros	$ -284.119.844,18	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -519.982,82	
Rendimientos	$ 3.077.373,88	
Retención en la fuente	$ 0,00	
Saldo Final a 30 Noviembre 2025		$ 676.724.945,09

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/11/2025 al 30/11/2025	F NEG FIDU	14.117,334343	67.783,292154	14.168,158960	47.763,788295	676.724.945,09

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/11/2025	SALDO ANTERIOR		956.919.398,21	14.117,334343	67.783,292154	956.919.398,21
10/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-392,006176	-5.543.584,18	14.141,573578	67.275,102647	951.375.814,03
10/11/2025	GMF-4x1000	-1,568025	-22.174,34	14.141,573578	67.273,534622	951.353.639,69
11/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-5.562,739923	-78.673.316,00	14.142,907468	61.704,449788	872.680.323,69
11/11/2025	GMF-4x1000	-22,250959	-314.693,26	14.142,907468	61.682,198828	872.365.630,43
14/11/2025	APORTES	96,691250	1.368.000,00	14.148,126162	61.756,137909	873.733.630,43
18/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-3.234,627123	-45.778.804,00	14.152,729902	58.501,422141	827.954.826,43
18/11/2025	GMF-4x1000	-12,938509	-183.115,22	14.152,729902	58.488,483632	827.771.711,21
18/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-10.890,064395	-154.124.140,00	14.152,729902	47.598,419237	673.647.571,21

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F NEG FIDU	2,00%	$1.920.793.004.602,75

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
DIREC ESPECIAL	5.818	7.952	8.607	8.427	9.713	11.498	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F ANTICIPOS	4.469	6.576	7.223	7.046	8.315	10.078	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F INV DIREC	5.191	7.312	7.964	7.785	9.063	10.838	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F NEG FIDU	4.469	6.576	7.223	7.046	8.315	10.078	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
CR 7 156 10 OF 1707
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 316300

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Noviembre 2025 **al** 30 Noviembre 2025 **Número de Encargo:** XXXXXXX6067-8

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	4.469	6.576	7.223	7.046	8.315	10.078	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
OFICIAL ESPECIAL	5.713	7.844	8.500	8.320	9.604	11.388	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA - RESERVA
CR 7 156 10 OF 1707
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 316300

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Noviembre 2025 **al** 30 Noviembre 2025 **Número de Encargo:** XXXXXXX6066-0

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2025		$ 6.866.572,18
Aportes	$ 0,00	
Retiros	$ -1.368.000,00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ 0,00	
Rendimientos	$ 22.783,75	
Retención en la fuente	$ 0,00	
Saldo Final a 30 Noviembre 2025		$ 5.521.355,93

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/11/2025 al 30/11/2025	F NEG FIDU	14.117,334343	486,392970	14.168,158960	389,701721	5.521.355,93

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/11/2025	SALDO ANTERIOR		6.866.572,18	14.117,334343	486,392970	6.866.572,18
14/11/2025	RETIROS	-96,691250	-1.368.000,00	14.148,126162	388,643140	5.498.572,18

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F NEG FIDU	2,00%	$1.920.793.004.602,75

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
DIREC ESPECIAL	5.818	7.952	8.607	8.427	9.713	11.498	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F ANTICIPOS	4.469	6.576	7.223	7.046	8.315	10.078	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F INV DIREC	5.191	7.312	7.964	7.785	9.063	10.838	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F NEG FIDU	4.469	6.576	7.223	7.046	8.315	10.078	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA - RESERVA
CR 7 156 10 OF 1707
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 316300

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Noviembre 2025 **al** 30 Noviembre 2025 **Número de Encargo:** XXXXXXX6066-0

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	4.469	6.576	7.223	7.046	8.315	10.078	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
OFICIAL ESPECIAL	5.713	7.844	8.500	8.320	9.604	11.388	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá, 19 de diciembre 2025

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Sr: Reynel Jaimes Mantilla
Técnico Mentor Tesoreria
Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN
ciudad

Asunto: **Respuesta Correo de fecha 16 de diciembre 2025 solicitud de asignación de DRXC**
P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA Código 316300

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones propias de Fiduciaria Popular nos permitimos informar que como administradores del negocio P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA para el manejo de los recursos económicos del Contrato 019 DE 2025, informamos que los rendimientos de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre fueron girados por sistema Sebra en la cuenta corriente del banco de la Republica No 6101109-4 a favor de la Direccion del Tesoro Nacional de acuerdo con la instrucción que se recibió del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, sin embargo por un error operativo estos fueron girados al portafolio N° 158 a favor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y no al portafolio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a la cual le corresponde los siguientes recursos detallados a continuación:

Mes	Fecha de Giro	Valor de Giro
ago-25	10/09/2025	$ 1.906.102,04
sep-25	10/10/2025	$ 9.350.343,27
oct-25	11/11/2025	$ 5.543.584,18
nov-25	12/12/2025	$ 3.077.373,88
Total, Valor Girado		**$ 19.877.407,37**

Agradecemos su atención en los trámites pertinentes que se requieran para solventar la situación.

Cordialmente,

IRMA YOLANDA LINARES SANCHEZ
Director de Negocios Fiduciarios

Elaboro: Johanna Ramirez Quiroga
Reviso: Diana Karina Arias Avellaneda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**963,785,970.39**	**4,988,541.40**	**286,528,210.77**	**682,246,301.02**
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**963,785,970.39**	**4,988,541.40**	**286,528,210.77**	**682,246,301.02**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**963,785,970.39**	**4,988,541.40**	**286,528,210.77**	**682,246,301.02**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**963,785,970.39**	**4,988,541.40**	**286,528,210.77**	**682,246,301.02**
13020501		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**963,785,970.39**	**4,988,541.40**	**286,528,210.77**	**682,246,301.02**
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	963,785,970.39	4,988,541.40	286,528,210.77	682,246,301.02
	70083606066	ENCARGO FIDUCIARIO 70083606066	NAPL	6,866,572.18	26,580.87	1,371,797.12	5,521,355.93
	70083606067	ENCARGO FIDUCIARIO 70083606067	NAPL	956,919,398.21	4,961,960.53	285,156,413.65	676,724,945.09
2		**PASIVO**	**NAPL**	**.00**	**299,013,771.63**	**299,013,771.63**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**299,013,771.63**	**299,013,771.63**	**.00**
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**14,893,927.45**	**14,893,927.45**	**.00**
257000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**14,893,927.45**	**14,893,927.45**	**.00**
25700000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**14,893,927.45**	**14,893,927.45**	**.00**
2570000001		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	14,893,927.45	14,893,927.45	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	14,893,927.45	14,893,927.45	.00
2590		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**284,119,844.18**	**284,119,844.18**	**.00**
259095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**284,119,844.18**	**284,119,844.18**	**.00**
25909501		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**284,119,844.18**	**284,119,844.18**	**.00**
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	.00	284,119,844.18	284,119,844.18	.00
	13721713	GAMEZ LAMUS EDWARD YESID	NAPL	.00	45,778,804.00	45,778,804.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	5,543,584.18	5,543,584.18	.00
	900119732	OBRICON S A S	NAPL	.00	154,124,140.00	154,124,140.00	.00
	901043505	CUBIERTAS Y FACHADAS TECNICAS QTEC S.A.S.	NAPL	.00	78,673,316.00	78,673,316.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-963,785,970.39**	**282,907,669.37**	**1,368,000.00**	**-682,246,301.02**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-959,411,131.61**	**279,944,260.00**	**1,368,000.00**	**-680,834,871.61**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-2,246,995,696.00**	**1,368,000.00**	**1,368,000.00**	**-2,246,995,696.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-2,246,995,696.00**	**1,368,000.00**	**1,368,000.00**	**-2,246,995,696.00**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-2,246,995,696.00**	**1,368,000.00**	**1,368,000.00**	**-2,246,995,696.00**
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-2,246,995,696.00	1,368,000.00	1,368,000.00	-2,246,995,696.00
	900066500	TAYFER DE COLOMBIA LTDA	NAPL	-2,246,995,696.00	1,368,000.00	1,368,000.00	-2,246,995,696.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**1,287,584,564.39**	**278,576,260.00**	**.00**	**1,566,160,824.39**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**1,287,584,564.39**	**278,576,260.00**	**.00**	**1,566,160,824.39**
35101000		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**1,287,584,564.39**	**278,576,260.00**	**.00**	**1,566,160,824.39**
3510100095		OTROS	NAPL	1,287,584,564.39	278,576,260.00	.00	1,566,160,824.39
	13721713	GAMEZ LAMUS EDWARD YESID	NAPL	.00	45,778,804.00	.00	45,778,804.00
	890201063	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER	NAPL	11,011,137.00	.00	.00	11,011,137.00
	900119732	OBRICON S A S	NAPL	990,011,615.98	154,124,140.00	.00	1,144,135,755.98
	900791265	FIGUHIERROS FT SAS	NAPL	46,108,982.00	.00	.00	46,108,982.00
	901043505	CUBIERTAS Y FACHADAS TECNICAS QTEC S.A.S.	NAPL	.00	78,673,316.00	.00	78,673,316.00
	901086549	MATERIALES ELECTRICOS VM SAS	NAPL	53,526,149.00	.00	.00	53,526,149.00
	901098707	VALVULAS MANGUERAS & ACCESORIOS DE COLOMBOIA	NAPL	44,926,680.41	.00	.00	44,926,680.41
	901206282	HIDROPUMPS SAS	NAPL	142,000,000.00	.00	.00	142,000,000.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-4,374,838.78**	**2,963,409.37**	**.00**	**-1,411,429.41**
3915		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-8,803,419.60**	**.00**	**.00**	**-8,803,419.60**
391501		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-8,803,419.60**	**.00**	**.00**	**-8,803,419.60**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
39150101		**GANANCIAS DEL EJECICIO**	**NAPL**	**-8,803,419.60**	**.00**	**.00**	**-8,803,419.60**
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	-8,803,419.60	.00	.00	-8,803,419.60
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-8,803,419.60	.00	.00	-8,803,419.60
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**4,428,580.82**	**2,963,409.37**	**.00**	**7,391,990.19**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**4,428,580.82**	**2,963,409.37**	**.00**	**7,391,990.19**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**4,428,580.82**	**2,963,409.37**	**.00**	**7,391,990.19**
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	4,428,580.82	2,963,409.37	.00	7,391,990.19
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	4,428,580.82	2,963,409.37	.00	7,391,990.19
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-14,960,499.63**	**14,893,927.45**	**3,620,541.40**	**-3,687,113.58**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-14,960,499.63**	**14,893,927.45**	**3,620,541.40**	**-3,687,113.58**
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-14,960,499.63**	**14,893,927.45**	**3,620,541.40**	**-3,687,113.58**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-14,960,499.63**	**14,893,927.45**	**3,620,541.40**	**-3,687,113.58**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**-14,960,499.63**	**14,893,927.45**	**3,620,541.40**	**-3,687,113.58**
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-14,960,499.63	14,893,927.45	3,620,541.40	-3,687,113.58
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-14,960,499.63	14,893,927.45	3,620,541.40	-3,687,113.58
5		**GASTOS**	**NAPL**	**14,960,499.63**	**6,583,950.77**	**17,857,336.82**	**3,687,113.58**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**10,585,660.85**	**6,583,950.77**	**14,893,927.45**	**2,275,684.17**
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**.00**	**520,383.77**	**.00**	**520,383.77**
510805		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**.00**	**520,383.77**	**.00**	**520,383.77**
51080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)**	**NAPL**	**.00**	**520,383.77**	**.00**	**520,383.77**
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	.00	520,383.77	.00	520,383.77
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	.00	520,383.77	.00	520,383.77
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**1,235,317.58**	**519,982.82**	**.00**	**1,755,300.40**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**1,235,317.58**	**519,982.82**	**.00**	**1,755,300.40**
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**1,235,317.58**	**519,982.82**	**.00**	**1,755,300.40**
5140050102		G.M.F. OFERTAS FDOS COMUNES	NAPL	1,235,317.58	519,982.82	.00	1,755,300.40
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	1,235,317.58	519,982.82	.00	1,755,300.40
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**9,350,343.27**	**5,543,584.18**	**14,893,927.45**	**.00**
516701		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**9,350,343.27**	**5,543,584.18**	**14,893,927.45**	**.00**
51670101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**9,350,343.27**	**5,543,584.18**	**14,893,927.45**	**.00**
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	9,350,343.27	5,543,584.18	14,893,927.45	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	9,350,343.27	5,543,584.18	14,893,927.45	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**4,374,838.78**	**.00**	**2,963,409.37**	**1,411,429.41**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**4,374,838.78**	**.00**	**2,963,409.37**	**1,411,429.41**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**4,374,838.78**	**.00**	**2,963,409.37**	**1,411,429.41**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**4,374,838.78**	**.00**	**2,963,409.37**	**1,411,429.41**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	4,374,838.78	.00	2,963,409.37	1,411,429.41
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	4,374,838.78	.00	2,963,409.37	1,411,429.41
			Total	.00	608,387,860.62	608,387,860.62	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL

DIRECTOR CONTABLE . .

Fideico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-11-2025 hasta 30-11-2025

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 316300 P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banc	Banco Destino Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
06/11/2025	EF		70083606067 901043505 CUBIERTAS Y FACHADAS TECNICAS QTEC S.A.S.		7	94671271510	78.673.316,00	0,00	78.673.316,00	PAGADA	cc-1.09 CUBIERTA	**PAGOS CON IMPUESTOS**	06/11/2025	10
10/11/2025	PT		70083606067 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				5.543.584,18	0,00	5.543.584,18	PAGADA	REND-RENDIMIENTOS OCT 25	**DEVOLUCIONES**	10/11/2025	11
13/11/2025	EF		70083606067 13721713 GAMEZ LAMUS EDWARD YESID		7	31831789771	45.778.804,00	0,00	45.778.804,00	PAGADA	CC-1.06 INSTALACIONES ELECTRICAS	**PAGOS CON IMPUESTOS**	13/11/2025	12
13/11/2025	EF		70083606067 900119732 OBRICON S A S		7	04261616697	154.124.140,00	0,00	154.124.140,00	PAGADA	FE 37-1.01 TRABAJOS PRELIMINARES $84.198.410 1.02 MOVIMIENTO DE TIERRA $13.178.145 1.03 CIMENTACIÓN $12.074 1.04 ESTRUCTURA $56.735.511	**PAGOS CON IMPUESTOS**	13/11/2025	13
			Nro. de Operaciones: 4	**TOTAL**			284.119.844,18	0,00	284.119.844,18					

Formas de Pago

EF	PAGO ELECTRONICO ACH
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS BANCO POPULAR
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW	TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

67	MIBANCO S.A.	0	BANCO DE LA REPUBLICA
1	BANCO DE BOGOTA	2	BANCO POPULAR S.A.
6	BANCO CORPBANCA-ITAU	7	BANCOLOMBIA
9	CITIBANK	10	HSBC COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	13	BBVA COLOMBIA
14	HELM BANK-ITAU	19	BANCO COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	32	BANCO CAJA SOCIAL
37	ADMINISTRADORA COUNTRY	40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
51	BANCO DAVIVIENDA	52	BANCO AV VILLAS
60	BANCO PICHINCHA	147	BANCO ALIADAS
531	FIDUCOLOMBIA	8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT
58	BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	61	BANCO COOMEVA S.A.
63	BANCO FINANDINA S.A.	62	BANCO FALABELLA S.A.
59	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN	53	BANCO WWB S.A..
64	BANCO MULTIBANK S.A	66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
292	CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA	69	BANCO SERFINANZA S.A
108	IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCI	68	BANCO MUNDO MUJER S.A.
46	COLTEFINANCIERA S.A.	70	LULO BANK S.A.
286	JKF COOPERATIVA FINANCIERA	289	COTRAFA FINANCIERA
25	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD	130	BANCO UNION S.A.
128	NU COLOMBIA COMPAÑIA DE FINANC	507	NEQUI
551	DAVIPLATA	124	RAPPIPAY

INFORMACION RESTRINGIDA

fiduciaria popular

$1,906,102 CON 04 CTS

006165

AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SEBRA DÉBITO (Oficinas)

FORMATO CLIENTE

Ciudad: BOGOTA D.C. FECHA: DIA 10 MES 09 AÑO 2025

BANCO POPULAR
Oficina: GERENCIA DE OPERACIONES

Nosotros: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT: 900.247.285-8

Autorizamos transferencia de fondos a través del sistema SEBRA bajo las siguientes condiciones:

Con cargo a:	**CUENTA CORRIENTE**	Número:	**110-050-25307-9**

	G.M.F
137 - OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.	EXENTA

Número	Cuenta destino en el Banco República:	Portafolio
61011094	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158

Valor de la transferencia:	**$ 1,906,102.04**

(valor en letras)

UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO DOS PESOS CON 04 CTVS. MCTE

Descripción de la operación:

RENDIMIENTOS AGOSTO

Firma autorizada: Firma autorizada

Nombre: Nombre:

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Número de Autorización

El Gerente certifica que en esta oficina se encuentra abierto y activo el producto autorizado por el titular para el débito, que las firmas y condiciones de manejo fueron verificadas y que igualmente se llevaron a cabo las confirmaciones pertinentes con el cliente de acuerdo con la cuantía, antes de firmar y enviar a la Gerencia de Operaciones esta solicitud, para que se ejecute la presente operación vía SEBRA.
En el campo de Referencia y Observaciones del aplicativo Canales es de caracter obligatorio identificar plenamente el beneficiario de los recursos de la transferencia Sebra (Nombre, Nr Producto a afectar, etc)

Nombre Gerente: **Firma:**

Espacio Sello Inclusión (Back Office)

Espacio Sello Activación (Back Office)

- INFORMACION RESERVADA -

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Oficina**	944
Nombre Producto	CTE050253079	**Desc. Oficina**	GERENCIA DE TESORERIA
No. Producto	*****3079	**No. Documento**	797A23AO89000031
Fecha	2025/09/10	**Débitos**	$1,906,102.04
Fecha Aplicación	2025/09/10	**Créditos**	$0.00
Hora	15:00	**Valor Efectivo**	$1,906,102.04
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS DEBITO SEBRA	**Valor Cheque**	$0.00

fiduciaria popular

$9.350.343 CON 27 CTS

007183

AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SEBRA DÉBITO (Oficinas)

FORMATO CLIENTE

Ciudad: BOGOTA D.C. FECHA: DIA 10 MES 10 AÑO 2025

BANCO POPULAR
Oficina: GERENCIA DE OPERACIONES

Nosotros: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT: 900.247.285-8

Autorizamos transferencia de fondos a través del sistema SEBRA bajo las siguientes condiciones:

Con cargo a:	**CUENTA CORRIENTE**	Número:	**110-050-25307-9**

G.M.F	
137 - OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.	EXENTA

Número	Cuenta destino en el Banco República:	Portafolio
61011094	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158

Valor de la transferencia: **$ 9.350.343,27**

(valor en letras)

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 27 CTVS. MCTE

Descripción de la operación:

RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE

Firma autorizada: Firma autorizada:

Nombre: Nombre:

FIDUCIARIA POPULAR S.A. FILIAL DEL BANCO POPULAR

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Número de Autorización

El Gerente certifica que en esta oficina se encuentra abierto y activo el producto autorizado por el titular para el débito, que las firmas y condiciones de manejo fueron verificadas y que igualmente se llevaron a cabo las confirmaciones pertinentes con el cliente de acuerdo con la cuantía, antes de firmar y enviar a la Gerencia de Operaciones esta solicitud, para que se ejecute la presente operación vía SEBRA.
En el campo de Referencia y Observaciones del aplicativo Canales es de caracter obligatorio identificar plenamente el beneficiario de los recursos de la transferencia Sebra (Nombre, Nr Producto a afectar, etc)

Nombre Gerente: **Firma:**

Espacio Sello Inclusión (Back Office) *Espacio Sello Activación (Back Office)*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REVISADO OPERACIONES

• Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 • PBX (601) 7461414/ 5961506
• servicioalcliente@fidupopular.com.co • www.fidupopular.com.co • Línea Nacional Gratuita: 018000-513962
• Redes Sociales: @fidupopular Fiduciaria Popular S.A. Fiduciaria Popular Fiduciaria Popular

2025/10/10	000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS DEBITO SEBRA	797A23AO99002025	$9,350,343.27	$0.00

Detalle

Contraer

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Oficina	797
Nombre Producto	CTE050253079	Desc. Oficina	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIAL
No. Producto	*****3079	No. Documento	797A23AO99002025
Fecha	2025/10/10	Débitos	$9,350,343.27
Fecha Aplicación	2025/10/10	Créditos	$0.00
Hora	16:04	Valor Efectivo	$9,350,343.27
Transacción	000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS DEBITO SEBRA	Valor Cheque	$0.00

EC-CC-FOT-010
(V01)
20/09/2024

fiduciaria popular

$5.543.584 CON 18 CTS

008092

AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SEBRA DÉBITO (Oficinas)

FORMATO CLIENTE

Ciudad: BOGOTA D.C. FECHA: DIA 11 MES 11 AÑO 2025

BANCO POPULAR
Oficina: GERENCIA DE OPERACIONES

Nosotros: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT: 900.247.285-8

Autorizamos transferencia de fondos a través del sistema SEBRA bajo las siguientes condiciones:

Con cargo a:	**CUENTA CORRIENTE**	Número:	**110-050-25307-9**

	G.M.F
137 - OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.	EXENTA

Número	Cuenta destino en el Banco República:	Portafolio
61011094	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158

Valor de la transferencia: **$ 5,543,584.18**

(valor en letras)

CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 18 CTVS. MCTE

Descripción de la operación:

RENDIMIENTOS OCT 2025-EN CASO PORT 158 NO SEA EL INDICADO APLICAR PORT 0

Firma autorizada: Firma autorizada: ALBATTHA

Fiduciaria popular S.A. FILIAL DEL BANCO POPULAR

Nombre: Nombre:

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Número de Autorización

El Gerente certifica que en esta oficina se encuentra abierto y activo el producto autorizado por el titular para el débito, que las firmas y condiciones de manejo fueron verificadas y que igualmente se llevaron a cabo las confirmaciones pertinentes con el diente de acuerdo con la cuantía, antes de firmar y enviar a la Gerencia de Operaciones esta solicitud, para que se ejecute la presente operación vía SEBRA.
En el campo de Referencia y Observaciones del aplicativo Canales es de caracter obligatorio identificar plenamente el beneficiario de los recursos de la transferencia Sebra (Nombre, NIT, Producto a afectar, etc)

Nombre Gerente: **Firma:**

REVISADO OPERACIONES

Espacio Sello Validación (Back Office)

Espacio Sello Activación (Back Office)

FIDUCIARIA POPULAR S.A. FILIAL DEL BANCO POPULAR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2025/11/11	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS DEBITO SEBRA	797A23AOAA000003	$5,543,584.18	$0.00	

Detalle

^ Contraer

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Oficina	944
Nombre Producto	CTE0503 3079	Desc. Oficina	GERENCIA DE TESORERIA
No. Producto	****3079	No. Documento	797A23AOAA000003
Fecha	2025/11/11	Débitos	$5,543,584.18
Fecha Aplicación	2025/11/11	Créditos	$0.00
Hora	13:03	Valor Efectivo	$5,543,584.18
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS DEBITO SEBRA	Valor Cheque	$0.00

009138

$3.077.373 CON 88 CTS

fiduciaria popular

AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SEBRA DÉBITO (Oficinas)

FORMATO CLIENTE

Ciudad: BOGOTA D.C. FECHA: DIA 15 MES 12 AÑO 2025

BANCO POPULAR
Oficina: GERENCIA DE OPERACIONES

Nosotros: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT: 900.247.285-8

Autorizamos transferencia de fondos a través del sistema SEBRA bajo las siguientes condiciones:

Con cargo a:	**CUENTA CORRIENTE**	Número:	**110-050-25307-9**

	G.M.F
137 - OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.	EXENTA

Número	Cuenta destino en el Banco República:	Portafolio
61011094	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158

Valor de la transferencia: **$ 3.077.373,88**

(valor en letras)

TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 88 CTVS. MCTE

Descripción de la operación:

RENDIMIENTOS NOV 25 - EN CASO DE NO SER EL CODIGO DE PORTAFOLIO APLICAR CON EL CODGIGO 0

Firma autorizada: Firma autorizada:

Nombre: Nombre:

FILIAL DEL BANCO POPULAR

FIDUCIARIA POPULAR S.A. FILIAL DEL BANCO POPULAR

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Número de Autorización

El Gerente certifica que en esta oficina se encuentra abierto y activo el producto autorizado por el titular para el débito, que las firmas y condiciones de manejo fueron verificadas y que igualmente se llevaron a cabo las confirmaciones pertinentes con el cliente de acuerdo con la cuantía, antes de firmar y enviar a la Gerencia de Operaciones esta solicitud, para que se ejecute la presente operación vía SEBRA.
En el campo de Referencia y Observaciones del aplicativo Canales es de caracter obligatorio identificar plenamente el beneficiario de los recursos de la transferencia Sebra (Nombre, Nr Producto a afectar, etc)

Nombre Gerente: **Firma:**

REVISADO OPERACIONES

Espacio Sello Inclusión (Back Office) *Espacio Sello Activación (Back Office)*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

• Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 • PBX (601) 7461414/ 5961506
• servicioalcliente@fidupopular.com.co • www.fidupopular.com.co • Línea Nacional Gratuita: 018000-513962
• Redes Sociales: @fidupopular Fiduciaria Popular S.A. Fiduciaria Popular Fiduciaria Popular

2025/12/15	000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS DEBITO SEBRA	797A23AOBE002013	$3,077,373.88	$0.00	

Detalle

Contraer

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Oficina	944
Nombre Producto	CTE050253079	Desc. Oficina	GERENCIA DE TESORERIA
No. Producto	*****3079	No. Documento	797A23AOBE002013
Fecha	2025/12/15	Débitos	$3,077,373.88
Fecha Aplicación	2025/12/15	Créditos	$0.00
Hora	15:14	Valor Efectivo	$3,077,373.88
Transacción	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS DEBITO SEBRA	Valor Cheque	$0.00

Bogotá D.C., 23 de Diciembre de 2025.

Señor
JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
INTERVENTOR
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores;

Martha Yolanda García, identificada con C.C. 39.658.586 de Bogotá D.C. en mi calidad de contadora del CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA identificado con Nit. 901.961.696 – 7 me permito certificar que durante el periodo del mes de NOVIEMBRE se presentaron los siguientes movimientos en el PATRIMONIO AUTONOMO P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA cuyo número de identificación es 316300 como se puede evidenciar en los extractos adjuntos; además el patrimonio autónomo antes citados genero rendimientos financieros por $3.077.373,88 los que la fiduciaria consignó según instrucciones de la entidad.

Fecha	CONCEPTOS	VALOR RETIROS	VALOR RENDIMIENTOS	SALDO
31/08/2025	SALDO INICIAL			$2,240,195,696.00
31/08/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$1,906,102.04	$2,242,101,798.04
10/09/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATISTA	$1,906,102.04		$2,240,195,696.00
10/09/2025	4X1000	$7,624.41		$2,240,188,071.59
10/09/2025	ORDEN DE GIRO No. 1	$820,636,488.98		$1,419,551,582.61
24/09/2025	ORDEN DE GIRO No. 2	$142,000,000.00		$1,277,551,582.61
24/09/2025	4X1000	$568,000.00		$1,276,983,582.61
30/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$9,350,343.27	$1,286,333,925.88
3/10/2025	ORDEN DE GIRO No. 3	$278,839,093.41		$1,007,494,832.47
3/10/2025	4X1000	$437,855.87		$1,007,056,976.60
8/10/2025	ORDEN DE GIRO No. 4	$46,108,982.00		$960,947,994.60
8/10/2025	4X1000	$184,435.93		$960,763,558.67

9/10/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATISTA	$9,350,343.27		$951,413,215.40
9/10/2025	4X1000	$37,401.37		$951,375,814.03
31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$5,543,584.18	$956,919,398.21
10/11/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATISTA	$5,543,584.18		$951,375,814.03
10/11/2025	4X1000	$22,174.34		$951,353,639.69
11/11/2025	ORDEN DE GIRO No. 5	$78,673,316.00		$872,680,323.69
11/11/2025	4X1000	$314,693.26		$872,365,630.43
14/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$1,368,000.00	$873,733,630.43
18/11/2025	ORDEN DE GIRO No. 6	$45,778,804.00		$827,954,826.43
18/11/2025	4X1000	$183,115.22		$827,771,711.21
18/11/2025	ORDEN DE GIRO No. 6	$154,124,140.00		$673,647,571.21
30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$3,077,373.88	$676,724,945.09

Cordialmente,



MARTHA YOLANDA GARCÍA
CONTADORA
C.C. 39.658.586 de Bogotá D.C.
T.P. 98932-T

Bogotá D.C., 23 de Diciembre de 2025.

Señor
JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
INTERVENTOR
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores;

Nicolas Álvarez González, identificado con C.C. 80.182.734 de Bogotá D.C. en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA identificado con Nit. 901.961.696 – 7 me permito certificar que durante el periodo del mes de NOVIEMBRE se presentaron los siguientes movimientos en el PATRIMONIO AUTONOMO P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA cuyo número de identificación es 316300 como se puede evidenciar en los extractos adjuntos; además el patrimonio autónomo antes citados genero rendimientos financieros por $3.077.373,88 los que la fiduciaria consignó según instrucciones de la entidad.

Fecha	CONCEPTOS	VALOR RETIROS	VALOR RENDIMIENTOS	SALDO
31/08/2025	SALDO INICIAL			$2,240,195,696.00
31/08/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$1,906,102.04	$2,242,101,798.04
10/09/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATISTA	$1,906,102.04		$2,240,195,696.00
10/09/2025	4X1000	$7,624.41		$2,240,188,071.59
10/09/2025	ORDEN DE GIRO No. 1	$820,636,488.98		$1,419,551,582.61
24/09/2025	ORDEN DE GIRO No. 2	$142,000,000.00		$1,277,551,582.61
24/09/2025	4X1000	$568,000.00		$1,276,983,582.61
30/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$9,350,343.27	$1,286,333,925.88
3/10/2025	ORDEN DE GIRO No. 3	$278,839,093.41		$1,007,494,832.47
3/10/2025	4X1000	$437,855.87		$1,007,056,976.60
8/10/2025	ORDEN DE GIRO No. 4	$46,108,982.00		$960,947,994.60

8/10/2025	4X1000	$184,435.93		$960,763,558.67
9/10/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATISTA	$9,350,343.27		$951,413,215.40
9/10/2025	4X1000	$37,401.37		$951,375,814.03
31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$5,543,584.18	$956,919,398.21
10/11/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATISTA	$5,543,584.18		$951,375,814.03
10/11/2025	4X1000	$22,174.34		$951,353,639.69
11/11/2025	ORDEN DE GIRO No. 5	$78,673,316.00		$872,680,323.69
11/11/2025	4X1000	$314,693.26		$872,365,630.43
14/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$1,368,000.00	$873,733,630.43
18/11/2025	ORDEN DE GIRO No. 6	$45,778,804.00		$827,954,826.43
18/11/2025	4X1000	$183,115.22		$827,771,711.21
18/11/2025	ORDEN DE GIRO No. 6	$154,124,140.00		$673,647,571.21
30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$3,077,373.88	$676,724,945.09

Cordialmente,

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
R/L NICOLAS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C. C. No. 80.182.734 DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

Bogotá D.C., 21 de enero del 2026

Señores
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta-Norte de Santander
Calle 12 No 7 - 65, Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Bogotá - Colombia.
Cúcuta-Norte de Santander

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Asunto: Certificación vinculación personal en condición de discapacidad.

Estimados señores:

NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ y JAMES ALBEIRO GONZALEZ CARO, identificados con cedula de ciudadanía 80.182.734 de Bogotá D.C y 79.716.353 de Bogotá D.C, en nuestra calidad de Representante Legal y Contador respectivamente, en representación de OBRICON S.A.S, identificada con NIT 900.119.732 - 0 certificamos que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
5	1

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C. a los 21 días del mes de enero de 2026

NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ
REP. LEGAL OBRICON S.A.S
NIT: 900.119.732-0
C.C. 80.182.734 de Bogotá D.C

JAMES ALBEIRO GONZALEZ CARO
C.C. 79.716.353 de Bogotá D.C
Contador Público
T.P 99032-T

Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2025721100000031018
FECHA RADICADO:	04/07/2025
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	OBRICON SAS
IDENTIFICACIÓN:	900.119.732-0

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	5
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	0
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	00.00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01681

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA: "A partir del lunes 3 de marzo de 2025, el presente certificado será comunicado por el inspector de conocimiento al correo electrónico aportado por el solicitante"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 24 de julio de 2025



CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

Verificó y Elaboró: A. Claro

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO POR LA INTERVENTORÍA

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

Bogotá D.C., 21 de enero del 2026

Señores
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta-Norte de Santander
Calle 12 No 7 - 65, Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Bogotá - Colombia.
Cúcuta-Norte de Santander

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Asunto: Certificación pagos de seguridad social.

Estimados señores:

Nicolas Álvarez González identificado con CC 80.182.734 de Bogotá en mi condición de representante legal de CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA identificada con NIT 901.961.696 - 7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 21 días del mes de enero de 2026

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
NIT: 900.119.732-0
Rep. Leg. NICOLAS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C.C. 80.182.734 de BOGOTÁ

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURÍDICAS.

Los suscritos, por una parte, **MARTHA YOLANDA GARCIA CASTELLANOS,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 39.658.589** de Bogotá, y con tarjeta profesional **No. 98931-T** de la junta central de contadores de Colombia, en condición de **CONTADORA** y por otra **NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.182.734 de Bogotá, ambos en representación de **CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA**, identificado con **Nit, 901.961.696-7,** manifestamos, que luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estrados financieros del consorcio, se certifica el pago de los aportes y salarios relacionados por la compañía durante los últimos seis(6) meses calendario, por los conceptos de salarios, y aportes a salud , pensiones , riesgos laborales (ARL), caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de aprendizaje (SENA).

Lo anterior según corresponda de conformidad con la ley 43 de 1990 los artículos 50 de la ley 789 de 2002, 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los (21) veintiún días del mes de enero de 2026.

MARTHA YOLANDA GARCIA CASTELLANOS
C.C. 39.658.586 de Bogotá
T.P. 98932-T
Contadora

NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ
C.C. 80.182.734 de Bogotá
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80182734**

ALVAREZ GONZALEZ

APELLIDOS

NICOLAS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-DIC-1981**

SANTAFE DE BOGOTA DC

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-ENE-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500111-43080852-M-0080182734-20001003 **05797** 00245H 02 089662296

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.658.586

GARCIA CASTELLANOS
APELLIDOS

MARTHA YOLANDA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1972

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-DIC-1990 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00277788-F-0039658586-20110118 0025561945A 2 36008459

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

98932 -T



MARTHA YOLANDA
GARCIA CASTELLANOS
C.C. 39658586
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE MIGUEL TIQUE PEÑA

108690

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

18533

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CAE0EB64E32687 4F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA YOLANDA GARCIA CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39658586 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 98932-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLAS

NOVIEMBRE 2025

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ORLANDO GALLARDO ORJUELA
No. Identificación: CC93355232
Dirección: CRA 9A 25
Telefono: 5626356
Correo: heidy239@hotmail.com
Ciudad: OCAÑA
Número de Planilla: 8392415139

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ORLANDO GALLARDO ORJUELA	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC93355232	**Periodo de Cotización Salud**	noviembre de 2025
Número de planilla	8392415139	**Periodo de Cotización Pensión**	noviembre de 2025
Fecha pago	2025-12-16	**Número de Administradoras**	2
Número de autorización pago	39935492	**Total Pagado**	407700
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	1900

PAGADA
8392415139

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	228900	1
EPS005	Sanitas EPS	178800	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 93355232
APELLIDOS Y NOMBRES: ORLANDO GALLARDO ORJUELA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	1423500	1423500	0	0	178000	0	227800	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049626361		SALAMANCA JIMENEZ FABIAN HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8C #167D-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7434496	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2001739475	9496350589	I	2025/12/15	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$1,072,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,693,600	$591,000			$3,693,600	$461,700			$0	$0			$3,693,600	$19,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,693,600	$591,000			$3,693,600	$461,700			$0	$0			$3,693,600	$19,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,693,600	$591,000			$3,693,600	$461,700			$0	$0			$3,693,600	$19,300		$0	$0
1	CC	1049626361 SALAMANCA FABIAN	231001	30	$3,693,600	$591,000	EPS005	30	$3,693,600	$461,700		0	$0	$0	14-23	30	$3,693,600	$19,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$3,693,600	$591,000			$3,693,600	$461,700			$0	$0			$3,693,600	$19,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049626361		SALAMANCA JIMENEZ FABIAN HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8C #167D-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7434496	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2001739475	9496350589	I	2025/12/15	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$1,072,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$591,000	$0	$0	$591,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$591,000	$0	$0	$591,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,300	$0	$0	$19,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,300	$0	$0	$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$461,700	$0	$0	$461,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$461,700	$0	$0	$461,700
TOTAL				1	$1,072,000	$0	$0	$1,072,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13721713		EDWARD YESID GAMEZ LAMUS	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 10 # 27-217	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	1234567	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$684,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$684,000
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$684,000
1	CC	13721713	GAMEZ EDWARD																	23100 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$684,000
Total	**Afiliados(1)**																					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$684,000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033761080	JUAN SEBASTIAN PARRA DUARTE	cra 17 b bis 66 45 sur	7600234	jseparrad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	23/12/2025	92084542	$407.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	5	600	0	178.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	5	800	0	228.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.600
Pensión	1	227.800	228.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	407.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1033761080	JUAN SEBASTIAN PARRA DUARTE		cra 17 b bis 66 45 sur	7600234	jseparrad@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	23/12/2025	92084542	$407.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033761080	PARRA DUARTE JUAN SEBASTIAN	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049638990
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL EDUARDO MOGROVEJO MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100A#77B-32	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992900347**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1969990238		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 332.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.800	$ 0	$ 332.800
SUBTOTALES:										**$ 332.800**	**$ 0**	**$ 332.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 260.000
SUBTOTALES:													**$ 260.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 260.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.900	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 10.900
SUBTOTALES:									**$ 10.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 41.600	$ 0	$ 41.600
SUBTOTALES:			**$ 41.600**	**$ 0**	**$ 41.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD							ARP																					
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1049638990	MOGROVEJO MARTINEZ DANIEL EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.080.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.080.000	$ 332.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.080.000	$ 260.000	$ 0	$ 260.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.080.000	104963899	$ 10.900	30	$ 2.080.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 645.300

Planilla Pagada

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 08:40:57 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 82036225

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

Cliente:

PAGADA 2025-12-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YULIETH TATIANA MONTAGUT AREVALO				
Documento	CC 1094269839	**Dirección**	CR 6B NORTE #4 B - 38 BARRIO LA PIÑUELA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	605642677		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ABREGO	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1094269839		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					MONTAGUT AREVALO YULIETH TATIANA	54003000 - 54		NORTE DE SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52072479	MARIA DEL PILAR VERANO PINEDA	calle 133 #1-80	4318040	mapyve@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		MAGDALENA	SANTA MARTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	13/11/2025	91448841	$441.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	441.800	441.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52072479	MARIA DEL PILAR VERANO PINEDA		calle 133 #1-80	4318040	mapyve@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			MAGDALENA	SANTA MARTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	13/11/2025	91448841	$441.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52072479	VERANO PINEDA MARIA DEL PILAR	57	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF33	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35711905
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	AC INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	815003458	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 7 N 29 142	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4210	CORREO ELECTRÓNICO	TRAMITESALUD0106 @GMAIL.COM	TELÉFONO	5697680
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88143468	PRIMER APELLIDO	CASADIEGO	SEGUNDO APELLIDO	SANJUAN
PRIMER NOMBRE	RICARDO	SEGUNDO NOMBRE	DANIEL		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$3.036.800		35711905

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1066063125	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	BAYONA DURAN EIDER ANTONIO	$1.423.500
CC-1066062515	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	DUARTE MANOSALVA DARIEL ISNARDO	$1.423.500
CC-1090990308	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	GUERRERO PEREZ YONATHAN	$1.423.500
CC-1066062826	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	JACOME PEREZ YOSNEIDER	$1.423.500
CC-5035604	01	No	No	No	54	498	5429001	Variable	MOLINA QUINTERO DIOSEMEL	$1.423.500
CC-1090987725	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	RODRIGUEZ GUERRERO SAMUEL ANTONIO	$1.423.500
CC-13378401	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	SEPULVEDA VERGEL ELI	$1.423.500
PT-6586747	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	ZABALA GUERRA ITHAN STIBEHT	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1066063125			X	2025-11-08																									0		
CC - 1066062515			X	2025-11-08																									0		
CC - 1090990308			X	2025-11-08																									0		
CC - 1066062826			X	2025-11-08																									0		
CC - 5035604			X	2025-11-08																									0		
CC - 1090987725			X	2025-11-08																									0		
CC - 13378401			X	2025-11-08																									0		
PT - 6586747			X	2025-11-08																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1066063125	PORVENIR	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0
CC - 1066062515	PORVENIR	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0
CC - 1090990308	COLPENSIONES	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0
CC - 1066062826	PORVENIR	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0
CC - 5035604	COLPENSIONES	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0
CC - 1090987725	PROTECCION	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0
CC - 13378401	COLPENSIONES	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0
PT - 6586747	PORVENIR	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1066063125	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$379.600	0.0400000	$15.200	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	1	0.0696000	$26.500
CC - 1066062515	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$379.600	0.0400000	$15.200	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	1	0.0696000	$26.500
CC - 1090990308	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$379.600	0.0400000	$15.200	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	1	0.0696000	$26.500
CC - 1066062826	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$379.600	0.0400000	$15.200	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	1	0.0696000	$26.500
CC - 5035604	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$379.600	0.0400000	$15.200	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	1	0.0696000	$26.500
CC - 1090987725	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$379.600	0.0400000	$15.200	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	1	0.0696000	$26.500
CC - 13378401	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$379.600	0.0400000	$15.200	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	1	0.0696000	$26.500
PT - 6586747	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$379.600	0.0400000	$15.200	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	1	0.0696000	$26.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1066063125	COMFANORTE	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1066062515	COMFANORTE	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090990308	COMFANORTE	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1066062826	COMFANORTE	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5035604	COMFANORTE	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090987725	COMFANORTE	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13378401	COMFANORTE	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-6586747	COMFANORTE	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$60.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$60.800
PORVENIR	4	$243.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$243.200
COLPENSIONES	3	$182.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$182.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	$91.200	$0	0	$0	0	$0	$91.200	0	$0	$0	$91.200	$0	0	$0	$0	$91.200	$0	$0	$91.200
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$30.400	$0	0	$0	0	$0	$30.400	0	$0	$0	$30.400	$0	0	$0	$0	$30.400	$0	$0	$30.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	$212.000	0	$0	$0	$212.000	0	$0	$212.000	0	$0	$0	$212.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	8	$121.600	0	$0	$121.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$121.600
PENSIONES	3	$486.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$212.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$121.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$941.600

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900119732-0	OBRICON S.A.S.	KR 53 # 131A - 72 INT 3 OF 302	6145878	contabilidad.obricon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	91909021	$1.565.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	312.300				312.300	0	0	312.300			3.123	312.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	285.000	0	0	285.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	285.000	285.000
Pensión	2	683.400	683.400
Riesgos Laborales	1	312.300	312.300
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.565.700	1.565.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900119732-0	OBRICON S.A.S.		KR 53 # 131A - 72 INT 3 OF 302	6145878	contabilidad.obricon@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	91909021	$1.565.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030550522	RODRIGUEZ SAZA YUMNA YISSELL	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1067960995	BARRERA BEGAMBRE YULIETH ANDREA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1109069798	TRIANA ANGEL JAIVEY EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	79140793	ALVAREZ CAMERA ANTONIO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	80182734	ALVAREZ GONZALEZ NICOLAS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA	CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92488217	$8.448.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	9.500	0		0		0	0	0	0	9.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	68.400	0		0		0	0	0	0	68.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	323.000	0		0		0	0	0	0	323.000	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	269.800	0		0		0	0	0	0	269.800	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	292.600	0		0		0	0	0	0	292.600	8

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	554.400	0	0	0	0	0	0		554.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.913.600	0	0	0	0	0	0		1.913.600	10
231001	Colfondos	800227940-6	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.283.300	0	0	0	0	0	0		1.283.300	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.972.700				1.972.700	0	0	1.972.700			19.727	1.972.700	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	1.134.300	0	0	1.134.300	26

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA		CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92488217	$8.448.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.134.300	1.134.300
Pensión	4	4.206.900	4.206.900
Riesgos Laborales	1	1.972.700	1.972.700
CCF	1	1.134.300	1.134.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	8.448.200	8.448.200

PAGADO 202143642

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA		CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92488217	$8.448.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002954218	MONTOYA FLOREZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003232173	VANEGAS BALLESTERO CRISTIAN RODOLFO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1003923283	BALLESTEROS VASQUEZ JOSE SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS002	521.950	20.900	14-4	521.950	5	36.400	CCF36	521.950	20.900	0	0	0	0	0
4	CC	1003923379	ALVAREZ AGUIRRE ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS002	569.400	22.800	14-4	569.400	5	39.700	CCF36	569.400	22.800	0	0	0	0	0
5	CC	1005085770	MENDOZA RODRIGUEZ DEVINSON	1	0			S	X																25-14	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS037	1.233.700	49.400	14-4	1.233.700	5	85.900	CCF36	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
6	CC	1007283619	OMAÑA BARBOSA DUVAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1072961009	ACOSTA BEJARANO CARLOS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1091659115	PEREZ RUEDA CRISTO HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1092671269	ORTIZ VELASQUEZ FRANYER ANDREY	1	0			S	X	X															25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-4	94.900	5	6.700	CCF36	94.900	3.800	0	0	0	0	0
10	CC	1124015452	GONZALEZ URIANA EDECIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1007961194	TELLEZ TORRES DEIMER DAVID	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	CCFC50	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1049622190	SANCHEZ MENDOZA MARCO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1049622192	SUAREZ RUIZ JAMER ERIXON	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1065864914	LEAL TRUJILLO MARCO ANTONIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	7176649	CRUZ BARAJAS FREDY ARTURO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	79125323	BENAVIDES VILLAR JORGE ENRIQUE	1	5			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS002	616.850	24.700	14-4	616.850	5	43.000	CCF36	616.850	24.700	0	0	0	0	0
17	CC	1091674494	PEREZ SALAZAR JEAN CARLO	1	0			S	X																230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS037	1.233.700	49.400	14-4	1.233.700	5	85.900	CCF36	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
18	CC	1091677841	ARENAS GARNICA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
19	CC	1091680166	HINCAPIE GUERRERO OSCAR SNEIDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1092176422	MENDOZA RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF36	47.450	1.900	0	0	0	0	0
21	CC	80408767	CABEZA ROMERO JAIME	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	CCFC50	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	88138248	PEREZ ZAMBRANO FERNANDO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF36	47.450	1.900	0	0	0	0	0
23	CC	1134174874	GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO	1	0			S		X															25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
24	CC	1151456856	PALMAR MARIO SEGUNDO	1	0			S	X																230301	237.250	38.000	0	0	0	0	CCFC55	237.250	9.500	14-4	237.250	5	16.600	CCF36	237.250	9.500	0	0	0	0	0
25	CC	1193219408	MALDONADO SANCHEZ ELIUD KALETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	17158340	AVELLA VARGAS FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA	CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y		92343780	$991.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	991.000				991.000	0	0	991.000			9.910	991.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	991.000	991.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	991.000	991.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA		CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y		92343780	$991.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033761080	PARRA DUARTE JUAN SEBASTIAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1049626361	SALAMANCA JIMENEZ FABIAN HUMBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1049638990	MOGROVEJO MARTINEZ DANIEL EDUARDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1094269839	MONTAGUT AREVALO YULIETH TATIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1098658750	CARRASCAL SANCHEZ EDUARD ALEJANDRO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	19355328	ARIZA MARTINEZ PABLO DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	19385162	ROMERO DIMATE HECTOR RAUL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	52072479	VERANO PINEDA MARIA DEL PILAR	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	7187216	VASQUEZ ESPITIA LUIS FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
10	CC	93355232	GALLARDO ORJUELA ORLANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 7187216		VASQUEZ ESPITIA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	planillatunja@gmail.com	TUNJA-BOYACA	3194801838

Clave: 9494948221

Periodo Pensión: 2025-11 **Periodo Salud: 2025-11**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/12/03	0	$0	$405,800
2025/12/04	0	$0	$405,800
2025/12/05	1	$400	$406,200
2025/12/09	5	$1,400	$407,200
2025/12/10	6	$1,600	$407,400
2025/12/11	7	$1,900	$407,700
2025/12/12	8	$2,100	$407,900
2025/12/15	11	$2,900	$408,700
2025/12/16	12	$3,200	$409,000
2025/12/17	13	$3,400	$409,200

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$227,800
PROTECCION		1	$227,800
EPS	1	1	$178,000
NUEVA E.P.S.		1	$178,000
SUBTOTAL			$405,800
TOTAL			$405,800

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7187216		VASQUEZ ESPITIA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 4 -43	TUNJA-BOYACA	5555555	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																														
1	CC	7187216	VASQUEZ LUIS																	230201	30	EPS037	30		0		0	0.000%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11		9494948221	I	2025/12/04			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

PLANILLAS

DICIEMBRE 2025

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900119732-0	OBRICON S.A.S.	KR 53 # 131A - 72 INT 3 OF 302	6145878	contabilidad.obricon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	08/01/2026	1682985	$1.565.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	312.300				312.300	0	0	312.300			3.123	312.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	285.000	0	0	285.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	285.000	285.000
Pensión	2	683.400	683.400
Riesgos Laborales	1	312.300	312.300
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.565.700	1.565.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900119732-0	OBRICON S.A.S.		KR 53 # 131A - 72 INT 3 OF 302	6145878	contabilidad.obricon@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	08/01/2026	1682985	$1.565.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030550522	RODRIGUEZ SAZA YUMNA YISSELL	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1067960995	BARRERA BEGAMBRE YULIETH ANDREA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1109069798	TRIANA ANGEL JAIVEY EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	79140793	ALVAREZ CAMERA ANTONIO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	80182734	ALVAREZ GONZALEZ NICOLAS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-18, 03:09:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077535184

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 18/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HECTOR RAUL ROMERO DIMATE		
Documento	CC19385162	**Dirección**	VÍA 0 #0 - 0 VEREDA CARRASQUILLA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114743339
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TENJO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19385162	HECTOR RAUL ROMERO DIMATE	03	05																	0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ORLANDO GALLARDO ORJUELA
No. Identificación: CC93355232
Dirección: CRA 9A 25
Telefono: 5626356
Correo: heidy239@hotmail.com
Ciudad: OCAÑA
Número de Planilla: 8392473132

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ORLANDO GALLARDO ORJUELA	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC93355232	**Periodo de Cotización Salud**	diciembre de 2025
Número de planilla	8392473132	**Periodo de Cotización Pensión**	diciembre de 2025
Fecha pago	2025-12-19	**Número de Administradoras**	2
Número de autorización pago	40301259	**Total Pagado**	405800
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8392473132

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	227800	1
EPS005	Sanitas EPS	178000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 93355232
APELLIDOS Y NOMBRES: ORLANDO GALLARDO ORJUELA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	1423500	1423500	0	0	178000	0	227800	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52072479	MARIA DEL PILAR VERANO PINEDA	calle 133 #1-80	4318040	mapyve@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		MAGDALENA	SANTA MARTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	12/12/2025	92316286	$441.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	441.800	441.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52072479	MARIA DEL PILAR VERANO PINEDA	calle 133 #1-80	4318040	mapyve@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		MAGDALENA	SANTA MARTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	12/12/2025	92316286	$441.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52072479	VERANO PINEDA MARIA DEL PILAR	57	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF33	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049626361		SALAMANCA JIMENEZ FABIAN HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8C #167D-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7434496	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2001739475	9496350589	I	2025/12/15	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$1,072,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,693,600	$591,000			$3,693,600	$461,700			$0	$0			$3,693,600	$19,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,693,600	$591,000			$3,693,600	$461,700			$0	$0			$3,693,600	$19,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,693,600	$591,000			$3,693,600	$461,700			$0	$0			$3,693,600	$19,300		$0	$0
1	CC	1049626361 SALAMANCA FABIAN	231001	30	$3,693,600	$591,000	EPS005	30	$3,693,600	$461,700		0	$0	$0	14-23	30	$3,693,600	$19,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$3,693,600	$591,000			$3,693,600	$461,700			$0	$0			$3,693,600	$19,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049626361		SALAMANCA JIMENEZ FABIAN HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8C #167D-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7434496	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2001739475	9496350589	I	2025/12/15	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$1,072,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$591,000	$0	$0	$591,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$591,000	$0	$0	$591,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,300	$0	$0	$19,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,300	$0	$0	$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$461,700	$0	$0	$461,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$461,700	$0	$0	$461,700
TOTAL				1	$1,072,000	$0	$0	$1,072,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901061871	8	GRUPO GARCIA Y ASOCIADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EVER GARCIA ORELLANO	Calle 19 # 2A-29	SANTA MARTA-MAGDALENA	4235858	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	36453778	9499218482	E	2026/01/20	2026/02/04	NEQUI	15	$639,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EVER GARCIA ORELLANO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: INSTALACIONES (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$1,423,500	$71,300
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$1,423,500	$71,300
1	CC	1082936414 DE LA TORRE JAIME	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$1,423,500	$71,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13721713		EDWARD YESID GAMEZ LAMUS	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 10 # 27-217	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	32830106	9499115033	I	2026/01/06	2026/02/03	BANCOLOMBIA	28	$695,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		**$684,000**
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		**$684,000**
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		**$684,000**
1	CC	13721713	GAMEZ EDWARD																	23100 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$684,000
Total	**Afiliados(1)**																					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$684,000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033761080	JUAN SEBASTIAN PARRA DUARTE	cra 17 b bis 66 45 sur	7600234	jseparrad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	03/02/2026	3463391	$409.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	13	1.500	0	179.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	13	1.900	0	229.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	179.500
Pensión	1	227.800	229.700
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	409.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1033761080	JUAN SEBASTIAN PARRA DUARTE		cra 17 b bis 66 45 sur	7600234	jseparrad@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	03/02/2026	3463391	$409.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033761080	PARRA DUARTE JUAN SEBASTIAN	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-18, 03:48:26 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82472028

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 18/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARD ALEJANDRO CARRACAL SANCHEZ		
Documento	CC1098658750	**Dirección**	AV 0 #5 - 5 AVENIDA LOS FUNDADORES
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3227663638
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA PLAYA	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098658750	EDUARD ALEJANDRO CARRASCAL SANCHEZ	03	00		X															0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049638990
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL EDUARDO MOGROVEJO MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100A#77B-32	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7996955162**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2086882594	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 332.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.800	$ 0	$ 332.800
SUBTOTALES:										**$ 332.800**	**$ 0**	**$ 332.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 260.000
SUBTOTALES:													**$ 260.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 260.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.900	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 10.900
SUBTOTALES:									**$ 10.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 41.600	$ 0	$ 41.600
SUBTOTALES:			**$ 41.600**	**$ 0**	**$ 41.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049638990	MOGROVEJO MARTINEZ DANIEL EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.080.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.080.000	$ 332.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.080.000	$ 260.000	$ 0	$ 260.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.080.000	104963899	$ 10.900	30	$ 2.080.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 645.300

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7187216		VASQUEZ ESPITIA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 4 -43	TUNJA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	38515105	9499225673	Y	2026/01/07	2026/02/05	NEQUI	29	$342,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	7187216	VASQUEZ ESPITIA LUIS FERNANDO	X	X																230201	20	EPS037	20		0	14-23	20	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7187216		VASQUEZ ESPITIA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 4 -43	TUNJA-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	38515105	9499225673	Y	2026/01/07	2026/02/05	NEQUI	29	$342,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$151,900	$2,800	$0	$154,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$151,900	$2,800	$0	$154,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$66,100	$1,200	$0	$67,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$66,100	$1,200	$0	$67,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$118,700	$2,200	$0	$120,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$118,700	$2,200	$0	$120,900
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$6,200**	**$0**	**$342,900**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA	CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		41952642	$7.002.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	2
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	38.000	0		0		0	0	0	0	38.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	11.400	0		0		0	0	0	0	11.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	190.000	0		0		0	0	0	0	190.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	245.100	0		0		0	0	0	0	245.100	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	267.900	0		0		0	0	0	0	267.900	8
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	455.700	0	0	0	0	0	0		455.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.655.800	0	0	0	0	0	0		1.655.800	13
231001	Colfondos	800227940-6	303.800	0	0	0	0	0	0		303.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.055.700	0	0	0	0	0	0		1.055.700	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.642.800				1.642.800	0	0	1.642.800			16.428	1.642.800	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	944.300	0	0	944.300	27

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA	CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		41952642	$7.002.400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	944.300	944.300
Pensión	4	3.471.000	3.471.000
Riesgos Laborales	1	1.642.800	1.642.800
CCF	1	944.300	944.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	7.002.400	7.002.400

PAGADO 971293

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA		CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		41952642	$7.002.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002954218	MONTOYA FLOREZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S		X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003232173	VANEGAS BALLESTERO CRISTIAN RODOLFO	1	0			S		X															25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
3	CC	1003923283	BALLESTEROS VASQUEZ JOSE SEBASTIAN	1	0			S		X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS002	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
4	CC	1003923379	ALVAREZ AGUIRRE ANDRES FELIPE	1	0			S		X															230201	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS002	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
5	CC	1004897666	ROJAS JAIME CRISTIAN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF36	47.450	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	1005085770	MENDOZA RODRIGUEZ DEVINSON	1	0			S		X															25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
7	CC	1049622192	SUAREZ RUIZ JAMER ERIXON	1	0			S		X															230201	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
8	CC	1050604413	VASQUEZ BAYONA BRAYAN FERNANDO	1	0			S	X	X															25-14	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS041	474.500	19.000	14-4	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
9	CC	1064791134	MEJIA CARDENAS VICTOR MANUEL	1	0			S	X	X															230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS041	569.400	22.800	14-4	569.400	5	39.700	CCF36	569.400	22.800	0	0	0	0	0
10	CC	1091674494	PEREZ SALAZAR JEAN CARLO	1	0			S		X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
11	CC	1091677841	ARENAS GARNICA LUIS FERNANDO	1	0			S		X															230201	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
12	CC	1091680166	HINCAPIE GUERRERO OSCAR SNEIDER	1	0			S		X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
13	CC	1007283619	OMAÑA BARBOSA DUVAN FELIPE	1	0			S		X															230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS005	284.700	11.400	14-4	284.700	5	19.900	CCF36	284.700	11.400	0	0	0	0	0
14	CC	1007961194	TELLEZ TORRES DEIMER DAVID	1	0			S		X															25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	CCFC50	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
15	CC	1049622190	SANCHEZ MENDOZA MARCO ANTONIO	1	0			S		X															25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
16	CC	1193219408	MALDONADO SANCHEZ ELIUD KALETH	1	0			S		X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
17	CC	17158340	AVELLA VARGAS FERNANDO	1	1			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
18	CC	7176649	CRUZ BARAJAS FREDY ARTURO	1	0			S		X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
19	CC	1065864914	LEAL TRUJILLO MARCO ANTONIO	1	0			S		X															231001	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
20	CC	1072961009	ACOSTA BEJARANO CARLOS EDUARDO	1	0			S		X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
21	CC	1091659115	PEREZ RUEDA CRISTO HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	77194614	RUIZ GOMEZ ANGEL MARIA	1	0			S	X	X															25-14	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS037	901.550	36.100	14-4	901.550	5	62.800	CCF36	901.550	36.100	0	0	0	0	0
23	CC	79125323	BENAVIDES VILLAR JORGE ENRIQUE	1	5			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS002	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
24	CC	80408767	CABEZA ROMERO JAIME	1	0			S		X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	CCFC50	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
25	CC	1122400189	SALAZAR PEREZ DUVAN STIVEN	1	0			S	X	X															230301	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS041	901.550	36.100	14-4	901.550	5	62.800	CCF36	901.550	36.100	0	0	0	0	0
26	CC	1124015452	GONZALEZ URIANA EDECIO	1	0			S		X															231001	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0
27	CC	1151456856	PALMAR MARIO SEGUNDO	1	0			S		X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	CCFC55	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF36	949.000	38.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA	CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y		42000381	$902.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	902.000				902.000	0	0	902.000			9.020	902.000	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	902.000	902.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	902.000	902.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA		CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y		42000381	$902.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033761080	PARRA DUARTE JUAN SEBASTIAN	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.376.050	5	95.800		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1049626361	SALAMANCA JIMENEZ FABIAN HUMBERTO	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.376.050	5	95.800		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1049638990	MOGROVEJO MARTINEZ DANIEL EDUARDO	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.376.050	5	95.800		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1094269839	MONTAGUT AREVALO YULIETH TATIANA	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.376.050	5	95.800		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1098658750	CARRASCAL SANCHEZ EDUARD ALEJANDRO	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	949.000	5	66.100		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	13721713	GAMEZ LAMUS EDWARD YESID	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.376.050	5	95.800		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	19355328	ARIZA MARTINEZ PABLO DAVID	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	47.450	5	3.400		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	19385162	ROMERO DIMATE HECTOR RAUL	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.376.050	5	95.800		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	52072479	VERANO PINEDA MARIA DEL PILAR	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.376.050	5	95.800		0	0	0	0	0	0	0
10	CC	7187216	VASQUEZ ESPITIA LUIS FERNANDO	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	949.000	5	66.100		0	0	0	0	0	0	0
11	CC	93355232	GALLARDO ORJUELA ORLANDO	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.376.050	5	95.800		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-02, 05:43:43 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078313297

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 02/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CUBIERTAS Y FACHADAS TECNICAS QTEC SAS		
Documento	NI901043505	**Dirección**	CR5 72CA6
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	31520591
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GARCIA JUAN MANUEL	**Identificación**	CC 901043505
Total Afiliados	12	**ARP**	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007893327	OSCAR RAFAEL ROMERO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1043000841	ADALBERTO ORTEGA DE LA ROSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1043000850	LUIS ALBERTO CERVANTES SANTAMARIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1043018594	JESUS RAFAEL ESMERAL REDONDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1043019835	JEAN CARLOS CARABALLO HIGGINS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1143467897	KEVIN ANDRES MARQUEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1193596275	BLADIMIR ORTEGA BOLIVAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 16785386	JUAN MANUEL GARCIA SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 3759824	AMBROSIO MANUEL RADA RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 8647331	ALEXANDER BARRAZA REDONDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 8649033	LENIN SANTOS ANGULO DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 8649201	CARLOS ALBERTO BARRAZA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.082.000	$ 17.082.000	$ 17.082.000	$ 17.082.000	$ 2.733.600	$ 684.000	$ 1.189.200	$ 684.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.290.800	$ 0	$ 5.290.800

PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE

OF – 013 - 2025

Bogotá D.C., 05 de agosto de 2025.

Señor
JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
INTERVENTOR
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"
ASUNTO: REMISION PAGO IMPUESTO DE TIMBRE

Estimados señores;

Por medio del presente remitimos recibo de pago por el Timbre del Contrato en referencia.

Cordialmente,

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
R/L NICOLAS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C. C. No. 80.182.734 DE BOGOTÁ D.C.

Elaboró: NAG
Revisó: NAG
Aprobó: NAG

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
CC o NIT:	80182734
Teléfono de Contacto Celular:	3157254002
Nombre y Apellido:	C ADECUACIONES CUCUTA
Correo Electrónico:	nicolas@obricon.com.co
IP:	186.154.125.137

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/08/2025
Ticket ID:	1746
Transacción/CUS:	1679742196
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	IMPUESTO DE TIMBRE
Ciclo Transacción:	3

FORMA DE PAGO	
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1029
Total:	37336595
Total Iva:	0
No. Pago:	1746

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

INFORME DE OBRA

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044



INFORME MENSUAL

DICIEMBRE 01 AL 29

DEL 2025

Contrato No. C-019 DE 2025

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta

Elaboró	Revisó	Aprobó
		
ARQ. RESIDENTE CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA	ING. DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA	Interventoría ARQ. JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
Arq. Orlando Gallardo	Ing. Raúl Romero	

INFORME MENSUAL

DICIEMBRE 01 AL 29 DEL 2025

Actividades ejecutadas en

PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA

Contrato No. C-019 DE 2025

Objeto del contrato:

"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Presentado por

ARQUITECTO RESIDENTE

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORME ADMINISTRATIVO 5
2.1. DATOS DEL CONTRATO 5
2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: 7
4. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN OBRA 17
5. RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES 17
6. PERSONAL DE OBRA 18
7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS 18
8. ANEXOS 18
9. RESULTADOS DE ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL MATERIAL 18
10. INFORME MENSUAL SST. 18
11. INFORME MENSUAL PGAS 18
12. BITACORA DE OBRA ..... _
13. INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ..... _
14. INFORME MENSUAL DE INVERSION DE ANTICIPO ..... _
15. INFORME MENSUAL DE INVERCION DE ANTICIPO ..... _

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como fin resumir las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de diciembre del año en curso, en el desarrollo del contrato C-019 DE 2025 celebrado entre CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA y Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta**,** cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

A continuación, se resume el desarrollo administrativo, técnico y financiero del proyecto durante el periodo de ejecución de la obra.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

2.1. DATOS DEL CONTRATO

Contratante	Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
Contrato Número	CONTRATO DE OBRA No. C-019 DE 2025
Objeto	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor del Contrato	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.467.318.989)
Contratista:	**CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA**
Nit. Contratista:	901.961.696-7
Representante Legal	ING. NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ
Identificación	CC. No. 80.182.734 de BOGOTÁ
Interventoría:	**ARQ. JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ**
Nit. Interventoría:	79696673-0
Representante Legal	ARQ. JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
Avance de obra	39.22%
Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual	62-40-101012361 Anexo 0 Vigencia hasta 31-12-2025
Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal	62-44-101021629 Anexo 0 Vigencia hasta 31-12-2030
Póliza de seguro todo riesgo construcción	62-18-101000020 Anexo 0 Vigencia hasta 31-12-2025

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la elaboración de las obras requeridas para el reforzamiento estructural, así como la remodelación y adecuación del palacio de justicia del municipio de Ocaña, Norte de Santander, esto con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos de la entidad, garantizando un espacio óptimo para el desarrollo de su objeto social, así como cesar el pago de arriendo en instalaciones provisionales.

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en la Cr.12 # 12-41/49 de la ciudad de Ocaña, norte de Santander.

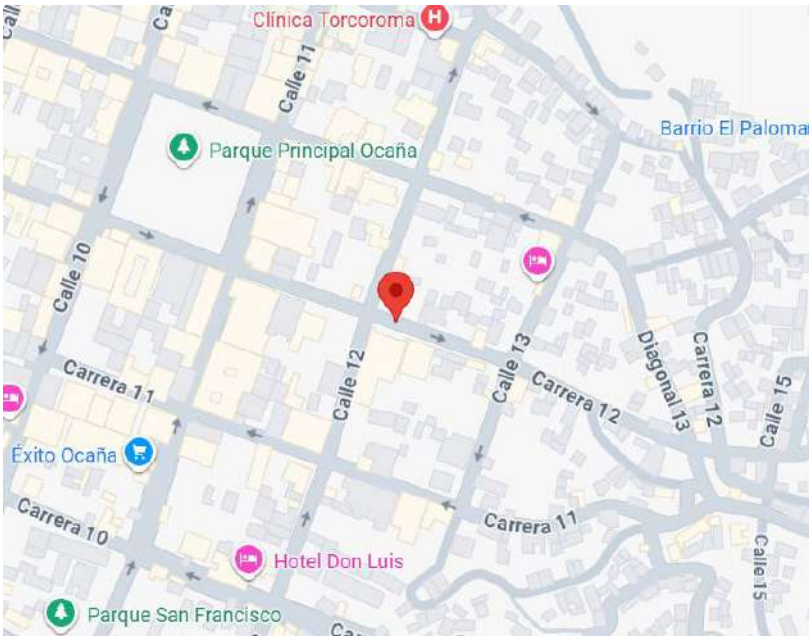


Ilustración 1. Ubicación del Laboratorio de Salud Pública departamental.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1.1	Demoliciones	m2	881.70
1.2	Construcción, Montaje, Manteniemiento y Desmonte de Campamentos y Cerramientos (incluye todas las adecuaciones provisionales en obra, incluye cargue y retiro a centro de disposición autorizado)	Und	1.00
1.3	Construcción de provisionales de energia y acueducto, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00
1.4	Obras Plan de Manejo de Ambiental, incluye todo lo necesario, contemplado el PGAS	gb	1.00
1.5	Obras Plan de Manejo de Tráfico	gb	1.00
1.6	Señalización de zonas intervenidas	un	50.00
1.7	Barrera de delimitación con delineador tubular, tela sintética verde y cinta reflectiva plástica de seguridad	m	201.56
1.8	Desmonte de puertas (todos los materiales y estructuras - incluye marcos) incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	un	21.00
1.9	Desmonte de cielo-raso (todos los materiales y estructuras) incluye cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	495.67
1.10	Desmonte teja fibro-cemento y otros materiales, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	452.67
1.11	Demolición placa de contrapiso hasta e<0.15m, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	422.14
1.12	Demolición de vigas y columnas (vigas de cubierta), incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m3	37.66
1.13	Demolición de muros con mampostería de arcilla o cemento espesor máx. de 0.20m, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1735.00
1.14	Desmonte de aparatos sanitarios	un	6.00
1.16	Demolicion de Tortas placas aereas, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1053.68
2.1	Excavacion mecanica a cielo abierto Sotano 1	m3	346.37
2.2	Excavacion manual vigas/zapatas	m3	25.07
2.3	Relleno material seleccionado	m3	13.02
3.3	Suministro, transporte e instalción de Acero Figurado 1/4" - 1", incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	kg	3436.79
3.4	Bombeo de concreto. incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	50.03
3.5	Localizacion y replanteo, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	121.77
3.6	Concreto de Limpieza 1500 PSI, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	46.58
3.7	Concreto Tanque 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	34.75
4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	5034.81
4.2	Ensayo Rotura Cilindros a compresión	un	24.00

4.3	Bombeo de concreto	m3	81.10
4.5	Escaleras en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	5.60
4.6	Muros en concreto y columnas en concreto de 31 Mpa (4500 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	1.17
4.8	Localizacion y replanteo	m2	1543.12
4.10	Concreto recalce placas/Losas/Escaleras. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	8.85
4.12	Concreto recalce vigas aéreas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	33.90
4.17	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	1076.00
4.18	Malla electrosoldada estandar.Incluye suministro, corte, amarre y colocación.	kg	2325.80
5.126	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00
5.127	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00
5.128	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00
5.129	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00
5.301	TUBERÍA PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	15.66
5.302	TUBERÍA PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	7.47
5.303	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	12.00
5.304	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	43.91
5.305	TUBERÍA PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	9.00
5.306	TUBERÍA PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	77.60

5.307	ACCESORIO PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00
5.308	ACCESORIO PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00
5.309	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00
5.310	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	50.00
5.311	ACCESORIO PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00
5.312	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	76.00
5.313	SOPORTE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	30.00
5.314	SOPORTE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00
5.315	SOPORTE 1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00
5.401	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00
5.402	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00
5.403	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00
5.501	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00
5.502	PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIO DE PUSH ANTIVANDALICO Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00
5.504	PUNTO HIDRAULICO PARA POCETAS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00

5.506	PUNTO HIDRAULICO PARA RECAMARA DE AIRE pvcp 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	13.00
5.507	PUNTO HIDRAULICO PARA ORINAL ø1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00
5.601	PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	24.00
5.602	PUNTO SANITARIO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	23.00
5.604	PUNTO SANITARIO PARA ORINAL Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00
5.605	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00
5.606	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	23.00
5.701	TUBERÍA PVC-L Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	37.50
5.702	TUBERÍA PVC-L Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00
5.801	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	108.35
5.802	TUBERÍA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	5.50
5.803	TUBERÍA PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	22.50
5.804	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	96.00
5.805	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	15.00
5.806	ACCESORIOS PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	134.00

5.810	JUNTA EXPANSIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00
5.812	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00
5.901	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	60.00
5.902	TUBERÍA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	12.00
5.903	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	30.00
5.904	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00
5.912	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00
5.101	CAJA DE INSPECCION 0,70*0,70. Incluye tapa en concreto y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	1.00
5.121	EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN	M3	13.51
5.123	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	13.51
6.101	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tuberíaEMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con polo a tierra,15 A, 120V,y seguro de giro, cable encauchetado 3x14AGW, para derivacion del tomacorriete a la clavija de conexión de la luminaria ,conductor de cobre CABLE 3No12 AWG THHN TC LS-ZH, (FASE-NEUTRO-TIERRA) para elcircuito ramal según lo mostrado en los planos, conectores tipo resorte, marquillas de identificacion y demásaccesorios que hagan parte de esta actividad. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	120.25
6.201	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica normal, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH(FASE-NEUTRO-TIERRA), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conectores tipo resortemarquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	63.25
6.202	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasicaregulada, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH TC(FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipohospitalario conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte marquillas deidentificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UN	28.00

6.203	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica conproteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto EMT, de ½", conductor de cobre CABLE 3No12 AWG, TC LS-ZH TC LS-ZH (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A,120V, conectores tipo resorte marquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LASALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UN	4.00
6.901	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , con division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para tomas e iluminacion , incluyendo cable desnudo No 6.	ML	47.51
6.101	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPO DE MEDIDA CD-GENERAL Malla de puesta a tierra para el CD-GEN, independiente según ART 15 RETIE, incluyendo 4 varillas de cobrede 5/8" x 2.44 m, 50m de conductor de cobre desnudo No 2/0, preparación de tierra, y 1 pozo de inspeccion, y conexiones con soldadura tipo cadwell	UN	1.00
6.111	Tendido de tubería Ø 3/4" IMC, desde la cubierta hasta el terreno. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	48.00
6.112	Tendido de conductor de cobre THHN # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	37.00
6.113	Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	90.30
6.114	Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 " . Abrazadera para fijación de cable, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	9.00
6.116	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00
6.117	Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	7.00
6.118	Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8' . Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00
7.105	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2" . Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	4.40

7.201	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	125.48
7.202	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	105.00
7.205	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	55.65
7.206	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	337.00
7.207	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	83.85
7.208	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	25.00
7.209	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	127.42
7.210	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	160.00
7.211	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	68.41
7.212	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	390.00
7.213	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	285.50
7.214	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	110.00
7.216	VALVULA RISER CHECK + TRIM LISTADA UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00
7.218	GABINETE CLASE III, INCLUYE, CAJA EN LAMINA DE ACERO, VIDRIO TEMPLADO DE 4mm, VALVULA ANGULO UL/FM 1.1/2", VALVULA DE ANGULO UL/FM DE 2.1/2", HACHA DE 2LBS, LLAVE PARA LAS VALVULAS, EXTINTOR DE 20 LBS. 30METROS DE MANGUERA DE POLIURETANO Y BOQUILLA DE POLICARBONATO DE 1.1/2" y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.90
7.226	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos,	UN	4.00

	andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)		
7.227	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	36.00
7.229	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	29.00
7.230	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	20.00
7.231	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	10.00
8.1	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	393.01
8.2	Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (ml). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	9.80
8.5	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	153.91
8.8	Grafil 4.0 mm. Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	63.83
8.15	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	115.00
9.1	Marquesina en cubierta policarbonato incluye Estructura. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	27.99
9.4	Suministro e instalación de cubierta liviana, sistema compuesto de cubierta en teja metálica sin traslapo tipo "Metal roof Grado 40" o similar, con cama de aislamiento termoacústico en poliuretano y capa superior de impermeabilización con membrana TPO. Incluye estructura y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	225.00
9.5	Media caña con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	248.00
9.8	Afinado pisos impermeabilizado - Cubierta. Incluye suministro, nivelación, vaciado y extendida de mortero, impermeabilizante y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	113.27
10.7	Filos y Dilataciones en Revoque/pañete Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	149.40
10.9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	704.55

14.3	Cielo Raso en drywall egún indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	288.57
21.3	Equipo Incendio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	0.95
NP01	DESMONTE DE LAMPARAS, consiste en el desmote técnico de las luminarias, y su posterior traslado a sitio de recolección por parte del contratante, incluye mano de obra, Epp, Andamios y demás elementos para el desarrollo de la actividad	Und	54.00
NP02	DESMONTE DE VENTANERIA, consiste en el desmote técnico de las ventanas existentes, y su posterior traslado a sitio de recolección por parte del contratante, incluye mano de obra, Epp, Andamios y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M2	132.35
NP03	RETIRO CASETON EN GUADUA EXISTENTE, consiste en el desmote técnico de los casetones de guadua incrustados en las placas de contrapiso existentes, incluye mano de obra, Epp, Andamios, retiro y disposición final de los residuos y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M	1132.51
NP04	RECUBRIMIENTO DE ACERO DE REFUERZO EN VIGUETAS, debido a problemas constructivos evidenciados en el momento de retirar la torta inferior de las placas aligeradas de entrepiso existentes, como hormigueos por vibrado, y otros derivados del retiro de los casetones, y por recomendación del Ing. Consultor se deben hacer reparaciones puntuales en la sección de las viguetas para resolver los aceros expuestos mediante la aplicación de un mortero de reparación que garantice el recubrimiento mínimo, según las evidencias encontradas en obra las viguetas deben ser reparadas en aproximadamente el 30% de su área superficial, la tarea consiste en aplicación de Mortero tixotrópico, para la reparación del concreto, que no requiere puente de adherencia, en espesor minimo de 2.5 cm sobre aceros expuestos, esta intervencion no garantiza niveles hilos o filos por lo que su finalidad es unicamente la proteccion de los aceros en un area que luego sera recubierta por cielorasos, incluye limpieza y retiro de material suelto, aplicacion de mortero de reparacion con llana de madera, mano de obra Epp, Andamios, y demás elementos necesarios para su correcta aplicación, se pagara por el total de las viguetas existentes en el proyecto.	M	683.80
NP05	DESMANTELAMIENTO REDES ELECTRICAS EXISTENTES, consiste en la desconexión y retiro de conductores existentes en el proyecto.	GL	1.00
NP06	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ACABADOS DE PISO Y AFINADOS, consiste en la demolición técnica de acabados de tableta de granito o cerámicos y su consecuente afinado de piso, en las placas de la edificación existente que buscan llegara el nivel original de la placa de entrepiso o contrapiso existentes para lograr las alturas de máximas, esta labor incluye herramienta menor y equipos y retiro de escombros	M2	1259.77
NP07	CONTRAPLACA EN LOSAS DE ENTREPISO, se requiere la construcción de contraplaca para garantizar una losa resistente toda vez que las existentes en el proyecto carecen de aceros de refuerzo, esta actividad consiste en aplicacion de concreto para recalce de placas de 3.000 PSI grava comun de concreto bombeable, en espesor de 50 mm, incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada Q2 (4mmX4mm 150mmX150mm) y mano de obra, sobre la misma se requiere pendientados afinados de piso pues no es de acabado final	M2	879.14

NP08	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	M2	651.65
NP009	Construcción de cárcamo porta cable en concreto de 3000 psi, con sección libre de 30x30, espesor de muros 10cm, incluye excavación manual, relleno en material seleccionado y compactación, concreto de limpieza, acero de refuerzo formaletas y en general todos los materiales y accesorios para su correcta construcción, se paga por ml a eje de cárcamo construido.	ML	10.55
NP010	Concreto superfluido para recalce, concreto grava fina 1/2", con plastificante y acelerante resistencia a la compresión de 4.000 psi mezclado en obra.	M3	0.48
NP011	Demolicion controlada de superficies de concreto para llegar a aceros de refuerzo en elementos a reforzar	M3	0.62
NP012	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12	ML	127.20
NP014	SUMINISTRO E INSTALACION PLÁSTICO NEGRO CAL 3.5 EN SUPERFIECIE PLACAS DE CONRAPISO	M2	271.34
NP015	CONCRETO DE 3000 P.S.I PLACA DE CONTRAPISO 10CM	M2	271.34
NP017	Acompañamiento certificación equipo	UND	1.00
NP018	Suministro e instalación de poste de concreto de 12mts x 1500kg. Trabajos con cuadrilla de línea energizada.	UN	1.00
NP019	Suministro e instalación de estructura de paso sencillo pin trifásica en bandera 523A para 13.2kv. Trabajos con cuadrilla de línea energizada.	UN	1.00
NP020	Desmonte de estructuras y postes existentes con cuadrilla de línea energizada.	UN	1.00
NP023	Fundida de bases de postes de concreto de 12 mts	UN	1.00
NP024	Suministro e instalacion de transformador trifásico convencional de 150 KVA 13200/220-127V. Incluye estructura para montaje de equipo separado de fachada para cumplimiento de distancias de seguridad.	UN	1.00
NP025	Suministro e instalación de protecciones para transformador trifásico tipo 711 hasta 13.2 KV y SPT. Incluye cortacircuitos con camara apagachispa.	UN	1.00
NP026	Suministro e instalación de dos (2) ductos conduit galvanizados imc de 4"	ML	1.00
NP027	Suministro e instalación de banco de tres (3) ductos conduit pvc de 4". Incluye demolición de piso de concreto, excavación, compactación y resanes.	ML	8.00
NP028	Suministro e instalación de ocho 2x(3F+1N) conductores en cable de cobre THHN 2x(3No. 4/0 +1No. 4/0 awg) + 1No. 2T awg, desde bornes del transformador hasta protección principal en celda de dsitribución general de BT.	ML	20.00
NP029	Suministro e instalación de grupo de medida indirecta para nivel 2, 3 elementos para 13.2 KV, uso exterior y calibrado.	UN	1.00
NP030	Elaboración de memorias de calculo, planos eléctricos y tramites de aprobacion diseño ante el operador de red.	UN	1.00
NP031	Antepechos cubierta, en panel Kinwall E=60mm 28/26 acanalado y/o liso, incluye perfil de soporte inferior e intermedio en Angulo Gal C-16 de 5x5 ctms	M2	180.00
NP032	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	24.00
NP033	Demolición y retiro de elementos masivos de comcreto en cimentaciones profundas	M3	27.15

NP034	Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	M2	212.00
NP035	Relleno en bloque de arcilla No 4 / 5 como material aligerante en placas de contrapiso	M3	10.71
NP036	Revisión integral y validacion cambios en recorridos para la red contraincendios, apoyo técnico en la definición de los parámetros hidráulicos y constructivos requeridos para mantener el sistema, en consecuencia de cambios en el diseño arquitectónico de cielorrasos y validación de alturas libres de la edificación. Incluye Planos de nuevo recorrido de RCI- Memorias de Cálculo (verificación de la presión y caudal del punto crítico de la red).	UN	1.00
NP038	Vigas de Cimentación en concreto de 21 Mpa (3000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M3	0.48
NP039	Suministro e instalacion cinta PVC O22 o similar	ML	33.94

4. NOVEDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se esperaba un porcentaje de ejecución superior al reportado, toda vez que la última semana de obras en el proyecto estuvo totalmente detenido el suministro de materiales, entre ellos se resalta que no fue posible el suministro de material de cubierta, la planta de procesamiento de concreto detuvo su operación toda vez que la trituradora no estuvo en operación a lo largo de la semana y solo se suministró concreto hasta el 20 de diciembre. La ciudad no tuvo abastecimiento de materiales base tales como cemento, agregados entre otros a causa del paro armado decretado por el ELN en la región.

5. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN OBRA

La ciudad no tuvo abastecimiento de materiales base tales como cemento, agregados entre otros a causa del paro armado decretado por el ELN en la región, generando retrasos en la ejecución de las obras.

6. RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES

ACTA	VALOR PAGADO
001	$ 492,126,493.77
002	$ 936,160,267.35
003	$ 534,333,829.48

7. PERSONAL DE OBRA

Ver anexo 2 Informe SST

8. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS

Ver anexo 2 Informe SST

9. ANEXOS

10. RESULTADOS DE ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL MATERIAL

Ver Anexo 1 Ensayos de laboratorio

11. INFORME SG-SST

Ver Anexo 2 Informe SST

12. INFORME PGAS

Ver Anexo 3 Informe PGAS

13. REGISTRO BITÁCORA DE OBRA.

Ver Anexo 4 Bitácora de Obra

14. INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

Ver Oficio OF-084-2025 - Informe de anticipo mes de octubre y sus anexos.

15. INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

Ver Oficio OF-084-2025 - Informe de anticipo mes de octubre y sus anexos.

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTALACION DE ACERO TANQUE RCI	FUNDIDA TANQUE AGUA POTABLE
	
INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	FUNDIDA TANQUE RCI
	
FUNDIDA CONTRAPLACA 1 PISO	INSTALACION DE VALVULAS RCI
	
ARMADA DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO	CAJA DE INSPECCION DE 70*70

	
INSTALACION DE MURO EN BLOQUE	INSTALACION DE PAÑETE
	
INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOAR	CONSTRUCCION DE VIGAS EN CARCAMO
	
INSTALACIONS DE ESTUCO	INSTALACION TUBERIA RCI
	
PAÑÑETE EN CAJAS DE INSPECCION	INSTALACION DE MALLA EN EL 1 PISO

CERTIFICACIONES ADICIONALES

Bogotá D.C., 21 de enero de 2026.

Señor
JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
INTERVENTOR
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"
ASUNTO: Relación de personal de contratista

Estimados señores;

Por medio del presente nos permitimos certificar la siguiente información relacionada con el personal vinculado para la ejecución del contrato.

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	Acreditación
HÉCTOR RAÚL ROMERO DIMATÉ	19.385.152 de Bogotá	Director de obra	ADULTO MAYOR
ORLANDO GALLARDO ORJUELA	93.355.232 de Ibague, Tolima	Residente de obra	
FABIAN HUMBERTO SALAMANCA JIMÉNEZ	1.049.626.361de Tunja	Especialista en estructuras	
DANIEL EDUARDO MOGROVEJO MARTÍNEZ	1.049.638.990 de Tunja	Especialista en Geotecnia	
PABLO DAVID ARIZA MARTÍNEZ	19.355.328 de Bogotá	Ingeniero Electricista	ADULTO MAYOR
JUAN SEBASTIAN PARRA DUARTE	1.033.761.080 de Bogotá D.C.	Ingeniero sanitario	
YULIETH TATITANA MONTAGUT AREVALO	1.094.269.839 de Pamplona	Arquitecta	
EDUARD ALEJANDRO CARRASCAL SANCHEZ	1.098.658.750 de Bucaramanga	Ingeniero Ambiental	
MARIA DEL PILAR VERANO PINEDA	52.072.479 de Bogotá D.C.	Especialista SST	
YULIETH ANDREA BARRERA BEGAMBRE	1.067.960.995 de Montería	Auxiliar Contable	PERSONAL TÉCNICO

Cordialmente,

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
R/L NICOLAS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C. C. No. 80.182.734 DE BOGOTÁ D.C.

Elaboró: NAG
Revisó: NAG
Aprobó: NAG

Bogotá D.C. 25 de julio de 2025

Señora:
YULIETH ANDREA BARRERABEGAMBRE
C.C. No. 1.067.960.995

Asunto: Modificación de Responsabilidades y Obligaciones Laborales

Respetada señora:

Por medio de la presente, y en atención a las necesidades operativas del contrato de obra no C-019 DE 2025, nos permitimos informarle que, a partir de la fecha, se modifican sus responsabilidades y obligaciones laborales, con el fin de optimizar la gestión administrativa y contable del proyecto.

A partir del 25 de julio de 2025, su labor se enmarca en el cargo de Auxilios Contables y Administrativos, donde deberá desarrollar funciones relacionadas con:

- Apoyo en la elaboración, revisión y archivo de documentos contables.
- Gestión y control de facturas, soportes y comprobantes.
- Apoyo en tareas administrativas generales del proyecto.
- Colaboración con el área contable en la preparación de reportes y estados financieros parciales.

Esta reasignación tiene carácter inmediato y constituye una declaración formal de sus nuevas responsabilidades, las cuales se desarrollarán en concordancia con los lineamientos y políticas de Obricon S.A.S.

Agradecemos su compromiso y disposición para asumir estas funciones, que contribuirán al buen desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

Nicolas Álvarez González
Representante Legal
NIT: 900.119.732-0
Cúcuta, 25 de julio de 2025

Obricon S.A.S
Construcciones civiles y arquitectonicas
Kr 53 # 131a - 72 Int 3 Of 302 Bogotá
(571)6145878
(571)4030505 ext 1184
obricon@gmail.com

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.067.960.995



Apellidos
BARRERA BEGAMBRE

Nombres
YULIETH ANDREA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
F

Fecha de nacimiento
29 JUL 1998

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
MONTERIA (CORDOBA)

Fecha y lugar de expedición
03 AGO 2016, MONTERIA

Fecha de expiración
20 JUN 2033

Firma

Yulieth Barrera

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

LIBERTAD Y ORDEN
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la ley 119 de 1994 y en atención a que

YULIETH ANDREA BARRERA BEGAMBRE.

Con Tarjeta de Identidad No. 98072961773

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TECNICO EN

CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Montería a los veintiún (21) dias del mes de noviembre del dos mil catorce(2014)

Firmado Digitalmente por
AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá – Colombia.
AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA

SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.
REGIONAL CORDOBA

Este certificado no es válido como documento
