Anexo 01

Correspondencia enviada y recibida por la firma contratista de obra del presente mes del 01 al 31 de octubre de 2025.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

2808

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Tame, 21 de octubre del 2025

Recibido 21-10-25 3:27 PM. Mauricio Rincón

Señores:
CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
Municipio de Tame

Ref: Solicitud de visita preliminar a la empresa ENELAR ESP– Evaluación de redes eléctricas en tramo inicial del Contrato de Obra N° 204 de 2025.

Por medio de la presente me permito solicitar muy respetuosamente la realización de una visita preliminar por parte de la empresa ENELAR E.S.P. al tramo inicial de la vía correspondiente al Contrato de Obra N° 204 de 2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR – SAN JOAQUÍN – PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

El propósito de la visita es evaluar conjuntamente con la firma contratista de la obra, la firma interventora y el personal técnico de ENELAR E.S.P. la disponibilidad y necesidad de traslado de las redes de baja tensión que se encuentran a lo largo del tramo de la vía. Dichas redes se ubican paralelas al hombro de la vía proyectada y, en algunos sectores, presentan baja altura, lo cual hace prioritario su respectivo ajuste para garantizar la correcta ejecución y seguridad del proyecto vial.

Agradecemos de antemano la atención prestada y la colaboración para coordinar la fecha y hora de la visita, con el fin de avanzar de manera articulada en la ejecución del contrato mencionado.

Lugar de visita: Vereda Puerto San Salvador
Día y hora: Según respuesta y disponibilidad del personal técnico de ENELAR E.S.P.

Sin otro particular;

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
CC. 68.302.258

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com

2809

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Tame, 04 de octubre del 2025

Recibido. 04-10-25. 9:10 a.m. Mauricio Rincón

Señores:
CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
Municipio de Tame

Ref: Radicado de Informe Mensual No. 02 – Contrato de Obra N.° 204 de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar la entrega del Informe Mensual No. 02, correspondiente al periodo comprendido entre el 12 y el 30 de septiembre de 2025, del Contrato de Obra N.° 204 de 2025, cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que comunica las veredas Puerto San Salvador – San Joaquín – Puerto Gaitán del municipio de Tame, departamento de Arauca."

Lo anterior se remite con el fin de que se realice la verificación correspondiente y se proceda con la emisión del informe a la administración municipal, conforme a los lineamientos contractuales establecidos.

Anexo:

- INFORME MENSUAL 02 DEL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE.

Sin otro particular,

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
CC. 68.302.258

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com

2810

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

Tame, 31 de octubre de 2025

Señor(a):

Señores:
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
Municipio de Tame

REFERENCIA: Contrato de obra 204 del 2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Cordial saludo,

En mi calidad de interventoría externa del contrato de la referencia, respetuosamente solicitamos se nos remita el Informe Mensual No. 03 correspondiente al corte comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025, con el fin de dar continuidad al proceso de seguimiento y control contractual.

Agradecemos su pronta atención y quedamos atentos al envío del documento.

Atentamente:

Mauricio Rincón

R.L CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
ING. EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
C.C 1.116.863.571

Recibí: Alejandro Medina
31-10-25
2:43 pm.

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

2811

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

Tame, 28 de octubre de 2025

Señores:
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
Municipio de Tame

REFERENCIA: **Respuesta a solicitud de visita técnica – Empresa de Energía ENELAR ESP**

Cordial saludo,

En atención a su comunicación del 21 de octubre de 2025, mediante la cual se solicita gestionar una visita técnica por parte de la empresa de energía ENELAR ESP con el fin de realizar un recorrido y verificar las afectaciones que presentan algunos postes y redes de energía en el sector, nos permitimos informar lo siguiente:

Esta firma interventora remitió la solicitud a ENELAR ESP el día 22 de octubre de 2025 a las 8:18 a.m., dando cumplimiento a lo requerido. Posteriormente, se recibió respuesta telefónica el día 28 de octubre de 2025, en la cual se acordó programar la visita técnica para el 30 de octubre de 2025 a las 8:00 a.m en la vereda Puerto San Salvador.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional o requerimiento relacionado con esta gestión.

Atentamente;

Mauricio Rincón

R.L CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
ING. EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
C.C 1.116.863.571

Recibí: Alejandro Medina
28-10-25
9:15am

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

2812

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

Tame, 01 de octubre de 2025

Señor(a):

Señores:
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
Municipio de Tame

REFERENCIA: Contrato de obra 204 del 2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Cordial saludo,

En mi calidad de interventoría externa del contrato de la referencia, respetuosamente solicitamos se nos remita el Informe Mensual No. 02, correspondiente al corte comprendido entre el 12 y el 30 de septiembre de 2025, con el fin de dar continuidad al proceso de seguimiento y control contractual.

Agradecemos su pronta atención y quedamos atentos al envío del documento.

Atentamente;

Mauricio Rincón

R.L CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
ING. EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
C.C 1.116.863.571

Recibí: Alejandro Medina
01-10-25
8:15 am

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

ANEXO 02 Bitácora Diaria de Obra para el periodo del presente informe del 01 al 31 de octubre de 2025.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO		X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO	X	
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para obtener (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2					
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 4					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se continua con los trabajos topograficos verificación de altimetrias, challanes, instalación de estacas de niveles, verificación de linderos de fincas, verificación de carteras de diseño geometrico implatadas en campo del **K3+750 al K3+900.**

Se continua con los trabajos conjuntos con la firma interventora de verificación preliminar topografica antes de intervenir la vía del **K3+750 al K3+900.**

Se realizan actividades de conformación, limpieza de hombros de via, descapote mecanico de la abscisa K2+025 al K2+250.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo la conformación mecanica de la abscisa K2+025 al K2+250.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Cnto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 | CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografico y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador	
Operadores De Maquinaria	2		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 4		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se continua con los trabajos topograficos verificación de altimetrias, challanes, instiación de estacas de niveles, verificación de linderos de fincas, verificación de carteras de diseño geometrico implatadas en campo del **K3+500 al K3+750.**
Se continua con los trabajos conjuntos con la firma interventora de verificación preliminar topografica antes de intervenir la vía del **K3+500 al K3+750.**

Se realizan actividades de conformación, limpieza de hombros de via, descapote mecanico de la abscisa K1+575 al K1+800.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo la conformación mecanica de la abscisa K1+575 al K1+800.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Ccto, 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocata)	1
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion brigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria	2		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 4		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K0+000 al K0+200.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K0+000 al K0+200.**

Se realizan actividades de conformación, limpieza de hombros de vía, descapote mecanico de la abscisa K2+250 al K2+475.

Se realiza compactación mecanica de la vía que se realizo la conformación mecanica de la abscisa K2+250 al K2+475.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Cclo. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

2817

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 | CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: SABADO 04 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador	
Operadores De Maquinaria	2		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 4		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K0+200 al K0+400,**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K0+200 al K0+400.**

Se realizan actividades de conformación, limpieza de hombros de via, descapote mecanico de la abscisa K2+475 al K2+700.

Se realiza compactación mecanica de la vía que se realizo la conformación mecanica de la abscisa K2+475 al K2+700.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 | CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: DOMINGO 05 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	maquinaria para ustaro (vibro hidraulico, camion irigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria	2		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 4		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRA DIA DOMINICAL.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibra concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocota)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2					
Maestra – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 1					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del K0+400 al K0+600.

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoria, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del K0+400 al K0+600.

Se realizan actividades de conformación, limpieza de hombros de via, descapote mecanico de la abscisa K2+700 al K2+900.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo la conformación mecanica de la abscisa KZ+700 al KZ+900

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfil:0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST -- AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo -- cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro mecanico, camion irigador, finisher y vibro compactador		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2					
Maestro – Oficial -- Ayudante	1 – 1 – 1					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K0+600 al K0+800,**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoria, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K0+600 al K0+800.**

Se realizan actividades de conformación, limpieza de hombros de via, descapote mecanico de la abscisa K2+900 al K3+100.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo la conformación mecanica de la abscisa K2+900 al K3+100.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Cclo. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025. CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.** CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estación topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocalo)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para distribuir (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2					
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 1					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K0+800 al K1+000.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K0+800 al K1+000.**

Se realizan actividades de conformación, limpieza de hombros de via, descapote mecanico de la abscisa K3+100 al K3+300.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo la conformación mecanica de la abscisa K3+100 al K3+300.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibra flexmatico, camion irigador, finisher y vibro compactador)		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2					
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 1					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de via y hombros de terraplen a construir del K1+000 al K1+200,

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del K1+000al K1+200.

Se realizan actividades de conformación, limpieza de hombros de via, descapote mecanico de la abscisa K3+300 al K3+500.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo la conformación mecanica de la abscisa K3+300 al K3+500.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Cclo. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.
Se realiza descargue y almacenamiento de cemneto en bodega de obra.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL – EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador)		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2					
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 1					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del K1+200 al K1+400.

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del K1+200 al K1+400.

Se realizan actividades de conformación, limpieza de hombros de vía, descapote mecanico de la abscisa K3+500 al K3+700.

Se realiza compactación mecanica de la vía que se realizo la conformación mecanica de la abscisa K3+500 al K3+700.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillos.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

2824

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2					
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 2					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K1+400 al K1+600.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del frazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K1+400 al K1+600.**

Se realizan actividades de conformación, limpieza de hombros de via, descapote mecanico de la abscisa K3+700 al K3+900.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo la conformación mecanica de la abscisa K3+700 al K3+900.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

2825

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2					
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 2					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRA DIA DOMINICAL.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 — CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: LUNES 13 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocafo)	1
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico,	
Operadores De Maquinaria	2	camion irrigador, finisher y vibro	
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 2	compactador	

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRA DIA FESTIVO.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

BLOQUEO PARA VEHICULOS SOBRE EL TRAMO DE VIA NACIONAL

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA.

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2					
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 2					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN TRABAJOS EN OBRA SE PRESENTAN BLOQUEOS SOBRE LA VIA NACIONAL EL CUAL IMPIDE EL TRASLADO DE PERSONAL AL LUGAR DE LA OBRA,

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

BLOQUEO PARA VEHICULOS SOBRE EL TRAMO DE VÍA NACIONAL

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025. CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.** CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador	
Operadores De Maquinaria	2		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del K1+600 al K1+800,

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del K1+600 al K1+800.

Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.

Se realiza compactación mecanica de la vía que se realizo el corte a nivel carreteable.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Cclo. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

BLOQUEO PARA VEHICULOS SOBRE EL TRAMO DE VIA NACIONAL

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
MP. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador	
Operadores De Maquinaria	2		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K1+800 al K2+000,**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K1+800 al K2+000.**

Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo el corte a nivel carreteable.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Cclo. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 [A-10]
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

BLOQUEO PARA VEHICULOS SOBRE EL TRAMO DE VIA NACIONAL

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
MP 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MÚNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria portrasiaro (vibro neumatica,	
Operadores De Maquinaria	2	camion inigador, finisher y vibro	
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 3	compactador)	

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de via y hombros de terraplen a construir del **K2+000 al K2+200.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoria, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K2+000 al K2+200.**

Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo el corte a nivel carreteable.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

BLOQUEO PARA VEHICULOS SOBRE EL TRAMO DE VIA NACIONAL

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: SABADO 18 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoya Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibra concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico,	
Operadores De Maquinaria	2	camion irigador, finisher y vibro	
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 3	compactador	

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K2+200 al K2+300.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K2+200 al K2+300.**

Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la via.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo el corte a nivel carreteable.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Cclo. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

BLOQUEO PARA VEHICULOS SOBRE EL TRAMO DE VIA NACIONAL

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: DOMINGO 19 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST -- AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo -- cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador	
Operadores De Maquinaria	2		
Maestro -- Oficial -- Ayudante	1 – 1 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRA DIA DOMINICAL.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocata)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria – Conductor	2 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 1 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K2+300 al K2+500.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K2+300 al K2+500.**

Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo el corte a nivel carreteable.

Se realiza actividades de mezclada y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniera Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2 – 1					
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K2+500 al K2+700,**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K2+500 al K2+700.**

Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo el corte a nivel carreteable.

Se realiza actividades de mezclado y encofrado de concreto para la fabricación de Sardinel Pref. Cclo. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50 (A-10)
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
MP 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

2835

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoya Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador	
Operadores De Maquinaria	2 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del K3+100 al K3+300.

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del K3+100 al K3+300.

Se realiza localización topografica para instalación de tuberia de 36" de alcantarilla # 01.
Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo el corte a nivel carreteable.

Excavación mecanica para alcantarilla # 01, nivelación de encole y descole.

Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.
Se realiza mezclado y vaciado de solado en concreto pobre para descole de la alcantarilla # 01.
Se realiza instalación y amarrado de acero de refuerzo para placa de encole de alcantarilla # 01.
Se realiza encofrado y vaciado de concreto para placa del encole de alcantarilla #01.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

100

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico,	
Operadores De Maquinaria	2 – 1	camion irrigador, finisher y vibro	
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3	compactador)	

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del K2+700 al K2+900,

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del K2+700 al K2+900.

Se realiza localización topografica, toma de niveles para excavación mecanica para alcantarilla # 01 (para tuberia, encole y descole)
Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.

Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo el corte a nivel carreteable.

Excavación mecanica para alcantarilla # 01, se realiza excavación mecanica para tuberia, encole y descole.

Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.
Se realiza mezclado y vaciado de solado en concreto pobre para niveles y soporte de tuberia para la alcantarilla # 01

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEXANDER MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 | CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria	2 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K2+900 al K3+100.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoria, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K2+900 al K3+100.**

Se realiza localización topografica para instalación de tuberia de 36" de alcantarilla # 01.
Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.

Se realiza compactación mecanica de la vía que se realizo el corte a nivel carreteable.

Excavación mecanica para alcantarilla # 01. nivelación de encole y descole.

Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.
Se realiza mezclado y vaciado de solado en concreto pobre para encole de la alcantarilla # 01.
Se realiza intalación de material de la misma excavación sobre tuberia de 36" para dar trafico vehicular sobre el eje vial.
Se realiza vaciado de concreto e intalación de acero de refuerzo para dentellon del encole de la alcantarilla # 01.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 | CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025. CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.** CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: SABADO 25 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para obras (vibro mecanico, camion irigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria	2 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K3+300 al K3+400.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoria, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K3+300 al K3+400.**

Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.
Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo el corte a nivel carreteable.

Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

Se realiza instalación y amarrado de acero de refuerzo para placa de descole de alcantarilla # 01.
Se realiza encofrado y vaciado de concreto para dentellon del descole de alcantarilla #01.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: DOMINGO 26 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocatoi)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador)		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria	2 – 1					
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRA DIA DOMINICAL.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 | CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria	2 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K3+400 al K3+600.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K3+400 al K3+600.**

Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.
Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo el corte a nivel carreteable.

Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.
Se realiza instalación y amarrado de acero de refuerzo para placa aletas y muro de encole de alcantarilla # 01
Se realiza instalación y amarrado de acero de refuerzo para placa de descole de alcantarilla # 01.
Se realiza encofrado y vaciado de concreto para placa del descole de alcantarilla #01.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 — CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador	
Operadores De Maquinaria	2 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K3+600 al K3+800.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría. verificación del trazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K3+600 al K3+800.**

Se realizan actividades de (excavación mecanica) corte a nivel carreteable puntos criticos de la vía.
Se realiza compactación mecanica de la via que se realizo el corte a nivel carreteable.

Se realiza nivelación para excavación mecanica de alcantarilla # 04, seguidamente se hace control topografico de dicha exacavació.

Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

Se realiza instalación y amarrado de acero de refuerzo para placa aletas y muro de descole de alcantarilla # 01.
Se realiza instalación de formaleta en madera para aletas y muro de encole de la alcantarilla # 01.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
MP 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 | CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador	
Operadores De Maquinaria	2 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza trabajos topograficos en campo localización de eje de vía y hombros de terraplen a construir del **K3+800 al K3+900.**

Verificación de trabajos de campo personal de obra e interventoría, verificación del frazado puntos eje de vía y hombros de terraplen del **K3+800 al K3+900.**

Se realizan vaciado de solado en concreto pobre para nivel y soporte de tubería de 36" de alcantarilla # 04,
Se realiza instalación de tubería de 36" de alcantarilla # 04, esta instalación es supervisada por topografia.
Se realiza instalación de material de la misma excavación sobre tubería de 36" alcantarilla # 04 para dar trafico vehicular.
Se realiza vaciado de concreto para aletas y muros del encole de alcantarilla # 01.
Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

Se realiza instalación y amarrado de acero de refuerzo para placa aletas y muro de descole de alcantarilla # 01.
Se realiza instalación de formaleta en madera para aletas y muro de descole de alcantarilla # 01.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 — CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocalo)	1	LLUVIA FUERTE		X
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro hidraulico, camion irigador, finisher y vibro compactador		HORAS LLUVIA:		3,5
Operadores De Maquinaria	2 – 1					
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza vaciado de concreto para aletas y muros de descole de alcantarilla # 01.

Se realiza actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

Se realiza adecuación en material de la misma excavación para paso vehiculares sobre alcantarilla # 01 y alcantarilla # 04.

Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde loc cual imposibilitan la continuidad de actividades.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

2844

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion imgador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria	2 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	1 – 2 – 3		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	
NUBLADO SECO		X
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza actividades topograficas en ajustes de ejes de la vía proyectada.

Se realiza corte, figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

Se realiza adecuación en material de la misma excavación para paso vehiculares sobre alcantarilla # 01 y alcantarilla # 04.

Se realiza nueva conformación de vía en los sectores criticos afectados por lluvias, con el fin de mejorar transitabilidad vehicular del sector.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	-			

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO 04. Acta de conformación de veeduría del contrato de obra 204 del 2025. ("ya fue anexo en informe mensual 02"). Pero si Se anexa Resolución No. 026 del 03 de octubre de 2025 de la personería Municipal.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

PERSONERÍA
Municipal de Tame

300-0316

Tame, 03 de otubre de 2025

Señores
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

Asunto: INSCRIPCIÓN DE VEEDURÍA

Con el presente me permito informarles que mediante **Resolución No. 26** del tres de octubre de 2025 se inscribió veeduria ciudadana para el CONTRATO **DE OBRA PUBLICA No. 204 de 2025 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR – SAN JOAQUIN – PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

Quedando conformado por los siguientes veedores:

- **LEIDY TATIANA FORERO FUENMAYOR**
- **WALTER JEFFERSON SOTO CARVAJAL**
- **JOEL ONAN CRUZ NEIVA**

Se informa que se les deberá brindar toda la información necesaria para que puedan ejercer su labor de conformidad con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003.

Con toda atención,

Diana Granados

DIANA LICETHG GRANADOS RINCON
Personera Municipal

Patricia S

PERSONERÍA
Municipal de Tame

RESOLUCIÓN No. 026
03 de otubre de 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE OFICIALIZA EL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA, CÍVICA Y COMUNITARIA

La Personería Municipal de Tame, Arauca, en uso de sus atribuciones legales conferidas en la Ley 134 de 1994

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia establece como uno de los principios fundamentales la Democracia Participativa, con lo cual se legaliza que los colombianos deben tener un papel decisorio en la vida Política, Económica, Social y Cultural de la Nación.

Que para que los ciudadanos podamos ejercer soberanamente dicha potestad se crean diferentes mecanismos y espacios de participación ciudadana acogidos en la Carta Política y que ha sido desarrollada por diferentes leyes (Ley 134, 131 y 136) entre otras.

Que la comunidad por iniciativa propia se reunió el veintiocho de agosto de dos mil veinticinco y constituyó el comité de veeduría ciudadana para el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 204 de 2025 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR – SAN JOAQUIN – PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Oficialícese el Comité de Veeduría Comunitaria quedando conformado por las siguientes personas:

- **LEIDY TATIANA FORERO FUENMAYOR**
- **WALTER JEFFERSON SOTO CARVAJAL**
- **JOEL ONAN CRUZ NEIVA**

ARTICULO SEGUNDO: Ejercerán veedurías solo para el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 204 de 2025 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR – SAN JOAQUIN – PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

Tame, tres de octubre de dos mil veinticinco

Diana Granados

DIANA LICETH GRANADOS RINCON
Personera Municipal

Patricia S.

ANEXO 06. Planillas de seguridad social integral y nómina firmadas por el personal del periodo del 01 al 31 de octubre del 2025.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	834001423
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 9 N 20-12 BARRIO LAS AMERICAS	TELÉFONO:	8853133
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CORRECION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112747349	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	515120400		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 911.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.200	$ 0	$ 911.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
SUBTOTALES:										$ 1.366.800	$ 0	$ 1.366.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 228.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 342.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 136.600	$ 136.600	$ 0	$ 0	$ 136.600
SUBTOTALES:									$ 136.600	$ 0	$ 0	$ 136.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	6	$ 342.000	$ 0	$ 342.000
SUBTOTALES:			$ 342.000	$ 0	$ 342.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1090486149	MEDINA BARRERA JORGE ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																
2	CC 1116788745	RODRIGUEZ TUPANTEVE YENNY MILENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																
3	CC 52526857	TORRES NIÑO LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																
4	CC 53032258	MEDINA MOLINA CLAUDIA PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																
5	CC 96191205	MONTEALEGRE MADERO DIAGOBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																
6	CC 96194854	MEDINA MOLINA CARLOS CESAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 93.100	30	$ 1.423.500	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 2.187.400

2384

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947891	9	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANSALVADOR	CARRERA 9 # 20 - 12	ARAUCA-ARAUCA	3114815501	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494391655	9494391655	E	2025/11/25	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,083,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1120869476	ACHURY CRISTIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1116504316	ALMANZA RICARDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	91247775	BENAVIDES ELIBARDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	96194845	BOVELO ARISTOBULO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1118555596	CONTRERAS BELKIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	1121836072	FONSECA PABEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
7	CC	17546035	GIRALDO JESUS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
8	CC	1006456807	GONZALEZ CAMILO	X																	230301	16	$759,200	$121,500	EPS041	16	$759,200	$30,400	CCF67	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$4,000	16	$0	$0	SI	$186,300
9	CC	7062150	GORDILLO HUBER		X															X	230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF67	5	$302,950	$12,200	14-23	5	$237,250	$1,300	5	$0	$0	SI	$61,000
10	CC	96195067	GUTIERREZ JOSE		X															X	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF67	5	$263,250	$10,600	14-23	5	$237,250	$1,300	5	$0	$0	SI	$59,400
11	CC	17589020	LAYA PEDRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
12	CC	96195513	MELO ROBERTO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF67	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0	SI	$232,900
13	CC	1128388541	MENDIETA ERIKA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
14	CC	74347917	MORA VICTOR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
15	CC	52420745	NARANJO ALBA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
16	CC	1116785943	RAMIREZ CARLOS	X																	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF67	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0	SI	$128,200
17	CC	1090469003	RINCON JUAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
18	CC	1116778461	RIVAS FREDY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
19	CC	1075292	RODRIGUEZ JOSE	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF67	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$2,500	10	$0	$0	SI	$116,500
20	CC	74862000	RODRIGUEZ RENE		X															X	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF67	5	$263,250	$10,600	14-23	5	$237,250	$1,300	5	$0	$0	SI	$59,400
21	CC	1116854941	RUIZ DANNY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
22	CC	1026284946	SALGADO GLORIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total			Afiliados(22)																				$24,768,900	$3,964,000			$24,768,900	$991,800			$24,886,600	$996,700			$24,768,900	$130,700		$0	$0		$6,083,200

2350

2025/11/05 03:50 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947891	9	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANSALVADOR	CARRERA 9 # 20 - 12	ARAUCA-ARAUCA	3114815501	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494391655	9494391655	E	2025/11/25	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,083,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$3,964,000	$0	$0	$3,964,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$843,000	$0	$0	$843,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,893,200	$0	$0	$2,893,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$130,700	$0	$0	$130,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	22	$130,700	$0	$0	$130,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$996,700	$0	$0	$996,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	22	$996,700	$0	$0	$996,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$991,800	$0	$0	$991,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$247,000	$0	$0	$247,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$288,800	$0	$0	$288,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$342,000	$0	$0	$342,000
TOTAL				22	$6,083,200	$0	$0	$6,083,200

2025/11/05 03:50 PM

1282

ANEXO 07. informe mensual 03 de seguridad y salud en el trabajo del periodo del 01 al 31 de octubre de 2025.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ANEXO 12. Informe mensual Ambiental 03 del contrato de obra 204 del 2025 en el periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

INFORME DE AVANCE PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA No.3

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR – SAN JOAQUIN, PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

PRESENTADO POR:

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA

ELABORADO POR:

PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA
ING. AMBIENTAL / ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MP. 25238-244492 CND

PRESENTADO A:

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
R/L EDWIN MAURICIO RONCON ROZO

ARAUCA
2025

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN....6
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....7
1.1 UBICACIÓN....7
2. GENERALIDADES....7
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS....8
3.1 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL....8
3.1.1 PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO....9
SUBPROGRAMA 1: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL....9
IDENTIFICACIÓN: DAGA– 1.1– 01....9
SUBPROGRAMA 2: CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA....13
IDENTIFICACIÓN: DAGA– 1.2– 02....13
SUBPROGRAMA 3: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES....16
IDENTIFICACIÓN: DAGA– 1.3– 03....16
3.1.2 PROGRAMA 2. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN....19
SUBPROGRAMA 1: MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN....19
IDENTIFICACIÓN: PAC– 2.1– 04....19
SUBPROGRAMA 3: SEÑALIZACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES....22
IDENTIFICACIÓN: PAC– 2.3-06....22
SUBPROGRAMA 4: MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS....25
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS....25
IDENTIFICACIÓN: PAC-2.4-07....25
SUBPROGRAMA 5: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES....27
IDENTIFICACIÓN: PAC– 2.5-08....27
3.1.3 PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO....31

SUBPROGRAMA 5: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES.....31

IDENTIFICACIÓN: PGH– 3.1-10.....31

3.1.4. PROGRAMA 4. DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 34

SUBPROGRAMA 1: INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO. 34

IDENTIFICACIÓN: PAC-2.2-05 34

SUBPROGRAMA 3: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.....37

IDENTIFICACIÓN: PMIT– 5.3– 20 37

SUBPROGRAMA 1: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL. 45

IDENTIFICACIÓN: PDL– 6.1– 21 45

3.1.5. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL.....49

SUBPROGRAMA 6.1: ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.....49

IDENTIFICACIÓN: PGS– 6.1– 21 49

SUBPROGRAMA 6.2: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.....52

IDENTIFICACIÓN: PGS– 6.2– 22 52

4. CONCLUSIONES.....54

Lista de ilustraciones

Ilustración 1. Ubicación del proyecto.....7

Lista de tablas

Tabla 1. Generalidades del proyecto.....8

Lista de fotografías

Fotografía 2. Señalización, demarcación y seguridad en general en los frentes de obra. 11
Fotografía 3. Capacitación al personal. 15
Fotografía 4. Manejo integral de materiales de construcción. 20
Fotografía 5. Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra.....23
Fotografía 6. Actividades de obra. 26
Fotografía 7. Puntos ecológicos. 28
Fotografía 8. Jornadas de limpieza baño portátil. 29
Fotografía 9. Captación del recurso hídrico. 32
Fotografía 10. Sitio de acopio. 35
Fotografía 11. Equipos de emergencia. 36
Fotografía 12. Información SST. 36
Fotografía 13. Maquinaria – Excavadora Oruga. 38
Fotografía 14. Maquinaria – Buldozer. 39
Fotografía 15. Maquinaria – Carro tanque de agua. 39
Fotografía 16. Maquinaria – Vibrocompactador. 40
Fotografía 17. Maquinaria – Motoniveladora. 40
Fotografía 18. Maquinaria – Compactador neumatico. 41
Fotografía 19. Maquinaria – Camión irrigador y compresor. 41
Fotografía 20. Maquinaria – Finisher. 42
Fotografía 21. Maquinaria – Vibrocompactador doble rodillo. 42
Fotografía 22. Maquinaria – Mezcladora de concreto. 43
Fotografía 23. Maquinaria – Vibro de concreto. 43
Fotografía 24. Fichas técnicas de maquinaria. 44
Fotografía 25. Kit para derrames. 44
Fotografía 26. Entrega de dotación y EPP´S. 47
Fotografía 27. Visita de ENELAR E.S.P. 50
Fotografía 28. Punto de atención a la comunidad. 51

Lista de Anexos

Anexo 1. Lista de asistencia capacitación e inducción ambiental. 10
Anexo 2. Lista de asistencia – Capacitaciones ambientales 14

Anexo 3. Lista de asistencia – Capacitaciones en SST.....14
Anexo 4. Formato de seguimiento al manejo de los residuos sólidos. 28
Anexo 5. Bitácora de agua – Octubre. 32
Anexo 6. Lista de asistencia entrega de dotación y EPP´S.....47

INTRODUCCIÓN

El presente informe expone las consideraciones ambientales relacionadas con la ejecución de actividades constructivas, las cuales generan impactos sobre los componentes abióticos, bióticos y sociales del entorno. Estos impactos deben ser debidamente prevenidos, mitigados o compensados mediante la aplicación de medidas de manejo ambiental, con el objetivo de asegurar una adecuada compatibilidad entre el desarrollo del proyecto y el entorno natural y social, en concordancia con la normatividad ambiental vigente en Colombia.

En este contexto, el manejo ambiental propuesto ha sido estructurado conforme a los lineamientos establecidos en la normativa aplicable, en particular la *Guía de Manejo Ambiental para Proyectos de Infraestructura – Modo Carreteable*, adoptada mediante la Resolución No. 2335 del 7 de julio de 2022, emitida por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta guía establece un enfoque integral por componente (abiótico, biótico y socioeconómico), ajustado a la magnitud, características específicas del proyecto y condiciones del área de intervención.

Cada uno de los programas de manejo ambiental incluidos en este informe contiene un conjunto de medidas dirigidas al control y adecuada gestión de los componentes ambientales (agua, aire, suelo), así como del componente social. En este sentido, el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) diseñado para este proyecto, clasificado con un nivel de complejidad de intervención medio – bajo, busca fomentar una participación activa de todos los actores involucrados, promoviendo la conservación del entorno y una interacción constructiva con las comunidades del área de influencia directa.

Asimismo, el informe detalla estrategias como la vinculación de mano de obra no calificada local y el establecimiento de mecanismos participativos, que permiten fortalecer el compromiso colectivo hacia la protección socioambiental. De esta manera, se promueve el control social, la transparencia en la ejecución del proyecto y la legitimidad de las acciones desarrolladas, todo ello enmarcado en los lineamientos del programa de gestión social implementado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de la vía terciaria que conecta las veredas San Salvador, San Joaquín y Puerto Gaitán del municipio de Tame, mediante pavimento flexible de aproximadamente 3.9 km, en el cual se efectuará un realce con material de la región de 40 cm de espesor, 20 cm de espesor de crudo tamaño máximo de 4 pulgadas, 17 cm de espesor de subbase granular, 11 cm de espesor de base granular y 8 cm de espesor de concreto asfaltico tipo MDC-19. Lo anterior, con el fin de garantizar la vida útil proyectada de la vía de 20 años futuros.

1.1 UBICACIÓN

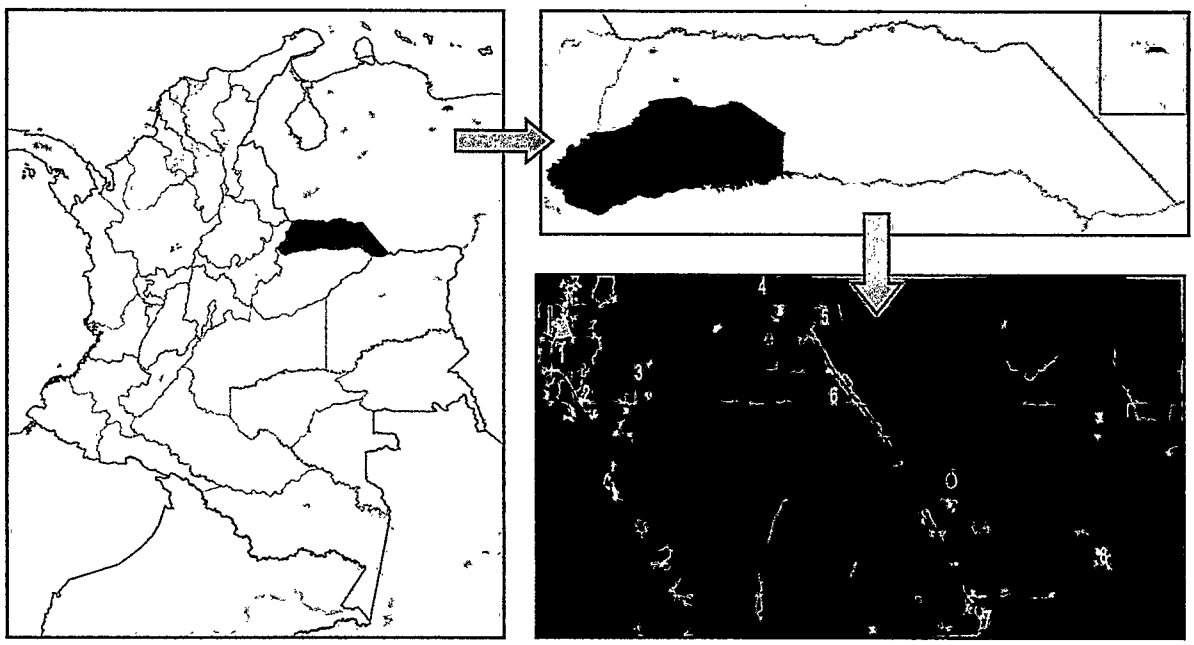


Ilustración 1. Ubicación del proyecto.

Fuente: Google Earth Pro, 2024 – Plan de Adaptación de la Guía Ambiental del proyecto.

2. GENERALIDADES

A continuación, en la tabla 1, se evidencia las principales generalidades del proyecto.

Tabla 1. Generalidades del proyecto.

CONTRATO DE OBRA No.	204 DE 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR – SAN JOAQUIN – PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME
NIT	800.102.801-3
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
IDENTIFICACIÓN:	901.947.891-9
REPRESENTANTE	CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
VALOR:	$ 11.106.664.743,04
PLAZO:	DIEZ (10) MESES
DEPARTAMENTO:	ARAUCA
MUNICIPIO:	TAME

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

El presente informe tiene por objeto documentar de manera detallada los avances alcanzados en la ejecución del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) durante el periodo de referencia, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y disposiciones normativas vigentes. A continuación, se describen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, en concordancia con los cronogramas establecidos, los lineamientos técnicos definidos y las especificaciones previstas en el plan, asegurando el seguimiento y control de las metas programadas.

3.1 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL

A continuación, se presentan de manera detallada los avances alcanzados en cada uno de los programas que integran el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), describiendo el estado de ejecución de las actividades previstas en cada subprograma que los conforma y su cumplimiento con las metas establecidas.

3.1.1 PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO.

SUBPROGRAMA 1: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.			**IDENTIFICACIÓN: DAGA– 1.1– 01**
OBJETIVO DEL PROYECTO: Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía ambiental - PAGA.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación:	**Prevención:** (X)	**Corrección:** (X)	**Compensación:**
IMPACTOS A MANEJAR: ✓ Incremento de la oferta de empleo ✓ Generación de conflictos entre la institución, empresa y comunidad			
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	**X**	**ALTA**	

ACCIONES EJECUTADAS:

La gestión socioambiental del proyecto continúa siendo liderada de manera efectiva por el profesional ambiental asignado, quien ha mantenido la implementación de las políticas y lineamientos establecidos conforme a los requerimientos del INVIAS y a lo dispuesto en la Guía Ambiental – PAGA. Durante este periodo, se ha dado continuidad al cumplimiento de los compromisos y obligaciones socioambientales, garantizando una atención oportuna a las quejas, peticiones e inquietudes presentadas por las comunidades, así como por los entes públicos, privados y ambientales vinculados al área de influencia del proyecto.

Asimismo, se ha mantenido la señalización en los frentes de obra de manera adecuada, garantizando su permanencia y visibilidad conforme a los lineamientos técnicos y normativos establecidos. De igual forma, el Grupo de Gestión Ambiental de la obra, creado con el objetivo de velar y hacer seguimiento a los componentes ambientales requeridos durante la ejecución del proyecto, permanece vigente y continúa desarrollando sus funciones. La conformación del grupo se mantiene de la siguiente manera:

NOMBRES	CEDULA	CARGO
GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	1128388541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST
LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA

Nota: El acta de conformación del grupo de gestión ambiental, se encuentra en el ***anexo 1*** del informe No.1 del presente proyecto.

Anexo 1. Lista de asistencia capacitación e inducción ambiental.









Fotografía 1. Señalización, demarcación y seguridad en general en los frentes de obra.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN											
N°	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Garantizar el cumplimiento de cada uno de los programas de manejo ambiental propuestos en el PAGA.	☑	☑	☑							
2	Brindar capacitación e inducción ambiental a todos los trabajadores.	☑		☑							
3	Garantizar el cumplimiento de todos los programas de gestión social que conforman el PAGA	☑	☑	☑							
4	Dar respuesta a todas las quejas, inquietudes y/o reclamos de la comunidad dando la solución pertinente	☑	☑	☑							
5	Mantener la señalización, demarcación y seguridad en general en los frentes de obra.	☑	☑	☑							
6	Presentación de los informes establecidos, indicando el avance del cumplimiento de cada uno de los programas que conforman el PAGA, con los registros correspondientes para aprobación de la Interventoría.	☑	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Registro de Cumplimiento
Número de programas ejecutados / Número de programas previsto	Ejecutar el 100% de los programas ambientales que aplican según el PAGA.	Cuantitativo	Mensual	Actas de comités socio ambientales realizados
RESULTADO INDICADOR 1				
Indicador: 5/5		% CUMPLIMIENTO: 100%		
Número de obligaciones cumplidas durante el periodo / Número de obligaciones que debe cumplir en el periodo	Cumplir con el 100% de las obligaciones previstas para cada profesional.	Cuantitativo	Mensual	Informes de Cumplimiento Ambiental
RESULTADO INDICADOR 2				
Indicador: 5/5		% CUMPLIMIENTO: 100%		

COSTOS DE EJECUCIÓN	
ACCIONES	COSTOS
Conformación del equipo de trabajo	**Costo 1.** El costo del profesional Ingeniero Residente Ambiental tiene un valor unitario mensual de $3.300.000 Valor total por los 10 meses de ejecución con una dedicación del 100% es de $ 33.000.000

COSTO TOTAL: $33.000.000

SUBPROGRAMA 2: CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA.			**IDENTIFICACIÓN: DAGA– 1.2– 02**
OBJETIVO DEL PROYECTO: Capacitar a todo el personal de la obra en temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación:	**Prevención:** (X)	**Corrección:** (X)	**Compensación:**
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	**X**	**ALTA**	

IMPACTOS A MANEJAR:

- ✓ Generación de conflictos entre la institución, empresa y comunidad
- ✓ Incremento de la oferta de empleo
- ✓ Generación de expectativas a la comunidad
- ✓ Desorientación de las aves
- ✓ Desplazamiento de fauna
- ✓ Incremento de la disposición de residuos sólidos ordinarios

ACCIONES EJECUTADAS:

Durante el periodo reportado, se desarrolló la charla mensual de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental (PAGA), en la cual se abordaron temáticas relacionadas con los componentes ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y social, en el marco del desarrollo del proyecto.

Como parte de la jornada, se socializaron los avances obtenidos, las medidas implementadas y las oportunidades de mejora identificadas en cada uno de los componentes, fortaleciendo la participación activa del personal y fomentando la adopción de buenas prácticas orientadas al cumplimiento de los objetivos ambientales y de seguridad durante la ejecución de las actividades de obra.


- ➢ Las capacitaciones realizadas en el componente ambiental durante el presente periodo fueron las siguientes:

- Identificación de amenazas ambientales.
- Gestión del riesgo ambiental.
- Sensibilización sobre el cambio climático.

- Las capacitaciones realizadas en el componente SST durante el presente periodo fueron las siguientes:

- Cultura de autocuidado y responsabilidad compartida.
- Prevención y mitigación de riesgos laborales.
- Conceptos básicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo laboral.
- Identificación de peligros.

Anexo 2. Lista de asistencia – Capacitaciones ambientales
Anexo 3. Lista de asistencia – Capacitaciones en SST.

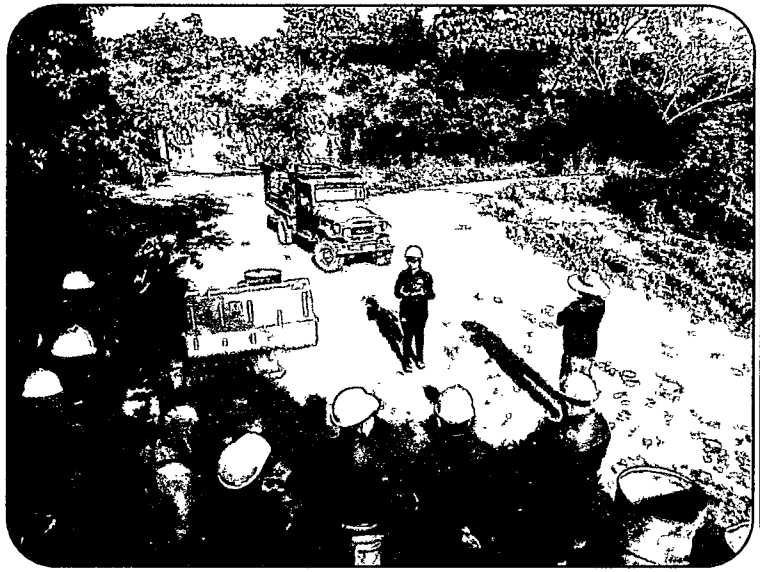





Fotografía 2. Capacitación al personal.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ejecutar inducción a todo el personal, explicando las políticas ambientales, seguridad y salud en el trabajo	☑									
2	Realizar simulacros para atención de primeros auxilios en caso de emergencias durante el desarrollo del proyecto.	☑									
3	Efectuar charlas con el fin de explicar los temas de riesgo (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) que se presentan en la ejecución de proyectos viales.	☑		☑							
4	Desarrollar una charla al mes sobre el seguimiento del PAGA en los temas de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y temas sociales.	☑	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Registro de Cumplimiento
Número de programas ejecutados / Número de programas previsto.	Ejecutar el 100% de los programas ambientales que aplican según el PAGA.	Cuantitativo	Mensual	Actas de comités socio ambientales realizados

RESULTADO INDICADOR 1				
Indicador: 5/5		% CUMPLIMIENTO: 100%		
Número de obligaciones cumplidas durante el periodo / Número de obligaciones que debe cumplir en el periodo	Cumplir con el 100% de las obligaciones previstas para cada profesional.	Cuantitativo	Mensual	Informes de Cumplimiento Ambiental
RESULTADO INDICADOR 2				
Indicador: 1/1		% CUMPLIMIENTO: 100%		

COSTOS DE EJECUCIÓN	
ACCIONES	**COSTOS**
Inducción a trabajadores antes de iniciar labores del proyecto Charlas de sensibilización	**Costo 1.** Tablero acrílico de 1,5 x 2m para ayuda didáctica x 1 und = $400.000 **Costo 2.** el costo del profesional competente, ingeniero ambiental residente o especialista ambiental se encuentra incluido dentro el presupuesto oficial.
COSTO TOTAL: $400.000	

SUBPROGRAMA 3: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.			**IDENTIFICACIÓN: DAGA– 1.3– 03**
OBJETIVO DEL PROYECTO: Contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto. Cumplir con la normatividad vigente, en relación con los mecanismos de participación, control social, consultas previas, respuesta a los derechos de petición y las solicitudes de información, entre otras.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación: (X)	**Prevención:** (X)	**Corrección:** (X)	**Compensación:** (X)
IMPACTOS A MANEJAR: ✓ Disminución de la oferta del recurso hídrico ✓ Mejora de las vías			
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	**X**	**ALTA**	

ACCIONES EJECUTADAS:

Durante el desarrollo del proyecto, se continuó con la verificación y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo de otorgamiento emitido por la Autoridad Ambiental, en lo referente al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para las actividades constructivas. Asimismo, se mantuvo el control permanente sobre los proveedores de material granular, asegurando que contaran con los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y de los lineamientos establecidos para el proyecto.

Permisos adquiridos:

- Permiso de ocupación de cauce.
- Permiso de concesión de aguas superficiales.

En el periodo reportado, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso de concesión de aguas superficiales, se continuó con el registro en la bitácora de control de agua, considerando la extracción correspondiente del recurso hídrico. Esta bitácora tiene como finalidad llevar un seguimiento detallado del volumen de agua consumido durante el periodo evaluado, asegurando el cumplimiento del caudal máximo autorizado en el mencionado permiso.

RECURSO NATURAL A AFECTAR: Agua, Suelo	**TIPO DE PERMISO:** Concesión de aguas superficiales, concesión de aguas superficiales	**ENTIDAD QUE LO OTORGA:** Corporinoquia
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Verificar y cumplir con las obligaciones relacionadas en el acto administrativo de otorgamiento de la Autoridad ambiental por el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales con relación a las actividades constructivas del proyecto.	☑	☑	☑							
2	Verificar que los proveedores de material granular cuenten con los correspondientes permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad y anexar copia de los permisos correspondientes (*aplica en los meses en que se efectúe la compra de los materiales en mención)	☑	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame				
Indicador	**Descripción del indicador**	**Tipo de indicador**	**Periocidad de Evaluación**	**Indicador**

Número de permisos ambientales requeridos y tramitados / Número de permisos ambientales otorgados	Al inicio del proyecto se debe contar con el permiso ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental.	Cuantitativo	Una sola vez	Número de permisos ambientales requeridos y tramitados / Número de permisos ambientales otorgados
RESULTADO INDICADOR				
Indicador: 2/2		% CUMPLIMIENTO: 100%		
COSTOS DE EJECUCIÓN				
ACCIONES		**COSTOS**		
1. Verificación de los requisitos legales Permisos 2. Permisos		**Costo 1.** el costo del profesional competente, ingeniero ambiental residente o especialista ambiental se encuentra incluido dentro el presupuesto oficial. **Costo 2.** Se encuentra incluido dentro del presupuesto de permisos ambientales.		

3.1.2 PROGRAMA 2. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.


SUBPROGRAMA 1: MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			**IDENTIFICACIÓN: PAC– 2.1– 04**
OBJETIVO DEL PROYECTO: Prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales directos, indirectos, sinérgicos y acumulativos asociados al manejo de los materiales de construcción en los sitios de influencia directa de las obras y centros de acopio.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación: (X)	**Prevención:** (X)	**Corrección:**	**Compensación:**
IMPACTOS A MANEJAR: ✓ Incremento del polvo ✓ Incremento del material particulado ✓ Cambio en los niveles de ruido ✓ Incremento de la presión sonora ✓ Cambio en la percepción de la calidad visual del paisaje			
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	**X**	**ALTA**	

ACCIONES EJECUTADAS:

Durante el presente periodo, se continúa llevando a cabo la disposición del material granular seleccionado sobre los frentes de obra, garantizando que únicamente se ubique el volumen necesario para una o dos jornadas laborales, de acuerdo con la programación establecida. Este procedimiento se realiza con el fin de optimizar el manejo de materiales, minimizar impactos sobre el entorno y mantener el orden en las zonas de trabajo.

El material dispuesto se conserva debidamente cubierto, demarcado y señalizado conforme a las medidas preventivas definidas, asegurando la prevención de dispersión por efecto del viento, escorrentías superficiales o tránsito de maquinaria. Asimismo, se verifica de manera constante el estado del material y de las áreas de almacenamiento, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, limpieza y control ambiental.

De igual forma, se ha evidenciado que el material granular se utiliza de manera progresiva y planificada, en función del avance de las actividades constructivas, evitando acumulaciones innecesarias y asegurando el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles.

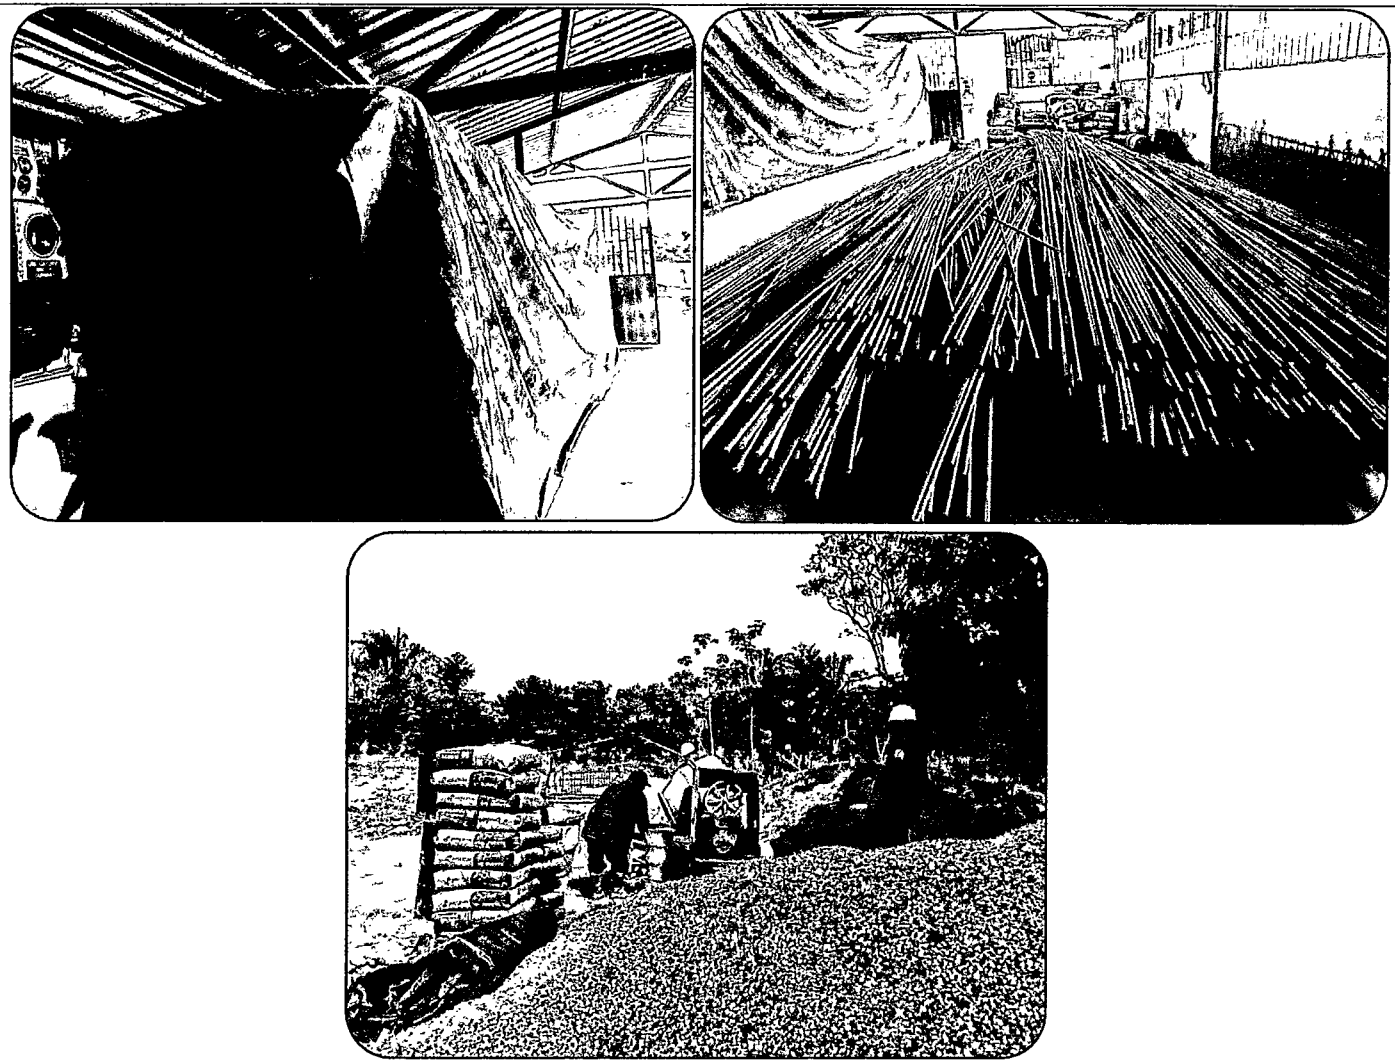

Fotografía 3. Manejo integral de materiales de construcción.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ubicar en los frentes de obra sólo el volumen de material requerido para una o dos jornadas laborales, el cual deberá ser cubierto, demarcado y señalizado	☑	☑	☑							
2	Garantizar el adecuado manejo de los materiales requeridos para la obra, para lo cual se establecerán programas de sensibilización ambiental mediante capacitaciones al personal vinculado.	☑		☑							
3	Cuando las condiciones climáticas lo exijan, el contratista debe hacer riego permanente sobre las áreas desprovistas de acabados con el objeto de prevenir las emisiones de material particulado a la atmósfera. La frecuencia del riego debe ser acordado con la Interventoría.	☑	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Registro de cumplimiento
Número de señalización requerida necesaria para la ejecución del proyecto / Reducción en la accidentalidad	Cumplir con el 100% de las acciones propuestas en este proyecto	Cuantitativo	Mensual	Registro fotográfico

RESULTADO INDICADOR

Indicador: 50/50	% CUMPLIMIENTO: 100%

COSTOS DE EJECUCIÓN

ACCIONES	COSTOS
1. Manejo integral de materiales de construcción	**Costo 1.** Carpa de alta densidad para protección de materiales, evitando corrosión, 50 m2, $600.000 **Costo 2.** Poli sombra de señalización para cerramiento de materiales, 3 rollos x $233.800 = $701.400 **Costo 2.** El costo del transporte de materiales por frente de trabajo está incluido en los costos de construcción del proyecto.
COSTO TOTAL: $1.301.400	

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

2874

SUBPROGRAMA 3: SEÑALIZACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.			**IDENTIFICACIÓN: PAC– 2.3-06**
OBJETIVO DEL PROYECTO: Incluir en el desarrollo del proyecto medidas para la prevención, reducción y/o mitigación del impacto de los accidentes asociados al tránsito, mediante la implementación de medidas de seguridad vial; junto con el uso de medidas durante la ejecución de, que vinculen al personal de obra al acceso de movilidad segura.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación: (X)	**Prevención:** (X)	**Corrección:** (X)	**Compensación:**
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	**X**	**ALTA**	

IMPACTOS A MANEJAR:

- ✓ Alteración del flujo vehicular.
- ✓ Generación de accidentes viales.
- ✓ Cambio en los tiempos de desplazamiento.

ACCIONES EJECUTADAS:

Durante este mes, se continúa garantizando el adecuado desarrollo de las actividades de mantenimiento, demarcación y señalización en los frentes de obra, evidenciando la continuidad en el buen manejo de la señalización implementada. Estas acciones se realizan en cumplimiento de lo establecido en el presente programa y en coordinación con el responsable del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las actividades ejecutadas comprenden:

- La instalación del cerramiento perimetral en las áreas de trabajo mediante cinta de demarcación y/o malla sintética, delimitando de manera segura las zonas de intervención.
- La fijación de avisos preventivos e informativos que comunican las actividades en ejecución y advierten sobre el acceso restringido a las áreas de trabajo.
- La correcta ubicación y acordonamiento de los materiales de construcción dentro de las zonas señalizadas, evitando interferencias con el tránsito vehicular y peatonal.
- La instalación de señalización de seguridad (prohibición, obligación, prevención e información) en las instalaciones temporales y en el campamento, conforme a la normativa vigente en cuanto a forma, color, contraste y texto.



Fotografía 4. Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Instalación de señalación de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información en los frentes de trabajo, instalaciones temporales y campamentos	☑	☑	☑							
2	Realizar seguimiento a la señalización conforme a lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental.	☑	☑	☑							
3	Adecuar la señalización preventiva, informativa de obligación y de prohibición que se deteriore durante la ejecución de la obra.	☑	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periodicidad de Evaluación	Indicador
Número de instalaciones temporales en la obra señalizadas / Número de instalaciones señalizadas en la obra	Cumplir con el 100% de las acciones propuestas en este proyecto	Cuantitativo	Mensual	✓ Informe de cumplimiento ✓ Registro fotográfico

RESULTADO INDICADOR

Indicador: 1/1	% CUMPLIMIENTO: 100%

COSTOS DE EJECUCIÓN

ACCIONES	COSTOS
1. Manejo integral de materiales de construcción	Costo 1. Señalización de frentes de obra (reglamentarias, obligatorias, informativas, productos químicos). 50 unidades x 20.000 = $1.000.000 Costo 2. Cinta adhesiva doble faz UND (5m x 19mm) 10 unidades x $7.200 = $72.000 Costo 3. Cinta de peligro para demarcación x 500mt =5 und = $500.000
COSTO TOTAL: $1.572.000	


297

SUBPROGRAMA 4: MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS.			**IDENTIFICACIÓN: PAC-2.4-07**
OBJETIVO DEL PROYECTO: Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los escombros provenientes del proyecto. Realizar un programa de seguimiento al manejo y disposición de escombros y lodos, con el fin de identificar la alteración de la calidad medioambiental durante la construcción del proyecto.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación:	**Prevención:** (X)	**Corrección:** (X)	**Compensación:**
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	**X**	**ALTA**	
IMPACTOS A MANEJAR: ✓ Todos los impactos identificados en este volumen.			

ACCIONES EJECUTADAS:

Durante el periodo reportado, se continúa dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en materia de manejo ambiental. No obstante, es importante señalar que en este lapso no se han generado residuos de construcción y demolición (RCD). En cuanto a los materiales provenientes de las actividades de excavación, estos han sido aprovechados como material de relleno en la vía intervenida, contribuyendo al mejoramiento de la superficie y evitando la generación de residuos adicionales.



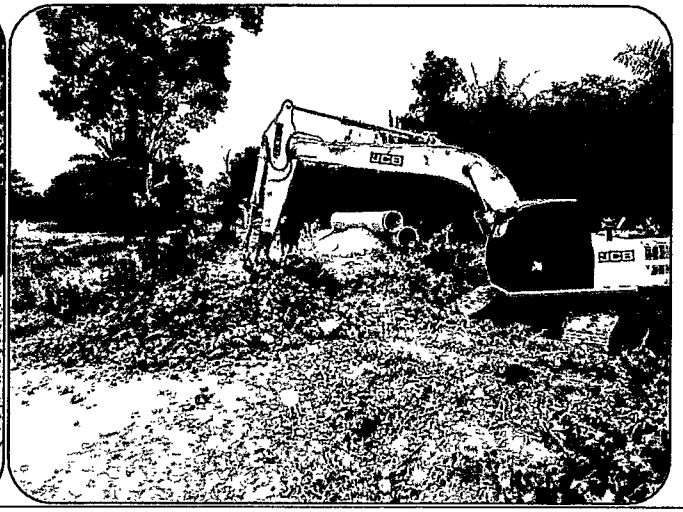

Fotografía 5. Actividades de obra.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Seguimiento del material que se transporte al área de disposición final Verificar el adecuado y oportuno cumplimiento de las acciones propuestas en el programa de desarrollo y aplicación de la gestión social ficha PAC – 2.4 – 07	☑	☑	☑							
2	Seguimiento y verificación de la correcta disposición de los materiales sobrantes durante la etapa de construcción	☑	☑	☑							
3	Cumplimiento de los requerimientos hechos por las distintas autoridades, tanto ambientales como el INVIAS	☑	☑	☑							
4	Seguimiento a la reutilización de los materiales de excavación	☑	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Indicador
AM = (Lugares Almacenamiento adecuados utilizados / total lugares almacenamiento utilizados) x100	Cumplir con el 100% de las acciones propuestas en este proyecto	Cuantitativo	Mensual	✓ Informe de cumplimiento ✓ Registro fotográfico

RESULTADO INDICADOR

Indicador: 1/1	% CUMPLIMIENTO: 100%

COSTOS DE EJECUCIÓN

ACCIONES	COSTOS
Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	Costo 1. El costo del transporte de los materiales de construcción está contemplado en los APU del proyecto.

SUBPROGRAMA 5: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.			**IDENTIFICACIÓN: PAC– 2.5-08**
OBJETIVO DEL PROYECTO: Establecer los lineamientos básicos para la gestión integral de residuos sólidos y especiales generados en las actividades de proyecto y de esta forma prevenir incidentes, enfermedades profesionales, minimizar impactos ambientales y garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación: (X)	**Prevención:** (X)	**Corrección:**	**Compensación:**
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	X	**ALTA**	

IMPACTOS A MANEJAR:

- ✓ Incremento de la disposición de residuos sólidos ordinarios.
- ✓ Disminución de la oferta del recurso hídrico.

ACCIONES EJECUTADAS:

Durante el periodo reportado, se continúa con la implementación de las medidas establecidas para el manejo adecuado de los residuos sólidos generados en el desarrollo del proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental y la normativa vigente. Estas acciones buscan minimizar los impactos negativos sobre el entorno, promover buenas prácticas ambientales y garantizar el cumplimiento de los principios de prevención, reducción y aprovechamiento de los residuos.

En este sentido, permanecen disponibles en el sitio de obra dos puntos ecológicos debidamente identificados, conformados por canecas de colores destinadas a la correcta clasificación y separación de los residuos según su tipología, conforme a lo establecido en la Resolución 2184 de 2019. Dichos puntos son objeto de verificación periódica con el fin de asegurar su adecuada utilización, limpieza y mantenimiento. De igual forma, se cuenta con un área específica para el almacenamiento temporal de los residuos, la cual cumple con las condiciones técnicas de seguridad, ventilación y protección exigidas por la normativa ambiental vigente.



Fotografía 6. Puntos ecológicos.

Anexo 4. Formato de seguimiento al manejo de los residuos sólidos.

En cuanto a los residuos especiales, como los líquidos originados por el uso de los baños portátiles, la empresa prestadora del servicio ha continuado realizando la limpieza y el vaciado de estos baños dos veces por semana. Esta frecuencia se ha mantenido, garantizando una adecuada gestión de los residuos sanitarios y previniendo riesgos para la salud y el medio ambiente. Asimismo, se ha asegurado el buen estado y funcionamiento de los baños, lo cual ha sido fundamental para conservar condiciones higiénicas óptimas en la prestación del servicio al personal de campo.



Fotografía 7. Jornadas de limpieza baño portátil.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Instalación de puntos ecológicos para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos.	☑									
2	Capacitar a los trabajadores de la obra sobre la identificación, clasificación y almacenamiento temporal de los residuos sólidos.	☑									
3	Seguimiento al manejo de los residuos sólidos en la obra.	☑	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Indicador
Volumen de residuos sólidos convencionales dispuestos/ Volumen de residuos sólidos convencionales generados	Cumplir con el 100% de las acciones propuestas en este proyecto	Cuantitativo	Mensual	✓ Planillas de registro de volumen de residuos sólidos convencionales. ✓ Registro fotográfico.


RESULTADO INDICADOR

2882

Indicador: 19,5 Kg / 19,5 Kg	% CUMPLIMIENTO: 100%
COSTOS DE EJECUCIÓN	
ACCIONES	**COSTOS**
1. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	Costo 1. Suministro e instalación de caneca metálica de 55 galones para la clasificación de materiales reciclables y no reciclables. 2 unidades x $260.000 = $520.000
COSTO TOTAL: $520.000	

3.1.3 PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO.

SUBPROGRAMA 5: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES.			**IDENTIFICACIÓN: PGH– 3.1-10**
OBJETIVO DEL PROYECTO: Realizar un manejo adecuado de los recursos hídricos aprovechados por el proyecto, en relación con las normas vigentes para la captación, transporte y uso del agua. Desarrollar las medidas de manejo que garanticen el adecuado manejo de la concesión de aguas superficiales autorizada.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación: (X)	**Prevención:** (X)	**Corrección:** (X)	**Compensación:**
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	X	**ALTA**	
IMPACTOS A MANEJAR: ✓ Disminución de la oferta del recurso hídrico.			
ACCIONES EJECUTADAS: Durante el periodo reportado, se llevó a cabo la captación directa del recurso hídrico para el desarrollo de las labores del proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). Esta captación se realizó directamente del río Casanare mediante una manguera plástica de ½", utilizando una motobomba de 1 caballo de fuerza, la cual fue revisada previamente para garantizar su adecuado funcionamiento y el manejo correcto de aceite y combustible. Para el proceso se empleó una boquilla de succión y descarga de ½", asegurando un uso eficiente y controlado del recurso hídrico. Durante el periodo reportado, se realizó la captación de un volumen total de 24000 litros de recurso hídrico. Teniendo en cuenta que el caudal concesionado para el proyecto es de 0.2141 L/s, se destaca que las actividades de captación se efectuaron en estricto cumplimiento del permiso otorgado, sin superar en ningún momento el valor autorizado, garantizando así el uso racional y responsable del recurso hídrico. Asimismo, se implementaron las medidas de control asociadas, entre ellas la prohibición de disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua, la restricción del lavado de maquinaria y equipos en cursos hídricos, y el control riguroso de posibles vertimientos de lubricantes o hidrocarburos. Estas acciones permitieron prevenir impactos negativos sobre los recursos naturales y asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en coordinación con la Interventoría y las autoridades competentes.			

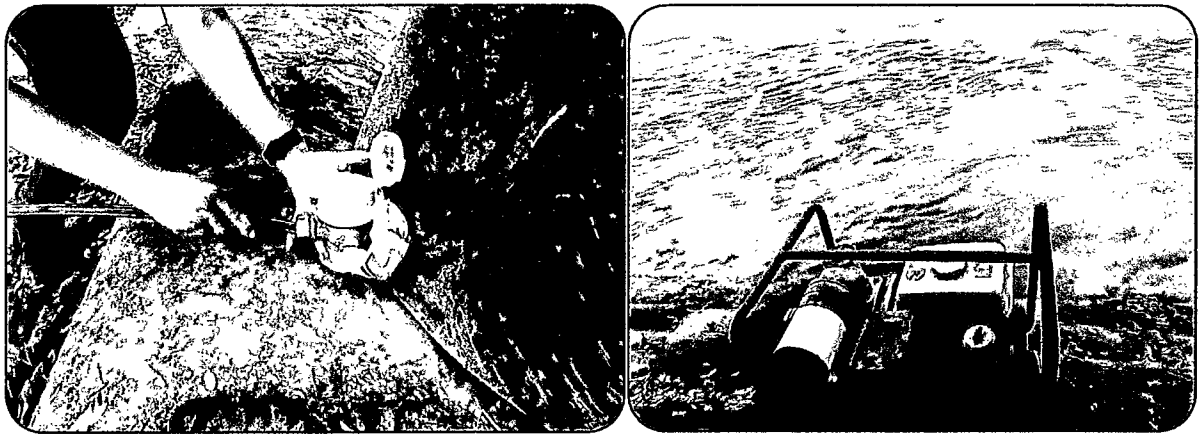

Fotografía 8. Captación del recurso hídrico.

Anexo 5. Bitácora de agua – Octubre.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Captación directa del recurso agua para el desarrollo de las actividades inherentes del proyecto	N/A	☑	☑							
2	No permitir la disposición de residuos sólidos en la corriente hídrica	N/A	☑	☑							
3	Prohibir el lavado de la maquinaria y equipo en los cursos de agua, para evitar el derrame de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de estos.	N/A	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Indicador
Caudal concesionado de la fuente hídrica/Caudal diario captado para la obra	Cumplir con el 100% de las acciones propuestas en este proyecto	Cuantitativo	Mensual	✓ Registro diario de bitácora de caudal captado. ✓ Informe de cumplimiento ambiental. ✓ Registro fotográfico. .

RESULTADO INDICADOR	
Indicador: 0,2141 l/s / 0.0116 L/s	% CUMPLIMIENTO: 100%
COSTOS DE EJECUCIÓN	
ACCIONES	**COSTOS**
1. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	Costo 1. Manguera de riego (1", Cal 40 x 100 m). 1 unid x $200.000 = $200.000
COSTO TOTAL: $200.000	

150
2886

3.1.4. PROGRAMA 4. DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

SUBPROGRAMA 1: INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO.			**IDENTIFICACIÓN: PAC-2.2-05**
OBJETIVO DEL PROYECTO: Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación: (X)	**Prevención:** (X)	**Corrección:** (X)	**Compensación:**
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	X	**ALTA**	

IMPACTOS A MANEJAR:

- ✓ Alteración de la morfología.
- ✓ Activación o generación de procesos erosivos o de generación de movimientos.
- ✓ Pérdida de suelo.
- ✓ Cambios en la calidad de los suelos.
- ✓ Alteración del uso actual.
- ✓ Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje.

ACCIONES EJECUTADAS:

Con el fin de garantizar la correcta implementación y operación en los frentes de obra se continúa dando el cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y en el presente programa, se llevan a cabo las siguientes actividades:

- **Instalación de las áreas temporales**

  - ✓ Se llevó a cabo la instalación del campamento y de las áreas destinadas al acopio temporal de materiales de construcción, almacenamiento de residuos provenientes de excavaciones y demoliciones, así como las zonas de parqueo para maquinaria y equipos requeridos en la ejecución del proyecto.
  - ✓ Los sitios fueron seleccionados en zonas cercanas a las áreas de intervención, garantizando que se encontraran fuera de las rondas de protección de cuerpos de agua (quebradas, ríos, lagunas, etc.), de áreas de protección ambiental, zonas de alta sensibilidad ecológica y terrenos inestables.

- **Funcionamiento de las áreas temporales**


  - ✓ En el sitio de obra se mantiene una adecuada gestión de los residuos sólidos generados, tanto reutilizables como reciclables, garantizando su correcto manejo, almacenamiento y disposición final conforme a la normatividad ambiental vigente. Se cuenta con puntos ecológicos debidamente identificados y con la separación de residuos según su tipología, lo que ha permitido optimizar los procesos de recolección y entrega a gestores autorizados.
  - ✓ Se implementó y mantiene un programa de orden y aseo aplicado específicamente al área del campamento, mediante el cual se asegura la limpieza permanente, la organización de los espacios comunes y la eliminación oportuna de residuos.
  - ✓ El campamento se encuentra debidamente señalizado en su totalidad, diferenciando claramente cada una de sus áreas de acuerdo con el diseño aprobado. Se mantiene la señalización correspondiente a salidas de emergencia, ubicación de extintores, zonas de almacenamiento, puntos de reunión, áreas de uso restringido y recordatorios sobre el uso obligatorio de elementos de protección personal.

- **Desmantelamiento de las instalaciones temporales**


  A la fecha del presente informe, no se ha llevado a cabo el desmantelamiento de las instalaciones temporales (campamento, áreas de acopio y zonas de almacenamiento), debido a que las obras aún se encuentran en proceso de ejecución.



Fotografía 9. Sitio de acopio.

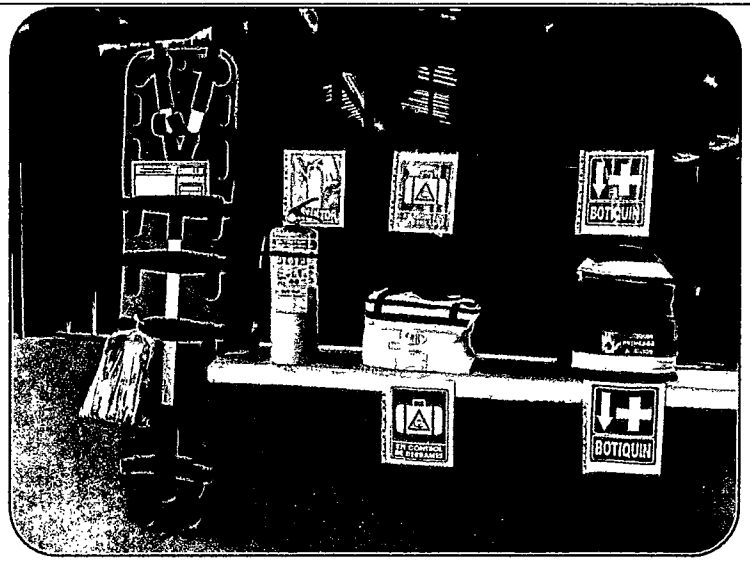

Fotografía 10. Equipos de emergencia.

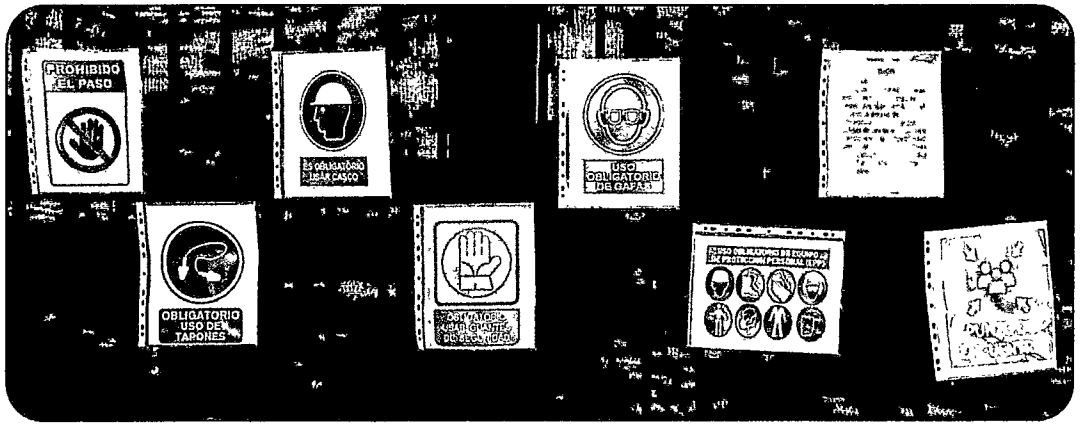

Fotografía 11. Información SST.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Instalación de las áreas temporales	☑	☑	☑							
2	Funcionamiento de las áreas temporales			☑							
3	Desmantelamiento										

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Indicador
Campamentos instalados/Campamentos utilizados	Cumplir con el 100% de las acciones propuestas en este proyecto	Cuantitativo	Mensual	✓ Informe de cumplimiento ambiental. ✓ Registro fotográfico.

RESULTADO INDICADOR

Indicador: 1/1	% CUMPLIMIENTO: 100%

COSTOS DE EJECUCIÓN

ACCIONES	COSTOS
1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento del campamento	Costo 1. 1 und de Camilla de emergencia = $192.000, 1 und Extintore 30 lb = $300.000, 1 und de Botiquin tipo A = $170.000, 10 meses de Alquiler de baños portátiles = $11.089.600

COSTO TOTAL: $11.751.600

SUBPROGRAMA 3: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.			IDENTIFICACIÓN: PMIT– 5.3– 20
OBJETIVO DEL PROYECTO: Realizar seguimiento al mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipos y vehículos. Prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos y vehículo.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación: (X)	**Prevención:** (X)	**Corrección:**	**Compensación:**
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	X	**ALTA**	
IMPACTOS A MANEJAR: ✓ Incremento del material particulado. ✓ Incremento del polvo.			

- ✓ Incremento de la presión sonora.
- ✓ Cambio en los niveles de ruido.

ACCIONES EJECUTADAS:

Se continúa realizando la revisión rutinaria de la maquinaria, equipos y vehículos utilizados durante la ejecución de las actividades del proyecto, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el programa. Estas inspecciones se llevan a cabo de manera periódica por el personal técnico competente, garantizando el seguimiento a las condiciones mecánicas, operativas y de seguridad de cada equipo antes de su uso en campo,como resultado de las verificaciones efectuadas, se ha evidenciado que todos los equipos, vehículos y maquinarias se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, asegurando la continuidad y eficiencia de las operaciones, así como el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente programa. Esta gestión ha permitido prevenir fallas mecánicas, minimizar riesgos laborales y reducir posibles afectaciones ambientales derivadas de fugas de aceites, combustibles o emisiones contaminantes. Asimismo, se resalta que, hasta la fecha, no ha sido necesario realizar labores de mantenimiento correctivo.


La maquinaria y los equipos que se usaran durante la ejecución del contrato son los siguientes:

Tipo:	EXCAVADORA ORUGA
Marca:	JCB
Referencia:	JCBJS20DK71610150
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA




Fotografía 12. Maquinaria – Excavadora Oruga.

Tipo:	BULDOZER
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	99J2260
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA

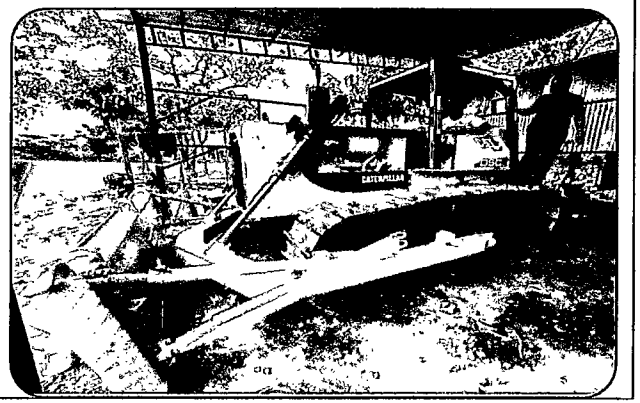


Fotografía 13. Maquinaria – Buldozer.

Tipo:	CARRO TANQUE DE AGUA
Marca:	JAC
Referencia:	LJ11KDCD6
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA

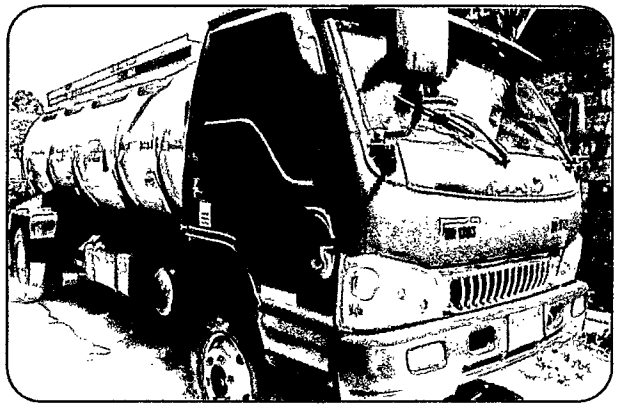


Fotografía 14. Maquinaria – Carro tanque de agua.

Tipo:	VIBROCOMPACTADOR
Marca:	INGERSOL RAND
Referencia:	196613
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA

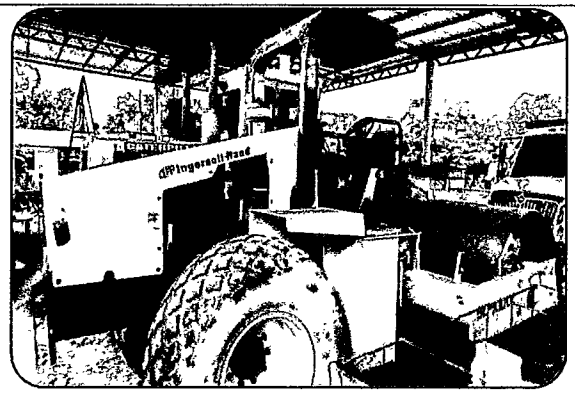


Fotografía 15. Maquinaria – Vibrocompactador.

Tipo:	MOTONIVELADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	87V9822
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA

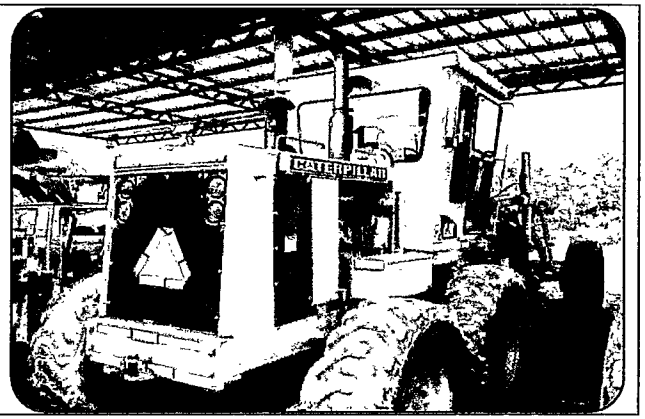

Fotografía 16. Maquinaria – Motoniveladora.

Tipo:	COMPATADOR NEUMATICO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	T04039 D412972
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA

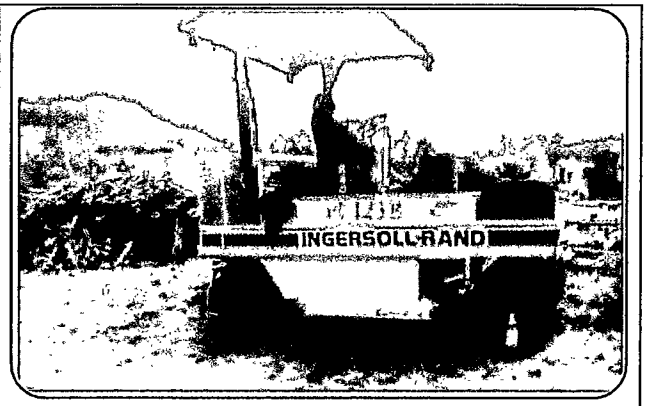


Fotografía 17. Maquinaria – Compactador neumatico.

Tipo:	CAMIÓN IRRIGADOR Y COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO)
Marca:	MACK
Referencia:	VG6M117B7PB201013
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA



Fotografía 18. Maquinaria – Camión irrigador y compresor.

Tipo:	FINISHER
Marca:	CEDARAPIDS
Referencia:	48347
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA

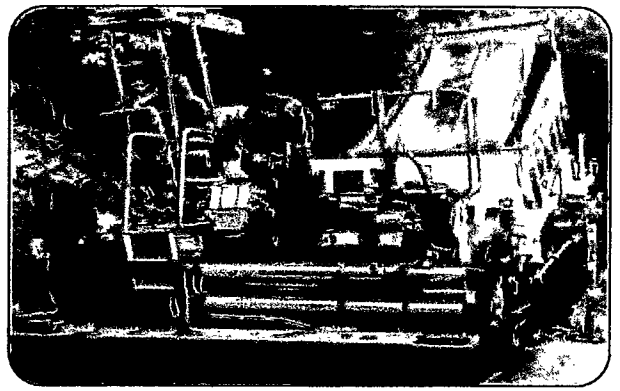


Fotografía 19. Maquinaria – Finisher.

Tipo:	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO
Marca:	INGERSOLL RAND
Referencia:	143268
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA



Fotografía 20. Maquinaria – Vibrocompactador doble rodillo.

Tipo:	MEZCLADORA DE CONCRETO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	1 BULTO MOTOR 10HP
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA

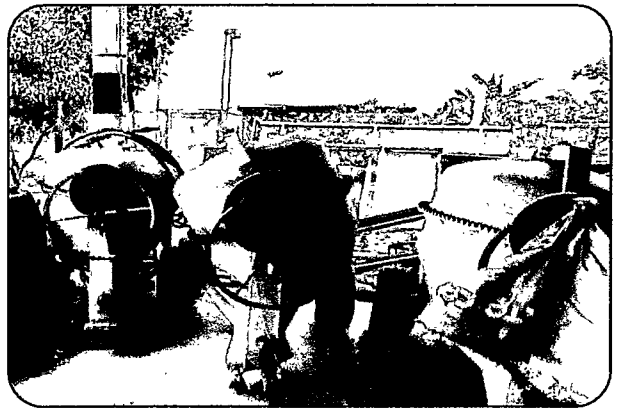


Fotografía 21. Maquinaria – Mezcladora de concreto.

Tipo:	VIBRO DE CONCRETO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	TCW5
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de maquina:	IDÓNEA



Fotografía 22. Maquinaria – Vibro de concreto.

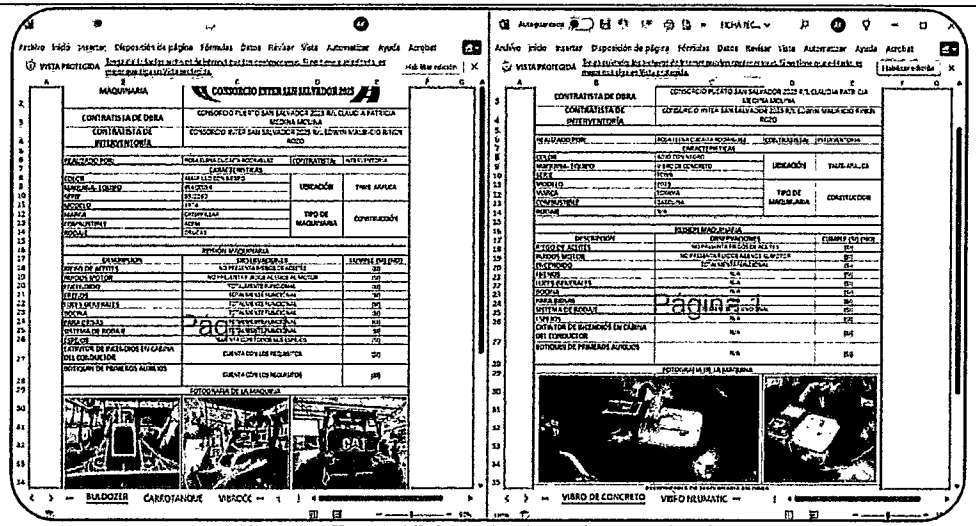

Fotografía 23. Fichas técnicas de maquinaria.



Fotografía 24. Kit para derrames.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N°	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizar mantenimientos preventivos, rutinarios y correctivos a la maquinaria, equipos y vehículos basados en listas de chequeo elaboradas de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y ser entregados a la Interventoría	☑	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Indicador
Número de maquinarias, equipos y vehículos utilizados en la obra / Total de mantenimientos preventivos, rutinarios y correctivos realizados.	Cumplir con el 100% de las acciones propuestas en este proyecto	Cuantitativo	Mensual	✓ Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos a operar en los frentes de obra ✓ Soportes de los chequeos realizados ✓ Registro fotográfico.

RESULTADO INDICADOR

Indicador: 11/11	% CUMPLIMIENTO: 100%

COSTOS DE EJECUCIÓN

ACCIONES	COSTOS
1. Control de derrames	Costo 1. Kit para control de derrame de combustible 1 unid x $900.000 = $900.000
	COSTO TOTAL: $900.000

SUBPROGRAMA 1: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL.			IDENTIFICACIÓN: PDL– 6.1– 21
OBJETIVO DEL PROYECTO: Propender por la vinculación de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, que hagan parte de grupos vulnerables del área de influencia.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación:	**Prevención:** (X)	**Corrección:**	**Compensación:**

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	**X**	**ALTA**	
TIPOS DE PROYECTO			
MEJORAMIENTO:	**MANTENIMIENTO:**	**REHABILITACION:** (X)	**ATENCION A EMERGENCIAS:**

IMPACTOS A MANEJAR:

- ✓ Generación de conflictos entre la institución, empresa y comunidad.
- ✓ Incremento de la oferta de empleo

ACCIONES EJECUTADAS:

El proceso de convocatoria se desarrolló conforme a los reglamentos establecidos y en cumplimiento de los parámetros definidos para la vinculación de personal. Durante su ejecución, se garantizó la participación amplia y el acceso equitativo a las oportunidades laborales generadas por el proyecto, promoviendo la transparencia, la inclusión y la igualdad de condiciones entre los aspirantes.

Así mismo, se llevó a cabo la entrega de la dotación y de los Elementos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores, asegurando que cada uno contara con los implementos necesarios para el adecuado desempeño de sus labores. Esta actividad se realizó siguiendo los lineamientos establecidos en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando que el personal dispusiera de prendas y equipos en óptimas condiciones, acordes con el tipo de actividad desarrollada y orientados a prevenir riesgos laborales.

De igual forma, se continúa con la gestión y atención oportuna de las peticiones, quejas y solicitudes (PQS) presentadas por la comunidad, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para su recepción, registro, seguimiento y respuesta. Estas acciones garantizan una atención transparente y efectiva, orientada a la satisfacción de los requerimientos ciudadanos y al fortalecimiento de las buenas prácticas de gestión social en el marco del proyecto.



Fotografía 25. Entrega de dotación y EPP´S.

Anexo 6. Lista de asistencia entrega de dotación y EPP´S.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N°	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Brindar información y atención a la comunidad sobre los perfiles y cargos a ofertar, así como realizar la convocatoria.	☑									
2	Dar respuesta oportuna a las peticiones que realice la comunidad	☑	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Indicador
Número de peticiones realizadas por la comunidad / Número de respuestas a peticiones emitidas por el contratista	Cumplir con el 100% de las acciones propuestas en este proyecto	Cuantitativo	Mensual	Informe de cumplimiento

RESULTADO INDICADOR

Indicador: 0/0	% CUMPLIMIENTO: 100%

COSTOS DE EJECUCIÓN

ACCIONES	COSTOS
1. Divulgación de las ofertas de empleo por medio de folletos.	Costo 1. Folletos 10 und x $10.000 = $100.000
COSTO TOTAL: $100.000	

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

2901

3.1.5. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 6.1: ATENCIÓN A LA COMUNIDAD		**IDENTIFICACIÓN: PGS– 6.1– 21**	
OBJETIVO DEL PROYECTO: implementar un Sistema de Atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las manifestaciones comunitarias generadas por las actividades de obra y las medidas de manejo de los impactos ambientales, sociales y prediales del proyecto.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación: (X)	**Prevención:** (X)	**Corrección:** (X)	**Compensación:**
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	**X**	**ALTA**	
TIPOS DE PROYECTO			
MEJORAMIENTO:	**MANTENIMIENTO:**	**REHABILITACION:** (X)	**ATENCION A EMERGENCIAS:**
IMPACTOS A MANEJAR: Generación de conflictos entre la institución, empresa y comunidad			

ACCIONES EJECUTADAS:

Se continúa con el funcionamiento del punto de atención ubicado en el área de la obra, el cual cuenta con las condiciones necesarias para garantizar un espacio adecuado para la información y atención a la comunidad. Este sitio ha sido dispuesto con el propósito de facilitar el acceso a datos relevantes sobre el proyecto, resolver inquietudes y fortalecer la comunicación directa con la población del área de influencia. Hasta la fecha, no se han recibido quejas por parte de la comunidad, lo que ha permitido el desarrollo satisfactorio de las actividades en campo.

Durante el presente mes se recibió la visita de la Empresa de Energía de Arauca - **ENELAR E.S.P.**, en atención a la solicitud realizada para verificar la instalación de la postería en la nueva vía. En dicha visita también estuvo presente el equipo de interventoría, con el fin de acompañar el proceso y garantizar el cumplimiento de los lineamientos técnicos y de seguridad establecidos para este tipo de actividades.



Fotografía 26. Visita de ENELAR E.S.P.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com



Fotografía 27. Punto de atención a la comunidad.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N°	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Instalación y adecuación de un sitio en el área de la obra para brindar información y atención a la comunidad.	☑									
2	Dar respuesta oportuna a las peticiones que realice la comunidad	☑	☑	☑							

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Indicador
Número de peticiones realizadas por la comunidad / Número de respuestas a peticiones emitidas por el contratista	Cumplir con el 100% de las acciones propuestas en este proyecto	Cuantitativo	Mensual	Informe de cumplimiento

RESULTADO INDICADOR

Indicador: 1/1	% CUMPLIMIENTO: 100%
COSTOS DE EJECUCIÓN	
ACCIONES	**COSTOS**
1. Reuniones con veedurías, comunidad y/o entidades gubernamentales.	Costo 1. Tablas para apoyo 2 unid x $8.000 = $16.000 Costo 2. Buzón 1 unid x $60.000 = $60.000
COSTO TOTAL: $76.000	

SUBPROGRAMA 6.2: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		**IDENTIFICACIÓN: PGS– 6.2– 22**	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales y líderes comunitarios.			
TIPO DE MEDIDA			
Mitigación:	**Prevención:** (X)	**Corrección:**	**Compensación:**
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		**MEDIA – ALTA**	
MEDIA-BAJA	**X**	**ALTA**	
TIPOS DE PROYECTO			
MEJORAMIENTO:	**MANTENIMIENTO:**	**REHABILITACION:** (X)	**ATENCION A EMERGENCIAS:**

IMPACTOS A MANEJAR:
Generación de conflictos entre la institución, empresa y comunidad

ACCIONES EJECUTADAS:

Durante el presente periodo, no se han presentado inconvenientes ni conflictos con la comunidad del área de influencia del proyecto. Por el contrario, se ha mantenido una relación de respeto, colaboración y comunicación permanente con los habitantes y líderes locales, lo que ha contribuido a fortalecer la confianza y la aceptación de las actividades desarrolladas.

Asimismo, se han mantenido abiertos los espacios de diálogo y participación para la atención de dudas, inquietudes o sugerencias por parte de la comunidad, garantizando una comunicación transparente y oportuna. Estas acciones han permitido consolidar una gestión social efectiva, basada en la prevención de conflictos y en la promoción de la corresponsabilidad entre la empresa ejecutora y la comunidad.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa de la obra

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		
N°	**ACTIVIDADES**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Reuniones con la comunidad para brindar información del proyecto y sus avances	☑	☑								
2	Instalación de puntos satélites para brindar información a la comunidad	☑									

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Contratista de obra

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Interventoría externa del proyecto - Supervisión por parte del municipio de Tame

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periocidad de Evaluación	Indicador
Número de reuniones realizadas con la comunidad del área de influencia/Número de reuniones programadas	Cumplir con el 100% de las acciones propuestas en este proyecto	Cuantitativo	Tres veces durante la ejecución total del proyecto	✓ Actas de reunión ✓ Lista de asistencia ✓ Registro fotográfico

RESULTADO INDICADOR

Indicador: 1/1	% CUMPLIMIENTO: 100%

COSTOS DE EJECUCIÓN

ACCIONES	COSTOS
1. Divulgación de la socialización, comités, entrega final, entre otros.	Costo 1. Emisión de cuñas radiales 10 und x $40.000 = $400.000

COSTO TOTAL: $400.000

4. CONCLUSIONES

- Hasta la fecha, se ha logrado la adecuada implementación de las actividades contempladas en cada una de las fichas, cumpliendo con los requisitos establecidos y alcanzando los objetivos propuestos dentro del plan de trabajo. Dichas actividades se desarrollaron de manera organizada y con el compromiso de todos los actores involucrados, evidenciándose una participación activa y receptiva por parte de los trabajadores, quienes demostraron interés y apropiación de los temas abordados.

- Se llevó a cabo la correcta aplicación de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando en todo momento condiciones seguras para el personal involucrado en las actividades. Asimismo, se promovió una cultura de prevención y autocuidado, fortaleciendo el compromiso de los trabajadores con el cumplimiento de las normas de seguridad, la identificación oportuna de riesgos y la adopción de medidas de control que contribuyen al bienestar y la integridad de todos los participantes.

- La integración comunitaria ha favorecido el adecuado desarrollo de las actividades en campo, promoviendo la corresponsabilidad social y ambiental, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos.

- Durante la visita realizada por la empresa ENELAR E.S.P., se logró cumplir satisfactoriamente con el objetivo establecido por dicha entidad. Asimismo, se brindó el acompañamiento correspondiente durante el desarrollo de la actividad, garantizando el apoyo necesario para la verificación y ejecución de las acciones programadas.

PABEL FONSECA.

PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA
INGENIERO AMBIENTAL / ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MP. 25238-244492 CND

ANEXOS

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ANEXO 1.

Lista de asistencia capacitación e inducción ambiental.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☒ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	FIRMA: PABEL FONSECA	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: INDUCCIÓN AMBIENTAL

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
23-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:15AM	8:15AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	1128388541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	ERIKA MENDIETA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA**	FIRMA:	EMPRESA : **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	Aristobulo Bovelo
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto melo
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo Ruiz
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose obando
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

ANEXO 2.

Lista de asistencia – Capacitaciones ambientales.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☑ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA :
PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	PABEL FONSECA	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: IDENTIFICACION DE AMENAZAS AMBIENTALES

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
04/10/25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:00AM	7:45 AM.	26

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	1128388541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	ERIKA MENDIETA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA FDA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian david achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS _____
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	FIRMA:	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	HUBER BAUTISTA GORDILLO CHIQUINQUIRA	7062150	AYUDANTE	Huber Bautista
4	RENE ALEXANDER RODRIGUEZ SANABRIA	74862000	AYUDANTE	Rene Rodriguez
5	JOSE OCTAVIO GUITIERREZ PAEZ	96195067	AYUDANTE	Jose octavio
6	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	aristobulo bovelo
7	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
8	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto melo
9	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
10	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo Ruiz
11	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose obando
12				
13				
14				
15				

2915

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☒ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA :
PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	PABEL FONSECA	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
09-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:00 AM	8:10 AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	1128388541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	ERIKA MENDIETA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian David achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA**	FIRMA:	EMPRESA : **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

2917

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☑ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	FIRMA: PABEL FONSECA	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: SENSIBILIZACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMATICO

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
17-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:30 AM	8.10 AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	1128388541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	ERIKA MENDIETA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian David achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

2918

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS _____
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA**	FIRMA:	EMPRESA : **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	Aristobulo Bovelo
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto melo
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo Ramirez
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose obando
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

2. 2

ANEXO 3.

Lista de asistencia – Capacitaciones en SST.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	FIRMA: Erika Mendieta	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: CULTURA DE AUTOCUIDADO Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
01-16-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:00AM	8:00AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R.
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian david achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.**	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO**	FIRMA:	EMPRESA : **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	aristobulo bovelo
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto melo
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose obando
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

2922

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☑ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA :
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	ERIKA MENDIETA	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS LABORALES

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
06-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:10AM	8:00 AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian david achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

2923

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS _____
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO**	FIRMA:	EMPRESA : **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	Aristobulo Bovelo
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto Melo
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose Obando
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	FIRMA: ERIKA MENDIETA	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: CONCEPTOS BASICOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (ABOBAT)

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
14-10-25	VEREDA PTO. SAN SALVADOR	7:00AM	8:00 AM	26

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian David achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

2925

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	FIRMA:	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

[redacted]MA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	HUBER BAUTISTA GORDILLO CHIQUINQUIRA	7062150	AYUDANTE	
4	RENE ALEXANDER RODRIGUEZ SANABRIA	74862000	AYUDANTE	
5	JOSE OCTAVIO GUITIERREZ PAEZ	96195067	AYUDANTE	
6	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	
[redacted]	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
8	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	
9	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	
10	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	
11	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	
12				
13				
14				
15				

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	FIRMA: ERIKA MENDIETA	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
20-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:15AM	8.15 AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian david achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

2927

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	FIRMA:	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	Huber bovelista
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto melo
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R.
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose obando
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

ANEXO 4.

Formato de seguimiento al manejo de los residuos sólidos.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025



"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS

PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".			AÑO 2025
GENERACIÓN				
FECHA	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD GENERADA	UNIDAD	RESPONSABLE
29/10/25	Peligrosos/especiales (bolsas de cemento)	18	Kg	PABEL FONSECA
31/10/25	No aprovechables	1,0	Kg	PABEL FONSECA
31/10/25	Aprovechables	0,5	Kg	PABEL FONSECA

ANEXO 5.

Bitácora de agua – Octubre.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

BITÁCORA DE CONSUMO DE AGUA – OCTUBRE 2025

Periodo: Del 01 al 31 de octubre de 2025.

Tipo de fuente: Aguas superficiales.

Permiso de concesión: Resolución No. 700.36.25.0045 de 04 de junio del 2025 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCES AL MUNICIPIO DE TAME Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

Caudal concesionado: 0.2141 L/s.

Volumen total captado: 24000 litros

FECHA	PUNTO DE CAPTACIÓN	VOLUMEN DIARIO (L)	OBSERVACIONES
Del 01 al 04	Rio Casanare (Resolución No. 700.36.25.0045 de 04 de junio del 2025)	4000	Captación controlada
Del 06 al 11		6000	Captación controlada
Del 15 al 18		4000	Captación controlada
20		1000	Captación controlada
Del 22 al 31		9000	Captación controlada
TOTAL		**24000 L**	

PABEL FONSECA.

PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA
ING. AMBIENTAL / ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MP. 25238-244492 CND

ANEXO 6.

Lista de asistencia entrega de dotación y EPP´S.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

2933

	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	CODIGO: SST-FO-06 VERSIÓN: 4.0 FECHA: OCTUBRE 2024 PAGINA: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Carlos Ramirez.

CEDULA N°: 1116985943

CARGO: Operador

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

EPP	CANTIDAD	FECHA
Camisa	2	20/10/2025
Pantalon	2	20/10/2025
Botas	1	20/10/2025
Casco	1	20/10/2025
Guantes	1	20/10/2025
Gafas	1	20/10/2025
Tapa oidos	1	20/10/2025
reflectivo	1	20/10/2025
Radio	1	20/10/2025
tapa bocas	1	20/10/2025

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR Carlos Ramirez

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Belis contreras

LUISA FERNANDA TORRES NIÑO
RESPONSABLE DE SST

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2434

	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	CODIGO: SST-FO-06 VERSIÓN: 4.0 FECHA: OCTUBRE 2024 PAGINA: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Roberto jose Melo Pineda.

CEDULA N°: 96195513

CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

EPP	CANTIDAD	FECHA
Pantalon	2	23/010/2025
Camisa	2	23/010/2025
botas	1	23/010/2025
Casco	1	23/010/2025
Guantes	1	23/010/2025
Gafas	1	23/010/2025
Tapa oidos	1	23/010/2025
Tapa bocas	1	23/010/2025

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR Roberto jose Melo

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Beltis contreras

LUISA FERNANDA TORRES NIÑO
RESPONSABLE DE SST

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

199 2935

CONSORCIO PUERTO-SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	CODIGO: SST-FO-06 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Jose Orlando Castellanos

CEDULA N°: 1.075.292

CARGO: Maestro

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

EPP	CANTIDAD	FECHA
Pantalón	2	23/10/2025
Camisa.	2	23/10/2025
Botas	1	23/10/2025
Casco	1	23/10/2025
Guantes	1	23/10/2025
Gafas	1	23/10/2025
Tapa oidos	1	23/10/2025
Tapa bocas	1	23/10/2025

COMPROMISO
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Belkis Contreras

ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO
RESPONSABLE DE SST

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INFORME MES 03 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

T.G ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente informe abarca las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas en el periodo del **01 al 31 de octubre del 2025** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."** Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través del Sistema Integrado de Gestión, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia ambiental y de salud y seguridad ocupacional (Siso-Ambiental). Por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del plan de salud y seguridad ocupacional implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra. De otro lado, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales generados por las actividades propias del proceso constructivo son objeto de trabajo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual es generado y ejecutado por el contratista de obra.

El PAGA basado en la legislación ambiental vigente, permite establecer metodologías y estrategias claras que apunten al crecimiento de la empresa en una relación armónica con la naturaleza, minimizando la contaminación, compensando los impactos negativos que se generan y en el mejor de los casos, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones ambientales en el área de intervención.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto aunado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo en la comunidad. Por lo anterior, se adoptó medidas que protejan la integridad de la población, cumplimiento con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de los recursos naturales.

ÁREA SOCIO - AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL

- ✓ Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA..**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y los resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental.

- ✓ Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley.

- ✓ Vigilar el debido cumplimiento por parte de la empresa contratista Diseño Absoluto del programa de Salud Ocupacional y a la reducción de incidencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales presentados en la ejecución del proyecto de **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."**

- ✓ Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."**

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

1. CAPACITACIONES

Mantener incentivado al personal del Proyecto de **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."** Ha sido la estrategia para que éste se empodere más de su trabajo y contribuya con el cumplimiento de las metas del **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** de manera productiva, a través de la disposición de su conocimiento, talento, habilidades y entusiasmo. Actividades relacionadas con la formación, capacitación, salud ocupacional, adecuación de puestos de trabajo, fortalecimiento de la comunicación interna, entre otros;

Permitiera que el clima laboral sea de una manera adecuada, aunque deben emprenderse aún ejercicios innovadores que permitan que este ambiente también mejore en la dimensión de las relaciones frente al otro. La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de salud Ocupacional.

Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.

Por otra parte, de esta forma se da cumplimiento al artículo 62 del decreto 1295/94, que obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores que tiene como objetivo proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de Salud Ocupacional, calidad y satisfacción.

2. MEDIDAS DE CONTROL

Según la matriz de identificación de peligros, valoración y control de riesgos los siguientes son los riesgos significativos a los que estuvieron expuestos nuestros trabajadores al ejecutar las actividades descritas y las medidas de intervención tomadas para controlarlos:

- ✓ **Riesgo Vial:** Se realiza instalación de señalización preventiva al inicio, fin de la obra y diferentes frentes de trabajo, al interior se realiza instalación de señalización. Adicionalmente se realiza control de las vías por medio de paleteros cuya función es orientar y mitigar algún tipo de accidente dentro y fuera de la vía de acceso de la obra.


Registro fotográfico Señalización



fotografía 01.




fotografía 02.

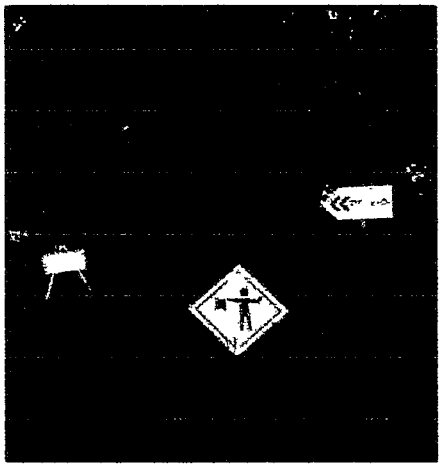


fotografía 03.



fotografía 04.

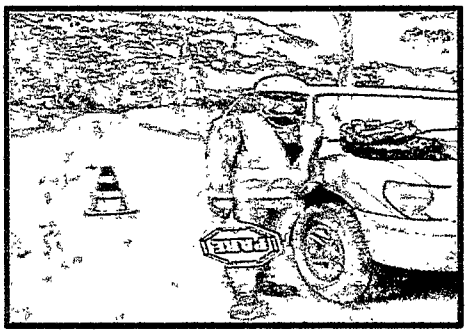

fotografía 05.

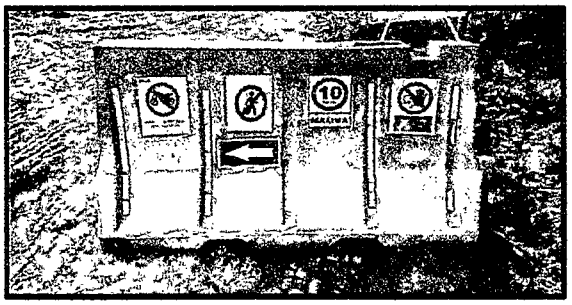

fotografía 06.




fotografía 07.



fotografía 08.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com

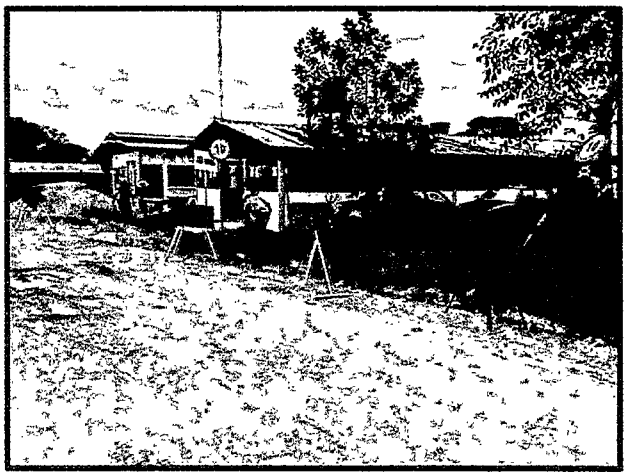

fotografía 09.



fotografía 10.



fotografía 11.




fotografía 12.




fotografía 13.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com

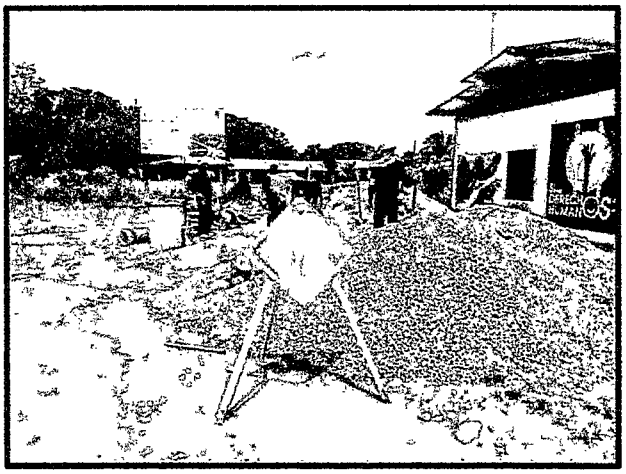

fotografía 14.

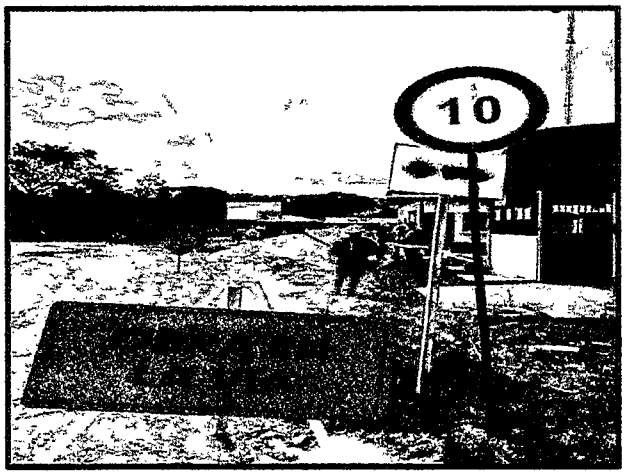


fotografía 15.




fotografía 16.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com

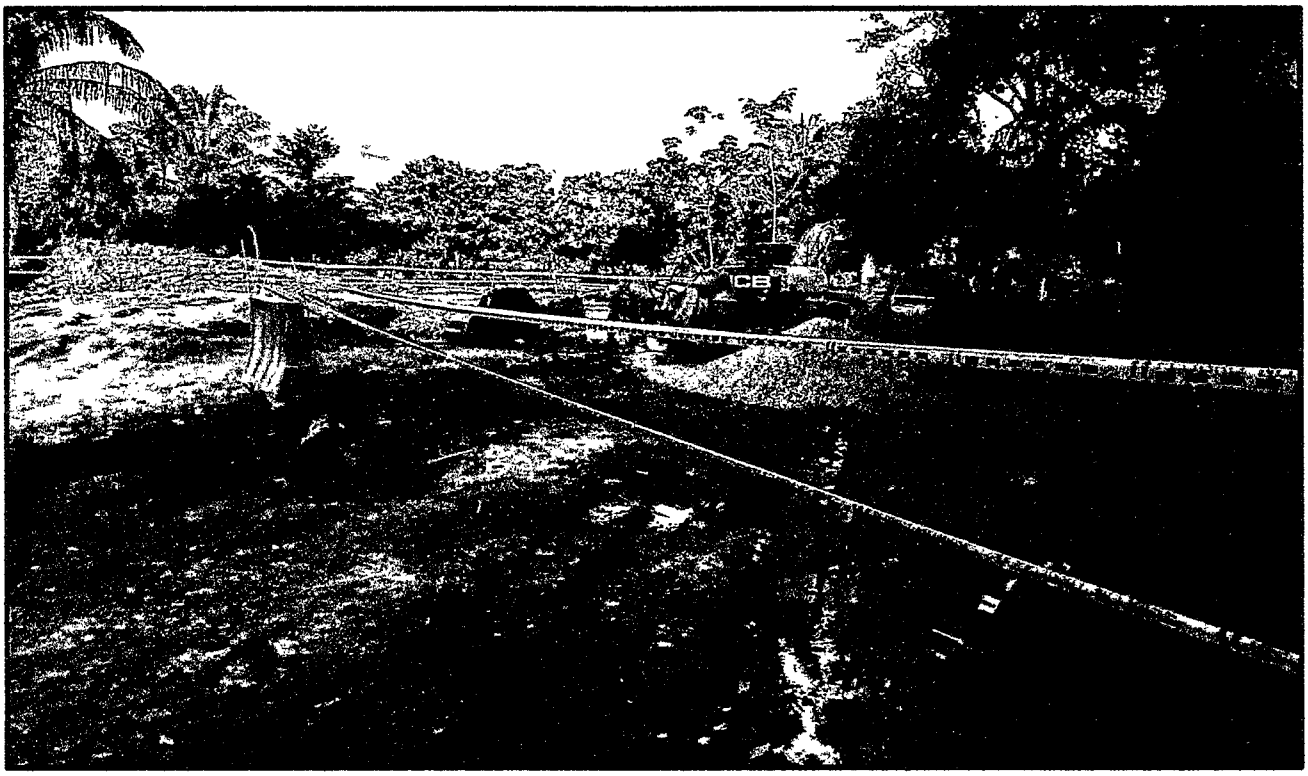

fotografía 17.

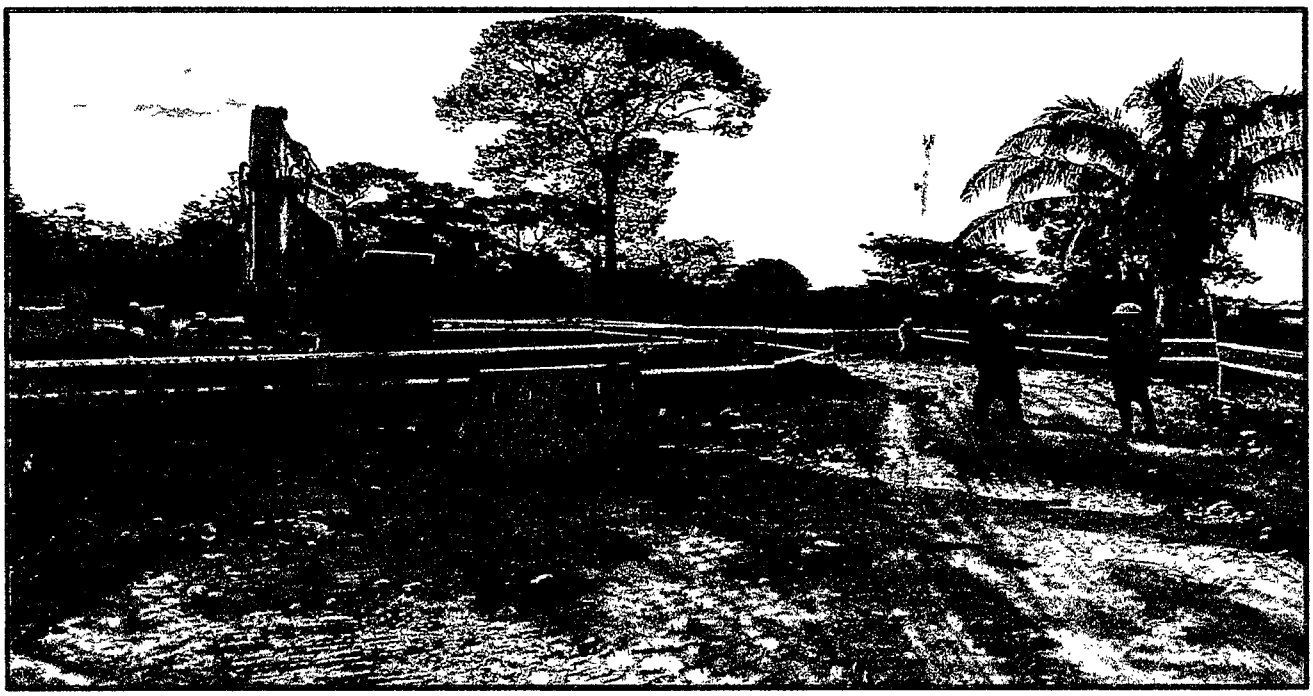


fotografía 18.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com




fotografía 19.

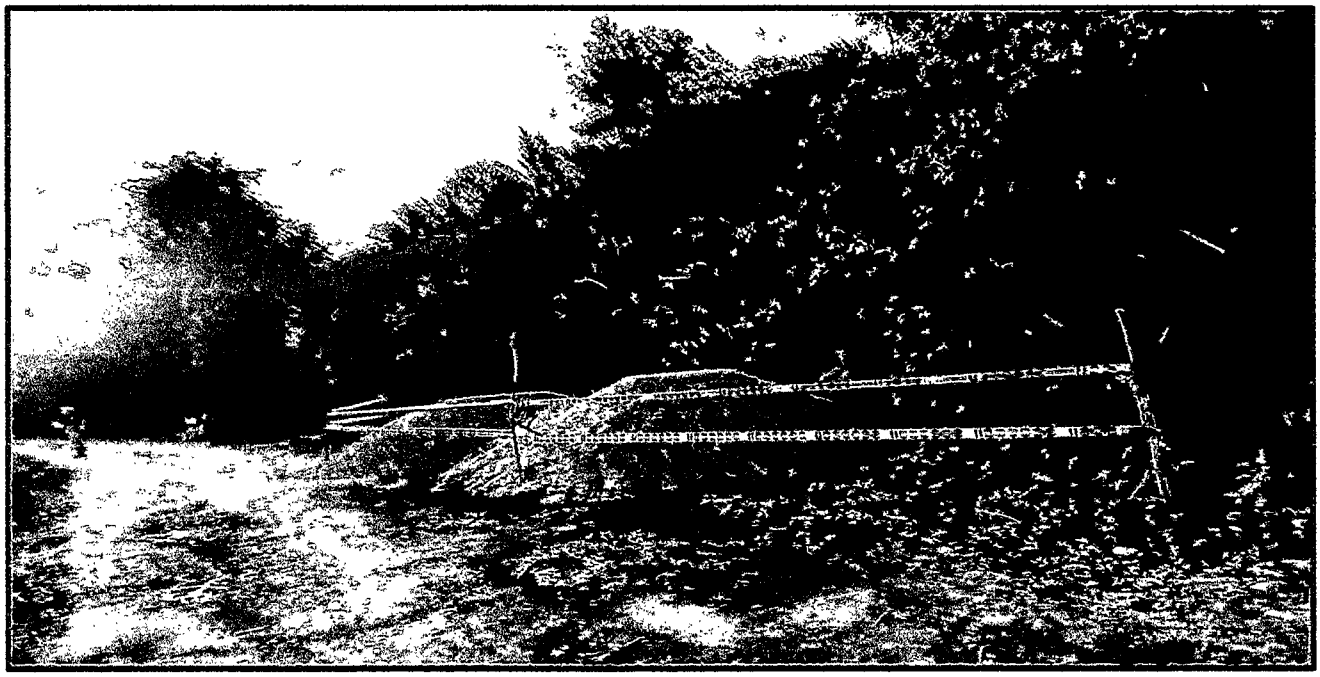


fotografía 20.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadera01@hotmail.com

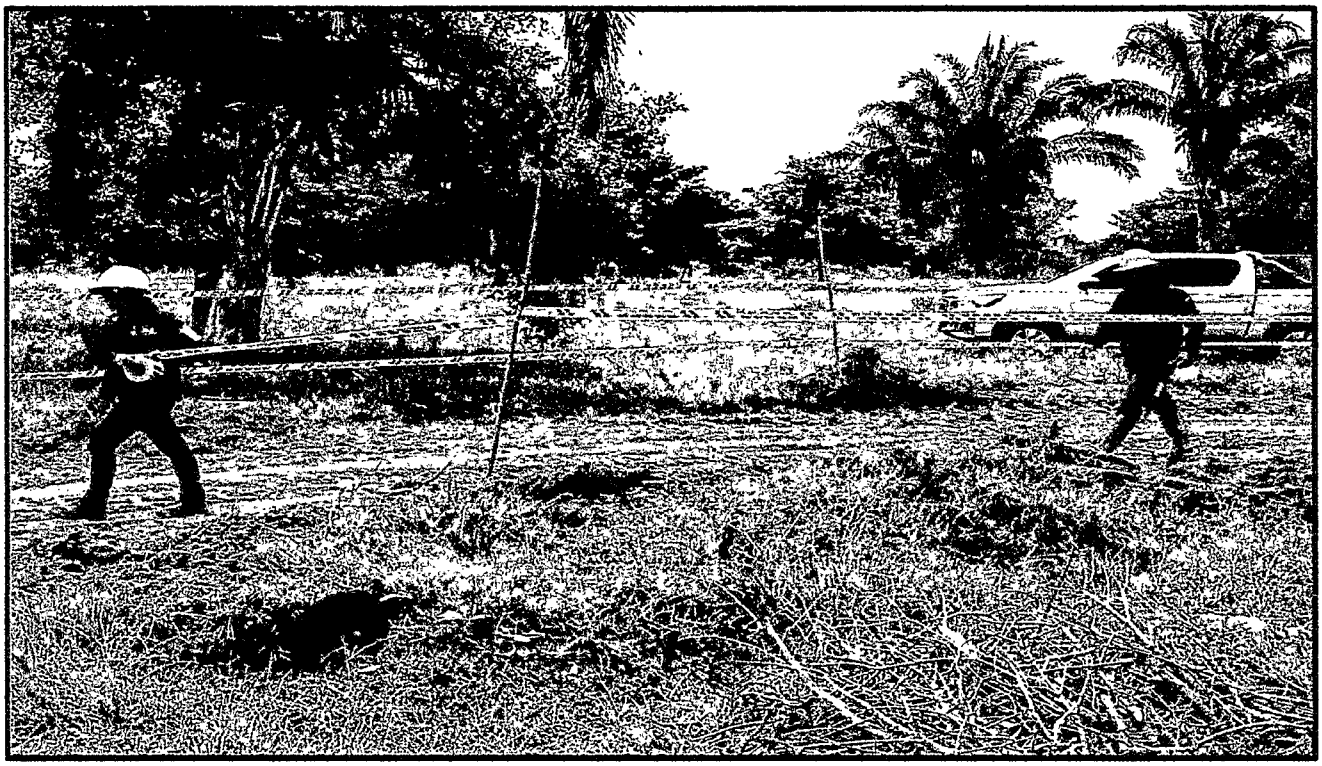

fotografía 21.

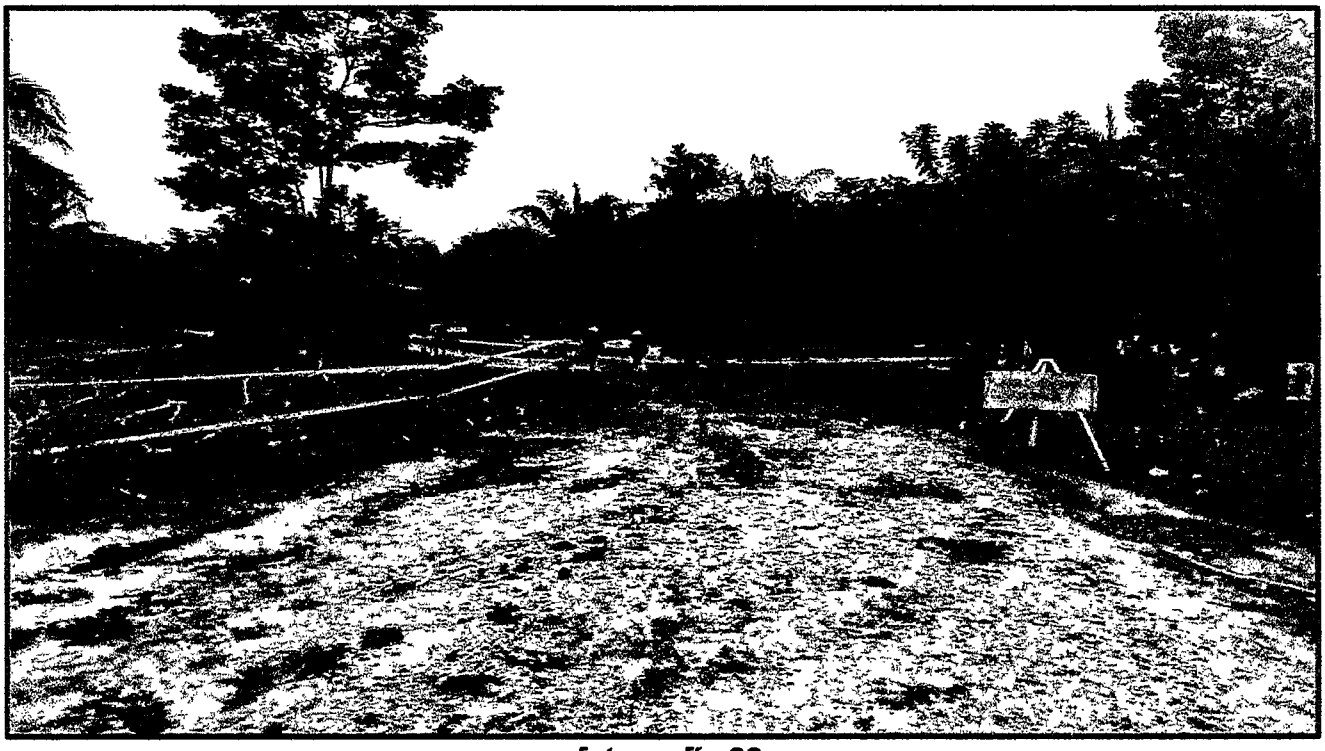

fotografía 22.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com

- ✓ **Riesgo mecánico por proyección de materiales:** durante operación de maquinara el personal estuvo ubicado a 3.5 mts del radio de operación de las maquinas, se ejecutan inspecciones pre operaciones de maquinaria, uso de elementos de protección personal tales como guantes, casco, botas de seguridad, gafas de seguridad.

Registro fotográfico uso de EPP



fotografía 23.



fotografía a 24.



fotografía 25.



fotografía 26.



fotografía 27.



fotografía 28.



fotografía 29.



fotografía 30.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com

- ✓ **Riesgo Biomecánico por esfuerzo** (Sobreesfuerzo, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos) se ejecuta programa de pausas activas y se cuenta con procedimiento estándar de levantamiento de cargas.

Registro fotográfico pausas activas.



fotografia 31.




fotografia 32.



fotografia 33.




fotografia 34.

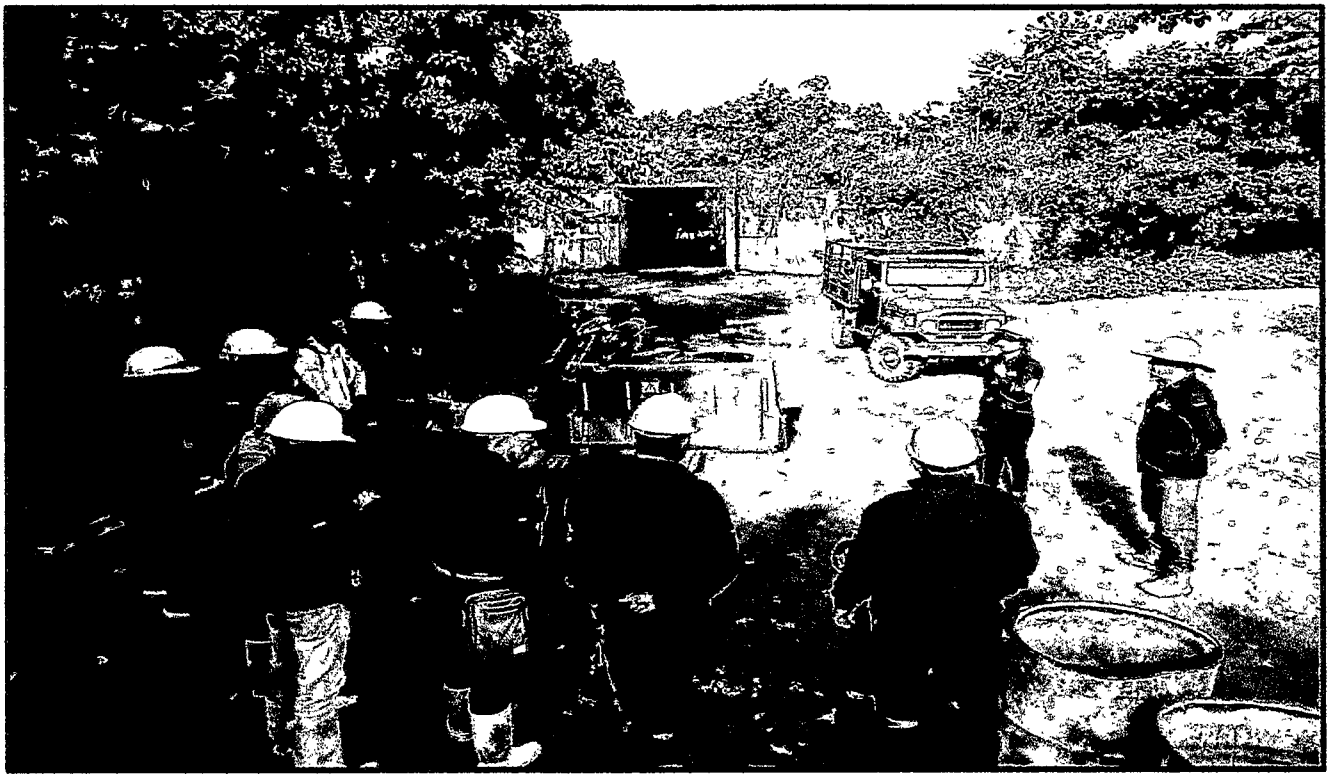

fotografia 35.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com

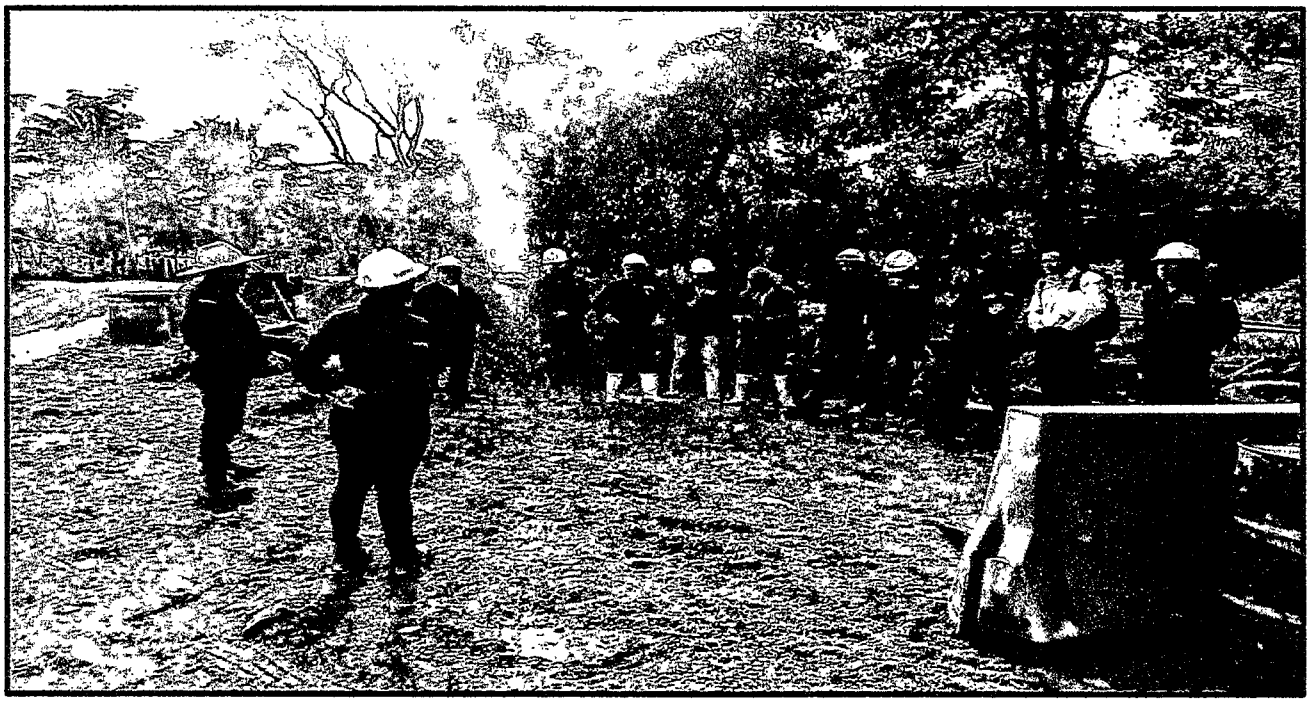

fotografia 36.




fotografia 37.


Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com

- ✓ **Riesgo físico por radiaciones no ionizantes:** se controla con pausas activas o descansos e hidratación constante.

Registro fotográfico Punto de Hidratación

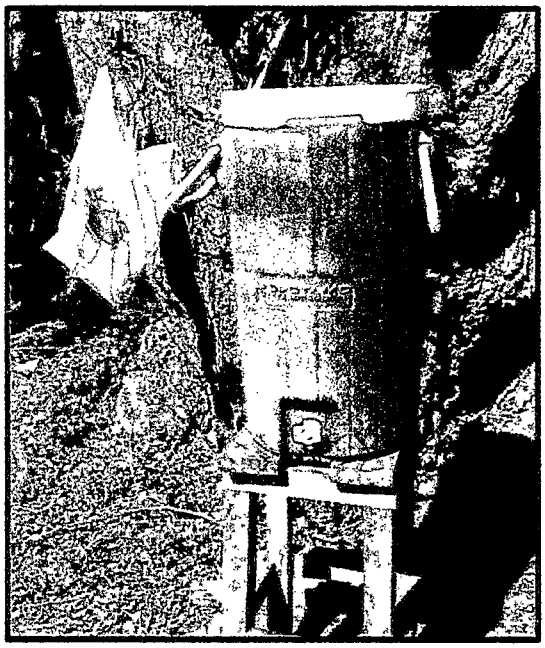

fotografia 38.

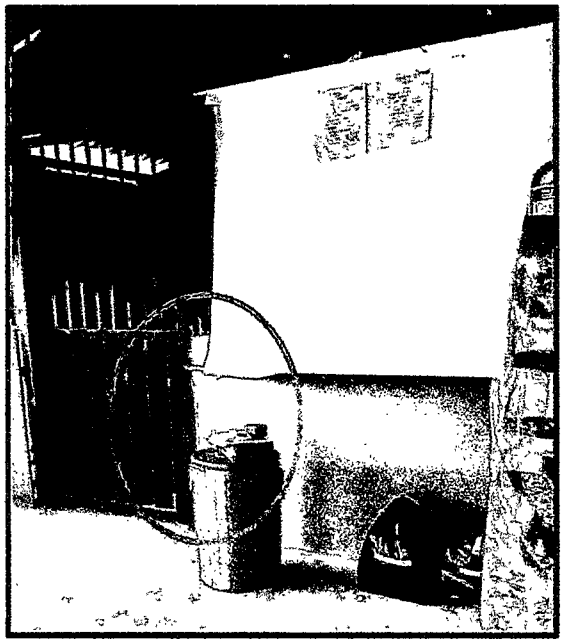

fotografia 39.

3. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS


En la obra se encuentran operando 1 retroexcavadora en llantas, 1 mezcladora, 1 motobomba, vibro de concreto, etc.... el contratista de obra en conjunto con la firma de interventoría ha realizado evaluación periódica del registro de la maquinaria y equipos, se ha verificado la documentación tanto de la maquinaria como de los operarios. Se le solicitó al contratista presentar certificado de mantenimiento de equipos en centros debidamente autorizados. Se le recomendó al contratista que el transporte de la retroexcavadora en cama baja, o cualquiera de la maquinaria pesada que ellos utilizaron en el desarrollo de las obras, debe ser transportado en cama baja. Según lo establecido en la resolución 12335 de 2012 y la normativa Ley 769 de 2002 "Maquinaria rodante de construcción o minería: Vehículo automotor destinado exclusivamente a obras industriales, incluidas las de minería, construcción y conservación de obras, que por sus características

técnicas y físicas no pueden transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público".

Registro fotográfico Manejo de Maquinaria y Equipo


La maquinaria y equipo que el contratista presento y utilizara durante el periodo de ejecución del contrato de obra 204 del 2025 es:

Tipo:	EXCAVADORA ORUGA
Marca:	JCB
Referencia:	JCBJS20DK71610150
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*

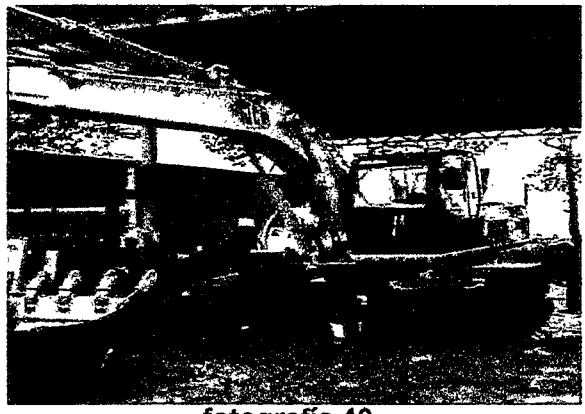

fotografía 40.

Tipo:	BULDOZER
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	99J2260
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*

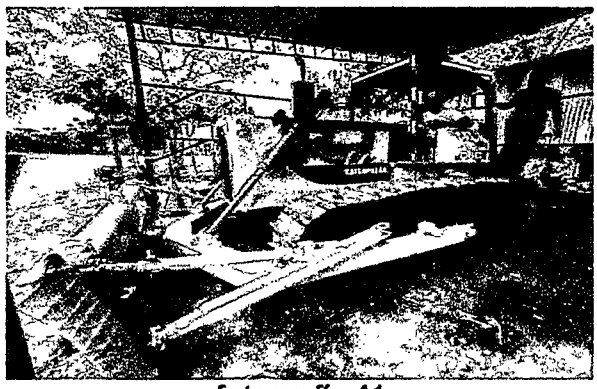


fotografía 41.

Tipo:	CARRO TANQUE DE AGUA
Marca:	JAC
Referencia:	LJ11KDCD6
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*




fotografía 42.

Tipo:	VIBROCOMPACTADOR
Marca:	INGERSOL RAND
Referencia:	196613
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*

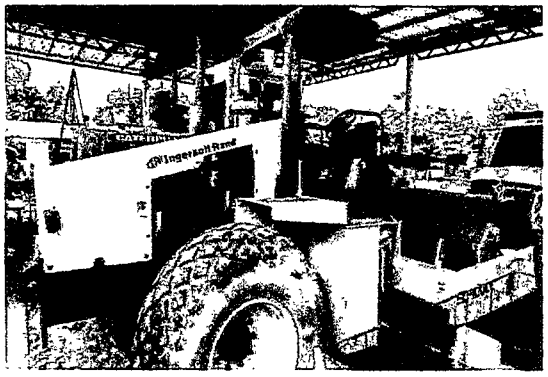

fotografía 43.


Tipo:	MOTONIVELADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	87V9822
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*

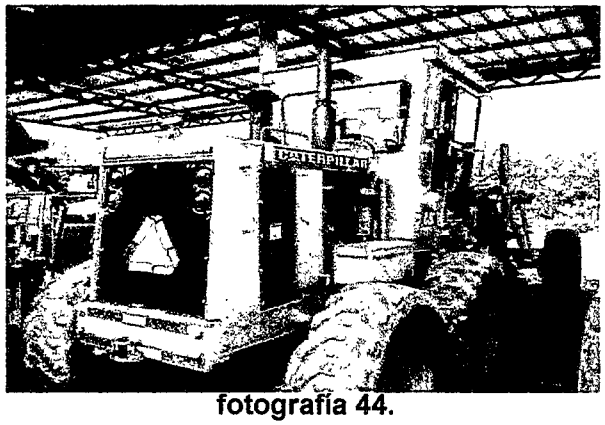

fotografía 44.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com

Tipo:	COMPATADOR NEUMATICO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	T04039 D412972
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*

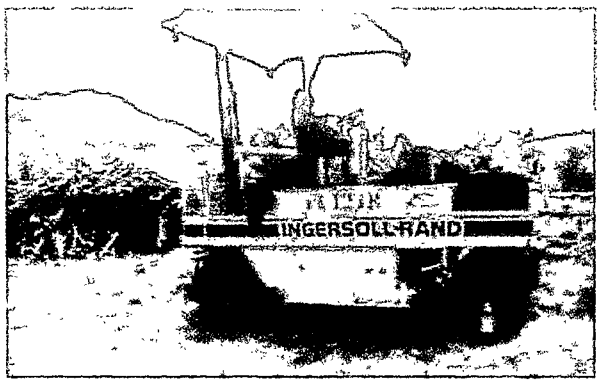

fotografía 45.

Tipo:	CAMIÓN IRRIGADOR Y COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO)
Marca:	MACK
Referencia:	VG6M117B7PB201 013
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*




fotografía 46.

Tipo:	FINISHER
Marca:	CEDARAPIDS
Referencia:	48347
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*




fotografía 47.

Tipo:	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO
Marca:	INGERSOLL RAND
Referencia:	143268
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*

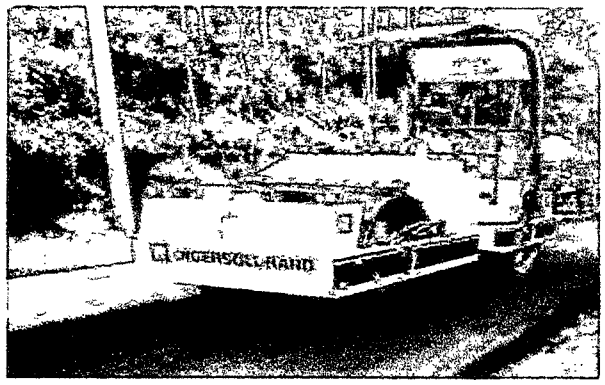


fotografía 48.

Tipo:	MEZCLADORA DE CONCRETO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	1 BULTO MOTOR 10HP
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*

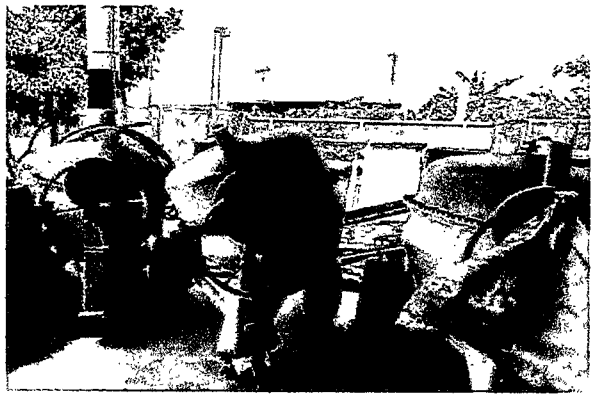

fotografía 49.

Tipo:	VIBRO DE CONCRETO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	TCW5
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*

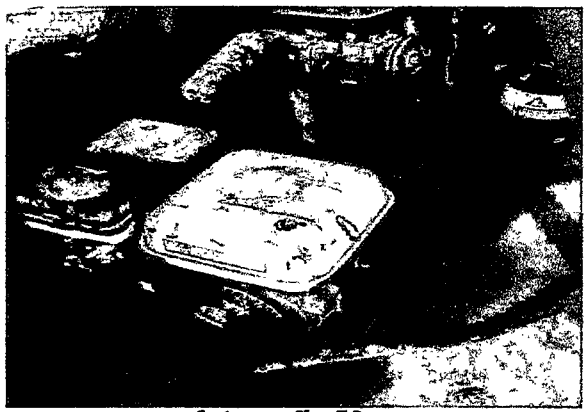


fotografía 50.


4. GESTIÓN SOCIAL

Es importante que la comunidad que se verá beneficiada con la obra de construcción de obra de protección, esté informada acerca de cada una de las actividades que se desarrollan en el proceso constructivo, además de los elementos de señalización instalados, se elaboró una valla donde está la información del nombre del contrato, el monto y el ente contratante.

Registro fotográfico Valla Informativa

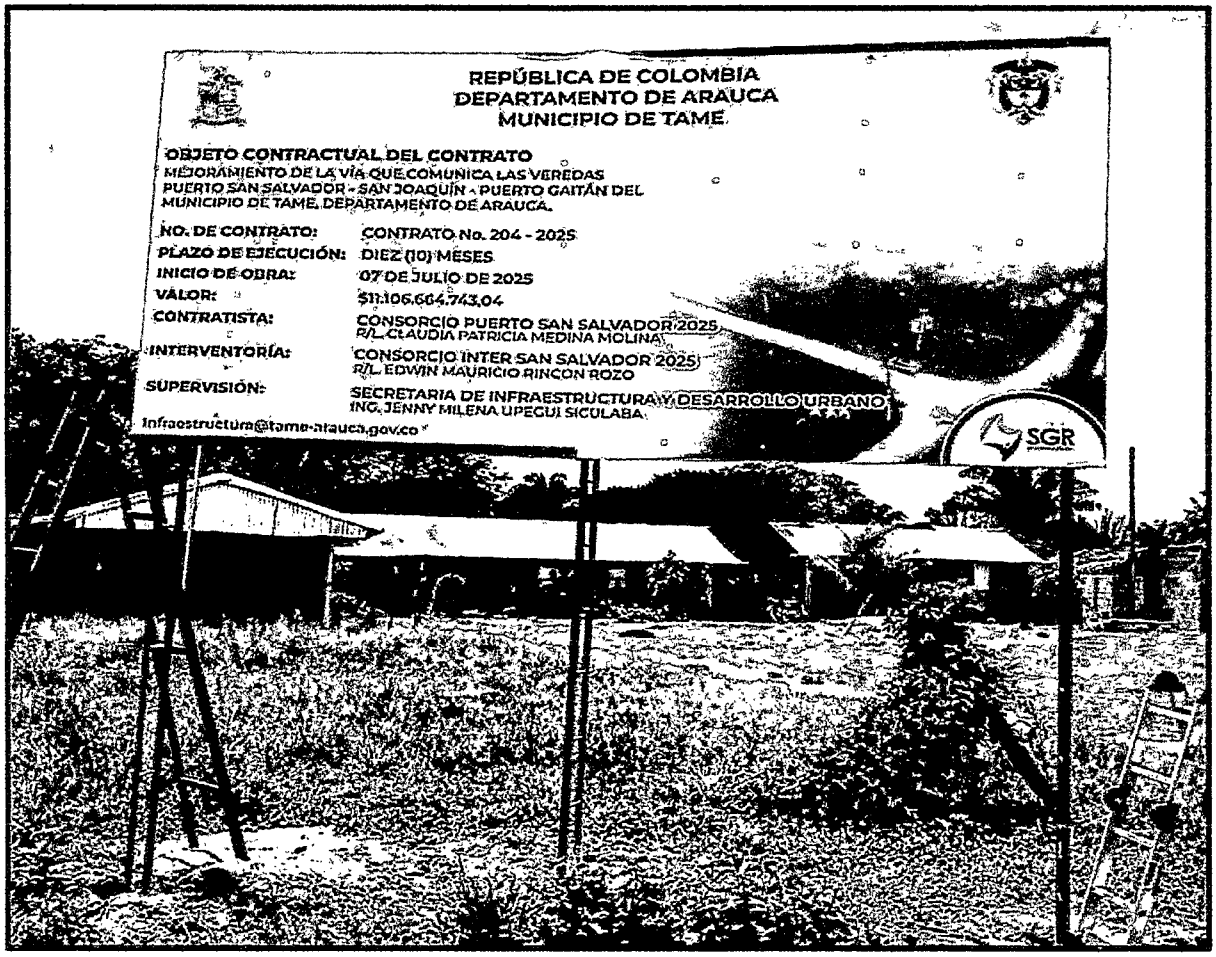

Fotografía 51.

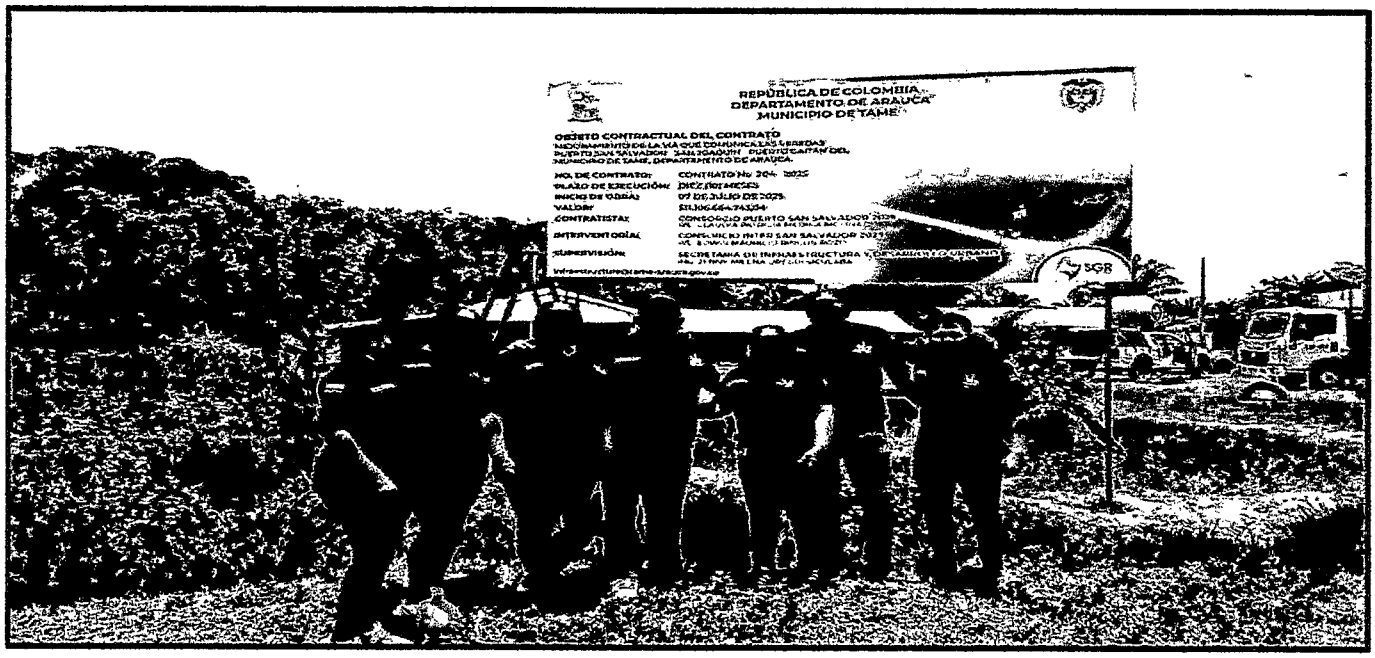

Fotografía 52.



Fotografía 53.

4.1 Socialización del proyecto

El 13/09/2025 se realizó la socialización del contrato de obra 204 del 2025 que tiene por objeto MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, previa convocatoria realizada por el "CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025".

En dicha reunión participaron representantes de la Municipio de Tame, representantes de la ART, representantes de la firma contratista de la obra, representantes de la Interventoría externa y representantes de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Municipio de Tame.

Registro fotográfico socialización del proyecto a la comunidad



Fotografía 54.



Fotografía 55.



Fotografía 56.



Fotografía 57.

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección personal se utilizaron como parte del programa de gestión y seguridad industrial de la empresa **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar de las operaciones de mantenimiento, construcción y el compromiso de las directivas en busca de un busca de un busca de un buen resultado, los elementos de protección son esenciales, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

Registro fotográfico Entrega de EPP



Fotografía 58.



Fotografía 59.



Fotografía 60.



Fotografía 61.



Fotografía 62.



Fotografía 63.



Fotografía 64.



Fotografía 65.



Fotografía 66.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com



Fotografía 67.



Fotografía 69.



Fotografía 68.



Fotografía 71.



Fotografía 70.



Fotografía 72.

Anexo 01: Reporte de entrega de elementos de protección personal al trabajador contratista.

6. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES

La supervisión y seguimiento del contrato verificó la respectiva certificación del pago de la seguridad social, pensión del contratista y riesgos profesionales de las personas que laboran.

Al contratista da cumplimiento de la normatividad vigente en este aspecto, es por esto que actualmente envían la documentación requerida y permanece en el archivo de la oficina. Esta documentación es revisada por la profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo por parte de la firma contratista de obra, para garantizar el estricto cumplimiento de este requerimiento contractual.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

El contratista utilizara mano de obra no calificada de la región con lo cual se generara empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal administrativo y operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de julio de 2025.

MES: JULIO DEL 2025												
Del 01/07/2025 AL 30/07/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X

4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL SST	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de septiembre de 2025.

MES: SEPTIEMBRE DEL 2025												
Del 12/09/2025 AL 30/09/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	**APELLIDOS**	**NOMBRES**	**CC**	**CARGO**	**SALARIO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA RETIRO**	**DIAS LABORADOS**	**SALUD**	**PENSION**	**RIESGOS**	**CCF**
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X

6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
13	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	15/09/2025		16	X	X	X	X
14	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.423.500,00	15/09/2025		16	X	X	X	X
15	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
16	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		9	X	X	X	X
17	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		9	X	X	X	X
18	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
19	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
20	GORDILLO CHIQUINQUIRA	HUBER BAUTISTA	7.062.150	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
21	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
22	GUITIERREZ PAEZ	JOSE OCTAVIO	96.195.067	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
23	BOVELO GONZALO	ARISTOBULO	96.194.845	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
24	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de octubre de 2025.

MES: OCTUBRE DEL 2025												
Del 01/10/2025 AL 31/10/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
13	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
14	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X

16	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
17	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
18	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
19	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
20	GORDILLO CHIQUINQUIRA	HUBER BAUTISTA	7.062.150	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	05/10/2025	05	X	X	X	X
21	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	05/10/2025	05	X	X	X	X
22	GUITIERREZ PAEZ	JOSE OCTAVIO	96.195.067	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	05/10/2025	05	X	X	X	X
23	BOVELO GONZALO	ARISTOBULO	96.194.845	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
24	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
25	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	11/10/2025		21	X	X	X	X
26	GONZALEZ GUTIERREZ	CAMILO JOSE	1.006.456.807	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	15/10/2025		17	X	X	X	X
27	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	20/10/2025		12	X	X	X	X
28	RODRIGUEZ CASTELLANOS	JOSE OBANDO	1.075.292	OFICIAL	$ 1.423.500,00	21/10/2025		11	X	X	X	X

Cuadro de relación de planillas de seguridad social e integral del personal de obra.

MES COTIZADO	EMPRESA	NIT	NUMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO	NUMERO DE TRABAJADORES
JULIO - 2025	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	9490259868	$ 1,617,600	06
JULIO - 2025	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	1112293781	$ 2.102.700	06
SEPTIEMBRE - 2025	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	9493024023	$ 2,096,600	18
SEPTIEMBRE - 2025	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	1112600331	$ 2.187.400	06
OCTUBRE - 2025	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	9494391655	$ 6,083,200	22
OCTUBRE - 2025	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	1112747349	$ 2.187.400	06

ANEXO 02. Planillas de seguridad social integral del periodo del 01 al 31 de octubre del 2025.

7. CHARLAS PREOPERACIONALES


En cuanto a educación en seguridad y salud en el trabajo se realizan inducciones al ingreso de personal, capacitaciones semanales de acuerdo a la Matriz de identificación de necesidades de capacitación por cargos y charlas pre operacionales diarias mediante análisis de trabajo seguro de cada actividad ejecutada.




Fotografía 73.



Fotografía 74.

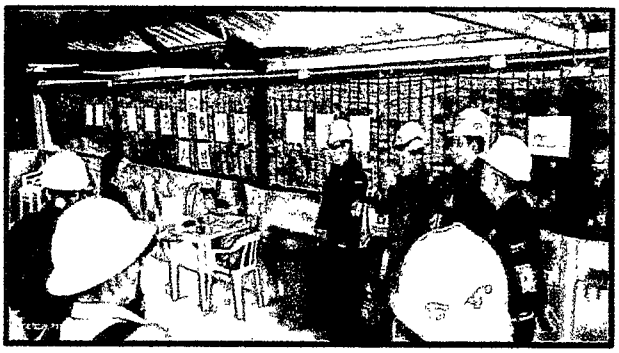

Fotografía 75.

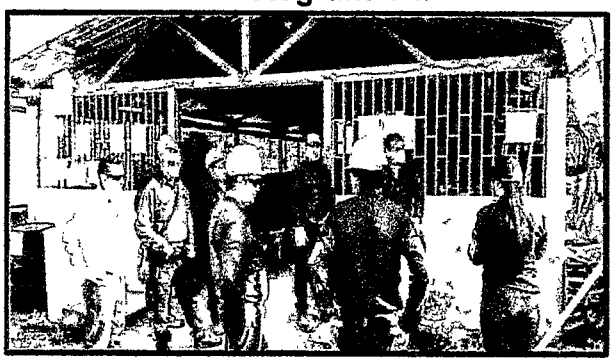

Fotografía 76.



Fotografía 77.



Fotografía 78.



Fotografía 79.




Fotografía 80.

Anexo 03: Reporte de lista de asistencia a charlas SST.


8. EQUIPOS ANTE EMERGENCIAS

Equipos de respuesta ante emergencia, se realiza inspección mensual y se revisa que estén en buen estado.

Registro fotográfico equipos de Emergencia y señales SST.

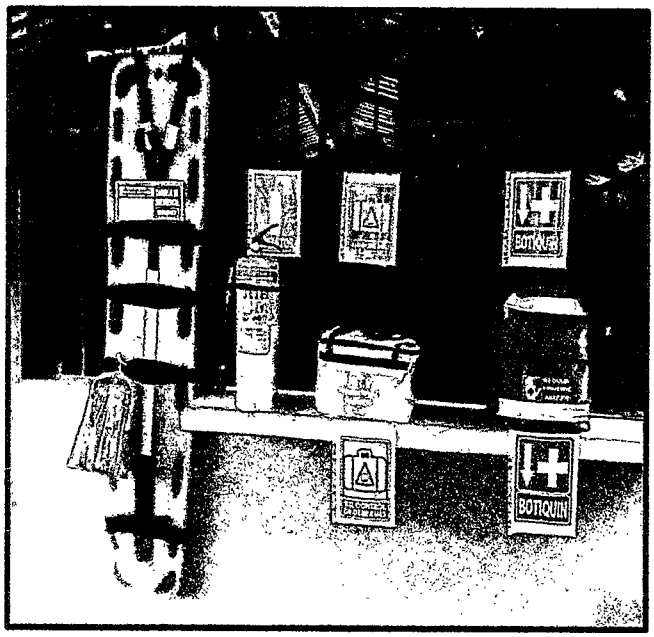


Fotografía 81.

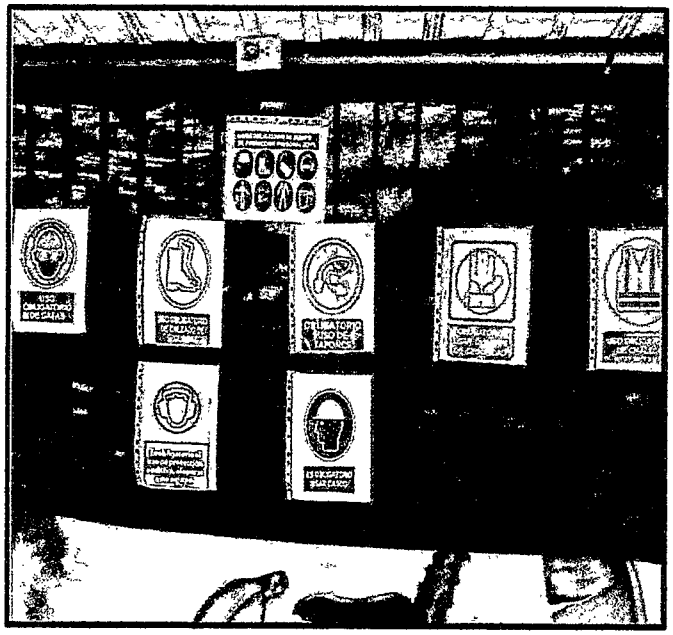

Fotografía 82.




Fotografía 83.

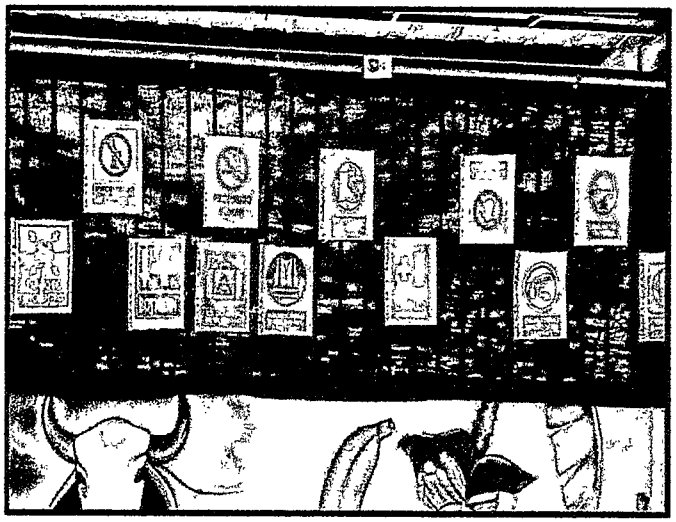

Fotografía 84.

9. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

Durante los periodos que estuvo en ejecución la obra, no se presentaron accidentes laborales, se manejó un plan de capacitaciones adecuado para la prevención y mitigación de cualquier clase de suceso en las labores diaria.

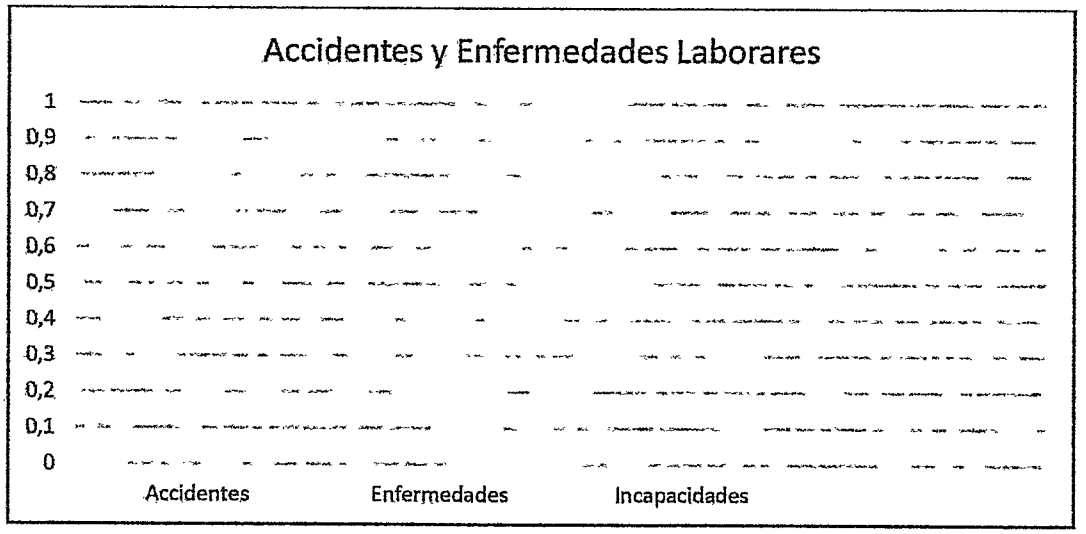

Prevenir los accidentes de trabajo es importante para las empresas, más allá del cumplimiento de una norma, ayuda a mejorar las condiciones laborales, a reducir la siniestralidad y promover la salud de los trabajadores. Se ha evidenciado que realizar capacitaciones en emergencias, autocuidado, higiene postural; la evaluación de riesgos de los lugares de trabajo, equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, factores psicosociales, etc., disminuyen la accidentalidad y el ausentismo laboral lo cual redunda en tiempo productivo para la empresa.

Es necesario conocer dónde está el riesgo, lo cual se logra conociendo las condiciones laborales y ambientales en que se encuentran los trabajadores de la empresa a través de un Análisis de trabajo seguro; y la manera de hacer que estos sean mínimos, mejorando las condiciones de trabajo, aplicando medidas de seguridad, higiene industrial, medicina preventiva, formación y ergonomía, es decir, a través del programa de prevención.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el último semestre de vigencia 2019, se genera las siguientes recomendaciones, las cuales quedan a consideración del Grupo de Talento Humano, así:

- Se recomienda realizar charlas de Seguridad y salud en el Trabajo, con la legislación vigente para aplicación y cumplimiento del SG-SST
- Realizar antes de empezar laborales una pausa activa...
- Señalizar de acuerdo a la labor que se está ejecutando
- Se recomienda realizar actualización y verificación de la documentación asociada a seguridad y salud en el trabajo
- Según el Decreto 1072 de 2015 ARTÍCULO 2.2.4.6.17. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe aportar con "cumplimiento con la legislación de dicho decreto e incluidos los estándares mínimos del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales que le apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo por lo cual se recomienda de acuerdo a lo estipulado la resolución 0312 de 2019.

CONCLUSIONES

- Se evidencia que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa cuenta con una Política acorde al Sistema Integrado de Planeación y Gestión, asimismo se resaltan las acciones de mejoramiento continuo implementadas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el compromiso con la adopción del PAGA basado en la legislación ambiental vigente Por otra parte se identifica que dicho Sistema vela por la seguridad de los trabajadores de la empresa y cuenta con mecanismos de prevención y mitigación de los posibles riesgos laborales que pudiesen presentarse al interior de la empresa

- Así mismo, se sugiere continuar con el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordé con la nueva normatividad emitida por el Ministerio de Trabajo con el ánimo de promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y controlar los factores de riesgo que pueden afectar a sus servidores, visitantes y contratistas a través de accidentes o enfermedades laborales en las instalaciones de la entidad.

Anexos:

1. Lista de asistencia a charlas
2. Planillas de seguridad social integral del periodo del 01 al 31 de octubre del 2025.
3. Planillas entrega de EPP.

Elaborado por;

ERIKA MENDIETA C.

ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO
PROFESIONAL SST
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

2976

	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	CODIGO: SST-FO-06 VERSIÓN: 4.0 FECHA: OCTUBRE 2024 PAGINA: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Carlos Ramirez.

CEDULA N°: 1116985943

CARGO: Operador

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

EPP	CANTIDAD	FECHA
Camisa	2	20/10/2025
Pantalon	2	20/10/2025
Botas	1	20/10/2025
Casco	1	20/10/2025
Guantes	1	20/10/2025
Gafas	1	20/10/2025
Tapa oidos	1	20/10/2025
reflectivo	1	20/10/2025
Radio	1	20/10/2025
Tapa bocas	1	20/10/2025

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR Carlos Ramirez

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Belki contreras

LUISA FERNANDA TORRES NIÑO
RESPONSABLE DE SST

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2967

	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	CODIGO: SST-FO-06 VERSIÓN: 4.0 FECHA: OCTUBRE 2024 PAGINA: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Roberto jose melo Pineda

CEDULA N°: 96195513

CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

EPP	CANTIDAD	FECHA
Pantalon	2	23/010/2025
Camisa	2	23/010/2025
botas	1	23/010/2025
Casco	1	23/010/2025
Guantes	1	23/010/2025
Gafas	1	23/010/2025
Tapa oidos	1	23/010/2025
Tapa bocas	1	23/010/2025

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR Roberto jose melo

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Belkis contreras

LUISA FERNANDA TORRES NIÑO
RESPONSABLE DE SST

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**	CODIGO: SST-FO-06 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Jose oBando Castellanos

CEDULA N°: 1.075.292

CARGO: Maestro

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

EPP	CANTIDAD	FECHA
Pantalón	2	29/10/2025
Camisa.	2	29/10/2025
Botas	1	29/10/2025
casco	1	29/10/2025
Guantes	1	29/10/2025
Gafas	1	29/10/2025
Tapa oidos	1	29/10/2025
Tapa bocas	1	29/10/2025

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Belkis Contreras

ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO
RESPONSABLE DE SST

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2969

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			
PRIMER APELLIDO:	APELLIDO	DEPARTAMENTO:	
DIRECCIÓN:	CRA 50 N° 4A -109	TELÉFONO:	
TIPO APORTANTE:	01-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	
TIPO PLANILLA:	PROPIA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (LEY 1607 DE 2012, ART 114-1 ET):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7891220641	TIPO DE PLANILLA		
PERIODO COTIZACIÓN (PROS.)	MES	Mes Año	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Mes Año
DÍAS DE MORA					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			NÚMERO AUTORIZACIÓN		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADO	EMPLEADOR	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230101	COLPENSIONES	1	$ 243.200	$	$	$	$	$	$	$ 243.200	$	$ 243.200
SUBTOTALES										$ 243.200	$	$ 243.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		UPC		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230101	EPS SANITAS S.A.S	1		$		$		$	$ 190.000	$	$	$	$ 190.000	$	$	$ 190.000
SUBTOTALES													$ 190.000	$	$	$ 190.000

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | 1ER APELLIDO | 2DO APELLIDO | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | NO. HORAS | EXTRANJERO | RESIDENTE EN EL EXTERIOR | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947891	9	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANSALVADOR	CARRERA 9 # 20 - 12	ARAUCA-ARAUCA	3114815501	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494391655	9494391655	E	2025/11/25	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,083,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1120869476	ACHURY CRISTIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1116504316	ALMANZA RICARDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	91247775	BENAVIDES ELIBARDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	96194845	BOVELO ARISTOBULO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1118555596	CONTRERAS BELKIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	1121836072	FONSECA PABEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
7	CC	17546035	GIRALDO JESUS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
8	CC	1006456807	GONZALEZ CAMILO	X																	230301	16	$759,200	$121,500	EPS041	16	$759,200	$30,400	CCF67	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$4,000	16	$0	$0	SI	$186,300
9	CC	7062150	GORDILLO HUBER		X															X	230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF67	5	$302,950	$12,200	14-23	5	$237,250	$1,300	5	$0	$0	SI	$61,000
10	CC	96195067	GUTIERREZ JOSE		X															X	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF67	5	$263,250	$10,600	14-23	5	$237,250	$1,300	5	$0	$0	SI	$59,400
11	CC	17589020	LAYA PEDRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
12	CC	96195513	MELO ROBERTO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF67	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0	SI	$232,900
13	CC	1128388541	MENDIETA ERIKA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
14	CC	74347917	MORA VICTOR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
15	CC	52420745	NARANJO ALBA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
16	CC	1116785943	RAMIREZ CARLOS	X																	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF67	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0	SI	$128,200
17	CC	1090469009	RINCON JUAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
18	CC	1116778461	RIVAS FREDY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
19	CC	1075292	RODRIGUEZ JOSE	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF67	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$2,500	10	$0	$0	SI	$116,500
20	CC	74862000	RODRIGUEZ RENE		X															X	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF67	5	$263,250	$10,600	14-23	5	$237,250	$1,300	5	$0	$0	SI	$59,400
21	CC	1116854941	RUIZ DANNY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
22	CC	1026284946	SALGADO GLORIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(22)																						$24,768,900	$3,964,000			$24,768,900	$991,800			$24,886,600	$996,700			$24,768,900	$130,700		$0	$0		$6,083,200

2025/11/05 03:50 PM

2471

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947891	9	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANSALVADOR	CARRERA 9 # 20 - 12	ARAUCA-ARAUCA	3114815501	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494391655	9494391655	E	2025/11/25	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,083,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$3,964,000	$0	$0	$3,964,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$843,000	$0	$0	$843,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,893,200	$0	$0	$2,893,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$130,700	$0	$0	$130,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	22	$130,700	$0	$0	$130,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$996,700	$0	$0	$996,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	22	$996,700	$0	$0	$996,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$991,800	$0	$0	$991,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$247,000	$0	$0	$247,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$288,800	$0	$0	$288,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$342,000	$0	$0	$342,000
TOTAL				22	$6,083,200	$0	$0	$6,083,200

2025/11/05 03:50 PM

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☑ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	FIRMA: Pabel Fonseca	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: IDENTIFICACION DE AMENAZAS AMBIENTALES

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
04/10/25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:00AM	7:45 AM.	26

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	1128388541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	ERIKA MENDIETA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA FDA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian david achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

PAGINAS 1-2

2973

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA**	FIRMA:	EMPRESA: **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	HUBER BAUTISTA GORDILLO CHIQUINQUIRA	7062150	AYUDANTE	Huber Bautista
4	RENE ALEXANDER RODRIGUEZ SANABRIA	74862000	AYUDANTE	Rene Rodriguez.
5	JOSE OCTAVIO GUITIERREZ PAEZ	96195067	AYUDANTE	Jose octavio
6	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	aristobulo bovelo
7	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
8	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto melo
9	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
10	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo Ramirez
11	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose obando
12				
13				
14				
15				

PAGINAS
2-2

2974

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS: _____
☒ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	PABEL FONSECA	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
09-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:00 AM	8:10 AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	1128388541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	ERIKA MENDIETA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian david achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

2975

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA**	FIRMA:	EMPRESA : **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

2-2

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☑ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	FIRMA: PABEL FONSECA	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: SENSIBILIZACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMATICO

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
17-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:30 AM	8.10 AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	1128388541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	ERIKA MENDIETA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian David achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

2977

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	FIRMA:	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	Aristobulo bovelo
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto melo
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo Ramirez
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose obando
10				
11				
12				
13				
14				
15				

2-2

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☑ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA
PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	PABEL FONSECA	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: INDUCCIÓN AMBIENTAL

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
23-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:15AM	8:15AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	1128388541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	ERIKA MENDIETA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian david achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

2979

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA**	FIRMA:	EMPRESA : **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	aristobulo bovelo
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto melo
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo Ramirez
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose obando
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

2980

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	FIRMA: Erika Mendieta	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: CULTURA DE AUTOCUIDADO Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
01-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:00AM	8:00AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R.
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian david achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA :
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO		CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contrera
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	aristobulo bovelo
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto melo
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose obando
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☑ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	FIRMA: ERIKA MENDIETA	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS LABORALES

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
06-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:10AM	8:00 AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

2483

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO**	FIRMA:	EMPRESA : **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA .
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	ERIKA MENDIETA	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: CONCEPTOS BASICOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (LABORAL)

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
14-10-25	VEREDA PTO. SAN SALVADOR	7:00AM	8:00 AM	26

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza R
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian David achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

2485

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	FIRMA.	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	HUBER BAUTISTA GORDILLO CHIQUINQUIRA	7062150	AYUDANTE	
4	RENE ALEXANDER RODRIGUEZ SANABRIA	74862000	AYUDANTE	
5	JOSE OCTAVIO GUITIERREZ PAEZ	96195067	AYUDANTE	
6	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	
7	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
8	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	
9	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	
10	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	
11	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	
12				
13				
14				
15				

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	FIRMA: ERIKA MENDIETA	EMPRESA : CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
20-10-25	VEREDA PTO SAN SALVADOR	7:15AM	8.15AM	23

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	PALETERA	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91247775	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian david achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.**	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: **ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO**	FIRMA:	EMPRESA : **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA:

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17546035	MAESTRO DE OBRA	
3	ARISTOBULO BOVELO GONZALO	96194845	AYUDANTE	Aristobulo bovelo
4	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL	
5	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto melo
6	CAMILO JOSE GONZALEZ GUITIERREZ	1006456807	AYUDANTE	Camilo Gonzalez
7	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R.
8	JOSE OBANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	1075292	OFICIAL	Jose obando
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
