	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**AB 033**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA P43 GLORIETA PINARES - ACOMETIDA ELÉCTRICA**

FECHA DE INICIO **01 / 09 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la visita técnica al punto de cámara P43 Glorieta Pinares, atendiendo el requerimiento por equipo fuera de servicio (punto apagado), se realiza diagnóstico eléctrico del sistema de alimentación asociado, obteniéndose los siguientes hallazgos:

- En la entrada de la protección bipolar de 20A, el valor de voltaje medido es 0V, condición que impide el suministro hacia el circuito de la cámara.
- Se verifica continuidad de la red en el poste auxiliar, encontrándose igualmente un valor de 0V, lo que confirma ausencia de tensión en el ramal de alimentación intermedio.
- Al no identificarse disponibilidad de energía proveniente de la red de iluminación pública, fuente principal de alimentación del punto, se concluye que la falla se origina en la pérdida de continuidad del conductor de acometida.

Como medida correctiva, se establece la necesidad de instalar un nuevo cable eléctrico, para restituir la acometida y garantizar el suministro eléctrico. Este elemento resulta esencial, dado que la cámara depende de una alimentación estable y continua para operar. La ausencia de este recurso compromete la captura de video en tiempo real, afecta la capacidad de monitoreo preventivo y reactivo en la zona, y reduce la cobertura del sistema de videovigilancia en un punto crítico de control vehicular y peatonal.


GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8055752151451 - **longitud:** -75.688986247285 - **altitud:** 1396 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







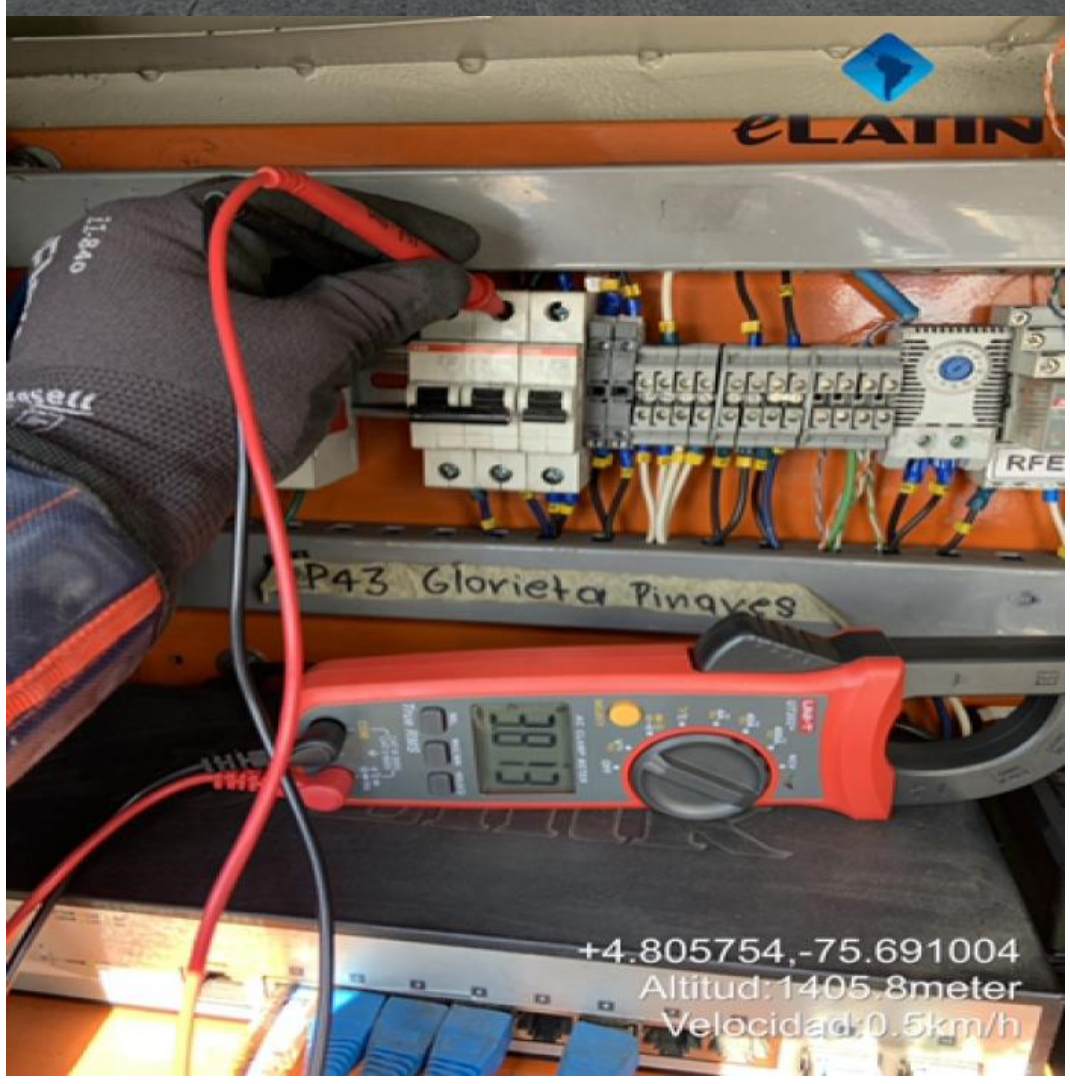







REPUESTO SOLICITADO
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **Ítem:** Cable Concéntrico 1x8+8 AWG**.** Cantidad: treinta (30) metros. Dado que el ítem requerido para la solución de la falla no se encuentra incluido en el listado de repuestos del documento **ANEXO 1. LISTA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO**, se solicita a la supervisión, seguir el procedimiento consignado en el documento 2. FICHA TECNICA - MANTO SIES 2025 – FIRMADA que contiene el ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA CCTV Y LÍNEA DE EMERGENCIA 123 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA en la numeral 5. ALCANCE DEL PROYECTO capítulo 3 numeral 3,5: "*Componentes no incluidos en la lista de repuestos y materiales: Si durante la ejecución del contrato se identifica que un elemento o material requerido no se encuentra relacionado en el listado del Anexo 1, el contratista debe informar de forma oportuna al supervisor del contrato. Su adquisición deberá ser justificada y sustentada con un mínimo de tres cotizaciones.* *El valor será fijado a través de una fórmula matemática y estadística conforme el supervisor del contrato o interventoría y contratista."*

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	
