		Sistema de Gestión de Calidad	
eLATIN	**ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025**	**FORMATO N°:**	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**MC 027**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA P18 KRA 26/69 CUBA - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA - FUENTE DE PODER 12V 1,5A CÁMARA FIJA IP TIPO BALA**

FECHA DE INICIO **06 / 09 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

En el acta de afectación de bolsa N° AB 041, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema y la falla en la cámara fija ip tipo bala que está asociada a la fuente de alimentación, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías en la unidad UPS y una (1) fuentes de poder 12v 1,5A de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 041, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Adicionalmente con esta intervención de la fuente de poder se permite restablecer el suministro energético a la cámara fija, recuperando la transmisión de señal de video hacia el sistema central de monitoreo. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8055798260019 - **longitud:** -75.737015852189 - **altitud:** 1288 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









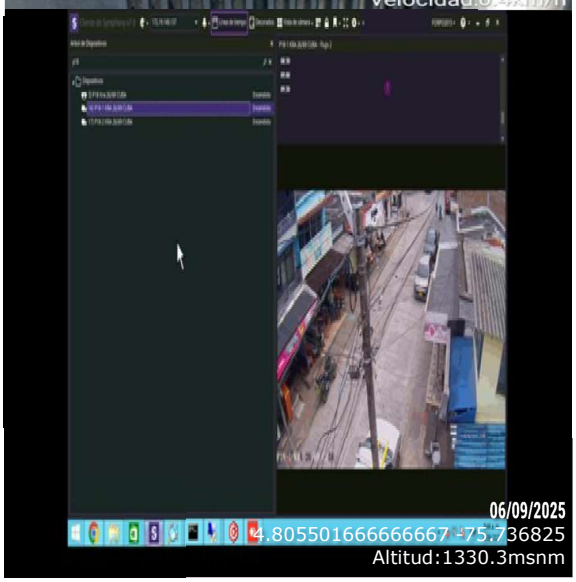

06/09/2025
4.8054950000000005 -75.736858333333334
Altitud:1328.0msnm
Velocidad:0.7km/h


06/09/2025
Altitud:1319.0msnm
Velocidad:0.2km/h


06/09/2025
4.805501666666667 -75.736825
Altitud:1330.3msnm
Velocidad:0.3km/h


06/09/2025
4.8054933333333334 -75.736803333333333
Altitud:1329.1msnm
Velocidad:0.4km/h


06/09/2025
4.805501666666667 -75.736825
Altitud:1330.3msnm
Velocidad:0.3km/h


06/09/2025
4.805501666666667 -75.736825
Altitud:1330.3msnm


06/09/2025
+4.805514,-75.737028
Altitud:1287.4meter


06/09/2025
+4.805366,-75.737335
Altitud:1235.6meter


06/09/2025
+4.805575,-75.736936
Altitud:1280.6meter


06/09/2025
+4.805540,-75.736948
Altitud:1287.0meter


P18 Cr26-69 Cuba
Pereira Mala.
Rechargeable VRLA Battery
Pb
06/09/2025
+4.805540,-75.736948
Altitud:1289.0meter


06/09/2025
+4.805381,-75.737021
Altitud:1251.5meter



OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación y la cámara fija queda con enlace de red restablecido (link activo) y transmisión de video en visualización normal hacia el sistema de monitoreo.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	
