eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MC 031	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P67 KRA 8/12 CENTRO - CÁMARA DOMO PTZ

FECHA DE INICIO **16 / 09 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

En el acta de afectación de bolsa N° AB 051, se le informó a la supervisión sobre la detección de una avería en la cámara PTZ, el equipo permanece apagado a pesar de encontrarse energizado, aunque mantiene respuesta a nivel de red mediante protocolo (Ping) hacia su dirección IP. No es posible establecer acceso a la interfaz de gestión web, y el sistema no genera señal de video. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de la cámara PTZ de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 051 donde

Se realizó la desinstalación de la cámara tipo PTZ con falla, con su respectiva fuente de poder (adaptador de corriente).
Se desinstaló el acople existente debido a que no era compatible con la nueva cámara a instalar.
Se instaló el nuevo acople.
Se realizó la instalación de la nueva cámara tipo PTZ.
Se instaló una (1) fuente de poder totalmente nueva la cual fue conectada a la UPS.
Se conectó la cámara tipo PTZ al Switch de punto de cámara.
Se realizaron pruebas de conectividad, calibración de video, recorrido y funcionalidad.

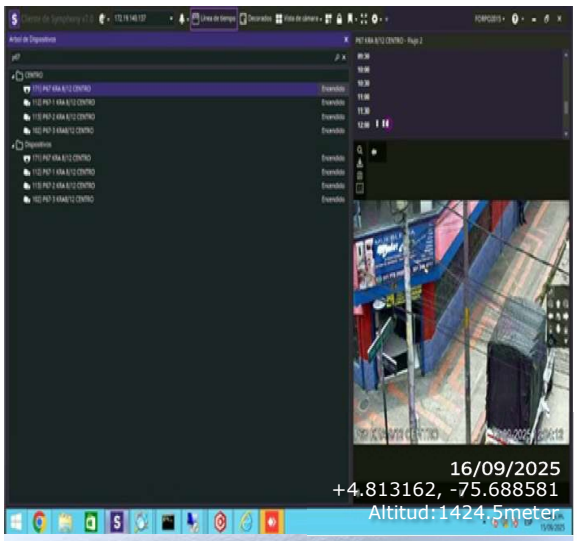
Característica del equipo instalado:

Marca: DAHUA
Modelo: DH-SD5A323GB-HNR
Cantidad: 1
Número de serie: AM148FEPAJ1E8DA

Una vez concluidas las pruebas de manera exitosa, la cuadrilla se retira del punto de cámara sin novedad.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8130895353568 - **longitud:** -75.688504714098 - **altitud:** 1422 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



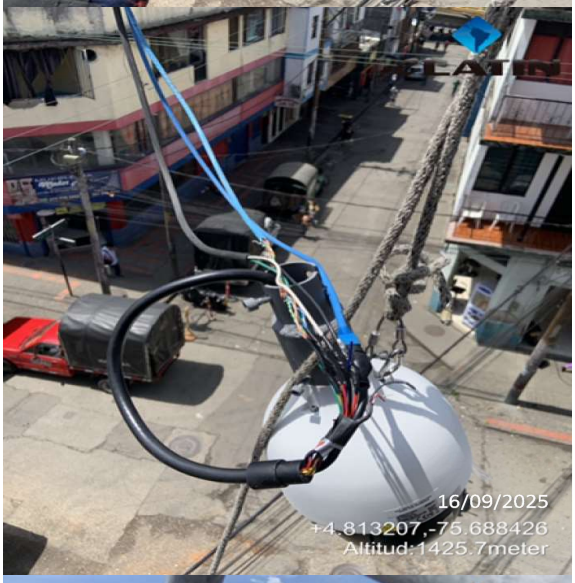


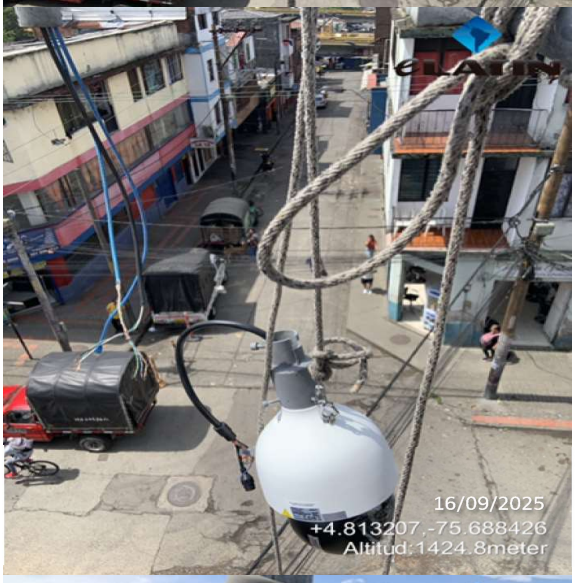





eLATIN
16/09/2025
+4.813225,-75.688436
Altitud:1427.2meter

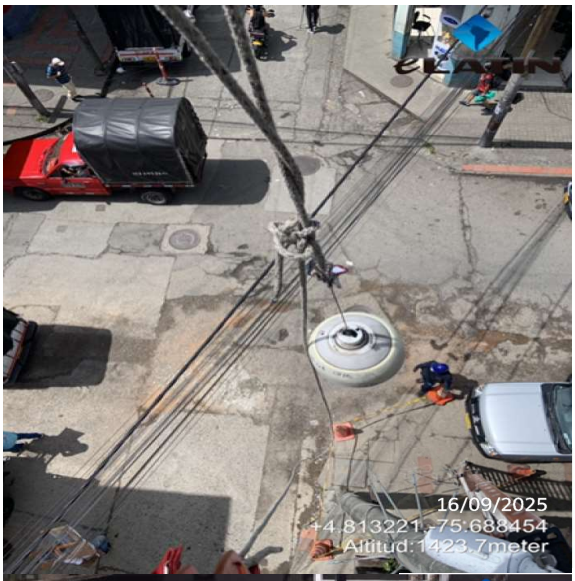

eLATIN
16/09/2025
+4.813225,-75.688436
Altitud:1424.9meter

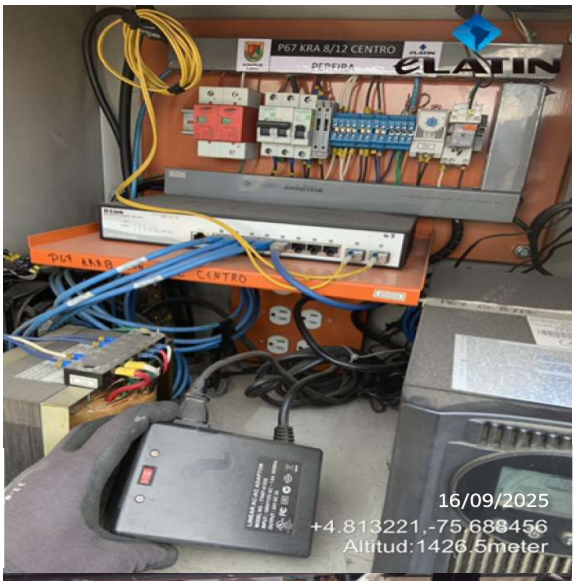

eLATIN
16/09/2025
+4.813207,-75.688426
Altitud:1425.7meter


eLATIN
16/09/2025
+4.813207,-75.688426
Altitud:1424.8meter

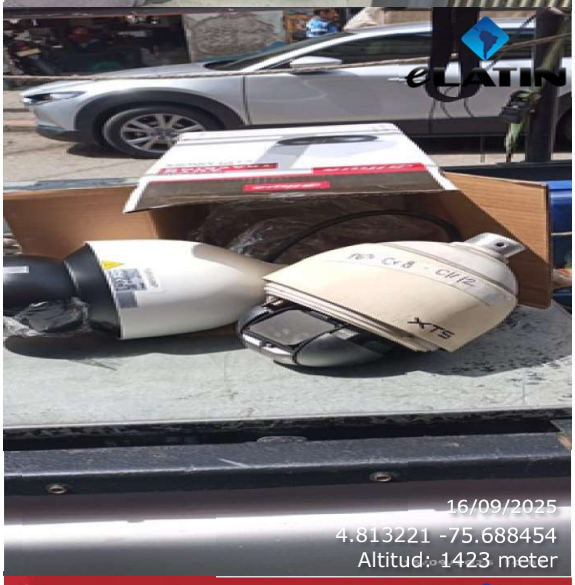

eLATIN
16/09/2025
+4.813221,-75.688454
Altitud:1431.9meter


eLATIN
16/09/2025
+4.813221,-75.688454
Altitud:1427.8meter

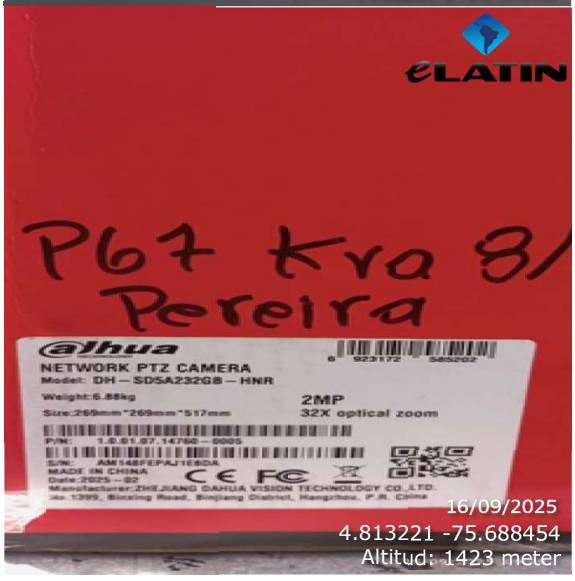

16/09/2025
+4.813221,-75.688454
Altitud:1423.7meter


P67 KRA 8/12 CENTRO
PEREIRA
16/09/2025
+4.813221,-75.688456
Altitud:1426.5meter

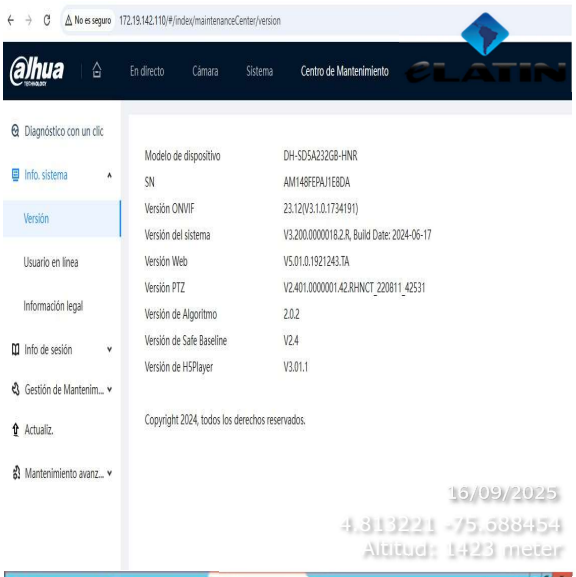

P67 Cr 8 - Cll 12
16/09/2025
4.813221 -75.688454
Altitud: 1423 meter

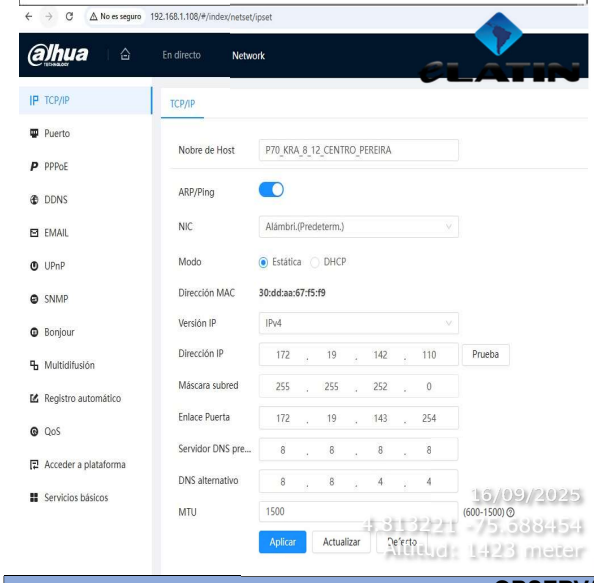

16/09/2025
4.813221 -75.688454
Altitud: 1423 meter


P67 Cr 8 - Cll 12
Pereira
16/09/2025
4.813221 -75.688454
Altitud: 1423 meter




P67 kra 8/
Pereira
alhua
NETWORK PTZ CAMERA
Model: DH-SD5A232GB-HNR
2MP
32X optical zoom
MADE IN CHINA
16/09/2025
4.813221 -75.688454
Altitud: 1423 meter









OBSERVACIONES		
Luego de ejecutarse las labores de instalación, se restablece el servicio de transmisión de video en el punto de cámara.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	
