eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MC 033	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P70 KRA 9/10 VILLAVICENCIO - ESTACIÓN PEREIRA - CÁMARA DOMO PTZ

FECHA DE INICIO 16 / 09 / 25

NOVEDADES PRELIMINARES

En el acta de afectación de bolsa N° AB 053, se le informó a la supervisión sobre la detección de una avería en la cámara PTZ, el equipo permanece apagado a pesar de encontrarse energizado, aunque mantiene respuesta a nivel de red mediante protocolo (Ping) hacia su dirección IP. No es posible establecer acceso a la interfaz de gestión web, y el sistema no genera señal de video. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de la cámara PTZ de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 053 donde

Se realizó la desinstalación de la cámara tipo PTZ con falla, con su respectiva fuente de poder (adaptador de corriente).
Se desinstaló el acople existente debido a que no era compatible con la nueva cámara a instalar.
Se instaló el nuevo acople.
Se realizó la instalación de la nueva cámara tipo PTZ.
Se instaló una (1) fuente de poder totalmente nueva la cual fue conectada a la UPS.
Se conectó la cámara tipo PTZ al Switch de punto de cámara.
Se realizaron pruebas de conectividad, calibración de video, recorrido y funcionalidad.

Característica del equipo instalado:

Marca: DAHUA
Modelo: DH-SD5A323GB-HNR
Cantidad: 1
Número de serie: AM148FEPAJ1E8DA

Una vez concluidas las pruebas de manera exitosa, la cuadrilla se retira del punto de cámara sin novedad.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8124266947928 - **longitud:** -75.688668131535 - **altitud:** 1419 **m**

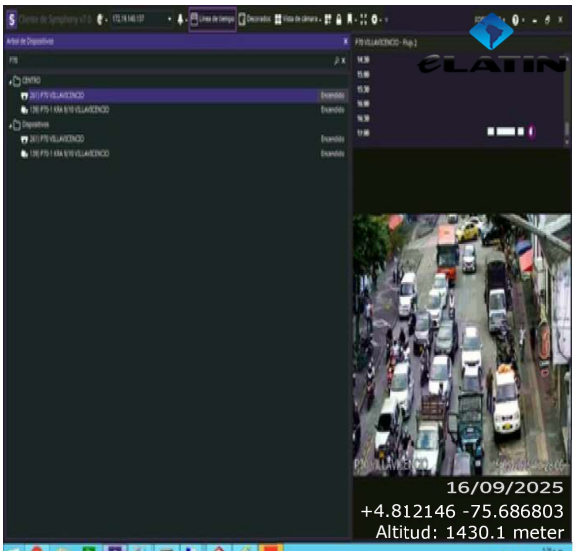
REGISTRO FOTOGRÁFICO



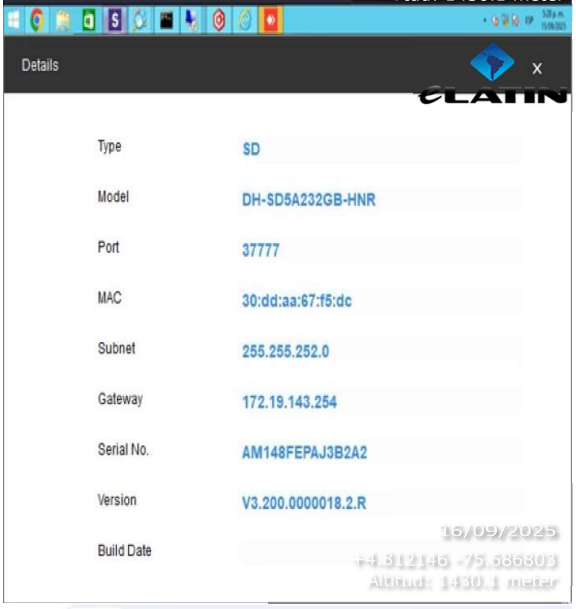


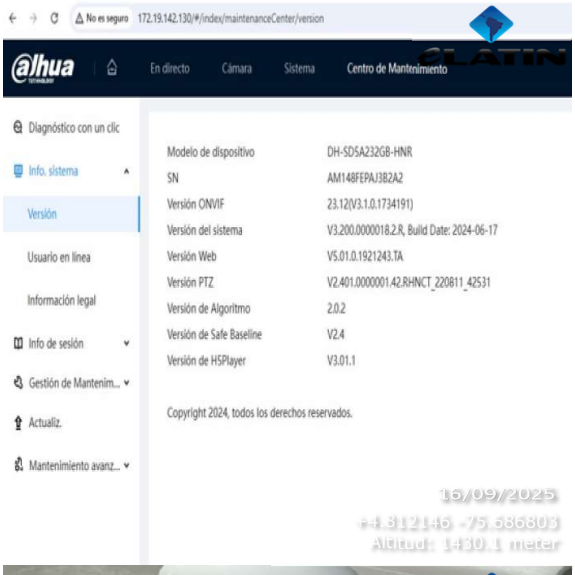


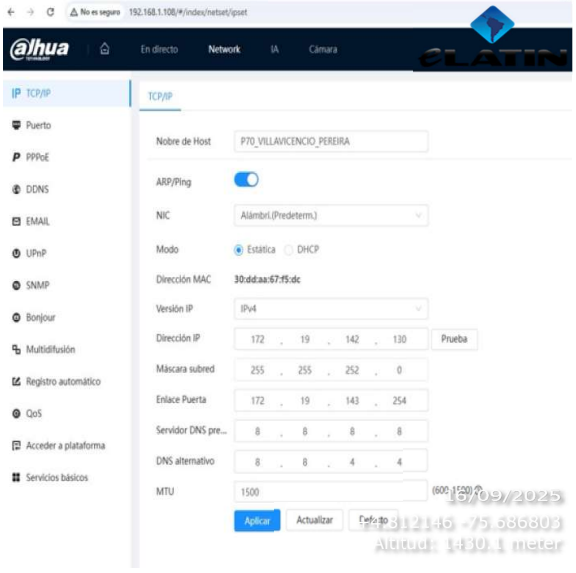



16/09/2025
+4.812146 -75.686803
Altitud: 1430.1 meter

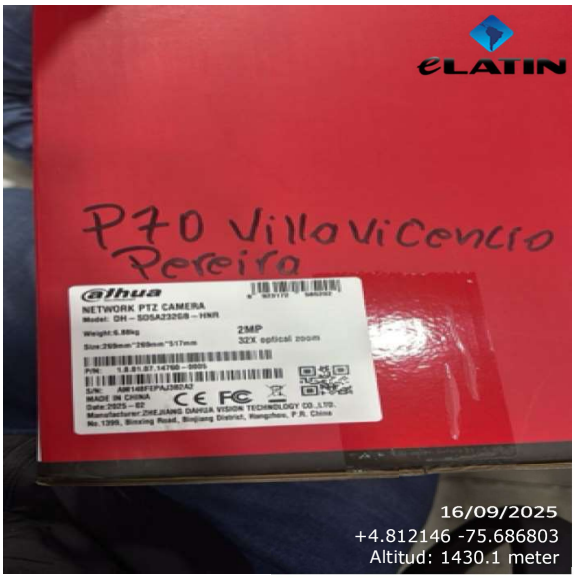

Apostar
P70 VILLAVICENCIO
16/09/2025
+4.812146 -75.686803
Altitud: 1430.1 meter


Details
Type SD
Model DH-SD5A232GB-HNR
Port 37777
MAC 30:dd:aa:67:f5:dc
Subnet 255.255.252.0
Gateway 172.19.143.254
Serial No. AM148FEPAJ3B2A2
Version V3.200.0000018.2.R
Build Date
16/09/2025
+4.812146 -75.686803
Altitud: 1430.1 meter


Centro de Mantenimiento
Modelo de dispositivo DH-SD5A232GB-HNR
SN AM148FEPAJ3B2A2
Versión ONVIF 23.12(V3.1.0.1734191)
Versión del sistema V3.200.0000018.2.R, Build Date: 2024-06-17
Versión Web V5.01.0.1921243.TA
Versión PTZ V2.401.0000001.42.RHNCT_220811_42531
Versión de Algoritmo 2.0.2
Versión de Safe Baseline V2.4
Versión de H5Player V3.01.1
Copyright 2024, todos los derechos reservados.
16/09/2025
+4.812146 -75.686803
Altitud: 1430.1 meter


TCP/IP
Nobre de Host P70_VILLAVICENCIO_PEREIRA
ARP/Ping
NIC Alámbri.(Predeterm.)
Modo Estática DHCP
Dirección MAC 30:dd:aa:67:f5:dc
Versión IP IPv4
Dirección IP 172 . 19 . 142 . 130 Prueba
Máscara subred 255 . 255 . 252 . 0
Enlace Puerta 172 . 19 . 143 . 254
Servidor DNS pre... 8 . 8 . 8 . 8
DNS alternativo 8 . 8 . 4 . 4
MTU 1500
Aplicar Actualizar Defecto
16/09/2025
+4.812146 -75.686803
Altitud: 1430.1 meter


P70 VILLAVICENCIO
SIES-123 PEREIRA
NETWORK PTZ CAMERA
16/09/2025
+4.812146 -75.686803
Altitud: 1430.1 meter



OBSERVACIONES		
Luego de ejecutarse las labores de instalación, se restablece el servicio de transmisión de video en el punto de cámara.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	
