eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MC 045	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P61 KRA 13/19 GOBERNACIÓN - VENTILADOR CUADRADO 110V PARA GABINETE PUNTO DE CÁMARA - FUENTE DE PODER 12V 1,5A CÁMARA FIJA IP TIPO BALA

FECHA DE INICIO **18 / 09 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

En el acta de afectación de bolsa N° AB 066, se le informó a la supervisión sobre los daños que presentaron algunos componentes internos del punto de cámara, después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar el suministro e instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA


A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de dos (2) ventiladores cuadrados 110V para gabinete punto de cámara nuevos y una (1) fuente de poder 12v 1,5A de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 066, esta adecuación permite optimizar el flujo de aire, facilitando la extracción del aire caliente generado por los equipos activos en operación y promoviendo el ingreso de aire a menor temperatura desde el exterior. Con esta medida se mejora el intercambio térmico, se mitiga el riesgo de sobrecalentamiento de los dispositivos y se garantiza la estabilidad operativa del sistema, así mismo con dicha intervención se restablece el suministro energético de la cámara fija ip tipo bala, recuperando la transmisión de señal de video hacia el sistema central de monitoreo. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.


GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8095129567461 - **longitud:** -75.694760325583 - **altitud:** 1403 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





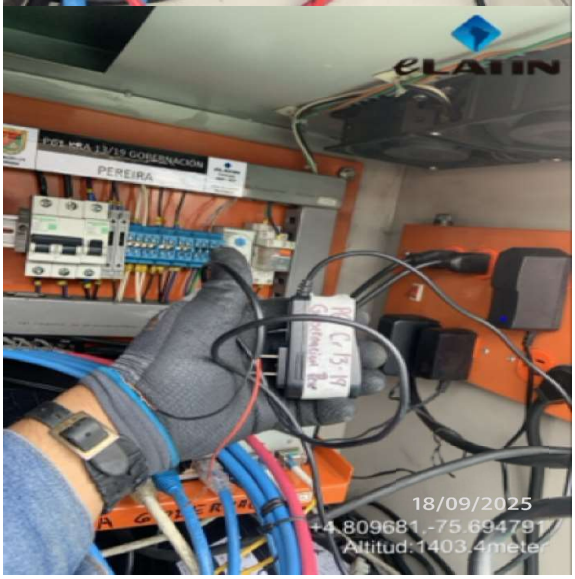

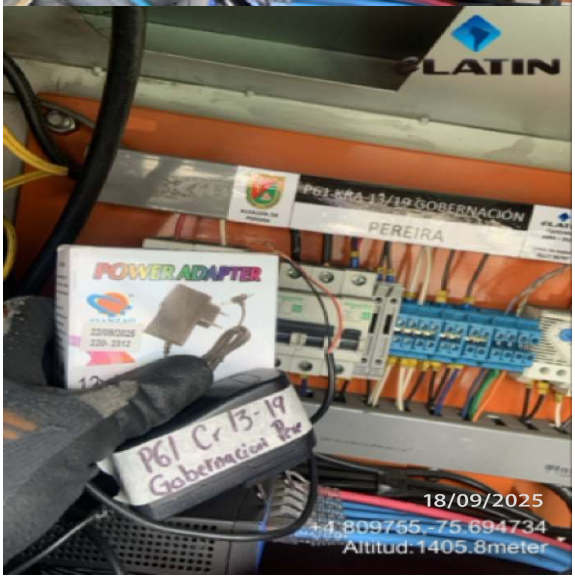


eLATIN
18/09/2025
+4.809786,-75.694785
Altitud:1403.2meter


P61 Cr13-19 Gobernación Pereira
18/09/2025
+4.809787,-75.694766
Altitud:1402.9meter


eLATIN
PEREIRA
P61 Cr13-19 Gobernación Pereira
P61 Cr13-19 Gobernación Pereira
18/09/2025
+4.809765,-75.694770
Altitud:1405.1meter



D-Link
18/09/2025
+4.809996,-75.694698
Altitud:1405.1meter


D-Link
18/09/2025
+4.809678,-75.694771
Altitud:1408.7meter


eLATIN
CNDF
CNDF
P61 Cr13-19 Gobernación Pereira
P61 Cr13-19 Gobernación Pereira
18/09/2025
+4.809965,-75.694668
Altitud:1402.9meter





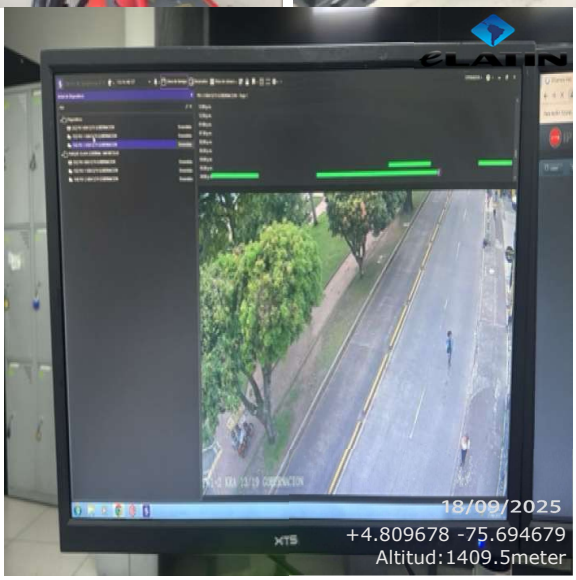

OBSERVACIONES		
Posterior a la instalación, los ventiladores de extracción térmica quedan operativos y en funcionamiento normal, garantizando el flujo de aire adecuado para la disipación del calor al interior del gabinete y así mismo la cámara queda con enlace de red restablecido (link activo) y transmisión de video en visualización normal hacia el sistema de monitoreo.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	
