
	FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
gestión ambiental & hseq SAS	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	VERSIÓN 1.0	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

CONTRATO No 00934 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No** 9 Páginas Totales 4

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Diana C. Ramos M	Interventoria	Representante Legal	Asistencia Virtual
Berenice Garces G	Consultor	Director Consultoria	Asistencia Virtual
César Augusto Rojas	Consultor	Geomorfología	Asistencia Virtual
Melissa Quintana	Interventoria	Apoyo Social	Asistencia Virtual
Yacquelines Hernandez	Consultor	Trabajadora Social	Asistencia Virtual
Oscar Leal	Supervision CAS	Apoyo Supervisión	Asistencia Virtual
Anderson Usma	Interventoria	Hidrologo	Asistencia Virtual
Mayra Salazar	Consultor	Coordinador	Asistencia Virtual
Miguel Ortiz	Interventoria	Director Interventoría	Asistencia Virtual

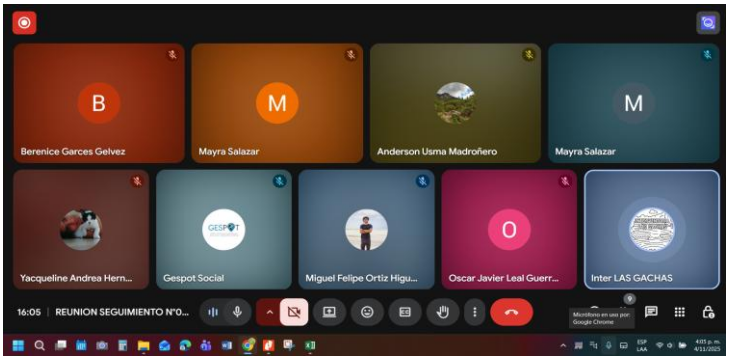

II. AGENDA O TEMARIO

- Toma de listado de asistentes
- Lectura del acta de reunion 8 del 21/10/2025
- Presentación de avances, productos o documentos según PDT - consultor
- Clarificación de responsabilidades y plazos - compromisos pactados
- Aclaración de dudas y discusión de puntos relevantes para la interventoría.
- Se anexa a esta acta la presentación realizada por el consutlor.

III. LUGAR Y HORA

LUGAR https://meet.google.com/jpd-xaaf-wjz **HORA** 4 pm

Grabación https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1M_NuU3oSxQt3ivpYLvQ3L0p9qCfenceB

	FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
gestión ambiental & hseq SAS	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	VERSIÓN 1.0	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

CONTRATO No 00934 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No** 9 Páginas Totales 4

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS PACTADOS	COMENTARIO Y/U OBSERVACION	FECHA ENTREGA - RESPONSABLES
Revisión de informe mensual enrtegado por el consultor el dia de hoy 4/11/2025	Entregar a la CAS el documento revisado y aprobado por interventoria	6/11/2025 INTERVENTORIA
Revision de avance del producto entregado 4/11/2025 en el Oficio 029	Entregar observaciones al documento entregado	7/11/2025 INTERVENTORIA

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

Seguimiento PDT Linea Base 1: a 3 de noviembre de 2025

	ACTIVIDADES	ACTIV D	ACTIV D	ACTIV D	VALOR PROYECT	VALOR PROGRA	VALO EJECUT.
1,01	Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414
1,01,01	Entrega Informe de Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica						
1,01,02	Revision Informe de Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica						
1,02	Recopilación de información secundaria	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414
1,02,01	Informacion historica de eventos de inundaciones o avenidas torrenciales	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,02	Caracterizacion climatica	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,03	Mapa de zonas de vida 1: 100000	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,04	Caracterizacion de suelos - Informacion secundaria	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,05	Mapa de humedades de Colombia	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,06	Peticiones quejas solicitudes y reclamos o conflictos ambientales	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,07	Documento técnico Informacion secundaria - aprobación del area de estudio	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,08	Entrega Informe de Recopilación de información secundaria						
1,02,09	Revision Informe de Recopilación de información secundaria/aprobacion area estudio						
1,03	Diseño de la estrategia de participación	0,54%	0,54%	0,54%	$ 3.718.869	$ 3.718.869	$ 3.718.869
1,03,01	Documento de metodologia y estrategia de participacion	0,54%	0,54%	0,54%	$ 3.718.869	$ 3.718.869	$ 3.718.869
1,03,02	Talleres de Socializacion (2 und)	0,00%	0,00%		$ 0	$ 0	$ 0
1,03,03	Entrega Informe del diseño de la estrategia de participación						
1,03,04	Revision Informe del diseño de la estrategia de participación						
1,04	Diseño conceptual de la base de datos geográfica	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414
1,04,01	Entrega Informe de Diseño conceptual de la base de datos geográfica						
1,04,02	Revision Informe de Diseño conceptual de la base de datos geográfica						
1,06	Programación de actividades	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.110.631
1,06,01	Entrega Informe de Programación de actividades						
1,06,02	Revision Informe de Programación de actividades						
1,07	Plan Operativo	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414
1,07,01	Entrega Informe de Plan Operativo			3,38%			
1,07,02	Revision Informe de Plan Operativo						
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 1						
1,08	**Entrega Informe Consolidado FASE 0A - Aprestamiento por parte del Consultor**						
1,09	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)**						
1,10	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)**						
1,05	Estudios soporte	28,30%	3,33%	3,81%	$ 197.628.136	$ 23.173.075	$ 26.057.563
1,05,01	Levantamiento topo batimetrico	3,37%	3,37%	0,67%	$ 23.021.570	$ 23.021.570	$ 4.604.314
1,05,02	Imágenes sensores remotos	0,02%	0,02%	0,02%	$ 157.505	$ 157.505	$ 157.505
1,05,03	Levantamiento orthofotomosaico drone + postproceso						
1,05,04	Modelo digital de superficie MDS	13,08%	0,00%	2,62%	$ 89.443.800	$ 0	##########
1,05,05	Cartografia basica generada para el proyecto 1:10000						
1,05,06	Geomorfologia a escala 1:10000 para la cuenca y de detalle para el cuerpo de agua	5,33%	0,00%		$ 40.577.052	$ 0	$ 0
1,05,07	Levantamiento de fauna y flora	4,38%	0,00%	0,50%	$ 34.063.840	$ 0	$ 3.406.384
1,05,08	Cobertura de tierra 1: 10000	1,51%	0,00%		$ 10.358.369	$ 0	$ 0
1,05,19	Informe de Estudios soporte						
1,05,10	Revision Informe de Estudios soporte						

GACHAS - GUADALUPE	02/09/25	08/09/25	15/09/25	22/09/25	29/09/25	06/10/25	13/10/25	20/10/25	27/10/25	03/11/25
$ 683.748.240	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9
% FISICO PROGRAMADO	**0,00%**	**0,00%**	**4,32%**	**10,11%**	**16,63%**	**17,39%**	**17,44%**	**18,87%**	**20,83%**	**21,08%**
% FISICO EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,28%	14,92%	15,31%	16,57%	17,44%	21,25%
FINANCIERO PROGRAMADO	$ -	$ -	$ 29.512	$ 69.144	$ 113.731	$ 118.931	$ 119.261	$ 129.011	$ 142.440	$ 144.163
FINANCIERO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.108	$ 102.013	$ 104.696	$ 113.321	$ 119.263	$ 145.321
DIFERENCIA FISICA	0,00%	0,00%	-4,32%	-10,11%	-11,35%	-2,47%	-2,13%	-2,29%	-3,39%	0,17%
DIFERENCIA FINANCIERA	$ -	$ -	-$ 29.512	-$ 69.144	-$ 77.623	-$ 16.917	-$ 14.565	-$ 15.690	-$ 23.177	$ 1.158

	FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
gestión ambiental & hseq SAS	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	VERSIÓN 1.0	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

CONTRATO No 00934 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No** 9 Páginas Totales 4

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

Presentacion de Actividades/productos/Insumos por parte del Consultor:

Se realizó un seguimiento del contrato 00934-2025, donde Berenice Garces Gelvez reportó un avance del 40% en el trabajo de campo, a pesar de las dificultades en el terreno montañoso. Mayra Salazar presentó los avances de la novena semana, incluyendo la socialización con la comunidad y el progreso en levantamientos topo batimétricos. Yacqueline Andrea Hernández Cacua destacó la participación de la alcaldía y la comunidad, así como las preocupaciones sobre la conservación del territorio, y se acordó un segundo taller.

Oscar Javier Leal Guerrero mencionó la falta de información sobre una queja de la comunidad y la necesidad de coordinar con la policía para facilitar el acceso a los terrenos, ya que algunos propietarios han mostrado resistencia. Garces informó que se levantarán 17 secciones transversales con tecnología RTK y se utilizará LIDAR para un modelo digital del terreno. La interventoría solicitó un cronograma detallado de actividades y se programó la próxima reunión de seguimiento para el 18 de noviembre.

Berenice Garces Gelvez informó sobre el avance del 40% en el trabajo de campo, aunque se han presentado dificultades debido al terreno montañoso. Mayra Salazar compartió los progresos de la novena semana, incluyendo la socialización con la comunidad y el levantamiento topo batimétrico. Yacqueline Andrea Hernández Cacua detalló la participación comunitaria y las preocupaciones sobre la conservación y el uso del territorio.
* Proceso de socialización con la comunidad y sus percepciones.
* Avances en el levantamiento topo batimétrico y uso de drones.

Seguimiento a Quejas y Acciones en Campo
Oscar Javier Leal Guerrero expresó inquietudes sobre una queja que no se ha podido verificar y la necesidad de dar una respuesta rápida para mantener la confianza de la comunidad. Yacqueline Andrea Hernández Cacua compartió que algunos propietarios han solicitado información previa antes de permitir el ingreso de los equipos de topografía. Se acordó que se informaría a las autoridades pertinentes y se coordinarían visitas al campo para asegurar el avance de los trabajos.
* Coordinación de reuniones con autoridades locales y provinciales.

Berenice Garces Gelvez explicó que se realizarán 17 secciones transversales en campo con tecnología RTK, y que el cauce se levantará con LIDAR para interpolar datos. Anderson Usma Madroñero mencionó que el modelo digital del terreno será integral, a pesar de los desafíos de acceso en la topografía. Garces también solicitó atención a cualquier comunicación relacionada con el acotamiento del cauce.
* Revisión y entrega de informes y productos relacionados con el proyecto.

Varios:
* Oscar Javier Leal Guerrero coordinará la vinculación del procurador provincial en una reunión futura.
* Mayra Salazar compartirá el informe mensual con la corporación para su revisión.
* Inter LAS GACHAS solicitará la entrega del producto a la corporación para revisión previa al cobro.
* Berenice Garces Gelvez realizará el levantamiento topobatimétrico y el vuelo con dron en el área de estudio.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Entegar cronograma de actividades de campo detallado	5/11/2025	consultor

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 18 **MES** Noviembre **AÑO** 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría.

en Bogotá., a los **cuatro** (Día en letras) **(4)** (Día en números) días del mes de **Noviembre** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) DIANA CAROLINA RAMOS

Representantel Legal - Directora de Proyectos

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista
