
ANX_04_Cronograma

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-262 DE 2025

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
0		**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**	**99 días**	**7/04/2025**	**6/08/2025**		**$ 2.751.562.197,01**
1		Acta de inicio	0 días	7/04/2025	7/04/2025		$ 0,00
2	**1**	**Capítulo 1. Explanación y Excavaciones.**	**24 días**	**7/04/2025**	**7/05/2025**		**$ 303.629.060,00**
3		Inicio capítulo 1	0 días	7/04/2025	7/04/2025	1	$ 0,00
4	1.1	Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).	12 días	7/04/2025	22/04/2025	3	$ 115.500.000,00
5	1.2	Demolición concreto estructural. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de	2 días	23/04/2025	24/04/2025	4	$ 5.555.460,00
6	1.3	Transporte de materiales prov. de explanación, canales, préstamos, sobreacarreos y	22 días	9/04/2025	7/05/2025	4FC-10 días	$ 182.573.600,00
7		Fin capítulo 1	0 días	7/05/2025	7/05/2025	2	$ 0,00
8	**2**	**Capítulo 2. Estructura de pavimento.**	**23 días**	**24/04/2025**	**22/05/2025**		**$ 592.604.544,01**
9		Inicio capítulo 2	0 días	24/04/2025	24/04/2025	5	$ 0,00
10	2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante.	2 días	25/04/2025	26/04/2025	9	$ 4.195.740,00
11	2.2	Afirmado.	2 días	28/04/2025	29/04/2025	10	$ 14.108.164,00
12	2.3	Sub base granular.	4 días	14/05/2025	17/05/2025	15FC-2 días;6	$ 355.265.000,00
13	2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.	2 días	19/05/2025	20/05/2025	12	$ 7.170.684,00
14	2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. (Incluye cemento asfáltico).	2 días	21/05/2025	22/05/2025	13	$ 182.160.000,00
15	2.6	Geotextil NT 2500.	13 días	30/04/2025	15/05/2025	11	$ 29.704.956,00
16		Fin capítulo 2	0 días	22/05/2025	22/05/2025	8	$ 0,00
17	**3**	**Capítulo 3. Obras de arte y Estructuras de contención**	**62 días**	**22/05/2025**	**6/08/2025**		**$ 1.745.131.000,00**
18		Inicio capítulo 3	0 días	22/05/2025	22/05/2025	14	$ 0,00
19	3.1	Cuneta de concreto Clase E, 3.500 psi con refuerzo en fibra	62 días	23/05/2025	6/08/2025	18	$ 1.745.131.000,00
20		Fin capítulo 3	0 días	6/08/2025	6/08/2025	17	$ 0,00
21		Plan de manejo de tráfico	99 días	7/04/2025	6/08/2025	3	$ 32.358.982,00
22		Plan de adaptación de la guía ambiental	99 días	7/04/2025	6/08/2025	21FC-99 días	$ 27.838.611,00
23		Provisión para ajuste por posible variación costos en insumos	99 días	7/04/2025	6/08/2025	22FC-99 días	$ 50.000.000,00
24		Acta de terminación	0 días	6/08/2025	6/08/2025	23;20	$ 0,00

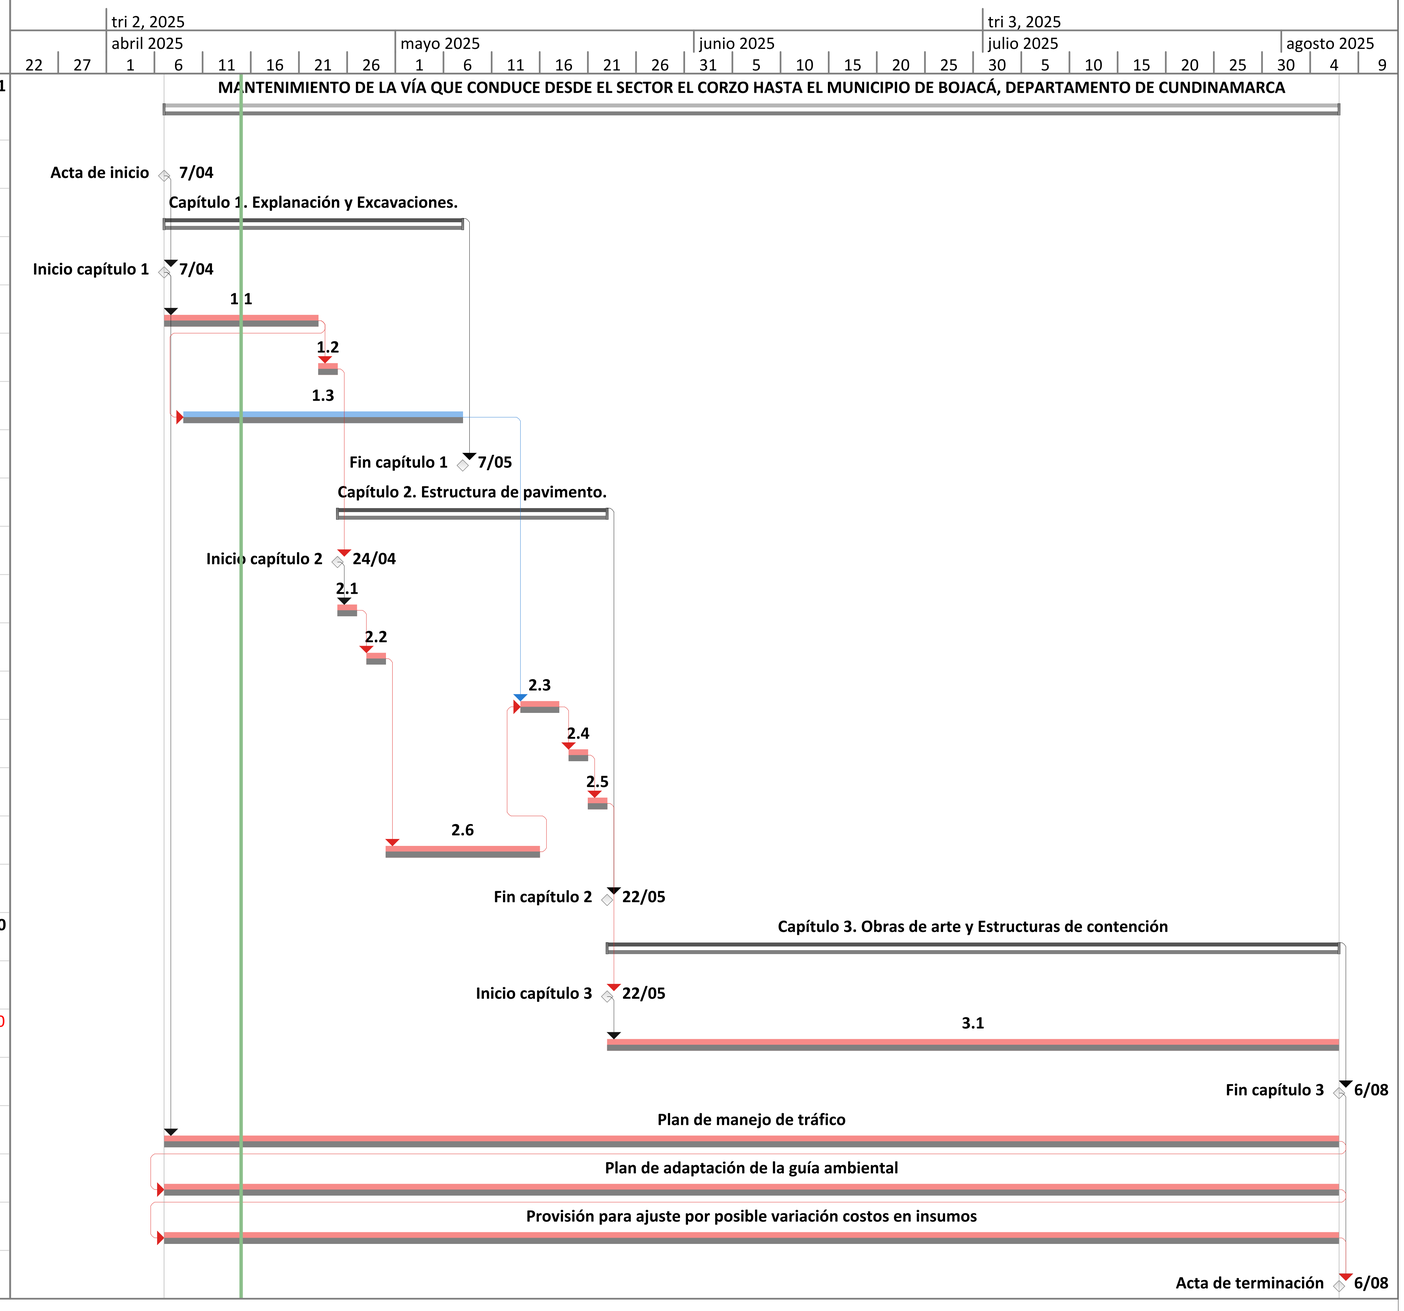


Proyecto: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE


Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Hito de línea base
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Resumen de línea base
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	Progreso
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Línea base	Progreso manual

FLUJO DE CAJA

Costo real	Costo de línea base	Costo restante	Variación de costo
$ 0,00	$ 2.751.562.197,01	$ 2.751.562.197,01	$ 0,00

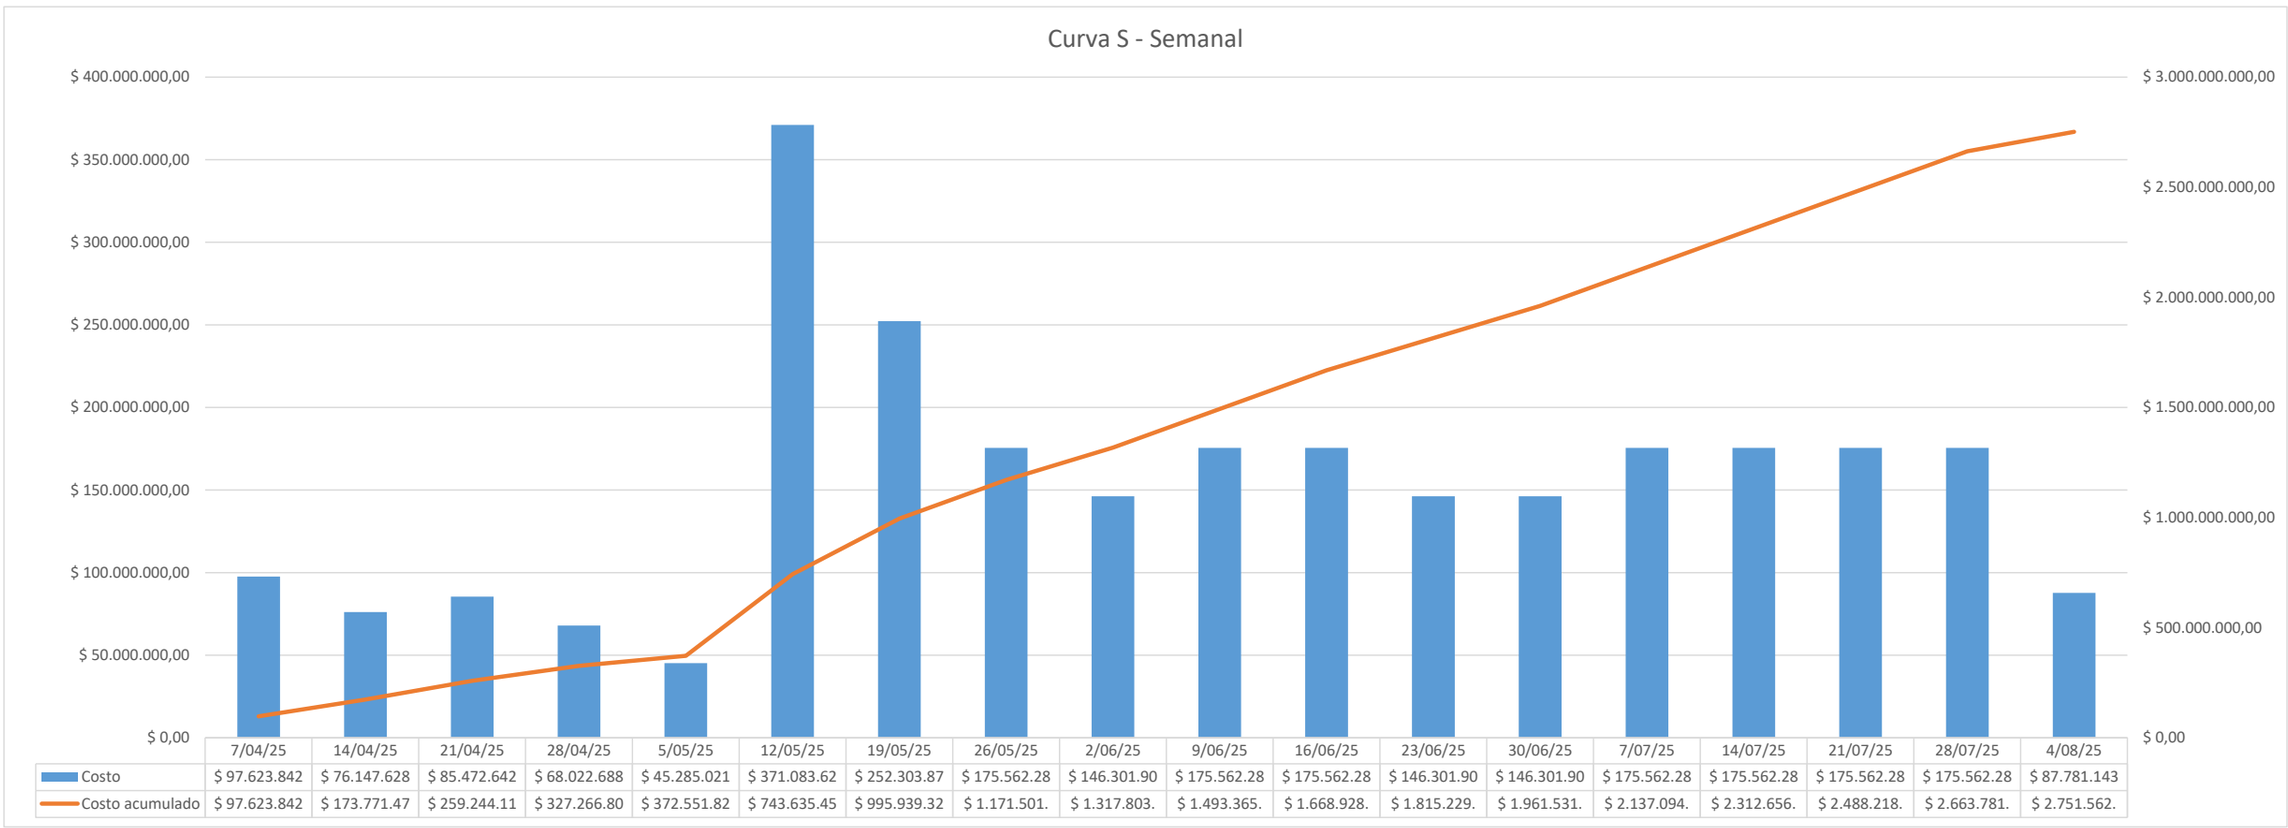

	7/04/25	14/04/25	21/04/25	28/04/25	5/05/25	12/05/25	19/05/25	26/05/25	2/06/25	9/06/25	16/06/25	23/06/25	30/06/25	7/07/25	14/07/25	21/07/25	28/07/25	4/08/25
Costo	$ 97.623.842	$ 76.147.628	$ 85.472.642	$ 68.022.688	$ 45.285.021	$ 371.083.62	$ 252.303.87	$ 175.562.28	$ 146.301.90	$ 175.562.28	$ 175.562.28	$ 146.301.90	$ 146.301.90	$ 175.562.28	$ 175.562.28	$ 175.562.28	$ 175.562.28	$ 87.781.143
Costo acumulado	$ 97.623.842	$ 173.771.47	$ 259.244.11	$ 327.266.80	$ 372.551.82	$ 743.635.45	$ 995.939.32	$ 1.171.501.	$ 1.317.803.	$ 1.493.365.	$ 1.668.928.	$ 1.815.229.	$ 1.961.531.	$ 2.137.094.	$ 2.312.656.	$ 2.488.218.	$ 2.663.781.	$ 2.751.562.

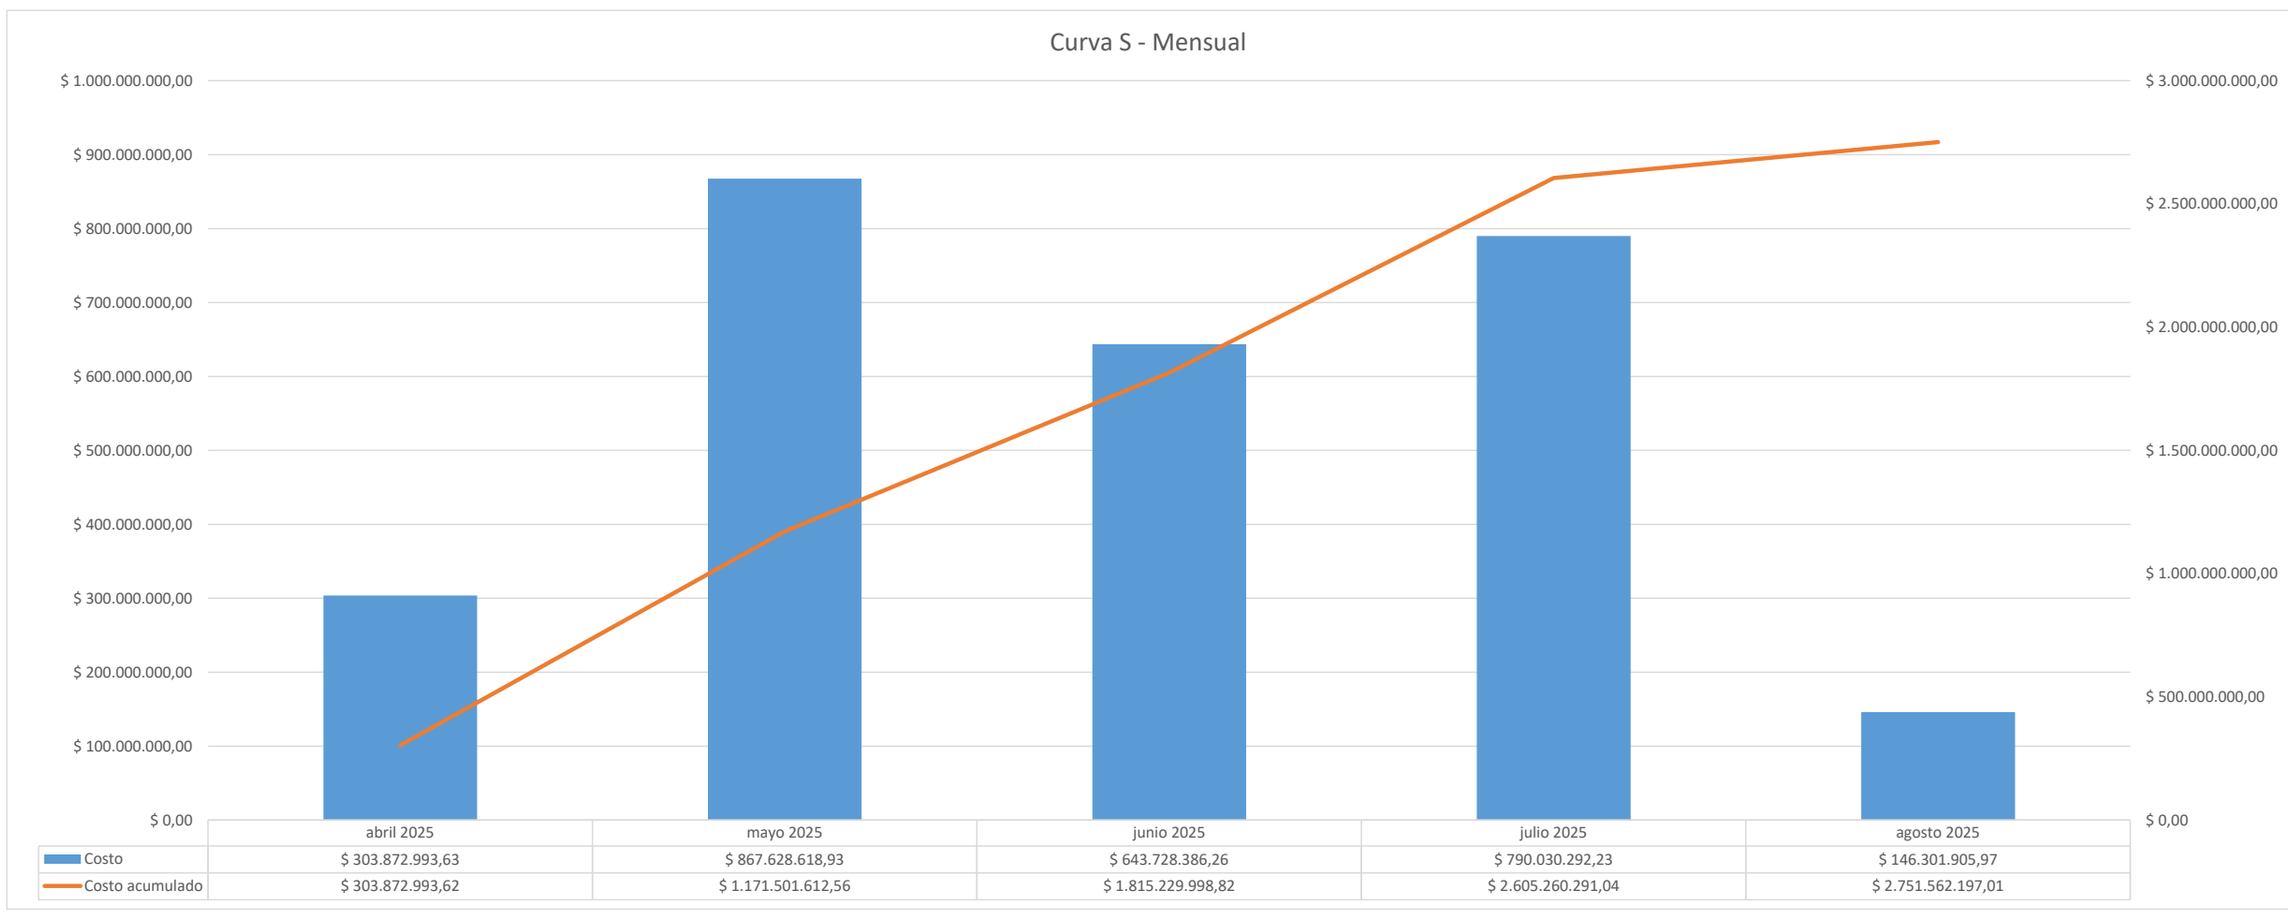

	abril 2025	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025
Costo	$ 303.872.993,63	$ 867.628.618,93	$ 643.728.386,26	$ 790.030.292,23	$ 146.301.905,97
Costo acumulado	$ 303.872.993,62	$ 1.171.501.612,56	$ 1.815.229.998,82	$ 2.605.260.291,04	$ 2.751.562.197,01

EDT	Nombre	Costo restante	Costo real	Costo	CPTR	CPTP	Costo de línea base
	Acta de inicio	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
1	Capítulo 1. Explanación y Excavaciones.	$ 303.629.060,00	$ 0,00	$ 303.629.060,00	$ 0,00	$ 303.495.058,28	$ 303.629.060,00
	Inicio capítulo 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
1.1	Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).	$ 115.500.000,00	$ 0,00	$ 115.500.000,00	$ 0,00	$ 115.398.315,83	$ 115.500.000,00
1.2	Demolición concreto estructural. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km).	$ 5.555.460,00	$ 0,00	$ 5.555.460,00	$ 0,00	$ 5.523.785,73	$ 5.555.460,00
1.3	Transporte de materiales prov. de explanación, canales, préstamos, sobreacarreos y derrumbes.	$ 182.573.600,00	$ 0,00	$ 182.573.600,00	$ 0,00	$ 182.572.956,72	$ 182.573.600,00
	Fin capítulo 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2	Capítulo 2. Estructura de pavimento.	$ 592.604.544,01	$ 0,00	$ 592.604.544,01	$ 0,00	$ 591.952.509,72	$ 592.604.544,01
	Inicio capítulo 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante.	$ 4.195.740,00	$ 0,00	$ 4.195.740,00	$ 0,00	$ 4.192.888,72	$ 4.195.740,00
2.2	Afirmado.	$ 14.108.164,00	$ 0,00	$ 14.108.164,00	$ 0,00	$ 14.097.680,26	$ 14.108.164,00
2.3	Sub base granular.	$ 355.265.000,00	$ 0,00	$ 355.265.000,00	$ 0,00	$ 355.234.258,06	$ 355.265.000,00
2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.	$ 7.170.684,00	$ 0,00	$ 7.170.684,00	$ 0,00	$ 7.168.501,30	$ 7.170.684,00
2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. (Incluye cemento asfáltico).	$ 182.160.000,00	$ 0,00	$ 182.160.000,00	$ 0,00	$ 182.120.795,55	$ 182.160.000,00
2.6	Geotextil NT 2500.	$ 29.704.956,00	$ 0,00	$ 29.704.956,00	$ 0,00	$ 29.138.385,82	$ 29.704.956,00
	Fin capítulo 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3	Capítulo 3. Obras de arte y Estructuras de contención	$ 1.745.131.000,00	$ 0,00	$ 1.745.131.000,00	$ 0,00	$ 1.725.288.922,16	$ 1.745.131.000,00
	Inicio capítulo 3	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3.1	Cuneta de concreto Clase E, 3.500 psi con refuerzo en fibra	$ 1.745.131.000,00	$ 0,00	$ 1.745.131.000,00	$ 0,00	$ 1.725.288.922,16	$ 1.745.131.000,00
	Fin capítulo 3	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	Plan de manejo de tráfico	$ 32.358.982,00	$ 0,00	$ 32.358.982,00	$ 0,00	$ 32.358.982,00	$ 32.358.982,00
	Plan de adaptación de la guía ambiental	$ 27.838.611,00	$ 0,00	$ 27.838.611,00	$ 0,00	$ 27.838.611,00	$ 27.838.611,00
	Provisión para ajuste por posible variación costos en insumos	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
	Acta de terminación	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00


inicial

PRESUPUESTO OFICIAL CTO ICCU 262-2025								Actual			EJECUTADO			% AVANCE
CAPÍTULO 1. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES														
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1.1	INV 600.1	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	m^3	3.300	$ 35.000	$ 115.500.000,00	3.300	$ 35.000	$ 115.500.000,00	882	$ 35.000	$ 30.854.953,50	26,71%
2	1.2	INV 201.7	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	m^3	20	$ 277.773	$ 5.555.460,00	20	$ 277.773	$ 5.555.460,00	26,3294	$ 277.773	$ 7.313.596,43	131,65%
3	1.3	***	Transporte de materiales producto de excavación, canales, préstamos, sobreacarreo y derrumbes	m^3·km	82.988	$ 2.200	$ 182.573.600,00	82.988	$ 2.200	$ 182.573.600,00	882	$ 2.200	$ 1.939.454,22	--
						Subtotal Cap. 1	$ 303.629.060,00			$ 303.629.060,00			$ 40.108.004,15	13,21%
CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO														
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
4	2.1	INV 320.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante	m^3	20	$ 209.787	$ 4.195.740,00	20	$ 209.787	$ 4.195.740,00	4,1214	$ 209.787	$ 864.616,14	20,61%
5	2.2	INV 311.1	Afirmado	m^3	107	$ 131.852	$ 14.108.164,00	107	$ 131.852	$ 14.108.164,00	0	$ 131.852	$ -	0,00%
6	2.3	INV 320.2	Sub base granular	m^3	1.733	$ 205.000	$ 355.265.000,00	1.733	$ 205.000	$ 355.265.000,00	364	$ 205.000	$ 74.561.370,05	20,99%
7	2.4	INV 421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m^2	1.893	$ 3.788	$ 7.170.684,00	1.893	$ 3.788	$ 7.170.684,00	0	$ 3.788	$ -	0,00%
8	2.5	INV 450.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento asfáltico)	m^3	132	$ 1.380.000	$ 182.160.000,00	132	$ 1.380.000	$ 182.160.000,00	0	$ 1.380.000	$ -	0,00%
9	2.6	---	Geotextil NT 2500	m^2	1.893	$ 15.692	$ 29.704.956,00	1.893	$ 15.692	$ 29.704.956,00		$ 15.692	$ -	0,00%
						Subtotal Cap. 2:	$ 592.604.544,00			$ 592.604.544,00			$ -	0,00%
CAPÍTULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN														
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
10	3.1	INV 671.1	Cuneta de concreto clase E, 3500 psi con refuerzo en fibra	m^3	1.733	$ 1.007.000,00	$ 1.745.131.000,00	1.733	$ 1.007.000,00	$ 1.745.131.000,00	297,43	$ 1.007.000,00	$ 299.515.786,25	17,16%
						Subtotal Cap. 3:	$ 1.745.131.000,00			$ 1.745.131.000,00			$ 299.515.786,25	17,16%
CAPÍTULO 4. NP														
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
NP-1							$ -			$ -			$ -	0,00%
NP-2							$ -			$ -			$ -	0,00%
NP-3							$ -			$ -			$ -	0,00%
NP-4							$ -			$ -			$ -	0,00%
						Subtotal Cap. 4	$ -			$ -			$ -	0,00%
						Subtotal :	$ 2.641.364.604,00	$		2.641.364.604,00	$		339.623.790,40	12,86%

VALOR TOTAL OBRA	$ 2.641.364.604,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 32.358.982,00
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL	$ 27.838.611,00
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 2.751.562.197,00

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-262 DE 2025

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo de línea base	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	% Programad	% completado	Nombres de los recursos
0		**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**	**$ 2.751.562.197,01**	**99 días**	**lun 7/04/25**	**mié 6/08/25**		**74%**	**15%**	
1		Acta de inicio	$ 0,00	0 días	lun 7/04/25	lun 7/04/25		100%	100%	
2	**1**	**Capítulo 1. Explanación y Excavaciones.**	**$ 303.629.060,00**	**24 días**	**lun 7/04/25**	**mié 7/05/25**		**100%**	**15%**	
3		Inicio capítulo 1	$ 0,00	0 días	lun 7/04/25	lun 7/04/25	1	100%	100%	
4	1.1	Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5	$ 115.500.000,00	12 días	lun 7/04/25	mar 22/04/25	3	100%	27%	Retrocargador 75 HP[97,85
5	1.2	Demolición concreto estructural. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de	$ 5.555.460,00	2 días	mié 23/04/25	jue 24/04/25	4	100%	100%	Retrocargador 75 HP[8,54 hm];Compresor
6	1.3	Transporte de materiales prov. de explanación, canales, préstamos, sobreacarreos y	$ 182.573.600,00	22 días	mié 9/04/25	mié 7/05/25	4FC-10 días	100%	1%	Volqueta (6 m3)[1.749,99 hm];Ajuste
7		Fin capítulo 1	$ 0,00	0 días	mié 7/05/25	mié 7/05/25	2	100%	0%	
8	**2**	**Capítulo 2. Estructura de pavimento.**	**$ 592.604.544,01**	**23 días**	**jue 24/04/25**	**jue 22/05/25**		**100%**	**5%**	
9		Inicio capítulo 2	$ 0,00	0 días	jue 24/04/25	jue 24/04/25	5	100%	100%	
10	2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante.	$ 4.195.740,00	2 días	vie 25/04/25	sáb 26/04/25	9	100%	21%	Retrocargador 75 HP[1,87
11	2.2	Afirmado.	$ 14.108.164,00	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	10	100%	0%	Motoniveladora 120 HP[3,52
12	2.3	Sub base granular.	$ 355.265.000,00	4 días	mié 14/05/25	sáb 17/05/25	15FC-2 días;6	100%	21%	Motoniveladora 120 HP[29,7
13	2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.	$ 7.170.684,00	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/25	12	100%	0%	Irrigador de asfalto[3,79 hm];Herramienta menor
14	2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. (Incluye cemento asfáltico).	$ 182.160.000,00	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	13	100%	0%	Terminadora de asfalto 150 HP[5,04
15	2.6	Geotextil NT 2500.	$ 29.704.956,00	13 días	mié 30/04/25	jue 15/05/25	11	100%	0%	Herramienta menor (5% MdeO)[$
16		Fin capítulo 2	$ 0,00	0 días	jue 22/05/25	jue 22/05/25	8	100%	0%	
17	**3**	**Capítulo 3. Obras de arte y Estructuras de contención**	**$ 1.745.131.000,00**	**62 días**	**jue 22/05/25**	**mié 6/08/25**		**56%**	**16%**	
18		Inicio capítulo 3	$ 0,00	0 días	jue 22/05/25	jue 22/05/25	14	100%	100%	
19	3.1	Cuneta de concreto Clase E, 3.500 psi con refuerzo en fibra	$ 1.745.131.000,00	62 días	vie 23/05/25	mié 6/08/25	18	56%	16%	Formaleta[1.733 Global];Vibrador de concreto[3.466
20		Fin capítulo 3	$ 0,00	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25	17	0%	0%	
21		Plan de manejo de tráfico	$ 32.358.982,00	99 días	lun 7/04/25	mié 6/08/25	3	73%	45%	
22		Plan de adaptación de la guía ambiental	$ 27.838.611,00	99 días	lun 7/04/25	mié 6/08/25	21FC-99 días	73%	0%	
23		Provisión para ajuste por posible variación costos en insumos	$ 50.000.000,00	99 días	lun 7/04/25	mié 6/08/25	22FC-99 días	73%	0%	
24		Acta de terminación	$ 0,00	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25	23;20	0%	0%	

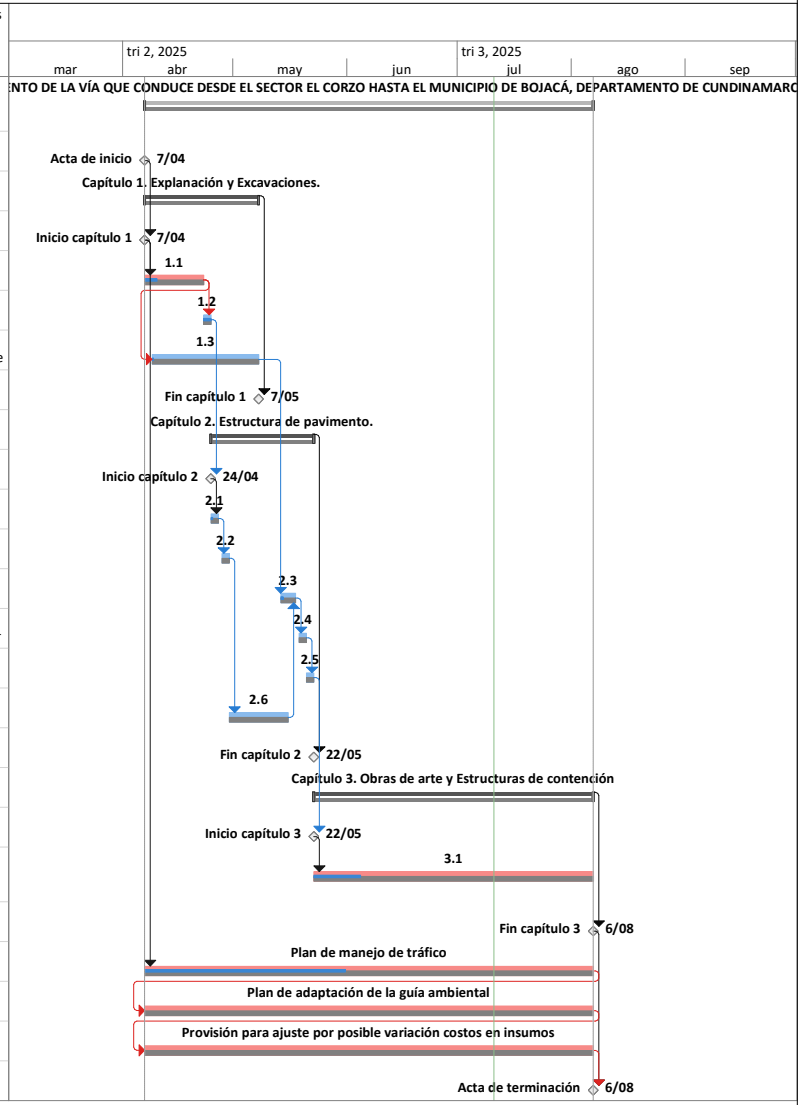

Proyecto: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base		

ANX_05_Anticipo

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	3	4	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No ICCU-2 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO GS

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVE AURA DANIELA NIETO GUTI

Valor total del contrato $ 299.970.440,00
Valor del Anticipo (15%) $ 44.995.566,00

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
n forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el n

JUSTI

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PAGO DE SALARIOS	$ 9.449.068,75	$ 9.449.068,75	$ 9.449.068,75	$ 9.449.068,75	$ 37.796.275,00	84%
2	OTROS COSTOS						
2.1	Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	$ 337.466,75	$ 337.466,75	$ 337.466,75	$ 337.466,75	$ 1.349.867,00	3%
2.2	Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios.	$ 899.911,25	$ 899.911,25	$ 899.911,25	$ 899.911,25	$ 3.599.645,00	8%
2.3	Oficina (incluye servicios).	$ 449.955,75	$ 449.955,75	$ 449.955,75	$ 449.955,75	$ 1.799.823,00	4%
2.4	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías.	$ 112.489,00	$ 112.489,00	$ 112.489,00	$ 112.489,00	$ 449.956,00	1%
TOTAL		$ 11.248.891,50	$ 11.248.891,50	$ 11.248.891,50	$ 11.248.891,50	$ 44.995.566,00	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. No aplica para compra de vehículos.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

ING. ALEJANDRO ALBA QUINTERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor Consorcio GS
Matricula No.: 25202-74153

ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora técnica (E) - Subdirección de Infraestructura Vial.
Inctituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca
Matricula No.: 25202-399751
