INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS ALCALDIA
CONVENIO No. 1405 DE 2024, MUNICIPIO DE AGUAZUL -CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JUNIO** DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE Calle 11 N 11-35 Barrio las Ferias		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO**		**$ 5.289.859.889,67**
	APORTES MUNICIPIO DE AGUAZUL		**$ 1.933.449.406,41**
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		**$ 7.223.359.296,08**
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/05/2025 11:59 PM		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/12/2025 11:59 PM		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON	10/09/2024	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	No.202400297	22/03/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	01/02/2024		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17/04/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 14/05/2025
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 20/05/2025	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 6,777,603,986.00	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 438,382,654.02	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 999.994.720,00	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

☐ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** *(adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)*

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.322.464.972,42) contra entrega de los siguientes productos: contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza, Cronograma de ejecución del Convenio.	NO APLICA	03/06/2024	$1.322.464.972,42
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. La entrega de los Estudios y diseños al Ministerio del Interior por parte del Municipio, previamente avalados por la interventoría y supervisor designado por parte del municipio. B. Plan de inversión y ejecución de obra avalados por el interventor y supervisor del municipio.	NO APLICA	DD/MM/ AAAA	$0,0
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	DD/MM/ AAAA	$0,0

ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP y certificación de conexión a servicios públicos C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. D. Todos los informes de interventoría, informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual junto con las actas de designación de supervisión del municipio.	100%	DD/MM/ AAAA	$0,0
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.322.464.972,42
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME POR EL MUNICIPIO				$ 1.933.499.406,41
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$0.0**

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS *FECHA*	*FECHA*
605-47-994000105956	Cumplimiento	$ 1.244.672.915,20	15/04/2024	31/08/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra (ADJUDICADO)***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
MA-SI-LP-005-2024	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**$ 5.784.981.922,06 COP**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		**$ 999.994.720,00 COP**
Nombre contratista	**CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL**	**Representante Legal:** Deyder Eufranio Cocunbo Vargas
Fecha de Acta de inicio del contrato	11 de Octubre del 2024	

Fecha de terminación del contrato inicial	10 de Mayo del 2025	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**Suspensión No 01:**	09 de Mayo del 2025 / Plazo (15) días.
	Ampliación No 01 a la Suspensión No 01:	09 de Mayo del 2025 / Plazo (15) días.

	Reinicio No 01:	28 de Mayo del 2025
	Suspensión No 02:	29 de Mayo de 2025/ Plazo (08) días
	Reinicio No 01:	28 de Mayo del 2025
	Suspensión No 02:	29 de Mayo de 2025/ Plazo (08) días
	Reinicio No 02:	03 de Junio del 2025
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$6.777.603.986,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS Nit. 860.002.527-9	
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO No. 400057195	
FECHA DE LA PÓLIZA	13/06/2025	
PÓLIZA No.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 400057191	
FECHA DE LA PÓLIZA	06/06/2025	

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra (ADJUDICADO)***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
MA-CMA-SI-008-2024	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	**$438.382.652,96 COP**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		
Nombre contratista	**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM**	**Representante Legal:** Andrea Viviana Castellanos Pinto
Fecha de Acta de inicio del contrato	**11 de Octubre del 2024**	
Fecha de terminación del Contrato inicial	**10 de Mayo del 2025**	
Fecha de terminación del contrato actual	**10 de Diciembre del 2025**	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**Suspensión No 01:**	09 de mayo del 2025

	Ampliación No 01 a la Suspensión No 01:	09 de Mayo del 2025 / Plazo (15) días.
	Reinicio No 01:	28 de Mayo del 2025
	Suspensión No 02:	29 de Mayo de 2025 / Plazo (08) días
	Reinicio No 02:	03 de Junio del 2025
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$438.382.652,96**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA No.	CUMPLIEMIENTO No.57-44101005773
FECHA DE LA PÓLIZA	20/05/2025
PÓLIZA No.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.57-40101002778
FECHA DE LA PÓLIZA	04/06/2025

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION	SI	NO	DESCRIPICION
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	X		MAYO-2025
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X		
INFORME FINANCIERO	X		
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	X		$ 168.708.223,45
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	X		$ 1.553.925,58
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X		
OTROS		X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:

AVANCE CTO 474 DE 2024 ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS		
PROGRAMADO %	100%	$240.731.986,00
EJECUTADO ACUMULADO%	100%	$240.731.986,00
ETAPA II: EJECUCION DE OBRA		
PROGRAMADO %	5.25%	$343.446.465,80
EJECUTADO ACUMULADO%	7.41%	$484.427.640,00

De acuerdo con los datos anteriores, actualmente se encuentra el proyecto en la etapa II correspondiente a la ejecucion de obra. En esta fase, se evidencia un avance positivo en relación con lo programado, lo cual indica un cumplimiento favorable del cronograma establecido.

COMPONENTE TÉCNICO.

OBRA:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

Ficha técnica del contrato de obra pública No 0474 del 2024

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA No MA-SI -LP-005-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	901.851-802-1
R/L	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR INICIAL	$ 5.777.609.266,00 M/CTE
VALOR ACTUAL	$ 6.777.603.986,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	10 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	10 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCION ETAPA II: Ejecución de Obra

Para el periodo comprendido 01 de junio al 30 de junio del 2025 del presente informe el Contratista de Obra se encuentra en la ejecución de la Etapa II ; Ejecución de Obra, la cual se inició el 07 de abril del 2025, luego de ser entregada la primera etapa al Ministerio del Interior.

PRESUPUESTO DE OBRA POR CAPITULOS:

	DESCRIPCION	VALOR POR CAPITULO	
1,0	PRELIMINARES	$	7.609.816,00
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$	54.613.229,00
3,0	CIMENTACION	$	119.989.437,00

4,0	ESTRUCTURA	$	1.183.381.926,00
5,0	CUBIERTA	$	437.558.055,00
6,0	PISOS Y ENCHAPES	$	266.469.676,00
7,0	MAMPOSTERIA	$	568.182.578,00
8,0	PINTURA Y FACHADA	$	196.389.461,00
9,0	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	$	322.010.320,00
10,0	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	$	97.138.694,00
11,0	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	$	65.697.222,00
12,0	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	$	67.887.418,00
13,0	APARATOS SANITARIOS	$	91.547.823,00
14,0	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	$	21.546.621,00
15,0	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	$	86.159.474,00
16,0	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	$	428.807.276,00
17,0	CLIMATIZACIÓN	$	490.248.125,00
18,0	VOZ Y DATOS	$	275.619.591,00
19,00	URBANISMO	$	29.478.134,00
20,0	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT	$	2.753.799,00
21,0	GAS NATURAL	$	3.142.525,00
	TOTAL, COSTO DIRECTO		**4.816.231.200,00**
	ADMINISTRACION (28.5%)	$	1.372.625.892,00
	IMPREVISTOS (1.0%)	$	48.162.312,00
	UTILIDAD (5.0%)	$	240.811.560,00
	RETIE	$	12.257.000,00
	RETILAP	$	13.149.500,00
	PMA	$	33.634.536,00
	VALOR TOTAL INCLUIDO A.I.U. (34.5%)	**$**	**6.536.872.000,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO AJUSTE AL PESO	**$**	**6.536.872.000,00**

A continuación, se describen las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de junio del 2025 al 30 junio del 2025, en el marco del proyecto denominado “Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Aguazul, Casanare.”; estas actividades corresponden a los ítems establecidos en el presupuesto del contrato de obra No. 0474 de 02 de agosto de 2024:

CAPITULO 4,0	**ESTRUCTURA**
Avance de actividades %	**5,40%**
Incidencia Acumulada	**8,02%**
Descripción de actividades:	Durante el presente mes se construyeron las vigas en concreto del nivel **N+3.60**, mediante el montaje de parales y encamado tipo camilla para garantizar alineación y nivelación. Posteriormente, se realizó el amarre del acero de refuerzo según planos estructurales y, tras la inspección conjunta con la interventoría, se autorizó

	el vaciado del concreto estructural de **3.500 psi**, cumpliendo con las especificaciones de diseño.

REGISTRO FOTOGRAFICO























CAPITULO 15,0	TABLEROS GENERALES ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION.
Avance de actividades %	**0,04%**
Incidencia Acumulada	**0,06%**
Descripción de actividades:	Durante el presente mes, se llevaron a cabo las conexiones de tuberías eléctricas correspondientes al segundo nivel, de acuerdo con los planos de diseño eléctrico y siguiendo los lineamientos técnicos establecidos. Estas instalaciones se ejecutaron con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de canalización de red para posteriormente extender cable de acometidas para la red, asegurando su integración eficiente al sistema general del proyecto. Todo el proceso ha estado bajo el control y seguimiento técnico de la interventoría, quien realiza inspecciones periódicas para verificar la correcta aplicación de los procedimientos constructivos y la fidelidad respecto al diseño aprobado. Este acompañamiento garantiza que las obras ejecutadas se alineen con los estándares de calidad requeridos, minimizando riesgos operativos y asegurando el buen desempeño del sistema a lo largo del tiempo.

REGISTRO FOTOGRAFICO









	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Avance de actividades %	**0,09%**
Incidencia Acumulada	**0,20%**
	Durante el presente mes, la interventoría realizo inspección detallada a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental según las responsabilidades establecidas; igualmente se verifico el cumplimiento ambiental de acuerdo con los programas propuestos para el PMA.







La ejecución de obra del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2025 se muestra a continuación, el porcentaje de avance mensual versus el porcentaje presupuestal del proyecto, mediante la ejecución de actividades contractuales de la obra ejecutada, presentando un avance acumulado de 16.67%, con esto se realiza el control, verificación y seguimiento al proyecto "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

INTERVENTORIA

El municipio de Aguazul Casanare se lleva a cabo el contrato de interventoría **MA-CMA-SI-008-2024** cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". Cuyo contratista es el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM representado legalmente por ANDREA VIVIANA CASTELLANOS identificada con cedula de ciudadanía 33.645.882 de Aguazul, quienes son los encargados de la revisión y aval para la ejecución del contrato.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

Ficha técnica del contrato de interventoría No 0735 del 2024

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	901-875-652-5
R/L	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE ".
VALOR INICIAL	$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCION ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de Obra

Para el periodo comprendido 01 de junio al 30 de junio del 2025 del presente informe el contratista se encuentra en ejecución de la Etapa II ; Interventoría a la Ejecución de Obra, la cual se inició el 07 de abril del 2025, luego de ser entregada la primera etapa al Ministerio del Interior, y aprobación por parte del supervisor del convenio.

PRESUPUESTO DE OBRA INTERVENTORIA POR ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD INTERVENTORÍA	VALOR POR ACTIVIDAD
1.ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 74.869.670,00**
2. ACTIVIDADES EN ETAPA CONSTRUCTIVA	**$ 293.519.114,00**
1. INTERVENTORIA TECNICA	$ 189.243.568,00
2. INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA	$ 38.312.481,00
3. INTERVENTORIA CONTABLE	$ 14.725.981,00
4. INTERVENTORIA FINANCIERA	$ 16.741.082,00
5. INTERVENTORIA JURIDICA	$ 13.481.001,00
6. INTERVENTORIA AMBIENTAL	$ 21.015.001,00
SUBTOTAL	**$ 368.388.784,00**
IVA (19%)	$ 69.993.868,96
TOTAL	**$ 438.382.653,0**

Para el periodo comprendido entre el 01 de junio del 2025 y el 30 de junio del 2025 la interventoría realiza el acompañamiento de la revisión detallada de la ejecución de la obra del contrato con numero interno 474 del 2024, la Interventoría tiene el objeto de supervisar y controlar la acción del contratista para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia del contrato.

Durante el mes de junio de 2025, la interventoría reporta una serie de situaciones que han influido directamente en el desarrollo del proyecto y en la ejecución de las actividades programadas: Modificación de contratos de obra e interventoría:

La suspensión temporal de las actividades estuvo relacionada con dificultades técnicas en la plataforma CONTRATVS de la administración municipal, lo cual impidió concluir oportunamente el proceso de modificación del convenio interadministrativo en el sistema. Esta situación, ajena tanto al contratista de obra como a la interventoría, generó retrasos en la reactivación formal del proyecto. Una vez subsanados estos inconvenientes, el día 3 de junio de 2025 se dio reinicio oficial a los contratos, con la correspondiente modificación en el plazo contractual, estableciendo como nueva fecha de finalización el 10 de diciembre de 2025.

Durante el presente mes, se han registrado lluvias intensas y frecuentes en la zona del proyecto, lo que ha ocasionado afectaciones en el avance físico de la obra. Las condiciones meteorológicas han impactado principalmente en el ingreso y la movilización de materiales e insumos, debido a cierres viales parciales y totales en tramos de las vías nacionales que comunican con el municipio de Aguazul. Esta situación ha provocado retrasos en la cadena logística y ha obligado a reprogramar algunas actividades constructivas, particularmente aquellas que dependen del suministro constante de materiales como concreto, acero, y tuberías.

La interventoría ha realizado un seguimiento riguroso a estos acontecimientos, con el fin de garantizar que las decisiones adoptadas en obra respeten los criterios técnicos establecidos, se preserve la calidad constructiva y se mantenga la seguridad del personal en obra, priorizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro del nuevo cronograma.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

ACTAS GENERASAS CONTRATO No 474 DEL 2024:

A la fecha de corte del 30 de junio del 2025 se han generado las siguientes Actas del contrato:

LEGALES:

ACTA	FECHA	OBSERVACION
No 01 INICIO	11/ Octubre / 2024	N.A
No 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de Octubre de 2024	23 / Octubre / 2024	7 meses
No 03 ANTICIPO	23 / Octubre / 2024	$2.022.163.243,10

No 04 DE SUSPENSION No. 01	09 / Mayo / 2025	QUINCE (15) DIAS
No 05 AMPLIACION A LA SUSPENSION No1	23 / Mayo / 2025	OCHO (8) DIAS
No 06. DE REINICIO	28 / Mayo / 2025	N.A.
No 07. DE SUSPENSION No.02	29 / Mayo / 2025	OCHO (8) DIAS
No 08. DE REINICIO No. 02	03 / Junio / 2025	N.A.

El contrato No 474 del 2024 se genero una (01) acta en el presente periodo.

ACTAS GENERASAS CONTRATO DE CONSULTORIA No 735 DEL 2024:

A la fecha de corte del 30 de junio del 2025 se han generado las siguientes Actas del contrato:

LEGALES:

ACTA	FECHA	OBSERVACION
No 01 INICIO	11/ Octubre / 2024	N.A
No 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de octubre de 2024	23 / Octubre / 2024	7 meses
No 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de octubre de 2024	04 / Diciembre /2024	N.A
No 04 ANTICIPO	04 / Marzo / 2024	$ 153.433.928,55
No 5. DE SUSPENSION No.1	9 / Mayo /2025	QUINCE (15) DIAS
No 6. AMPLIACION A LA SUSPENSION No1	23 / Mayo /2025	OCHO (8) DIAS
No 7. DE REINICIO	28 / Mayo /2025	N.A.
No 8. DE SUSPENSION No.02	29 / Mayo /2025	OCHO (8) DIAS
No 9. DE REINICIO	03 / Junio /2025	N.A.

Durante el presente periodo, el equipo de interventoría ha desarrollado diversas actividades administrativas fundamentales para asegurar el seguimiento, control y soporte técnico del proyecto en la fase de construcción. Estas acciones se han realizado en articulación con la Secretaría de Infraestructura, quien ha participado en los procesos de verificación y validación correspondientes.

Entre las actividades administrativas que se ejecutaron en este periodo en este contrato se pueden evidenciar los siguientes aspectos:

- Se veló por la debida ejecución de las actividades realizas en el presente mes, siguiendo las especificaciones técnicas según los planos de diseño.
- El contratista de Obra, realizo la entrega de los certificados de calidad de cada uno de los materiales implementados en la obra.
- La interventoría realizo ensayos de laboratorio y rotura de cilindros de concreto tomados en obra.
- Se realizo la verificación de los planes de señalización en obra, verificación de Plan de Manejo Ambiental y seguimiento y control del tránsito en el área de influencia del proyecto.
- Se realizo la verificación de materiales y equipo disponible previo a cada inicio de actividad.
- Se verifico personal en obra, según planilla de seguridad entregada mes a mes por parte del contratista.
- Se llevo conjuntamente la bitácora diaria de las actividades ejecutadas en los diferentes escenarios intervenidos.
- Se realizaron comités de obra con el contratista y supervisión para revisión de inconvenientes técnicos de actividades contractuales para realizar adecuaciones oportunas y viales con el fin de dar el debido cumplimiento contractual.

COMITES Y/O REUNIONES

No	DESCRIPCION	FECHA	ENTIDAD	LUGAR	OBSERVACION
1	Acta de comité	06/ Junio / 2025	Obra, Interventoria, Supervisión Alcaldia.	Secretaria de Infraestructura – Aguazul Casanare	Comité presencial a los contratos derivados del convenio 1405 de 2024 Aguazul – Casanare, suspensión de contratos de obra e interventoría.

PERSONAL CONTRATO OBRA No 0474 DEL 2024:

ETAPA II : EJECUCION DE OBRA:

ITEM	PERSONAL PROFESIONAL OBRA	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACIÓN
1	Director de obra	Luis Manuel Rojas Gil	40%
2	Residente de Obra	Álvaro Andrés Gómez Otálora	100%
3	Ingeniera electromecánica	Gloria Stefany Lagos Tiria	30%
4	Profesional SST	Martha Liliana Fonseca Molina	100%

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA No 0735 DEL 2024:

ETAPA II : INTERVENTORIA A EJECUCION DE OBRA:

ITEM	PERSONAL PROFESIONAL OBRA	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACIÓN
1	Director de interventoría	Manuel Cepeda	50%
2	Residente de interventoría	Andrea Viviana Castellanos Pinto	100%
3	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras	Andres Felipe Goez	50%
4	Ingeniero Ambiental	Cristian Fabian Rodríguez	30%
5	Profesional Hseq	Holman Eduardo Rodríguez Paez	100%
6	Inspector	Diego Fernando Acuña Jimenez	100%

COMPONENTE FINANCIERO.

OBRA:

A corte del 30 de junio de 2025 el contratista de obra a ejecutado un valor acumulado de $484.427.640 como resultado del avance de la ejecución de la obra.

BALANCE FINANCIERO CTO DE OBRA			
Valor inicial del contrato	$5.777.609.266,00		
Valor anticipo 35%		$2.022.163.243,10	
Valor pendiente por amortizar			$2.022.163.243,10
Valor pendiente por pagar		$3.755.446.022,90	$3.755.446.022,90
Totales	**$5.777.609.266,00**	**$5.777.609.266,00**	**$5.777.609.266,00**

INTERVENTORIA:

A corte del 30 de junio de 2025 el contratista de interventoría a ejecutado un valor acumulado de $114.136.217,31 como resultado de la etapa interventoria de ejecución de obra.

BALANCE FINANCIERO CTO DE CONSULTORIA			
Valor inicial del contrato	$438.382.653,00		
Valor anticipo 35%		$153.433.928,55	
Valor pendiente por amortizar			$153.433.928,55
Valor pendiente por pagar		$ 284.948.724,45	$ 284.948.724,45

Totales	**$438.382.653,00**	**$438.382.653,00**	**$438.382.653,00**

La Interventoría realizo el control financiero del contrato de obra semana a semana correspondiente a los porcentajes de ejecución de esta, reportados en informes semanales.

Se adjunta los extractos de las dos cuentas bancarias en las cuales se encuentra el depósito del dinero del convenio No. 1405 de 2024.

Cuenta Aperturada para aporte del Ministerio del Interior:
Numero de cuenta: 001300770200001753
Fecha de corte: 30-06-2025
Saldo: $ 1.553.925,58

Cuenta Aperturada para aporte del Municipio:
Numero de cuenta: 001300770200002023
Fecha de corte: 30-0-2025
Saldo: $ 168.708.223,45

COMPONENTE JURÍDICO.

En el mes de junio del 2025 no realizaron actuaciones jurídicas a los contratos derivados, se continua con la vigencia de las pólizas de inicio de los contratos derivados.

CONTROL DE POLIZAS CTO OBRA:

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/03/2026	$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/01/2026	$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/07/2028	$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/07/2025	2/07/2030	$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/07/2026	$577.760.926,60
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 5 de agosto de 2024.					

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 5 de agosto de 2024.					

Las pólizas de la minuta fueron aprobadas el día 8 de octubre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/01/2026	$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/11/2025	$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/05/2028	$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/05/2025	11/05/2030	$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/05/2026	$577.760.926,60
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 15 de noviembre de 2024					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	$260.000.000

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 15 de noviembre de 2024.

REINICIO No 01 DEL CONTRATO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/01/2026	$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	11/11/2025	$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2028	$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2030	$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2026	$577.760.926,60
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 28 de mayo de 2025					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 28 de mayo de 2025					

REINICIO No 02 DEL CONTRATO

Fecha de aprobación **18 de junio del 2025**

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 4					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057598	29/05/2025	10/08/2026	$677.760.398,60

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057598	29/05/2025	10/06/2026	$2.372.161.395,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057598	29/05/2025	10/12/2028	$338.880.199,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057598	29/05/2025	10/12/2030	$2.033.281.195,80
CALIDAD DEL SERVICIO	NACIONAL DE SEGUROS	400057598	29/05/2025	10/12/2026	$677.760.398,60
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 13 de junio de 2025					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	29/05/2025	10/12/2025	$569.400.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	29/05/2025	10/12/2025	$284.700.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	29/05/2025	10/12/2025	$284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	29/05/2025	10/12/2025	$284.700.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 05 de junio de 2025.					

CONTROL DE POLIZAS CTO DE CONSULTORIA:

ACTA DE INICIO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 2					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/03/2026	$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/03/2026	$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/09/2028	$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	$1.31.514.795,90

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024, aprobadas el día 26 de noviembre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica .					

CONTROL DEL AMPARO	**NOMBRE ASEGURADORA**	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 3					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/02/2025	$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/02/2025	$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	14/02/2025	$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024, aprobadas el día 26 de noviembre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica					

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 4					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2025	$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 6 de diciembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 6					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	20/05/2025	$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	20/05/2025	$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	20/05/2025	$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del del 6 de diciembre de 2024.					

REINICIO No 01 DEL CONTRATO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 7					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	01/12/2025	$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2027	$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	$131.514.795,90

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 28 de mayo de 2025.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 8					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	10/06/2025	$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	10/06/2025	$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	11/06/2025	$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del del 28 de mayo de 2025.					

REINICIO No 02 DEL CONTRATO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 9					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	15/06/2026	$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	15/06/2026	$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/12/2028	$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 04 de junio de 2025.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 10					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/11/2025	$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/11/2025	$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	14/11/2025	$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 04 de junio de 2025.					

JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE:

Durante el mes de junio, la administración municipal adelantó gestiones administrativas relacionadas a los contratos derivados de la PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON - Y EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. OTROSÍ No. 02, la cual surtio modificaciones a el contrato de obre e interventoria.


Por parte del municipio se realizo la radicacion de los anexos para la solicitud del segundo desembolso correspondiente al Convenio Interadministrativo N° 1405 del 2024, celebrado entre LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON – MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE para AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE, por una suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.322.464.972,42) M/CTE.


El informe de obra e interventoria se realizó en el periodo comprendido entre el 3 de junio de 2025 al 30 de junio 2025, en cumplimiento al avance de obra presenta un 7,41% para el contrato “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE." Se da cumplimiento al pago de seguridad social, prestaciones y parafiscales para el proyecto “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.” para el mes de mayo de 2025.

Se dio cumplimiento a las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que fueron aplicables durante la ejecución del contrato. A la fecha del presente informe, se encuentra en ejecución la **Etapa II: Ejecución de Obra**, habiéndose realizado la revisión, verificación y aprobación de todos los productos

Resumen de Avance

Durante el periodo comprendido entre el **01 y el 30 de junio 2025**, el avance físico ejecutado alcanza un **16,67%** acumulado del contrato de obra, según las actividades desarrolladas y su correspondencia con el presupuesto contractual. Este avance representa el cumplimiento de los ítems programados, y permite continuar con el proceso de control, seguimiento y verificación técnica del proyecto "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Aguazul, Casanare."

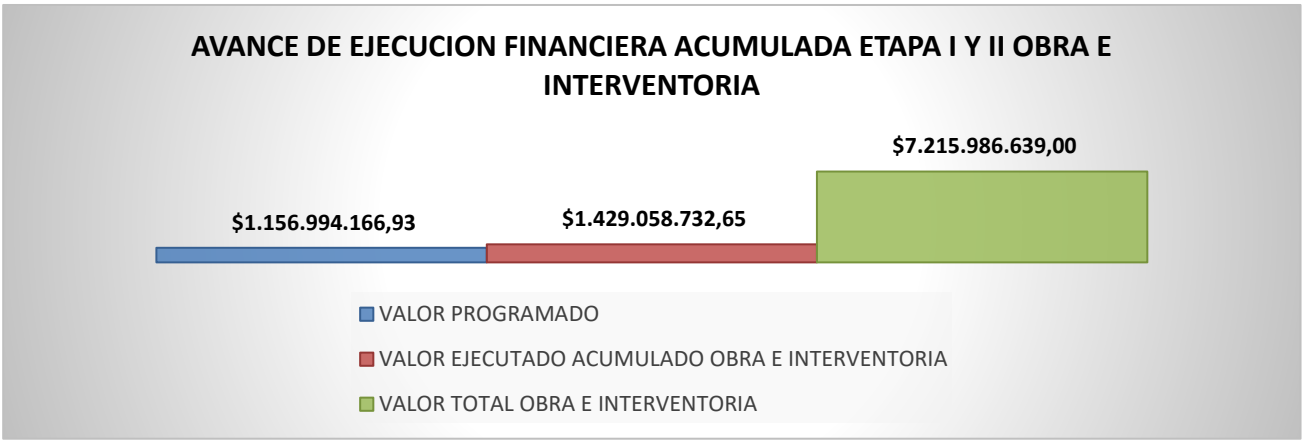

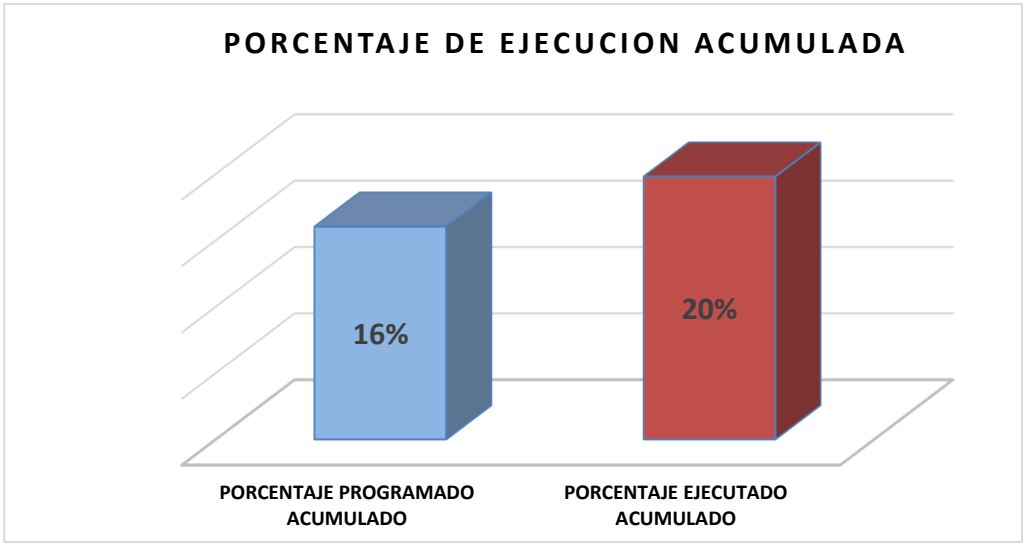

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

22/05/2024	28/05/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

JUAN MIGUEL SANDOVALGUTIERREZ
Supervisor Municipio Convenio No. 1405-2024
Municipio de Aguazul Casanare

Proyecto: Jessica Fernanda Garcia Garzon
Profesional Contratado SIA
