Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

CONTRATISTA:		CONTRATANTE:					OBJETO:
JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA					CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS SEDES JUDICIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" Y SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO DE JUSTICIA "OSCAR TRUJILLO LERMA " DE ROLDANILLO Y PALACIO DE JUSTICA DE CARTAGO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO.
FECHA PRESENTE:							
3/02/26		CONTRATO No.	064 DE 2025				
FECHA ACTA DE INICIO:	20/12/25	VALOR CONTRATO:	$1.373.787.900,00				
Periodo Acta	3/02/26	VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:	$ 179.193.813,00	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:	20	VALOR ACTA No. 1	$639.013.131,00
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:		**VALOR TOTAL CONTRATO:**	############	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:	15	VALOR ACTA No. 2	$531.959.394,00
3/02/26	**ACTA No. 3**	SALDO CONTRATO	**$ -**	**TOTAL TIEMPO ADICIONES**	**35**	**VALOR ACTA No.3 final**	**$382.009.188,00**

INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONTRATO INTERVENTORIA	VALOR CONTRATO:	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:
MARIA CLAUDIA GARCIA CARDENAS	N/A	N/A	N/A	N/A

			CANTIDADES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN		TOTAL A EJECUTAR		Acta 1 $639.013.131,00		Acta 2 $531.959.394,00		BALANCE FINAL		Acta 3 $382.009.188,00		ACUMULADO	
ITEM	**ID**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNITARIO ANTES DE AIU E IVA**	**VALOR**	**MAYORES Y MENORES**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
		CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA																		
		Adecuación baño PMR																		
1	PR-29	Retiro de tubería hidráulica existinte de 1/2	ML	5,02	$ 10.009,00	$ 50.245,00	-5,02	-$ 50.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	PR-35	Regatas en muros	ML	1,00	$ 18.365,00	$ 18.365,00	14,00	$ 257.110,00	15,00	$ 275.475,00	0,00	$ -	6,60	$ 121.209,00	6,60	$ 121.209,00	0,00	$ -	6,60	$ 121.209,00
3	IH-23	Suministro e instalación de tapa registro de 15x15	UND	3,00	$ 37.333,00	$ 111.999,00	-1,00	-$ 37.333,00	2,00	$ 74.666,00	0,00	$ -	2,00	$ 74.666,00	2,00	$ 74.666,00	0,00	$ -	2,00	$ 74.666,00
4	PR-07	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	64,01	$ 40.336,00	$ 2.581.867,00	10,53	$ 424.617,00	74,54	$ 3.006.484,00	74,27	$ 2.995.916,00	0,00	$ -	74,27	$ 2.995.916,00	0,00	$ -	74,27	$ 2.995.916,00
5	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	16,94	$ 129.622,00	$ 2.196.341,00	30,36	$ 3.934.780,00	47,30	$ 6.131.121,00	0,00	$ -	36,83	$ 4.774.341,00	36,83	$ 4.774.341,00	0,00	$ -	36,83	$ 4.774.341,00
6	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	21,56	$ 121.957,00	$ 2.629.661,00	1,08	$ 131.872,00	22,64	$ 2.761.533,00	0,00	$ -	22,64	$ 2.761.533,00	22,64	$ 2.761.533,00	0,00	$ -	22,64	$ 2.761.533,00
7	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	6,00	$ 35.648,00	$ 213.888,00	10,00	$ 356.480,00	16,00	$ 570.368,00	16,00	$ 570.368,00	0,00	$ -	16,00	$ 570.368,00	0,00	$ -	16,00	$ 570.368,00
8	PR-37	Reinstalación de aparatos sanitarios	UND	1,00	$ 63.782,00	$ 63.782,00	-1,00	-$ 63.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal Milano Blanco (incluye griferia)	UND	1,00	$ 370.168,00	$ 370.168,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.168,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.168,00	1,00	$ 370.168,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.168,00
10	AC-52	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio	M2	1,00	$ 383.890,00	$ 383.890,00	0,00	$ -	1,00	$ 383.890,00	0,00	$ -	1,00	$ 383.890,00	1,00	$ 383.890,00	0,00	$ -	1,00	$ 383.890,00
11	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	5,10	$ 52.997,00	$ 270.285,00	0,90	$ 47.697,00	6,00	$ 317.982,00	0,00	$ -	5,80	$ 307.383,00	5,80	$ 307.383,00	0,00	$ -	5,80	$ 307.383,00
12	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	2,00	$ 74.138,00	$ 148.276,00	0,00	$ -	2,00	$ 148.276,00	0,00	$ -	2,00	$ 148.276,00	2,00	$ 148.276,00	0,00	$ -	2,00	$ 148.276,00
13	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	18,12	$ 32.388,00	$ 586.871,00	0,00	$ -	18,12	$ 586.871,00	0,00	$ -	18,12	$ 586.871,00	18,12	$ 586.871,00	0,00	$ -	18,12	$ 586.871,00
14	IH-07	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios	ML	5,00	$ 42.126,00	$ 210.630,00	-5,00	-$ 210.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	2,00	$ 70.623,00	$ 141.246,00	3,00	$ 211.869,00	5,00	$ 353.115,00	0,00	$ -	5,00	$ 353.115,00	5,00	$ 353.115,00	0,00	$ -	5,00	$ 353.115,00
16	AP-04	Suministro e instalación de Griferia de Push para lavamanos	UND	1,00	$ 370.448,00	$ 370.448,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.448,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.448,00	1,00	$ 370.448,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.448,00
17	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	1,00	$ 108.686,00	$ 108.686,00	0,00	$ -	1,00	$ 108.686,00	0,00	$ -	3,00	$ 326.058,00	3,00	$ 326.058,00	0,00	$ -	3,00	$ 326.058,00
18	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	2,00	$ 57.558,00	$ 115.116,00	0,00	$ -	2,00	$ 115.116,00	0,00	$ -	2,00	$ 115.116,00	2,00	$ 115.116,00	0,00	$ -	2,00	$ 115.116,00
19	DI-22	Alistado piso 4cm mortero 1:3	M2	21,56	$ 44.740,00	$ 964.693,00	1,08	$ 48.377,00	22,64	$ 1.013.070,00	22,64	$ 1.013.070,00	0,00	$ -	22,64	$ 1.013.070,00	0,00	$ -	22,64	$ 1.013.070,00
20	PR-31	Desmontar y retiro las divisiones de baño existentes	UND	6,00	$ 71.858,00	$ 431.148,00	0,00	$ -	6,00	$ 431.148,00	6,00	$ 431.148,00	0,00	$ -	6,00	$ 431.148,00	0,00	$ -	6,00	$ 431.148,00
21	PR-13	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	16,20	$ 16.436,00	$ 266.263,00	3,80	$ 62.457,00	20,00	$ 328.720,00	20,00	$ 328.720,00	0,00	$ -	20,00	$ 328.720,00	0,00	$ -	20,00	$ 328.720,00
22	AC-19	Suministro e instalación de tableta de aress formato 30 x 30 (Aprox)	M2	21,56	$ 88.884,00	$ 1.916.535,00	-21,56	-$ 1.916.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	22,40	$ 98.890,00	$ 2.215.136,00	-1,40	-$ 138.446,00	21,00	$ 2.076.690,00	13,20	$ 1.305.694,00	0,00	$ -	16,48	$ 1.630.053,00	3,28	$ 324.359,00	16,48	$ 1.630.053,00
24	AC-47	suministro y aplicación estuco relleno muros	M2	46,44	$ 21.655,00	$ 1.005.654,00	20,16	$ 436.569,00	66,60	$ 1.442.223,00	37,14	$ 804.371,00	0,00	$ -	37,14	$ 804.371,00	0,00	$ -	37,14	$ 804.371,00
25	AC-50	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	1,00	$ 991.188,00	$ 991.188,00	0,00	$ -	1,00	$ 991.188,00	0,00	$ -	1,00	$ 991.188,00	1,00	$ 991.188,00	0,00	$ -	1,00	$ 991.188,00
26	AP-05	suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	1,00	$ 1.337.014,00	$ 1.337.014,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.337.014,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.337.014,00	1,00	$ 1.337.014,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.337.014,00
27	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	1,00	$ 1.136.407,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.136.407,00	1,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.136.407,00
28	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	1,00	$ 276.297,00	$ 276.297,00	0,00	$ -	1,00	$ 276.297,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 276.297,00	1,00	$ 276.297,00	1,00	$ 276.297,00
29	CA-29	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1,00	$ 1.683.410,00	$ 1.683.410,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.683.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.683.410,00	1,00	$ 1.683.410,00	1,00	$ 1.683.410,00
30	CA-34	Suministro e instalación de división en aluminio para baños de 1.21x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación, según diseño	UND	2,00	$ 1.487.734,00	$ 2.975.468,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.975.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 4.463.202,00	3,00	$ 4.463.202,00	3,00	$ 4.463.202,00
31	CA-37	suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo	UND	1,00	$ 1.496.924,00	$ 1.496.924,00	1,00	$ 1.496.924,00	2,00	$ 2.993.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.993.848,00	2,00	$ 2.993.848,00	2,00	$ 2.993.848,00
32	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	2,00	$ 126.364,00	$ 252.728,00	0,00	$ -	2,00	$ 252.728,00	0,00	$ -	2,00	$ 252.728,00	4,00	$ 505.456,00	2,00	$ 252.728,00	4,00	$ 505.456,00
		Tratamiento impermeabilización terraza																	0,00	$ -
33	PR-49	Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros	M2	1411,77	$ 25.500,00	$ 36.000.135,00	-161,77	-$ 4.125.135,00	1.250,00	$ 31.875.000,00	1.250,00	$ 31.875.000,00	0,00	$ -	1.250,00	$ 31.875.000,00	0,00	$ -	1250,00	$ 31.875.000,00
34	PR-47	Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso)	M2	1411,77	$ 36.451,00	$ 51.460.428,00	-161,77	-$ 5.896.678,00	1.250,00	$ 45.563.750,00	1.250,00	$ 45.563.750,00	0,00	$ -	1.250,00	$ 45.563.750,00	0,00	$ -	1250,00	$ 45.563.750,00
35	DI-15	Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano	ML	141,18	$ 19.524,00	$ 2.756.340,00	608,82	$ 11.886.660,00	750,00	$ 14.643.000,00	0,00	$ -	404,00	$ 7.887.696,00	655,00	$ 12.788.220,00	251,00	$ 4.900.524,00	655,00	$ 12.788.220,00
36	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral altura 10cm (superficie con pendiente)	M2	358,92	$ 44.057,00	$ 15.812.938,00	-8,92	-$ 392.988,00	350,00	$ 15.419.950,00	129,96	$ 5.725.648,00	189,07	$ 8.330.046,00	584,44	$ 25.748.488,00	265,40	$ 11.692.794,00	584,44	$ 25.748.488,00
37	CC-22	Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante.	M2	358,92	$ 66.775,00	$ 23.966.883,00	-358,92	-$ 23.966.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	351,62	$ 23.479.579,00	351,62	$ 23.479.579,00	351,62	$ 23.479.579,00
38	RI-08	Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)	M2	1052,85	$ 272.238,00	$ 286.625.778,00	-8,50	-$ 2.314.023,00	1.044,35	$ 284.311.755,00	0,00	$ -	805,63	$ 219.323.590,00	1.070,28	$ 291.369.798,00	264,64	$ 72.046.208,00	1070,28	$ 291.369.798,00
39	AC-19	Suministro e instalación de enchape antideslizante	M2	358,92	$ 147.015,00	$ 52.766.624,00	0,00	$ -	358,92	$ 52.766.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	332,45	$ 48.874.740,00	332,45	$ 48.874.740,00	332,45	$ 48.874.740,00
		Arreglo y tratamiento de humedad en fachada Lateral																	0,00	
40	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	M2	116,49	$ 9.325,00	$ 1.086.245,00	-116,49	-$ 1.086.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
41	DI-26	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior	M2	87,52	$ 161.612,00	$ 14.144.282,00	77,48	$ 12.521.698,00	165,00	$ 26.665.980,00	69,00	$ 11.151.228,00	0,00	$ -	165,00	$ 26.665.980,00	96,00	$ 15.514.752,00	165,00	$ 26.665.980,00

42	DI-27	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior	ML	68,97	$ 113.262,00	$ 7.811.680,00	0,08	$ 9.061,00	69,05	$ 7.820.741,00	69,00	$ 7.815.078,00	0,00	$ -	87,00	$ 9.853.794,00	18,00	$ 2.038.716,00	87,00	$ 9.853.794,00
43	VA-07	Lavada de fachada con agua a chorro de aspersion con hipoclorito (incluye retiro de material extraño y piezas rotas)	M2	620,73	$ 13.789,00	$ 8.559.246,00	0,27	$ 3.723,00	621,00	$ 8.562.969,00	621,00	$ 8.562.969,00	0,00	$ -	621,00	$ 8.562.969,00	0,00	$ -	621,00	$ 8.562.969,00
44	AC-02	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1	M2	620,73	$ 46.972,00	$ 29.156.930,00	0,27	$ 12.682,00	621,00	$ 29.169.612,00	525,00	$ 24.660.300,00	0,00	$ -	621,00	$ 29.169.612,00	96,00	$ 4.509.312,00	621,00	$ 29.169.612,00
45	RI-03	Suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio (impermeabilización, incluye emulsión asfáltica)	M2	68,97	$ 58.167,00	$ 4.011.778,00	-33,97	-$ 1.975.933,00	35,00	$ 2.035.845,00	0,00	$ -	0,00	$ -	35,00	$ 2.035.845,00	35,00	$ 2.035.845,00	35,00	$ 2.035.845,00
		Tratamiento humedades internas																	0,00	
46	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	20,91	$ 10.537,00	$ 220.329,00	63,54	$ 669.521,00	84,45	$ 889.850,00	31,05	$ 327.174,00	0,00	$ -	31,05	$ 327.174,00	0,00	$ -	31,05	$ 327.174,00
47	RI-09	Suministro y aplicación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	20,91	$ 49.635,00	$ 1.037.868,00	64,80	$ 3.216.348,00	85,71	$ 4.254.216,00	31,05	$ 1.541.167,00	0,00	$ -	31,05	$ 1.541.167,00	0,00	$ -	31,05	$ 1.541.167,00
48	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	83,64	$ 36.623,00	$ 3.063.148,00	45,85	$ 1.679.194,00	129,49	$ 4.742.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -	28,21	$ 1.033.054,00	28,21	$ 1.033.054,00	28,21	$ 1.033.054,00
49	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)(Incluye filos y dilataciones)	M2	209,10	$ 19.441,00	$ 4.065.113,00	143,13	$ 2.782.532,00	352,23	$ 6.847.645,00	0,00	$ -	223,71	$ 4.349.148,00	430,69	$ 8.372.949,00	206,98	$ 4.023.801,00	430,69	$ 8.372.949,00
		otros																	0,00	
50	DI-28	Suministro e instalación de fachaleta similiar a la existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y aplicación de hidrófugo	UND	30,00	$ 106.766,00	$ 3.202.980,00	0,00	$ -	30,00	$ 3.202.980,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.601.490,00	54,00	$ 5.765.364,00	39,00	$ 4.163.874,00	54,00	$ 5.765.364,00
51	CA-02	Desmonte de puerta metálica	M2	6,72	$ 49.327,00	$ 331.477,00	0,00	$ -	6,72	$ 331.477,00	0,00	$ -	6,72	$ 331.477,00	8,72	$ 430.131,00	2,00	$ 98.654,00	8,72	$ 430.131,00
52	SH-18	Suministro e instalación de puerta cortafuego metálica de doble alta, certificación nacional, con dimensiones especiales de 2.40m de ancho por 2.69m de alto, con resistencia al fuego mínima de ciento ochenta (180) minuto (RF-180) , conforme a las normas NFPA 252, NFPA 80 y en cumplimiento del Reglamento técnico colombiano de construcción sismorresistente NSR-10, compuesta por hojas en acero cold rolled o galvanizado calibre 18 y marco en acero cold rolled o galvanizado calibre 16, con espesor aproximado de 45mm, relleno interior en lana mineral o lana de roca resistente a temperaturas superiores a 1000ºC, refuerzos internos en acero hot rolled para cerraduras y cierrapuertas, refuerzos en bisagras de acero calibre 7, canales de cierre superior e inferior en acero calibre 16, bisagras de uso pesado de 4 ½" con balineras, sellos intumiscentes perimetrales	M2	6,72	$ 2.381.238,00	$ 16.001.919,00	0,00	$ -	6,72	$ 16.001.919,00	0,00	$ -	6,46	$ 15.373.273,00	6,46	$ 15.373.273,00	0,00	$ -	6,46	$ 15.373.273,00
53	CA-45	Suministro e instalación de reja metalica (puerta) metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50, incluye marco, perforación de muro, resanes, base o platina para pared, cerradura argolla para candado, acabado de pintura y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	2,08	$ 374.838,00	$ 779.663,00	0,00	$ -	2,08	$ 779.663,00	2,08	$ 779.663,00	0,00	$ -	2,08	$ 779.663,00	0,00	$ -	2,08	$ 779.663,00
54	CA-16	Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir	ML	12,80	$ 93.590,00	$ 1.197.952,00	5,20	$ 486.668,00	18,00	$ 1.684.620,00	14,70	$ 1.375.773,00	0,00	$ -	19,25	$ 1.801.608,00	4,55	$ 425.835,00	19,25	$ 1.801.608,00
55	PR-27	Demolición muro en ladrillo (incluye retiro)	M2	1,00	$ 65.476,00	$ 65.476,00	5,00	$ 327.380,00	6,00	$ 392.856,00	4,12	$ 269.761,00	1,20	$ 78.571,00	5,32	$ 348.332,00	0,00	$ -	5,32	$ 348.332,00
56	AC-21	Fundición de concreto estampado con color, espesor 10cm , incluye nivelación de piso y malla (color y diseño a definir en sitio)	M2	8,00	$ 154.117,00	$ 1.232.936,00	10,00	$ 1.541.170,00	18,00	$ 2.774.106,00	0,00	$ -	0,00	$ -	25,55	$ 3.937.689,00	25,55	$ 3.937.689,00	25,55	$ 3.937.689,00
57	CA-46	Mantenimiento de pasamanos existente, incluye lijada, masilla de relleno y acaabdo de pintura 3 en 1)	ML	22,40	$ 44.753,00	$ 1.002.467,00	257,90	$ 11.541.799,00	280,30	$ 12.544.266,00	100,38	$ 4.492.400,00	0,00	$ -	354,88	$ 15.882.039,00	254,50	$ 11.389.639,00	354,88	$ 15.882.039,00
58	CA-20	Mantenimiento de reja metalica, incluye desmonte, cepillado, limpieza del elemento, cambio de partes afectadas, cambio de chapa donde se requiera, aplicación de pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	80,80	$ 94.379,00	$ 7.625.823,00	166,51	$ 15.715.236,00	247,31	$ 23.341.059,00	247,31	$ 23.341.059,00	0,00	$ -	249,04	$ 23.504.493,00	1,73	$ 163.434,00	249,04368	$ 23.504.493,00
59	CA-47	Suministro e instalación de reja metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50, incluye soldadura, acabado con pintura 3 en 1 y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	9,50	$ 267.750,00	$ 2.543.625,00	-9,50	-$ 2.543.625,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
60	CA-48	Desmonte y retiro de vidrio existente	M2	1,57	$ 50.106,00	$ 78.907,00	2,05	$ 102.514,00	3,62	$ 181.421,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,54	$ 127.019,00	2,54	$ 127.019,00	2,54	$ 127.019,00
61	CA-49	Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad 5 mm	M2	2,00	$ 297.570,00	$ 595.140,00	1,62	$ 482.287,00	3,62	$ 1.077.427,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,54	$ 754.340,00	2,54	$ 754.340,00	2,54	$ 754.340,00
62	VA-05	Aseo general.	M2	214,80	$ 6.251,00	$ 1.342.715,00	1196,97	$ 7.482.259,00	1.411,77	$ 8.824.974,00	214,80	$ 1.342.715,00	1.196,97	$ 7.482.259,00	1.411,77	$ 8.824.974,00	0,00	$ -	1411,77	$ 8.824.974,00
63	PR-13	Corte de piso en concreto con pulidora	Ml	6,36	$ 16.436,00	$ 104.533,00	-0,36	-$ 5.917,00	6,00	$ 98.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,78	$ 242.924,00	14,78	$ 242.924,00	14,78	$ 242.924,00
64	PR-07	Demolición enchape de piso, incluye retiro de sobrantes	M2	7,95	$ 40.336,00	$ 320.671,00	2,05	$ 82.689,00	10,00	$ 403.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,50	$ 100.840,00	2,50	$ 100.840,00	2,50	$ 100.840,00
65	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M3	7,95	$ 497.309,00	$ 3.953.607,00	-6,45	-$ 3.207.643,00	1,50	$ 745.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,18	$ 87.029,00	0,18	$ 87.029,00	0,18	$ 87.029,00
66	PR-48	Relleno con rocamuerta 95% PM	M3	4,77	$ 115.808,00	$ 552.404,00	-1,27	-$ 147.076,00	3,50	$ 405.328,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
67	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	7,95	$ 109.996,00	$ 874.468,00	2,05	$ 225.492,00	10,00	$ 1.099.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
68	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	7,95	$ 55.965,00	$ 444.922,00	2,05	$ 114.728,00	10,00	$ 559.650,00	0,00	$ -	2,50	$ 139.913,00	2,50	$ 139.913,00	0,00	$ -	2,50	$ 139.913,00
69	AC-64	Suministro e instalación de pisos en tableta de gress estoraque de 7cms x 24cms,	M2	7,95	$ 127.374,00	$ 1.012.623,00	2,05	$ 261.117,00	10,00	$ 1.273.740,00	0,00	$ -	2,50	$ 318.435,00	2,50	$ 318.435,00	0,00	$ -	2,50	$ 318.435,00
		ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																		
1,03	PR-26	Demolición mesones en concreto	ML	0,00	$ 46.591,00	$ -	5,70	$ 265.569,00	5,70	$ 265.569,00	0,00	$ -	5,70	$ 265.569,00	5,70	$ 265.569,00	0,00	$ -	5,70	$ 265.569,00
1,05	PR-28	Demolición de cielo raso	M2	0,00	$ 21.680,00	$ -	33,88	$ 734.475,00	33,88	$ 734.475,00	0,00	$ -	22,64	$ 490.911,00	42,78	$ 927.460,00	20,14	$ 436.549,00	42,78	$ 927.460,00
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.	M2	0,00	$ 90.735,00	$ -	21,98	$ 1.994.174,00	21,98	$ 1.994.174,00	0,00	$ -	22,64	$ 2.054.558,00	29,69	$ 2.694.149,00	7,05	$ 639.591,00	29,69	$ 2.694.149,00
3,05	DI-02	Suministro e instalación muro en perfileria de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	0	$ 148.796,00	$ -	4,00	$ 595.333,00	4,00	$ 595.333,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,15	$ 915.244,00	6,15	$ 915.244,00	6,15	$ 915.244,00
1,16	DI-05	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	0,00	$ 62.454,00	$ -	13,70	$ 855.620,00	13,70	$ 855.620,00	0,00	$ -	13,22	$ 825.642,00	13,22	$ 825.642,00	0,00	$ -	13,22	$ 825.642,00
1,15	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	0,00	$ 49.931,00	$ -	13,70	$ 684.055,00	13,70	$ 684.055,00	0,00	$ -	13,22	$ 660.088,00	13,22	$ 660.088,00	0,00	$ -	13,22	$ 660.088,00
48;	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	0	$ 144.091,00	$ -	5,00	$ 720.455,00	5,00	$ 720.455,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.440.910,00	10,00	$ 1.440.910,00	10,00	$ 1.440.910,00
49;	IE-01	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_	ML	0	$ 79.313,00	$ -	15,00	$ 1.189.695,00	15,00	$ 1.189.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,10	$ 1.118.313,00	14,10	$ 1.118.313,00	14,10	$ 1.118.313,00
50;	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	ML	0	$ 17.484,00	$ -	10,00	$ 174.840,00	10,00	$ 174.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	69,00	$ 1.206.396,00	69,00	$ 1.206.396,00	69,00	$ 1.206.396,00
51;	IE-02	Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	UND	0	$ 36.606,00	$ -	15,00	$ 549.090,00	15,00	$ 549.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 549.090,00	15,00	$ 549.090,00	15,00	$ 549.090,00
52;	IE-03	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	ML	0	$ 11.446,00	$ -	158,00	$ 1.808.468,00	158,00	$ 1.808.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -	188,00	$ 2.151.848,00	188,00	$ 2.151.848,00	188,00	$ 2.151.848,00
53;	IE-50	Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	UND	0	$ 81.290,00	$ -	5,00	$ 406.450,00	5,00	$ 406.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 812.900,00	10,00	$ 812.900,00	10,00	$ 812.900,00
54;	IE-04	Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	UND	0	$ 22.051,00	$ -	5,00	$ 110.255,00	5,00	$ 110.255,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 110.255,00	5,00	$ 110.255,00	5,00	$ 110.255,00
55;	IE-22	Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	UND	0	$ 41.103,00	$ -	5,00	$ 205.515,00	5,00	$ 205.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 411.030,00	10,00	$ 411.030,00	10,00	$ 411.030,00
56;	IE-05	Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	UND	0	$ 122.044,00	$ -	5,00	$ 610.220,00	5,00	$ 610.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 610.220,00	5,00	$ 610.220,00	5,00	$ 610.220,00
57;	IE-16	Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	UND	0	$ 3.195.955,00	$ -	1,00	$ 3.195.955,00	1,00	$ 3.195.955,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
58;	IE-23	Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	UND	0	$ 554.127,00	$ -	1,00	$ 554.127,00	1,00	$ 554.127,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,43	IE-11	Suministro e instalacion de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	0	$ 100.115,00	$ -	3,00	$ 300.345,00	3,00	$ 300.345,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 500.575,00	5,00	$ 500.575,00	5,00	$ 500.575,00
7;	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	0	$ 107.532,00	$ -	111,18	$ 11.955.408,00	111,18	$ 11.955.408,00	0,00	$ -	106,90	$ 11.495.171,00	106,90	$ 11.495.171,00	0,00	$ -	106,90	$ 11.495.171,00

8;	CC-17	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	0	$ 85.685,00	$ -	58,00	$ 4.969.730,00	58,00	$ 4.969.730,00	0,00	$ -	0,00	$ -	58,00	$ 4.969.730,00	58,00	$ 4.969.730,00	58,00	$ 4.969.730,00
1,50	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	0	$ 101.820,00	$ -	9,00	$ 916.380,00	9,00	$ 916.380,00	0,00	$ -	4,00	$ 407.280,00	7,00	$ 712.740,00	3,00	$ 305.460,00	7,00	$ 712.740,00
1,23	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	0	$ 108.706,00	$ -	4,00	$ 434.824,00	4,00	$ 434.824,00	0,00	$ -	4,00	$ 434.824,00	4,00	$ 434.824,00	0,00	$ -	4,00	$ 434.824,00
1,36	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	UND	0	$ 719.169,00	$ -	1,00	$ 719.169,00	1,00	$ 719.169,00	0,00	$ -	1,00	$ 719.169,00	1,00	$ 719.169,00	0,00	$ -	1,00	$ 719.169,00
23;	RI-04	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	M2	0	$ 212.682,00	$ -	47,00	$ 9.996.054,00	47,00	$ 9.996.054,00	0,00	$ -	47,00	$ 9.996.054,00	47,00	$ 9.996.054,00	0,00	$ -	47,00	$ 9.996.054,00
1,13;	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	M2	0	$ 41.029,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	61,23	$ 2.512.288,00	61,23	$ 2.512.288,00	61,23	$ 2.512.288,00
35;	DI-16	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	0	$ 68.320,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 3.416.000,00	50,00	$ 3.416.000,00	50,00	$ 3.416.000,00
31;	VA-03	suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica	ML	0	$ 27.972,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	114,57	$ 3.204.883,00	114,57	$ 3.204.883,00	114,57	$ 3.204.883,00
63;	AC-06	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2	M2	0	$ 16.149,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	115,73	$ 1.869.003,00	115,73	$ 1.869.003,00	115,73	$ 1.869.003,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 613.330.682,00**		**$ 74.420.599,00**		**$ 687.751.281,00**		**$ 176.272.972,00**		**$ 306.975.575,00**		**$ 732.063.278,00**		**$ 248.814.731,00**		**$ 732.063.278,00**
ADMINISTRACION				27,00%		$ 165.599.284,00		$ 20.093.562,00		$ 185.692.846,00		$ 47.593.702,00		$ 82.883.405,00		$ 197.657.085,00		$ 67.179.977,00		$ 197.657.085,00
IMPREVISTO				1,00%		$ 6.133.307,00		$ 744.206,00		$ 6.877.513,00		$ 1.762.730,00		$ 3.069.756,00		$ 7.320.633,00		$ 2.488.147,00		$ 7.320.633,00
UTILIDAD				5,00%		$ 30.666.534,00		$ 3.721.030,00		$ 34.387.564,00		$ 8.813.649,00		$ 15.348.779,00		$ 36.603.164,00		$ 12.440.737,00		$ 36.603.164,00
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%		$ 5.826.641,00		$ 706.996,00		$ 6.533.637,00		$ 1.674.593,00		$ 2.916.268,00		$ 6.954.601,00		$ 2.363.740,00		$ 6.954.601,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)						**$ 821.556.448,00**		**$ 99.686.393,00**		**$ 921.242.841,00**		**$ 236.117.646,00**		**$ 411.193.783,00**		**$ 980.598.761,00**		**$ 333.287.332,00**		**$ 980.598.761,00**

CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

ITEM	*ID*	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*	*MAYORES Y MENORES*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*
		Cubierta																		
1	PR-62	Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado y respectivo retiro	M2	171	$ 15.535,00	$ 2.656.485,00	15,78	$ 245.142,00	186,78	$ 2.901.627,00	186,78	$ 2.901.627,00	0,00	$ -	186,78	$ 2.901.627,00	0,00	$ -	186,78	$ 2.901.627,00
2	PR-63	Desmonte de teja termoacustica , incluye retiro	M2	184	$ 16.885,00	$ 3.106.840,00	-184,00	-$ 3.106.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	DI-16	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	43	$ 68.320,00	$ 2.937.760,00	-29,00	-$ 1.981.280,00	14,00	$ 956.480,00	12,00	$ 819.840,00	0,00	$ -	12,00	$ 819.840,00	0,00	$ -	12,00	$ 819.840,00
4	CC-21	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 12cm a 15 cm de alto x 30 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos	UND	43	$ 70.697,00	$ 3.039.971,00	-15,00	-$ 1.060.455,00	28,00	$ 1.979.516,00	24,00	$ 1.696.728,00	4,00	$ 282.788,00	28,00	$ 1.979.516,00	0,00	$ -	28,00	$ 1.979.516,00
5	CC-24	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x100 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	158	$ 119.598,00	$ 18.896.484,00	-158,00	-$ 18.896.484,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	CC-13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	122	$ 114.763,00	$ 14.001.086,00	94,00	$ 10.787.722,00	216,00	$ 24.788.808,00	190,54	$ 21.866.942,00	0,00	$ -	190,54	$ 21.866.942,00	0,00	$ -	190,54	$ 21.866.942,00
7	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	207,81	$ 107.532,00	$ 22.346.225,00	236,19	$ 25.397.983,00	444,00	$ 47.744.208,00	436,10	$ 46.894.705,00	7,86	$ 845.202,00	443,96	$ 47.739.907,00	0,00	$ -	443,96	$ 47.739.907,00
8	CC-17	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	332	$ 85.685,00	$ 28.447.420,00	130,85	$ 11.212.054,00	462,85	$ 39.659.474,00	452,15	$ 38.742.387,00	5,72	$ 490.118,00	464,35	$ 39.787.744,00	6,48	$ 555.239,00	464,35	$ 39.787.744,00
9	PR-12	Demolición muro existente incluye retiro	M3	1	$ 198.421,00	$ 198.421,00	0,00	$ -	1,00	$ 198.421,00	0,40	$ 79.368,00	0,00	$ -	0,40	$ 79.368,00	0,00	$ -	0,40	$ 79.368,00
10	PR-46	Retiro de manto impermeabilizante foil	M2	10	$ 18.996,00	$ 189.960,00	23,00	$ 436.908,00	33,00	$ 626.868,00	32,84	$ 623.829,00	0,00	$ -	32,84	$ 623.829,00	0,00	$ -	32,84	$ 623.829,00
11	DI-24	Fabricación muro en mamposteria e:10cm	M2	6,002	$ 152.856,00	$ 917.442,00	7,04	$ 1.075.801,00	13,04	$ 1.993.242,00	11,91	$ 1.821.126,00	0,00	$ -	11,91	$ 1.821.126,00	0,00	$ -	11,91	$ 1.821.126,00
12	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm	M2	6,002	$ 40.772,00	$ 244.714,00	20,08	$ 818.620,00	26,08	$ 1.063.334,00	23,83	$ 971.515,00	0,00	$ -	23,83	$ 971.515,00	0,00	$ -	23,83	$ 971.515,00
13	DI-22	Alistado piso 4cm mortero 1:3	M2	66	$ 44.740,00	$ 2.952.840,00	-41,55	-$ 1.858.947,00	24,45	$ 1.093.893,00	17,71	$ 792.345,00	0,00	$ -	17,71	$ 792.345,00	0,00	$ -	17,71	$ 792.345,00
14	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	M2	66	$ 44.057,00	$ 2.907.762,00	-33,40	-$ 1.471.504,00	32,60	$ 1.436.258,00	17,71	$ 780.249,00	0,00	$ -	17,71	$ 780.249,00	0,00	$ -	17,71	$ 780.249,00
15	PR-64	Sumnistro e instalación de cubierta provisional en plastico o lona, incluye cuerda perimetral,alambre, bastidor y todo lo necesario para su correcta instalación y su posterior retiro.	M2	332	$ 39.685,00	$ 13.175.420,00	-236,37	-$ 9.380.185,00	95,63	$ 3.795.235,00	95,63	$ 3.795.235,00	0,00	$ -	95,63	$ 3.795.235,00	0,00	$ -	95,63	$ 3.795.235,00
16	CC-15	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, ancho entre 30 y 45 cm ,incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	11,3	$ 94.212,00	$ 1.064.596,00	-11,30	-$ 1.064.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	CC-25	Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación	ML	16	$ 85.485,00	$ 1.367.760,00	3,26	$ 278.681,00	19,26	$ 1.646.441,00	19,12	$ 1.634.473,00	0,00	$ -	19,12	$ 1.634.473,00	0,00	$ -	19,12	$ 1.634.473,00
18	PR-05	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 4", incluye retiro	UND	4	$ 193.400,00	$ 773.600,00	-2,00	-$ 386.800,00	2,00	$ 386.800,00	1,00	$ 193.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 193.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 193.400,00
19	IH-03	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	ML	15	$ 62.409,00	$ 936.135,00	-8,00	-$ 499.272,00	7,00	$ 436.863,00	7,00	$ 436.863,00	0,00	$ -	7,00	$ 436.863,00	0,00	$ -	7,00	$ 436.863,00
20	CC-26	Suministro e instalación de gárgolas prefabricadas cuyas medidas son 8 x12x 21 cm , incluye todo lo necesario correcta instalación)	UND	4	$ 60.624,00	$ 242.496,00	-4,00	-$ 242.496,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21	CC-27	Sumnistro e instalación de frescasa, incluye malla en alambre galvanizado de 20 cm x 20cm	M2	152	$ 52.478,00	$ 7.976.656,00	-152,00	-$ 7.976.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	RI-03	Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo	M2	10	$ 58.167,00	$ 581.670,00	10,00	$ 581.670,00	20,00	$ 1.163.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,25	$ 363.544,00	6,25	$ 363.544,00	6,25	$ 363.544,00
23	RI-04	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	M2	24	$ 212.682,00	$ 5.104.368,00	62,00	$ 13.186.284,00	86,00	$ 18.290.652,00	71,67	$ 15.242.919,00	0,00	$ -	71,67	$ 15.242.919,00	0,00	$ -	71,67	$ 15.242.919,00
		Arreglo Fachada (acceso)																		
24	PR-50	Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales.	ML	8	$ 11.407,00	$ 91.256,00	0,00	$ -	8,00	$ 91.256,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	M2	7	$ 9.325,00	$ 65.275,00	0,20	$ 1.865,00	7,20	$ 67.140,00	0,00	$ -	7,20	$ 67.140,00	7,20	$ 67.140,00	0,00	$ -	7,20	$ 67.140,00
26	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	ML	33	$ 7.956,00	$ 262.548,00	39,60	$ 315.058,00	72,60	$ 577.606,00	0,00	$ -	0,00	$ -	66,71	$ 530.745,00	66,71	$ 530.745,00	66,71	$ 530.745,00
27	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	6,88	$ 80.325,00	$ 552.636,00	0,32	$ 25.704,00	7,20	$ 578.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,20	$ 578.340,00	7,20	$ 578.340,00	7,20	$ 578.340,00
28	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye estructura, masillada, filos y pintura para exterior 2 manos	ML	35,1	$ 47.878,00	$ 1.680.518,00	93,50	$ 4.476.593,00	128,60	$ 6.157.111,00	0,00	$ -	0,00	$ -	134,60	$ 6.444.379,00	134,60	$ 6.444.379,00	134,60	$ 6.444.379,00
29	AC-09	Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U	ML	15	$ 13.693,00	$ 205.395,00	15,00	$ 205.395,00	30,00	$ 410.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
30	CA-42	Suministro e instalación de alfajía metálica, incluye desmonte de ventana, retiro de alfajia en mal estado, e instalación de nueva alfajia	ML	5,4	$ 75.137,00	$ 405.740,00	0,60	$ 45.082,00	6,00	$ 450.822,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 450.822,00	6,00	$ 450.822,00	6,00	$ 450.822,00
31	VA-03	suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica	ML	12,5	$ 27.972,00	$ 349.650,00	60,60	$ 1.695.103,00	73,10	$ 2.044.753,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
32	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	17	$ 10.537,00	$ 179.129,00	5,07	$ 53.444,00	22,07	$ 232.573,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
33	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	28	$ 23.186,00	$ 649.208,00	27,18	$ 630.195,00	55,18	$ 1.279.403,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
34	VA-09	Suministro y aplicación de pintura acrilica a tres manos para exterior Tipo 1 - incluye filos y dilataciones	M2	55	$ 42.591,00	$ 2.342.505,00	0,18	$ 7.666,00	55,18	$ 2.350.171,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,95	$ 2.170.139,00	50,95	$ 2.170.139,00	50,95	$ 2.170.139,00
		Cuarto de residuos solidos																		
35	DI-16	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	2	$ 68.320,00	$ 136.640,00	0,00	$ -	2,00	$ 136.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
36	CC-21	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 10cm a 15 cm de alto x 15 a 20 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos	UND	4	$ 66.152,00	$ 264.608,00	2,00	$ 132.304,00	6,00	$ 396.912,00	4,00	$ 264.608,00	0,00	$ -	5,00	$ 330.760,00	1,00	$ 66.152,00	5,00	$ 330.760,00
37	CC-13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	17,45	$ 114.763,00	$ 2.002.614,00	4,95	$ 568.077,00	22,40	$ 2.570.691,00	18,35	$ 2.105.901,00	0,00	$ -	22,40	$ 2.570.691,00	4,05	$ 464.790,00	22,40	$ 2.570.691,00

38	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	12	$ 107.532,00	$ 1.290.384,00	42,00	$ 4.516.344,00	54,00	$ 5.806.728,00	21,25	$ 2.285.055,00	0,00	$ -	21,25	$ 2.285.055,00	0,00	$ -	21,25	$ 2.285.055,00
39	CC-19	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	13	$ 80.484,00	$ 1.046.292,00	7,00	$ 563.388,00	20,00	$ 1.609.680,00	0,00	$ -	17,00	$ 1.368.228,00	17,00	$ 1.368.228,00	0,00	$ -	17,00	$ 1.368.228,00
40	CC-15	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	4	$ 94.212,00	$ 376.848,00	0,35	$ 32.974,00	4,35	$ 409.822,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,25	$ 400.401,00	4,25	$ 400.401,00	4,25	$ 400.401,00
41	CC-05	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	6,32	$ 48.446,00	$ 306.179,00	1,68	$ 81.389,00	8,00	$ 387.568,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 387.568,00	8,00	$ 387.568,00	8,00	$ 387.568,00
42	IH-03	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	ML	3,2	$ 62.409,00	$ 199.709,00	-0,20	-$ 12.482,00	3,00	$ 187.227,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 187.227,00	3,00	$ 187.227,00	3,00	$ 187.227,00
43	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	M2	13,05	$ 44.057,00	$ 574.979,00	4,35	$ 191.613,00	17,40	$ 766.592,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
44	AC-48	Suministro y aplicación de pintura epoxica (2 capas)	M2	23,50	$ 42.111,00	$ 989.642,00	33,76	$ 1.421.634,00	57,26	$ 2.411.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,02	$ 2.106.472,00	50,02	$ 2.106.472,00	50,02	$ 2.106.472,00
45	CA-10	Instalación de puerta existente en aluminio 2,40 mt x2,80 mt), incluye todo lo necesario para su correcta instaalción	UND	1	$ 163.434,00	$ 163.434,00	0,00	$ -	1,00	$ 163.434,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 163.434,00	1,00	$ 163.434,00	1,00	$ 163.434,00
46	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	0,72	$ 129.622,00	$ 93.328,00	2,16	$ 279.984,00	2,88	$ 373.311,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,34	$ 303.315,00	2,34	$ 303.315,00	2,34	$ 303.315,00
47	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	3,726	$ 80.325,00	$ 299.291,00	6,53	$ 524.844,00	10,26	$ 824.135,00	0,00	$ -	0,00	$ -	49,72	$ 3.994.145,00	49,72	$ 3.994.145,00	49,72	$ 3.994.145,00
		Adecuaciones Electricas																		
48	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	7	$ 144.091,00	$ 1.008.637,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.008.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
49	IE-01	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado RETIE	ML	15	$ 79.313,00	$ 1.189.695,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.189.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
50	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	ML	10	$ 17.484,00	$ 174.840,00	40,00	$ 699.360,00	50,00	$ 874.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
51	IE-02	Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	UND	21	$ 36.606,00	$ 768.726,00	0,00	$ -	21,00	$ 768.726,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
52	IE-03	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	ML	158	$ 11.446,00	$ 1.808.468,00	0,00	$ -	158,00	$ 1.808.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
53	IE-50	Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6°, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	UND	7	$ 81.290,00	$ 569.030,00	1,00	$ 81.290,00	8,00	$ 650.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
54	IE-04	Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	UND	7	$ 22.051,00	$ 154.357,00	0,00	$ -	7,00	$ 154.357,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
55	IE-22	Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	UND	7	$ 41.103,00	$ 287.721,00	0,00	$ -	7,00	$ 287.721,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
56	IE-05	Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	UND	7	$ 122.044,00	$ 854.308,00	0,00	$ -	7,00	$ 854.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
57	IE-16	Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	UND	1	$ 3.195.955,00	$ 3.195.955,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.195.955,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
58	IE-23	Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	UND	1	$ 554.127,00	$ 554.127,00	0,00	$ -	1,00	$ 554.127,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Tratamiento de humedades internas																$ -		
59	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	4,55	$ 10.537,00	$ 47.943,00	0,25	$ 2.634,00	4,80	$ 50.578,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
60	RI-09	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	4,55	$ 46.495,00	$ 211.552,00	0,25	$ 11.624,00	4,80	$ 223.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
61	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	4,55	$ 34.790,00	$ 158.295,00	19,45	$ 676.666,00	24,00	$ 834.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,38	$ 117.663,00	3,38	$ 117.663,00	3,38	$ 117.663,00
62	AC-04	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones)	M2	11,375	$ 21.984,00	$ 250.068,00	42,13	$ 926.076,00	53,50	$ 1.176.144,00	0,00	$ -	0,00	$ -	63,23	$ 1.390.000,00	63,23	$ 1.390.000,00	63,23	$ 1.390.000,00
63	AC-06	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2	M2	29,5	$ 16.149,00	$ 476.396,00	-29,50	-$ 476.396,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
64	PR-28	Desmonte y retiro de cielo en panel yeso	M2	2,6	$ 17.596,00	$ 45.750,00	9,40	$ 165.402,00	12,00	$ 211.152,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,38	$ 59.511,00	3,38	$ 59.511,00	3,38	$ 59.511,00
		Baño PMR																		
65	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios, incluye todos los accesorios existentes y el respectivo retiro	UND	4	$ 35.648,00	$ 142.592,00	-2,00	-$ 71.296,00	2,00	$ 71.296,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
66	PR-07	Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros.	M2	12,6984	$ 40.336,00	$ 512.203,00	-6,32	-$ 254.859,00	6,38	$ 257.344,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
67	PR-08	Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros.	M2	36,64	$ 43.580,00	$ 1.596.771,00	-18,32	-$ 798.386,00	18,32	$ 798.386,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
68	PR-61	Desmonte y retiro de espejo existente	UND	2	$ 35.615,00	$ 71.230,00	-1,00	-$ 35.615,00	1,00	$ 35.615,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
69	AP-05	suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	2	$ 1.255.599,00	$ 2.511.198,00	-1,00	-$ 1.255.599,00	1,00	$ 1.255.599,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
70	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	2	$ 1.085.697,00	$ 2.171.394,00	-1,00	-$ 1.085.697,00	1,00	$ 1.085.697,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
71	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	2	$ 276.297,00	$ 552.594,00	-1,00	-$ 276.297,00	1,00	$ 276.297,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
72	AC-51	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	2	$ 925.591,00	$ 1.851.182,00	-1,00	-$ 925.591,00	1,00	$ 925.591,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Otros																		
73	SH-20	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final	ML	3,8	$ 71.439,00	$ 271.468,00	0,20	$ 14.288,00	4,00	$ 285.756,00	0,00	$ -	4,00	$ 285.756,00	4,00	$ 285.756,00	0,00	$ -	4,00	$ 285.756,00
74	SH-01	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento	ML	3,8	$ 1.170.671,00	$ 4.448.550,00	0,70	$ 819.470,00	4,50	$ 5.268.020,00	0,00	$ -	4,50	$ 5.268.020,00	4,50	$ 5.268.020,00	0,00	$ -	4,50	$ 5.268.020,00
75	VA-05	Aseo general.	M2	412,7	$ 5.868,00	$ 2.421.724,00	0,00	$ -	412,70	$ 2.421.724,00	412,70	$ 2.421.724,00	0,00	$ -	412,70	$ 2.421.724,00	0,00	$ -	412,70	$ 2.421.724,00
76	SH-03	Suministro e instalación de placa de identificación	UND	1	$ 284.381,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00	1,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00
77	SH-06	Entrega de certificado según Resolución 4272 de 2021.	UND	1	$ 2.752.740,00	$ 2.752.740,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.752.740,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.752.740,00	1,00	$ 2.752.740,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.752.740,00
78	SN	Empaque de escombros en fibra	m3	3	$ 96.265,00	$ 288.795,00	3,00	$ 288.795,00	6,00	$ 577.590,00	6,00	$ 577.590,00	0,00	$ -	6,00	$ 577.590,00	0,00	$ -	6,00	$ 577.590,00
79	SN	Cargue material manual	m3	6	$ 13.333,00	$ 79.998,00	0,00	$ -	6,00	$ 79.998,00	6,00	$ 79.998,00	0,00	$ -	6,00	$ 79.998,00	0,00	$ -	6,00	$ 79.998,00
80	SN	Retiro acarreo material volqueta kilom	m3k	6	$ 2.350,00	$ 14.100,00	0,00	$ -	6,00	$ 14.100,00	6,00	$ 14.100,00	0,00	$ -	6,00	$ 14.100,00	0,00	$ -	6,00	$ 14.100,00
81	SN	Disposición final de escombros y sobrantes	M3	6	$ 4.578,00	$ 27.468,00	0,00	$ -	6,00	$ 27.468,00	6,00	$ 27.468,00	0,00	$ -	6,00	$ 27.468,00	0,00	$ -	6,00	$ 27.468,00
82	SN	Movimiento vertical de materiales - escombros	KG	1149	$ 149,00	$ 171.201,00	5857,00	$ 872.693,00	7.006,00	$ 1.043.894,00	4.748,83	$ 707.576,00	2.212,17	$ 329.613,00	6.961,00	$ 1.037.189,00	0,00	$ -	6961,00	$ 1.037.189,00
		ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																		
1,05	PR-28	Demolición de cielo raso	M2	0,00	$ 21.680,00	$ -	181,80	$ 3.941.424,00	181,80	$ 3.941.424,00	0,00	$ -	163,35	$ 3.541.428,00	163,35	$ 3.541.428,00	0,00	$ -	163,35	$ 3.541.428,00
48;	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 36.623,00	$ -	55,18	$ 2.020.857,00	55,18	$ 2.020.857,00	0,00	$ -	0,00	$ -	55,18	$ 2.020.857,00	55,18	$ 2.020.857,00	55,18	$ 2.020.857,00
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye estructura.	M2	0,00	$ 90.735,00	$ -	12,00	$ 1.088.820,00	12,00	$ 1.088.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,38	$ 306.875,00	3,38	$ 306.875,00	3,38	$ 306.875,00
2,05	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	0,00	$ 82.477,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	33,75	$ 2.783.599,00	33,75	$ 2.783.599,00	33,75	$ 2.783.599,00
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 180.519.376,00**		**$ 38.281.187,00**		**$ 218.800.562,00**		**$ 147.777.571,00**		**$ 15.515.414,00**		**$ 189.138.202,00**		**$ 25.845.217,00**		**$ 189.138.202,00**
		ADMINISTRACION		25,00%		$ 45.129.844,00		$ 9.570.297,00		$ 54.700.141,00		$ 36.944.393,00		$ 3.878.854,00		$ 47.284.551,00		$ 6.461.304,00		$ 47.284.551,00
		IMPREVISTO		2,00%		$ 3.610.388,00		$ 765.624,00		$ 4.376.011,00		$ 2.955.551,00		$ 310.308,00		$ 3.782.764,00		$ 516.904,00		$ 3.782.764,00
		UTILIDAD		5,00%		$ 9.025.969,00		$ 1.914.059,00		$ 10.940.028,00		$ 7.388.879,00		$ 775.771,00		$ 9.456.910,00		$ 1.292.261,00		$ 9.456.910,00
		IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 1.714.934,00		$ 363.671,00		$ 2.078.605,00		$ 1.403.887,00		$ 147.396,00		$ 1.796.813,00		$ 245.530,00		$ 1.796.813,00
		VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)				**$ 240.000.511,00**		**$ 50.894.838,00**		**$ 290.895.347,00**		**$ 196.470.281,00**		**$ 20.627.743,00**		**$ 251.459.240,00**		**$ 34.361.216,00**		**$ 251.459.240,00**

CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO																				
ITEM	***ID***	***DESCRIPCIÓN***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	***VALOR UNITARIO***	***VALOR TOTAL***	**MAYORES Y MENORES**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
		1. Baterías sanitarias - cocineta																		
1,01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	42,01	$ 69.430,00	$ 2.916.754,00	16,39	$ 1.137.671,00	58,40	$ 4.054.425,00	42,01	$ 2.916.754,00	0,00	$ -	42,01	$ 2.916.754,00	0,00	$ -	42,01	$ 2.916.754,00

1,02	PR-25	Desmonte de puertas en madera	UND	6	$	62.016,00	$	372.096,00	2,00	$	124.032,00	8,00	$	496.128,00	6,00	$	372.096,00	2,00	$	124.032,00	8,00	$	496.128,00	0,00	$	-	8,00	$	496.128,00
1,03	PR-26	Demolicion meson en concreto	ML	6,02	$	46.591,00	$	280.478,00	0,00	$	-	6,02	$	280.478,00	5,88	$	273.955,00	0,00	$	-	5,88	$	273.955,00	0,00	$	-	5,88	$	273.955,00
1,04	PR-27	Demolición muros en ladrillo	M2	27,18	$	26.991,00	$	733.615,00	-22,00	-$	593.667,00	5,19	$	139.948,00	5,19	$	139.948,00	0,00	$	-	5,19	$	139.948,00	0,00	$	-	5,19	$	139.948,00
1,05	PR-28	Demolición de cieloraso	M2	15,87	$	21.680,00	$	344.062,00	-15,87	-$	344.062,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
1,06	PR-30	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	50,65	$	27.449,00	$	1.390.292,00	65,60	$	1.800.750,00	116,25	$	3.191.042,00	110,99	$	3.046.482,00	0,00	$	-	110,99	$	3.046.482,00	0,00	$	-	110,99	$	3.046.482,00
1,07	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	40,52	$	17.993,00	$	729.076,00	0,00	$	-	40,52	$	729.076,00	0,00	$	-	20,84	$	374.974,00	20,84	$	374.974,00	0,00	$	-	20,84	$	374.974,00
1,08	PR-33	corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.	ML	9	$	37.613,00	$	338.517,00	9,00	$	338.517,00	18,00	$	677.034,00	18,00	$	677.034,00	0,00	$	-	18,00	$	677.034,00	0,00	$	-	18,00	$	677.034,00
1,09	PR-35	regatas en muros para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	11	$	10.870,00	$	119.570,00	1,00	$	10.870,00	12,00	$	130.440,00	12,00	$	130.440,00	0,00	$	-	12,00	$	130.440,00	0,00	$	-	12,00	$	130.440,00
1,1	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	13	$	46.216,00	$	600.808,00	2,00	$	92.432,00	15,00	$	693.240,00	15,00	$	693.240,00	0,00	$	-	15,00	$	693.240,00	0,00	$	-	15,00	$	693.240,00
1,11	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	42,01	$	82.477,00	$	3.464.859,00	16,39	$	1.351.551,00	58,40	$	4.816.409,00	32,10	$	2.647.454,00	0,00	$	-	32,45	$	2.676.321,00	0,35	$	28.867,00	32,45	$	2.676.321,00
1,12	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	42,01	$	47.974,00	$	2.015.388,00	13,39	$	642.228,00	55,40	$	2.657.616,00	30,40	$	1.458.280,00	14,30	$	686.124,00	44,70	$	2.144.404,00	0,00	$	-	44,70	$	2.144.404,00
1,13	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	M2	49,05	$	41.029,00	$	2.012.472,00	78,71	$	3.229.286,00	127,76	$	5.241.758,00	109,34	$	4.486.196,00	18,42	$	755.562,00	128,25	$	5.261.862,00	0,49	$	20.104,00	128,25	$	5.261.862,00
1,14	DI-10	cajas de inspección de concreto reforzado 60x60	UND	10	$	884.762,00	$	8.847.620,00	-5,00	-$	4.423.810,00	5,00	$	4.423.810,00	5,00	$	4.423.810,00	0,00	$	-	5,00	$	4.423.810,00	0,00	$	-	5,00	$	4.423.810,00
1,15	DI-02	suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	M2	13,85	$	148.796,00	$	2.060.825,00	4,15	$	617.503,00	18,00	$	2.678.328,00	13,00	$	1.934.348,00	0,00	$	-	13,00	$	1.934.348,00	0,00	$	-	13,00	$	1.934.348,00
1,16	DI-05	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	3	$	62.454,00	$	187.362,00	-3,00	-$	187.362,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
1,17	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	3	$	49.931,00	$	149.793,00	-3,00	-$	149.793,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye estructura.	M2	29,98	$	90.735,00	$	2.720.235,00	-29,98	-$	2.720.235,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
1,19	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	66,87	$	119.952,00	$	8.021.190,00	69,40	$	8.325.209,00	136,27	$	16.346.399,00	71,17	$	8.536.864,00	60,78	$	7.290.395,00	131,95	$	15.827.259,00	0,00	$	-	131,95	$	15.827.259,00
1,2	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	21,75	$	119.540,00	$	2.599.995,00	18,12	$	2.165.826,00	39,87	$	4.765.821,00	17,86	$	2.134.566,00	0,00	$	-	17,86	$	2.134.566,00	0,00	$	-	17,86	$	2.134.566,00
1,21	AC-19	Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox)	M2	20,26	$	105.806,00	$	2.143.630,00	-9,26	-$	979.764,00	11,00	$	1.163.866,00	8,20	$	867.271,00	0,00	$	-	10,04	$	1.061.954,00	1,84	$	194.683,00	10,04	$	1.061.954,00
1,22	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	15,14	$	51.104,00	$	773.715,00	-9,14	-$	467.091,00	6,00	$	306.624,00	6,00	$	306.624,00	0,00	$	-	6,00	$	306.624,00	0,00	$	-	6,00	$	306.624,00
1,23	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	8	$	108.706,00	$	869.648,00	1,00	$	108.706,00	9,00	$	978.354,00	9,00	$	978.354,00	0,00	$	-	9,00	$	978.354,00	0,00	$	-	9,00	$	978.354,00
1,24	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	5	$	74.679,00	$	373.395,00	1,00	$	74.679,00	6,00	$	448.074,00	6,00	$	448.074,00	0,00	$	-	6,00	$	448.074,00	0,00	$	-	6,00	$	448.074,00
1,25	IH-10	suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	UND	5	$	27.544,00	$	137.720,00	2,00	$	55.088,00	7,00	$	192.808,00	6,00	$	165.264,00	1,00	$	27.544,00	7,00	$	192.808,00	0,00	$	-	7,00	$	192.808,00
1,26	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	55,28	$	74.360,00	$	4.110.621,00	-13,28	-$	987.501,00	42,00	$	3.123.120,00	25,00	$	1.859.000,00	2,90	$	215.644,00	27,90	$	2.074.644,00	0,00	$	-	27,90	$	2.074.644,00
1,27	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	6	$	126.364,00	$	758.184,00	-4,00	-$	505.456,00	2,00	$	252.728,00	2,00	$	252.728,00	0,00	$	-	2,00	$	252.728,00	0,00	$	-	2,00	$	252.728,00
1,28	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	42,5	$	28.734,00	$	1.221.195,00	-30,50	-$	876.387,00	12,00	$	344.808,00	12,00	$	344.808,00	0,00	$	-	12,00	$	344.808,00	0,00	$	-	12,00	$	344.808,00
1,29	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	14	$	70.623,00	$	988.722,00	-7,00	-$	494.361,00	7,00	$	494.361,00	7,00	$	494.361,00	0,00	$	-	7,00	$	494.361,00	0,00	$	-	7,00	$	494.361,00
1,3	IH-23	suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15	UND	5	$	34.915,00	$	174.575,00	0,00	$	-	5,00	$	174.575,00	3,00	$	104.745,00	2,00	$	69.830,00	5,00	$	174.575,00	0,00	$	-	5,00	$	174.575,00
1,31	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	5	$	108.686,00	$	543.430,00	3,00	$	326.058,00	8,00	$	869.488,00	6,00	$	652.116,00	2,00	$	217.372,00	8,00	$	869.488,00	0,00	$	-	8,00	$	869.488,00
1,32	AC-55	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.	ML	3,85	$	1.000.961,00	$	3.853.700,00	0,00	$	-	3,85	$	3.853.700,00	1,93	$	1.926.850,00	1,93	$	1.926.850,00	3,85	$	3.853.700,00	0,00	$	-	3,85	$	3.853.700,00
1,33	DI-07	suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación	ML	1,75	$	306.701,00	$	536.727,00	-0,55	-$	168.686,00	1,20	$	368.041,00	0,00	$	-	1,20	$	368.041,00	1,20	$	368.041,00	0,00	$	-	1,20	$	368.041,00
1,34	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.	UND	5	$	439.566,00	$	2.197.830,00	0,00	$	-	5,00	$	2.197.830,00	2,00	$	879.132,00	3,00	$	1.318.698,00	5,00	$	2.197.830,00	0,00	$	-	5,00	$	2.197.830,00
1,35	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	1	$	1.136.407,00	$	1.136.407,00	0,00	$	-	1,00	$	1.136.407,00	0,00	$	-	1,00	$	1.136.407,00	1,00	$	1.136.407,00	0,00	$	-	1,00	$	1.136.407,00
1,36	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	UND	5	$	719.169,00	$	3.595.845,00	0,00	$	-	5,00	$	3.595.845,00	1,00	$	719.169,00	4,00	$	2.876.676,00	5,00	$	3.595.845,00	0,00	$	-	5,00	$	3.595.845,00
1,37	AP-05	Suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	1	$	1.337.014,00	$	1.337.014,00	0,00	$	-	1,00	$	1.337.014,00	1,00	$	1.337.014,00	0,00	$	-	1,00	$	1.337.014,00	0,00	$	-	1,00	$	1.337.014,00
1,38	AP-08	Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal	UND	2	$	477.009,00	$	954.018,00	0,00	$	-	2,00	$	954.018,00	1,00	$	477.009,00	1,00	$	477.009,00	2,00	$	954.018,00	0,00	$	-	2,00	$	954.018,00
1,39	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio	M2	2,7	$	408.065,00	$	1.101.776,00	0,30	$	122.420,00	3,00	$	1.224.195,00	0,00	$	-	3,00	$	1.224.195,00	3,00	$	1.224.195,00	0,00	$	-	3,00	$	1.224.195,00
1,4	AP-04	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	UND	6	$	355.943,00	$	2.135.658,00	0,00	$	-	6,00	$	2.135.658,00	3,00	$	1.067.829,00	3,00	$	1.067.829,00	6,00	$	2.135.658,00	0,00	$	-	6,00	$	2.135.658,00
1,41	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	6	$	57.558,00	$	345.348,00	0,00	$	-	6,00	$	345.348,00	2,00	$	115.116,00	4,00	$	230.232,00	6,00	$	345.348,00	0,00	$	-	6,00	$	345.348,00
1,42	AC-50	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	1	$	991.188,00	$	991.188,00	0,00	$	-	1,00	$	991.188,00	1,00	$	991.188,00	0,00	$	-	1,00	$	991.188,00	0,00	$	-	1,00	$	991.188,00
1,43	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	1	$	346.512,00	$	346.512,00	0,00	$	-	1,00	$	346.512,00	0,00	$	-	1,00	$	346.512,00	1,00	$	346.512,00	0,00	$	-	1,00	$	346.512,00
1,44	CA-38	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento	UND	2	$	2.408.660,00	$	4.817.320,00	0,00	$	-	2,00	$	4.817.320,00	0,00	$	-	2,00	$	4.817.320,00	2,00	$	4.817.320,00	0,00	$	-	2,00	$	4.817.320,00
1,45	CA-36	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	5	$	876.659,00	$	4.383.295,00	0,00	$	-	5,00	$	4.383.295,00	3,00	$	2.629.977,00	2,00	$	1.753.318,00	5,00	$	4.383.295,00	0,00	$	-	5,00	$	4.383.295,00
1,46	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	M2	12,3	$	834.615,00	$	10.265.765,00	-10,30	-$	8.596.535,00	2,00	$	1.669.230,00	2,00	$	1.669.230,00	0,00	$	-	2,00	$	1.669.230,00	0,00	$	-	2,00	$	1.669.230,00
1,47	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	2	$	557.646,00	$	1.115.292,00	0,00	$	-	2,00	$	1.115.292,00	1,00	$	557.646,00	0,00	$	-	1,00	$	557.646,00	0,00	$	-	1,00	$	557.646,00
1,48	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	13	$	125.536,00	$	1.631.968,00	-8,00	-$	1.004.288,00	5,00	$	627.680,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
1,49	IE-11	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	5	$	100.115,00	$	500.575,00	0,00	$	-	5,00	$	500.575,00	0,00	$	-	5,00	$	500.575,00	5,00	$	500.575,00	0,00	$	-	5,00	$	500.575,00
1,5	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	5	$	101.820,00	$	509.100,00	0,00	$	-	5,00	$	509.100,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
1,51	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	MI	30	$	19.146,00	$	574.380,00	0,00	$	-	30,00	$	574.380,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
1,52	CA-15	suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación, accesorios para su correcto funcionamiento y encimera en acero inoxidable con pozuelo .	MI	1,7	$	973.256,00	$	1.654.535,00	0,10	$	97.326,00	1,80	$	1.751.861,00	1,80	$	1.751.861,00	0,00	$	-	1,80	$	1.751.861,00	0,00	$	-	1,80	$	1.751.861,00
1,53	IE-45	Suministro e instalación toma electrico GFCI	UND	3	$	117.403,00	$	352.209,00	0,00	$	-	3,00	$	352.209,00	1,00	$	117.403,00	0,00	$	-	1,00	$	117.403,00	0,00	$	-	1,00	$	117.403,00
1,54	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	14,4	$	87.992,00	$	1.267.085,00	0,00	$	-	14,40	$	1.267.085,00	8,00	$	703.936,00	6,40	$	563.149,00	14,40	$	1.267.085,00	0,00	$	-	14,40	$	1.267.085,00
1,55	AP-01	Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalación y correcto funcionamiento	UND	2	$	475.809,00	$	951.618,00	0,00	$	-	2,00	$	951.618,00	0,00	$	-	2,00	$	951.618,00	2,00	$	951.618,00	0,00	$	-	2,00	$	951.618,00
		2. Losa tanques de agua																											
2,01	CA-16	Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir	ML	2	$	103.260,00	$	206.520,00	0,00	$	-	2,00	$	206.520,00	0,00	$	-	1,40	$	144.564,00	1,40	$	144.564,00	0,00	$	-	1,40	$	144.564,00
2,02	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	9,02	$	47.974,00	$	432.725,00	0,00	$	-	9,02	$	432.725,00	7,79	$	373.717,00	0,00	$	-	7,79	$	373.717,00	0,00	$	-	7,79	$	373.717,00
2,03	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	9,02	$	119.540,00	$	1.078.251,00	0,00	$	-	9,02	$	1.078.251,00	7,79	$	931.217,00	0,00	$	-	7,79	$	931.217,00	0,00	$	-	7,79	$	931.217,00
2,04	IH-13	Desmonte y reinstalación tanques de almacenamiento de agua 500lts, incluye accesorios	Und	2	$	169.660,00	$	339.320,00	1,00	$	169.660,00	3,00	$	508.980,00	3,00	$	508.980,00	0,00	$	-	3,00	$	508.980,00	0,00	$	-	3,00	$	508.980,00
2,05	AC-13	Suministro e instalación de enchape cerámico para pared formato 20 cm x 20 cm	M2	13,19	$	80.532,00	$	1.062.217,00	-13,19	-$	1.062.217,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
		3. Varios																											

3,01	CA-31	Adecuación dintel de madera 0,05x0,50x1,80, inmunnizado y pintado color negro mate, incluye alzaprimada de muro/cubierta, retiro dintel existente, resane y pintura 3 vinilo manos en muro	UND	1	$ 481.980,00	$ 481.980,00	0,00	$ -	1,00	$ 481.980,00	0,00	$ -	1,00	$ 481.980,00	1,00	$ 481.980,00	0,00	$ -	1,00	$ 481.980,00
3,02	CA-17	Cambio columna de madera 0,15x0,15x3,5, similar al existente inmunnizada y pintada color negro mate (similar al existente), incluye alzaprimada de cubierta, retiro de la columna existente y todo lo necesario para su correcta instalación	UND	8	$ 573.856,00	$ 4.590.848,00	8,00	$ 4.590.848,00	16,00	$ 9.181.696,00	0,00	$ -	8,00	$ 4.590.848,00	16,00	$ 9.181.696,00	8,00	$ 4.590.848,00	16,00	$ 9.181.696,00
3,03	CA-18	Suministro e instalación de cerradura de sobreponer acorazada, con cobertura adicional contra apertura forzosa, bulón cuadrado de 35mm y cerrojo de tres (3) golpes para puerta en madera	UND	4	$ 265.780,00	$ 1.063.120,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.063.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.063.120,00	4,00	$ 1.063.120,00	4,00	$ 1.063.120,00
3,04	CA-40	Suministro e instalación de cerradura de doble cerrojo de 3 golpes con cilindro de llave plana reversibles, backset de 70Mm, para puerta de madera.	UND	1	$ 219.712,00	$ 219.712,00	0,00	$ -	1,00	$ 219.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 219.712,00	1,00	$ 219.712,00	1,00	$ 219.712,00
3,05	DI-02	Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	9	$ 148.796,00	$ 1.339.164,00	-9,00	-$ 1.339.164,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,06	VA-05	Aseo general	M2	42,01	$ 6.251,00	$ 262.605,00	290,95	$ 1.818.728,00	332,96	$ 2.081.333,00	332,96	$ 2.081.333,00	0,00	$ -	332,96	$ 2.081.333,00	0,00	$ -	332,96	$ 2.081.333,00
		4. Cubierta																		
4,01		Desmonte teja de barro (incluye el respectivo almacenamiento para conservar su estado y posterior reinstalación)	M2	150	$ 11.604,00	$ 1.740.600,00	8,01	$ 92.963,00	158,01	$ 1.833.563,00	158,01	$ 1.833.563,00	0,00	$ -	158,01	$ 1.833.563,00	0,00	$ -	158,01	$ 1.833.563,00
4,02		Suministro e instalación manto techfiel 4 mm (el cual se instalará sobre la estructura de cubierta y por debajo de la teja de barro)	M2	150	$ 67.690,00	$ 10.153.500,00	8,01	$ 542.285,00	158,01	$ 10.695.785,00	158,01	$ 10.695.785,00	0,00	$ -	166,01	$ 11.237.305,00	8,00	$ 541.520,00	166,01	$ 11.237.305,00
4,03		Reinstalación de teja de barro existente, con fijación	M2	60	$ 17.406,00	$ 1.044.360,00	-60,00	-$ 1.044.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04		Suministro e instalación de teja de barro	M2	22,5	$ 43.515,00	$ 979.088,00	-22,50	-$ 979.088,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,05	10	Suministro e instalación caballete Colonial articulado rojo, similar a la teja de barro, incluye accesorios para su correcta instalación.	ML	10	$ 62.855,00	$ 628.550,00	40,00	$ 2.514.200,00	50,00	$ 3.142.750,00	50,00	$ 3.142.750,00	0,00	$ -	50,00	$ 3.142.750,00	0,00	$ -	50,00	$ 3.142.750,00
4,06	CC-15	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias sección de 20 cm X 15 cm en lámina galvanizada calibre 22 (incluye los elementos de soporte y fijación)	ML	6	$ 87.030,00	$ 522.180,00	-6,00	-$ 522.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,07	IH-04	Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.	ML	6	$ 58.020,00	$ 348.120,00	-6,00	-$ 348.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,08		mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros.	M2	50	$ 53.185,00	$ 2.659.250,00	347,72	$ 18.493.674,00	397,72	$ 21.152.924,00	397,72	$ 21.152.924,00	0,00	$ -	397,72	$ 21.152.924,00	0,00	$ -	397,72	$ 21.152.924,00
4,09	CC-05	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	6	$ 62.855,00	$ 377.130,00	-6,00	-$ 377.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		5. Seguridad Humana																		$ -
5,01	SH-01	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento	ML	4	$ 1.216.261,00	$ 4.865.044,00	0,00	$ -	4,00	$ 4.865.044,00	0,00	$ -	4,00	$ 4.865.044,00	4,00	$ 4.865.044,00	0,00	$ -	4,00	$ 4.865.044,00
5,02	SH-03	Suministro e instalación de Placa de Identificación	UND	1	$ 284.381,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00	1,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00
5,03	SH-06	Entrega de Certificación según RESOLUCION 4272 DE 2021	UND	1	$ 4.054.978,00	$ 4.054.978,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.054.978,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.054.978,00	1,00	$ 4.054.978,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.054.978,00
5,04	SH-20	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final	ML	4	$ 100.449,00	$ 401.796,00	0,00	$ -	4,00	$ 401.796,00	0,00	$ -	4,00	$ 401.796,00	4,00	$ 401.796,00	0,00	$ -	4,00	$ 401.796,00
		ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																		
62	AC-04	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones)	M2	0	$ 21.984,00	$ -	352,23	$ 7.743.358,00	352,23	$ 7.743.358,00	0,00	$ -	0,00	$ -	159,36	$ 3.503.348,00	159,36	$ 3.503.348,00	159,36	$ 3.503.348,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 137.690.446,00**		**$ 20.671.253,00**		**$ 158.361.697,00**		**$ 96.008.441,00**		**$ 44.143.497,00**		**$ 150.314.140,00**		**$ 10.162.202,00**		**$ 150.314.140,00**
ADMINISTRACIÓN					23,00%	$ 31.668.803,00		$ 4.754.388,00		$ 36.423.190,00		$ 22.081.941,00		$ 10.153.004,00		$ 34.572.252,00		$ 2.337.306,00		$ 34.572.252,00
IMPREVISTO					1,00%	$ 1.376.904,00		$ 206.713,00		$ 1.583.617,00		$ 960.084,00		$ 441.435,00		$ 1.503.141,00		$ 101.622,00		$ 1.503.141,00
UTILIDAD					5,00%	$ 6.884.522,00		$ 1.033.563,00		$ 7.918.085,00		$ 4.800.422,00		$ 2.207.175,00		$ 7.515.707,00		$ 508.110,00		$ 7.515.707,00
IVA					19,00%	$ 1.308.059,00		$ 196.377,00		$ 1.504.436,00		$ 912.080,00		$ 419.363,00		$ 1.427.984,00		$ 96.541,00		$ 1.427.984,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA						**$ 178.928.734,00**		**$ 26.862.294,00**		**$ 205.791.025,00**		**$ 124.762.968,00**		**$ 57.364.474,00**		**$ 195.333.224,00**		**$ 13.205.781,00**		**$ 195.333.224,00**

CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

ITEM	ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES Y MENORES	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
		1. Baterias sanitarias																		
1,01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	20,17	$ 69.430,00	$ 1.400.403,00	8,28	$ 574.533,00	28,45	$ 1.974.936,00	27,52	$ 1.910.366,00	0,93	$ 64.570,00	28,45	$ 1.974.936,00	0,00	$ -	28,45	$ 1.974.936,00
1,02	PR-25	Desmonte de puertas en madera	UND	1	$ 62.016,00	$ 62.016,00	0,00	$ -	1,00	$ 62.016,00	1,00	$ 62.016,00	0,00	$ -	1,00	$ 62.016,00	0,00	$ -	1,00	$ 62.016,00
1,03	PR-27	Demolición muros en ladrillo	M2	1,8	$ 37.822,00	$ 68.080,00	-0,05	-$ 1.891,00	1,75	$ 66.189,00	1,75	$ 66.189,00	0,00	$ -	1,75	$ 66.189,00	0,00	$ -	1,75	$ 66.189,00
1,04	PR-30	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	20,34	$ 27.449,00	$ 558.313,00	4,44	$ 121.772,00	24,78	$ 680.085,00	24,77	$ 679.912,00	0,00	$ -	24,77	$ 679.912,00	0,00	$ -	24,77	$ 679.912,00
1,05	PR-31	Desmontar y retirar las divisiones de baño existentes	UND	4	$ 79.110,00	$ 316.440,00	3,00	$ 237.330,00	7,00	$ 553.770,00	5,00	$ 395.550,00	2,00	$ 158.220,00	7,00	$ 553.770,00	0,00	$ -	7,00	$ 553.770,00
1,06	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	4	$ 21.377,00	$ 85.508,00	0,00	$ -	4,00	$ 85.508,00	4,00	$ 85.508,00	0,00	$ -	4,00	$ 85.508,00	0,00	$ -	4,00	$ 85.508,00
1,07	PR-33	corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.	ML	1,8	$ 42.448,00	$ 76.406,00	4,20	$ 178.282,00	6,00	$ 254.688,00	6,00	$ 254.688,00	0,00	$ -	6,00	$ 254.688,00	0,00	$ -	6,00	$ 254.688,00
1,08	PR-35	regatas en muros para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	6	$ 18.365,00	$ 110.190,00	-3,50	-$ 64.278,00	2,50	$ 45.913,00	2,50	$ 45.913,00	0,00	$ -	2,50	$ 45.913,00	0,00	$ -	2,50	$ 45.913,00
1,09	PR-34	Regata en piso para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	18	$ 17.969,00	$ 323.442,00	0,00	$ -	18,00	$ 323.442,00	10,54	$ 189.393,00	0,00	$ -	10,54	$ 189.393,00	0,00	$ -	10,54	$ 189.393,00
1,1	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	7	$ 46.216,00	$ 323.512,00	0,00	$ -	7,00	$ 323.512,00	6,00	$ 277.296,00	1,00	$ 46.216,00	7,00	$ 323.512,00	0,00	$ -	7,00	$ 323.512,00
1,11	PR-37	Reinstalación de aparatos sanitarios	UND	2	$ 54.827,00	$ 109.654,00	0,00	$ -	2,00	$ 109.654,00	2,00	$ 109.654,00	0,00	$ -	2,00	$ 109.654,00	0,00	$ -	2,00	$ 109.654,00
1,12	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	11,1	$ 82.477,00	$ 915.495,00	16,42	$ 1.353.860,00	27,52	$ 2.269.355,00	27,52	$ 2.269.355,00	0,00	$ -	27,52	$ 2.269.355,00	0,00	$ -	27,52	$ 2.269.355,00
1,13	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	11,1	$ 47.974,00	$ 532.511,00	16,42	$ 787.493,00	27,52	$ 1.320.005,00	27,52	$ 1.320.005,00	0,00	$ -	27,52	$ 1.320.005,00	0,00	$ -	27,52	$ 1.320.005,00
1,14	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	M2	42,66	$ 41.029,00	$ 1.750.297,00	1,66	$ 68.067,00	44,32	$ 1.818.364,00	37,74	$ 1.548.558,00	6,58	$ 269.806,00	44,32	$ 1.818.364,00	0,00	$ -	44,32	$ 1.818.364,00
1,15	DI-02	suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	M2	7,3	$ 148.796,00	$ 1.086.211,00	2,10	$ 312.472,00	9,40	$ 1.398.682,00	7,60	$ 1.130.850,00	1,80	$ 267.833,00	13,33	$ 1.983.153,00	3,93	$ 584.470,00	13,33	$ 1.983.153,00
1,16	DI-05	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	3	$ 62.454,00	$ 187.362,00	6,00	$ 374.724,00	9,00	$ 562.086,00	5,00	$ 312.270,00	4,00	$ 249.816,00	9,00	$ 562.086,00	0,00	$ -	9,00	$ 562.086,00
1,17	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	3	$ 49.931,00	$ 149.793,00	8,00	$ 399.448,00	11,00	$ 549.241,00	8,00	$ 399.448,00	3,00	$ 149.793,00	11,00	$ 549.241,00	0,00	$ -	11,00	$ 549.241,00
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.	M2	20,17	$ 90.735,00	$ 1.830.125,00	11,10	$ 1.006.705,00	31,27	$ 2.836.830,00	0,00	$ -	31,27	$ 2.836.830,00	31,27	$ 2.836.830,00	0,00	$ -	31,27	$ 2.836.830,00
1,19	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	42,66	$ 119.952,00	$ 5.117.152,00	-0,72	-$ 86.965,00	41,94	$ 5.030.187,00	45,07	$ 5.405.877,00	0,00	$ -	45,07	$ 5.405.877,00	0,00	$ -	45,07	$ 5.405.877,00
1,2	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	20,17	$ 119.540,00	$ 2.411.122,00	7,35	$ 878.021,00	27,52	$ 3.289.143,00	27,52	$ 3.289.143,00	0,00	$ -	27,52	$ 3.289.143,00	0,00	$ -	27,52	$ 3.289.143,00
1,21	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	5,22	$ 51.104,00	$ 266.763,00	0,78	$ 39.861,00	6,00	$ 306.624,00	6,00	$ 306.624,00	0,00	$ -	6,00	$ 306.624,00	0,00	$ -	6,00	$ 306.624,00
1,22	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	3	$ 108.706,00	$ 326.118,00	1,00	$ 108.706,00	4,00	$ 434.824,00	4,00	$ 434.824,00	0,00	$ -	4,00	$ 434.824,00	0,00	$ -	4,00	$ 434.824,00
1,23	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	1	$ 74.679,00	$ 74.679,00	0,00	$ -	1,00	$ 74.679,00	1,00	$ 74.679,00	0,00	$ -	1,00	$ 74.679,00	0,00	$ -	1,00	$ 74.679,00
1,24	IH-10	suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	UND	2	$ 27.544,00	$ 55.088,00	0,00	$ -	2,00	$ 55.088,00	2,00	$ 55.088,00	0,00	$ -	2,00	$ 55.088,00	0,00	$ -	2,00	$ 55.088,00
1,25	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	3,31	$ 74.360,00	$ 246.132,00	11,69	$ 869.268,00	15,00	$ 1.115.400,00	15,00	$ 1.115.400,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.115.400,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.115.400,00
1,26	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	3	$ 126.364,00	$ 379.092,00	0,00	$ -	3,00	$ 379.092,00	3,00	$ 379.092,00	0,00	$ -	3,00	$ 379.092,00	0,00	$ -	3,00	$ 379.092,00
1,27	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	10,73	$ 28.734,00	$ 308.316,00	7,27	$ 208.896,00	18,00	$ 517.212,00	18,00	$ 517.212,00	0,00	$ -	18,00	$ 517.212,00	0,00	$ -	18,00	$ 517.212,00
1,28	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	11	$ 70.623,00	$ 776.853,00	1,00	$ 70.623,00	12,00	$ 847.476,00	12,00	$ 847.476,00	0,00	$ -	12,00	$ 847.476,00	0,00	$ -	12,00	$ 847.476,00
1,29	IH-23	suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15	UND	2	$ 34.915,00	$ 69.830,00	0,00	$ -	2,00	$ 69.830,00	2,00	$ 69.830,00	0,00	$ -	2,00	$ 69.830,00	0,00	$ -	2,00	$ 69.830,00
1,3	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	2	$ 108.686,00	$ 217.372,00	0,00	$ -	2,00	$ 217.372,00	2,00	$ 217.372,00	0,00	$ -	2,00	$ 217.372,00	0,00	$ -	2,00	$ 217.372,00
1,31	AC-55	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.	ML	2	$ 1.000.961,00	$ 2.001.922,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.001.922,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.001.922,00	2,00	$ 2.001.922,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.001.922,00
1,32	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.	UND	3	$ 439.566,00	$ 1.318.698,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.318.698,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.318.698,00	3,00	$ 1.318.698,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.318.698,00
1,33	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	UND	5	$ 719.169,00	$ 3.595.845,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.595.845,00	5,00	$ 3.595.845,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.595.845,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.595.845,00
1,34	AP-04	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	UND	5	$ 370.448,00	$ 1.852.240,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.852.240,00	2,00	$ 740.896,00	3,00	$ 1.111.344,00	5,00	$ 1.852.240,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.852.240,00
1,35	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	5	$ 57.558,00	$ 287.790,00	0,00	$ -	5,00	$ 287.790,00	5,00	$ 287.790,00	0,00	$ -	5,00	$ 287.790,00	0,00	$ -	5,00	$ 287.790,00
1,36	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	4	$ 346.512,00	$ 1.386.048,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.386.048,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.386.048,00	4,00	$ 1.386.048,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.386.048,00
1,37	CA-38	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalacion y correcto funcionamiento	UND	2	$ 2.408.660,00	$ 4.817.320,00	-1,00	-$ 2.408.660,00	1,00	$ 2.408.660,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.408.660,00	1,00	$ 2.408.660,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.408.660,00
1,38	CA-36	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	5	$ 876.659,00	$ 4.383.295,00	0,00	$ -	5,00	$ 4.383.295,00	0,00	$ -	5,00	$ 4.383.295,00	5,00	$ 4.383.295,00	0,00	$ -	5,00	$ 4.383.295,00
1,39	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	M2	13,92	$ 834.615,00	$ 11.617.841,00	0,00	$ -	13,92	$ 11.617.841,00	0,00	$ -	13,92	$ 11.617.841,00	13,92	$ 11.617.841,00	0,00	$ -	13,92	$ 11.617.841,00
1,4	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	2	$ 557.646,00	$ 1.115.292,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.115.292,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.115.292,00	2,00	$ 1.115.292,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.115.292,00
1,41	CA-29	suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	5	$ 1.492.089,00	$ 7.460.445,00	0,00	$ -	5,00	$ 7.460.445,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,42	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	4	$ 125.536,00	$ 502.144,00	0,00	$ -	4,00	$ 502.144,00	0,00	$ -	1,00	$ 125.536,00	1,00	$ 125.536,00	0,00	$ -	1,00	$ 125.536,00
1,43	IE-11	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	2	$ 100.115,00	$ 200.230,00	0,00	$ -	2,00	$ 200.230,00	0,00	$ -	2,00	$ 200.230,00	2,00	$ 200.230,00	0,00	$ -	2,00	$ 200.230,00
1,44	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	2	$ 101.820,00	$ 203.640,00	4,00	$ 407.280,00	6,00	$ 610.920,00	0,00	$ -	6,00	$ 610.920,00	6,00	$ 610.920,00	0,00	$ -	6,00	$ 610.920,00
1,45	IE-45	Suministro e instalación toma electrico GFCI	UND	1	$ 117.403,00	$ 117.403,00	0,00	$ -	1,00	$ 117.403,00	0,00	$ -	1,00	$ 117.403,00	1,00	$ 117.403,00	0,00	$ -	1,00	$ 117.403,00
1,46	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	MI	30	$ 19.146,00	$ 574.380,00	0,00	$ -	30,00	$ 574.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,89	$ 304.225,00	15,89	$ 304.225,00	15,89	$ 304.225,00
1,47	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	5,65	$ 90.410,00	$ 510.817,00	0,45	$ 40.684,00	6,10	$ 551.501,00	6,10	$ 551.501,00	0,00	$ -	6,10	$ 551.501,00	0,00	$ -	6,10	$ 551.501,00
1,48	PR-04	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 2", incluye retiro	UND	8	$ 118.253,00	$ 946.024,00	-5,00	-$ 591.265,00	3,00	$ 354.759,00	2,00	$ 236.506,00	1,00	$ 118.253,00	3,00	$ 354.759,00	0,00	$ -	3,00	$ 354.759,00
1,49	PR-05	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 4", incluye retiro	UND	5	$ 161.641,00	$ 808.205,00	-2,00	-$ 323.282,00	3,00	$ 484.923,00	3,00	$ 484.923,00	0,00	$ -	3,00	$ 484.923,00	0,00	$ -	3,00	$ 484.923,00
1,5	IH-14	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 6", incluye retiro	UND	1	$ 216.868,00	$ 216.868,00	-1,00	-$ 216.868,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,51	AP-01	Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalacion y correcto funcionamiento	UND	2	$ 475.809,00	$ 951.618,00	0,00	$ -	2,00	$ 951.618,00	2,00	$ 951.618,00	0,00	$ -	2,00	$ 951.618,00	0,00	$ -	2,00	$ 951.618,00
1,52	AP-08	Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal	UND	2	$ 477.009,00	$ 954.018,00	0,00	$ -	2,00	$ 954.018,00	2,00	$ 954.018,00	0,00	$ -	2,00	$ 954.018,00	0,00	$ -	2,00	$ 954.018,00
		2. Hundimiento hall de acceso																		
2,01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	49,35	$ 69.430,00	$ 3.426.371,00	11,66	$ 809.366,00	61,01	$ 4.235.737,00	61,01	$ 4.235.737,00	0,00	$ -	61,01	$ 4.235.737,00	0,00	$ -	61,01	$ 4.235.737,00
2,02	PR-17	Excavación en tierra a mano	M3	67,09	$ 104.451,00	$ 7.007.618,00	-36,59	-$ 3.821.481,00	30,50	$ 3.186.137,00	30,50	$ 3.186.137,00	0,00	$ -	30,50	$ 3.186.137,00	0,00	$ -	30,50	$ 3.186.137,00
2,03	PR-48	Relleno rocamuerta compactado 95%PM	M3	67,09	$ 93.764,00	$ 6.290.627,00	-36,59	-$ 3.430.483,00	30,50	$ 2.860.144,00	30,50	$ 2.860.144,00	0,00	$ -	30,50	$ 2.860.144,00	0,00	$ -	30,50	$ 2.860.144,00
2,04	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	5,1	$ 21.377,00	$ 109.023,00	-5,10	-$ 109.023,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	40,57	$ 82.477,00	$ 3.346.092,00	20,44	$ 1.685.607,00	61,01	$ 5.031.699,00	61,01	$ 5.031.699,00	0,00	$ -	61,01	$ 5.031.699,00	0,00	$ -	61,01	$ 5.031.699,00
2,06	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	40,57	$ 47.974,00	$ 1.946.305,00	20,44	$ 980.459,00	61,01	$ 2.926.764,00	61,01	$ 2.926.764,00	0,00	$ -	61,01	$ 2.926.764,00	0,00	$ -	61,01	$ 2.926.764,00
2,07	DI-10	cajas de inspección de concreto reforzado 60x60	UND	6	$ 884.762,00	$ 5.308.572,00	-4,00	-$ 3.539.048,00	2,00	$ 1.769.524,00	2,00	$ 1.769.524,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.769.524,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.769.524,00
2,08	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	40,57	$ 119.540,00	$ 4.849.738,00	20,44	$ 2.443.075,00	61,01	$ 7.292.813,00	61,01	$ 7.292.813,00	0,00	$ -	61,01	$ 7.292.813,00	0,00	$ -	61,01	$ 7.292.813,00

2,09	AC-16	Suministro e instalación guaradaescobas en PVC, color a definir por la Entidad	ML	26,19	$	31.032,00	$	812.728,00	10,75	$	333.594,00	36,94	$	1.146.322,00	0,00	$	-	36,94	$	1.146.322,00	36,94	$	1.146.322,00	0,00	$	-	36,94	$	1.146.322,00
2,1	IH-18	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento	ML	7,92	$	84.123,00	$	666.254,00	-4,92	-$	413.885,00	3,00	$	252.369,00	3,00	$	252.369,00	0,00	$	-	3,00	$	252.369,00	0,00	$	-	3,00	$	252.369,00
2,11	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	9	$	41.724,00	$	375.516,00	6,00	$	250.344,00	15,00	$	625.860,00	15,00	$	625.860,00	0,00	$	-	15,00	$	625.860,00	0,00	$	-	15,00	$	625.860,00
2,12	IH-12	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	5,42	$	28.734,00	$	155.738,00	-5,42	-$	155.738,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
2,13	IH-07	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios	ML	5,42	$	33.453,00	$	181.315,00	-5,42	-$	181.315,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
2,14	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	10,36	$	87.992,00	$	911.597,00	18,44	$	1.622.572,00	28,80	$	2.534.170,00	28,80	$	2.534.170,00	0,00	$	-	28,80	$	2.534.170,00	0,00	$	-	28,80	$	2.534.170,00
2,15	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	38,01	$	20.840,00	$	792.128,00	17,68	$	368.451,00	55,69	$	1.160.580,00	0,00	$	-	55,69	$	1.160.579,00	55,69	$	1.160.579,00	0,00	$	-	55,69	$	1.160.579,00
2,16	VA-05	Aseo general	M2	70,97	$	6.251,00	$	443.633,00	25,53	$	159.582,00	96,50	$	603.215,00	88,53	$	553.372,00	7,97	$	49.843,00	96,50	$	603.215,00	0,00	$	-	96,50	$	603.215,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO							**$**	**102.579.613,00**		**$**	**1.346.893,00**		**$**	**103.926.509,00**		**$**	**62.841.274,00**		**$**	**32.915.270,00**		**$**	**96.645.239,00**		**$**	**888.695,00**		**$**	**96.645.239,00**
ADMINISTRACIÓN					23,00%		$	23.593.311,00		$	309.785,00		$	23.903.097,00		$	14.453.493,00		$	7.570.512,00		$	22.228.405,00		$	204.399,00		$	22.228.405,00
IMPREVISTO					1,00%		$	1.025.796,00		$	13.469,00		$	1.039.265,00		$	628.413,00		$	329.153,00		$	966.452,00		$	8.887,00		$	966.452,00
UTILIDAD					5,00%		$	5.128.981,00		$	67.345,00		$	5.196.325,00		$	3.142.064,00		$	1.645.764,00		$	4.832.262,00		$	44.435,00		$	4.832.262,00
IVA					19,00%		$	974.506,00		$	12.796,00		$	987.302,00		$	596.992,00		$	312.695,00		$	918.130,00		$	8.443,00		$	918.130,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA							**$**	**133.302.207,00**		**$**	**1.750.288,00**		**$**	**135.052.498,00**		**$**	**81.662.236,00**		**$**	**42.773.394,00**		**$**	**125.590.488,00**		**$**	**1.154.859,00**		**$**	**125.590.488,00**

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.034.120.117,00**	**$ 134.719.932,00**	**$ 1.168.840.049,00**	**$482.900.258,00**	**$ 399.549.756,00**	**$ 1.168.160.859,00**	**$ 285.710.845,00**	**$ 1.168.160.859,00**
ADMINISTRACIÓN	18,50%	$ 265.991.242,00	$ 34.728.032,00	$ 300.719.274,00	$121.073.529,00	$104.485.775,00	$ 301.742.293,00	$76.182.986,00	$301.742.293,00
IMPREVISTO	2,00%	$ 12.146.395,00	$ 1.730.012,00	$ 13.876.407,00	$6.306.778,00	$4.150.652,00	$ 13.572.990,00	$3.115.560,00	$13.572.990,00
UTILIDAD	4,50%	$ 51.706.006,00	$ 6.735.997,00	$ 58.442.003,00	$24.145.014,00	$19.977.489,00	$ 58.408.043,00	$14.285.543,00	$58.408.043,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 9.824.140,00	$ 1.279.840,00	$ 11.103.980,00	$4.587.552,00	$3.795.722,00	$ 11.097.528,00	$2.714.254,00	$11.097.528,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)		**$ 1.373.787.900,00**	**$ 179.193.813,00**	**$ 1.552.981.713,00**	**$639.013.131,00**	**$531.959.394,00**	**$ 1.552.981.713,00**	**$382.009.188,00**	**$1.552.981.713,00**
				100%	**41,15%**	**34,25%**	**100%**	**24,60%**	**100,00%**

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
Representante Legal - JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

MARIA CLAUDIA GARCIA CARDENAS
Directora de Obra

ADRIANA MANUELA TRILLOS RAMIREZ
Supervisión

PIEDAD LORENA HERNANDEZ FERNANDEZ
Apoyo Supervisión

JUAN JOSE MONSALVE
Apoyo

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
23	3,28	M3		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESCOMBROS	Muros entrada Jardineras	2	1	0,4	0,60	0,48
ESCOMBROS	Jardineras	1	4	4,00	0,10	1,60
ESCOMBROS	Jardineras	1	3	4,00	0,10	1,20



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
28	1	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
espejo	Baño PMR	1				1





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
29	1	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Puerta	Baño PMR	1				1





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de división en aluminio para baños de 1.21x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
30	3	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
División	Baño-ducha	3				3





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
31	2	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
puerta	Baño - ducha	2				2






Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
32	2	UND		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Puntos 4"	Sifones terraza	2				2

María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano	

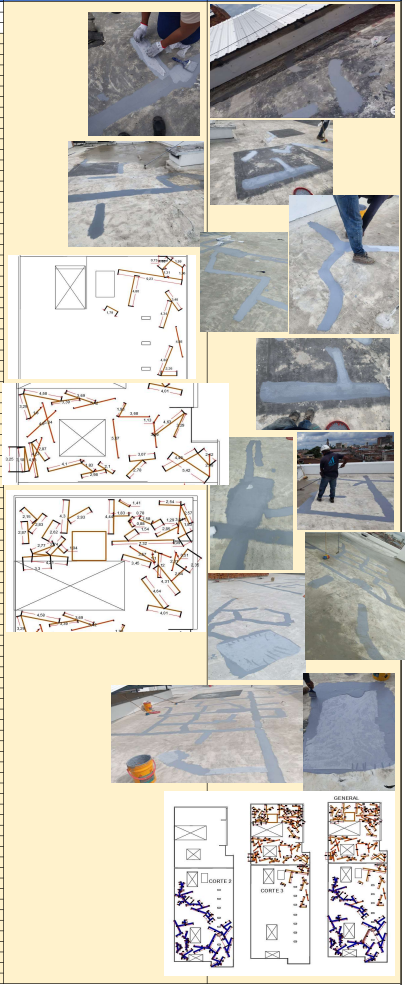ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
35	251,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Resane	Terraza	1		2,87		2,87
Resane	Terraza	1		2,83		2,83
Resane	Terraza	1		2,15		2,15
Resane	Terraza	1		2,62		2,62
Resane	Terraza	1		2,77		2,77
Resane	Terraza	1		2,74		2,74
Resane	Terraza	1		1,04		1,04
Resane	Terraza	1		4,21		4,21
Resane	Terraza	1		3,30		3,30
Resane	Terraza	1		4,30		4,30
Resane	Terraza	1		2,93		2,93
Resane	Terraza	1		4,44		4,44
Resane	Terraza	1		1,83		1,83
Resane	Terraza	1		1,41		1,41
Resane	Terraza	1		0,78		0,78
Resane	Terraza	1		0,88		0,88
Resane	Terraza	1		1,58		1,58
Resane	Terraza	1		1,29		1,29
Resane	Terraza	1		1,54		1,54
Resane	Terraza	1		7,32		7,32
Resane	Terraza	1		2,54		2,54
Resane	Terraza	1		2,57		2,57
Resane	Terraza	1		3,64		3,64
Resane	Terraza	1		1,83		1,83
Resane	Terraza	1		1,09		1,09
Resane	Terraza	1		2,85		2,85
Resane	Terraza	1		3,45		3,45
Resane	Terraza	1		3,57		3,57
Resane	Terraza	1		1,10		1,10
Resane	Terraza	1		4,00		4,00
Resane	Terraza	1		3,12		3,12
Resane	Terraza	1		4,31		4,31
Resane	Terraza	1		2,54		2,54
Resane	Terraza	1		2,31		2,31
Resane	Terraza	1		0,51		0,51
Resane	Terraza	1		2,35		2,35
Resane	Terraza	1		4,64		4,64
Resane	Terraza	1		4,01		4,01
Resane	Terraza	1		5,12		5,12
Resane	Terraza	1		3,69		3,69
Resane	Terraza	1		3,39		3,39
Resane	Terraza	1		4,58		4,58
Resane	Terraza	1		3,29		3,29
Resane	Terraza	1		1,80		1,80
Resane	Terraza	1		5,34		5,34
Resane	Terraza	1		4,80		4,80
Resane	Terraza	1		1,93		1,93
Resane	Terraza	1		3,68		3,68
Resane	Terraza	1		1,13		1,13
Resane	Terraza	1		3,28		3,28
Resane	Terraza	1		4,63		4,63
Resane	Terraza	1		3,29		3,29
Resane	Terraza	1		5,07		5,07
Resane	Terraza	1		3,07		3,07
Resane	Terraza	1		2,78		2,78
Resane	Terraza	1		3,49		3,49
Resane	Terraza	1		5,42		5,42
Resane	Terraza	1		2,88		2,88
Resane	Terraza	1		2,12		2,12
Resane	Terraza	1		2,10		2,10
Resane	Terraza	1		2,98		2,98
Resane	Terraza	1		1,83		1,83
Resane	Terraza	1		4,10		4,10
Resane	Terraza	1		4,57		4,57
Resane	Terraza	1		2,87		2,87
Resane	Terraza	1		4,53		4,53
Resane	Terraza	1		3,18		3,18
Resane	Terraza	1		3,25		3,25
Resane	Terraza	1		0,73		0,73
Resane	Terraza	1		1,92		1,92
Resane	Terraza	1		1,99		1,99
Resane	Terraza	1		1,96		1,96
Resane	Terraza	1		1,31		1,31
Resane	Terraza	1		9,23		9,23
Resane	Terraza	1		4,86		4,86
Resane	Terraza	1		3,46		3,46
Resane	Terraza	1		4,34		4,34
Resane	Terraza	1		4,88		4,88
Resane	Terraza	1		4,82		4,82
Resane	Terraza	1		2,26		2,26
Resane	Terraza	1		1,79		1,79

María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral altura 10cm (superficie con pendiente)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
36	265,40	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Mortero	Terraza	1	6,05	8,35		50,52
Mortero	Terraza	1	4,04	2,30		9,29
Mortero	Terraza	1	10,87	5,10		55,44
Mortero	Terraza	1	11,60	6,20		71,92
Mortero	Terraza	1	4,50	4,08		18,36
Mortero	Terraza	1	4,78	4,03		19,26
Mortero	Terraza	1	4,23	9,60		40,61

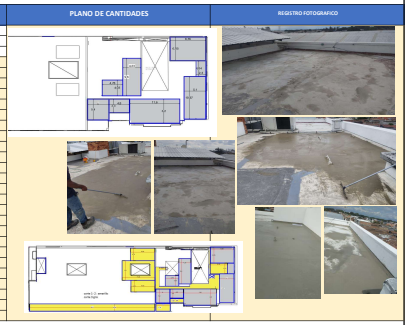

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
37	351,62	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
pintura sellante	terraza	1	4,01	6,12		24,54
pintura sellante	terraza	1	5,4	3,65		19,71
pintura sellante	terraza	1	1,9	6,7		12,73
pintura sellante	terraza	1	1,03	10,81		11,13
pintura sellante	terraza	1	1,28	8,27		10,59
pintura sellante	terraza	1	1,03	2,3		2,37
pintura sellante	terraza	1	1,53	4,8		7,34
pintura sellante	terraza	1	2,74	5		13,70
pintura sellante	terraza	1	4,43	8,42		37,30
pintura sellante	terraza	1	7,41	11,54		85,51
pintura sellante	terraza	1	4,75	8,58		40,76
pintura sellante	terraza	1	2,74	44,1		120,83
descuento	terraza	1	1,3	-2		-2,60
descuento	terraza	1	2,12	-1,44		-3,05
descuento	terraza	1	6,8	-4,3		-29,24



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
38	264,64	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
membrana	terraza	1	4,89	3,15		15,40
membrana	terraza	1	5,88	3,44		20,23
membrana	terraza	1	9,00	4,61		41,49
membrana	terraza	1	4,23	9,42		39,85
membrana	terraza	1	4,78	4,03		19,26
membrana	terraza	1	2,30	6,25		14,38
membrana	terraza	1	4,80	3,50		16,80
membrana	terraza	1	5,00	5,54		27,70
membrana	terraza	1	8,30	4,66		38,68
membrana	terraza	1	2,74	9,10		24,93
membrana	terraza	1	0,09	21,10		1,90
membrana	terraza	1	11,13	0,75		8,35
descuento	ductos ventilacion	16	-0,30	0,90		-4,32

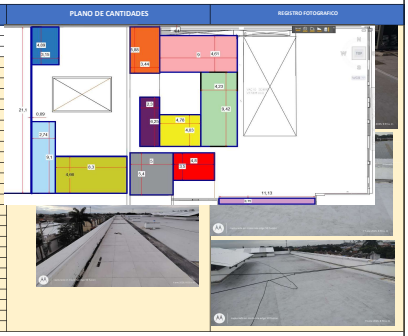

Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de enchape antideslizante

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
39	332,45	M2

PLANO DE CANTIDADES




REGISTRO FOTOGRAFICO













DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Enchape	Terraza	1	4,01	6,12		24,54
descuento	condensadoras	1	-1,3	2		-2,60
Enchape	Terraza	1	5,4	3,65		19,71
descuento	condensadoras	1	-2,12	1,44		-3,05
Enchape	Terraza	1	1,9	6,7		12,73
Enchape	Terraza	1	1,03	10,81		11,13
Enchape	Terraza	1	1,28	8,27		10,59
Enchape	Terraza	1	1,03	2,3		2,37
Enchape	Terraza	1	1,53	4,8		7,34
Enchape	Terraza	1	2,74	5		13,70
Enchape	Terraza	1	4,43	8,42		37,30
descuento	condensadoras	1	-2,95	3,25		-9,59
Enchape	Terraza	1	7,41	11,54		85,51
descuento	condensadoras	1	-6,8	4,3		-29,24
Enchape	Terraza	1	4,75	8,58		40,76
descuento	condensadoras	1	-2,95	3,25		-9,59
Enchape	Terraza	1	2,74	44,1		120,83

María Clarita García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
41	96	M2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Fibrocemento	Fachada lateral	1	12		8	96

María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
42	18	ML

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
fibrocemento	bordillo terraza	1		18		18

María Clarita García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
44	96,00	M2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PINTURA	Fachada lateral	1	12		8	96

María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio (impermeabilización, incluye emulsión asfáltica)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
45	35	M2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Foil	Terraza	1	0,5	0,5		0,25
		1	0,5	69		34,5
		1	0,5	0,5		0,25

María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
48	28,21	M2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
estuco	Antiguo archivo - oficina juez	3		3,37	2,3	23,25
estuco	Antiguo archivo - oficina juez	2		3,50	2,3	16,10
descuento	ventanas	2		-0,90	1	-1,80
descuento	ventanas	2		-1,20	1	-2,40
descuento	puerta	2		-0,90	2,07	-3,73
estuco	Antiguo archivo - of (1). Funcionarios	2		2,70	2,3	12,42
descuento	puerta	1		-0,97	2	-1,94
estuco	Antiguo archivo - of (1). Funcionarios	1		2,22	2,3	5,11

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)(Incluye filos y dilataciones)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
49	206,98	M2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Pintura	Antiguo archivo - oficina juez	3		3,37	2,3	23,25
Pintura	Antiguo archivo - oficina juez	2		3,50	2,3	16,10
descuento	ventanas	2		-0,90	1	-1,80
descuento	ventanas	2		-1,20	1	-2,40
descuento	puerta	2		-0,90	2,07	-3,73
Pintura	Antiguo archivo - of (1). Funcionarios	2		2,70	2,3	12,42
descuento	puerta	1		-0,97	2	-1,94
Pintura	Antiguo archivo - of (1). Funcionarios	1		2,22	2,3	5,11
descuento	puerta	2		-0,97	2	-3,88
descuento	ventanas	1		-1,20	0,4	-0,48
Pintura	Antiguo archivo - of (2). Funcionarios	2		2,80	2,3	12,88
Pintura	Antiguo archivo - of (2). Funcionarios	2		1,9	2,3	8,74
Pintura	Antiguo archivo - secretaria	1		2,92	2,3	6,72
Pintura	Antiguo archivo - secretaria	1		3,82	2,3	8,79
Pintura	Antiguo archivo - secretaria	1		0,98	2,3	2,25
Pintura	Antiguo archivo - secretaria	1		4,33	2,3	9,96
Pintura	Antiguo archivo - secretaria	1		6,55	1	6,55
Pintura	Antiguo archivo - secretaria	1		8,15	2,3	18,75
Pintura	Antiguo archivo - secretaria	2		0,45	2,3	2,07
Pintura	Antiguo archivo - secretaria	1		0,8	2,3	1,84
Pintura	Antiguo archivo - secretaria	1		7,53	2,3	17,32
descuento	pasillo	1		-1,07	2,3	-2,46
descuento	puerta baño	2		-0,80	2	-3,20
Pintura	Vacio cubiertas	2		6,41	1,8	23,08
Pintura	Vacio cubiertas	2		4,01	1,8	14,44
Pintura	Vacio cubiertas	2		6,25	1,8	22,50
Pintura	Vacio cubiertas	2		3,92	1,8	14,11

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de fachaleta similar a la existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y aplicación de hidrófugo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
50	39	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
fachaleta	Punto fijo terraza	39				39

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Desmonte de puerta metálica

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
51	2	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Desmonte	Baño discapacitados		1		2	2

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
54	4,55	ML		

DISCRIMINACIÓN



elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Pasamanos	Punto fijo acceso cuarto electrico	1		2,55		2,55
Pasamanos	Punto fijo acceso cuarto electrico	2		1		2

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Fundición de concreto estampado con color, espesor 10cm , incluye nivelación de piso y malla (color y diseño a definir en sitio)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
56	25,55	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
concreto estamp	Area jardinera izquierda	10,24				10,24
concreto estamp	Area jardinera derecha	15,31				15,31

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de pasamanos existente, incluye lijada, masilla de relleno y acaabdo de pintura 3 en 1)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
57	254,50	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PASAMANOS	Escalera sotano al 1er piso	1		2,00		2,00
PASAMANOS	Escalera sotano al 1er piso	1		0,8		0,8
PASAMANOS	Escalera sotano al 1er piso	1		2,00		2,00
PASAMANOS	Escalera sotano al 1er piso	1		0,94		0,94
PASAMANOS	Escalera sotano al 1er piso	1		3,01		3,01
PASAMANOS	Escalera sotano al 1er piso	1		0,75		0,75
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		0,27		0,27
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		3,47		3,47
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		0,26		0,26
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		3,38		3,38
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	2		0,63		1,26
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		3,3		3,3
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		0,61		0,61
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		0,29		0,29
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		3,21		3,21
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		0,18		0,18
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		1,73		1,73
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		2,36		2,36
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		3,36		3,36
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		0,15		0,15
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		0,57		0,57
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		1,69		1,69
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		3,13		3,13
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		0,61		0,61
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		0,29		0,29
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		2,8		2,8
PASAMANOS	Escalera 1er piso al 3er piso	1		0,19		0,19
PASAMANOS	Balcones 1er piso	1		3,4		3,4
PASAMANOS	Balcones 1er piso	1		2,57		2,57
PASAMANOS	Balcones 2do piso	2		3,37		6,74
PASAMANOS	Balcones 2do piso	2		1,57		3,14
PASAMANOS	Balcones 3er piso	2		3,36		6,72
PASAMANOS	Balcones 3er piso	2		1,56		3,12
PASAMANOS	Archivo 2do piso	1		1,16		1,16
PASAMANOS	Archivo 3er piso	1		1,2		1,2
PASAMANOS	Escaleras sotano al 3er piso-acceso PPL	10		2,14		21,4
PASAMANOS	Escaleras sotano al 3er piso-acceso PPL	2		3,00		6,00
PASAMANOS	Escaleras sotano al 3er piso-acceso PPL	2		7,06		14,12
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	1		2,82		2,82
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	1		0,12		0,12
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	1		2,76		2,76
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	1		0,12		0,12
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	1		2,57		2,57
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	1		0,25		0,25
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	1		1,38		1,38
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	1		2,76		2,76

PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	1		0,13		0,13
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	1		0,24		0,24
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	2		0,21		0,42
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	2		2,85		5,7
PASAMANOS	Escalera costado izq del 1er piso al 3er piso	2		0,15		0,3
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	1		4,83		4,83
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	3		4,7		14,1
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	4		1,00		4,00
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	1		3,48		3,48
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	2		3,00		6,00
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	3		0,7		2,1
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	1		3,55		3,55
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	2		3,2		6,4
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	3		0,95		2,85
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	4		2,00		8,00
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	4		0,3		1,2
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	4		2,00		8,00
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	6		0,9		5,4
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	2		2,5		5
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	3		0,5		1,5
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	1		1,2		1,2
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	4		3,00		12,00
PASAMANOS	Badanda rampa de acceso	3		1,00		3,00
PASAMANOS	Mastil de banderas	3		4,5		13,5
PASAMANOS	Terraza al 3er piso	2		1,00		2,00
PASAMANOS	Terraza al 3er piso	2		0,42		0,84
PASAMANOS	Terraza al 3er piso	4		1,5		6
PASAMANOS	Terraza al 3er piso	4		1,2		4,8
PASAMANOS	Terraza al 3er piso	1		3		3



María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de reja metalica, incluye desmonte, cepillado, limpieza del elemento, cambio de partes afectadas, cambio de chapa donde se requiera, aplicación de pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
58	1,73	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baño discapacitados	1	1		1,73	1,73





María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Desmonte y retiro de vidrio existente

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
60	2,54	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
desmonte	Juzgado 2 laboral	1		1,3	0,65	0,85
desmonte	Oficina Administración	1		1,3	0,65	0,85
desmonte	Juzgado 4 penal circuito	1		1,3	0,650	0,85





María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad 5 mm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	2,54	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
vidrio	Juzgado 2 laboral	1		1,3	0,65	0,85
vidrio	Oficina Administración	1		1,3	0,65	0,85
vidrio	Juzgado 4 penal circuito	1		1,3	0,650	0,85





María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Corte de piso en concreto con pulidora

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
63	14,78	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Enfermeria	2		1,04		2,08
	Enfermeria	2		3,18		6,36
	Baño	2		3,17		6,34






María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Demolición enchape de piso, incluye retiro de sobrantes

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
64	2,5	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
demolición	Pasillo acceso	1	1,00	2,50		2,50

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
65	0,18	M3		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Demolición	Pasillo acceso	1	1,00	2,50	0,07	0,18

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Demolición de cielo raso

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,05	20,14	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
demolición	Oficina	1	1,9	2,8		5,32
demolición	Baño antiguo archivo	1	1,33	1,3		1,73
demolición	Muro antiguo archivo	1	3,82		2,3	8,79
demolición	Muro lateral antiguo archivo	1	1,87		2,3	4,30

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,18	7,05	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Instalación	Oficina	1	1,9	2,8		5,32
Instalación	Baño antiguo archivo	1	1,33	1,3		1,73

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
3,05	6,15	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Muro	Oficina Juez - antiguo archivo		3,37		2,30	7,75
descuento	puerta	1	-0,8		2,00	-1,60

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
48;	10	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Salida elect	Antiguo Archivo	5				5
Salida elect	Baños y enfermeria	5				5

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
49;	14,1	ML

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Canaleta	Antiguo Archivo	1		3,37		3,37
Canaleta	Antiguo Archivo	1		3,5		3,5
Canaleta	Antiguo Archivo	1		2,7		2,7
Canaleta	Antiguo Archivo	1		2,13		2,13
Canaleta	Antiguo Archivo	1		2,4		2,4

María Cardia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
50;	69	ML

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Cable	Antiguo Archivo - normal	20				20
Cable	Antiguo Archivo - regulado	20				20
Cable	Antiguo Archivo - iluminación	14				14
Cable	Baños y enfermeria - normal	15				15

María Cardia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
51;	15	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Troquel	Antiguo Archivo	15				15

María Cardia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
52;	188	ML

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
UTP	Punto 1 oficina Juez	1		45		45
UTP	Punto 2 oficina 1	1		35		35
UTP	Punto 3 oficina 1	1		37		37
UTP	Punto 4 oficina 2	1		35		35
UTP	Punto 5 oficina secretaria	1		36		36
UTP						0
UTP						0
UTP						0
UTP						0
						0
						0

María Cardia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
53;	10	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Toma hembra	Antiguo Archivo	5				5
Toma hembra	Cuarto rack	5				5

María Cardia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
54;	5	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
faceplate	Antiguo Archivo	5				5

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
55;	10	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
patch cord	Antiguo Archivo	5				5
patch cord	Cuarto rack	5				5

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1.5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
56;	5	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
salida elec	Antiguo Archivo	5				5

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,43	5	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
interruptor	Antiguo Archivo	3				3
interruptor	Baños	1				1
interruptor	Enfermeria	1				1

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
8;	58	M2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Teja	Punto fijo	2	4,9	2		19,6
Teja	Punto fijo	2	8,8	2		35,2
Caballete	Punto fijo	4	0,36	2,25		3,2

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,5	3	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Lamparas	Antiguo archivo baño	1				1
Lamparas	Antiguo archivo oficina	2				2

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,13;	61,23	M2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños 1er piso	1		2,9	2,6	7,54
	Baños 1er piso	1		3,2	2,6	8,32
	Baños 1er piso	1		3,26	2,6	8,48
	Baños 1er piso	2		2,95	2,6	15,34
	Baños 1er piso	2		4,53	2,6	23,56
	Baños 1er piso	-1		1	2	-2,00

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
35;	50	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
bases	Terraza estructura tuberia condensadoras	5		3		15
bases	Terraza estructura tuberia condensadoras	1		5		5
bases	Terraza estructura tuberia condensadoras	15		2		30

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
31;	114,57	ML

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Sellador	Terraza	1		44,1		44,10
Sellador	Terraza	1		4,8		4,80
Sellador	Terraza	1		22,3		22,30
Sellador	Terraza	1		5,41		5,41
Sellador	Terraza	1		2,8		2,80
Sellador	Terraza	1		4,33		4,33
Sellador	Terraza	1		6,05		6,05
Sellador	Terraza	1		11		11,00
Sellador	Terraza	1		6,24		6,24
Sellador	Terraza	1		2,1		2,10
Sellador	Terraza	1		3,3		3,30
Sellador	Terraza	1		2,14		2,14

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA




DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
63;	115,73	UND

PLANO DE CANTIDADES




REGISTRO FOTOGRAFICO

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Pintura	Auditorio techos	2	1	14,55		29,10
Pintura	Auditorio techos franja perimetral	2	1	6,15		12,30
Pintura	Antiguo archivo techo - oficina juez	1	3,37	3,5		11,80
Pintura	Antiguo archivo techo - of (1). Funcionarios	1	3,37	2,70		9,10
Pintura	Techo pasillo frente a of (2) funcionarios	1	1,07	2,12		2,27
Pintura	Antiguo archivo techo - secretaria	1	8,15	6,55		53,38
descuento	Luminarias	1		-1,00	2,21	-2,21

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
8	6,48	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Teja UPVC	Cubierta sobre escalera gato	1	2,70	2,40		6,48





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
22	6,25	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Manto Foil	Terraza tanques	1	2,5	2,5		6,25





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
26	66,71	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Desmonte	Fachada acceso	3		3,50		10,50
Desmonte	Fachada acceso	1		3,14		3,14
Desmonte	Fachada acceso	1		3,80		3,80
Desmonte	Fachada acceso	3		3,80		11,40
Desmonte	Fachada acceso	2		3,80		7,60
Desmonte	Fachada acceso	2		9,50		19,00
Desmonte	Fachada acceso	1		5,27		5,27
Desmonte	Arreglo inclinación base ventan	2		1,2		2,40
Desmonte	Arreglo inclinación base ventan	2		1,8		3,60





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
27	7,20	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Fibrocemento	Fachada acceso	1	1		3,63	3,63
Fibrocemento	Fachada acceso	1	0,94		3,8	3,57







María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye estructura, masillada, filos y pintura para exterior 2 manos

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
28	134,60	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Fachada acceso	3		3,50		10,50
	Fachada acceso	1		3,14		3,14
	Fachada acceso	1		3,80		3,80
	Fachada acceso	3		3,80		11,40
	Fachada acceso	2		3,8		7,60
	Fachada acceso	2		9,5		19,00
	Fachada acceso	1		5,27		5,27
	Fachada acceso	3		11,28		33,84
	Fachada acceso	3		6,74		20,22
	Arreglo inclinación base ventan	2		1,2		2,40
	Arreglo inclinación base ventan	2		1,8		3,60
	UARS	1		13,83		13,83

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de alfajía metálica, incluye desmonte de ventana, retiro de alfajía en mal estado, e instalación de nueva alfajía

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
30	6,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Alfajía	Arreglo inclinación base ventan	2		1,2		2,40
Alfajía	Arreglo inclinación base ventan	2		1,8		3,60

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura acrílica a tres manos para exterior Tipo 1 - incluye filos y dilataciones

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
34	50,95	M2		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Pintura Acrílica	Fachada acceso	1	5,60		0,97	5,432
Pintura Acrílica	Fachada acceso	1	2,10		0,3	0,63
Pintura Acrílica	Fachada acceso	1	7,10		3,14	22,29
descuento	fibrocemento	1	-3,14		0,3	-0,94
descuento	ventana	1	-1,90		0,3	-0,57
Pintura Acrílica	Fachada acceso	1	1,53		0,3	0,459
Pintura Acrílica	Fachada acceso	1	6,80		3,8	25,84
descuento	fibrocemento	1	-3,80		0,3	-1,14
descuento	ventana	1	-3,50		0,3	-1,05

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 10cm a 15 cm de alto x 15 a 20 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión., corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
36	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PLATINAS	Patio (futuro Uars)	1				1

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
37	4,05	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Frontal para puerta	Patio (futuro Uars)	1		4,05		4,05

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
40	4,25	ML		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Canal	Patio (futuro Uars)	1		4,25		4,25

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
41	8,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Solapa	Patio (futuro Uars)	2		4		8

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
42	3,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Tubería	Patio (futuro Uars)					3

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCION | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Suministro y aplicación de pintura epoxica (2 capas)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
44	50,02	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Epoxica	Patio (futuro Uars)	1	2,7		2,54	6,86
Epoxica	Patio (futuro Uars)	1	3,6		2,63	9,47
Epoxica	Patio (futuro Uars)	1	3,93		3,03	11,91
Epoxica	Patio (futuro Uars)	1	3,6		2,9	10,44
Epoxica	Piso Patio (futuro Uars)	1	3,6	3,93		14,15
descuento	Poceta	1	-2		1	-2,00
descuento	Poceta	1	-2		0,4	-0,80

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCION | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Instalación de puerta existente en aluminio 2,40 mt x2,80 mt), incluye todo lo necesario para su correcta instaalción

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
45	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Uars y Salida a terraza por escalera gato	1				1

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCION | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
46	2,34	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Enchape	Patio (futuro Uars)	13	0,3	0,6		2,34

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCION | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
47	49,72	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
placa	Patio (futuro Uars)	2	3,68		0,45	3,312
placa	Patio (futuro Uars)	2	2,44		2,56	12,49
placa	Punto fijo terraza	2	1,2		2,4	5,76
placa	Punto fijo terraza	4	2,6		2,2	22,88
placa	Punto fijo terraza	2	2,2		1,2	5,28



María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca



MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	3,38	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
estuco	Sala audiencia cuarto familia	1	1	1		1
estuco	Salad audiencia noveno familia	1	0,83	2,87		2,38


María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones)


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
62	63,23	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
vinilo	Sala infantil 1	2	2,26		2,6	11,75
descuento	puerta	1	-0,9		2	-1,80
vinilo	Sala infantil 1	2	2,23		2,6	11,60
vinilo	Techo Sala infantil 1	1	2,23	2,26		5,04
vinilo	Sala infantil 2	2	2,4		2,4	11,52
descuento	puerta	1	-0,9		2	-1,80
vinilo	Sala infantil 2	2	3,6		2,4	17,28
vinilo	Techo Sala infantil	1	3,6	2,4		8,64
vinilo	Sala audiencia cuarto familia	1	1	1		1







María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Desmonte y retiro de cielo en panel yeso

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
64	3,38	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
desmonte	Sala audiencia cuarto familia	1	1	1		1
desmonte	Salad audiencia noveno familia	1	0,83	2,87		2,38





María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
48;	55,18	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
estuco	Fachada acceso	1	6,62		8,34	55,18





María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca



MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye estructura.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,18	3,38	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Sala audiencia cuarto familia	1	1	1		1
	Salad audiencia noveno familia	1	0,83	2,87		2,38


María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Contrapiso en concreto e=0,10m

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,05	33,75	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Contrapiso	Fachada Lateral derecha	1	1,24	17		21,08
Contrapiso	Fachada Lateral derecha	1	1,81	7		12,67

María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Contrapiso en concreto e=0,10m							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,11		0,35	M2					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
Contrapiso	Pasillo contiguo baños funciona	1	0,35	1,00		0,35		






María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,13		0,49	M2					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
Mortero	Pasillo contiguo baños funcio	1		1,40	0,35	0,49		







María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox)							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,21		1,84	M2					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
Tableta	Pasillo baños - piso	1	1,35	1,00		1,35		
Tableta	Pasillo baños - pared	1		1,40	0,35	0,49		






María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN	Cambio columna de madera 0,15x0,15x3,5, similar al existente inmunnizada y pintada color negro mate (similar al existente), incluye alzaprimada de cubierta, retiro de la columna existente y todo lo necesario para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
3,02	8,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	PASILLOS PATIO PRINCIPAL	8				8


María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cerradura de sobreponer acorazada, con cobertura adicional contra apertura forzosa, bulón cuadrado de 35mm y cerrojo de tres (3) golpes para puerta en madera

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
3,03	4,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
cerradura	Juzgados	4				4


María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cerradura de doble cerrojo de 3 golpes con cilindro de llave plana reversibles, backset de 70Mm, para puerta de madera.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
3,04	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
cerradura	Puerta principal	1				1


María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación manto techfiel 4 mm (el cual se instalará sobre la estructura de cubierta y por debajo de la teja de barro)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
4,02	8,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MANTO	Costado posterior cubierta		1,00	8,00		8,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
62	159,36	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
pintura	Baños hombres y PMR	2	1,13		1,50	3,39
pintura	Baños hombres y PMR	2	3,50		1,50	10,50
pintura	Baños hombres y PMR	2	1,50		1,50	4,50
pintura	Baños hombres y PMR	2	2,35		1,50	7,05
pintura	Baños hombres y PMR	2	0,69		1,50	2,07
pintura	Baños hombres y PMR	2	1,20		1,20	2,88
pintura	Techos baños hombres y PMR	2	1,50	3,50		10,50
pintura	Cefeteria	1	2,52		1,84	4,64
pintura	Cefeteria	2	1,90		1,84	6,99
pintura	Cefeteria	1	1,55		1,84	2,85
pintura	Techos cafeteria	1	2,52	1,90		4,79
pintura	Lavatraperos	1	1,41		1,84	2,59
pintura	Lavatraperos	1	1,90		1,84	3,50
pintura	Lavatraperos	1	1,50		1,84	2,76
pintura	Lavatraperos	1	1,90		1,84	3,50
pintura	Lavatraperos	1	0,90		1,84	1,66
pintura	Lavatraperos	2	0,96		1,84	3,53
pintura	Techo Lavatraperos	1	1,41	1,9		2,68
pintura	Baño Funcionario homb	1	1,58		1,34	2,12
pintura	Baño Funcionario homb	1	2		1,34	2,68
pintura	Baño Funcionario homb	2	0,6		1,34	1,61
pintura	Baño Funcionario homb	4	1,3		1,34	6,97
pintura	Baño Funcionario homb	1	2,38		1,34	3,19
pintura	Baño Funcionario homb	1	1,0		1,34	1,34
pintura	Baño Funcionario homb	1	0,8		1,34	1,07
pintura	Baño Funcionario homb	1	1,15		1,34	1,54
pintura	Techo baño Funci homb	1	2,38	3,52		8,38
pintura	Baño Funcionario Damas	1	1,58		1,34	2,12
pintura	Baño Funcionario Damas	1	2,00		1,34	2,68
pintura	Baño Funcionario Damas	2	0,60		1,34	1,61
pintura	Baño Funcionario Damas	4	1,30		1,34	6,97
pintura	Baño Funcionario Damas	1	2,38		1,34	3,19
pintura	Baño Funcionario Damas	1	1,00		1,34	1,34
pintura	Baño Funcionario Damas	1	0,80		1,34	1,07
pintura	Baño Funcionario Damas	1	1,15		1,34	1,54
pintura	Techo baño Funci damas	1	2,38	3,52		8,38
pintura	Juzgado	1	4,00		3,50	14,00
pintura	Bodega-muro grapaddo	1	2,40		3,00	7,20

PLANO DE CANTIDADES

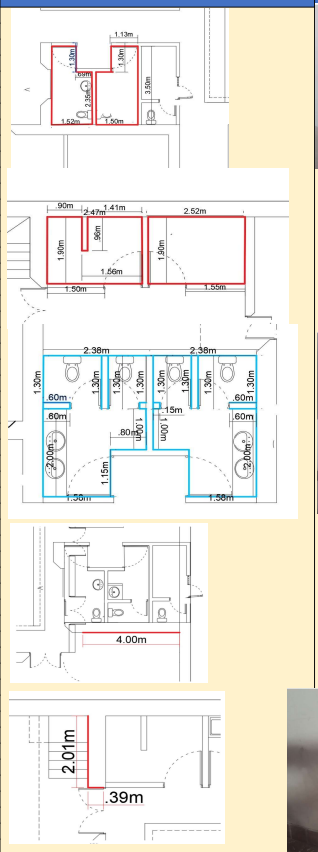

REGISTRO FOTOGRAFICO




María Claudia García

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO
DESCRIPCIÓN	suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,15	3,93	M2		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
perfileria	Muro ventana	1	2,44	1,2		2,93
	Refuerzo meson	1	1	1		1,00

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,46	15,89	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños hombres-luminarias	1		1,04		1,04
	Baños hombres-luminarias	1		1,87		1,87
	Baños hombres y mujeres-interruptor	2		1,5		3
	Baños mujeres-luminarias	1		1,94		1,94
	Baños mujeres-luminarias	1		1,89		1,89
	Baños mujeres-luminarias	1		1,9		1,9
	Baños mujeres - tomacorriente	1		1,9		1,9
	Lactacia- luminarias	1		2,35		2,35

María Claudia García

Vo Bo Director Obra
