I. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No. **NA**	CONVENIO No. **400-2025**	OS No. **NA**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** **X** **INTERVENTORÍA** _____

CONVENIENTES: - MUNICIPIO DE LA PLATA – CAMILO OSPINA MARTINEZ.
- EMSERPLA ESP – ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA.
-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) – CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO.

OBJETO: "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DENOMINADO "CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", Y "CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA" PROYECTOS REGISTRADOS Y VIABILIZADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO LOS RADICADOS 13243 2025-E Y 13242 2005-E*".

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08 de agosto de 2025
FECHA DE INICIO: 19 de agosto de 2025
PLAZO INICIAL: Doce (12) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 18 de agosto de 2026
OTROSIS, ADICIONALES Y SUSPENSIONES:
FECHA DEL INFORME: 04 de febrero de 2026

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- ✓ El Convenio Interadministrativo No.400 fue suscrito el día 08 de agosto de 2025, entre Municipio de La Plata, EMSERPLA ESP y la CAM.

- ✓ El Convenio No.400 de 2025 cuenta con Acta de Inicio de fecha 19 de agosto de 2025, tiene un plazo inicial de doce (12) meses contados a partir de la firma de dicha acta.



ACTA DE INICIACION — Código: F-CAM-057 | Versión: 3 | Fecha: 09 Abr 14

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.400 DE 2025

FECHA: 19 de agosto de 2025
CONVENIO No. 400 del 08 de agosto de 2025
OBJETO. *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", Y "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA" PROYECTOS REGISTRADOS Y VIABILIZADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO LOS RADICADOS 13243 2025-EY 13242 2025-E*
CONVENIENTES: CAMILO OSPINA MARTINEZ – Alcalde del Municipio de La Plata (H).
ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA - representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA E.S.P.
CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO – Director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
VALOR CONVENIO: TRES MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.087.774.514"" MCTE).
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Convenio es de doce (12) meses contados a partir de la firma por las partes del Acta de Inicio.

En Neiva (Huila), el día 19 de agosto de 2025, en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, se reunieron: el Doctor CAMILO OSPINA MARTINEZ identificado con C.C. No.12.275.857 de La Plata (H), en calidad de Alcalde del Municipio de La Plata (H) con NIT. 891.180.155-7; el Doctor ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA identificado con C.C. No.1.081.397.805 de La Plata (H), en condición de representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA E.S.P., con NIT:813.002.781-2; y el

Página 1 de 2



ACTA DE INICIACION — Código: F-CAM-057 | Versión: 3 | Fecha: 09 Abr 14

ingeniero LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR identificado con C.C. No.7.699.628 de Neiva (H), Profesional Especializado de la Subdirección de Gestión Ambiental actuando en calidad de supervisor designado por la CAM, para dar INICIO al Convenio No.400 del 08 de agosto de 2025, cuyo objeto corresponde a: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", Y "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA" PROYECTOS REGISTRADOS Y VIABILIZADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO LOS RADICADOS 13243 2025-EY 13242 2025-E.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2025 por los que en ella intervinieron.


CAMILO OSPINA MARTINEZ
Alcalde Municipal
Municipio de La Plata (H)

LEONEL FERNANDO OBREGON S
Profesional Especializado SGA
Supervisor Designado CAM

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
Gerente EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA E.S.P.

Página 2 de 2

- ✓ La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA ESP en calidad de ejecutor del proyecto, remite el primer informe del convenio 400 de 2025 correspondiente al periodo 19 de agosto al 18 de septiembre, donde básicamente informa que se inició el proceso contractual de obra e interventoría.

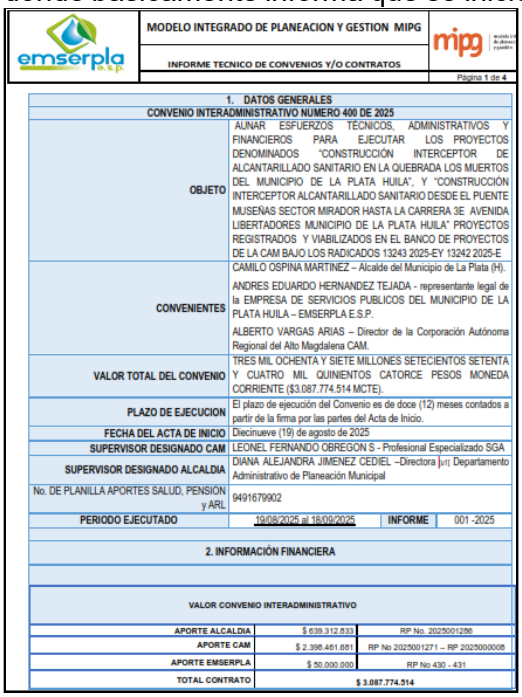

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
INFORME TECNICO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS
Página 1 de 4

1. DATOS GENERALES	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 400 DE 2025	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", Y "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA" PROYECTOS REGISTRADOS Y VIABILIZADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO LOS RADICADOS 13243 2025-EY 13242 2025-E
CONVENIENTES	CAMILO OSPINA MARTINEZ – Alcalde del Municipio de La Plata (H). ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA - representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA E.S.P. ALBERTO VARGAS ARIAS – Director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	TRES MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.087.774.514 MCTE).
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del Convenio es de doce (12) meses contados a partir de la firma por las partes del Acta de Inicio.
FECHA DEL ACTA DE INICIO	Diecinueve (19) de agosto de 2025
SUPERVISOR DESIGNADO CAM	LEONEL FERNANDO OBREGON S - Profesional Especializado SGA
SUPERVISOR DESIGNADO ALCALDIA	DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL –Directora (e) Departamento Administrativo de Planeación Municipal
No. DE PLANILLA APORTES SALUD, PENSIÓN y ARL	9491679902
PERIODO EJECUTADO	19/08/2025 al 18/09/2025 — INFORME 001 -2025

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
APORTE ALCALDIA	$ 639.312.833	RP No. 2025001256
APORTE CAM	$ 2.398.461.681	RP No 2025001271 – RP 2025000006
APORTE EMSERPLA	$ 50.000.000	RP No 430 - 431
TOTAL CONTRATO	$ 3.087.774.514	



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
INFORME TECNICO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS
Página 3 de 4

El proceso contractual se adelantó con el propósito de garantizar la ejecución oportuna y adecuada de las obras proyectadas, dando cumplimiento a los principios de planeación, transparencia, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación pública, así como a las obligaciones contractuales asumidas por la entidad.

6. OBSERVACIONES

7. CONCLUSIONES


1. Durante el período comprendido entre el 19 de agosto de 2025 y el 18 de septiembre de 2025, la Empresa de Servicios Públicos de La Plata, Huila – EMSERPLA E.S.P., adelantó el proceso de contratación de las obras y las interventorías correspondientes al Convenio Interadministrativo No. 400 de 2025, en cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la entidad.
2. El proceso contractual se orientó a garantizar la ejecución de los proyectos de construcción de interceptores de alcantarillado sanitario en los sectores Quebrada Los Muertos y Puente Museñas – Avenida Libertadores, los cuales se encuentran debidamente registrados y viabilizados en el Banco de Proyectos de la CAM, asegurando su viabilidad técnica, administrativa y financiera.
3. La gestión adelantada por EMSERPLA E.S.P. se desarrolló conforme a los principios de planeación, transparencia, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación pública, permitiendo estructurar los procesos necesarios para la ejecución oportuna y adecuada de las obras.
4. El desarrollo de los proyectos objeto del convenio contribuirá de manera significativa al fortalecimiento del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de La Plata, Huila, mejorando las condiciones sanitarias, ambientales y de calidad de vida de la población beneficiada.

NOTA: Se anexa documentos soportes	SI	X	NO	

Relación anexos:
1. Planilla de seguridad social junio EMSERPLA ESP, dos (2) folios.

ELABORADO POR	
LUIS GUILLERMO DEVIA	INGENIERO CIVIL DE APOYO
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VISADO POR	
ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA	GERENTE
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO

- ✓ La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA ESP en calidad de ejecutor del proyecto, remite el segundo informe del convenio 400 de 2025 correspondiente al periodo 19 de septiembre al 18 de octubre, donde informa que derivado de los procesos se suscribió:
  Contrato de obra 68 de 2025 con Carlos Mario Urrutia Bastidas y de Interventoría 73 de 2025 con Daniel Torres Betancourth, para el proyecto de "CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA".
  Contrato de obra 89 de 2025 con Inversiones Nova Ing SAS y de interventoría 72 de 2025 con Maikol Estith Cantor Quimbaya, para el proyecto de "CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA".

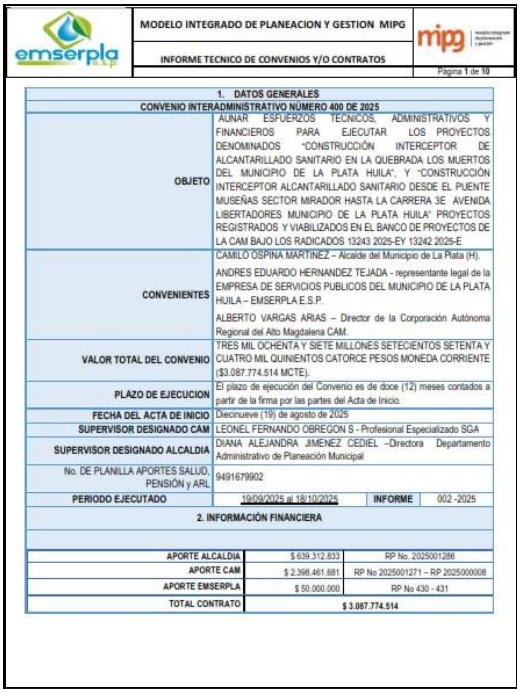

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

INFORME TECNICO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS


Página 1 de 10

1. DATOS GENERALES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 400 DE 2025	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", Y "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA" PROYECTOS REGISTRADOS Y VIABILIZADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO LOS RADICADOS 13243 2025-EY 13242 2025-E
CONVENIENTES	CAMILO OSPINA MARTINEZ – Alcalde del Municipio de La Plata (H). ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA - representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA E.S.P. ALBERTO VARGAS ARIAS – Director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	TRES MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.087.774.514 MCTE).
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del Convenio es de doce (12) meses contados a partir de la firma por las partes del Acta de Inicio.
FECHA DEL ACTA DE INICIO	Diecinueve (19) de agosto de 2025
SUPERVISOR DESIGNADO CAM	LEONEL FERNANDO OBREGON S - Profesional Especializado SGA
SUPERVISOR DESIGNADO ALCALDIA	DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL –Directora Departamento Administrativo de Planeación Municipal
No. DE PLANILLA APORTES SALUD, PENSIÓN y ARL	94916799O2
PERIODO EJECUTADO	19/09/2025 al 18/10/2025 **INFORME** 002 -2025

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

APORTE ALCALDIA	$ 639.312.833	RP No. 2025001286
APORTE CAM	$ 2.398.461.681	RP No 2025001271 – RP 2025000008
APORTE EMSERPLA	$ 50.000.000	RP No 430 - 431
TOTAL CONTRATO	$ 3.087.774.514	

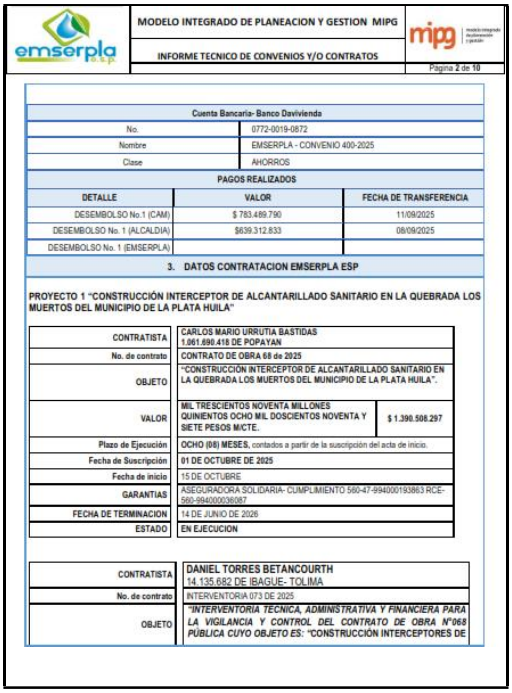

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

INFORME TECNICO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS

Página 2 de 10

Cuenta Bancaria- Banco Davivienda	
No.	0772-0019-0872
Nombre	EMSERPLA - CONVENIO 400-2025
Clase	AHORROS

PAGOS REALIZADOS


DETALLE	VALOR	FECHA DE TRANSFERENCIA
DESEMBOLSO No.1 (CAM)	$ 783.489.790	11/09/2025
DESEMBOLSO No. 1 (ALCALDIA)	$639.312.833	08/09/2025
DESEMBOLSO No. 1 (EMSERPLA)		

3. DATOS CONTRATACION EMSERPLA ESP

PROYECTO 1 "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA"

CONTRATISTA	CARLOS MARIO URRUTIA BASTIDAS 1.061.690.418 DE POPAYAN	
No. de contrato	CONTRATO DE OBRA 68 de 2025	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA".	
VALOR	MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.	$ 1.390.508.297
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Fecha de Suscripción	01 DE OCTUBRE DE 2025	
Fecha de inicio	15 DE OCTUBRE	
GARANTIAS	ASEGURADORA SOLIDARIA- CUMPLIMIENTO 560-47-994000193863 RCE-560-994000036087	
FECHA DE TERMINACION	14 DE JUNIO DE 2026	
ESTADO	EN EJECUCION	

CONTRATISTA	DANIEL TORRES BETANCOURTH 14.135.682 DE IBAGUE- TOLIMA
No. de contrato	INTERVENTORIA 073 DE 2025
OBJETO	*"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA N°068 PÚBLICA CUYO OBJETO ES:* "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES DE

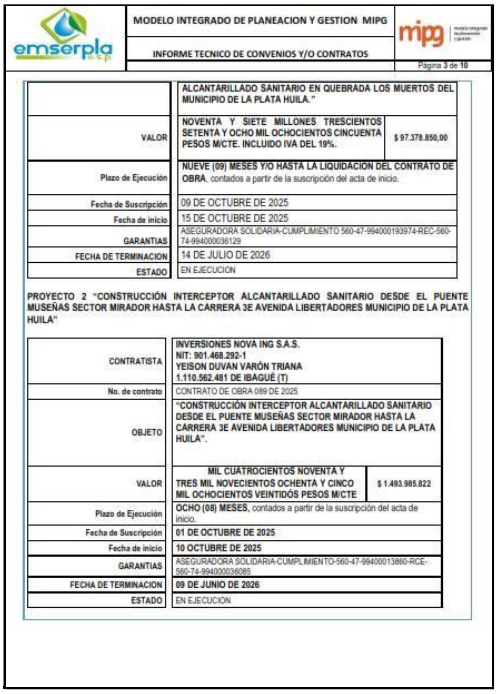

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG


INFORME TECNICO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS

Página 3 de 10

	ALCANTARILLADO SANITARIO EN QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA."
VALOR	NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. INCLUIDO IVA DEL 19%. $ 97.378.850,00
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES Y/O HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de Suscripción	09 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de inicio	15 DE OCTUBRE DE 2025
GARANTIAS	ASEGURADORA SOLIDARIA-CUMPLIMIENTO 560-47-994000193974-REC-560-74-994000036129
FECHA DE TERMINACION	14 DE JULIO DE 2026
ESTADO	EN EJECUCION

PROYECTO 2 "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA"

CONTRATISTA	INVERSIONES NOVA ING S.A.S. NIT: 901.468.292-1 YEISON DUVAN VARÓN TRIANA 1.110.562.481 DE IBAGUÉ (T)
No. de contrato	CONTRATO DE OBRA 089 DE 2025
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA".
VALOR	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE $ 1.493.985.822
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de Suscripción	01 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de inicio	10 OCTUBRE DE 2025
GARANTIAS	ASEGURADORA SOLIDARIA-CUMPLIMIENTO-560-47-994000013860-RCE-560-74-994000036085
FECHA DE TERMINACION	09 DE JUNIO DE 2026
ESTADO	EN EJECUCION

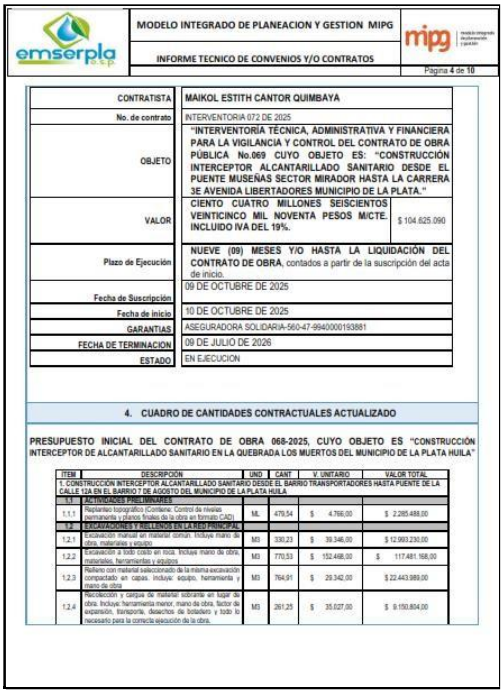

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

INFORME TECNICO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS

Página 4 de 10

CONTRATISTA	MAIKOL ESTITH CANTOR QUIMBAYA
No. de contrato	INTERVENTORIA 072 DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.069 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA."
VALOR	CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE. INCLUIDO IVA DEL 19%. $ 104.625.090
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES Y/O HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de Suscripción	09 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de inicio	10 DE OCTUBRE DE 2025
GARANTIAS	ASEGURADORA SOLIDARIA-560-47-994000019388
FECHA DE TERMINACION	09 DE JULIO DE 2026
ESTADO	EN EJECUCION


4. CUADRO DE CANTIDADES CONTRACTUALES ACTUALIZADO

PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA 068-2025, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL BARRIO TRANSPORTADORES HASTA PUENTE DE LA CALLE 12A EN EL BARRIO 7 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA				
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1.1	Replanteo topográfico (Contiene: Control de niveles permanente y planos finales de la obra en formato CAD)	ML	479,54	$ 4.766,00	$ 2.285.488,00
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS EN LA RED PRINCIPAL				
1.2.1	Excavación manual en material común. Incluye mano de obra, materiales y equipo	M3	330,23	$ 39.346,00	$ 12.993.230,00
1.2.2	Excavación a todo costo en roca. Incluye mano de obra, materiales, herramientas y equipos	M3	770,53	$ 152.468,00	$ 117.481.168,00
1.2.3	Relleno con material seleccionado de la misma excavación compactado en capas. Incluye: equipo, herramienta y mano de obra	M3	764,91	$ 29.342,00	$ 22.443.989,00
1.2.4	Recolección y cargue de material sobrante en lugar de obra. Incluye: herramienta menor, mano de obra, factor de expansión, transporte, desechos de botadero y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M3	261,25	$ 35.027,00	$ 9.150.804,00

- ✓ El día 27 de noviembre de 2025 se llevó a cabo un comité de seguimiento al convenio, en las oficinas de emserpla esp, donde se informa que la ejecución física de los proyectos está ligada con los permisos de ocupación de cauce a cargo del contratista, suscrita las actas de inicio se giraron los recursos por concepto de anticipo para la compra de tuberías y materiales que ya se adelanta, y la mano de obra con relación a las festividades de final de año.

- ✓ Con oficio 2184 de fecha 28 de enero de 2026, la CAM solicita al Municipio de La Plata y Emserpla ESP información relacionada con la ejecución de los proyectos.

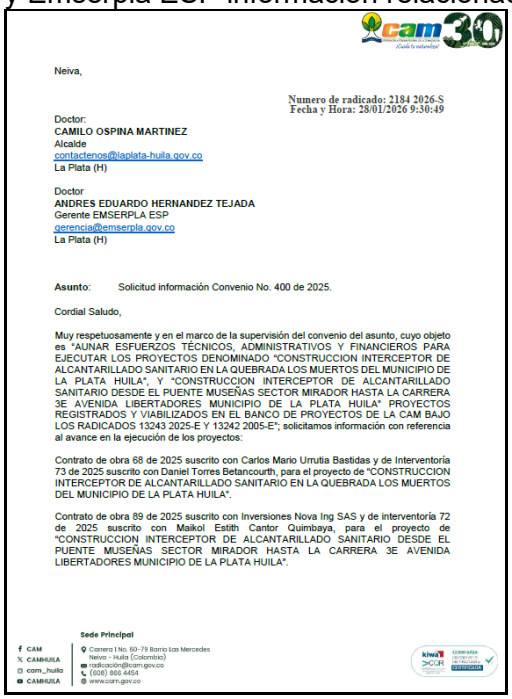

Neiva,

Numero de radicado: 2184 2026-S
Fecha y Hora: 28/01/2026 9:30:49

Doctor:
CAMILO OSPINA MARTINEZ
Alcalde
contactenos@laplata-huila.gov.co
La Plata (H)

Doctor
ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
Gerente EMSERPLA ESP
gerencia@emserpla.gov.co
La Plata (H)

Asunto: Solicitud información Convenio No. 400 de 2025.


Cordial Saludo,

Muy respetuosamente y en el marco de la supervisión del convenio del asunto, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DENOMINADO "CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", Y "CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA" PROYECTOS REGISTRADOS Y VIABILIZADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO LOS RADICADOS 13243 2025-E Y 13242 2005-E"; solicitamos información con referencia al avance en la ejecución de los proyectos:

Contrato de obra 68 de 2025 suscrito con Carlos Mario Urrutia Bastidas y de Interventoria 73 de 2025 suscrito con Daniel Torres Betancourth, para el proyecto de "CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA".

Contrato de obra 89 de 2025 suscrito con Inversiones Nova Ing SAS y de interventoria 72 de 2025 suscrito con Maikol Estith Cantor Quimbaya, para el proyecto de "CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA".

Sede Principal
CAM
CAMHUILA
cam_huila
CAMHUILA
Carrera 1 No. 60-79 Barrio Las Mercedes
Neiva - Huila (Colombia)
radicacion@cam.gov.co
(608) 866 4454
www.cam.gov.co

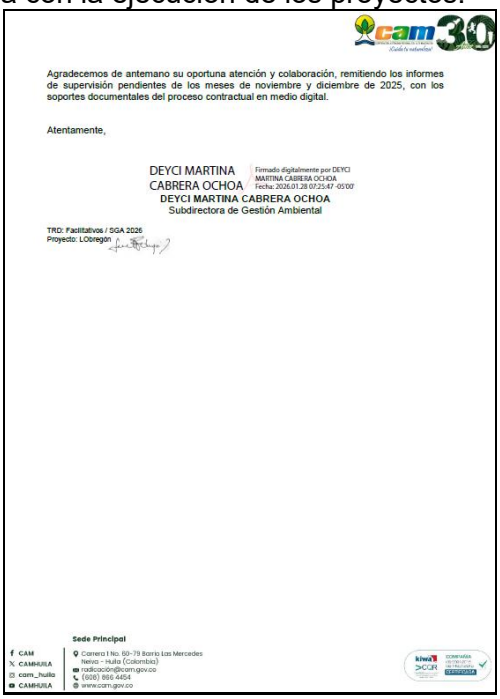

Agradecemos de antemano su oportuna atención y colaboración, remitiendo los informes de supervisión pendientes de los meses de noviembre y diciembre de 2025, con los soportes documentales del proceso contractual en medio digital.


Atentamente,

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Firmado digitalmente por DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Fecha: 2026.01.28 07:25:47 -05'00'
DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Gestión Ambiental

TRD: Facilitativos / SGA 2026
Proyecto: LObregon

Sede Principal
CAM
CAMHUILA
cam_huila
CAMHUILA
Carrera 1 No. 60-79 Barrio Las Mercedes
Neiva - Huila (Colombia)
radicacion@cam.gov.co
(608) 866 4454
www.cam.gov.co

- ✓ La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA ESP en calidad de ejecutor del proyecto, remite el tercer y cuarto informe del convenio 400 de 2025 correspondiente al periodo 19 de octubre – 18 de noviembre 2025 y 19 de noviembre – 18 de diciembre 2025, donde informa que los contratos derivados todavía no inician la ejecución física, y se adelantaron por parte de los contratistas conjunto con la interventoría las etapas de replanteo general de las obras, validación de todos los componentes técnicos del proyecto, tales como alineamientos, cotas, pendientes, localización de estructuras y correspondencia con los planos aprobados, adelantan la adquisición de los materiales e insumos requeridos, así como el alquiler de maquinaria y herramientas necesarias para la correcta ejecución de las obras, avance de los procesos técnico-ambientales, administrativos y de planeación, análisis hidráulico conforme a lo establecido en el RAS 2000 y la Resolución 0330 de 2017, así como la verificación de estructuras especiales, pozos de inspección y puntos de empalme, teniendo en cuenta las condiciones reales del terreno y de cada cauce intervenido, definición de frentes de trabajo, metodologías constructivas, zonas críticas de intervención y programación de ejecución por tramos, junto con la gestión predial y social requerida para el ingreso a predios y la interacción con las comunidades ribereñas necesarios para garantizar el inicio de obra.

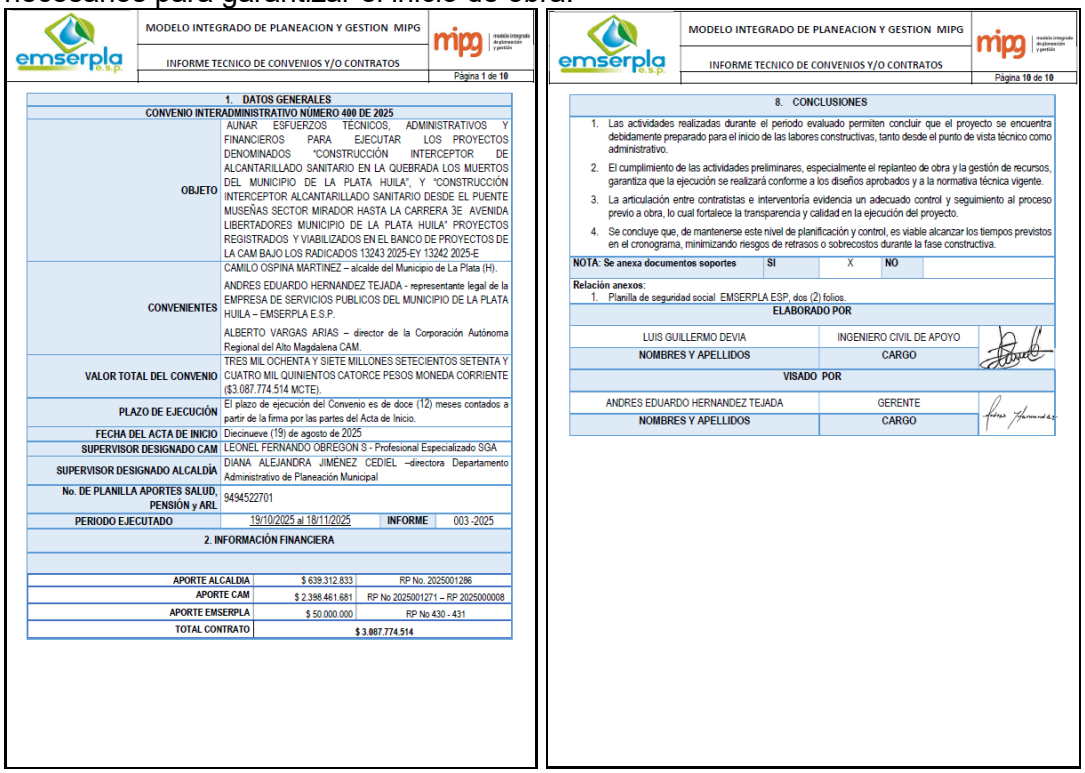

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

INFORME TECNICO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS

Página 1 de 10

1. DATOS GENERALES	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 400 DE 2025	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", Y "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA" PROYECTOS REGISTRADOS Y VIABILIZADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO LOS RADICADOS 13243 2025-EY 13242 2025-E
CONVENIENTES	CAMILO OSPINA MARTINEZ – alcalde del Municipio de La Plata (H). ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA - representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA E.S.P. ALBERTO VARGAS ARIAS – director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	TRES MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.087.774.514 MCTE).
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del Convenio es de doce (12) meses contados a partir de la firma por las partes del Acta de Inicio.
FECHA DEL ACTA DE INICIO	Diecinueve (19) de agosto de 2025
SUPERVISOR DESIGNADO CAM	LEONEL FERNANDO OBREGON S - Profesional Especializado SGA
SUPERVISOR DESIGNADO ALCALDÍA	DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL –directora Departamento Administrativo de Planeación Municipal
No. DE PLANILLA APORTES SALUD, PENSIÓN y ARL	9494522701
PERIODO EJECUTADO	19/10/2025 al 18/11/2025 — INFORME 003 -2025

2. INFORMACIÓN FINANCIERA		
APORTE ALCALDIA	$ 639.312.833	RP No. 2025001286
APORTE CAM	$ 2.398.461.681	RP No 2025001271 – RP 2025000008
APORTE EMSERPLA	$ 50.000.000	RP No 430 - 431
TOTAL CONTRATO	$ 3.087.774.514	

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

INFORME TECNICO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS

Página 10 de 10


8. CONCLUSIONES

1. Las actividades realizadas durante el periodo evaluado permiten concluir que el proyecto se encuentra debidamente preparado para el inicio de las labores constructivas, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo.
2. El cumplimiento de las actividades preliminares, especialmente el replanteo de obra y la gestión de recursos, garantiza que la ejecución se realizará conforme a los diseños aprobados y a la normativa técnica vigente.
3. La articulación entre contratistas e interventoría evidencia un adecuado control y seguimiento al proceso previo a obra, lo cual fortalece la transparencia y calidad en la ejecución del proyecto.
4. Se concluye que, de mantenerse este nivel de planificación y control, es viable alcanzar los tiempos previstos en el cronograma, minimizando riesgos de retrasos o sobrecostos durante la fase constructiva.

NOTA: Se anexa documentos soportes	SI	X	NO	

Relación anexos:
1. Planilla de seguridad social EMSERPLA ESP, dos (2) folios.

ELABORADO POR	
LUIS GUILLERMO DEVIA	INGENIERO CIVIL DE APOYO
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VISADO POR	
ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA	GERENTE
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO

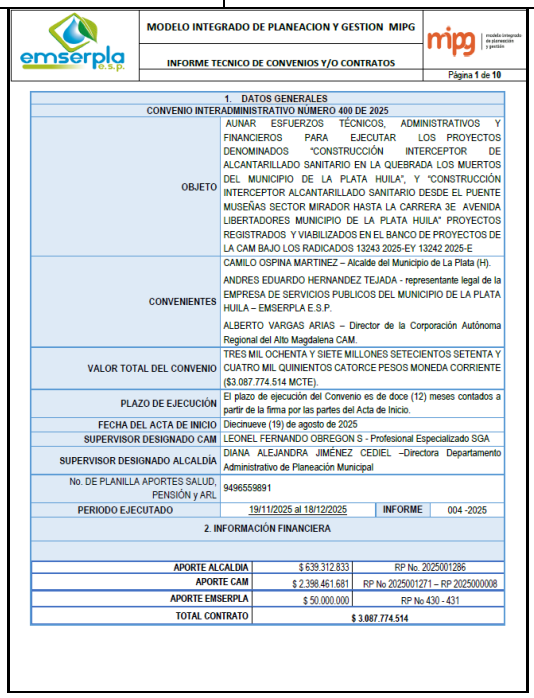


MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

INFORME TECNICO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS

Página 1 de 10

1. DATOS GENERALES	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 400 DE 2025	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", Y "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA" PROYECTOS REGISTRADOS Y VIABILIZADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO LOS RADICADOS 13243 2025-EY 13242 2025-E
CONVENIENTES	CAMILO OSPINA MARTINEZ – Alcalde del Municipio de La Plata (H). ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA - representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA E.S.P. ALBERTO VARGAS ARIAS – Director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	TRES MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.087.774.514 MCTE).
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del Convenio es de doce (12) meses contados a partir de la firma por las partes del Acta de Inicio.
FECHA DEL ACTA DE INICIO	Diecinueve (19) de agosto de 2025
SUPERVISOR DESIGNADO CAM	LEONEL FERNANDO OBREGON S - Profesional Especializado SGA
SUPERVISOR DESIGNADO ALCALDÍA	DIANA ALEJANDRA JIMÉNEZ CEDIEL –Directora Departamento Administrativo de Planeación Municipal
No. DE PLANILLA APORTES SALUD, PENSIÓN y ARL	9496559891
PERIODO EJECUTADO	19/11/2025 al 18/12/2025 — INFORME: 004 -2025

2. INFORMACIÓN FINANCIERA		
APORTE ALCALDIA	$ 639.312.833	RP No. 2025001286
APORTE CAM	$ 2.398.461.681	RP No 2025001271 – RP 2025000008
APORTE EMSERPLA	$ 50.000.000	RP No 430 - 431
TOTAL CONTRATO	$ 3.087.774.514	

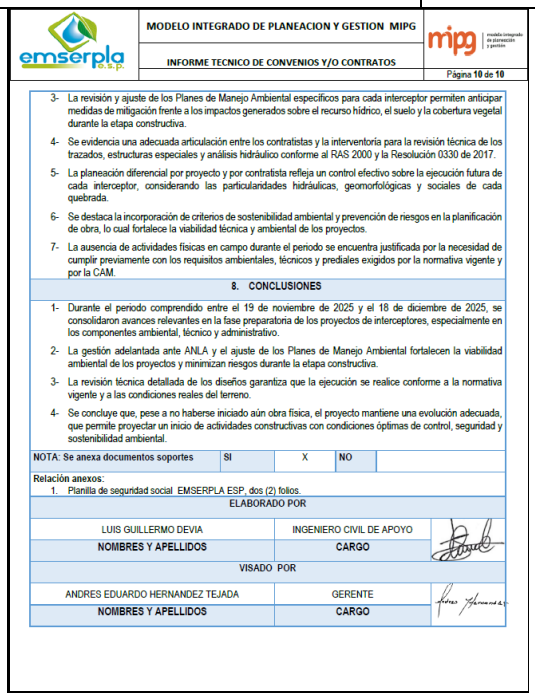

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

INFORME TECNICO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS

Página 10 de 10

3- La revisión y ajuste de los Planes de Manejo Ambiental específicos para cada interceptor permiten anticipar medidas de mitigación frente a los impactos generados sobre el recurso hídrico, el suelo y la cobertura vegetal durante la etapa constructiva.

4- Se evidencia una adecuada articulación entre los contratistas y la interventoría para la revisión técnica de los trazados, estructuras especiales y análisis hidráulico conforme al RAS 2000 y la Resolución 0330 de 2017.

5- La planeación diferencial por proyecto y por contratista refleja un control efectivo sobre la ejecución futura de cada interceptor, considerando las particularidades hidráulicas, geomorfológicas y sociales de cada quebrada.

6- Se destaca la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental y prevención de riesgos en la planificación de obra, lo cual fortalece la viabilidad técnica y ambiental de los proyectos.

7- La ausencia de actividades físicas en campo durante el periodo se encuentra justificada por la necesidad de cumplir previamente con los requisitos ambientales, técnicos y prediales exigidos por la normativa vigente y por la CAM.

8. CONCLUSIONES

1- Durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 2025 y el 18 de diciembre de 2025, se consolidaron avances relevantes en la fase preparatoria de los proyectos de interceptores, especialmente en los componentes ambiental, técnico y administrativo.

2- La gestión adelantada ante ANLA y el ajuste de los Planes de Manejo Ambiental fortalecen la viabilidad ambiental de los proyectos y minimizan riesgos durante la etapa constructiva.

3- La revisión técnica detallada de los diseños garantiza que la ejecución se realice conforme a la normativa vigente y a las condiciones reales del terreno.

4- Se concluye que, pese a no haberse iniciado aún obra física, el proyecto mantiene una evolución adecuada, que permite proyectar un inicio de actividades constructivas con condiciones óptimas de control, seguridad y sostenibilidad ambiental.

NOTA: Se anexa documentos soportes	SI	X	NO	

Relación anexos:
1. Planilla de seguridad social EMSERPLA ESP, dos (2) folios.

ELABORADO POR		
LUIS GUILLERMO DEVIA	INGENIERO CIVIL DE APOYO	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	
VISADO POR		
ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA	GERENTE	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	

III. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EMSERPLA ESP (Ejecutor):

ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Etapa de Legalización	100%	Se cumplió con la suscripción del convenio 400 de 2025, acta de inicio de fecha 19 de agosto de 2025.
Etapa pre-contractual	100%	EMSERPLA ESP en calidad de ejecutor del convenio, adelantó los procesos, las propuestas fueron evaluadas jurídica, técnica y financieramente, y adjudicadas.
Etapa contractual	100%	Se suscribió el contrato de obra 68 de 2025 y de Interventoría 73 de 2025, en ambos casos con acta de inicio el día 15 de octubre de 2025; para el proyecto de "CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA". Se suscribió el contrato de obra 89 de 2025 y de interventoría 72 de 2025, en ambos casos con acta de inicio el dia 10 de octubre de 2025; para el proyecto de "CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA".
Etapa de ejecución	0%	
Etapa de seguimiento	0%	
Informe de ejecución física y financiera – recibo final	0%	
Etapa de liquidación	0%	

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA. CONSTRUCCION INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.	$2.398.461.681	$783.489.790	23,67%	Se giro el primer desembolso, conforme lo establecido en la clausula sexta del convenio 400 de 2025
MUNICIPIO DE LA PLATA	$ 639.312.833			
EMSERPLA ESP	$ 50.000.000			
TOTAL	**$3.087.774.514**			

A continuación, se presenta mayor detalle de la ejecución financiera:

CONVENIO	
No. Convenio y fecha	400 del 08/08/2025
Aportes obra:	
CAM Tasa Retributiva	$2.398.461.681
Aportes Obra e Interventoría:	
MUNICIPIO de la Plata	$ 639.312.833
EMSERPLA ESP	$ 50.000.000

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Certificado pago octubre y noviembre, seguridad social
Modificación de garantías			N.A
Cláusulas de responsabilidad Ambiental			N.A
Cláusulas de responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo			N.A
Otros (Explicar)			N.A

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	3,0
Oportunidad en entrega	3,0
Cantidad entregada	.3,0
Responsabilidad Ambiental	3,0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	3,0
PROMEDIO CALIFICACION	**3,0**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

La CAM en ejercicio de la supervisión correspondiente, ha prestado al municipio y al ejecutor EMSERPLA ESP, el apoyo institucional necesario y conforme a sus competencias para facilitar la ejecución del convenio.

Atentamente,



LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR
Profesional Especializado
Supervisor CAM
