1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001271 H2 2024
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL VCS SITTI RADIOCOM 2024
Periodo informe:	NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Nombre de Supervisor:	LUISA PESELLIN - CARLOS ARTURO OTALVARO - JOSE ALFREDO JIMENEZ – WILLIAM FONSECA – WILLIAM NIÑO – ALEXANDER CASTAÑEDA – JOSE ANTONIO CORNEJO – DIEGO GIRALDO REYES
Nombre del Interventor:	No aplica
Área perteneciente:	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación aérea

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN SERVICIO SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ (VCS) A NIVEL NACIONAL - VIGENCIA FUTURA

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante este periodo:

Durante los meses de enero y febrero se realizo el retiro y envio de los equipos correspondientes a las sedes de NEIVA, BUCARAMANGA Y PEREIRA, se adjuntan actas:

A. COMPROMISOS

- Seguimiento de instalaciones según cronograma.

4. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

EXAMEN OCUPACIONAL

Los supervisores del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual se solicitó la entrega de esta información a contratista, en la siguiente reunión se le hará seguimiento al tema

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Se realizo el pago correspondiente a los equipos posterior al ingreso al almacén general.

VIGENCIA	VALOR TOTAL	RESERVA 2024	RESERVA 2025	RESERVA 2026	FACTURA 4 2025
2024	$ 1,511,914,753	0			
2025	$ 24,412,820,395		$ 1,489,886,412		$ 22,922,933,983
2026	$ 10,441,036,082				
TOTAL	$ 36,365,771,230				

1.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Se recibió el 100% de los equipos en el almacén general de nivel central en Bogotá de la Entidad, se despachan equipos y se inicia la implementación, actualmente el avance del proyecto es del 60.47%

RESUMEN FORMATO 8				50%
#	ITEM	ESTADO	AVANCE FORMATO 8	PONDERADO
1	SURVEY	100.00%	6.19%	3.09%
2	ENTREGA KVM	54.96%	3.40%	1.70%
3	ENTREGA SWITCH	57.34%	7.09%	3.55%
4	ENTREGA GRABADORAS	54.96%	3.40%	1.70%
5	ENTREGA SERVIDORES MONITOREO	54.96%	3.40%	1.70%
6	ENTREGA VCS	56.31%	29.22%	14.61%
7	ENTREGA MESAS PARA CONSOLAS	50.00%	4.12%	2.06%
8	EQUIPO MINIMO DE TRABAJO	100.00%	2.75%	1.37%
TOTAL		66.07%	59.57%	29.79%

RESUMEN FORMATO 10				50%
SUBSECCION	ITEM	ESTADO	AVANCE FORMATO 10	PONDERADO
1	TOUCHSCREEN	100.00%	15.91%	7.95%
2	SISTEMA DE GRABACION	60.00%	20.45%	10.23%
3	SERVIDORES COST	0.00%	0.00%	0.00%
4	FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DE LOS VCS	75.00%	13.64%	6.82%
5	GESTION DEL SISTEMA	0.00%	0.00%	0.00%
6	FUNCIONALIDADES DE TELEFONIA	42.86%	6.82%	3.41%
7	DESCRIPCION DEL SISTEMA	100.00%	4.55%	2.27%
TOTAL		53.98%	61.36%	30.68%
TOTAL PONDERADO PROYECTO				60.47%

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 09

ÁREA:	*Dirección de Telecomunicaciones*		**CONTRATO**	*24001271 H2*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Revisión actividades contrato 24001271 - supervisores del contrato*				
LUGAR:	*Teams*				
FECHA:	*23 de enero 2025*	**HORA INICIO:**	*14:00*	**HORA FINAL:**	17:00

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revision actividades contrato 24001271 H2

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Temas a tratar
2. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

a. GENERALIDADES

- ***retiro equipos almacen general entidad***

1. ALMACEN GENERAL

En el marco del Contrato No. 24001271, el contratista realizo el retiro del equipamiento de los 3 primeros sitios a intervenir NEIVA, PEREIRA, BUCARAMANGA, las cuales fueron entregadas en cada uno de los sitios para iniciar con las labores de instalación y puesta en servicio de las consolas


KOMATSU
30
KOMATSU


PELIGRO











Actualmente de acuerdo al seguimiento de actividades estamos cumpliendo con el cronograma de trabajo y avances del proceso en base a lo establecido

ITEM	LOCALIZACION			CANT	lacion		ESTADO	ESTADO AERO	ESTADO REGIONAL	ESTADO ITEM	AVANCE
	REGIONAL	AEROPUERTO	POSICION		TERMINADAS	PENDIENTES					
SURVEY	NORTE	Barranquilla	Barranquilla	1	1	0.0	100%	100%	100%	100%	6.19%
		Riohacha	Riohacha	1	1	0.0	100%	100%			
		Santa Marta	Santa Marta	1	1	0.0	100%	100%			
		Cartagena	Cartagena	1	1	0.0	100%	100%			
		Corozal	Corozal	1	1	0.0	100%	100%			
		Valledupar	Valledupar	1	1	0.0	100%	100%			
		San Andres	San Andres	1	1	0.0	100%	100%			
	NOR_OCCIDENTE	Rionegro	Rionegro	1	1	0.0	100%	100%	100%		
		Medellin	Medellin	1	1	0.0	100%	100%			
		Carepa	Carepa	1	1	0.0	100%	100%			
		Monteria	Monteria	1	1	0.0	100%	100%			
	NOR_ORIENTE	Cucuta	Cucuta	1	1	0.0	100%	100%	100%		
		Barrancabermeja	Barrancabermeja	1	1	0.0	100%	100%			
		Bucaramanga	Bucaramanga	1	1	0.0	100%	100%			
	CENTRO_SUR	Neiva	Neiva	1	1	0.0	100%	100%	100%		
	OCCIDENTE	Pereira	Pereira	1	1	0.0	100%	100%	100%		
		Pasto	Pasto	1	1	0.0	100%	100%			
	ORIENTE	Yopal	Yopal	1	1	0.0	100%	100%	100%		
ENTREGA KVM	NORTE	Barranquilla	Barranquilla	1		1.0	50%	50%	21%	55%	3.40%
		Riohacha	Riohacha	1		1.0	0%	0%			
		Santa Marta	Santa Marta	1		1.0	0%	0%			
		Cartagena	Cartagena	1		1.0	0%	0%			
		Corozal	Corozal	1		1.0	50%	50%			
		Valledupar	Valledupar	1		1.0	0%	0%			
		San Andres	San Andres	1		1.0	50%	50%			
	NOR_OCCIDENTE	Rionegro	Rionegro	1		1.0	50%	50%	50%		
		Medellin	Medellin	1		1.0	50%	50%			
		Carepa	Carepa	1		1.0	50%	50%			
		Monteria	Monteria	1		1.0	50%	50%			
	NOR_ORIENTE	Cucuta	Cucuta	1		1.0	50%	50%	58%		
		Barrancabermeja	Barrancabermeja	1		1.0	50%	50%			
		Bucaramanga	Bucaramanga	1		0.5	75%	75%			
	CENTRO_SUR	Neiva	Neiva	1		0.5	75%	75%	75%		
	OCCIDENTE	Pereira	Pereira	1		1.0	50%	50%	50%		
		Pasto	Pasto	1		1.0	50%	50%			
	ORIENTE	Yopal	Yopal	1		0.5	75%	75%	75%		

ENTREGA SWITCH	NORTE	Barranquilla	Barranquilla	2		2.0	50%	50%	36%	57%	7.09%
		Riohacha	Riohacha	2		2.0	25%	25%			
		Santa Marta	Santa Marta	2		2.0	25%	25%			
		Cartagena	Cartagena	2		2.0	25%	25%			
		Corozal	Corozal	2		2.0	50%	50%			
		Valledupar	Valledupar	2		2.0	25%	25%			
		San Andres	San Andres	2		2.0	50%	50%			
	NOR_OCCIDENTE	Rionegro	Rionegro	2		2.0	50%	50%	50%		
		Medellin	Medellin	2		2.0	50%	50%			
		Carepa	Carepa	2		2.0	50%	50%			
		Monteria	Monteria	2		2.0	50%	50%			
	NOR_ORIENTE	Cucuta	Cucuta	2		2.0	50%	50%	58%		
		Barrancabermeja	Barrancabermeja	2		2.0	50%	50%			
		Bucaramanga	Bucaramanga	2		1.0	75%	75%			
	CENTRO_SUR	Neiva	Neiva	2		1.0	75%	75%	75%		
	OCCIDENTE	Pereira	Pereira	2		2.0	50%	50%	50%		
		Pasto	Pasto	2		2.0	50%	50%			
	ORIENTE	Yopal	Yopal	2		1.0	75%	75%	75%		
ENTREGA GRABADORAS	NORTE	Barranquilla	Barranquilla	1		1.0	50%	50%	21%	55%	3.40%
		Riohacha	Riohacha	1		1.0	0%	0%			
		Santa Marta	Santa Marta	1		1.0	0%	0%			
		Cartagena	Cartagena	1		1.0	0%	0%			
		Corozal	Corozal	1		1.0	50%	50%			
		Valledupar	Valledupar	1		1.0	0%	0%			
		San Andres	San Andres	1		1.0	50%	50%			
	NOR_OCCIDENTE	Rionegro	Rionegro	1		1.0	50%	50%	50%		
		Medellin	Medellin	1		1.0	50%	50%			
		Carepa	Carepa	1		1.0	50%	50%			
		Monteria	Monteria	1		1.0	50%	50%			
	NOR_ORIENTE	Cucuta	Cucuta	1		1.0	50%	50%	58%		
		Barrancabermeja	Barrancabermeja	1		1.0	50%	50%			
		Bucaramanga	Bucaramanga	1		0.5	75%	75%			
	CENTRO_SUR	Neiva	Neiva	1		0.5	75%	75%	75%		
	OCCIDENTE	Pereira	Pereira	1		1.0	50%	50%	50%		
		Pasto	Pasto	1		1.0	50%	50%			
	ORIENTE	Yopal	Yopal	1		0.5	75%	75%	75%		
ENTREGA SERVIDORES MONITOREO	NORTE	Barranquilla	Barranquilla	1		1.0	50%	50%	21%	55%	3.40%
		Riohacha	Riohacha	1		1.0	0%	0%			
		Santa Marta	Santa Marta	1		1.0	0%	0%			
		Cartagena	Cartagena	1		1.0	0%	0%			
		Corozal	Corozal	1		1.0	50%	50%			
		Valledupar	Valledupar	1		1.0	0%	0%			
		San Andres	San Andres	1		1.0	50%	50%			
	NOR_OCCIDENTE	Rionegro	Rionegro	1		1.0	50%	50%	50%		
		Medellin	Medellin	1		1.0	50%	50%			
		Carepa	Carepa	1		1.0	50%	50%			
		Monteria	Monteria	1		1.0	50%	50%			
	NOR_ORIENTE	Cucuta	Cucuta	1		1.0	50%	50%	58%		
		Barrancabermeja	Barrancabermeja	1		1.0	50%	50%			
		Bucaramanga	Bucaramanga	1		0.5	75%	75%			
	CENTRO_SUR	Neiva	Neiva	1		0.5	75%	75%	75%		
	OCCIDENTE	Pereira	Pereira	1		1.0	50%	50%	50%		
		Pasto	Pasto	1		1.0	50%	50%			
	ORIENTE	Yopal	Yopal	1		0.5	75%	75%	75%		





			ACC Sector Norte	2		2.0	50%		
			ACC Sector Sur Este	2		2.0	50%		
			ACC Sector Sur Oeste	2		2.0	50%		
			APP Norte	2		2.0	50%		
	NORTE	Barranquilla	APP Sur	2		2.0	50%	50%	30%
			TWR Barranquilla	4		4.0	50%		
			FIC Barranquilla	2		2.0	50%		
			ATSEP Barranquilla	2		2.0	50%		
			AIM Barranquilla	2		2.0	50%		
			Supervisor Barranquilla	2		2.0	50%		
			Reserva	4		4.0	50%		
		Riohacha	TWR	2		2.0	25%	13%	
			ATSEP	1		1.0	0%		
		Corozal	TWR	2		2.0	50%	50%	
			ATSEP	1		1.0	50%		
		Santa Marta	TWR	3		3.0	33%	17%	
			ATSEP	1		1.0	0%		
		Cartagena	TWR	2		2.0	25%	15%	
			AIM	1		1.0	0%		
			ATSEP	1		1.0	0%		
			Reserva	2		2.0	25%		
			GND	2		2.0	25%		
		San Andrés	TWR	2		2.0	50%	50%	
			AIM	1		1.0	50%		
			ATSEP	1		1.0	50%		
			Reserva	3		3.0	50%		
			Supervisor	1		1.0	50%		
			APP	2		2.0	50%		
		Valledupar	TWR	2		2.0	25%	13%	
			ATSEP	1		1.0	0%		
	NOR_OCCIDENTE	Rionegro	APP Norte Medellin	2		2.0	50%	50%	50%
			APP Sur Medellin	2		2.0	50%		
			FIC Medellin	2		2.0	50%		
			CTA Medellin	2		2.0	50%		
			Supervisor Sala Radar	1		1.0	50%		
			Coordinador Grupo Regional Servicios Tránsito aéreo	1		1.0	50%		
			Reserva	2		2.0	50%		
			TWR SKRG	5		5.0	50%		
			AIM	1		1.0	50%		
			ATSEP	2		2.0	50%		
		Medellin	TWR SKMD	5		5.0	50%	50%	
			AIM	1		1.0	50%		
			Reserva	1		1.0	50%		
			ATSEP	1		1.0	50%		
ENTREGA VCS		Carepa	TWR	2		2.0	50%	50%	
			ATSEP	1		1.0	50%		
		Monteria	TWR	2		2.0	50%	50%	
			ATSEP	1		1.0	50%		

NOR_ORIENTE	Cúcuta	TWR Titular	1		1.0	50%	50%	58%		
		TWR Coordinador	1		1.0	50%				
		APP Cúcuta Sur	2		2.0	50%				
		APP Cúcuta Norte	2		2.0	50%				
		Supervisor APP	1		1.0	50%				
		Sala remota TWR	2		2.0	50%				
		AIM	1		1.0	50%				
		ATSEP TWR	1		1.0	50%				
		ATSEP Soporte	2		2.0	50%				
	Barrancabermeja	TWR	2		2.0	50%	50%			
		ATSEP	1		1.0	50%				
	Bucaramanga	TWR	2		1.0	75%	75%			
		TWR Superficie	2		1.0	75%				
		APP	2		1.0	75%				
		Supervisor APP	1		0.5	75%				
		ATSEP TWR	1		0.5	75%				
		ATSEP Soporte	1		0.5	75%				
		Reserva(2app-1TWR sup)	3		1.5	75%				
		AIM	1		0.5	75%				
CENTRO_SUR	Neiva	TWR	2		1.0	75%	75%	75%		
		APP	2		1.0	75%				
		FIC	2		1.0	75%				
		AIM	1		0.5	75%				
		ATSEP	1		0.5	75%				
OCCIDENTE	Pereira	TWR	3		3.0	50%	50%	50%		
		APP Pereira	2		2.0	50%				
		CTA Pereira Control terminal area	2		2.0	50%				
		Supervisor	1		1.0	50%				
		AIM	1		1.0	50%				
		ATSEP	1		1.0	50%				
		Reserva	2		2.0	50%				
	Pasto	TWR	2		2.0	50%	50%			
		ATSEP	1		1.0	50%				
ORIENTE	Yopal	TWR	2		1.0	75%	75%	75%		
		APP El Yopal	2		1.0	75%				
		Supervisor	1		0.5	75%				
		AIM FDP	1		0.5	75%				
		ATSEP	1		0.5	75%				
		Reserva	1		0.5	75%				

ENTREGA MESAS PARA CONSOLAS	NORTE	Barranquilla	Barranquilla	3		3.0	50%	50%	50%	50%	4.12%
		Santa Marta	Santa Marta	2		2.0	50%	50%			
		Cartagena	Cartagena	2		2.0	50%	50%			
		San Andres	San Andres	2		2.0	50%	50%			
	NOR_OCCIDENTE	Rionegro	Rionegro	3		3.0	50%	50%	50%		
		Carepa	Carepa	2		2.0	50%	50%			
		Monteria	Monteria	2		2.0	50%	50%			
	NOR_ORIENTE	Cucuta	Cucuta	2		2.0	50%	50%	50%		
		Bucaramanga	Bucaramanga	2		2.0	50%	50%			
	CENTRO_SUR	Neiva	Neiva	1		1.0	50%	50%	50%		
	OCCIDENTE	Pereira	Pereira	2		2.0	50%	50%	50%		
	ORIENTE	Yopal	Yopal	1		1.0	50%	50%	50%		
EQUIPO MINIMO DE TRABAJO	NACIONAL	Lider tecnico	100% Dedicacion	1	1	0.0	100%	100%	100%	100%	2.75%
		Gerente del proyecto	50% Dedicacion	1	1	0.0	100%	100%	100%		
		Frente Equipo Tecnico	100% Dedicacion	6	6	0.0	100%	100%	100%		

FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá D.C. a los 23 de enero de 2026, por los asistentes. Se adjunta listado de asistentes.

Nombre completo	Cargo	Firma
José A. Jimenez C.	Supervisor Regional Norte	
Carlos A. Otalvaro O.	Supervisor Regional Noroccidente	
José A. Cornejo V.	Supervisor Regional Nororiente	
Germán A. Castañeda Y.	Supervisor Regional Occidente	
William A. Niño F.	Supervisor Regional Oriente	
William Fonseca	Supervisor Regional Centro Sur	
Diego F. Giraldo R.	Supervisor Nivel Central	
Luisa F. Pesellin G.	Apoyo a la Supervisión Nivel Central	

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 10

ÁREA:	*Dirección de Telecomunicaciones*		**CONTRATO**	*24001271 H2*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Revisión actividades contrato 24001271 - supervisores del contrato*				
LUGAR:	*Teams*				
FECHA:	*12 febrero 2025*	**HORA INICIO:**	*14:00*	**HORA FINAL:**	17:00

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revision actividades contrato 24001271 H2

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Temas a tratar
2. Planes de acción (Generación de compromisos)

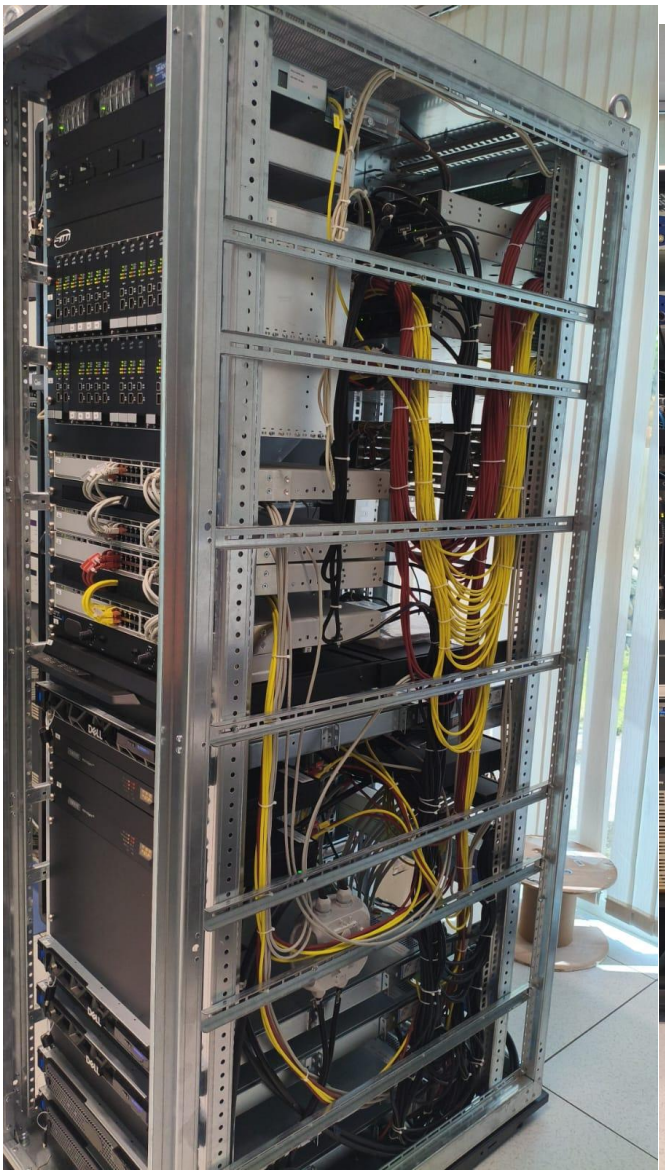
IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

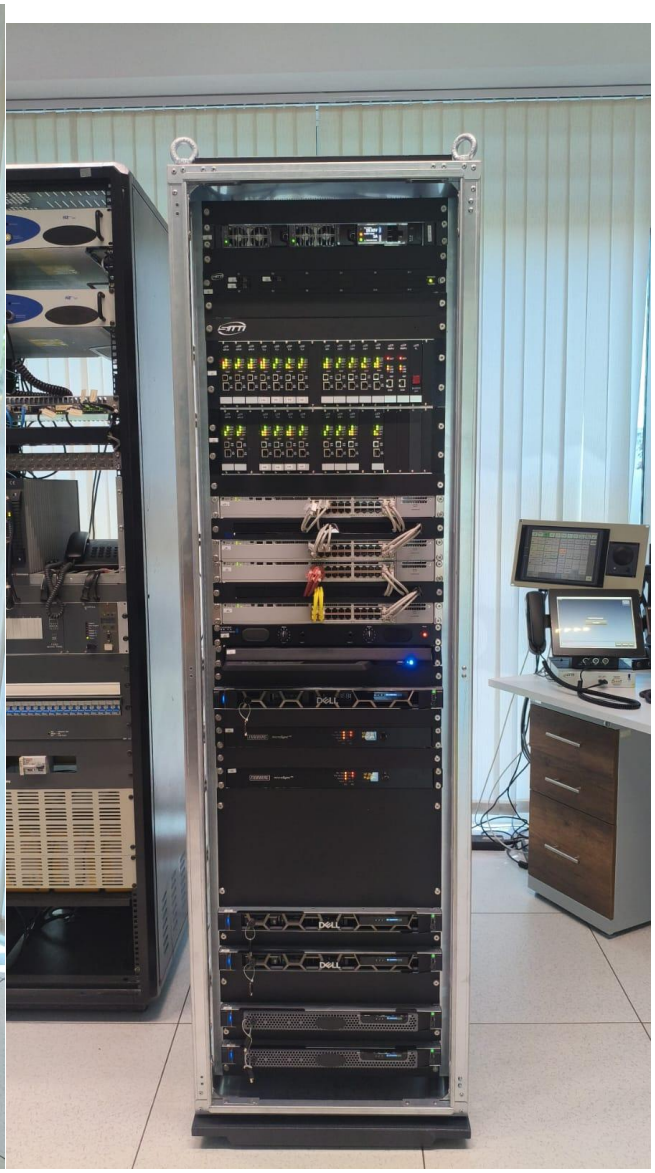
a. GENERALIDADES

- ***retiro equipos almacen general entidad***

1. ALMACEN GENERAL

En el marco del Contrato No. 24001271, el contratista inicio con la implementación de los equipos, infraestructura y servicios de los Aeropuertos de NEIVA, BUCARAMANGA Y PEREIRA





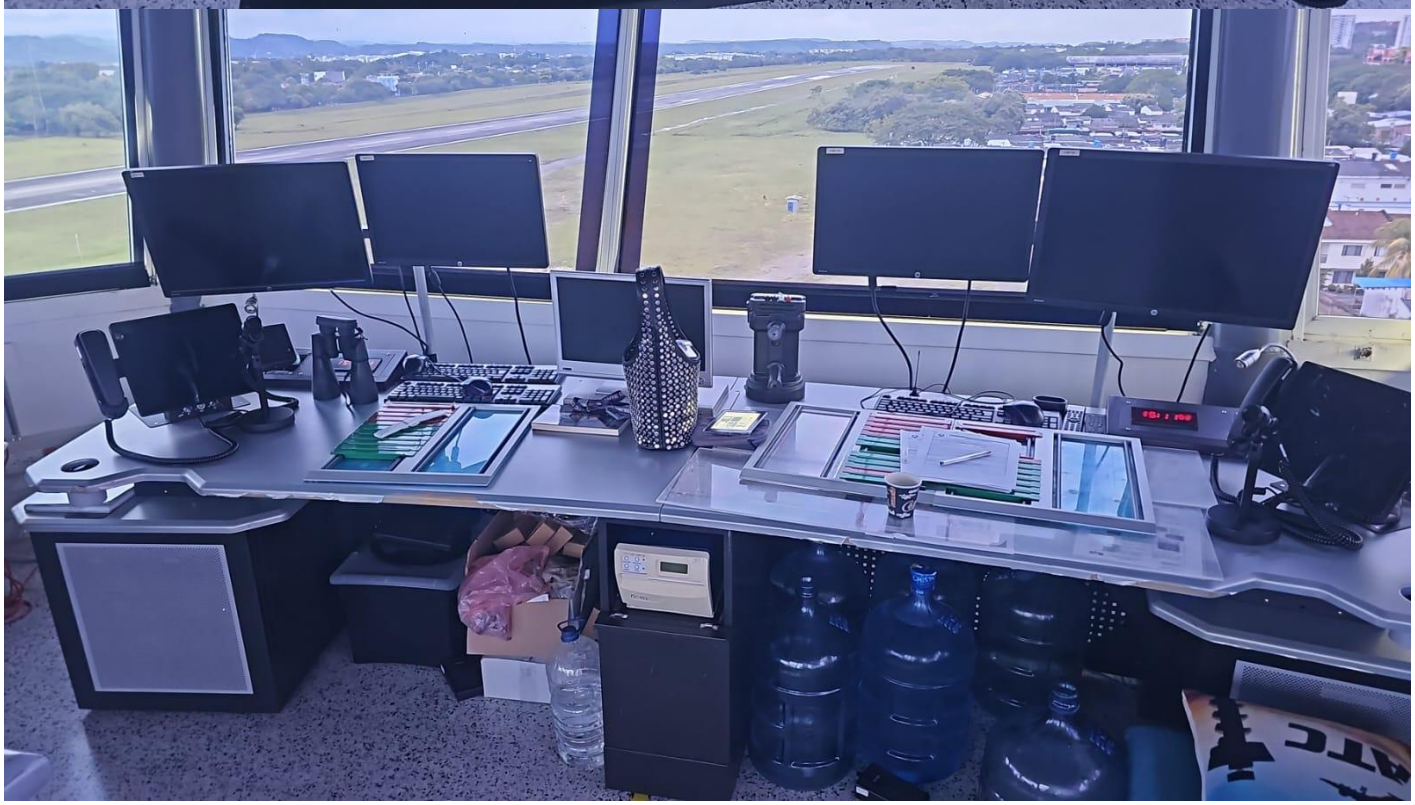


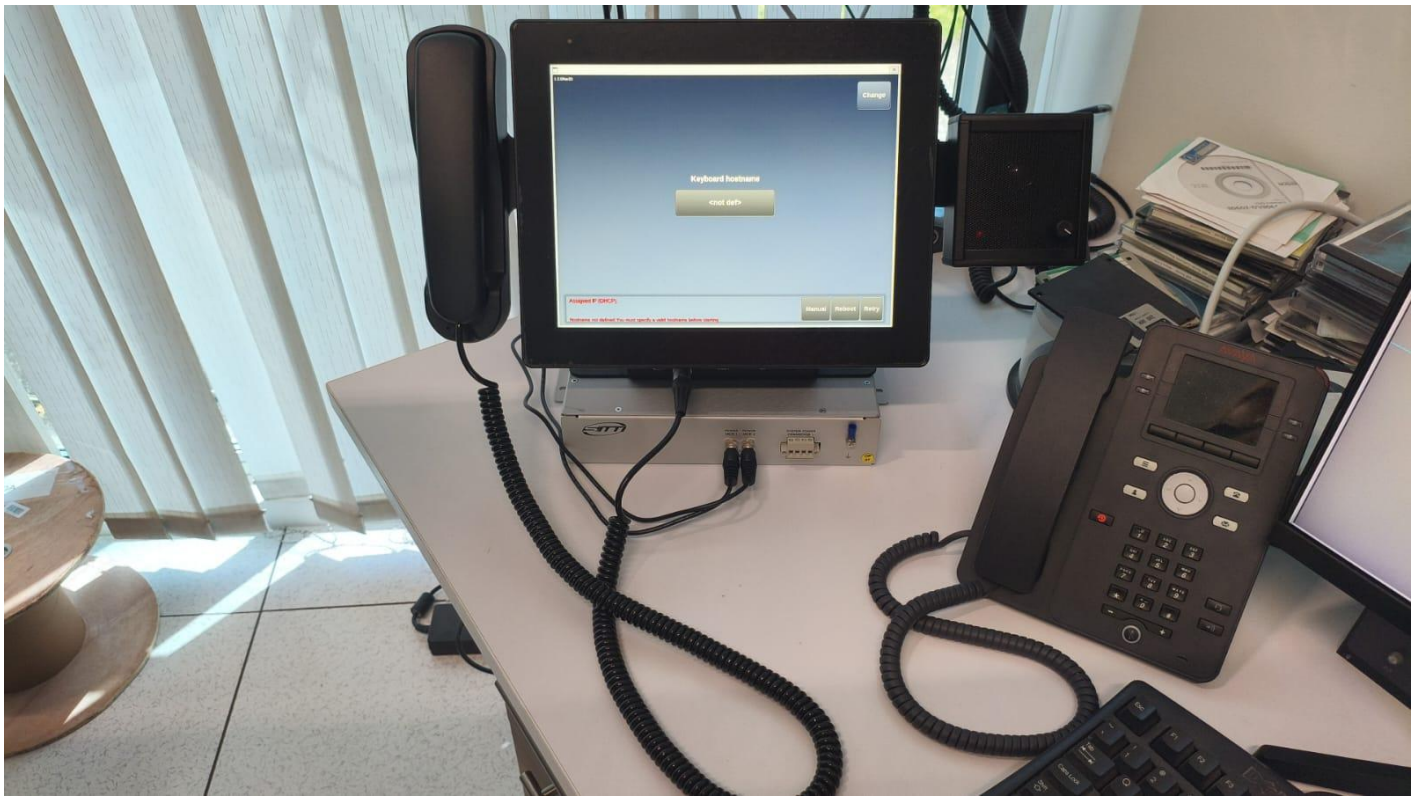





¡Te cuido, me cuidas!










RESUMEN FORMATO 8				50%
#	ITEM	ESTADO	AVANCE FORMATO 8	PONDERADO
1	SURVEY	100.00%	6.19%	3.09%
2	ENTREGA KVM	54.96%	3.40%	1.70%
3	ENTREGA SWITCH	57.34%	7.09%	3.55%
4	ENTREGA GRABADORAS	54.96%	3.40%	1.70%
5	ENTREGA SERVIDORES MONITOREO	54.96%	3.40%	1.70%
6	ENTREGA VCS	56.31%	29.22%	14.61%
7	ENTREGA MESAS PARA CONSOLAS	50.00%	4.12%	2.06%
8	EQUIPO MINIMO DE TRABAJO	100.00%	2.75%	1.37%
TOTAL		66.07%	59.57%	29.79%

RESUMEN FORMATO 10				50%
SUBSECCION	**ITEM**	**ESTADO**	**AVANCE FORMATO 10**	**PONDERADO**
1	TOUCHSCREEN	100.00%	15.91%	7.95%
2	SISTEMA DE GRABACION	60.00%	20.45%	10.23%
3	SERVIDORES COST	0.00%	0.00%	0.00%
4	FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DE LOS VCS	75.00%	13.64%	6.82%
5	GESTION DEL SISTEMA	0.00%	0.00%	0.00%
6	FUNCIONALIDADES DE TELEFONIA	42.86%	6.82%	3.41%
7	DESCRIPCION DEL SISTEMA	100.00%	4.55%	2.27%
TOTAL		**53.98%**	**61.36%**	**30.68%**
TOTAL PONDERADO PROYECTO				**60.47%**

FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá D.C. a los 12 de febrero de 2026, por los asistentes. Se adjunta listado de asistentes.

Nombre completo	Cargo	Firma
José A. Jimenez C.	Supervisor Regional Norte	
Carlos A. Otalvaro O.	Supervisor Regional Noroccidente	
José A. Cornejo V.	Supervisor Regional Nororiente	
Germán A. Castañeda Y.	Supervisor Regional Occidente	
William A. Niño F.	Supervisor Regional Oriente	
William Fonseca	Supervisor Regional Centro Sur	
Diego F. Giraldo R.	Supervisor Nivel Central	
Luisa F. Pesellin G.	Apoyo a la Supervisión Nivel Central	
