| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 14 | | | | | |
| **SUPERVISIÓN** | X | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | X | **PARA PAGO** | X | **FINAL** | ☐ |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 01/12/2025 | | Hasta: | 31/12/2025 | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | 01/12/2025 | | Hasta: | 31/12/2025 | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | ☐ | **NÚMERO:** | 4600017804 (IDEA 0356) |
| **CONVENIO** | ☐ | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 26/12/24 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | Contratación directa |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 16334 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 26/12/24 |
| **OBJETO:** "AUNAR ESFUERZOS E INCORPORAR RECURSOS AL "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO, CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO", CELEBRADO CON EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA" | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | NOMBRE: | | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA |
| | NIT | | 890.980.179-2 |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | | Sesenta y un mil cuatrocientos setenta y tres millones ciento un mil ochocientos treinta y nueve pesos M.L ($61.473.101.839) |
| | | **N°** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICIÓN** |
| | ADICIONES | 1 | Ciento ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y un pesos $184.345.141 como aporte del Departamento.<br><br>Nueve millones doscientos diecisiete mil doscientos cincuenta y siete $9.217.257 como aporte del IDEA, aporta el 5% | %0.3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | sobre el valor total de la adición. | |
| | | 2 | Seis mil trescientos sesenta y cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos M/L ($ 6.365.212.460). distribuidos así: **Secretaría de Infraestructura Física**: Aporte económico adicional Departamento de Antioquia Seis mil sesenta y dos millones ciento siete mil ciento cinco pesos M/L. ($ 6.062.107.105). **Instituto para el Desarrollo de Antioquia:** Aporte en especie adicional equivalente a trescientos tres millones ciento cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos ($303.105.355), correspondientes al total de costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos del dinero a administrar | 9.76% |
| | | 3 | Siete mil treinta y cinco millones M/L **($7.035.000.000)** distribuidos así: **Secretaría de Infraestructura Física**: Aporte económico adicional Departamento de Antioquia Seis mil setecientos millones M/L **($6.700.000.000) Instituto para el Desarrollo de Antioquia:** Aporte en especie | 10.45% del valor inicial del convenio expresado en SMMLV |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | adicional equivalente a trecientos treinta y cinco millones M/L **($335.000.000)** correspondientes al total de costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos del dinero a administrar. | |
| | VALOR TOTAL: | El valor total del contrato teniendo en cuenta las adiciones propuestas es de: Setenta y cinco mil sesenta y seis millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos noventa y siete pesos M/L. **($75.066.876.697).** | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO y FECHA DE LIBERACION | 4500064042 DEL 26/12/2024 | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | N/A | | |
| **PLAZO:** | INICIAL | Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | |
| | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | 26/12/2024 | 26/12/2026 | |
| | PRÓRROGAS: **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | 1 | Un año y un mes | 26 de enero de 2028 | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | **No** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | 26/01/2028 | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | SI | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | JULIAN ALBERTO RAMIREZ CORTES 1.027.884.243<br>SEBASTIAN CASTAÑO GÓMEZ 1.037.581.916 |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | 49.2% |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | 100% |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para el periodo del presente informe, se da a conocer la ejecución al mes de diciembre del presente convenio interadministrativo, el cual tiene como derivados los siguientes contratos:

Cabe resaltar en el periodo del presente informe que, en el Departamento de Antioquia existe una problemática constante de orden vial que requiere de soluciones eficaces y de acciones inmediatas, que permitan dar continuidad a la prestación del servicio para todos los usuarios de las vías en las subregiones del Departamento. Éstas dificultades han generado, no solo una reducción considerable en los tiempos de transitabilidad entre las diferentes subregiones, afectando el entorno medio ambiental, aumentando los gastos de mantenimiento vehicular, los tiempos de desplazamiento, con las consiguientes consecuencias negativas en los ámbitos económico, social y familiar, sino que también han producido daños en diversas vías departamentales.

En tal sentido desde la Secretaría de Infraestructura Física se cuenta con recursos financieros para proyectos de infraestructura vial en las vías a cargo del Departamento.

En el mes de junio, se realizó acompañamiento a todo lo relacionado con la **Adición N°1** por un valor de ciento ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y un pesos $184.345.141, destinados a incluir y costear el componente de interventoría en el proyecto "Actividades de mejoramiento del suelo y obras complementarias en segmentos de vías ubicadas en los municipios de La Ceja, Entrerríos, Heliconia y Andes en el Departamento de Antioquia". El cual se encuentra dentro del alcance del convenio suscrito con el IDEA, esta adición se desembolsó al IDEA el día 26 de junio bajo comprobante de egreso N°300254857.

En el mes de septiembre se realiza el trámite de modificación al Convenio Interadministrativo:

**MODIFICACION N.1:**

Incluir al alcance del objeto en el ítem • EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS SUBREGIONES DE VALLE DE ABURRÁ, OCCIDENTE, ORIENTE, NORTE, NORDESTE, BAJO CAUCA, MAGDALENA MEDIO, SUROESTE Y URABÁ, EN VIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA:

El artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece que "*son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución*".

En el Departamento de Antioquia existe una problemática constante de orden vial que requiere de soluciones eficaces y de acciones inmediatas, que permitan dar continuidad a la prestación del servicio para todos los usuarios de las vías en las subregiones del Departamento. Estas dificultades han generado, no sólo una reducción considerable en los tiempos de transitabilidad entre las diferentes subregiones, afectando el entorno medio ambiental, aumentando los gastos de mantenimiento vehicular,

los tiempos de desplazamiento, con las consiguientes consecuencias negativas en los ámbitos económico, social y familiar, sino que también han producido daños en diversas vías departamentales.

A pesar de los avances contemplados en el Plan de Desarrollo "POR ANTIOQUIA FIRME 2024 – 2027" y la priorizaron de los estudios y diseños para corredores viales, se han identificado nuevas necesidades de conectividad que requieren ser incluidas, dado que estas vías adicionales presentan condiciones similares o incluso más críticas que las ya priorizadas, y su intervención resulta fundamental para garantizar una cobertura territorial equitativa, mejorar la competitividad regional y asegurar la movilidad de comunidades que actualmente enfrentan aislamiento vial.

El convenio No. 4600017804 fue suscrito por la SIF y el IDEA con el objetivo de incorporar recursos al convenio interadministrativo de asociación marco suscrito anteriormente por ambas entidades para el manejo de dineros destinados a la ejecución de proyectos entre los cuales se encuentra la EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS SUBREGIONES DE VALLE DE ABURRÁ, OCCIDENTE, ORIENTE, NORTE, NORDESTE, BAJO CAUCA, MAGDALENA MEDIO, SUROESTE Y URABÁ, EN VIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

No obstante, por las circunstancias viales que se presentan en las vías del Departamento, se requiere adicionar nuevos corredores viales, a los establecidos inicialmente, dejando de presente que las nuevas vías propuestas cumplen con criterios técnicos, sociales y económicos que justifican su inclusión:

- Conectividad estratégica: Estas vías permiten la articulación entre zonas rurales y centros urbanos, facilitando el acceso a servicios básicos, mercados y oportunidades de desarrollo.

- Impacto socioeconómico: La mejora de estas vías contribuirá directamente al fortalecimiento de cadenas productivas locales, especialmente en sectores agropecuarios, turísticos y mineros, reduciendo los costos logísticos y aumentando la competitividad.

- Condiciones críticas actuales: Muchas de estas vías presentan deterioro avanzado, afectaciones por fenómenos naturales (deslizamientos, pérdida de banca, empozamientos) y falta de mantenimiento, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el desarrollo territorial.

- Equidad territorial: La inclusión de estas vías responde al principio de equidad territorial, garantizando que todas las subregiones del departamento tengan acceso a infraestructura vial digna y funcional, especialmente aquellas que históricamente han sido marginadas en los procesos de inversión pública.

- Complementariedad con proyectos existentes: Estas vías se integran funcionalmente con los corredores viales ya priorizados, fortaleciendo el sistema multimodal de transporte y mejorando la eficiencia de la red vial departamental.

- Viabilidad técnica y financiera: Se contempla la realización de estudios y diseños técnicos que permitan evaluar alternativas de intervención, incluyendo técnicas de estabilización de material granular tratado, y explorar fuentes de financiación como regalías, valorización, obras por impuestos y cofinanciación municipal.

Esta Modificación No. 1 no solo se encuentra justificada técnicamente con los fundamentos anteriormente expuestos, sino que, además, resulta procedente en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual estipula:

> "*De los fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos o convenios y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines…*"

Adicionalmente, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone:

> *"Artículo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondana su esencia y naturaleza.*
>
> *Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.*
>
> *En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.* (…)

Por todo lo anterior y con el fin de continuar la ejecución del alcance establecido en el Convenio Interadministrativo de Incorporación de recursos, se encuentra procedente adicionar el alcance propuesto, dejando de presente que el mismo, no requiere de la adición de recursos.

Por lo que se requiere modificar la cláusula SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO del Convenio Interadministrativo de Incorporación, en especial el ítem de **EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS SUBREGIONES DE VALLE DE ABURRÁ, OCCIDENTE, ORIENTE, NORTE, NORDESTE, BAJO CAUCA, MAGDALENA MEDIO, SUROESTE Y URABÁ, EN VIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

Quedando de la siguiente manera:

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS SUBREGIONES DE VALLE DE ABURRÁ, OCCIDENTE, ORIENTE, NORTE, NORDESTE, BAJO CAUCA, MAGDALENA MEDIO, SUROESTE Y URABÁ, EN VIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

Así como la adición de los siguientes corredores:

| ID | CORREDOR | SUBREGION | CODIGO DE VIAL | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Domingo - Termales - Alejandría | Oriente | 62AN22-2 | Santo Domingo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Remedios - La Ye | Magdalena Medio | 62AN29-1-1 | Remedios |
| 3 | Alto del Cardal - Toledo | Norte | 62AN18-3-1 | Toledo |
| 4 | Campamento - Anorí | Nordeste | 25AN12-1 | Anorí |
| 5 | Caicedo - Urrao | Occidente | 25BAN06-1 | Caicedo |
| 6 | San Pedro de Urabá | Urabá | 62AAN02-2 | San Pedro de Urabá |
| 7 | Campamento - Anorí | Nordeste | 25AN12-1 | Campamento |
| 8 | Puente sobre el río Porce | Nordeste | 05040VT02<br>05031VT5325AN18 | Anorí |
| 9 | Colorado - Nechí | Bajo Cauca | 25AN18 | Nechí |
| 10 | Santo Domingo - Termales - Alejandría | Oriente | 62AN22-2 | Alejandría |

Para los alcances de estos estudios y diseños se deben seguir los lineamientos técnicos de la Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia y la normatividad vigente.

**ADICIÓN N°1**

En el mes de junio se realizó la Adición N°1 al presente contrato, para tal efecto, de acuerdo con la proyección de la SIF se ha determinado que se requiere adicionar para la ejecución del proyecto la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ($184.345.141), teniendo en consideración los siguientes elementos:

- El proyecto introduce tecnologías de estabilización de suelos con productos químicos no convencionales contemplados en las normas técnicas del INVIAS. Esto exige un control técnico riguroso para asegurar su correcta aplicación y efectividad, incluyendo una cantidad significativa de ensayos.

- La interventoría debe verificar que los materiales y procedimientos usados en cada una de las intervenciones de mejoramiento cumpla con las especificaciones de la Resolución 2451 de 2022 del INVIAS, la interventoría previene el uso de materiales inadecuados o prácticas constructivas deficientes, evitando sobrecostos y retrasos en la ejecución de las actividades.

- La dispersión geográfica de los puntos a intervenir hace necesario contar con una interventoría que garantice que las soluciones técnicas se adapten a cada contexto topográfico, climático y geológico, logrando homogeneidad de las obras en todas las subregiones, previniendo fallas, lo cual redunda en la calidad y durabilidad de las obras.

- Personal especializado en cada área, capaz de evaluar y garantizar la idoneidad de las soluciones adoptadas en cada punto a intervenir.

- Se verifica que los pagos a contratistas se realicen de acuerdo con el avance real de los trabajos.

- Se identifican y solucionan dificultades que puedan afectar el avance del proyecto y el cumplimiento de sus metas.

- La interventoría supervisa el cronograma de ejecución, previniendo retrasos y asegurando la entrega oportuna de los trabajos.

Las partes acuerdan adicionar el convenio en la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($193.562.398) la cual equivale al 0,3% del valor inicial del convenio y se discrimina así:

| | |
|---|---|
| Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física. | Ciento ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y un pesos ($184.345.141) |
| Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. | Nueve millones doscientos diecisiete mil doscientos cincuenta y siete pesos ($9.217.257) – en especie. |

Los recursos aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física para la adición se encuentran respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP - 3500055743 del 24 de abril de 2025 y el Certificado de Registro Presupuestal - CRP -4500064931.

Por su parte, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA hace su porte en especie, el cual equivale al cinco por ciento (5%) de los recursos en dinero a administrar SEGUNDA. VALOR DEL CONVENIO. Considerando los aportes por las partes a la presente adición el nuevo valor del convenio asciende a la suma de sesenta y un mil seiscientos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos treinta v siete pesos M/L ($61.666.664.237), así:

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO - SIF** | $ 58.545.811.275 | $184.345.141 |
| **IDEA** | $ 2.927.290.564 | $9.217.257 |

**ADICIÓN N°2**

Seis mil trescientos sesenta y cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos M/L ($ 6.365.212.460). distribuidos así: **Secretaría de Infraestructura Física**: Aporte económico adicional Departamento de Antioquia seis mil sesenta y dos millones ciento siete mil ciento cinco pesos M/L. ($ 6.062.107.105). **Instituto para el Desarrollo de Antioquia:** Aporte en especie adicional equivalente a trescientos tres millones ciento cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos ($303.105.355), correspondientes al total de costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos del dinero a administrar.


La adición propuesta corresponde al 9.46% del valor inicial del convenio expresado en SMMLV. Considerando la Modificación No. 1 Adición No. 1 el convenio sería adicionado por 9.76% en total expresado en SMMLV.

El valor total del contrato teniendo en cuenta la adición propuesta es de: Sesenta y ocho mil treinta y un millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos noventa y siete pesos M/L. ($68.031.876.697).


**MODIFICACIÓN N°2**

El Departamento de Antioquia, por medio de su Secretaría de Infraestructura Física participa activamente de la generación y ejecución de proyectos relacionados con el desarrollo nuevas vías, la ampliación o el mejoramiento de las vías existentes, así como con el mantenimiento preventivo y correctivo de la red vial que resulta crucial para garantizar la movilidad y el desarrollo económico y social de los municipios y subregiones. Para ello, debe crear y desarrollar estrategias: planes y programas, que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos a su cargo y la implementación del plan de desarrollo "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027".

En este contexto, la Secretaría a identificado la necesidad de incluir dentro del alcance del presente convenio de incorporación el proyecto denominado "ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL – SITR DEL URABÁ ANTIOQUEÑO" por medio del cual pretende mejorar las condiciones de movilidad de la región impactando nueve (9) municipios, que son: Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá. Así:

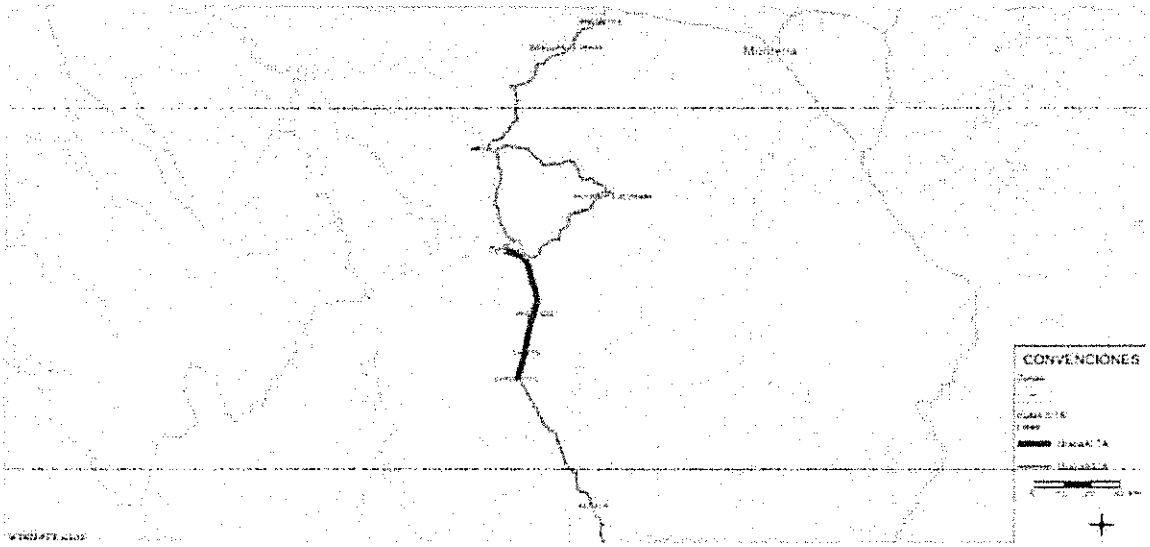


De acuerdo con lo planeado por la Secretaría de Infraestructura Física, el proyecto inicialmente constará de cinco (5) rutas de transporte público, que se distribuyen de manera conceptual de la siguiente manera:

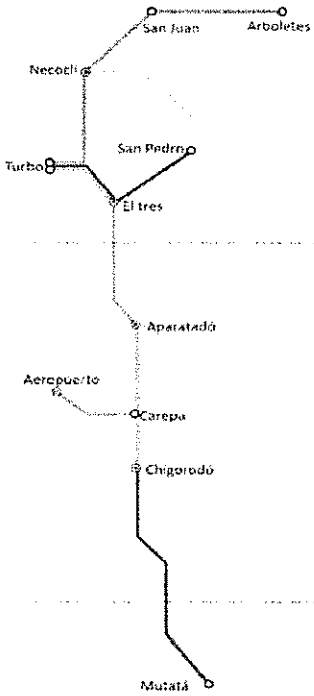


Del mismo modo, la Secretaría a identificado la necesidad de incluir dentro del alcance del presente convenio de incorporación el proyecto denominado "Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el mejoramiento y obras complementarias de la vía corta de acceso al Municipio de el Retiro – Antioquia" Este proyecto tiene el siguiente alcance:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el mejoramiento y obras complementarias de la vía corta de acceso al Municipio de el Retiro - Antioquia. Según el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La Interventoría, según lo indica la norma, consistirá en el seguimiento técnico, ambiental, de seguridad industrial y de salud en el trabajo (SST), administrativo, financiero y legal que sobre el cumplimiento del contrato de obra realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen.

El contratista de Interventoría deberá por su cuenta y riesgo ejercer estas actividades, de acuerdo con la propuesta económica y demás documentación anexa, así como el Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia.

**PRIMERA. MODIFICACION No.2.** Las partes acuerdan MODIFICAR la Cláusula segunda - Alcance del objeto - del convenio interadministrativo para incluir los siguientes proyectos:

1. **"ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL – SITR DEL URABÁ ANTIOQUEÑO"**, esto de acuerdo con las especificaciones descritas en los estudios previos de ese proyecto que se encuentran como anexo No. 1 del presente otrosí y hacen parte integral del mismo.

2. **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA CORTA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE EL RETIRO – ANTIOQUIA"** esto de acuerdo con las especificaciones descritas en los estudios previos de ese proyecto que se encuentran como anexo No. 2 del presente otrosí y hacen parte integral del mismo.

**SEGUNDA. ADICIÓN NO.2.** Las partes acuerdan adicionar el convenio de incorporación No. 4600017804 de 2024 (IDEA 0356) en la suma de Seis mil trescientos sesenta y cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos M/L ($ 6.365.212.460).

La adición aquí pactada corresponde a los siguientes aportes al convenio:

**Secretaría de Infraestructura Física**: Aporte económico adicional Departamento de Antioquia seis mil sesenta y dos millones ciento siete mil ciento cinco pesos M/L. ($6.062.107.105).

Estos recursos son aportados al convenio por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física y se encuentran respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP – 3500056489 y los Certificados de Registro Presupuestal – CRP – 4500065790 y 4500065791.

**Instituto para el Desarrollo de Antioquia:** Aporte en especie adicional equivalente a TRESCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($303.105.355), correspondientes al total de costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos del dinero adicionales a administrar.

**TERCERA. VALOR DEL CONVENIO.** Considerando los recursos aportados por las partes mediante la presente adición el nuevo valor del convenio asciende a la suma de SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/L. ($68.031.876.697), así:

| PARTE | APORTE INICIAL | ADICIÓN 1 | ADICIÓN 2 |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO - SIF | $ 58.545.811.275 | $ 184.345.141 | $6.062.107.105 |
| IDEA | $ 2.927.290.564 | $ 9.217.257 | $303.105.355 |
| TOTAL: $68.031.876.697 | | | |

**CUARTA. VIGENCIAS Y ESTIPULACIONES:** Quedan vigentes todas las estipulaciones del convenio principal y que no sean contrarias a este documento.

**QUINTA. PERFECCIONAMIENTO:** La presente modificación se entiende perfeccionada por el acuerdo de voluntades y la suscripción del mismo por las partes.

**SEXTA. ANEXOS:** Los estudios previos correspondientes a los proyectos "ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL – SITR DEL URABÁ ANTIOQUEÑO" e "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA CORTA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE EL RETIRO – ANTIOQUIA" constituyen los anexos No. 1 y No. 2 del presente otrosí y hacen parte integral del mismo.

**SEPTIMA. MANIFESTACIÓN**: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y detallada del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan al tenor literal de las órdenes y manifestaciones estipuladas en el mismo.

En el mes de diciembre de 2025 mediante otrosí suscrito, las partes acordaron adicionar el convenio así:

**MODIFICAR** la CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO de manera que se agrega el siguiente texto:

**"***ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LOS TRAMOS 3-9 DEL CORREDOR DE CICLOCAMINABILIDAD EN LA ANTIGUA VÍA FÉRREA EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESTRELLA, CALDAS, AMAGÁ, ANGELÓPOLIS Y FREDONIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCANCE: administración integral para la ejecución de las obras en los tramos 3 al 9 del Corredor de Ciclocaminabilidad, ubicados en la antigua vía férrea de los municipios de La Estrella, Caldas, Amagá, Angelópolis y Fredonia. Su función principal es la representación del Departamento de Antioquia en la coordinación de los recursos técnicos, humanos y financieros, garantizando que el proyecto alcance su objetivo de mejorar la conectividad y movilidad en la franja férrea en desuso***"**

**SEGUNDA:** Para cubrir la modificación al alcance **ADICIONAR** el convenio de la siguiente manera:

($7.035.000.000) SIETE MIL TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS. Distribuidos así: La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia aportará la suma adicional de: ($6.700.000.000) SEIS MIL SETECIENTOS MILLONES PESOS. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA aportará en especie la suma de ($335.000.000) TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS, correspondientes al total de costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos del dinero a administrar

La adición propuesta corresponde al 10.45% del valor inicial del convenio expresado en SMMLV. Considerando la Modificación No. 1 y Modificación No. 2 el convenio sería adicionado por 20.19% en total expresado en SMMLV.

El valor total del contrato teniendo en cuenta la adición propuesta es de: $75.066.876.697 SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.

**TERCERA:** De acuerdo con el nuevo alcance, **PRORROGAR** el convenio en 01 (UN) AÑO Y 01 (UN) MES adicional al plazo inicialmente pactado.
Con la anterior prorroga la fecha de terminación corresponde al 26/01/2028.

**QUINTA.** Vigencia de las estipulaciones: Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no hayan sido modificadas por el presente documento.

**SEXTA.** Perfeccionamiento: La presente modificación se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes en la Plataforma Secop II y se entienden incorporadas a esta, todos los documentos que soportan su trámite y aprobación.

## 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Este convenio de incorporación de recursos, contrato N°4600017804 (IDEA 0356) Celebrado entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física – y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, se deriva del Convenio Interadministrativo N° 24IA111B2048, "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO, CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO.", la suscripción del presente convenio interadministrativo de Incorporación fue socializada y aprobada en el Comité Interno de Contratación y el Comité de orientación y Seguimiento. Así mismo fue aprobado por el Comité Directivo de Orientación, Seguimiento y Contratación del IDEA en sesión N°92 del 23 de diciembre de 2024. Adicionalmente, cada una de las partes justificó mediante acto administrativo la presente contratación dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Como objeto del convenio: AUNAR ESFUERZOS E INCORPORAR RECURSOS AL "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO, CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTODEL PLAN DE DESARROLLO", CELEBRADO CON EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA.

El convenio se firmó e inició en el mes de diciembre de 2024 y los movimientos que ha tenido, se reflejan en el Informe Ejecutivo y de Supervisión de Administración de recursos del fondo especial al 30 de noviembre del 2025 que remite el IDEA además de los compromisos presupuestales (labores) para contratar y el pago de los rendimientos.

### 2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Como contratos derivados tenemos en ejecución los siguientes:

Contrato interadministrativo 25IA111B2087 celebrado el día 26/02/2025 con Renting de Antioquia EICE – RENTAN, cuyo objeto es: *"Ejecución de Estudios y Diseños, destinados a la Estructuración en etapa*

*de prefactiblidad y factibilidad de APP, del Proyecto Vial Santuario – Providencia (Conexión Oriente – Norte), en el Departamento de Antioquia".*

El valor total del contrato es de $27.366.058.144 al cual, se le ha realizado un pago por un valor de $7.583.666.567, pago N°1 autorizado por la supervisión con el informe N°1 del mes de febrero – marzo que, según lo establecido en la forma de pago, el contratista entregó el Cronograma de Actividades a desarrollar dentro del contrato, Plan de trabajo e informe técnico preliminar de actividades a ejecutar.

El pago N°2 por un valor de $10.111.555.423 obedece al cobro del segundo desembolso al contratista, este se realiza en el mes del presente informe.

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 36.59% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 70% |

Para el presente informe, se presenta un avance en la ejecución física del 36.59%dado a que no se han entregado productos terminados y la ejecución financiera del total del contrato del 70%.

Es de precisar que, los pagos que se han realizado para la ejecución de dicho contrato se discriminan en sus informes de seguimiento a la supervisión del mismo.

Convenio Interadministrativo 25IA111B2170 es otro contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 07 de mayo de 2025 y tiene acta de inicio con fecha del 26 de mayo de 2025, cuyo objeto es: *"Contrato Interadministrativo de Mandato sin representación para la ejecución de Estudios y Diseños y Comparador Público Privado del proyecto vial La Ceja – La Pintada (Conexión Oriente – Sur), en el Departamento de Antioquia".*

El valor total del contrato es de $15.494.317.903.

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 89.39% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 27.73% |

Para el presente informe, se presenta un avance en la ejecución física del 89.39% y la ejecución financiera del total del contrato del 27.73%.

Convenio Interadministrativo 25AS111B2175 es otro contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 21 de abril del 2025, y tiene acta de inicio con fecha del 14 de mayo de 2025, cuyo objeto es: *"Articular y coordinar esfuerzos entre el Municipio de Murindó y el Departamento de Antioquia para la ejecución de actividades de conservación, mantenimiento y construcción de obras de infraestructura vial, así como la adquisición de maquinaria amarilla, para coadyuvar al correcto funcionamiento de las vías del municipio asociado".*

El valor total del contrato es de $1.908.085.319 de los cuales el aporte del Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física es de $1.878.203.546 y por parte del Municipio de Murindó aporta $29.881.773.

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 77.68% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 100% |

Teniendo en cuenta el periodo del presente informe, el convenio Interadministrativo 25AS111B2175 con el Municipio de Murindó presenta un avance en ejecución física del 77.68% según lo reportado en el último informe de seguimiento del Supervisor.

El porcentaje de ejecución financiera está ejecutado al 100% dado a que se realizó el desembolso correspondiente al aporte del Departamento el cual es de $1.878.203.546, el cual se pagó mediante fondo especial N.10000924 el 24/12/2024, en el IDEA por esta supervisión al contrato 4600017804 (IDEA 0356) de 2024 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS E INCORPORAR RECURSOS AL "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO, CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO•, CELEBRADO CON EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación 25MA111B2767 de 2025 contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 07 de noviembre del 2025, aún sin acta de inicio, cuyo objeto es: *"Llevar a cabo la estructuración del Sistema Integrado de Transporte Regional – SITR del Urabá Antioqueño".*

El valor total del contrato es de $5.293.087.840 CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/L que corresponden a: Recursos a administrar correspondientes a costos directos del proyecto $4,867,041,580 - (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA. PESOS M/L) + Honorarios del 8% sobre el valor de los recursos a administrar $358,022,067 - (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES VEINTIDÓS MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/L) + IVA sobre el valor de los honorarios $68,024,193 - (SESENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L)

Plazo del contrato 11 meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 16% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 45.98% |

Contrato Interadministrativo N° 25IA111B2394 de 2025 contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 06 de agosto de 2025, con acta de inicio del día 02 de octubre cuyo objeto es: *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SUELO DE SUBRASANTE, CARPETA DE RODADURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SEGMENTOS DE VIAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEJA, ENTRERRIOS, HELICONIA Y ANDES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".*

El valor total del contrato es MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($1.984.152.341)

En el mes de noviembre se realizó un desembolso por un valor de $363.253.121.

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 18.31% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 0% |

Contrato Interadministrativo 25IA111B2778 de 2025 contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 07/11/2025 aún sin acta de inicio, cuyo objeto es: *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA CORTA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE EL RETIRO – ANTIOQUIA".*

El valor total del contrato es SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($768.184.629,00) incluido IVA DEL DIECINUEVE POR CIENTO (19%) y una Factor Multiplicador de UNO PUNTO OCHENTA Y DOS (1.82).

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 0% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 0% |

Contrato Interadministrativo 25MA111B2715 de 2025 contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 29 de octubre de 2025, con acta de inicio del 02 de noviembre de 2025 cuyo objeto es: *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".*

El valor total del contrato es de Cinco mil seiscientos veintinueve millones setecientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y siete pesos M/L. (5.629.794.897) tributos incluidos, distribuidos así:

Recursos a administrar: Cinco mil treinta y tres millones trescientos ochenta y nueve mil cincuenta y nueve pesos M/L ($5.033.389.059).

Costos de coordinación asociados al proyecto: Ciento diecisiete millones doscientos veintisiete mil doscientos pesos M/L. ($117.227.200)
Honorarios (8%): Cuatrocientos dos millones seiscientos setenta y un mil ciento veinticuatro pesos M/L ($ 402.671.124)
IVA (19%) sobre los honorarios: Setenta y seis millones quinientos siete mil quinientos trece pesos ($ 76.507.513).

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 13% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 0% |

Se recibe por parte del INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA el Informe Ejecutivo y de Supervisión de Administración de recursos del fondo especial al 31 de octubre del 2025, Convenio N° DEPTO 4600017804, IDEA 0356 de 2024, Acta de incorporación 1 al Convenio Marco N° 24IA111B2048 DEPTO, IDEA 0355 de 2024 Proyectos de Infraestructura, Objeto: AUNAR ESFUERZOS E INCORPORAR RECURSOS AL "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO, CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO", CELEBRADO CON EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA.

Lo que se describe a continuación, da lugar a la ejecución financiera del Contrato Interadministrativo anteriormente mencionado:

**Valor inicial:** $ 61.473.101.839 Departamento $ 58.545.811. 275 en dinero e IDEA $ 2.927.290.564 en especie.

| **ADICIONES:** | **DEPARTAMENTO** | **IDEA (Especie)** |
|---|---|---|
| ADICIÓN N°1: **$193.562.398** | $184.345.141 | $9.217.257 |
| ADICIÓN N°2: **$6.365.212.460** | $6.062.107.105 | $303.105.355 |
| ADICIÓN n°3: **$7.035.000.000** | $6.700.000.000 | $335.000.000 |
| **VALOR TOTAL: $ 75.066.876.697** | $71.492.263.521 | $3.574.613.176 |

**Fecha de inicio:** 26 de diciembre de 2024

**Plazo inicial:** 24 meses sin superar el 31 de diciembre de 2026

**Prórrogas:** N/A

**Estado:** En ejecución

**Vencimiento:** 26 de diciembre de 2026

**Condiciones Financieras:**

**Rendimientos:** Treinta (30%) por ciento de la DTF NATA

**Costos de Operación:** El costo de operatividad equivale al cinco por ciento (5%) sobre el valor total de los recursos en dinero de las actas de incorporación a administrar, de los cuales el IDEA aporta la totalidad.

**Cantidad de cuentas**: 2

**Supervisor por el IDEA:** Germán Alberto Mejía Gallego de la Dirección de Convenios y Cooperación.

| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO<br>A DICIEMBRE 31 DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **SALDO MES ANTERIOR** | **MOVIMIENTO DEL MES** | **SALDO MES ACTUAL** |
| Valor recibido de capital | 64.792.263.521 | - | 64.792.263.521 |
| Valor recibido por rendimientos generados | 1.246.012.777 | 101.215.171 | 1.347.227.948 |
| **VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)** | 66.038.276.298 | 101.215.171 | 66.139.491.469 |
| Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados) | 59.594.754.671 | - | 59.594.754.671 |
| Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar) | 6.443.521.627 | 101.215.171 | 6.544.736.798 |
| **VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)** | 66.038.276.298 | 101.215.171 | 66.139.491.469 |
| Valor pagado | 13.046.800.049 | 13.900.758.783 | 26.947.558.832 |
| Valor pagado costos de operación por pagos | - | - | - |
| **VALOR TOTAL PAGOS => (C)** | 13.046.800.049 | 13.900.758.783 | 26.947.558.832 |
| Valor pagado de comisión por rendimientos | - | - | - |
| Retención fuente por rendimientos financieros | - | - | - |
| **SALDO CUENTA => (A - C)** | 52.991.476.249 | (13.799.543.612) | 39.191.932.637 |

Observaciones:

El convenio se firmó e inició en el mes de diciembre de 2024, en el mes de junio de 2025 tuvo una adición de recursos a administrar por 184,345,141, en este mes el convenio tuvo movimientos, los cuales han sido los compromisos presupuestales (labores) para contratar y modificaciones a estas y ya se están ordenar pagos además de los rendimientos, se realizaron los pagos solicitados. También en el mes de noviembre de 2025 se realizó una adición de recursos a administrar por 6,062,107,105, la cual se refleja en los ingresos. En el mes de diciembre de 2025 se adicionan recursos a administrar por $6.700.000.000 pero, el ingreso no se alcanzó a realizar en diciembre y quedara para enero de 2026 y por ello no se refleja el ingreso en este informe. **Este informe y los demás anexos que se envían con él, hacen parte del infirme de supervisión**.

## Ejecución del convenio

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 1
Hora : 16/08/04
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 0000000010000924 ACTA ICORP 1 AL MARCO 0355 PROY INFRAEST
Encargo Financiero 0000001000007096 FE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA
Cuenta - Encargo 0000000100015969 Saldo Cta: 38.988.223.275 Fecha : 1/02/26

Valor Encargo: 54.792.263.521 Recibido: 54.792.263.521 Reservado: 58.451.236.885 Ejecutado: 25.804.040.246
Saldo por ejecutar del encargo: 38.988.223.275 Saldo por comprometer del encargo: 6.341.027.436

| LABOR | DESCRIPCION | EJECUTOR | NIT | VR. COMPROMISO | VALOR PAGO | VR. DESEMBOLSAR | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000100223155 | ESTUD Y DIS, DESTINADOS A LA ESTRUCT EN ETAPA DE P | RENTAN | 900285704-4 | 27.371.480.679 | 17.981.708.203 | 9.469.772.476 | |
| | | | | | 7.583.666.567 | | 2025/03/28 |
| | | | | | 23.027.764 | | 2025/11/25 |
| | | | | | 183.458.449 | | 2025/12/18 |
| | | | | | 10.111.555.423 | | 2025/12/18 |
| 0000000100225326 | CONTR INTERADVO DE MANDATO SIN REPRES PARA LA EJEC | RENTAN | 900285704-4 | 1.984.152.341 | 363.253.121 | 1.620.899.220 | |
| | | | | | 363.253.121 | | 2025/12/18 |
| 0000000100225327 | ARTICULAR Y COORD ESFUERZOS MPIO DE MURINDO Y EL | MUNICIPIO DE MURINDO | 890984882-0 | 1.878.203.546 | 808.971.000 | 1.069.232.546 | |
| | | | | | 808.971.000 | | 2025/12/24 |
| 0000000100225328 | SE ANULA RESERVA SEGUN CR2025004912 DEL 12 DE AGOS | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0000000100226515 | CTO INTERADM DE MANDATO SIN REPRES PARA EJECUCION | RENTAN | 900285704-4 | 15.496.127.050 | 4.296.587.132 | 11.199.539.918 | |
| | | | | | 4.296.587.132 | | 2025/08/29 |
| 0000000100233648 | CTO INTERADM DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA RE | PROMOTORA FERROCARRIL DE | 900988911-1 | 5.660.000.000 | 0 | 5.660.000.000 | |
| 0000000100236507 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINIST AMBIENTAL FINANCIE | RENTAN | 900285704-4 | 768.184.629 | 0 | 768.184.629 | |
| 0000000100236508 | CONTRATO INTERADMVO DE MANDATO SIN REPRESENT PARA | PROMOTORA FERROCARRIL DE | 900988911-1 | 5.293.087.840 | 2.433.520.790 | 2.859.567.050 | |
| | | | | | 2.433.520.790 | | 2025/12/23 |
| | | TOTAL..... | | 58.451.236.885 | 25.804.040.246 | 32.647.195.639 | |

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 2
Hora : 16/08/04
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 0000000010000924 ACTA ICORP 1 AL MARCO 0355 PROY INFRAEST
Encargo Financiero 0000001000007097 FE RENDI PROYECTOS INFRAESTRUCTURA
Cuenta - Encargo 0000000100015970 Saldo Cta: 203.709.362 Fecha : 1/02/26

Valor Encargo: 1.347.227.948 Recibido: 1.347.227.948 Reservado: 1.143.518.586 Ejecutado: 1.143.518.586
Saldo por ejecutar del encargo: 203.709.362 Saldo por comprometer del encargo: 203.709.362

| LABOR | DESCRIPCION | EJECUTOR | NIT | VR. COMPROMISO | VALOR PAGO | VR. DESEMBOLSAR | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000100227561 | REND CONV 4600017804-0356 DE 2024 DE DIC 2024 AL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 400.822.632 | 400.822.632 | 0 | |
| | | | | | 4.000.226 | | 2025/04/10 |
| | | | | | 396.822.406 | | 2025/04/18 |
| 0000000100229325 | REND CONV 4600017804-0356-2024 DE ABR DE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 109.500.919 | 109.500.919 | 0 | |
| | | | | | 1.099.009 | | 2025/06/10 |
| | | | | | 108.801.910 | | 2025/06/18 |
| 0000000100229327 | REND CONV 4600017804-0356-2024 DE MAY DE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 111.689.450 | 111.689.450 | 0 | |
| | | | | | 1.116.895 | | 2025/06/10 |
| | | | | | 110.572.555 | | 2025/06/18 |
| 0000000100230118 | REND CONV 4600017804-0356-2024 DE JUN DE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 106.703.354 | 106.703.354 | 0 | |
| | | | | | 1.067.034 | | 2025/07/22 |
| | | | | | 105.636.320 | | 2025/07/22 |
| 0000000100232705 | REND CONV 4600017804-0356-2024 DE JUL DE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 111.018.801 | 111.018.801 | 0 | |
| | | | | | 1.110.188 | | 2025/08/15 |
| | | | | | 109.908.613 | | 2025/08/15 |
| 0000000100234287 | REND CONV 4600017804-0356-2024 DE AGO DE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 108.743.606 | 108.743.606 | 0 | |
| | | | | | 1.087.436 | | 2025/09/19 |
| | | | | | 107.656.170 | | 2025/09/19 |
| 0000000100234748 | REND CONV 4600017804-0356-2024 DE SEP DE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 96.520.768 | 96.520.768 | 0 | |
| | | | | | 965.208 | | 2025/10/07 |
| | | | | | 95.555.560 | | 2025/10/07 |
| 0000000100236761 | REND CONV 4600017804-0356-2024 DE OCT DE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 98.919.056 | 98.919.056 | 0 | |
| | | | | | 989.191 | | 2025/11/18 |
| | | | | | 97.929.865 | | 2025/11/18 |
| | | TOTAL..... | | 1.143.518.586 | 1.143.518.586 | 0 | |

Vemos a continuación, en el cuadro relacionado, la relación de capitalizaciones y comisiones realizadas a cuentas de depósitos ligadas a un convenio, reportadas por el supervisor del convenio por parte del IDEA.

01/02/26 09:22:19 PAGE 1

RELACION DE CAPITALIZACIONES Y COMISIONES REALIZADAS
A CTAS DE DEPOSITOS LIGADAS A UN CONVENIO
Rango de Fechas del Reporte AL

| CONVENIO | ENCARGO | CTA_DEPOS | CAPITALIZAC. TOTAL | ND CAPITAL. | COMISION POR PAGO | NC COMISION POR PAGO | COMISION POR INT. | NC COMISION POR INT. | RTEFTE | NC RTEFTE | FECHA REG INICIAL | FECHA REG FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000924 | 10000007096 | 00100015969 | 100,888,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251201 | 20251231 |
| 10000924 | 10000007097 | 00100015970 | 326,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251201 | 20251231 |
| | | FINAL TOTALS | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 101,215,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

*** END OF REPORT ***

IDEINPROAS/CONICAP

## 2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Constituir el Fondo Especial de Administración de Recursos | 100% | 100% | Creación del Fondo Identificación SIIF N°10000924 | El IDEA con la firma del Convenio 4600017804 creó el contrato en el Sistema de Identificación Financiera del IDEA. |
| Aperturar las cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial. | 100% | 100% | El Conveniante le dio cumplimiento total en el inicio del convenio. | N/A |
| Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del fondo especial. | 100% | 100% | informe de ejecución y de supervisión de administración de recursos del Fondo Especial. | El conveniente remite 1 informe de ejecución y de supervisión de administración de recursos del Fondo Especial, del mes del presente informe. |
| Generar los informes de Ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio | 2.7% | 35.1% | El conveniente remite 1 informe de ejecución y de supervisión de administración de recursos del Fondo Especial, del mes del presente informe. | El IDEA presentó el informe detallado de la ejecución del convenio.. |
| Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto convenio marco y sus actas de incorporación autorizados por el ordenador del Gasto del fondo especial. | 2.7% | 35.1% | Informe de ejecución y de supervisión de administración de recursos del Fondo Especial, del mes del presente informe. | Se realizan los pagos de:<br>ADICIÓN N°1: $193.562.398<br>ADICIÓN N°2: $6.365.212.460<br>ADICIÓN N°3 $7.035.000.000 |
| Presentar el acompañamiento y asesoría en la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo. | 2.7% | 35.1% | El Conveniante le da cumplimiento total a medida que se ejecuta el convenio | Se realizó acompañamiento para el cobro N°1 y a la adición N°1 y modificación N°1 y Adición N°2 y Adición N°3. |
| Presentar mensualmente al ordenador del gasto, con copia a la supervisión del convenio, los informes ejecutivos asociados a las actas de incorporación que se suscriban, con los soportes correspondientes. | 2.7% | 35.1% | El conveniente remite un informe de ejecución y de supervisión de administración de recursos del Fondo Especial, del mes del presente informe. | El IDEA presentó el informe detallado de la ejecución del convenio.. |
| Participar en las reuniones que le | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| sean convocadas, en el marco de su rol de administrador de los recursos. | | | | |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado**: Se realiza el cálculo del porcentaje, tomando como referencia que el plazo del convenio interadministrativo se suscribió por veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2027, luego de la prórroga realizada al convenio de un (1) año y un (1) mes dando por nueva fecha de terminación del 26/01/2028, razón por la cual, es necesario hacer la operación del avance de forma mensual, para ello, se divide el porcentaje del contrato (100%) por el tiempo del contrato (37) meses, entregando como resultado un porcentaje de avance mensual de 35.1%, dejando claridad que el mes anterior se reportó un porcentaje mayor 4.5% por que no se había realizado la prórroga.

Para el cálculo del porcentaje de ejecución de recursos, se tuvo en cuenta que el valor total del contrato se pagó al IDEA en su totalidad el día 26/12/2024, por un total de $58.545.811.275, por ello, su porcentaje de avance de ejecución financiera corresponde al porcentaje de avance general del presupuesto determinado para esta actividad, más las adiciones N°1 $193.562.398 y N°2 $6.365.212.460 y N°3 por un valor de $7.035.000.000 para un total de contrato de Setenta y cinco mil sesenta y seis millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos noventa y siete pesos M/L. ($75.066.876.697).

### 2.1.2.1. SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

### 2.1.2.2. SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

### 2.1.2.3. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

### 2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo constituido, que deben corresponder a un 30% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente (o de la tasa IBR plazo tres meses en el caso que desaparezca el indicador DTF), liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de | Cumple | Un Informe ejecutivo y de Supervisión de administración de recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe. | Se ha dado cumplimiento por parte del IDEA para el periodo del presente informe. El Idea reporta un valor de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial. Dichos rendimientos serán reintegrados de acuerdo con las instrucciones pactadas en el convenio. El IDEA realizará el respectivo informe financiero, señalando mensualmente los rendimientos generados por los recursos incorporados, los cuales se reflejarán en los extractos de cada una de las cuentas especiales y deben consignarse al Departamento de Antioquia, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. | | | $101.215.171 consignados a las cuentas correspondientes. |
| El IDEA presentará informes financieros mensuales de los recursos que sean incorporados al Fondo. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Un Informe ejecutivo y de Supervisión de administración de recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe. |
| Realizar los trámites financieros a que haya lugar para la administración de los recursos. | Cumple | Informe ejecutivo y de Supervisión de administración de recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe. | Conforme con las obligaciones a cargo del IDEA se constituyó un fondo cuenta especial para la administración de los recursos del convenio. |
| Mantener la información financiera independiente del resto de recursos del IDEA, y de los demás que se encuentre administrando. | Cumple | Informe ejecutivo y de Supervisión de administración de recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe. | Conforme con las obligaciones a cargo del IDEA se constituyó un fondo cuenta especial para la administración de los recursos del convenio. |
| Tener los recursos que se requieran con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de desembolsos | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Conforme con las obligaciones a cargo del IDEA se constituyó un fondo cuenta especial para la administración de los recursos del convenio. |
| Dejar registro detallado y documentado de todas las operaciones objeto de la administración, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop | El IDEA llevará el registro detallado y documentado de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| las políticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las partes. | | II | todas las operaciones objeto de la administración del fondo, conforme con las normas y procedimientos aplicables a las entidades financieras de su orden. |
| Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de los supervisores del convenio y/o los organismos de control y vigilancia. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Durante el período del presente informe, no se ha requerido la práctica de auditorías. |
| Aportar en especie el total del costo de operatividad, el cual está previsto en el cinco por ciento (5%) del total de los recursos entregados en administración en el fondo especial. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Informe ejecutivo y de Supervisión de administración de recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe. |
| Designar un supervisor con la experiencia y conocimiento en: la administración del fondo especial y el control y vigilancia al Convenio Interadministrativo marco; el cual prestará asesoría permanente al Secretaría de Infraestructura Física - Gobernación de Antioquia y será el enlace con el Departamento. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | El IDEA designó como supervisor del convenio a Germán Alberto Mejía Gallego. |
| Informar oportunamente sobre cualquier hecho que conozca y que pueda afectar el normal desarrollo del convenio interadministrativo marco. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Durante el período de este informe, no se han presentado hechos que puedan afectar el normal desarrollo del convenio interadministrativo. |
| Asistir a las reuniones que sean requeridas y/o programadas por Secretaría de Infraestructura Física - Gobernación de Antioquia durante la ejecución del convenio interadministrativo marco y solicitar las reuniones que considere necesarias para la correcta ejecución del mismo. | N/A | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Durante el período de este informe, no se realizaron reuniones. |
| Custodiar los recursos entregados para asegurar su protección contra cualquier acto de terceros que pueda disminuir su monto o impedir su utilización oportuna. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | El IDEA como institución financiera, cuenta con la |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | infraestructura de equipos, sistemas de información y demás requisitos para la administración del fondo especial. |
| Sujetarse a las políticas establecidas en materia de administración de los recursos, sin perjuicio de las disposiciones legales de carácter presupuestal, financiero y comercial, aplicables para la administración de los mismos. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | El IDEA como institución financiera, está sujeto a las políticas establecidas, en materia de administración de los recursos y las disposiciones legales de carácter presupuestal, financiero y comercial, aplicables. |
| El IDEA debe cumplir con las disposiciones consagradas en la Ley 594 de 2000 y con el Sistema Integrado de Gestión Implementado por el Departamento de Antioquia, el modelo estándar de control interno MECI, y El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para todos los documentos que se expidan o alleguen con ocasión al convenio interadministrativo. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | El IDEA históricamente cumple con las disposiciones consagradas en la Ley 594 de 2000 y con el Sistema Integrado de Gestión Implementado por el Departamento de Antioquia, el modelo estándar de control interno MECI, y El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para todos los documentos que se expidan o alleguen con ocasión al convenio interadministrativo. |
| El IDEA debe acreditar mensualmente y enviar al supervisor el certificado donde consta que el conveniante se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes a los sistemas de salud, | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | El IDEA históricamente cumple con la acreditación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, de conformidad con la ley | | | mensual de enviar a los supervisores el certificado donde consta que el conveniente se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, de conformidad con la ley. |
| Disponer de la imagen institucional del Departamento de Antioquia en la publicidad de las actividades objeto del presente convenio. | Cumple | Documentos tramitados | El IDEA históricamente cumple con este requerimiento. |
| Garantizar que se cumplan los lineamientos del Manual de Imagen del Departamento de Antioquia y contar con la asesoría y aprobación de la Oficina de Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional en la ejecución del convenio. | Cumple | Documentos tramitados | El IDEA históricamente cumple con este requerimiento. |
| Declarar y pagar todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, generados con ocasión de la administración y pago de los recursos que formen parte del fondo especial. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | El IDEA históricamente cumple con este requerimiento. |
| Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia. | Cumple | Manual de Seguridad y Salud en el trabajo del IDEA | El IDEA históricamente cumple con este requerimiento. |
| Generar las disponibilidades o reservas de los recursos para soportar los contratos derivados y sus pagos de ejecución. | Cumple | Informe ejecutivo y de Supervisión de administración de recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe | Informe ejecutivo y de Supervisión de administración de recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto marco y sus actas de incorporación autorizados por el ordenador del gasto del Secretaría de Infraestructura Física - Gobernación de Antioquia. El plazo para el pago estará supeditado a la verificación de los beneficiarios de éste en las listas restrictivas y que dicha verificación no presente alertas que impidan la realización del mismo dentro de los tiempos establecidos. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Se cumple con la obligación cuando se aprueban los pagos por parte de los supervisores |
| Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente convenio marco, son de uso exclusivo y propiedad del Departamento de Antioquia y el IDEA. La información utilizada para el desarrollo del presente convenio es de carácter confidencial. La información confidencial deberá ser guardada por el conveniante y utilizarse exclusivamente en relación con el propósito que ha señalado. El conveniante ejecutor tendrá los siguientes deberes en relación con la información confidencial que reciba o a la que tenga acceso: a) Mantener dicha información de manera confidencial y privada. b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer. c) Informar de la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las personas que tengan acceso a ella. | Cumple | En los documentos aportados para el convenio | El IDEA históricamente cumple con este requerimiento. |
| El Conveniante, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: a). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; b). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. | Cumple | En los documentos aportados para el convenio | El IDEA históricamente cumple con este requerimiento. |
| Las partes manifiestan no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. Así mismo, se comprometen a verificar que el personal del que dispongan para la ejecución del objeto del convenio, no presente antecedentes fiscales, penales, disciplinarios, contravencionales ni deudas alimentarias y no se encuentre incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. | Cumple | En los documentos aportados para el convenio | El IDEA históricamente cumple con este requerimiento. |
| Las demás que se deban cumplir de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se | N/A | N/A | Durante el periodo de este informe, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| deriven de la naturaleza del convenio a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento. | | | no se ha requerido la asignación de obligaciones adicionales a cargo del conveniante. |

**2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniante que para el caso correspondan. | Cumple | Comprobantes de egresos | Comprobantes de egresos<br><br>N° 3000252487<br>Valor $9.000.000.000<br><br>N° 3000252489<br>Valor $9.000.000.000<br><br>N°3000252492<br>Valor $9.000.000.000<br><br>N° 3000252499<br>Valor $3.688.004.834<br><br>N° 3000252494<br>Valor $9.000.000.000<br><br>N° 3000252496<br>Valor $9.000.000.000<br><br>N° 3000252497<br>Valor $9.000.000.000<br><br>N° 3000252500<br>Valor $371.480.679<br><br>N°3000252501<br>Valor $486.325.762<br><br>Desembolso Adición N°1<br><br>Comprobante N° 300254857<br>Valor $184.345.141.<br><br>Desembolso Adición N°2<br><br>Recibo a satisfacción N° 5000253483 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Valor $2.883.592.490<br><br>Recibo a satisfacción N°5000253482<br>Valor $3.178.514.615<br><br>Desembolso Adición N°3<br><br>Recibo a satisfacción N° 500257294 |
| Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Se designó supervisión mediante oficio con Radicado 2024020062753. |
| Exigir al conveniante la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio, de conformidad con el alcance y las obligaciones del Convenio. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | El convenio se encuentra en su etapa de ejecución. |
| Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del Convenio marco. | Cumple | Actas e Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Durante el período de este informe, no se llevaron a cabo reuniones. |
| Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | El convenio se encuentra en su etapa de ejecución. |
| Realizar el seguimiento y la evaluación del programa, de acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones del convenio. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Informes de seguimiento. |
| Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por el IDEA. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Se recibe y se verifica el Informe ejecutivo y de Supervisión de administración de recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe. |
| Asistir a las reuniones que sean necesarias para la buena marcha y ejecución del convenio. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Durante el período de este informe, no se llevaron a cabo reuniones. |
| Incluir al IDEA en la promoción y publicidad del proyecto, como aportante de recursos en especie por la administración del Fondo Especial y por otros eventuales recursos. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Se incluiye al IDEA en la promoción y publicidad del proyecto, como aportante de recursos en especie por la administración del Fondo Especial y por otros eventuales recursos. |
| Ordenar al IDEA para que en el Sistema Integrado de Información | Cumple | Informe ejecutivo y de Supervisión de | Informe ejecutivo y de Supervisión de administración de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Financiera SIIF, genere los respaldos presupuestales – reservas laborales o disponibilidades necesarias para amparar los procesos de contratación derivada del presente Convenio Interadministrativo Marco, para lo cual el ordenador del gasto del Fondo Especial constituido, deberá indicar, mediante oficio formal y radicado el en IDEA, la siguiente información: El número del Fondo Especial (Acta de incorporación) en el SIIF, N° de encargo y su cuenta, objeto, plazo y valor. | | administración de recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe | recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe. |
| Adelantar por su cuenta y riesgo los procesos de selección (Estudios previos, contrato y demás), requeridos para la ejecución del proyecto correspondiente al alcance del Convenio Interadministrativo Marco y sus respectivas actas de incorporación. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Se adelantaron los requerimientos para los contratos y para la ejecución del proyecto correspondiente al alcance del Convenio Interadministrativo Marco y sus respectivas actas de incorporación. |
| Hacer la supervisión o Interventoría a la contratación derivada con cargo a este Fondo Especial. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Contrato 25IA111B2087, contrato derivado de este convenio, designación de supervisión bajo radicado N°2025020007529.<br><br>Convenio Interadministrativo 25AS1112175, contrato derivado de este convenio, designación de supervisión bajo radicado N°2025020016846.<br><br>Contrato Interadministrativo N°25IA111B2394 celebrado el día 6 de agosto con Renting de Antioquia EICE – RENTAN.<br><br>Contrato Interadministrativo de mandato sin representación N°25IA111B2170 de 2025, celebrado el día 07 de mayo con Renting de Antioquia EICE – RENTAN.<br><br>Contrato Interadministrativo de mandato sin representación N°25MA111B2767, celebrado el |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 7 de noviembre de 2025 con La Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S<br><br>Contrato Interadministrativo N°25IA111B2778, celebrado el día 7 de noviembre de 2025 con Renting de Antioquia EICE – RENTAN.<br><br>Contrato Interadministrativo de mandato sin representación N°25MA111B2715 celebrado el día 27 de octubre de 2025 con La Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. |
| Ordenar al IDEA los pagos que se requieran en virtud de la ejecución de la contratación derivada del presente Convenio Interadministrativo Marco, , a través de oficio formal, suscrito por el ordenador del gasto del Fondo Especial y radicado en el IDEA, en el cual deberá indicar: El número del convenio, encargo, cuenta y labor, además de remitir los soportes documentales necesarios para su realización que serán: Factura a nombre del beneficiario, recibo a satisfacción del servicio por el supervisor del contrato, pago parafiscales y seguridad social certificado por el revisor fiscal (en caso de estar obligados a tenerlo) o el representante legal si es persona jurídica no obligada a revisoría fiscal; si es persona natural la planilla de pago del mes, Informe de actividades, RUT, si es el primer pago, Certificación bancaria de la cuenta donde se consigna, y demás certificaciones de Ley que sean procedentes para materializar la respectiva ordenación. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Se ordenan los pagos requeridos por los contratistas de contratos derivados luego de su debida aprobación por parte de esta supervisión. |
| Exigir a los contratistas de los diferentes contratos que se realicen para la ejecución del presente Convenio Interadministrativo Marco y/o las Actas de Incorporación que se | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Se recibe por parte de los contratistas derivados de este convenio, las garantías correspondientes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| suscriban; las garantías que correspondan, en las que deberá figurar la Secretaría de Infraestructura Física – Departamento de Antioquia, como asegurados y beneficiarios. | | | |
| Mantener indemne al IDEA frente a cualquier reclamación que se realice por parte de cualquier persona natural o jurídica, organismo de control o autoridad judicial o administrativa con ocasión de la ejecución de los contratos derivados de diseño, obra y/o interventoría y demás contrataciones que se realicen con cargo a la presente acta de incorporación. | Cumple | Informes de seguimiento a la contratación / Secop II | Durante el período de este informe, no se ha requerido la asignación de obligaciones adicionales a cargo del Departamento de Antioquia. |

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO(S) si aplica** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $58.545.811.275 | $2.927.290.564 | $0 | $61.473.101.839 |
| 2. Adición N°1 | $184.345.141 | $9.217.257 | $0 | $193.562.398 |
| 3. Adición N°2 | $6.062.107.105 | $303.105.355 | $0 | $6.365.212.460 |
| 4. Adición N°3 | $6.700.000.000 | $335.000.000 | $0 | $7.035.000.000 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $71.492.263.521 | $3.574.613.176 | $0 | $75.066.876.697 |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $71.492.263.521 | $3.574.613.176 | $0 | $75.066.876.697 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $71.492.263.521 | $3.574.613.176 | $0 | $75.066.876.697 |
| 7. Recursos ejecutados | $71.492.263.521 | $3.574.613.176 | $0 | $75.066.876.697 |
| 8. Recursos no ejecutados | $0 | $0 | $0 | $0 |

Con este informe de supervisión N°14 se da cuenta del desembolso del 100% de los recursos del Departamento por $58.545.811.275 que representan el 95% de los recursos comprometidos, que se encuentran comprometidos en Certificados de Labores por $58.545.811.275,00 para adelantar los procesos precontractuales de los contratos derivados. Por parte del IDEA se da cuenta como parte de sus compromisos en especie la suma de $2.927.290.564,00, que representan el 5% de los recursos comprometidos para un total de $61.473.101.839,00, según el seguimiento realizado descrito en este informe de supervisión, además, se da cuenta del desembolso de la adición N°1 por un valor de ciento

ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y un pesos $184.345.141 y por parte del IDEA se da cuenta como parte de sus compromisos en especie la suma de $9.217.257 destinados a incluir y costear el componente de interventoría en el proyecto "Actividades de mejoramiento del suelo y obras complementarias en segmentos de vías ubicadas en los municipios de La Ceja, Entrerríos, Heliconia y Andes en el Departamento de Antioquia". El cual se encuentra dentro del alcance del convenio suscrito con el IDEA, esta adición se desembolsó al IDEA el día 26 de junio bajo comprobante de egreso N°300254857, se da cuenta además del desembolso de la adición N°2 por un valor de $6.062.107.105 y por parte del IDEA se da cuenta como parte de sus compromisos en especie la suma de $303.105.355 destinados a MODIFICACION No.2. Las partes acuerdan MODIFICAR la Cláusula segunda - Alcance del objeto - del convenio interadministrativo para incluir los siguientes proyectos:

1. **"ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL – SITR DEL URABÁ ANTIOQUEÑO"**, esto de acuerdo con las especificaciones descritas en los estudios previos de ese proyecto que se encuentran como anexo No. 1 del presente otrosí y hacen parte integral del mismo.

2. **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA CORTA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE EL RETIRO – ANTIOQUIA"** esto de acuerdo con las especificaciones descritas en los estudios previos de ese proyecto que se encuentran como anexo No. 2 del presente otrosí y hacen parte integral del mismo.

Se da cuenta además del otrosí N°3:

**MODIFICAR** la CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO de manera que se agrega el siguiente texto:
"*ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LOS TRAMOS 3-9 DEL CORREDOR DE CICLOCAMINABILIDAD EN LA ANTIGUA VÍA FÉRREA EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESTRELLA, CALDAS, AMAGÁ, ANGELÓPOLIS Y FREDONIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*"

*ALCANCE: administración integral para la ejecución de las obras en los tramos 3 al 9 del Corredor de Ciclocaminabilidad, ubicados en la antigua vía férrea de los municipios de La Estrella, Caldas, Amagá, Angelópolis y Fredonia. Su función principal es la representación del Departamento de Antioquia en la coordinación de los recursos técnicos, humanos y financieros, garantizando que el proyecto alcance su objetivo de mejorar la conectividad y movilidad en la franja férrea en desuso.*

**SEGUNDA:** Para cubrir la modificación al alcance **ADICIONAR** el convenio de la siguiente manera:

($ 7.035.000.000) SIETE MIL TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS. Distribuidos así: La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia aportará la suma adicional de: ($ 6.700.000.000) SEIS MIL SETECIENTOS MILLONES PESOS. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA aportará en especie la suma de ($ 335.000.000) TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS, correspondientes al total de costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos del dinero a administrar

La adición propuesta corresponde al 10.45% del valor inicial del convenio expresado en SMMLV. Considerando la Modificación No. 1 y Modificación No. 2 el convenio sería adicionado por 20.19% en total expresado en SMMLV.

El valor total del contrato teniendo en cuenta la adición propuesta es de: $ 75.066.876.697 SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.

**TERCERA:** De acuerdo con el nuevo alcance, **PRORROGAR** el convenio en 01 (UN) AÑO Y 01 (UN) MES adicional al plazo inicialmente pactado.

Con la anterior prorroga la fecha de terminación corresponde al 26/01/2028.

Del presente convenio de incorporación de recursos se derivan los siguientes contratos:

Del Contrato derivado N° 25IA111B2087, se puede observar como recurso ejecutado el desembolso del pago N°1 por un valor de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L $7.583.666.567.

Convenio Interadministrativo 25AS111B2175 es otro contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 21 de abril del 2025, y tiene acta de inicio con fecha del 14 de mayo de 2025, cuyo objeto es: *"Articular y coordinar esfuerzos entre el Municipio de Murindó y el Departamento de Antioquia para la ejecución de actividades de conservación, mantenimiento y construcción de obras de infraestructura vial, así como la adquisición de maquinaria amarilla, para coadyuvar al correcto funcionamiento de las vías del municipio asociado".*

El valor total del contrato es de $1.908.085.319 de los cuales el aporte del Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física es de $1.878.203.546 y por parte del Municipio de Murindó aporta $29.881.773.

Pago N°1 $808.971.000.

Convenio Interadministrativo 25IA111B2170 es otro contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 07 de mayo de 2025 y tiene acta de inicio con fecha del 26 de mayo de 2025, cuyo objeto es: *"Contrato Interadministrativo de Mandato sin representación para la ejecución de Estudios y Diseños y Comparador Público Privado del proyecto vial La Ceja – La Pintada (Conexión Oriente – Sur), en el Departamento de Antioquia"*, se puede observar como recurso ejecutado el desembolso del pago N°1 por un valor de $4.296.587.132.

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación 25MA111B2767 de 2025 contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 07 de noviembre del 2025, aún sin acta de inicio, cuyo objeto es: *"Llevar a cabo la estructuración del Sistema Integrado de Transporte Regional – SITR del Urabá Antioqueño".* El valor total del contrato es de $5.293.087.840.
Pago N°1 $2.433.520.790.

Contrato Interadministrativo N° 25IA111B2394 de 2025 contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 06 de agosto de 2025, con acta de inicio del día 02 de octubre cuyo objeto es:

*"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SUELO DE SUBRASANTE, CARPETA DE RODADURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SEGMENTOS DE VIAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEJA, ENTRERRIOS, HELICONIA Y ANDES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".*

El valor total del contrato es MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($1.984.152.341)
Pago N°1 $363.253.121.

Contrato Interadministrativo 25IA111B2778 de 2025 contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 07/11/2025 aún sin acta de inicio, cuyo objeto es: *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA CORTA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE EL RETIRO – ANTIOQUIA".*

El valor total del contrato es SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($768.184.629,00) incluido IVA DEL DIECINUEVE POR CIENTO (19%) y una Factor Multiplicador de UNO PUNTO OCHENTA Y DOS (1.82).

Contrato Interadministrativo 25MA111B2715 de 2025 contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 29 de octubre de 2025, con acta de inicio del 02 de noviembre de 2025 cuyo objeto es: *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".*

El valor total del contrato es de Cinco mil seiscientos veintinueve millones setecientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y siete pesos M/L. (5.629.794.897) tributos incluidos.

### 4.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El valor del convenio corresponde a la suma de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($61.473.101.839).

La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia aportará la suma de: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ($58.545.811.275) respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055203 de 2024.

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA aportará en especie la suma de: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($2.927.290.564), correspondientes a el total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos a administrar.

## 2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 3 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

### FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

El desembolso se efectuó en una única entrega posterior a la firma del acta de inicio del presente Convenio Interadministrativo de incorporación N°1, una vez se completaron los trámites internos necesarios. Los recursos del convenio incluyendo sus adiciones fueron transferidos a la cuenta bancaria que indicó el IDEA en su cuenta de cobro y de allí fueron trasladados a las cuentas especiales que se aperturaron para el manejo de los Fondos Especiales, conforme a los requisitos de la constitución del fondo de administración de recursos.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Comprobantes de egresos<br><br>N° 3000252487<br>Valor $9000000000 |
| Valor Inicial Aporte del Depto | 26/12/2024 | $58.545.811.275 | | $0 | | $58.545.811.275 | N° 3000252489<br>Valor $9000000000<br><br>N°3000252492<br>Valor $9000000000<br><br>N° 3000252499<br>Valor $3688004834<br><br>N° 3000252494<br>Valor $9000000000<br><br>N° 3000252496<br>Valor $9000000000<br><br>N° 3000252497<br>Valor $9000000000<br><br>N° 3000252500<br>Valor $371480679<br><br>N°3000252501<br>Valor $486325762 |
| Aporte IDEA en especie | 26/12/2024 | $2.927.290.564 | | $0 | | $2.927.290.564 | |
| Pago No.1 / Desembolso | 26/12/2024 | | $58.545.811.275 | $0 | $58.545.811.275 | $0 | |
| Adición N°1 Aporte del Depto. | 26/06/2025 | $184.345.141 | | | | $184.345.141 | N° 300254857<br>Valor $184.345.141 |
| Adición N°1 Aporte del IDEA | 27/06/2025 | $9.217.257 | | | | $9.217.257 | |
| Pago No.2 / Desembolso | 02/07/2025 | | $184.345.141 | $0 | $184.345.141 | $0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adición N°2 Aporte del Depto. | 06/11/2025 | $6.062.107.105 | | | | $6.062.107.105 | N° 300254857 Valor $184.345.141<br><br>N°5000253483 Valor: $2.883.592.490<br><br>N°5000253482 Valor $3.178.514.615 |
| Adición N°2 Aporte del IDEA | 06/11/2025 | $303.105.355 | | | | $303.105.355 | |
| Pago No.3 / Desembolso | 06/11/2025 | | $6.062.107.105 | $0 | $6.062.107.105 | $0 | |
| Adición N°3 Aporte del Depto. | 29/12/2025 | $6.700.000.000 | | | | $6.700.000.000 | |
| Adición N°3 Aporte del IDEA | 29/12/2025 | $335.000.000 | | | | $335.000.000 | |
| Pago No.4 / Desembolso | | | $6.700.000.000 | $0 | $6.700.000.000 | | |
| TOTALES | | $75.066.876.697 | $71.492.263.521 | $0 | $71.492.263.521 | $75.066.876.697 | |

| **ADICIONES:** | **DEPARTAMENTO** | **IDEA (Especie)** |
|---|---|---|
| ADICIÓN N°1: **$193.562.398** | $184.345.141 | $9.217.257 |
| ADICIÓN N°2: **$6.365.212.460** | $6.062.107.105 | $303.105.355 |
| ADICIÓN N°3 **$7.035.000.000** | $6.700.000.000 | $335.000.000 |
| **VALOR TOTAL: $ 75.066.876.697** | $71.492.263.521 | $3.574.613.176 |

En el periodo del presente informe se da cuenta de que se realizaron los trámites para la Adición N°3 y al convenio, la misma que se desembolsa en el mismo mes.

El valor total del convenio interadministrativo con la adición N°1, la adición N°2 y la adición N°3 es de $75.066.876.697, de los cuales se describe a continuación cada contrato derivado y los montos que se han desembolsado y como se han ido autorizando los pagos de cada uno de ellos.

Contrato Interadministrativo 25IA111B2087 - Objeto: Ejecución de Estudios y Diseños, destinados a la Estructuración en etapa de perfectibilidad y factibilidad de APP, del Proyecto Vial Santuario – Providencia (Conexión Oriente – Norte), en el Departamento de Antioquia.

El valor total del contrato es de $27.366.058.144 al cual, se le ha realizado un pago por un valor de $7.583.666.567, pago N°1 autorizado por la supervisión con el informe N°1 del mes de febrero – marzo que, según lo establecido en la forma de pago, el contratista entregó el Cronograma de Actividades a desarrollar dentro del contrato, Plan de trabajo e informe técnico preliminar de actividades a ejecutar.

El pago N°2 por un valor de $10.111.555.423 obedece al cobro del segundo desembolso al contratista, este se realizó en el mes de diciembre.

Relación de desembolsos del contrato:

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 26/02/2025 | $27.366.058.144 | | $0 | $27.366.058.144 | $27.366.058.144 | N/A |
| Adiciones | N/A | N/A | | | | N/A | |
| Pago No.1 / Desembolso | 26/03/2025 | | $7.583.666.567 | $0 | $7.583.666.567 | $19.782.391.577 | |
| Pago No.2 / Desembolso | 12/2025 | | $10.111.555.423 | $0 | $10.111.555.423 | $9.670.836.154 | |
| TOTALES | | $27.366.058.144 | $17.695.221.990 | $0 | $9.670.836.154 | $9.670.836.154 | |

Para el periodo del presente informe se cuenta con lo reportado del primer pago del contrato Interadministrativo 25IA111B2087 con el contratista RENTING DE ANTIOQUIA – EICE- que por acta de inicio comenzó el 26 de febrero de 2025; el cual es un derivado del convenio de incorporación de recursos, contrato N°4600017804 (IDEA 0356) Celebrado entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física – y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA.

Convenio Interadministrativo 25IA111B2170 es otro contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 07 de mayo de 2025 y tiene acta de inicio con fecha del 26 de mayo de 2025, cuyo objeto es: Contrato Interadministrativo de Mandato sin representación para la ejecución de estudios y diseños y comparador público privado del proyecto vial La Ceja – La Pintada (conexión Oriente – Sur), en el Departamento de Antioquia.

El valor total del contrato es de $15.494.317.903.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 07/05/2025 | $15.494.317.903 | | $0 | | $15.494.317.903 | En trámite |
| Adiciones | N/A | N/A | | | | N/A | |
| Pago No.1 / Desembolso | 30/06/2025 | | $4.296.587.132 | | | $11.197.730.771 | |
| TOTALES | | $15.494.317.903 | $4.296.587.132 | $0 | | $11.197.730.771 | |

El primer desembolso del derivado anteriormente descrito equivale al 30% del valor de los costos directos del proyecto, previa presentación de los siguientes documentos y aprobación del supervisor del contrato:

- Cronograma de actividades a desarrollar dentro del contrato.
- Plan de trabajo
- Informe técnico preliminar de actividades a ejecutar.

Desembolsos autorizados para la ejecución de los dineros en la cuenta conjunta del IDEA se pueden verificar en los informes de seguimiento a la supervisión del contrato en mención.

Convenio Interadministrativo 25AS111B2175 - Objeto: "Articular y Coordinar esfuerzos entre el Municipio de Murindó y el Departamento de Antioquia para la ejecución de actividades de conservación,

mantenimiento y construcción de obras de infraestructura vial, así como la adquisición de maquinaria amarilla, para coadyuvar al correcto funcionamiento de las vías del municipio asociado"

Relación de desembolsos del contrato:

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 21/04/2025 | $1.878.203.546 | | $0 | $1.878.203.546 | $1.878.203.546 | En trámite |
| Valor Inicial aporte Municipio | 21/04/2025 | $29.881.773 | | $0 | $29.881.773 | $29.881.773 | En trámite |
| Adiciones | N/A | N/A | | | | N/A | |
| TOTALES | | $1.908.085.319 | $0 | $0 | | $1.908.085.319 | |

No hay movimientos en el mes del presente informe.

Contrato Interadministrativo N° 25IA111B2394 de 2025 contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 06 de agosto de 2025, con acta de inicio del día 02 de octubre cuyo objeto es: *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SUELO DE SUBRASANTE, CARPETA DE RODADURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SEGMENTOS DE VIAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEJA, ENTRERRIOS, HELICONIA Y ANDES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".*

El valor total del contrato es MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($1.984.152.341)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial aporte Depto | 06/08/2025 | $1.984.152.341 | | $0 | $1.984.152.341 | $1.984.152.341 | En trámite |
| Adiciones | N/A | N/A | | | | N/A | |
| Pago No.1 / Desembolso | | | $363.253.121 | | | | |
| TOTALES | | $1.984.152.341 | $363.253.121 | $0 | $1.984.152.341 | $1.620.899.220 | |

Contrato Interadministrativo 25MA111B2715 de 2025 contrato derivado del convenio 4600017804, firmado el día 29 de octubre de 2025, con acta de inicio del 02 de noviembre de 2025 cuyo objeto es: *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".*

El valor total del contrato es de Cinco mil seiscientos veintinueve millones setecientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y siete pesos M/L. (5.629.794.897) tributos incluidos.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial aporte Depto | 29/10/2025 | $5.629.794.897 | | $0 | $5.629.794.897 | $5.629.794.897 | En trámite |
| Adiciones | N/A | N/A | | | | N/A | |
| TOTALES | | $5.629.794.897 | $0 | $0 | $5.629.794.897 | $5.629.794.897 | |

## 4 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación de parafiscales del 10/12/20252025, acreditando que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del conveniante.

## 5 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas e inicialmente pactadas | Retrasos en los procesos propios del contrato | Contratante y Contratista | Controlar y realizar una verificación ajuste legal sobre el contexto regulatorio en el cual se ejecuta el contrato | Permanente.<br><br>Fecha de iniciación y terminación. Desde el inicio del contrato hasta la culminación de este.<br>Metodología del monitoreo del riesgo: Análisis legal detallado del objeto contractual, sus partes y sus obligaciones | Acompañamiento permanente |
| Idoneidad del | Impacto negativo | Contratista | Verificar la | Mensual a la | Acompañamient |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| personal contratista, el contratista debe garantizar la experiencia en los campos profesionales del Derecho, Administración y Financiera | en el logro de los objetivos de la Gobernación de Antioquia y en consecuencia sobre la imagen de la Entidad. | | idoneidad del personal contratado | entrega de facturación.<br><br>Fecha de iniciación y terminación. Desde el inicio del contrato hasta la culminación de este.<br>Metodología del monitoreo del riesgo: Análisis detallado del objeto contractual, sus partes y sus obligaciones | o permanente |
| Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay ocurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales. | Reprocesos que atrasan el cumplimiento en la entrega de informes y en consecuencia el incumplimiento del contrato. | Contratante y Contratista | Establecer canales claros de comunicación, con responsables de cada entidad para el Departamento de Antioquia y para el IDEA, para el mejoramiento de la coordinación interinstitucional. | Permanente.<br><br>Fecha de iniciación y terminación. Desde el inicio del contrato hasta la culminación de este.<br>Metodología del monitoreo del riesgo: Revisión permanente de los equipos entregados al contratista. | Acompañamiento permanente |
| Disponibilidad del equipo humano idóneo en el momento en el momento oportuno para la Supervisión del Convenio. | Retrasos en los procesos propios del contrato. | Contratante | Control permanente del estado del proceso frente al personal encargado de la supervisión del Convenio y la implementación de estrategias de gestión oportuna para resolver o programar actividades. | Semanalmente.<br><br>Fecha de iniciación y terminación. Desde el inicio del contrato hasta la culminación de este.<br>Metodología del monitoreo del riesgo: Verificación de | Acompañamiento permanente |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | cronogramas y seguimiento al avance del contrato, consulta permanente de la información. | |
| Revelación de la información confidencial relacionada con el contrato a un tercero no autorizado, manejo indebido de la información obtenida en ocasión de la ejecución del contrato. | Imagen desfavorable de la entidad, debiendo asumir las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que se obtenga en ocasión de la ejecución del contrato | Contratante y Contratista | Establecer el tipo de información que tiene reserva, teniendo claridad en las consecuencias de tipo legal en que incurre al dar un mensaje inadecuado a la información de la entidad. | Permanente.<br><br>Fecha de iniciación y terminación. Desde el inicio del contrato hasta la culminación de este.<br>Metodología del monitoreo del riesgo: Monitoreo constante sobre el tema en observaciones, comunicaciones y medios de comunicación que se manejen en la entidad. | Acompañamiento permanente |
| Incumplimiento en las obligaciones del IDEA dentro del contrato Interadministrativo, ante las directrices impartidas por el Departamento. | Retraso en los procesos con terceros y contratos vinculados al desarrollo del Proyecto | Contratista | Definir y concertar previamente las fechas, la forma y los documentos necesarios que deban presentarse para realizar el pago de forma oportuna. | Permanente.<br><br>Fecha de iniciación y terminación. Desde el inicio del contrato hasta la culminación de este.<br>Metodología del monitoreo del riesgo: Monitoreo constante sobre el tema de observaciones, comunicaciones y medios de comunicación | Acompañamiento permanente |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | que se manejen la entidad. | |
| Mala administración de recursos | Uso inadecuado, desvío de fondos o errores en la asignación presupuestaria. | Contratista | Crear políticas claras para la asignación y uso de los recursos.<br><br>Requerir la aprobación de múltiples niveles jerárquicos para decisiones significativas del gasto.<br><br>Realizar auditorías regulares para verificar el uso correcto de los recursos. | Permanente.<br><br>Fecha de iniciación y terminación. Desde el inicio del contrato hasta la culminación de este.<br>Metodología del monitoreo del riesgo: Monitoreo constante sobre el tema de observaciones, comunicaciones y medios de comunicación que se manejen en la entidad. | Acompañamiento permanente |
| Falta de controles Financieros | Fallas en el flujo de caja o procesos administrativos que generen incumplimientos en los tiempos de pago.<br><br>Ausencia de mecanismos para garantizar la trazabilidad y la transparencia en el manejo de los recursos. | Contratista | Usar herramientas de gestión contable y financiera que permitan el seguimiento de cada transacción.<br><br>Generar reportes automáticos y realizar auditorías periódicas de los datos registrados.<br><br>Publicar informes periódicos de ejecución presupuestaria, accesibles a las partes interesadas. | Permanente.<br><br>Fecha de iniciación y terminación. Desde el inicio del contrato hasta la culminación de este.<br>Metodología del monitoreo del riesgo: Monitoreo constante sobre el tema de observaciones, comunicaciones y medios de comunicación que se manejen en la entidad | Acompañamiento permanente |

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | N/A | N/A . |

## 6 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

## 7 ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

## 8 ANEXOS

1. Informe ejecutivo y de Supervisión de administración de recursos del Fondo Especial IDEA, para el mes del presente informe.
2. Parafiscales IDEA.

Para constancia, se firma la presente acta el: 16 ENE 2026

**JULIÁN ALBERTO RAMÍREZ CORTÉS**
SUPERVISOR
Rol administrativo (Coordinador) y financiero

**SEBASTIÁN CASTAÑO GÓMEZ**
SUPERVISOR
Rol técnico

| | | |
|---|---|---|
| IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia | **INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES** | Versión: 1<br>F-CC-005<br>Fecha: 17/06/2025 |

**A DICIEMBRE 31 DE 2025**

| | | |
|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** | |
| **CONVENIO N°:** | **DEPTO 4600017804, IDEA 0356 de 2024** | |
| **CONVENIO SIIF N°:** | **10000924** | |
| **NOMBRE DEL CONVENIO:** | **ACTA DE INCORPORACIÓN 1 AL MARCO 0355 DE 2024 PROYECTOS INFRAESTRUCTURA** | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS E INCORPORAR RECURSOS AL "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO, CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO", CELEBRADO CON EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA. | |
| **VALOR INICIAL:** | **$ 61.473.101.839** | DEPARTAMENTO $ 58.545.811.275 EN DINERO E IDEA $2.927.290.564 EN ESPECIE |

| **ADICIONES:** | | DEPARTAMENTO | IDEA (Especie) |
|---|---|---|---|
| ADICIÓN N°1: | **$ 193.562.398** | 184.345.141 | 9.217.257 |
| ADICIÓN N°2: | **$ 6.365.212.460** | 6.062.107.105 | 303.105.355 |
| ADICIÓN N°3: | **$ 7.035.000.000** | 6.700.000.000 | 335.000.000 |
| **VALOR TOTAL :** | **$ 75.066.876.697** | 71.492.263.521 | 3.574.613.176 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 26 DE DIC DE 2024 |
| **PLAZO INICIAL:** | 24 meses sin superar el 31 de diciembre de 2026 |
| **PRÓRROGAS:** | N/A |
| PRÓRROGA N°1: | Un año y un mes |
| **ESTADO:** | En ejecución |
| **VENCIMIENTO:** | 26 DE ENE DE 2028 |
| **CONDICIONES FINANCIERAS:** | |
| RENDIMIENTOS: | TREINTA (30%) por ciento de la DTF NATA |
| COSTOS DE OPERACIÓN : | El costo de operatividad, equivale al cinco por ciento (5%) sobre el valor total de los recursos en dinero de las actas de incorporación a administrar, de los cuales el IDEA aporta la totalidad |
| CANTIDAD DE CUENTAS: | 2 |
| **SUPERVISOR:** | Por el departamento Julián Alberto Ramírez y Sebastián Castaño Gómez y por el IDEA Germán Alberto Mejía Gallego de la Dirección de Convenios y Cooperación |

| | | |
|---|---|---|
| IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia | **INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES** | Versión: 1<br>F-CC-005<br>Fecha: 17/06/2025 |

**ORDENADOR DEL GASTO:** Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia Luis Horacio Gallón Arango

**CONTACTO CLIENTE:** Julián Alberto Ramírez julianalberto.ramirez@antioquia.gov.co y Sebastián Castaño Gómez sebastian.castano@antioquia.gov.co

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

**A DICIEMBRE 31 DE 2025**

| DESCRIPCIÓN | SALDO MES ANTERIOR | MOVIMIENTO DEL MES | SALDO MES ACTUAL |
|---|---|---|---|
| Valor recibido de capital | 64.792.263.521 | - | 64.792.263.521 |
| Valor recibido por rendimientos generados | 1.246.012.777 | 101.215.171 | 1.347.227.948 |
| **VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)** | **66.038.276.298** | **101.215.171** | **66.139.491.469** |
| Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados) | 59.594.754.671 | - | 59.594.754.671 |
| Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar) | 6.443.521.627 | 101.215.171 | 6.544.736.798 |
| **VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)** | **66.038.276.298** | **101.215.171** | **66.139.491.469** |
| Valor pagado | 13.046.800.049 | 13.900.758.783 | 26.947.558.832 |
| Valor pagado costos de operación por pagos | - | - | - |
| **VALOR TOTAL PAGOS => (C)** | **13.046.800.049** | **13.900.758.783** | **26.947.558.832** |
| Valor pagado de comisión por rendimientos | - | - | - |
| Retención fuente por rendimientos financieros | - | - | - |
| **SALDO CUENTA => (A - C)** | **52.991.476.249** | **(13.799.543.612)** | **39.191.932.637** |

**OBSERVACIONES:**

El convenio se firmó e inició en el mes de diciembre de 2024, en el mes de junio de 2025 tuvo una adición de recursos a administrar por 184,345,141, en este mes el convenio tuvo movimientos,los cuales han sido los compromisos presupuestales(labores) para contratar y modificaciones a estas y ya se están ordenar pagos además de los rendimientos, se realizarón los pagos solicitados.tambien en el mes de noviembre de 2025 se realizó una adición de recursos a administrar por 6,062,107,105, la cual se refleja en los ingresos. En el mes de diciembre de 2025 se adicionan recursos a administrar por $6.700.000.000 pero, el ingreso no se alcanzo a realizar en diciembre y quedara para enero de 2026 y por ello no se reflejael ingreso en este informe. **Este informe y los demás anexos que se envían con él, hacen parte del infirme de supervisión**.

**CONTACTO IDEA:** Germán Alberto Mejía Gallego. Teléfono: 3819134. Correo Electrónico: germanmg@idea.gov.co

SUPERVISOR: Germán Alberto Mejía Gallego **7 de enero de 2026**

APOYO A LA SUPERVISIÓN: N/A

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.045.020.787

RAMIREZ DUQUE

APELLIDOS

ANGELA PATRICIA

NOMBRES

Angela Patricia R.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1991

SANTUARIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

24-FEB-2010 SANTUARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0125600-00227272-F-1045020787-20100320 0021730635A 1 29436198

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2025-9127
Fecha: 10/12/2025 13:42:03
Tipo documento: CERTIFICACION
Destino: INSTITUTO PARA EL
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este radicado

**EL REVISOR FISCAL DEL**

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA**
**NIT.890.980.179-2**

**CERTIFICA QUE**

Según registros auxiliares de contabilidad al 31 de octubre de 2025 y durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Entidad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación Familiar.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.

La presente certificación se emite en Medellín, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025, por solicitud de la Administración de la Entidad**.**

Atentamente,

Angela P Ramirez D.

**Ángela Patricia Ramírez Duque**
Revisor Fiscal Suplente
T.P. 229492-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

F2699108590D72F39

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
AMEZQUITA

Que el contador público **ANGELA PATRICIA RAMIREZ DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045020787 de EL SANTUARIO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 229492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** ******************************
******************************************************************
*****************************************************************

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

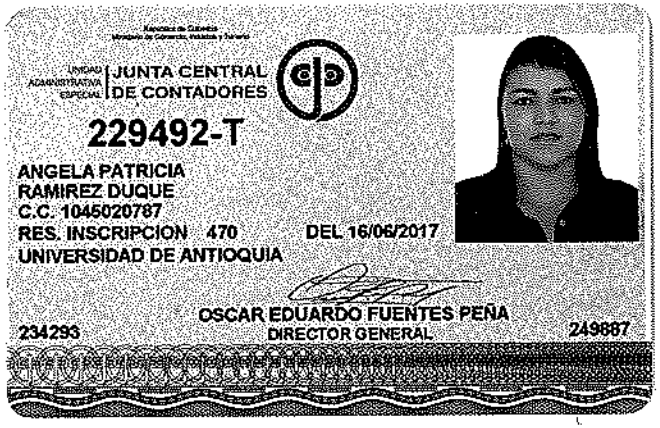
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
229492-T
ANGELA PATRICIA
RAMIREZ DUQUE
C.C. 1045020787
RES. INSCRIPCION 470 DEL 16/06/2017
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
234293
249887
