ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

1033

La Vega Cundinamarca, 31 de octubre de 2025.

Señores
Oficina de Contratación
Alcaldía de La Vega Cundinamarca

Asunto: Entrega de Documentos Pago No. 02 Contrato de Obra No. 161-2025

Por medio de la presente se hace entrega formal de los siguientes documentos, con el fin de adelantar el trámite de Pago Parcial No. 02 del Contrato de Obra No. 161-2025 del contratista PROYECTOS DE INGENIERIA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING S.A.S. NIT. 900.976.357-7, representada por el señor CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ Identificado con CC. No. 1.019.044.913 de Bogotá D.C.

Contrato No.	Nombre del Documento	Numero de Folios, medios magnéticos u otros
161-2025	Cronograma Actualizado	
	Aval Cronograma Interventoría	01
	Cronograma Actualizado	03
	Pago Parcial No. 01	
	Aval y Entrega Acta Parcial No. 02 Interventoría	02
	Radicado Acta Parcial No. 02	02
	Factura	03
	Rut	02
	Certificación Bancaria	02
	Resolución Facturación	03
	Cedula Representante Legal	02
	Documentos Contador	04
	Certificación Parafiscales	02
	Planillas Seguridad Social	12
	Avales Informes Mensuales	09
	Informe Acta de Terminación	29
	Balance de Mayores y Menores	05
	Acta de Recibo Final	03
	Memorias de Cantidades	20
	Registro Fotográfico	18
	Control Estado del Tiempo	03
	Bitácoras de Obra	50
	Pago Sena Fic	04
	Certificados Calidad de Materiales y Disposición	10
	Pólizas Actualizadas	07
	Manual de Mantenimiento	24
	Pólizas Actualizadas	04
	Manual de Mantenimiento	24

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

	Ensayos de Laboratorio	06
	Informe Mensual No. 3	105
	Informe Mensual No. 4	107
	Actas de Comités Técnicos	54
	Planos Record	06
	Informe de Supervisión	15
	Certificado Supervisor	01

NOTA: ***En el caso de documentos para trámite de pago debe venir una copia para entregar a la secretaria de Hacienda donde van los siguientes documentos, los cuales deben también ser relacionados en el cuadro anterior:***

- *Certificación del supervisor*
- *Factura del Contratista*
- *Soportes Seguridad Social*
- *Certificación contratista pago seguridad social*
- *Certificación Bancaria*

Atentamente,

DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
Profesional Universitario
Secretaria De Planeación E Infraestructura

1034

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900166619-9

La Vega – 25 de agosto de 2025

CTO.179-2025-161-015.2

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

LA VEGA 08/09/2025 15:54
Al Contestar cite este No.: 20251105143
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:3 FOLIOS Fol:1

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL Y ENTREGA CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO A MODIFICATORIO No.1 DEL CONTRATO DE OBRA C-OBRA-161-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra mediante el comunicado CTO 161-2025-008.1 de fecha 20 de agosto de 2025 referente al cronograma de obra actualizado al modificatorio No.1, esta interventoría informa:

- Una vez revisada la información entregada por el contratista de obra en referencia al cronograma de obra actualizado al modificatorio No.1 este se avala.

Por lo anterior, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación, aprobación y trámite correspondiente. Se adjunta:

- Cronograma de obra actualizado en dos (02) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1035

La Vega, 20 de agosto de 2025

CTO 161-2025-008.1

Señores
Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

RECIBIDO
INTERVENTORIA
DEL PROYECTO
Lorena Gómez
20 Agosto 2025

REFERENCIA: Contrato de obra No.161-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ASUNTO: **ENTREGA CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO AL MODIFICATORIO No. 1**

Estimados señores;


En cumplimiento al contrato de Obra No. 161 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen, como contratista de obra hacemos entrega del cronograma de obra actualizado al Modificatorio No.1.

Lo anterior se remite de acuerdo con la solicitud en dos (02) folios.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,


Carlos Andres Pinzon Lopez
CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

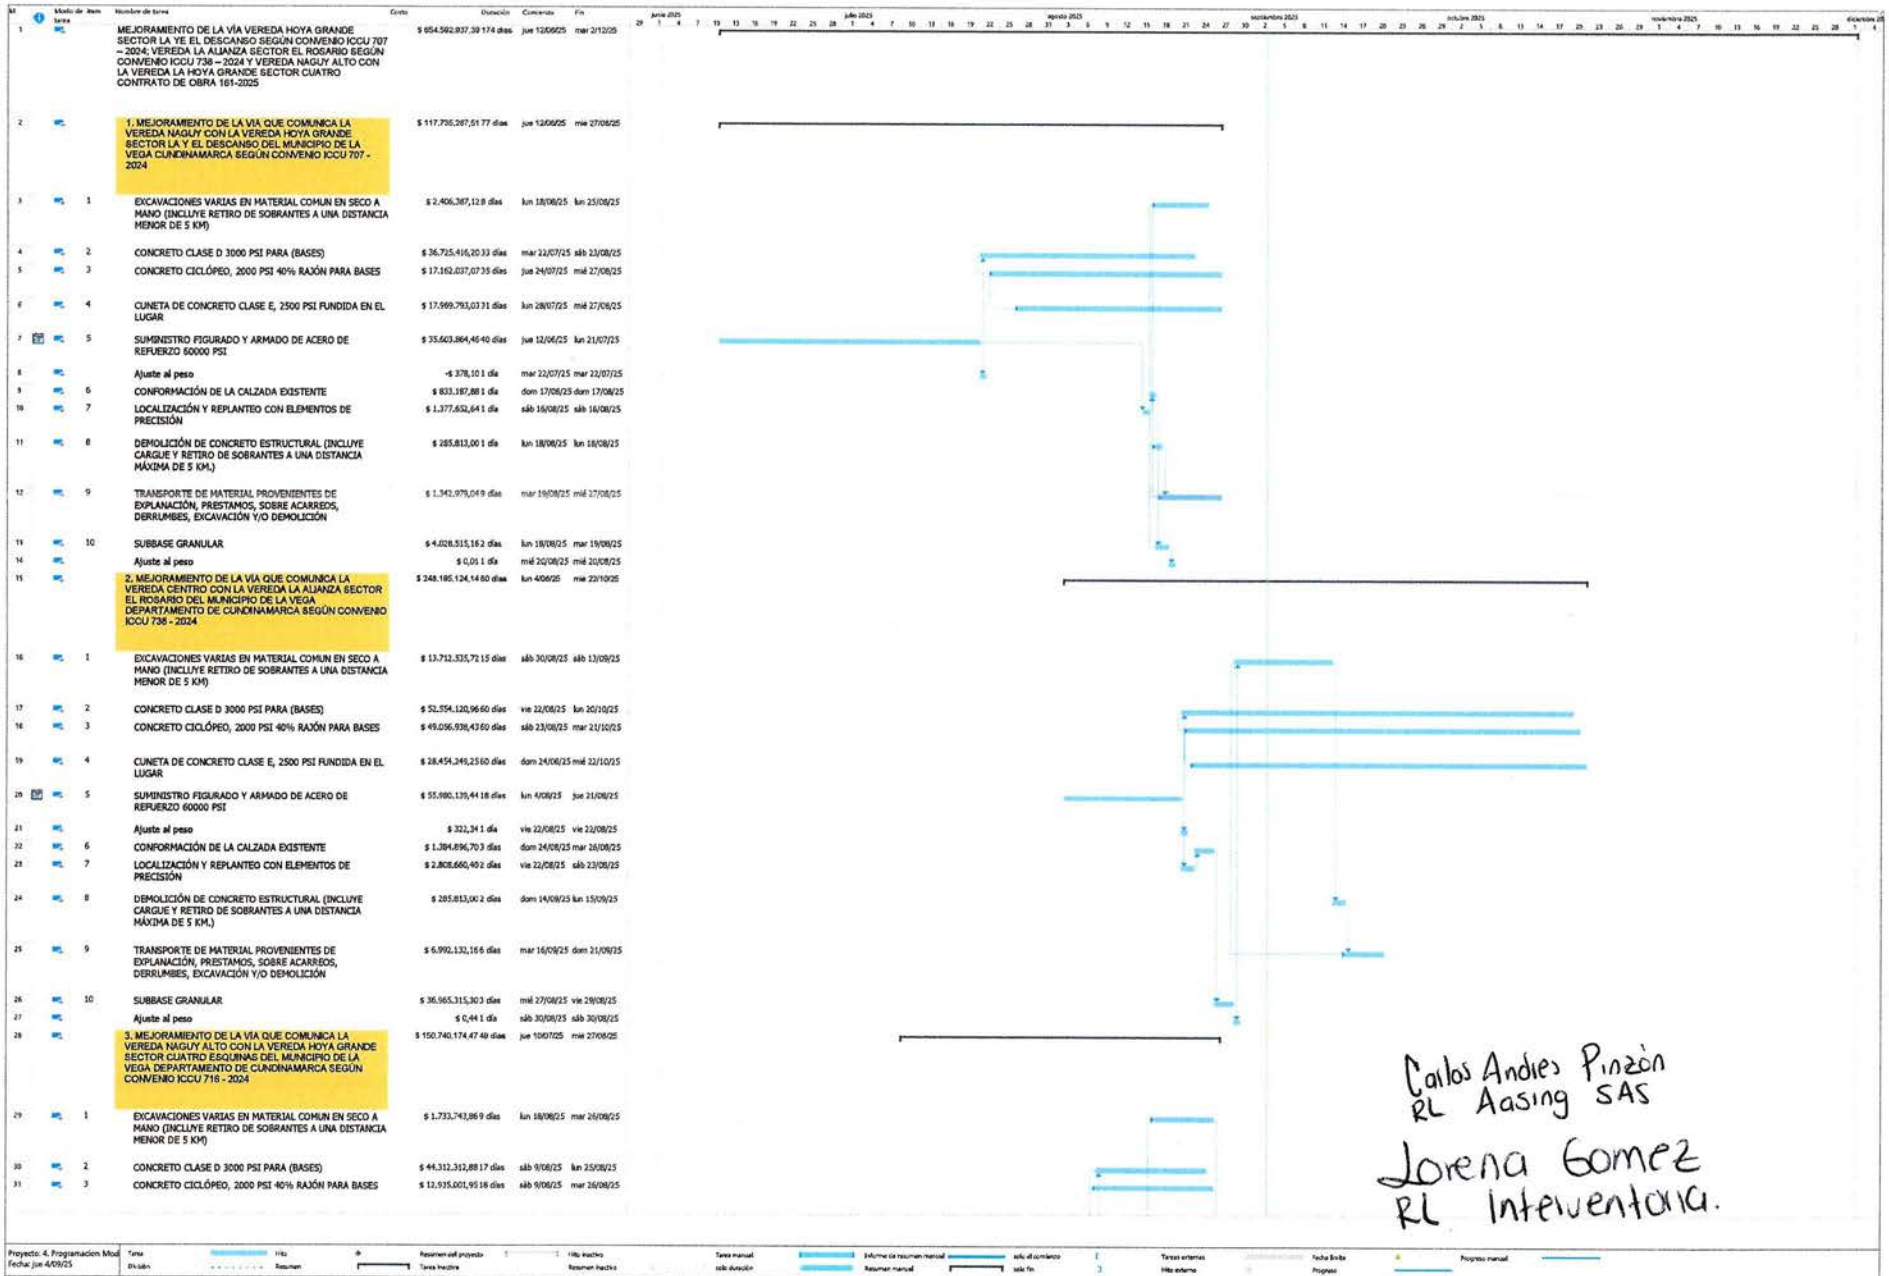

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO CONTRATO DE OBRA 161-2025	$ 654.592.837,39	174 días	jue 12/06/25	mar 2/12/25
2		1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA Y EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024	$ 517.736.267,51	77 días	jue 12/06/25	mie 27/08/25
3		1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 2.406.387,12	8 días	lun 18/08/25	lun 25/08/25
4		2 CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	$ 36.725.416,20	33 días	mar 22/07/25	sáb 23/08/25
5		3 CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 17.162.037,07	35 días	jue 24/07/25	mié 27/08/25
6		4 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 17.969.793,03	31 días	lun 28/07/25	mié 27/08/25
7		5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 35.603.864,46	40 días	jue 12/06/25	lun 21/07/25
8		Ajuste al peso	-$ 378,10	1 día	mar 22/07/25	mar 22/07/25
9		6 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ 833.187,88	1 día	dom 17/08/25	dom 17/08/25
10		7 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	$ 1.377.652,64	1 día	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25
11		8 DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	$ 285.813,00	1 día	lun 18/08/25	lun 18/08/25
12		9 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	$ 1.342.979,04	9 días	mar 19/08/25	mié 27/08/25
13		10 SUBBASE GRANULAR	$ 4.028.515,16	2 días	lun 18/08/25	mar 19/08/25
14		Ajuste al peso	$ 0,01	1 día	mié 20/08/25	mié 20/08/25
15		2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024	$ 248.185.124,14	60 días	lun 4/08/25	mie 22/10/25
16		1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 13.712.535,72	15 días	sáb 30/08/25	sáb 13/09/25
17		2 CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	$ 52.554.120,96	60 días	vie 22/08/25	lun 20/10/25
18		3 CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 49.056.938,43	60 días	sáb 23/08/25	mar 21/10/25
19		4 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 28.454.249,25	60 días	dom 24/08/25	mié 22/10/25
20		5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 55.980.139,44	18 días	lun 4/08/25	jue 21/08/25
21		Ajuste al peso	$ 322,34	1 día	vie 22/08/25	vie 22/08/25
22		6 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ 1.384.896,70	3 días	dom 24/08/25	mar 26/08/25
23		7 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	$ 2.808.660,40	2 días	vie 22/08/25	sáb 23/08/25
24		8 DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	$ 285.813,00	2 días	dom 14/09/25	lun 15/09/25
25		9 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	$ 6.992.132,16	6 días	mar 16/09/25	dom 21/09/25
26		10 SUBBASE GRANULAR	$ 36.965.315,30	3 días	mié 27/08/25	vie 29/08/25
27		Ajuste al peso	$ 0,44	1 día	sáb 30/08/25	sáb 30/08/25
28		3. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 716 - 2024	$ 150.740.174,47	48 días	jue 10/07/25	mié 27/08/25
29		1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 1.733.743,86	9 días	lun 18/08/25	mar 26/08/25
30		2 CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	$ 44.312.312,88	17 días	sáb 9/08/25	lun 25/08/25
31		3 CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 12.935.001,95	16 días	sáb 9/08/25	mar 26/08/25

Carlos Andres Pinzón
RL Aasing SAS

Lorena Gomez
RL Interventoria.

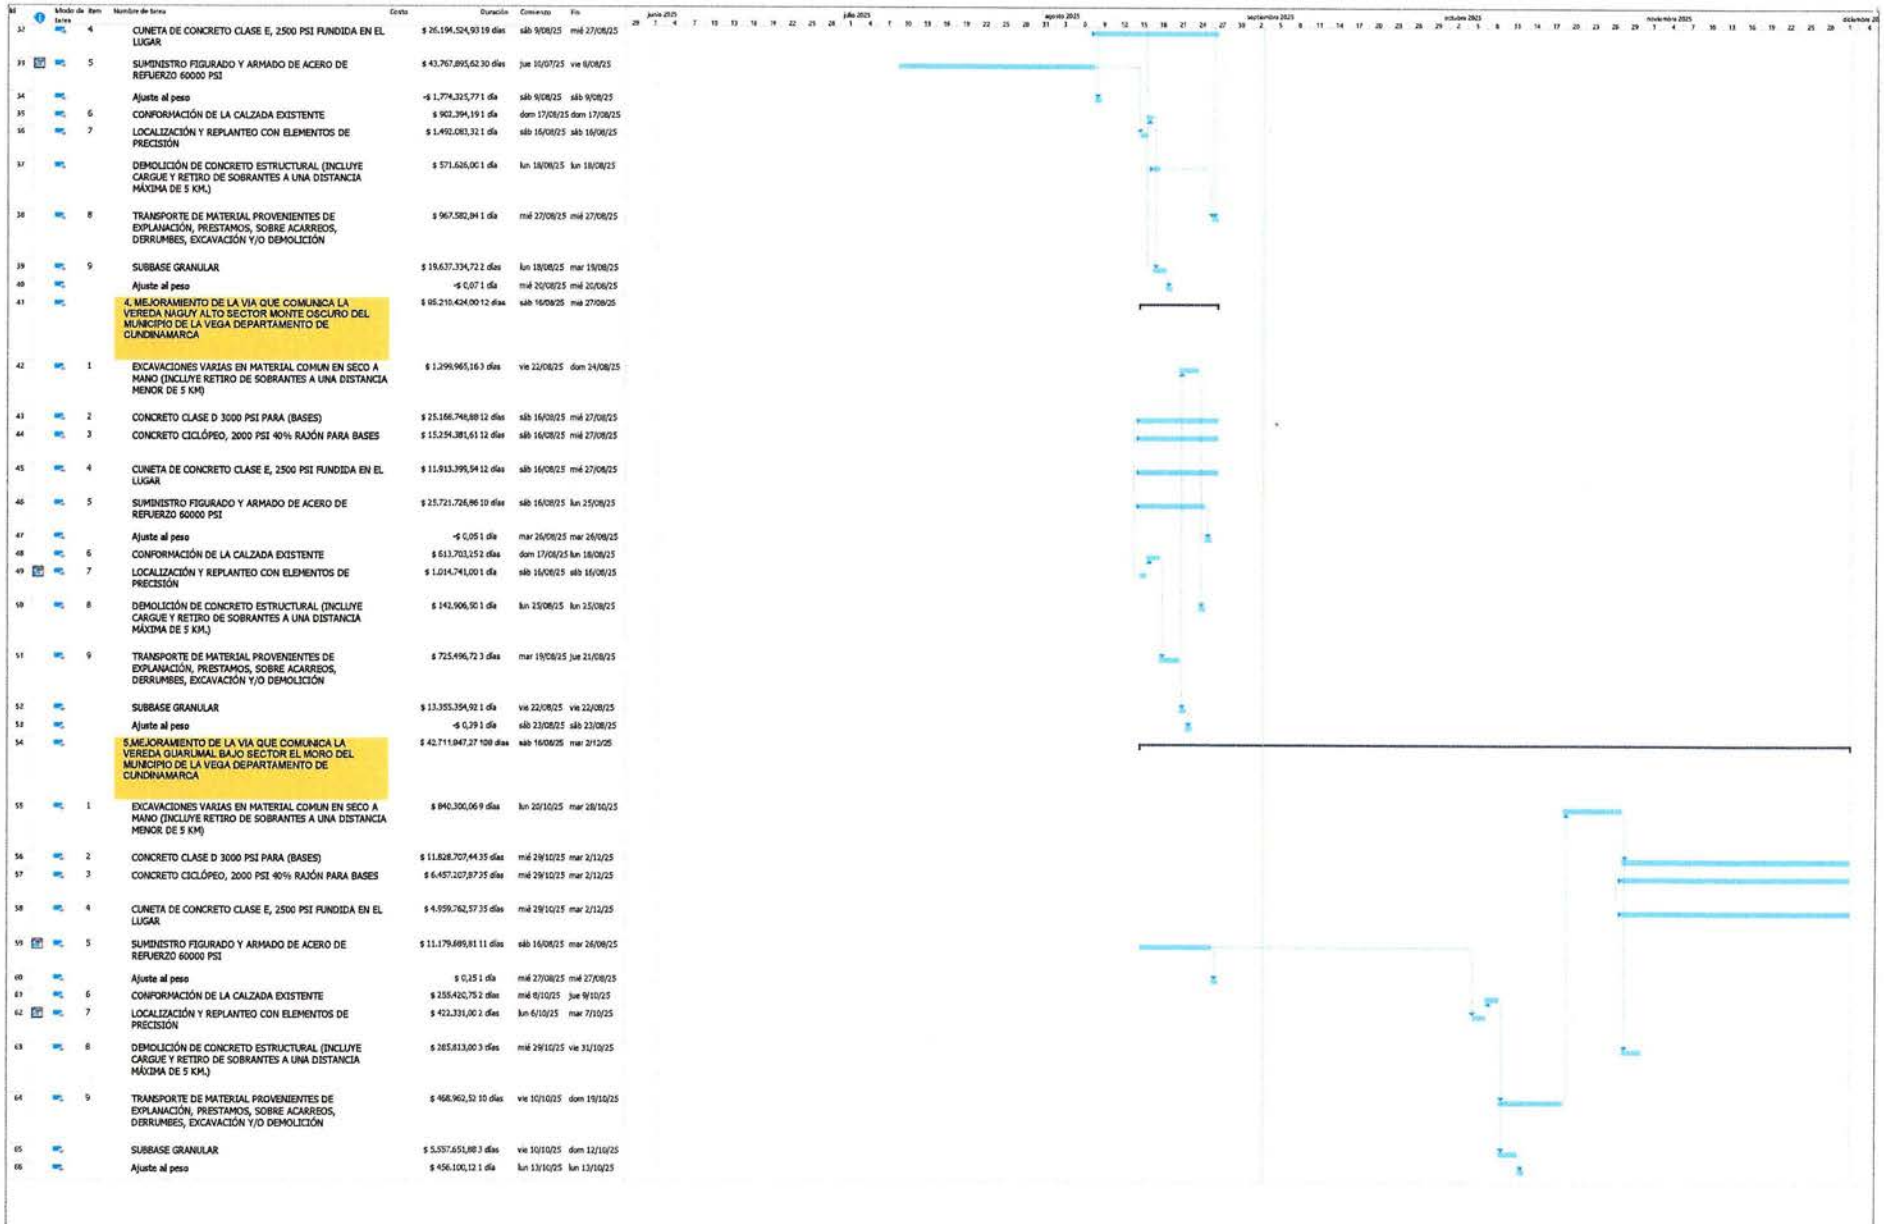

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
32		4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 26.194.524,93	19 días	sáb 9/08/25	mié 27/08/25
33		5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 43.767.895,62	30 días	jue 10/07/25	vie 8/08/25
34			Ajuste al peso	-$ 1.774.325,77	1 día	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25
35		6	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ 902.394,19	1 día	dom 17/08/25	dom 17/08/25
36		7	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	$ 1.492.083,32	1 día	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25
37			DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	$ 571.626,06	1 día	lun 18/08/25	lun 18/08/25
38		8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	$ 967.582,84	1 día	mié 27/08/25	mié 27/08/25
39		9	SUBBASE GRANULAR	$ 19.637.334,72	2 días	lun 18/08/25	mar 19/08/25
40			Ajuste al peso	-$ 0,07	1 día	mié 20/08/25	mié 20/08/25
41			4. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 85.210.424,00	12 días	sáb 16/08/25	mié 27/08/25
42		1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 1.299.965,16	3 días	vie 22/08/25	dom 24/08/25
43		2	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	$ 25.166.748,88	12 días	sáb 16/08/25	mié 27/08/25
44		3	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 15.254.381,61	12 días	sáb 16/08/25	mié 27/08/25
45		4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 11.913.399,54	12 días	sáb 16/08/25	mié 27/08/25
46		5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 25.721.726,86	10 días	sáb 16/08/25	lun 25/08/25
47			Ajuste al peso	-$ 0,05	1 día	mar 26/08/25	mar 26/08/25
48		6	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ 613.703,15	2 días	dom 17/08/25	lun 18/08/25
49		7	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	$ 1.014.741,00	1 día	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25
50		8	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	$ 142.906,50	1 día	lun 25/08/25	lun 25/08/25
51		9	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	$ 725.496,72	3 días	mar 19/08/25	jue 21/08/25
52			SUBBASE GRANULAR	$ 13.355.354,92	1 día	vie 22/08/25	vie 22/08/25
53			Ajuste al peso	-$ 0,39	1 día	sáb 23/08/25	sáb 23/08/25
54			5.MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 42.711.047,27	108 días	sáb 16/08/25	mar 2/12/25
55		1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 840.300,06	9 días	lun 20/10/25	mar 28/10/25
56		2	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	$ 11.828.707,44	35 días	mié 29/10/25	mar 2/12/25
57		3	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 6.457.207,87	35 días	mié 29/10/25	mar 2/12/25
58		4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$ 4.959.762,57	35 días	mié 29/10/25	mar 2/12/25
59		5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 11.179.689,81	11 días	sáb 16/08/25	mar 26/08/25
60			Ajuste al peso	$ 0,25	1 día	mié 27/08/25	mié 27/08/25
61		6	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ 255.420,75	2 días	mié 8/10/25	jue 9/10/25
62		7	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	$ 422.331,00	2 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25
63		8	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	$ 285.813,00	3 días	mié 29/10/25	vie 31/10/25
64		9	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	$ 468.962,52	10 días	vie 10/10/25	dom 19/10/25
65			SUBBASE GRANULAR	$ 5.557.651,88	3 días	vie 10/10/25	dom 12/10/25
66			Ajuste al peso	$ 456.100,12	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25

1038

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900416619-9

La Vega Cundinamarca 22 de octubre de 2025

CTO.179-2025-161-022

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

LA VEGA 22/10/2025 16:04
Al Contestar cite este No.: 20251106068
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:224 Folios y 5 Planos Fol:2

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: AVAL Y ENTREGA ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES – ACTA DE TERMINACIÓN C-OBRA-161-2025 – SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del acta de recibo final de cantidades para el contrato de obra C-OBRA-161-2025 mediante el comunicado CTO 161-2025-012 de fecha de 20 de octubre de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

anexo 1 · Factura avance 90%
anexo 2 · Factura avance 100%
anexo 3 · RUT
anexo 4 · Certificación bancaria
anexo 5 · Resolución de facturación
anexo 6 · Cédula representante legal
anexo 7 · Documentos contador
anexo 8 · Certificación pago de parafiscales

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 900416619-9

anexo 9 · Planillas de seguridad social
anexo 10· Aval informes mensuales presentados
anexo 11· Informe acta de terminación
anexo 12· Balance de mayores y menores cantidades
anexo 13 Acta parcial 2 – acta de recibo final de cantidades
anexo 14· Memorias de cantidades acta parcial No. 02 convenio ICCU-738-2024
anexo 15· Memorias de cantidades acta parcial No. 02 El Moro
anexo 16· Registro fotográfico convenio ICCU-738-2024
anexo 17· Registro fotográfico convenio El Moro
anexo 18· Control estado del clima
anexo 19· Bitácora convenio ICCU-738-2024
anexo 20· Bitácora El Moro
anexo 21· Pago fit
anexo 22· Certificados de calidad
anexo 23· Pólizas actualizadas acta de recibo final de cantidades
anexo 24· Manual de mantenimiento
anexo 25· Certificación RCD
anexo 26· Resultados ensayos laboratorio
anexo 27· Planos record

Así mismo solicitamos que se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra 161 de 2025, de acuerdo a la solicitud presentada por el contratista de obra.

Total, folios Doscientos veinticuatro (224) folios

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1040

La Vega, 20 de octubre de 2025

CTO 161-2025-012

Señores
Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.161-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ASUNTO: ENTREGA ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES -TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 161-2025 – SOLICITUD DE PAGO Y SOLICITUD LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de obra No. 161 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen, como contratista de obra hacemos entrega del acta de recibo final de cantidades – terminación del contrato de obra para su respectiva revisión, aprobación y trámite correspondiente, la cual contiene lo siguiente:

En el acta de recibo final de cantidades – terminación, en mención se adjunta toda la documentación en la cual se detalla la culminación de las actividades de obra realizadas, todo lo anterior conforme a los términos contractuales establecidos.

A continuación, se detallan los documentos anexos:

- Factura avance 90%
- Factura avance 100%
- RUT
- Certificación bancaria
- Resolución de facturación
- Cédula representante legal
- Documentos contador
- Certificación pago de parafiscales
- Planillas de seguridad social
- Aval informes mensuales presentados
- Informe acta de terminación

RECIBIDO
INTERVENTORIA
DEL PROYECTO
Lorena Gómez
20-octubre 2025.

- Balance de mayores y menores cantidades
- Acta parcial 2 – acta de recibo final de cantidades
- Memorias de cantidades acta parcial No. 02 convenio ICCU-738-2024
- Memorias de cantidades acta parcial No. 02 El Moro
- Registro fotográfico convenio ICCU-738-2024
- Registro fotográfico convenio El Moro
- Control estado del clima
- Bitácora convenio ICCU-738-2024
- Bitácora El Moro
- Pago fit
- Certificados de calidad
- Pólizas actualizadas acta de recibo final de cantidades
- Manual de mantenimiento
- Certificación RCD
- Resultados ensayos laboratorio
- Planos record

Se anexan doscientos veintidós (222) folios

Lo anterior, se entrega para revisión, aprobación y trámite correspondiente por parte de la supervisión del proyecto, con el fin de que se otorgue el pago correspondiente.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

FACTURA – AVANCE 90%

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

1043

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
768038c8edd73aa144a3ad1709608be1b75453ad002cbf3f69e5cb92393af5262162ee7458f8fe1773e7c18456f28508

Número de Factura: AS-56
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 31/10/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
Nombre Comercial: PROYECTOS DE INGENIERIA DISE?OS CONSTRUCCIONES Y C
Nit del Emisor: 900976357
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cajicá
Dirección: VDA CHUNTAME QUINTAS DE MOLINO CA 56
Teléfono / Móvil: 031|3053678028|
Correo: ingenieros.aas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / MUNICIPIO LA VEGA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800073475
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6013056694000
Correo: alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	CONTRATO DE OBRA No. 161 DE 2025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ZZ	1,00	$ 39.617.508,01	$ 0,00	$ 13.073.777,64					$ 52.691.285,65

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: CONTRATO DE OBRA CIVIL

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2025 10:46:00
Documento validado por la DIAN:
31/10/2025 10:47:06
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	39.617.508,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	13.073.777,64
Total Bruto Factura	52.691.285,65
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	52.691.285,65
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 52.691.285,65

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100901892 Rango desde: 54 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-10-31

RUT

1046

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165613644

(415)7707212489984(8020) 000014116561364 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 6 3 5 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AASING SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	La Vega 4 0 2

41. Dirección principal
CR 4 8 169 CONJ BALCONES DE SAN MARTIN TO 8 AP 202

42. Correo electrónico ingenieros.aas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 3 6 7 8 0 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 5 1 9	4 3 9 0	2 0 1 6 0 5 1 9		7 1 1 2	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PINZON LOPEZ CARLOS ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 04-03-2025 08:47:21AM

CERTIFICACIÓN BANCARIA

305 3678028 aasing.phiavega25@gmail.com

1048

Bancolombia

Bogotá D.C, 14 de Octubre de 2025

Señores
A QUIEN CORRESPONDA Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **AASING SAS** identificado(a) con **NIT Nro. 900976357,** tiene con el Banco los Siguientes Productos:

Nombre Producto	Número	Estado	Fecha de apertura
CUENTA CORRIENTE	**892-924359-20**	**Activa**	**2018/04/19**

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información a la fecha, en el teléfono 4273070 de Bogotá, o en nuestra sucursal Salitre ubicada en la Calle 25 N° 68B 02.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Bogota - Of. 171 Salitre
Asesor de Servicios Nº 154
Cédula Nº

Christian Julian Luna Rodriguez
Asesor Pyme
Sucursal Ciudad Salitre

10

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

1050

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764082640150

(415)7707212489984(8020) 001876408264015 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900976357	7				

11. Razón social

PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección

CR 4 8 169 CONJ BALCONES DE SAN MARTIN TO 8 AP 202

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	La Vega

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-10-31 / 04:31:21 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PINZON LOPEZ CARLOS ANDRES

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación 1019044913 1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y

997. Fecha formalización 2024-10-31 16:31:21

12

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764082640150

(415)7707212489984(8020) 001876408264015 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900976357	7				

11. Razón social

PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS CR 4 8 169 CONJ BALCONES DE SAN MARTIN TO 8 AP 202							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AS	31	100	12	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

AUTORIZADO

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.019.044.913
PINZON LOPEZ

APELLIDOS
CARLOS ANDRES

NOMBRES
Carlos Andrés Pinzón López

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1990
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

29-ABR-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00083521-M-1019044913-20080929 0003851334A 1 25767293

DOCUMENTOS CONTADORA

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1055

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D873B02CB172239B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VIVIANA ANDREA NAVA GRANADOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075671382 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 273257-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

17

1056

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.075.671.382**
NAVA GRANADOS

APELLIDOS
VIVIANA ANDREA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **22-NOV-1993**
ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

29-NOV-2011 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1534000-00359760-F-1075671382-20120203 0029149285A 1 37738364

Uso Exclusivo Para Verificación De Datos Personales

18

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

273257-T



VIVIANA ANDREA
NAVA GRANADOS
C.C. 1075671382
RES. INSCRIPCION 1403 DEL 21/08/2020
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

293900

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

307873

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

Cajicá Cundinamarca, 12 de octubre de 2025.

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

La empresa **PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS** identificada con NIT: 900.976.357-7, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones y la de sus empleados, provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002

Atentamente

VIVIANA ANDREA NAVA GRANADOS
CONTADOR PUBLICO
273257-T

2

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900976357	7	AASING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AASINGSAS	CR 97 B 156 B 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6845086	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1748609356	9491395082	E	2025/09/12	2025/09/03	BANCOLOMBIA	0	$3,465,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AASINGSAS (10 Afiliados)																						$11,909,950	$1,906,000			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$476,900			$11,909,950		$605,300		$0	$0		$3,465,100
Centro de Trabajo: OBRA (7 Afiliados)																						$7,639,450	$1,222,600			$7,639,450	$305,900			$7,639,450	$305,900			$7,639,450		$532,000		$0	$0		$2,366,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$7,639,450	$1,222,600			$7,639,450	$305,900			$7,639,450	$305,900			$7,639,450		$532,000		$0	$0		$2,366,400
1	CC	1070708412	ALDANA CONTRERAS WILSON URIEL	X																	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
2	CC	1076664596	ARIAS SANTANA CRISTIAN CAMILO	X																	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
3	CC	1075662769	GARCIA ESTEBAN	X																	23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS017	27	$1,281,150	$51,300	CCF24	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	Si	$396,800
4	CC	1075650444	GARCIA JORGE LUIS	X																	23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS017	27	$1,281,150	$51,300	CCF24	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	Si	$396,800
5	CC	1020830953	MONTENEGRO MERCALFE CARLOS ANDRES	X																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1070307828	PEÑA PINILLA JHON JAIRO	X																	23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS017	27	$1,281,150	$51,300	CCF24	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	Si	$396,800
7	CC	1052411964	SANABRIA GALINDO ANGGIE LISETT																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: PERSONAL OFICINA (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$11,300		$0	$0		$694,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$11,300		$0	$0		$694,900
8	CC	1014225234	CARRILLO RUIZ GABRIEL EDUARDO													X					23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF24	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$170,900
9	CC	1014225234	CARRILLO RUIZ GABRIEL EDUARDO																		23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF24	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	0.522%	$3,800	15	$0	$0	Si	$174,700
10	CC	1010960046	HUERTAS SUAREZ JUAN DANIEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
11	CC	1019044913	PINZON LOPEZ CARLOS ANDRES																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
Total Afiliados(10)																						$11,909,950	$1,906,000			$11,909,950	$476,900			$11,909,950	$476,900			$11,909,950		$605,300		$0	$0		$3,465,100

aportes en línea

Pla lla Resumen

1063

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900976357	7	AASING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AASINGSAS	CR 97 B 156 B 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6845086	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1838473485	9493088515	E	2025/10/15	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	$6,311,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AASINGSAS (22 Afiliados)																								$21,542,300	$3,447,800			$21,542,300	$862,600			$20,304,641	$813,100			$21,542,300		$1,187,700		$0	$0		$6,311,200
Centro de Trabajo: OBRA (19 Afiliados)																								$17,271,800	$2,764,400			$17,271,800	$691,600			$16,034,141	$642,100			$17,271,800		$1,110,700		$0	$0		$5,208,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																								$17,271,800	$2,764,400			$17,271,800	$691,600			$16,034,141	$642,100			$17,271,800		$1,110,700		$0	$0		$5,208,800
1	CC	6312908	ABREU MARQUEZ VISGABI ANTONIO	X																		23030 1	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF24	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
2	CC	3169432	ACERO GONZALEZ MIGUEL ALFREDO	X																		23100 1	9	$427,050	$68,400	EPS017	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	SI	$132,400
3	CC	1043872067	ACUÑA OROZCO WILFRIDO JOSE	X																		23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
4	CC	1070708412	ALDANA CONTRERAS WILSON URIEL																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1076664596	ARIAS SANTANA CRISTIAN CAMILO																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1071331384	AVILA QUINTERO JHON ALEXANDER	X																		23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
7	CC	1003826898	CAMACHO PUENTES NELSON ESTEBAN	X																		25-14	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
8	CC	1075662769	GARCIA ESTEBAN																			23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF24	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$29,500
9	CC	1075662769	GARCIA ESTEBAN											X								23030 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	28	$1,328,600	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$265,800
10	CC	1075650444	GARCIA JORGE LUIS																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	18881952	LAMBRAÑO MARTINEZ HERNAN LUIS	X																		23030 1	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	SI	$132,400
12	CC	1073532828	LIZCANO BAUTISTA DUVAN YEFRED	X																		23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
13	CC	1073533249	LIZCANO GUARTOS GELVER JOSUE	X																		23030 1	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF24	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
14	CC	3028927	LIZCANO GUARTOS NESTOR	X																		23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
15	CC	1020830953	MONTENEGRO MERCALFE CARLOS ANDRES		X																X	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS017	15	$711,750	$28,500	CCF24	15	$800,714	$32,100	14-11	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$224,100
16	CC	1143993398	OSORIO TRINIDAD CRISTIAN DAVID	X																		23020 1	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF24	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
17	CC	1070307828	PEÑA PINILLA JHON JAIRO																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
18	CC	80005693	QUINTERO LEANDRO JOSE MAURICIO	X																		23020 1	20	$949,000	$151,900	EPS008	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
19	CC	13686211	SALAZAR HERNANDEZ LUIS ALFONSO	X	X																X	23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$49,427	$2,000	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,900
20	CC	1052411964	SANABRIA GALINDO ANGGIE LISETT																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Centro de Trabajo: PERSONAL OFICINA (2 Afiliados)																								$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
21	CC	1014225234	CARRILLO RUIZ GABRIEL EDUARDO																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
22	CC	1010960046	HUERTAS SUAREZ JUAN DANIEL																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
23	CC	1019044913	PINZON LOPEZ CARLOS ANDRES																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800

2025/10/08 04:13 PM

Total Afiliados(22)		$21,542,300	$3,447,800		$21,542,300	$862,600		$20,304,641	$813,100		$21,542,300		$1,187,700		$0	$0		$6,311,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900976357	7	AASING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AASINGSAS	CR 97 B 156 B 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6845086	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1838473485	9493088515	E	2025/10/15	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	$6,311,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$3,447,800	$0	$0	$3,447,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$68,400	$0	$0	$68,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$151,900	$0	$0	$151,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,718,700	$0	$0	$2,718,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$508,800	$0	$0	$508,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,187,700	$0	$0	$1,187,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,187,700	$0	$0	$1,187,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$813,100	$0	$0	$813,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$813,100	$0	$0	$813,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$862,600	$0	$0	$862,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$38,000	$0	$0	$38,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$494,000	$0	$0	$494,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$165,300	$0	$0	$165,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$38,000	$0	$0	$38,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$70,300	$0	$0	$70,300
TOTAL				22	$6,311,200	$0	$0	$6,311,200

26

1065

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070324753	JUAN CARLOS PINTO CHAVES	CALLE 10 5 19	3206676736	ingjcpinto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	03/09/2025	89568866	$868.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	306.300	0		0		0	0	0	0	306.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	392.000	0	0	0	0	0	0		392.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	170.600				170.600	0	0	170.600			1.706	170.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	306.300	306.300
Pensión	1	392.000	392.000
Riesgos Laborales	1	170.600	170.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	868.900	868.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

27

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1070324753	JUAN CARLOS PINTO CHAVES		CALLE 10 5 19	3206676736	ingjcpinto@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	EL COLEGIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-08	I	03/09/2025	89568866	$868.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Exonerado	IRA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070324753	PINTO CHAVES JUAN CARLOS	57	0			N								X								230201	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS008	2.450.000	306.300	14-23	2.450.000	5	170.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070324753	JUAN CARLOS PINTO CHAVES	CALLE 10 5 19	3206676736	ingjcpinto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	06/10/2025	89568972	$868.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	306.300	0		0		0	0	0	0	306.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	392.000	0	0	0	0	0	0		392.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	170.600				170.600	0	0	170.600			1.706	170.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	306.300	306.300
Pensión	1	392.000	392.000
Riesgos Laborales	1	170.600	170.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	868.900	868.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1068

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070324753	JUAN CARLOS PINTO CHAVES	CALLE 10 5 19	3206676736	ingjcpinto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-09	I	06/10/2025	89568972	$868.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070324753	PINTO CHAVES JUAN CARLOS	57	0			N								X									230201	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS008	2.450.000	306.300	14-23	2.450.000	5	170.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

30

1069

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80363416	EDILBERTO BOHADA BARON	carrera 80 # 8b-37	3115212979	baron2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	01/09/2025	89559878	$434.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.300	434.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

37

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80363416	EDILBERTO BOHADA BARON	carrera 80 # 8b-37	3115212979	baron2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-09	2025-09	I	02/10/2025	89679789	TOTAL A PAGAR	
					$434.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.300	434.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80363416	EDILBERTO BOHADA BARON	carrera 80 # 8b-37	3115212979	baron2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-09	I	02/10/2025	89679789	$434.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80363416	BOHADA BARON EDILBERTO	3	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000				0	CCF22	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

AVALES INFORMES MENSUALES

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1074

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:901166619-9

La Vega – 24 de julio de 2025

CTO.179-2025-161-011

LA VEGA 20251104295

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibí: Carlos Andres 30-Julio 2025

Señores
Proyectos de Ingenieria – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No.1 C-OBRA-161-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.1 para el contrato de obra C-OBRA-161-2025 mediante el comunicado OFI 161-2025-006.1 de fecha 11 de julio de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

ANEXO 0 Informe mensual de obra No.1
ANEXO 1 . Registro fotográfico Convenio 707
ANEXO 2 . Registro fotográfico Convenio 738
ANEXO 3 . Registro fotográfico Convenio 716
ANEXO 4 .Bitácora de Obra
ANEXO 5. Control estado del tiempo
ANEXO 6 . Registro fotográfico socializaciones convenios
ANEXO 7. Correspondencia original enviada
ANEXO 8. Correspondencia original recibida

36

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 900116619-9

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta

Informe mensual de avance No.1 en 76 Folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente, p

Jarena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1076

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901411061-0

La Vega – 15 de agosto de 2025

CTO.179-2025-161-015.1

LA VEGA 22/08/2025 09:31
Al Contestar cite este No.: 20251104776
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:1 Carpeta con 137 folios Fol:2

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibí Carlos Andres 22-08-2025

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No.2 C-OBRA-161-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.2 para el contrato de obra C-OBRA-161-2025 mediante el comunicado OFI 161-2025-007.1 de fecha 08 de agosto de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

Anexo 1 . Registro fotográfico convenio ICCU 707-2024
Anexo 2 . Registro fotográfico convenio ICCU 738-2024
Anexo 3 . Registro fotográfico convenio ICCU 716-2024
Anexo 4 . Bitácora convenio ICCU 707-2024
Anexo 5 . Bitácora convenio ICCU 738-2024
Anexo 6 . Bitácora convenio ICCU 716-2024
Anexo 7. Control estado del tiempo Cto 161-2025
Anexo 8.. Correspondencia original enviada
Anexo 9.. Correspondencia original recibida

30

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901112694-8

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta

- Informe mensual de avance No.1 en ciento treinta y siete (137) Folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente, p

Ingrid Lorena Gómez.

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1078

AGROAMBIENTAL

La Vega – 16 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-161-019

LA VEGA 24/09/2025 15:36
Al Contestar cite este No.: 20251105498
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:102 FOLIOS Fol:2

Señores

Alcaldia Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Recibí: Carlos Andres 24-09-2025

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No.3 C-OBRA-161-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.3 para el contrato de obra C-OBRA-161-2025 mediante el comunicado OFI 161-2025-010 de fecha 09 de septiembre de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

- Pólizas actualizadas a modificatorio No. 1 Cto obra 161
- Registro fotográfico convenio ICCU 738-2024
- Registro fotográfico Adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
- Registro fotográfico Adición vereda Guarumal sector El Moro
- Bitácora convenio ICCU 738-2024

- Control estado del tiempo
- Correspondencia original enviada
- Correspondencia original recibida

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta

- Informe mensual de avance No.3 en ciento un (102) Folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1080

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900116619-9

La Vega – 08 de octubre de 2025

CTO.179-2025-161-021

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibido
Carlos Andres Pinzón
08-oct-2025

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: **AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No.4 C-OBRA-161-2025**
Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.4 para el contrato de obra C-OBRA-161-2025 mediante el comunicado OFI 161-2025-011 de fecha 06 de octubre de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

- Informe mensual No. 4 de obra
- Registro fotográfico detallado convenio ICCU 707-2024
- Registro fotográfico detallado convenio ICCU 738-2024
- Registro fotográfico Adición vereda Guarumal sector El Moro
- Bitácora convenio ICCU 738-2024
- Bitácora de obra adición vereda Guarumal sector El Moro
- Control estado del tiempo cto 161 de 2025

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900416649-9

- Correspondencia original enviada
- Correspondencia original recibida

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta

- Informe mensual de avance No.4 en ciento cuatro (104) Folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

INFORME ACTA DE TERMINACIÓN

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

INFORME MENSUAL No. 5 - TERMINACIÓN

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 – 2024 MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"



CONTRATO DE OBRA No. 161 DE 2025

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

VERSIÓN	PERIODO	OBJETO	ELABORADO	REVISADO POR	APROBADO POR
01	03/10/2025 – 10/10/2025	Informe No. 5 - Terminación	Residente de obra	Director Obra	Supervisión Municipal

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 8
5 ASPECTOS JURÍDICOS 9
5.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO 9
5.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO 10
6 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 11
6.1 FORMA DE PAGO 11
6.2 CORTES DE OBRA 11
7 ASPECTOS TÉCNICOS 12
7.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO 12
7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
7.2.1 Vía que comunica la vereda Nagui con la vereda Hoya Grande sector la Ye el Descanso – Convenio ICCU 707 - 2024 13
7.2.2 Vía que comunica la vereda Centro con la vereda la Alianza Sector el Rosario – Convenio ICCU 738-2024 13
7.2.3 Vía que comunica la Vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas - Convenio ICCU 716 – 2024 15
7.2.4 Vía que comunica la Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro 16
7.2.5 Vía que comunica la Vereda Guarumal Sector el Moro 16
7.3 ESTADO DEL TIEMPO 20
8 ASPECTOS SOCIALES 21
8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 21
8.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS 21
9 ASPECTOS SG SST 22
9.1 PERSONAL DE OBRA 22
9.2 SEGURIDAD SOCIAL 22
9.3 DOTACIONES Y (EPP) 22
10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 23
10.1 SEGUIMIENTO DE PROYECTO 23
10.1.1 Control de correspondencia 23

46

10.1.2 Control comités 25
11 CONCLUSIONES 27
11.1 ASPECTOS TÉCNICOS 27
11.2 ASPECTOS SG-SST 27
11.3 ASPECTOS AMBIENTALES 28

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Datos contrato de obra AASING S.A.S 8
Tabla 2 Pólizas iniciales contrato de obra AASING S.A.S 9
Tabla 3 Pólizas acta de inicio contrato de obra AASING S.A.S 9
Tabla 4 Pólizas actualizadas al modificatorio No. 1 contrato de obra AASING S.A.S 9
Tabla 5 Pólizas actualizadas acta de recibo final contrato de obra AASING S.A.S 9
Tabla 6 Documentos legales contrato de obra AASING S.A.S. 10
Tabla 7 Forma de pago del contrato AASING S.A.S 11
Tabla 8 Cortes de obra AASING S.A.S. 11
Tabla 9 Programado VS Ejecutado AASING S.A.S 12
Tabla 10 Actividades Vía vereda La Alianza Sector El Rosario 13
Tabla 11 Actividades Vía vereda Guarumal Sector el Moro 16
Tabla 12.Control del clima periodo actual 20
Tabla 13.Plan de acompañamiento a actividades técnicas 21
Tabla 14. Relación de personal de obra 22
Tabla 15 Relación - Correspondencia enviada 23
Tabla 16 Relación - Correspondencia recibida 24
Tabla 17 Relación – comité de obra 25
Tabla 18 Avance de obra en sitios de intervención 27

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega 6
Ilustración 2 Localización general de la vía que a la vereda Hoya Grande sector la Ye el descanso 6
Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda la Alianza sector El Rosario. 7
Ilustración 4 Localización general de la vía vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas. 7
Ilustración 5. Programado Vs Ejecutado AASING S.A.S 12

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las labores realizadas por la empresa AASING S.A.S, en el periodo comprendido del 03 de octubre de 2025 al 10 de octubre de 2025, para el contrato cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 – 2024 MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" de acuerdo con la propuesta presentada y con los respectivos términos de referencia con base al contrato No. 161-2025.

Siendo una de las obligaciones del contratista suministrar información sobre el proyecto con base al avance de este, en el presente documento se muestra el control de las actividades que se realizan durante el período especificado anteriormente, durante la ejecución de todas las actividades de desarrollo, enfatizando en la calidad, estudios técnicos y especificaciones del desempeño de las operaciones actuales.

Al final, se realiza conclusiones y observaciones sobre las actividades ejecutadas hasta el periodo mencionado y se realiza entrega del presente informe a la interventoría del proyecto, para su revisión y aprobación.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de La Vega Cundinamarca, ha identificado la necesidad para el mantenimiento, rehabilitación y conservación de vías del sector rural, las cuales, a pesar de contar con un bajo volumen de tránsito, principalmente de vehículos livianos como los automóviles, camperos o motocicletas, son esenciales para la conectividad de las comunidades. En este contexto, considerando la prioridad de mejorar la infraestructura vial para el bienestar de los habitantes rurales, se destinarán recursos para la construcción de pavimentos de placa huella de concreto reforzado.

Este proyecto se justifica a partir de la previa la evaluación técnica que ha determinado la urgencia y la viabilidad de intervenir las siguientes vías, en búsqueda de mejorar las condiciones de accesibilidad de la población rural hacia el casco urbano del municipio y, a su vez, facilitar la conexión con otras regiones del país.

La intervención contempla el mejoramiento de aproximadamente 331 metros de placa huella, distribuidos en tres tramos:

a) Vía que comunica la vereda Hoya Grande sector La Ye el Descanso. Convenio ICCU 707-2024
b) Vía que comunica la vereda la Alianza Sector el Rosario. Convenio ICCU 738 -2024
c) Vía que comunica la vereda la Hoya Grande Sector Cuatro Esquinas. Convenio ICCU 716-2024
d) Vía que comunica la vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro.
e) Vía que comunica la vereda Guarumal Sector el Moro.

El desarrollo del proyecto busca mejorar la conectividad y accesibilidad vial en el sector rural, lo cual impactará positivamente en la calidad de vida de los habitantes y en el desarrollo económico de la región, fortaleciendo los vínculos entre la zona rural y el resto del municipio y la región.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Vega es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia, que se caracteriza por su entorno rural y su riqueza natural, se encuentra en la región central de Colombia.

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega



Características:

Extensión total: 146 km²
Altitud de la cabecera municipal:1510 m.s.n.m
Temperatura media: 19 °C
Habitantes: 7361 hab

Fuente: Alcaldía de la Vega

Las zonas por intervenir son parte del área rural del municipio de la vega son vías que comunican veredas entre sí y con la zona urbana, el proyecto tiene como objetivo brindar mejoramiento a las condiciones de circulación por las veredas que comunica esta vía, facilitando la comunicación y movilización de productos del sector campesino del municipio.

a. Vía que conduce de la vereda Nagui a la vereda Hoya Grande sector la Ye el Descanso

Ilustración 2 Localización general de la vía que a la vereda Hoya Grande sector la Ye el descanso



Fuente: Alcaldía de la Vega

50

b. vía que comunica la vereda Centro con la vereda La Alianza sector El Rosario.

Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda la Alianza sector El Rosario.



Fuente: Alcaldía de la Vega

c. Vía que comunica la vereda Naguy con la vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas.

Ilustración 4 Localización general de la vía vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas.



Fuente: Alcaldía de la Vega

51

4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Se hace la presentación detallada de la parte contractual y administrativa del contrato de obra del proyecto. Se describen a continuación los datos del contrato de obra indicando los tiempos y valores contractuales y el personal solicitado en el pliego de condiciones.

Tabla 1 Datos contrato de obra AASING S.A.S

CONTRATISTA	
Número de contrato	C-OBRA-No. 161 de 2025
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 – 2024 MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
Contratista	Proyectos de Ingeniería Diseños Construcciones y Consultorías S.A.S (AASING S.A.S)
Nit	900.976.357-7
Representante legal	Carlos Andrés Pinzón López
Valor inicial del contrato	$ 436.794.579,39
Adición No. 1	$ 217.798.358,00
Valor final del contrato	$ 654.592.937,39
Plazo de ejecución inicial	Cuatro (04) Meses
Prórroga No. 1	Dos (02) Meses
Plazo de ejecución final	Seis (06) Meses
Fecha inicio	03 de junio de 2025
Terminación inicial	02 de octubre de 2025
Terminación final	02 de diciembre de 2025
Supervisor	Laura Viviana Ortiz Robayo

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

5.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de obra tales como actas de inicio:

Tabla 6 Documentos legales contrato de obra AASING S.A.S.

No.	Objeto	Fecha de Firma
1	Contrato	27/03/2025
2	Acta de inicio	03/06/2025
3	Modificatorio No. 1	16/08/2025
4	Acta de recibo final	10/10/2025

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com


7 ASPECTOS TÉCNICOS

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades contractuales en obra:

7.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO

Se evidencia el avance de ejecución de obra de las actividades realizadas hasta la fecha:

Ilustración 5. Programado Vs Ejecutado AASING S.A.S

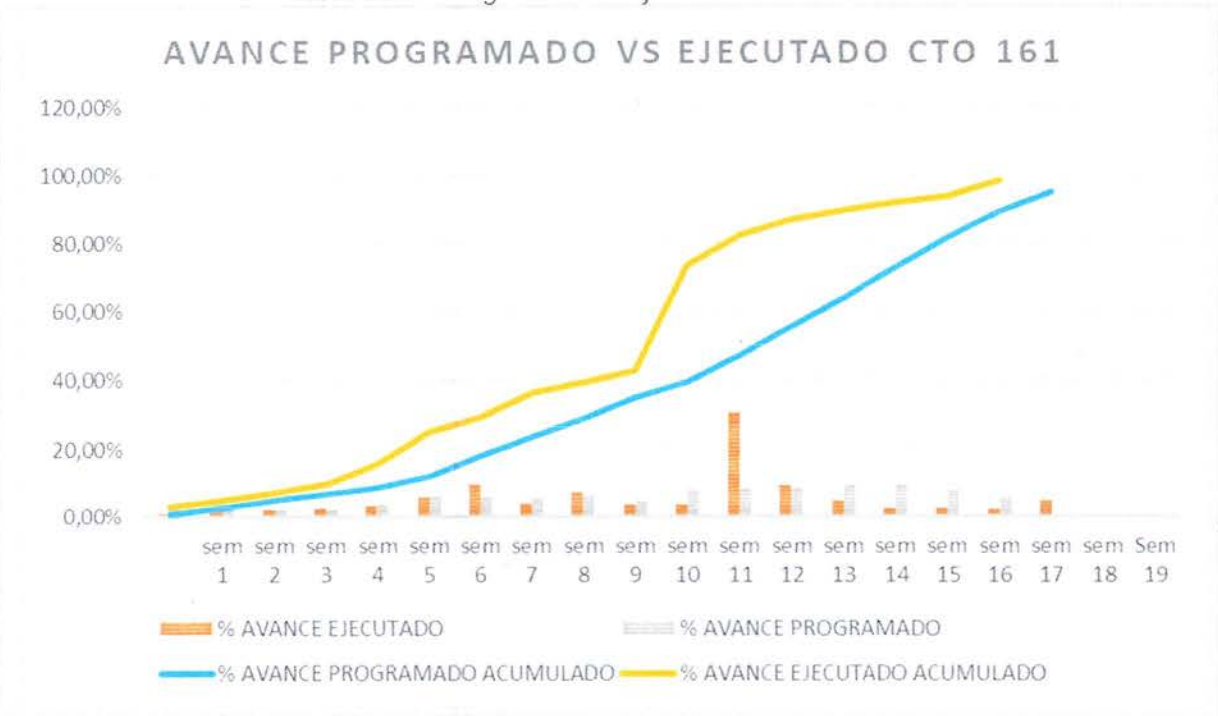

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 9 Programado VS Ejecutado AASING S.A.S

FECHA	PROGRAMADO	EJECUTADO
03 de junio de 2025 al 10 de octubre de 2025	96,40%	100.00%

Fuente: AASING S.A.S

7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A la fecha del presente informe se han desarrollado las actividades constructivas en los frentes de trabajo en ejecución los cuales se detallan a continuación.

7.2.1 Vía que comunica la vereda Nagui con la vereda Hoya Grande sector la Ye el Descanso – Convenio ICCU 707 - 2024

Para el periodo en mención, en el frente de trabajo ya se han finalizado las actividades constructivas el día 27 de agosto de 2025 de acuerdo a las actividades y recursos aprobados mediante el modificatorio No.1

7.2.2 Vía que comunica la vereda Centro con la vereda la Alianza Sector el Rosario – Convenio ICCU 738-2024

Durante el periodo, se finalizaron las actividades en este frente de trabajo. Para ello, se dispuso en el sitio el material necesario para la ejecución incluyendo el acero de refuerzo, cemento y demás insumos requeridos. Con la disponibilidad total de los recursos, se procedió con el inicio de las obras, las cuales fueron desarrolladas de acuerdo con lo previsto en la planeación. Estas actividades se ejecutaron de manera continua. El avance físico y administrativo se adelantó en relación al cronograma.

Tabla 10 Actividades Vía vereda La Alianza Sector El Rosario

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	

57

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	

58

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	

Fuente: AASING S.A.S

7.2.3 Vía que comunica la Vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas - Convenio ICCU 716 – 2024

Para el periodo en mención, en el frente de trabajo ya se han finalizado las actividades constructivas el día 17 de agosto de 2025 de acuerdo a las actividades y recursos aprobados en el modificatorio No.1

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

7.2.4 Vía que comunica la Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro

Para el periodo en mención, en el frente de trabajo ya se han finalizado las labores constructivas de acuerdo a las actividades y recursos aprobados mediante el modificatorio No.1

7.2.5 Vía que comunica la Vereda Guarumal Sector el Moro

Durante el periodo, se finalizaron las actividades en este frente de trabajo. Para ello, se dispuso en el sitio el material necesario para la ejecución incluyendo el acero de refuerzo, cemento y demás insumos requeridos. Con la disponibilidad total de los recursos, se procedió con el inicio de las obras, las cuales fueron desarrolladas de acuerdo con lo previsto en la planeación. Estas actividades se ejecutaron de manera continua. El avance físico y administrativo se adelantó en relación al cronograma avalado por parte de esta interventoria.

Tabla 11 Actividades Vía vereda Guarumal Sector el Moro

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	

60

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	

62


REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	

Fuente: AASING S.A.S

7.3 ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo de ejecución del proyecto, el tiempo fue favorable parta la ejecución de las actividades constructivas

Tabla 12.Control del clima periodo actual

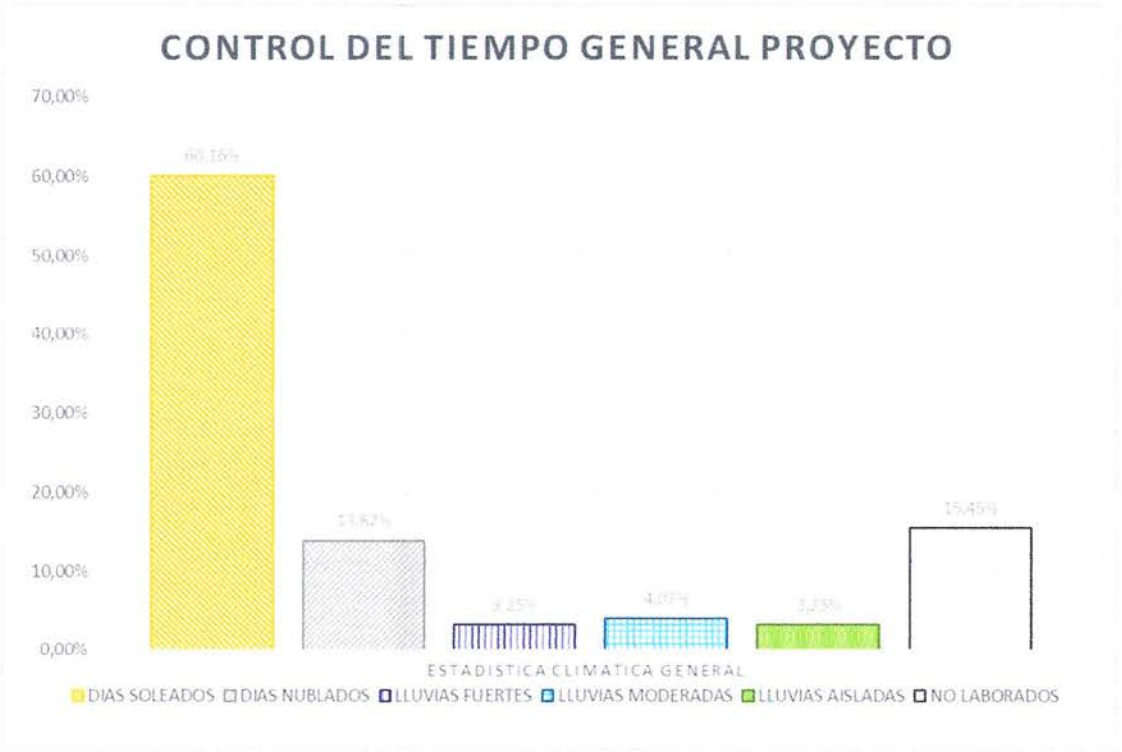

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

8 ASPECTOS SOCIALES

8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Con el objetivo de brindar atención y participación a la comunidad en el proyecto que se está ejecutando, se encuentra disponibilidad en la obra para recibir cualquier petición, queja y/o reclamos (PQR'S) con relación a la obra en ejecución. Este programa se implementa dado que, para AASING S.A.S., es muy importante la participación de la comunidad para la cual se está ejecutando el proyecto, durante el periodo no se presentó ninguna PQRS.

Dentro de la gestión social realizada por el contratista de obra se resalta la vinculación laboral de personas habitantes del municipio de la Vega.

Previo al inicio de las actividades constructivas, se llevó a cabo la socialización del proyecto con la comunidad, la cual manifestó una recepción favorable ante las obras ejecutadas.

8.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS

En el periodo correspondiente a este informe se realiza apoyo a actividades técnicas de obra.

Tabla 13.Plan de acompañamiento a actividades técnicas

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	OBSERVACIONES
Realizar acompañamiento en temas de conflictos con propietarios. Brindar apoyo en el momento de que se generen imprevistos en obra por parte de la comunidad. Dar información al residente de obra con respecto a propietarios directamente implicados con el proyecto. Ser partícipe y dar apoyo de las capacitaciones que se brinden al personal de obra en los diferentes temas. Apoyo en la socialización y recepción de firmas de actas de aprovechamiento forestal.	Realizar acompañamiento social en obra en las actividades técnicas, para que así se genere de la mejor manera y sin afectar a la comunidad ni al contratista	Se realiza acompañamiento al residente de obra al momento de resolver dudas e inquietudes con los propietarios. Se apoya en las capacitaciones de obra en temas referentes a SG-SST Se realiza acompañamiento a viviendas que sufrieron afectaciones debido a la ejecución de la obra.

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

9 ASPECTOS SG SST

Aspectos de sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro del proyecto:

9.1 PERSONAL DE OBRA

Para el inicio de las obras, se realizó la presentación de las hojas de vida del personal profesional de obra, conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato. Dicho personal ha hecho presencia en el sitio de la obra y se relaciona a continuación.

Tabla 14. Relación de personal de obra

PROFESIONAL
Director de obra
Residente de Obra
Ingeniero en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: AASING S.A.S

9.2 SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo del presente informe el contratista entrego a la interventoría los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social y ARL, es de aclarar que no se permitió el ingreso a la obra de ninguna persona sin la documentación antes mencionada.

9.3 DOTACIONES Y (EPP)

Al inicio de la obra el contratista entrega dotación y elementos de protección personal (EPP) a todo el personal que ingresó a trabajar en la obra; de igual manera a medida que nuevo personal ingresa a trabajar, se hará entrega de todos sus elementos de protección. En momento, los trabajadores cuentas con los siguientes elementos de protección personal: Casco amarillo, Botas de seguridad, gafas de seguridad, tapa oídos de inserción, tapabocas, guantes de carnaza.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el presente capítulo se relaciona las actas administrativas realizadas durante el desarrollo del contrato, al igual, las decisiones tomadas y los diferentes requerimientos realizados de la interventoría al contratista, al igual que las respuestas dadas por ellos, de igual forma se relacionan la correspondencia generada.

10.1 SEGUIMIENTO DE PROYECTO

Se relaciona el seguimiento del proyecto durante la ejecución de la obra en los siguientes aspectos:

10.1.1 Control de correspondencia

La correspondencia que a continuación se relaciona es la que se ha generado en el transcurso de la ejecución del proyecto; se menciona la correspondencia enviada y recibida de la supervisión u otra entidad.

Tabla 15 Relación - Correspondencia enviada

INFORME No 1			
No.	Fecha	Asunto	Destinatario
1	09-06-2025	Entrega cronograma, apu, hojas de vida personal mínimo requerido, pmt y soportes de maquinaria	Supervisión, interventoría
2	09-06-2025	Entrega pólizas acta de inicio contrato c-obra-161-2025	Supervisión,
3	11-06-2025	Entrega plan de seguridad y salud en el trabajo sst	Supervisión,
4	24-06-2025	Solicitud de aclaración de inclusión de iva en el valor del contrato de obra no. C-obra-161-2025	Supervisión,
5	24-06-2025	Subsanación de observaciones al plan del sg-sst del contrato de obra no. C-obra-161-2025	interventoría
INFORME No 2			
No.	Fecha	Asunto	Destinatario
6	11-07-2025	Solicitud aprobación modificatoria por adición en el valor, adición en tiempo e inclusión de ítems no previstos al al contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
6.1	11-07-2025	Entrega informe mensual de obra No.1	Interventoría
7	23-07-2025	No aplicación de protocolos de bioseguridad	Supervisión, interventoría
INFORME No 3			
8	19-08-2025	Entrega pólizas actualizadas a modificatorio No. 1 Contrato C-OBRA-161-2025	Supervisión, Interventoría

8.1	20-08-2025	Entrega cronograma de obra actualizado al modificatorio No. 1	Interventoría
9	27-08-2025	Entrega acta parcial No. 1 de obra solicitud de pago	Interventoría
		INFORME No. 4	
10	09-09-2025	Entrega informe mensual de obra No. 3	Interventoría
		INFORME No. 5 - TERMINACIÓN	
11	06-10-2025	Entrega informe mensual de obra No.4	Interventoría

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 16 Relación - Correspondencia recibida

INFORME No. 1			
No.	Fecha	Asunto	Remitente
1	06-06-2025	Solicitud de información inicial para el desarrollo del contrato de obra no. 161-2025 (placa huella vereda Naguy Alto y vereda La Alianza)	Interventoría
2	18-06-2025	Val y entrega de hojas de vida, programación de obra, análisis de precios unitarios y PMT contrato de obra c-obra-154-2025	Interventoría
3	12-06-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 01 de fecha 11 de junio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 02 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
4	18-06-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 02 de fecha 18 de junio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 03 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
5	24-06-2025	Respuesta al oficio CTO 161-2025-004 del 24 de junio de 2025 solicitud de aclaración de IVA en el valor del contrato de obra no. C-obra-161-2025	Interventoría
6	25-06-2025	Aval y entrega de plan SG SST para el contrato de obra c-obra-161-2025	Interventoría
		INFORME No. 2	
No.	Fecha	Asunto	Remitente
7	14-07-2025	Previstos y adición en valor y tiempo No.1 contrato de obra No. 161-2025	Interventoría
8	18-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 04 de fecha 09 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 05 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
9	18-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 05 de fecha 16 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 06 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
10	24-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 06 de fecha 23 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 07 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
11	24-07-2025	Aval y entrega informe mensual de avance No.1 c-obra-161-2025	Interventoría

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

12	02-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 07 de fecha 30 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 08 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
		INFORME No. 3	
13	06-08-2025	Aval comunicado cto 161-2025-007 – "NO APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD"	Interventoría
14	08-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 08 de fecha 06 de agosto de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 09 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
15	13-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 09 de fecha 13 de agosto de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 10 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
15.1	15-08-2025	Aval y entrega informe mensual de avance no.2 c-obra-161-2025	Interventoría
15.2	25-08-2025	Aval y entrega cronograma de obra actualizado a modificatorio no.1 del contrato de obra c-obra-161-2025	Interventoría
16	27-08-2025	Aval y entrega acta parcial no. 1 c-obra-161-2025	Interventoría
17	01-09-2025	Entrega de acta comité de obra no. 10 de fecha de 20 de agosto de 2025, entrega acta comité de obra no. 11 y compromisos de fecha 27 de agosto de 2025, y citación al próximo comité de obra no. 11 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
		INFORME No. 4	
18	08-09-2025	Entrega de acta comité de obra no. 12 de fecha de 03 de septiembre de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 13 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
19	16-09-2025	Aval y entrega de informe mensual de avance No. 3 C-OBRA-161-2025	Interventoría
20	26-09-2025	Entrega de acta comité de obra no. 13 de fecha de 24 de septiembre de 2025 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
		INFORME No. 5 - TERMINACIÓN	
21	08-10-2025	Aval y entrega de informe mensual de avance No. 4 C-OBRA-161-2025	Interventoría

Fuente: AASING S.A.S

10.1.2 Control comités

Durante el periodo se llevaron a cabo los siguientes comités de obra.

Tabla 17 Relación – comité de obra

INFORME No 1		
No.	Fecha	Asunto
01	11/06/2025	Comité de seguimiento de las actividades
02	18/06/2025	Comité de seguimiento de las actividades
03	25/06/2025	Comité de seguimiento de las actividades
INFORME No 2		
No.	Fecha	Asunto

04	09/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
05	16/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
06	23/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
07	30/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
		INFORME No 3
08	06/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
09	13/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
10	20/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
11	27/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
		INFORMES No. 4
12	03/09/2025	Comité de seguimiento de las actividades
13	24/09/2025	Comité de seguimiento de las actividades
		INFORMES No. 5
		No se realizaron comités durante el periodo

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

11 CONCLUSIONES

11.1 ASPECTOS TÉCNICOS

- A la fecha el avance general de obra es de un 100% ejecutado frente al 96,40% programado representado en la ejecución de actividades contractuales.

- Para cada uno de los sectores de intervención se cuenta con el siguiente avance de obra:

Tabla 18 Avance de obra en sitios de intervención

SITIO DE INTERVENCIÓN	AVANCE DE OBRA
Vereda Hoya grande Sector la Ye el Descanso Convenio 707	100,00%
Vereda La Alianza Sector el Rosario Convenio738	100,00%
Vereda Hoya Grande sector Cuatro Esquinas Convenio 716	100,00%
Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro	100,00%
Vereda Guarumal Sector el Moro	100,00%

Fuente: AASING S.A.S

- A la fecha se han finalizados los procesos constructivos en el convenio ICCU 707 -2024, convenio ICCU 716-2024, convenio ICCU 738-2024, frente vereda Naguy alto Sector Monte Oscuro y , Vereda Guarumal Sector el Moro correspondientes a el suministro, figurado y armado de acero de refuerzo, conformación de calzada, localización y replanteo, instalación de subbsae, demoliciones, la fundida de concretos clase D, concretos ciclópeos en 2500 psi, excavaciones manuales, concretos de cunetas y transporte de materiales Por lo cual se finalizaron las labores constructivas en los frentes de trabajo en mención

- El clima presentado en el transcurso del proyecto ha sido favorable para la ejecución de las actividades.

  - Durante el periodo del presente informe de terminación se suscribió el acta de recibo final de cantidades teniendo en cuenta que las actividades finalizaron.

11.2 ASPECTOS SG-SST

- Durante este periodo de ejecución de actividades se mantuvo el personal afiliado al sistema de seguridad (ARL, EPS y pensión), de igual modo el personal contó con su respectiva dotación de elementos de protección personal.

71

11.3 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se supervisaron las actividades diarias, con el fin de generar el menor impacto de contaminación posible, control de desechos orgánicos e inorgánicos y contaminación visual, además de mitigar del impacto frente a los vecinos colindantes a cada uno.

111

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

73

LA VEGA	ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 161-2025	AASING S.A.S

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 161-2025

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA / CONVENIO No. : C-OBRA-No. 161-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA : PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

SUPERVISOR: LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO

FECHA DE PRESENTE ACTA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INTERVENTORIA : AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

CONTRATO INTERVENTORIA /CONVENIO No. : C-INTERV-179-2025

N°	CODIGOS UNSPC	CODIGOS CPC	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES CANTIDAD ACTUALIZADA	MENORES CANTIDADES VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES CANTIDAD	MAYORES CANTIDADES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES VALOR TOTAL
					1. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA Y EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024													
1	72141511	54211	ICCU 2.13	600,4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,97	80.643,00	723.367,71	29,84	80.643,00	2.406.387,12	0,00	-378,32	0,00	0,00	29,84	2.406.008,80
2	30102217	54211	ICCU 4.6	630,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3	45,10	1.007.556,00	45.440.775,60	36,45	1.007.556,00	36.725.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	36.725.416,20
3	30102217	54211	ICCU 4.23	630,7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	22,70	686.207,00	15.576.898,90	25,01	686.207,00	17.162.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	17.162.037,07
4	30102217	54211	ICCU 4.21	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	16,95	830.781,00	14.081.737,95	21,63	830.781,00	17.969.793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	17.969.793,03
5	11101704	54211	ICCU 4.52	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.263,14	10.433,00	34.044.339,62	3.412,62	10.433,00	35.603.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,62	35.603.864,46
					Ajuste al peso							-378,10	0,00	0,00	0,00	378,32		0,22
					SUB-TOTAL				**109.867.119,78**			**109.867.119,78**						**109.867.119,78**
					1. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA Y EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024													
					ITEM´S NO PREVISTOS													
6			ICCU 8.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		540,68	1.541,00	833.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	540,68	833.187,88
7			NP		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		540,68	2.548,00	1.377.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	540,68	1.377.652,64
8			ICCU 1.1	201 P	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	M3		$ 285.813,00		1,00	285.813,00	285.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	285.813,00
9			ICCU 1.8		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		581,88	2.308,00	1.342.979,04	0,00	-0,77	0,00	0,00	581,88	1.342.978,27
10			ICCU 16.12		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		18,02	223.558,00	4.028.515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	4.028.515,16
					Ajuste al peso							0,01						0,78
					SUB-TOTAL				**0,00**			**7.868.147,73**						**7.868.147,73**
					SUB-TOTAL OBRAS				**109.867.119,78**			**117.735.267,51**						**117.735.267,51**

N°	CODIGOS UNSPC	CODIGOS CPC	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES CANTIDAD ACTUALIZADA	MENORES CANTIDADES VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES VALOR TOTAL
					2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024													
1	72141511	54211	ICCU 2.13	600,4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	16,30	80.643,00	1.314.480,90	170,04	80.643,00	13.712.535,72	-126,94	-10.228.490,44	0,00	0,00	43,20	3.484.045,28
2	30102217	54211	ICCU 4.6	630,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3	82,00	1.007.556,00	82.619.592,00	52,16	1.007.556,00	52.554.120,96	0,00	0,00	10,91	10.992.939,74	63,07	63.547.060,70
3	30102217	54211	ICCU 4.25	630,7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	41,28	686.207,00	28.326.624,96	71,49	686.207,00	49.056.938,43	-12,39	-8.574.156,48	0,00	0,00	59,00	40.482.781,97
4	30102217	54211	ICCU 4.21	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	30,82	830.781,00	25.604.670,42	34,25	830.781,00	28.454.249,25	0,00	0,00	3,04	2.523.081,90	37,29	30.977.331,15
5	11101704	54211	ICCU 4.52	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.932,42	10.433,00	61.892.937,86	5.365,68	10.433,00	55.980.139,44	0,00	0,00	506,75	5.286.947,79	5.872,43	61.267.087,23
					Ajuste al peso							322,34						-5,19
					SUB-TOTAL				**199.758.306,14**			**199.758.306,14**						**199.758.306,14**

74

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).

LA VEGA	ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 161-2025	AASING S.A.S

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 161-2025

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA — **CONTRATO DE OBRA / CONVENIO No. :** C-OBRA-No. 161-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA : PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS) — **SUPERVISOR:** LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO — **FECHA DE PRESENTE ACTA** 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INTERVENTORIA : AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS — **CONTRATO INTERVENTORIA /CONVENIO No. :** C-INTERV-179-2025

					2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024													
					ITEM´S NO PREVISTOS													
6			ICCU 6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		898,70	1.541,00	1.384.896,70	0,00	0,00	137,05	211.194,05	1.035,75	1.596.090,75
7			NP		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		1.102,30	2.548,00	2.808.660,40	-46,55	-169.569,40	0,00	0,00	1.035,75	2.639.091,00
8			ICCU 1.1	201 P	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	M3		$ 285.813,00		1,00	285.813,00	285.813,00	0,00	0,00	13,76	3.932.786,88	14,76	4.218.599,88
9			ICCU 1.6		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		3.029,52	2.308,00	6.992.132,16	-754,60	-1.741.826,00	0,00	0,00	2.274,92	5.250.306,16
10			ICCU 16.12		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		165,35	223.558,00	36.965.315,30	-8,99	-2.232.785,53	0,00	0,00	155,36	34.732.529,76
					Ajuste al peso							0,44						0,44
					SUB-TOTAL				0,00			48.436.819,00						48.436.818,00
					SUB-TOTAL OBRAS				199.758.306,14			248.195.124,14						248.195.124,14

Nº	CÓDIGOS UNSPC	CÓDIGOS CPC	ESPECIFICACIONES PARTICULARES	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los Rems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES CANTIDAD ACTUALIZADA	MENORES CANTIDADES VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES VALOR TOTAL
					3. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 716 - 2024													
1	72141511	54211	ICCU 2.13	600,49	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COHUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,38	80.643,00	837.074,34	21,50	80.643,00	1.733.743,86	0,00	0,00	21,50	1.733.497,12	21,50	1.733.497,12
2	30102217	54211	ICCU 4.6	630,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3	52,20	1.007.556,00	52.594.423,20	43,98	1.007.556,00	44.312.312,88	0,00	0,00	43,98	44.312.312,88	43,98	44.312.312,88
3	30102217	54211	ICCU 4.25	630,7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,27	686.207,00	18.026.657,89	18,85	686.207,00	12.935.001,95	0,00	0,00	18,08	12.406.622,56	18,08	12.406.622,56
4	30102217	54211	ICCU 4.21	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,62	830.781,00	16.299.923,22	31,53	830.781,00	26.194.524,93	0,00	0,00	31,53	26.194.524,93	31,53	26.194.524,93
5	11161704	54211	ICCU 4.52	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.777,54	10.433,00	39.411.074,82	4.195,14	10.433,00	43.767.895,62	0,00	0,00	4.075,74	42.522.195,42	4.075,74	42.522.195,42
					Ajuste al peso							-1.774.325,77				0,56		0,56
					SUB-TOTAL				127.169.153,47			127.169.153,47				127.169.153,47		127.169.153,47
					3. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 716 - 2024													
6			ICCU 6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		585,59	$ 1.541,00	902.394,19	0,00	0,00	585,59	902.394,19	585,59	902.394,19
7			NP		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		585,59	$ 2.548,00	1.492.083,32	0,00	0,00	585,59	1.492.083,32	585,59	1.492.083,32
			ICCU 1.1	201 P	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	M3		$ 285.813,00		2,00	$ 285.813,00	571.626,00	0,00	0,00	2,00	571.626,00	2,00	571.626,00
9			ICCU 1.6		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		419,23	$ 2.308,00	967.582,84	0,00	0,00	419,23	967.583,67	419,23	967.583,67
9			ICCU 16.12		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		87,84	$ 223.558,00	19.637.334,72	0,00	0,00	87,84	19.637.334,72	87,84	19.637.334,72
					Ajuste al peso							-0,07				-0,90		-0,90
					SUB-TOTAL				0,00			23.571.021,00				23.571.021,00		23.571.021,00
					SUB-TOTAL OBRAS				127.169.153,47			150.740.174,47				150.740.174,47		150.740.174,47

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).

ALCALDÍA LA VEGA	ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 161-2025	AASING S.A.S

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 161-2025

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA — **CONTRATO DE OBRA / CONVENIO No. :** C-OBRA-No. 161-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA : PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS) — **SUPERVISOR:** LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO — **FECHA DE PRESENTE ACTA** 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INTERVENTORIA : AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS — **CONTRATO INTERVENTORIA /CONVENIO No. :** C-INTERV-179-2025

Nº	CODIGOS		ESPECIFICACIONES	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1			MENORES CANTIDADES		ACTA PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
	UNSPC	CPC	PARTICULAR				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
					4. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA											0,00		
1	72141511	54211		600,4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		80.643,00		16,12	80.643,00	1.299.965,16	0,00	0,00	16,12	1.299.965,16	16,12	1.299.965,16
2	30102217	54211		630,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3		1.007.556,00		24,98	1.007.556,00	25.168.748,88	0,00	0,00	24,98	25.168.748,88	24,98	25.168.748,88
3	30102217	54211		630,7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3		686.207,00		22,23	686.207,00	15.254.381,61	0,00	0,00	22,23	15.254.381,61	22,23	15.254.381,61
4	30102217	54211		671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3		830.781,00		14,34	830.781,00	11.913.399,54	0,00	0,00	14,34	11.913.399,54	14,34	11.913.399,54
5	11101704	54211		640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		10.433,00		2.465,42	10.433,00	25.721.726,86	0,00	0,00	2.465,42	25.721.726,86	2.465,42	25.721.726,86
					Ajuste al peso				0,00			-0,05		0,00		-0,05	0,00	-0,05
6				310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		398,25	1.541,00	613.703,25	0,00	0,00	398,25	613.703,25	398,25	613.703,25
7					LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		398,25	2.548,00	1.014.741,00	0,00	0,00	398,25	1.014.741,00	398,25	1.014.741,00
				201 P	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	M3		$ 285.813,00		0,50	285.813,00	142.906,50	0,00	0,00	0,50	142.906,50	0,50	142.906,50
8					TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		314,34	2.308,00	725.496,72	0,00	0,00	314,34	725.496,72	314,34	725.496,72
9					SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		59,74	223.558,00	13.355.354,92	0,00	0,00	59,74	13.355.354,92	59,74	13.355.354,92
					Ajuste al peso							-0,39				-0,39		-0,39
					SUB-TOTAL OBRAS				**0,00**			**95.210.424,00**				**95.210.424,00**		**95.210.424,00**

Nº	CODIGOS		ESPECIFICACIONES	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTAULIZADAS MODIFICATORIO No.1			MENORES CANTIDADES		ACTA PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
	UNSPC	CPC	PARTICULAR				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
					5.MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA													
1	72141511	54211		600,4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		80.643,00		10,42	80.643,00	840.300,06	0,00	0,00		0,00	10,42	840.300,06
2	30102217	54211		630,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3		1.007.556,00		11,74	1.007.556,00	11.828.707,44	0,00	0,00		0,00	11,74	11.828.707,44
3	30102217	54211		630,7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3		686.207,00		9,41	686.207,00	6.457.207,87	0,00	0,00		0,00	9,41	6.457.207,87
4	30102217	54211		671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3		830.781,00		5,97	830.781,00	4.959.762,57	0,00	0,00		0,00	5,97	4.959.762,57
5	11101704	54211		640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		10.433,00		1.071,57	10.433,00	11.179.689,81	0,00	0,00	1.071,57	11.179.689,81	1.071,57	11.179.689,81
					Ajuste al peso							0,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6				310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		165,75	1.541,00	255.420,75	0,00	0,00		0,00	165,75	255.420,75
7					LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		165,75	2.548,00	422.331,00	0,00	0,00		0,00	165,75	422.331,00
				201 P	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	M3		$ 285.813,00		1,00	285.813,00	285.813,00	0,00	0,00		0,00	1,00	285.813,00
8					TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		203,19	2.308,00	468.962,52	0,00	0,00		0,00	400,81	925.062,52
9					SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		24,86	223.558,00	5.557.651,88	0,00	0,00		0,00	24,86	5.557.651,88
					Ajuste al peso							456.100,12						0,37
					SUB-TOTAL OBRAS				**0,00**			**42.711.947,27**						**42.711.947,27**
					VALOR TOTAL				**436.794.579,39**			**654.592.937,39**						**654.592.937,39**

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).

ALCALDÍA LA VEGA	ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 161-2025	AASING S.A.S

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 161-2025

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA / CONVENIO No. : C-OBRA-No. 161-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA : PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

SUPERVISOR: LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO

FECHA DE PRESENTE ACTA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INTERVENTORIA : AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

CONTRATO INTERVENTORIA /CONVENIO No. : C-INTERV-179-2025

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**436.794.579,39**
V/R ADICIONES:	**217.798.358,00**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**654.592.937,39**

FIRMA

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

FIRMA

Lorena Gómez.

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FIRMA

NOMBRE: LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ
Revisó y aprobó: SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / CON DELEGACION OTORGADA MEDIENTE EL DECRETO No.015 DEL 2024.

ORIGINAL: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2:

ACTA PARCIAL No.2 ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

ALCALDÍA DE LA VEGA	ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 161-2025	AASING S.A.S

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 161-2025

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA — **CONTRATO DE OBRA / CONVENIO No. :** C-OBRA-No. 161-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA : PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS) — **SUPERVISOR:** LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO — FECHA DE INICIO DE ACTA: 10 DE OCTUBRE DE 2025

INTERVENTORIA : AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS — **CONTRATO INTERVENTORIA /CONVENIO No. :** C-INTERV-179-2025

Nº	CÓDIGO UNSPSC	CPC	PARTIDA APU	CAPÍTULO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN (Correspondiente a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	AJUSTES Y MAYORES CANTIDADES PARA ACTA PARCIAL No. 2 TERMINACIÓN CANTIDAD ACTUALIZADA	AJUSTES Y MAYORES CANTIDADES PARA ACTA PARCIAL No. 2 TERMINACIÓN VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 2 - TERMINACIÓN CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 2 - TERMINACIÓN VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 2 - TERMINACIÓN VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACION CANTIDAD	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACION VALOR UNITARIO	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACION VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR VALOR TOTAL	TOTALES CANTIDAD	TOTALES VALOR TOTAL
					1. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024																							
1	72141511	54211	3001-2.13	600,49	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,97	80.643,00	723.367,71	29,84	80.643,00	2.406.387,12	0,00	239,52	29,84	80.643,00	2.406.208,80		80.643,00	0,00	29,84	80.643,00	2.406.208,80	0,00	239,52	29,84	2.406.208,80
2	30101217	54211	3001-4.4	630,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3	45,10	1.007.556,00	45.440.773,60	36,45	1.007.556,00	36.725.418,20	0,00	0,00	36,45	1.007.556,00	36.725.418,20		1.007.556,00	0,00	36,45	1.007.556,00	36.725.418,20	0,00	0,00	36,45	36.725.418,20
3	30101217	54211	3001-4.25	630,7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAÓN PARA BASES	M3	22,70	686.207,00	15.576.898,90	25,01	686.207,00	17.162.027,07	0,00	0,00	25,01	686.207,00	17.162.027,07		686.207,00	0,00	25,01	686.207,00	17.162.027,07	0,00	0,00	25,01	17.162.027,07
4	30101217	54211	3001-4.21	670,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PLANCHA EN EL LUGAR	M3	16,95	830.781,00	14.081.737,95	21,62	830.781,00	17.969.792,03	0,00	0,00	21,62	830.781,00	17.969.792,03		830.781,00	0,00	21,62	830.781,00	17.969.792,03	0,00	0,00	21,62	17.969.792,03
5	31151704	54211	3001-4.31	640,1	SUMINISTRO FISURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.263,16	10.433,00	34.041.229,64	3.412,42	10.433,00	35.603.864,46	0,00	0,00	3.412,42	10.433,00	35.603.864,46		10.433,00	0,00	3.412,42	10.433,00	35.603.864,46	0,00	0,00	3.412,42	35.603.864,46
					Ajuste al peso							-374,10					-374,10						0,00				0,00	
					SUB-TOTAL				109.867.119,78			109.867.119,78					109.666.741,48	0,00					109.867.119,78	0,00	0,00		109.867.119,78
					1. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024																									
					ITEM'S NO PREVISTOS																							
6			3001-6.1	710,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		540,68	1.541,00	833.187,88	0,00	0,00	540,68	1.541,00	833.187,88		1.541,00	0,00	540,68	1.541,00	833.187,88	0,00	0,00	540,68	833.187,88
7			NP		LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		540,68	2.548,00	1.377.652,64	0,00	0,00	540,68	2.548,00	1.377.652,64		2.548,00	0,00	540,68	2.548,00	1.377.652,64	0,00	0,00	540,68	1.377.652,64
8			3001-3.1	210,1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM)	M3		$ 285.813,00		1,00	285.813,00	285.813,00	0,00	0,00	1,00	285.813,00	285.813,00		285.813,00	0,00	1,00	285.813,00	285.813,00	0,00	0,00	1,00	285.813,00
9			3001-3.6		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DISFRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		581,88	2.308,00	1.342.978,04	0,00	0,77	582,88	2.308,00	1.345.978,27		2.308,00	0,00	581,88	2.308,00	1.342.978,27	0,00	0,77	581,88	1.342.978,27
10			3001-14.12		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		18,02	223.558,00	4.028.515,16	0,00	0,00	18,02	223.558,00	4.028.515,16		223.558,00	0,00	18,02	223.558,00	4.028.515,16	0,00	0,00	18,02	4.028.515,16
					Ajuste al peso							0,01					0,00						0,00				0,01	
					SUB-TOTAL				0,00			7.868.147,73					7.868.146,96	0,00					7.868.147,73	0,00	0,00		7.868.147,73
					SUB-TOTAL OBRAS				109.867.119,78			117.735.267,51					117.734.888,42	0,00					117.735.267,51	0,00	0,00		117.735.267,51

Nº	CÓDIGO UNSPSC	CPC	PARTIDA APU	CAPÍTULO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN (Correspondiente a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	AJUSTES Y MAYORES CANTIDADES PARA ACTA PARCIAL No. 2 TERMINACIÓN CANTIDAD ACTUALIZADA	AJUSTES Y MAYORES CANTIDADES PARA ACTA PARCIAL No. 2 TERMINACIÓN VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 2 - TERMINACIÓN CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 2 - TERMINACIÓN VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 2 - TERMINACIÓN VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACION CANTIDAD	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACION VALOR UNITARIO	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACION VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR VALOR TOTAL	TOTALES CANTIDAD	TOTALES VALOR TOTAL
					2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024																							
1	72141511	54211	3001-2.13	600,49	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	16,30	80.643,00	1.314.480,90	170,04	80.643,00	13.712.595,72	-124,84	-10.068.440,44	43,20	80.643,00	3.484.045,28	126,84	80.643,00	10.228.490,44	170,04	80.643,00	13.712.535,72	126,84	10.228.490,44	43,20	3.484.045,28
2	30101217	54211	3001-4.4	630,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3	82,00	1.007.556,00	82.619.592,00	52,16	1.007.556,00	52.554.120,96	-10,91	-10.992.939,74	63,07	1.007.556,00	63.547.060,70	32,93	1.007.556,00	33.174.938,24	-10,91	-10.992.939,74	63,07	63.547.060,70
3	30101217	54211	3001-4.25	630,7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAÓN PARA BASES	M3	41,28	686.207,00	28.326.604,96	71,49	686.207,00	49.056.558,43	12,50	8.574.136,46	59,00	686.207,00	40.482.781,97	31,80	686.207,00	21.818.644,28	17,87	686.207,00	12.260.417,46	12,50	8.574.136,46	59,00	40.482.781,97
4	30101217	54211	3001-4.21	670,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PLANCHA EN EL LUGAR	M3	30,82	830.781,00	25.604.670,42	34,23	830.781,00	28.454.249,25	3,94	3.273.081,30	37,29	830.781,00	30.977.331,15	23,71	830.781,00	21.180.955,77	13,58	830.781,00	11.277.975,38	3,94	3.273.081,30	37,29	30.977.331,15
5	31151704	54211	3001-4.31	640,1	SUMINISTRO FISURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.932,42	10.433,00	61.892.937,86	5.305,68	10.433,00	55.350.139,44	-506,75	-5.286.947,79	5.812,43	10.433,00	61.267.087,23	506,75	10.433,00	5.286.947,79	5.305,68	10.433,00	55.350.139,44	-506,75	-5.286.947,79	5.812,43	61.267.087,23
					Ajuste al peso							592,34					722,34						-0,10				-0,10	
					SUB-TOTAL				199.758.306,14			199.758.306,14					198.758.829,67			63.810.699,67			135.670.809,47				199.758.306,14
					2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024																									
					ITEM'S NO PREVISTOS																							
6			3001-6.1	710,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		898,70	1.541,00	1.384.886,75	137,05	211.144,05	1.035,75	1.541,00	1.596.030,75	432,90	1.541,00	670.945,80	137,05	211.144,05	1.035,75	1.596.030,75
7			NP		LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		1.102,30	2.548,00	2.808.680,40	169,45	169.509,40	1.035,75	2.548,00	2.639.591,00	424,20	2.548,00	1.081.401,60	66,55	169.509,40	1.035,75	2.639.591,00
8			3001-3.1	210,1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM)	M3		$ 285.813,00		14,76	285.813,00	4.218.599,88	-13,76	-3.932.786,88	1,00	285.813,00	285.813,00	1,00	285.813,00	285.813,00	1,00	285.813,00	285.813,00	-13,76	-3.932.786,88	14,76	4.218.599,88
9			3001-3.6		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DISFRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		3.029,32	2.308,00	6.992.132,16	-754,60	-1.741.626,00	2.274,92	2.308,00	5.250.506,16	1.041,54	2.308,00	2.403.865,12	1.233,38	2.308,00	2.846.641,04	754,60	1.741.626,00	2.274,92	5.250.506,16
10			3001-14.12		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		165,35	223.558,00	36.965.515,30	0,00	-2.230.787,52	158,36	223.558,00	34.732.529,78	44,30	223.558,00	14.700.127,94	30,88	223.558,00	12.295.356,84	0,00	2.230.787,52	155,36	34.732.529,78
					Ajuste al peso							0,44					0,44						0,01				0,01	
					SUB-TOTAL				0,00			49.439.818,00					48.436.818,01			22.798.621,77			25.638.196,23		0,00		48.436.818,00
					SUB-TOTAL OBRAS				199.758.306,14			248.195.124,14					248.195.446,68			86.618.321,44			161.576.962,70		0,00		248.195.124,14

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).

ALCALDÍA LA VEGA | ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 161-2025 | AASING S.A.S

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 161-2025

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA / CONVENIO No. : C-OBRA-No. 161-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 727 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA : PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

SUPERVISOR: LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO

FECHA DE PRESENTE ACTA 10 DE OCTUBRE DE 2025

INTERVENTORIA : AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

CONTRATO INTERVENTORIA /CONVENIO No. : C-INTERV-179-2025

Nº	CÓDIGOS UNSPSC	CÓDIGOS ESPECIFICACIONES UNIFORMES	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	VARIACIÓN Y DIFERENCIA CANTIDADES ENTRE ACTA PARCIAL No. 1 Y TERMINACIÓN CANTIDAD ACTUALIZADA	VARIACIÓN Y DIFERENCIA CANTIDADES ENTRE ACTA PARCIAL No. 1 Y TERMINACIÓN VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 - TERMINACIÓN CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 - TERMINACIÓN VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 - TERMINACIÓN VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACIÓN CANTIDAD	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACIÓN VALOR UNITARIO	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACIÓN VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR VALOR TOTAL	TOTALES CANTIDAD	TOTALES VALOR TOTAL
				3. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 716 - 2024																						
2	72141501	54211	300U 2.13	600,69	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,38	80.643,00	837.074,34	21,50	80.643,00	1.733.743,85	0,00	246,74	21,50	80.643,00	1.733.497,12		80.643,00	0,00	21,50	80.643,00	1.733.497,12	0,00	246,74	21,50	1.733.497,12
3	39101617	54211	300U 4.8	606,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3	52,20	1.007.556,00	52.594.423,20	43,98	1.007.556,00	44.312.392,88	0,00	0,00	43,98	1.007.556,00	44.312.392,88	1.767.156,00	0,00	-43,98	1.007.556,00	44.312.392,88	0,00	0,00	43,98	44.312.392,88
3	39101617	54211	300U 4.8	606,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3	52,20	1.007.556,00	52.594.423,20	43,98	1.007.556,00	44.312.392,88	0,00	520.379,39	43,98	1.007.556,00	44.312.392,88	686.207,00	0,00	-14,08	686.207,00	12.406.622,56	0,00	520.379,39	15,08	12.406.622,56
3	39101617	54211	300U 4.21	606,7	CONCRETO CICLOPEO, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	26,27	686.207,00	18.026.657,89	18,80	686.207,00	12.905.001,95	-6,73	620.779,39	18,08	686.207,00	12.406.622,56	686.207,00	0,00	-14,08	686.207,00	12.406.622,56	0,00	0,00	18,08	12.406.622,56
3	39101617	54211	300U 4.21	606,7	CONCRETO CICLOPEO, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	26,27	686.207,00	18.026.657,89	18,80	686.207,00	12.905.001,95	-6,73	620.779,39	31,53	830.781,00	26.194.524,93	830.781,00	0,00	5,26	830.781,00	26.194.524,93	0,00	0,00	31,53	26.194.524,93
4	39101617	54211	300U 4.21	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,62	830.781,00	16.299.923,22	31,53	830.781,00	26.194.524,93	11,91	1.245.750,20	19,62	830.781,00	16.299.923,22	1.077.531,00	0,00	-5,26	830.781,00	26.194.524,93	0,00	0,00	31,53	26.194.524,93
4	39101617	54211	300U 4.21	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,62	830.781,00	16.299.923,22	31,53	830.781,00	26.194.524,93	11,91	1.245.750,20	4.015,74	10.433,00	41.907.195,42	10.433,00	0,00	4.015,74	10.433,00	41.907.195,42	0,00	1.245.750,20	4.015,74	42.502.195,42
5	31201704	54211	300U 4.32	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.777,54	10.433,00	39.411.074,82	4.195,14	10.433,00	43.767.895,62	139,48	1.245.750,20	4.015,74	10.433,00	42.502.195,42									0,00
					Ajuste al peso							-1.774.375,77					0,36			0,00		0,00			0,00	0,00
					SUB-TOTAL				127.169.153,47			127.169.153,47					127.169.153,47			0,00		127.169.153,47		0,00		127.169.153,47
					3. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 716 - 2024																						
6			300U 6.1	310,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		585,59	$ 1.541,00	902.394,19	0,00	0,00	585,59	1.541,00	902.394,19	1.541,00	0,00	585,59	1.541,00	902.394,19	0,00	0,00	585,59	902.394,19
6			NP		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		585,59	$ 2.548,00	1.492.080,32	0,00	0,00	585,59	2.548,00	1.492.080,32	2.548,00	0,00	585,59	2.548,00	1.492.080,32	0,00	0,00	585,59	1.492.080,30
7			300U 5.1	201 P	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 5 KM.)	M3		$ 285.813,00		2,00	$ 285.813,00	571.626,00	0,00	0,00	2,00	285.813,00	571.626,00	285.813,00	0,00	0,00	285.813,00	571.626,00	0,00	0,00	2,00	571.626,00
8			300U 5.8		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		419,23	$ 2.308,00	967.582,84	0,00	0,83	419,23	2.308,00	967.582,67	2.308,00	0,00	419,23	2.308,00	967.582,67	0,00	-0,83	419,23	967.582,67
9			300U 16.12		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		87,84	$ 223.558,00	19.637.324,72	0,00	0,00	87,84	223.558,00	19.637.324,72							0,00	0,00	87,84	19.637.324,72
					Ajuste al peso				0,00			23.571.021,00					0,07			0,00		23.571.021,83		0,00		23.571.021,00
					SUB-TOTAL				122.169.153,47			150.740.174,47					23.571.021,83			0,00		150.740.174,47		0,00		150.740.174,47
					SUB-TOTAL OBRAS																					

Nº	CÓDIGOS UNSPSC	CÓDIGOS ESPECIFICACIONES UNIFORMES	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	VARIACIÓN Y DIFERENCIA CANTIDADES ENTRE ACTA PARCIAL No. 1 Y TERMINACIÓN CANTIDAD ACTUALIZADA	VARIACIÓN Y DIFERENCIA CANTIDADES ENTRE ACTA PARCIAL No. 1 Y TERMINACIÓN VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 - TERMINACIÓN CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 - TERMINACIÓN VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 1 - TERMINACIÓN VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACIÓN CANTIDAD	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACIÓN VALOR UNITARIO	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACIÓN VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR VALOR TOTAL	TOTALES CANTIDAD	TOTALES VALOR TOTAL
				4. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA																						
1	72141501	54211	300U 2.13	600,69	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		80.643,00		16,12	80.643,00	1.299.965,16	0,00	0,00	16,12	80.643,00	1.299.965,16	80.643,00	0,00	0,00	80.643,00	1.299.965,16	0,00	0,00	16,12	1.299.965,16
2	39101617	54211	300U 4.8	606,4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3		1.007.556,00		24,98	1.007.556,00	25.168.748,88	0,00	0,00	24,98	1.007.556,00	25.168.748,88	1.007.556,00	0,00	0,00	1.007.556,00	25.168.748,88	0,00	0,00	24,98	25.168.748,88
3	39101617	54211	300U 4.21	606,7	CONCRETO CICLOPEO, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3		686.207,00		22,23	686.207,00	15.254.381,61	0,00	0,00	22,23	686.207,00	15.254.381,61	686.207,00	0,00	0,00	686.207,00	15.254.381,61	0,00	0,00	22,23	15.254.381,61
4	39101617	54211	300U 4.21	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3		830.781,00		14,34	830.781,00	11.913.399,54	0,00	0,00	14,34	830.781,00	11.913.399,54	830.781,00	0,00	0,00	830.781,00	11.913.399,54	0,00	0,00	14,34	11.913.399,54
5	31201704	54211	300U 4.32	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		10.433,00		2.465,42	10.433,00	25.721.726,86	0,00	0,00	2.465,42	10.433,00	25.721.726,86	10.433,00	0,00	0,00	10.433,00	25.721.726,86	0,00	0,00	2.465,42	25.721.726,86
					Ajuste al peso						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6			300U 6.1	310,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		398,25	1.541,00	613.703,25	0,00	0,00	398,25	1.541,00	613.703,25	1.541,00	0,00	398,25	1.541,00	613.703,25	0,00	0,00	398,25	613.703,25
7			NP		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		398,25	2.548,00	1.014.741,00	0,00	0,00	398,25	2.548,00	1.014.741,00	2.548,00	0,00	398,25	2.548,00	1.014.741,00	0,00	0,00	398,25	1.014.741,00
8			300U 5.1	201 P	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 5 KM.)	M3		$ 285.813,00		0,50	285.813,00	142.906,50	0,00	0,00	0,50	285.813,00	142.906,50	285.813,00	0,00	0,00	285.813,00	142.906,50	0,00	0,00	0,50	142.906,50
9			300U 5.8		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		314,34	2.308,00	725.496,72	0,00	0,00	314,34	2.308,00	725.496,72	2.308,00	0,00	314,34	2.308,00	725.496,72	0,00	0,00	314,34	725.496,72
10			300U 16.12		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.558,00		59,74	$ 223.558,00	13.355.354,92	0,00	0,00	59,74	223.558,00	13.355.354,92							0,00	0,00	59,74	13.355.354,92
					Ajuste al peso				0,00			95.210.424,00					0,08			0,00		95.210.424,00		0,00		95.210.424,00
					SUB-TOTAL OBRAS																					

Fecha documento no consultivo vacíos no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Isolucion).

80

ALCALDÍA LA VEGA | ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 161-2025 | AASING S.A.S

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 161-2025

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA — **CONTRATO DE OBRA / CONVENIO No. :** C-OBRA-No. 161-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA : PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS) — **SUPERVISOR:** LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO — **FECHA DE PRESENTE ACTA** 10 DE OCTUBRE DE 2025

INTERVENTORIA : AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS — **CONTRATO INTERVENTORIA /CONVENIO No. :** C-INTERV-179-2025

ÍTEM	CODIGOS SISPT	CODIGOS UPC	ESPECIFICACIONES EN PARTICULAR	CÓDIGO DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 VALOR TOTAL	CANTIDADES Y MONTOS CONSIGNADOS PARA ACTA PARCIAL No. 2 TERMINACION CANTIDAD ACTUAL (CORTE)	CANTIDADES Y MONTOS CONSIGNADOS PARA ACTA PARCIAL No. 2 TERMINACION VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 2 - TERMINACION CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 2 - TERMINACION VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA PARCIAL No. 2 - TERMINACION VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACION CANTIDAD	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACION VALOR UNITARIO	PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DE TERMINACION VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR UNITARIO	ACTA PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR VALOR TOTAL	TOTALES CANTIDADES	TOTALES VALOR TOTAL
					SANEAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUANUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA																							
1	7294303	94211	3000 2.03	608.47	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		80.642,00		10,42	80.643,00	840.300,06	0,00	0,00	10,42	80.643,00	840.300,06	10,42	80.643,00	840.300,06			0,00	0,00	0,00	10,42	840.300,06
2	3000207	94211	3000 4.6	630.4	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3		1.007.556,00		11,74	1.007.556,00	11.828.707,44	0,00	0,00	11,74	1.007.556,00	11.828.707,44	11,74	1.007.556,00	11.828.707,44			0,00	0,00	0,00	11,74	11.828.707,44
3	3000207	94211	3000 4.05	630.2	CONCRETO CICLOPEO, 2000 PSI 40% RAZÓN PARA BASES	M3		686.207,00		9,41	686.207,00	6.457.207,87	0,00	0,00	9,41	686.207,00	6.457.207,87	9,41	686.207,00	6.457.207,87			0,00	0,00	0,00	9,41	6.457.207,87
4	3000207	94211	3000 4.01	601.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3		830.781,00		5,97	830.781,00	4.959.762,57	0,00	0,00	5,97	830.781,00	4.959.762,57	5,97	830.781,00	4.959.762,57			0,00	0,00	0,00	5,97	4.959.762,57
5	1000709	94211	3000 4.50	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		10.433,00		1.071,57	10.433,00	11.179.689,81	0,00	0,00	1.071,57	10.433,00	11.179.689,81			0,00	1.071,57	10.433,00	11.179.689,81	0,00	0,00	1.071,57	11.179.689,81
					Ajuste al peso					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			3000 6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.541,00		165,75	1.541,00	255.420,75	0,00	0,00	165,75	1.541,00	255.420,75	165,75	1.541,00	255.420,75			0,00	0,00	0,00	165,75	255.420,75
7			AIP		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.548,00		165,75	2.548,00	422.331,00	0,00	0,00	165,75	2.548,00	422.331,00	165,75	2.548,00	422.331,00			0,00	0,00	0,00	165,75	422.331,00
			0000 1.1	201 P	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	M3		$ 285.813,00		1,00	285.813,00	285.813,00	0,00	0,00	1,00	285.813,00	285.813,00	1,00	285.813,00	285.813,00			0,00	0,00	0,00	1,00	285.813,00
8			3000 1.6	805-A08	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3-KM		$ 2.308,00		200,19	2.308,00	462.482,52	197,62	456.100,00	400,81	2.308,00	925.082,52	400,81	2.308,00	925.082,52			0,00	197,62	-456.100,00	400,81	925.082,52
9			3000 10.10		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 223.550,00		24,86	223.550,00	5.557.651,88	0,00	0,00	24,86	223.550,00	5.557.651,88			0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	5.557.651,88
					Ajuste al peso							496.100,12		0,00			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					SUB-TOTAL OBRAS				0,00			42.711.947,27					42.711.947,27			11.552.257,95			11.179.689,32		-456.100,00		42.711.947,27
					VALOR TOTAL				436.794.579,39			654.592.937,39					654.592.937,39			119.150.579,39			538.442.358,00		-456.100,00		654.592.937,39
																				27,05%			81,95%				

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**436.794.579,39**
V/R ADICIONES:	**217.798.358,00**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**654.592.937,39**

La presente acta se firma el el Municipio de la Vega Cundinamarca por quien en ella intervinieron el dia 10 de octubre de 2025

RESUMEN FINANCIERO

DESCRIPCION Y DETALLE	VALORES EN EL CONTRATO	AIU	VALOR COSTO DIRECTO	VALOR AIU	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL	RECURSOS DE:
CONTRATO DE OBRA RECURSOS CONVENIO **ICCU 707-2024** (VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO)	109.867.119,78	33,00%	82.809.808,98	27.260.282,80	0,00	
RECURSO MUNICIPIO DE LA VEGA CONTRATO 161 - 2025 (VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO)	7.868.147,73	33,00%	5.915.900,68	1.952.247,10	0,00	
CONTRATO DE OBRA RECURSOS CONVENIO **ICCU 738-2024** (VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO)	166.758.308,14	33,00%	160.184.215,14	40.854.591,00	83.919.608,87	CONVENIO 738 DE 2024
RECURSO MUNICIPIO DE LA VEGA CONTRATO 161 - 2025 (VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO)	45.456.616,30	33,00%	36.415.662,16	12.016.157,95	22.796.621,77	MUNICIPIO LA VEGA
CONTRATO DE OBRA RECURSOS CONVENIO **ICCU 716-2024** (VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS)	127.159.153,47	33,00%	95.615.604,86	31.553.248,61	0,00	
RECURSO MUNICIPIO DE LA VEGA CONTRATO 161 - 2025 (VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS)	23.871.021,00	33,00%	17.722.572,16	5.848.448,82	0,00	
CONTRATO DE OBRA 161 DE 2025 RECURSOS MUNICIPIO (VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO)	95.210.424,90	33,00%	71.581.784,96	23.628.639,94	0,00	
CONTRATO DE OBRA 161 DE 2025 RECURSOS MUNICIPIO (VEREDA GUANUMAL BAJO SECTOR EL MORO)	42.711.947,27	33,00%	32.114.246,07	10.597.701,20	31.532.257,85	MUNICIPIO LA VEGA
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 154 DE 2025 (INCLUIDA LA ADICION No. 1)	**654.592.837,39**					
				VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2 - TERMINACION	**119.150.579,39**	
				% del ACTA PARCIAL No. 2	**18,05%**	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No.2 DE TERMINACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA 161-2025: CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($118.150.579,39)

FIRMA

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

FIRMA

Lorena Gomez

NOMBRE: DIGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FIRMA

NOMBRE: LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Revisó y aprobó: SUPERVISOR CONTRATO/ SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ORIGINAL: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Isolucion).

1120

MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL 02 ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES CONVENIO ICCU 738-2024

92

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1121

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 738-2024

CAPÍTULO	1	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

CONVENIO ICCU 738 DE 2024 / TRAMO 1 de 2 : VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho 2	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	69,00 mts
Ancho de La Viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	**207,15** mts
Rampa No. 1	0,00 mts
Rampa No. 2	0,00 mts
Longitud del Tramo de Via =	**207,15** mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
TRAMO 1						
EXCAVACION CUNETA No. 1 (Izquierda)	207,15	0,60	0,10		1,00	12,43
EXCAVACION CUNETA No. 2 (Derecha)	207,15	0,60	0,10		1,00	12,43
EXCAVACION VIGAS DE AMARRE	3,80	0,15	0,10		69,00	3,93
EXCAVACION NIVELACION DE LA VIA	207,15	5,00	0,01		1,00	14,41
				SUB-TOTAL TRAMO No. 1		**43,20**

Subtotal	43,20
Cobrado en acta anterior No.1	170,04
TOTAL PRESENTE ACTA	**- 126,84**

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

83

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 738-2024

CAPÍTULO	2	ITEM	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

CONVENIO ICCU 738 DE 2024 / TRAMO 1 de 2 : VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho 2	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85 mts
Cantidad de Modulos=	69,00 mts
Ancho de La viga=	0,15 mts
Longitud del Tramo de Via =	207,15 mts
Rampa No. 1	0,00 mts
Rampa No. 2	0,00 mts
Longitud del Tramo de Via =	207,15 mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	espesor		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
TRAMO 1						
CALCULO CANTIDAD CONCRETO CARRILES						
CONCRETO CARRIL No. 1 LATERAL IZQUIERDO	2,85	0,90	0,15		69,00	26,55
CONCRETO CARRIL No. 2 LATERAL DERECHO	2,85	0,90	0,15		69,00	26,55
CALCULO CANTIDAD CONCRETO VIGAS						
CONCRETO VIGAS	3,80	0,15	0,25		70,00	9,98
				SUB-TOTAL TRAMO No. 1		63,07

Subtotal	63,07
Cobrado en acta anterior No.1	31,04
TOTAL PRESENTE ACTA	32,03

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoria

Lorena Gòmez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	


FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 738-2024

CAPÍTULO	3	ITEM	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

CONVENIO ICCU 738 DE 2024 / TRAMO 1 de 2 : VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO



Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	69,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	207,15	mts
Rampa No. 1	0,00	mts
Rampa No. 2	0,00	mts
Longitud del Tramo de Via =	207,15	mts

Localización	Dimensiones				No. DE ELEMENTOS	Medida Total
	Longitud	Ancho	espesor			
TRAMO 1						
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 1 IZQUIERDO	2,85	0,55	0,15		69,00	16,22
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 2 DERECHO	2,85	0,55	0,15		69,00	16,22
CONCRETO CICLOPEO CENTRAL	2,85	0,90	0,15		69,00	26,55
					SUB-TOTAL TRAMO No. 1	59,00

Subtotal	59,00
Cobrado en acta anterior No.1	37,67
TOTAL PRESENTE ACTA	21,33

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

85

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 738-2024

CAPÍTULO	4	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

CONVENIO ICCU 738 DE 2024 / TRAMO 1 de 2 : VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho 2	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	69,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	207,15	mts
Rampa No. 1	0,00	mts
Rampa No. 2	0,00	mts
Longitud del Tramo de Via =	207,15	mts

Localización	Dimensiones			No. DE ELEMENTOS	Medida Total
	Longitud	Ancho	espesor		
TRAMO 1					
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 1 Derecha	207,15	0,60	0,15	1,00	18,64
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 2 Izquierda	207,15	0,60	0,15	1,00	18,64
				SUB-TOTAL TRAMO No. 1	37,29

Subtotal	37,29
Cobrado en acta anterior No.1	10,98
TOTAL PRESENTE ACTA	26,31

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS


	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 738-2024

CAPÍTULO	6	ITEM	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	UNID.	M2	UBICACIÓN	VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

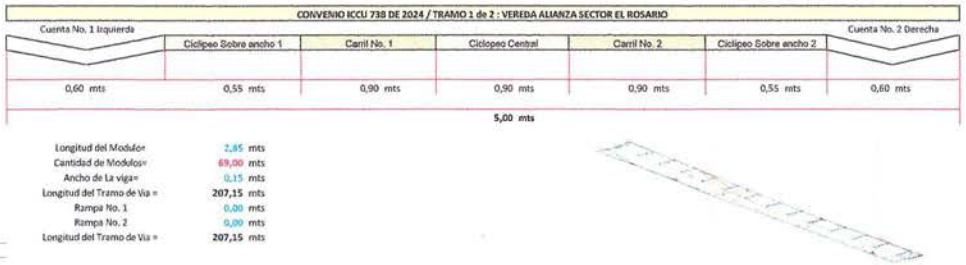

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	69,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	207,15	mts
Rampa No. 1	0,00	mts
Rampa No. 2	0,00	mts
Longitud del Tramo de Via =	207,15	mts

	Dimensiones				No. DE ELEMENTOS	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura			
Conformacion de la calzada - Sector El Rosario Tramo 1	207,15	5,00			1,00	1.035,75
				Subtotal		1.035,75
				Cobrado en acta anterior No.1		402,95
				TOTAL PRESENTE ACTA		632,80

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

87

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 738-2024

CAPÍTULO	7	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2	UBICACIÓN	VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

CONVENIO ICCU 738 DE 2024 / TRAMO 1 de 2 : VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Cuenta No. 1 Izquierda						Cuenta No. 2 Derecha
	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho 2	
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	69,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	**207,15**	mts
Rampa No. 1	0,00	mts
Rampa No. 2	0,00	mts
Longitud del Tramo de Via =	**207,15**	mts

	Dimensiones				No. DE ELEMENTOS	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura			
Localizacion y replanto - Tramo 1	207,15	5,00			1,00	1.035,75

Subtotal	1.035,75
Cobrado en acta anterior No.1	606,55
TOTAL PRESENTE ACTA	429,20

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS


	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 738-2024

CAPÍTULO	8	ITEM	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO



Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	0,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	**0,15**	mts
Rampa No. 1	0,00	mts
Rampa No. 2	0,00	mts
Longitud del Tramo de Via =	**0,15**	mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
Demolicion concretos Huellas existentes	22,00	0,90	0,10		2,00	3,96
Demolicion concretos Huellas existentes	60,00	0,90	0,10		2,00	10,80
					Subtotal	14,76
					Cobrado en acta anterior No.1	1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA	13,76

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gomez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

89

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 738-2024

CAPÍTULO	9	ITEM	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	UNID.	M3-KM	UBICACIÓN	VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO



Localización	Dimensiones Volumen Excavación	Espesor (m)	Distancia (Km)			Medida Total
Volumen de Excavación de Vía (Tramo 1)	43,20	Ver Memoria de Excavacion Tramo 1				
Calculo de Transporte de Material (Tramo 1)				43,20		
			Factor de Expansión =	1,30		
			Volumen A transportar (Material Suelto)=	56,16	30,19	1.695,62

Localización	Dimensiones Volumen Excavación	Espesor (m)	Distancia (Km)			Medida Total
Volumen de Demolicion (Tramo 1)	14,76	Ver Memoria de Excavacion Tramo 1				
Calculo de Transporte de Material (Tramo 1)				14,76		
			Factor de Expansión =	1,30		
			Volumen A transportar (Material Suelto)=	19,19	30,19	579,29

Subtotal	2.274,92
Cobrado en acta anterior No,1	1.233,38
TOTAL PRESENTE ACTA	1.041,54

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gomez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

CONVENIO ICCU 738-2024

CAPÍTULO	10	ITEM	SUBBASE GRANULAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

CONVENIO ICCU 738 DE 2024 / TRAMO 1 de 2 : VEREDA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho 1	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho 2	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	69,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	**207,15**	mts
Rampa No. 1	0,00	mts
Rampa No. 2	0,00	mts
Longitud del Tramo de Via =	**207,15**	mts

	Dimensiones				No. DE ELEMENTOS	Medida Total
	Longitud	Ancho	Espesor			
subbase - Sector El Rosario Tramo 1	207,15	5,00	0,15		1,00	155,36
					Subtotal	155,36
					Cobrado en acta anterior No,1	90,98
					TOTAL PRESENTE ACTA	64,38

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

1130

MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2 ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

02

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com


	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

FRENTE DE ADICION - MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CAPÍTULO	1	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA GUAMURAL SECTOR EL MORO



Longitud del Modulo= 2,85 mts
Cantidad de Modulos= 10,00 mts
Ancho de La Viga= 0,15 mts
Longitud del Tramo de Via = **30,15** mts
Rampa No. 1 1,50 mts
Rampa No. 2 1,50 mts
Longitud del Tramo de Via = **33,15** mts

Localización TRAMO 1	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
EXCAVACION CUNETA No. 1 (Izquierda)	31,30	0,60	0,15		1,00	2,82
EXCAVACION CUNETA No. 2 (Derecha)	31,30	0,60	0,15		1,00	2,82
EXCAVACION VIGAS DE AMARRE	3,80	0,15	0,10		11,00	0,63
EXCAVACION RAMPA No. 1 (Inicial)	1,50	3,80	0,15		1,00	0,86
EXCAVACION RAMPA No. 2 (Final)	1,50	3,80	0,15		1,00	0,86
EXCAVACIONES VARIAS PARA NIVELACION VIA	31,30	0,78	0,10		1,00	2,43
					Subtotal	10,42
					Vienen	
					TOTAL	10,42

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoria

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

FRENTE DE ADICION - MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CAPÍTULO	2	ITEM	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA GUAMURAL SECTOR EL MORO

TRAMO 2 : VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclopeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	10,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	30,15	mts
Rampa No. 1	1,50	mts
Rampa No. 2	1,50	mts
Longitud del Tramo de Via =	33,15	mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
CALCULO CANTIDAD CONCRETO CARRILES						
CONCRETO CARRIL No. 1 LATERAL IZQUIERDO	2,85	0,90	0,15		11,00	4,23
CONCRETO CARRIL No. 2 LATERAL DERECHO	2,85	0,90	0,15		11,00	4,23
						-
CALCULO CANTIDAD CONCRETO VIGAS						
CONCRETO VIGAS	3,80	0,15	0,25		11,00	1,57
CALCULO CANTIDAD CONCRETO RAMPAS						
CONCRETO RAMPA No. 1 (Inicial)	1,50	3,80	0,15		1,00	0,86
CONCRETORAMPA No. 2 (Final)	1,50	3,80	0,15		1,00	0,86
					Subtotal	11,74
					Vienen	
					TOTAL	11,74

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

94

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

FRENTE DE ADICION - MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CAPÍTULO	3	ITEM	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA GUAMURAL SECTOR EL MORO

TRAMO 2 : VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO

Cuenta No. 1 Izquierda						Cuenta No. 2 Derecha
	Ciclipeo Sobre ancho	Carril No. 1	Ciclopeo Central	Carril No. 2	Ciclipeo Sobre ancho	
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
			5,00 mts			

Longitud del Modulo= 2,85 mts
Cantidad de Modulos= 10,00 mts
Ancho de La viga= 0,15 mts
Longitud del Tramo de Via = **30,15** mts
Rampa No. 1 1,50 mts
Rampa No. 2 1,50 mts
Longitud del Tramo de Via = **33,15** mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	espesor		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 1 IZQUIERDO	2,85	0,55	0,15		11	2,59
CONCRETO CICLOPEO LATERAL No. 2 DERECHO	2,85	0,55	0,15		11	2,59
CONCRETO CICLOPEO CENTRAL	2,85	0,90	0,15		11	4,23
					Subtotal	9,41
					Vienen	
					TOTAL	9,41

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzón Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

FRENTE DE ADICION - MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CAPÍTULO	4	ÍTEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA GUAMURAL SECTOR EL MORO

TRAMO 2 : VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO

Cuenta No. 1 Izquierda	Ciclopeo Sobre ancho	Camil No. 1	Ciclopeo Central	Camil No. 2	Ciclopeo Sobre ancho	Cuenta No. 2 Derecha
0,60 mts	0,55 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,90 mts	0,55 mts	0,60 mts
5,00 mts						

Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	10,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	**30,15**	mts
Rampa No. 1	1,50	mts
Rampa No. 2	1,50	mts
Longitud del Tramo de Via =	**33,15**	mts

Localización	Dimensiones			No. DE ELEMENTOS	Medida Total
	Longitud	Ancho	espesor		
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 1 Derecha	33,15	0,60	0,15	1	2,98
CONCRETO CUENTA SECCIÓN No. 2 Izquierda	33,15	0,60	0,15	1	2,98
				Subtotal	5,97
				Vienen	
				TOTAL	**5,97**

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS


	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

FRENTE DE ADICION - MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CAPÍTULO	6	ITEM	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	UNID.	M2	UBICACIÓN	VEREDA GUAMURAL SECTOR EL MORO



Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	10,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	30,15	mts
Rampa No. 1	1,50	mts
Rampa No. 2	1,50	mts
Longitud del Tramo de Via =	33,15	mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
Conformación de la vía	33,15	5,00			1,00	165,75
					Subtotal	165,75
					Vienen	
					TOTAL	165,75

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra	Firma RL interventoría
Carlos Andres Pinzon lopez	Lorena Gómez
NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS


	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD 10	MM 10	AA 2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

FRENTE DE ADICION - MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CAPÍTULO	7	ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	UNID.	M2	UBICACIÓN	VEREDA GUAMURAL SECTOR EL MORO



Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	10,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	30,15	mts
Rampa No. 1	1,50	mts
Rampa No. 2	1,50	mts
Longitud del Tramo de Via =	33,15	mts

Localización	Dimensiones				No. DE ELEMENTOS	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura			
Localizacion y Replanteo de la vía	33,15	5,00			1,00	165,75
					Subtotal	165,75
					Vienen	
					TOTAL	165,75

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra	Firma RL interventoría
Carlos Andres Pinzon Lopez	Lorena Gómez
NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS


	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	

FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

FRENTE DE ADICION - MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CAPÍTULO	8	ITEM	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	UNID.	M2	UBICACIÓN	VEREDA GUAMURAL SECTOR EL MORO



Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	10,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	30,15	mts
Rampa No. 1	1,50	mts
Rampa No. 2	1,50	mts
Longitud del Tramo de Via =	33,15	mts

Localización	Dimensiones				No. DE ELEMENTOS	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura			
Demolicion de concretos vartios Existentes	2,00	5,00	0,10		1,00	1,00
					Subtotal	1,00
					Vienen	
					TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andrés Pinzón López

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	


FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

FRENTE DE ADICION - MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CAPÍTULO	9	ITEM	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	UNID.	M2	UBICACIÓN	VEREDA GUAMURAL SECTOR EL MORO

TRAMO 2 : VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO



Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	10,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	30,15	mts
Rampa No. 1	1,50	mts
Rampa No. 2	1,50	mts
Longitud del Tramo de Via =	33,15	mts

Localización	Dimensiones: Volumen Excavación	Espesor (m)	Distancia (Km)			Medida Total
Volumen de Excavación de Vía (Tramo 1)	10,42	Ver Memoria de Excavacion Tramo 1				
Calculo de Transporte de Material (Tramo 1)				10,42		
			Factor de Expansión =	1,30		
			Volumen A transportar (Material Suelto)=	13,55	29,59	400,81
					Subtotal	400,81
					Vienen	
					TOTAL	400,81

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzón Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez.

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

FORMATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	AASING S.A.S.
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No. 2 - ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	


FECHA	DD	10	MM	10	AA	2025	ACTA PARCIAL	2	ELABORÓ	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
SUPERVISOR	LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)	NIT O C.C.	NIT N°: 900.976.357-7	CONTRATO N°	C-OBRA-No. 161-2025
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C.	NIT N°: 900.446.649-9	CONTRATO N°	C-INTERV-179-2025

FRENTE DE ADICION - MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CAPÍTULO	10	ITEM	SUBBASE GRANULAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA GUAMURAL SECTOR EL MORO

TRAMO 2 : VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO



Longitud del Modulo=	2,85	mts
Cantidad de Modulos=	10,00	mts
Ancho de La viga=	0,15	mts
Longitud del Tramo de Via =	30,15	mts
Rampa No. 1	1,50	mts
Rampa No. 2	1,50	mts
Longitud del Tramo de Via =	33,15	mts

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Altura		No. DE ELEMENTOS	Medida Total
Sub-base Granular	33,15	5,00	0,15		1,00	24,86
					Subtotal	24,86
					Vienen	
					TOTAL	24,86

OBSERVACIONES:

Firma RL Contratista de Obra

Carlos Andres Pinzon Lopez

NOMBRE: CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
Elaboró: CONTRATISTA DE OBRA / PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

Firma RL interventoría

Lorena Gómez

NOMBRE: INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisó y avaló: INTERVENTORÍA / AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS

1140

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVENIO 738-2024

102

REGISTRO FOTOGRAFICO FINAL FINAL FINAL

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	

CAP	1	**ITEM**	0	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realizaron excavaciones menores a mano

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	1	**ITEM**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registran excavaciones menores a mano para la instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se finalizo la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se finalizo la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.
ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	3	**ITEM**	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se finalizo la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	10	**ITEM**	SUBBASE GRANULAR	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registra colocación y estabilización material granular

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	NP	**ITEM**	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza la demolicion de elementos estructurales identificados.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO ADICIÓN VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se finalizo la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se finalizo la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO		
CAP	3	**ITEM**	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se finalizo la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se finaliza la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO

CAP	7	**ITEM**	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza localización y replanteo con elementos de precisión

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	6	**ITEM**	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza conformación de la calzada existente previo al inicio de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO - TRAMO 1

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO		
CAP	10	**ITEM**	SUBBASE GRANULAR	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**ACTA PARCIAL**	**2- TERMINACION**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza la estabilización de la subbase granular, previso al inicio de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO - TRAMO 1

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

CONTROL ESTADO DEL CLIMA


305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com


AASING S.A.S.	CONTROL DEL TIEMPO	VERSIÓN 01
		Página 1 de 1
		Elaboró: Residente de obra

OBJETO CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S) - CONTRATO DE OBRA 161-2025
SUPERVISOR	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA, CUNDINAMARCA

CONTROL DEL TIEMPO GENERAL PROYECTO

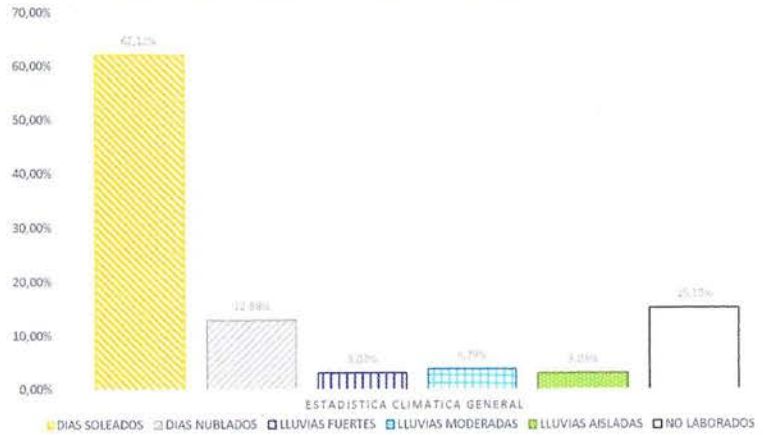

CONTROL DEL TIEMPO PERIODO ACTUAL

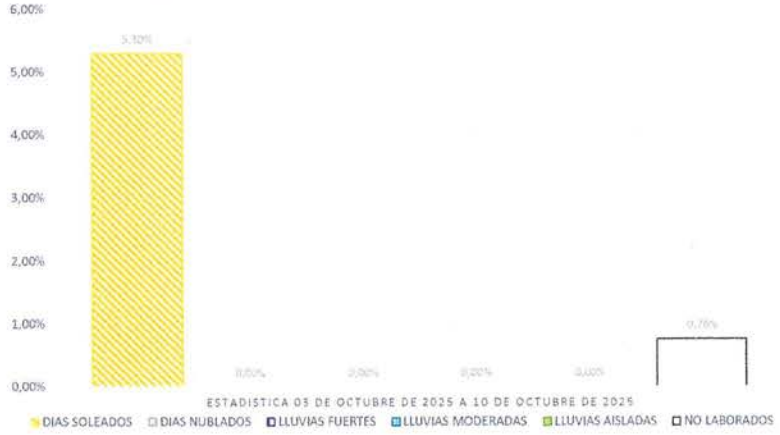

ELABORO: AASING S.A.S

RESPONSABLE		FECHA:
NOMBRE:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ	10/10/2025
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA:	Carlos Andres Pinzon Lopez	

1160

AASING S.A.S.	CONTROL ESTADO DEL TIEMPO	VERSIÓN 01
		Página 1 de 1
		Elaboró: Residente de obra

CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA - DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S) CONTRATO DE OBRA 161-2025
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

MES / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JUNIO			DN	DN	LLF	DS	DN	NL	LLM	LLM	LLA	LLF	DN	DN	NL	DS	LLM	DS	DS	DS	DS	DN	NL	LLA	DS	DN	DS	DN	NL	NL	
JULIO	DS	DN	DS	DS	DN	NL	DS	LLM	DN	LLM	LLF	DS	NL	LLM	DN	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DN	LLA	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS
AGOSTO	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DN	DS	NL	DS	DS	DN	DS	DS	DS	NL	NL	DS	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DS	DS	NL
SEPTIEMBRE	DS	DS	DS	DN	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	LLF	DS	NL	DS	DS	DN
OCTUBRE	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DS	DS																				
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															
ENERO																															
SEPTIEMBRE																															
OCTUBRE																															
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															

CONTROL DEL TIEMPO	DESDE :	3 JUN 25	HASTA	10 OCT 25

CONCEPTO	TOTALES		CONVENCIONES	CV	COLOR
TOTAL DE DÍAS SOLEADOS	82	62,12%	DIAS SOLEADOS	DS	
TOTAL DÍAS NUBLADOS	17	12,88%	DIAS NUBLADOS	DN	
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	4	3,03%	LLUVIAS FUERTES	LLF	
	5	3,79%	LLUVIAS MODERADAS	LLM	
	4	3,03%	LLUVIAS AISLADAS	LLA	
DÍAS NO LABORADOS	20	15,15%	NO LABORADOS	NL	
TOTAL	**132**	**100,00%**			

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA OBRA		
FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL	
3 JUN 2025	10 OCT 25	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
DÍAS SECOS	99	75,00%
DÍAS LLUVIOSOS	13	9,85%
NO LABORADOS (DOMINGOS Y FESTIVOS)	20	15,15%
TOTAL	**132**	**100,00%**

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL ULTIMO PERIODO		
DESDE	HASTA	
3 OCT 25	10 OCT 25	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
TOTAL DÍAS SECOS	7	87,50%
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	0	0,00%
TOTAL DÍAS NO LABORADOS (DOMINGOS Y FESTIVOS)	1	12,50%
TOTAL	8	100,00%

OBSERVACIONES :

-
-
-
-
-
-
-

RESPONSABLE		FECHA:
NOMBRE:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ	10/10/25
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA:	Carlos Andres Pinzón López	

ELABORO: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S)

122

BITÁCORA DE OBRA CONVENIO ICCU 738-2024

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1162

01/08/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia Soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades:
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Se comienzan las actividades de suministro de materiales.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

02/08/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado con lluvias suaves
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades:
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Continuan las actividades de suministro de materiales al sitio de obra.

William O.T
Laura Galindo Anggie S Aux. Residente Obra

124

04/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado, con lluvias suaves
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro para carriles.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Juliana D

05/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado con lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

1164

06/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado con lluvia en la tarde
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte y figurado para cunetas, carriles y vigas.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Suliana D

08/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado con lluvias suaves
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de amarre de parrillas para carriles.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Suliana D

126

12/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente.
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte figurado y amarre de hierro.

William O.T
Laura Galindo Aux. Residente Obra

Anggie S

Suliana D

13/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia seco, soleado
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte figurado y amarre de hierro para parrillas canales.

William O.T
Laura Galindo Anggie S Aux. Residente Obra

Suliana D

1167

14/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de conformacion y replanteo de la via existente.

Laura Galindo Anggie S William O. T
Aux. Residente Obra

Suliana D

15/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia nublado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de demolicion de antas en concreto existentes y conformacion de la via.

Laura Galindo Anggie S William O. T
Aux. Residente Obra

Suliana D

16/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte figurado y amarre de hierro.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Suliana D

19/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte figurado y amarre de hierro.

William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo

Anggie S

Suliana D

1169

20/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 residente, 1 oficial, 2 ayudantes
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Trama 1: Actividades de corte figurado y amarre de hierro.

Laura Galindo Zeyda Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

SulianaD

21/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro para parrillas de carriles, cunetas y vigas, partida de piedra.

William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo Zeyda

Anggie S

SulianaD

1170

22/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades. • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de partida de piedra rajon, suministro de materiales agregados. Laura Galindo Zeid Anggie S William O.T Aux. Residente Obra Suliana D
23/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia soleado sin lluvias Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de partida de piedra, corte, figurado y amarre de hierro. Laura Galindo Zeid Anggie S William O.T Aux. Residente Obra Suliana D

1171

25/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro, partida de piedra.

Laura Galindo William O.T
Aux. Residente Obra.

Anggie S

SulianaD

26/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia sin lluvias, sol todo el dia
CPersonal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de replanteo y nivelacion manual, armado de cayones para encofrado.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

SulianaD

133

1172

27/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de encofrado y fundida de centros, sobre anchos y carriles.

Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo Suliana D

28/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente.
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de acomodado de piedra, encofrado y fundida de centros y sobre anchos en concreto ciclopeo.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Suliana D

134

1174

01/09/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am Clima: Mañana nublada, dia soleado Personal: 1maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra. Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de sobre anchos en concreto ciclopeo, acomodado de hierro y fundida de cunetas. Anggie S William O.T Laura Golindo. Suliana D
02/09/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am Clima: Dia soleado Personal: 1maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de ciclopeos, encofrado y acomodado de hierro cunetas. Laura Golindo. Anggie S William O.T Suliana D

136

03/09/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738/2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
- V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de vigas, centros en concreto ciclopeo.

Laura Golindo Anggic S William O. T

Suliana T

04/09/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
- V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de centros en ciclopeo, corte, figurado y amarrado de hierro para carriles y vigas.

Laura Golindo. Anggie S William O. T

Suliana T

1176

05/09/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima : Dia soleado
Personal : 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Corte, figurado y amarrado de hierro para cunetas y vigas.

Laura Galindo. Anggies William O.T

Suliana D

06/09/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima : Dia soleado, sin lluvias.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Corte, figurado y amarrado de hierro para cunetas y vgas.

Laura Galindo. Anggies William O.T

Suliana D

1177

08/09/25	C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Corte, figurado y amarrado de hierro, acomodado de piedra rajon. Laura Golindo. Anggie S William O.T Suliana D
09/09/25	C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Corte, figurado y amarre de parrillas de vigas. Laura Golindo. Anggie S William O.T Suliana D

1178

10/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado, acomodado de piedra y fundida de centros y sobre anchos en concreto ciclopeo.

Laura Galindo. Anggies. William O.T

Juliana D

11/09/25 C. Obra: 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Mañana nublada, sin lluvias
Personal: 1maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Partida de piedra, encofrado y acomodado de piedra para fundir centros y sobre anchos en concreto ciclopeo.

Laura Galindo. Anggies William O.T

Juliana D

140

12/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y acomodado de piedra para fundida de sobre anchos y centros en ciclopeo, excavaciones para vigas.

Laura Galindo Anggies William O.T

Suliana D

13/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Trama 1: Excavaciones y acomodado de hierro para vigas y carriles.

Laura Galindo. Anggies William O.T

Suliana D

1181

17/09/25 C.Obra 167-2023 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
- V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de carriles y cunetas.
- V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte y figurado de hierro para carriles.

Laura Galindo Anggie S William O.T Suliana D

18/09/25 C.Obra 167-2023 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
- V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de cunetas y sobre anchos.
- V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte y figurado de hierro.

Laura Galindo Anggie S William O.T Suliana D

143

1182

19/09/25

C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Fundida de sobre anchos y cunetas. Se termina la primera mitad de placa huella, para dar tiempo de fraguado.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Golindo. Anggie S William O.T
Seliana D

20/09/25

C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Golindo Anggie S William O.T
Seliana D

144

22/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y nivelacion manual, suministro de agregados.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Golindo Anggie S William O. T
Suliana D

23/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia seco, sin lluvia
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de sobre anchos en concreto ciclopeo, excavaciones para vigas y nivelacion manual.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Golindo Anggie S William O. T
Suliana D

1184

24/09/25

C.Obra 161-2025 / Conv ICC 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima : Dia seco
Personal : 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado, acomodado de hierro y fundida de vigas y carriles.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Golindo Anggie S William O.T
Juliana D

25/09/25

C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Fundida de carriles y vigas
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Golindo Anggie S William O.T
Juliana D

146

26/09/25 C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de cunetas y carriles con vigas.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Galindo Anggie S. William O. T Suliana D

27/09/25 C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de sobre anchos en concreto ciclopeo.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarre de hierro.

Laura Galindo Anggie S William O. T Suliana D

1186

29/09/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima : Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y acomodado de hierro para carriles y cunetas. • V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarre de hierro. Laura Galindo Anggie S William O.T Suliana D
30/09/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima : Dia soleado, sin lluvias Personal : 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de carriles y cunetas. • V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Conformacion de la via existente. Laura Galindo Anggie S William O.T Suliana D

148

01/10/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de sobre anchos en ciclopeo y cunetas
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Partida de piedra rajon para ciclopeos.

Laura Galindo Anggies William O.T
Suliana D

02/10/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia nublado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de sobre anchos, carriles y cunetas.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Nivelacion manual y encofrado.

Laura Galindo Anggies William O.T
Suliana D

03/10/25

C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
- V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de carriles y vigas.
- V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Encofrado y acomodado de piedra para sobre anchos

Laura Galindo Anggie S William O.T Suliana D

04/10/25

C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
- V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de carriles y vigas.
- V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Fundida de sobre-anchos y centros en ciclopeo.

Laura Galindo Anggie S William O.T Suliana D

06/10/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de cunetas.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Encofrado y acomodado de hierro para carriles y vigas.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Juliana D

07/10/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de cunetas.
• V. Alianza S. Rosano Tramo 2: Fundida de carriles y vigas, encofrado de sobre anchos y centro en ciclópeo.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Juliana D

1190

08/10/25 C.Obra 161-2025/Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:02am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Fundida de cunetos
• V Alianza S. Rosario Tramo 2: fundida de centros y sobre anchos.

Laura Galindo. Anggie S

William O.T

Suliana D

09/10/25 C. Obra 161-2025/Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00
Clima: Dia nublado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
-V. Alianza S. Rosario Tramo 1: fundida de Cunetas
-V Alianza S. Rosario Tramo 2: fundida de Cunetos

Laura Galindo Anggie S

William O.T

Suliana D

152

1191

10/10/25 C. Obra 161-2025/ConvICCU 738-2024 Inicio 7:000m
Clima: Dia soleado, Sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
·V Alianta S. Rosario Tramo 1: Desencofrado y limpieza, entrega de placa huella terminada completamente

Cara Galinda Anggies William O.T

Suliana D

153

1192

BITÁCORA DE OBRA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

154

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

01/09/2025	C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - Tramo 2: replanteo y nivelación Laura Golindo. Anggie S William O.T Suliana D
02/09/2025	C. Obra 161 / Adición , Inicio: 7:00 a.m clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro Laura Golindo. Anggie S William O.T Suliana D

1194

03/09/2025	C. Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades- • V. El Moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro Laura Galindo. Anggie S. William O.T Juliana D
04/09/2025	C. Obra 161 / Adución — Inicio: 7:00 a m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades • V. El moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarre de hierro Pura cuentas Laura Galindo. Anggie S William O.T Juliana D

156

1195

05/09/2025 C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente

Actividades

• V. El moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarre de hierro para vigas

Laura Galindo. Angie S William O.T Juliana D

06/09/2025 C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado sin lluvias

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente

Actividades:

• V. El moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro

Laura Galindo. Angie S William O.T Juliana D

157

1196

08/09/2025	C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades • V. El moro - Tramo 2: corte, figurado y amarrado de hierro Para Carriles y vigas Laura Galindo. Anggie S. William O. T Suliana D
09/09/2025	C. Obra 161/Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades • V. El moro - Tramo 2: corte, figurado y amarrado de hierro para Carnles y vigas Laura Galindo. William O.T Anggie S Suliana D

158

10/09/2025	C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades •V. El moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro para parillas de cunetas y carriles. Laura Galindo. William O.T Anggie S Suliana D
11/09/2025	C. Obra 161 / Adición Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades •V. El moro-Tramo 2: replanteo y conformación de la via existente Laura Galindo. William O.T Anggie S Suliana D

12/09/2025	C.Obra 161/Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V.El moro-Tramo 2: corte, figurado y amarrado de hierro Laura Galindo. Anggie S William O T Juliana D
13/09/2025	C.Obra 161/Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V.El moro-Tramo 2: Suministro de hierro para tramos 1 y 3 Laura Galindo. Anggie S William O.T Juliana D

15/08/2025	C. Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - tramo 2: Conformación de la via para tramo 1 Laura Galindo. Anggie S William O.T Suliana D
16/09/2025	C. Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente. Actividades • V El moro - tramo 2: conformación de la via en los tres tramos Laura Galindo. Suliana D... William O.T Anggie S

1200

17/09/2025	C. Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado sin lluvias Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - tramo 1: corte, figurado y amarrado de hierro carriles • V. El moro - tramo 2: Suministro de materiales Laura Galindo. Zend William O.T Anggie S Juliana D
18/09/2025	C. Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a. m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades: • V. El moro - tramo 1: Corte, figurado y amarrado de hierro • V. El moro - tramo 2: Suministro de materiales Laura Galindo. Zend William O.T Anggie S Juliana D

1201

19/09/2025	C. Obra 161 / Adicion Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El muro - tramo 1: Corte, figurado y amarrado de hierro • V. El muro - tramo 2: Suministro de materiales agregados y partida de piedra rajón Laura Galindo William O. T Anggie S Suliana D
20/09/2025	C. Obra 161 / Adicion Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades: V. El muro - Tramo 1: Corte, figurado y amarrado de hierro V. El muro - Tramo 2: Suministro de materiales agregados y partida de piedra rajon Laura Galindo William O. T Anggie S Suliana D

22/09/2025	C-Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades •V-El moro - tramo 2: Suministro de materiales, partida de piedra rajon y encofrado •V. El moro tramo 1: se terminan actividades de corte, figurado y amarrado de hierro Laura Galindo Angie S William O.T Juliana D
23/09/2025	C-Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades •V-El moro - Tramo 2: Suministro de materiales, partida de piedra rajon y encofrado •V-El moro - tramo 3: corte, figurado y amarrado de hierro. Laura Galindo. Angie S William O.T Juliana D

24/09/2025	C.obra 161/Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades • V.El moro-tramo 2: encofrado, acomodado de piedra y fundida de centros en concreto ciclópeo Laura Golindo Anggie S William O.T Sliana D
25/09/2025	C.obra 161/Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades: • V.El moro-tramo 2: encofrado y fundida de carril Laura Golindo Anggie S William O.T Sliana D

1204

26/09/2025	C.Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m clima: Dia Soleado Sin lluvias. Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades. • V.El moro-Tramo 2: encofrado y fundida de carnl. Laura Galindo. Angie S William O.T Suliana D
27/09/2025	C.Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades • V.El moro - tramo 2: encofrado y fundida de carnles. Laura Galindo. Angie S William O.T Suliana D

166

1205

29/09/2025	C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades: • V. El moro – tramo 2: excavaciones superficiales y nivelación para vigas y cunetas Laura Galindo. Angyes William O.T Suliana D
30/09/2025	C. Obra 161 / Adición Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro-tramo 2: encofrado, acomodado de hierro y fundida de cunetas Laura Galindo. Angyes William O.T Suliana D

167

1204

01/10/2025	C.Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - tramo 2: fundida de cunetas y desencofrado Laura Galindo. Ernest Anggies William O.T Suliana D
02/10/2025	C.Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades. - V. El moro - tramo 2: encofrado y fundida de carriles, sobre anclas y cunetas. Laura Galindo. Ernest Anggies William O.T Suliana D

160

1207

03/10/2025	C.Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 ofiual, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - tramo 2: encofrado y fundida de cunetas Laura Galindo. Zend Anggie S William O.T Suliana D
04/10/2025	C.Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 ofiual, 2 ayudantes y 1 residente Actividades. • V. El moro - tramo 1: suministro de materiales para este tramo y las actividades de partida de piedra rajón • V-El moro - tramo 2: encofrado y fundida de cunetas y rampa. Laura Galindo. Zend Anggie S William O.T Suliana D

169

1208

06/10/2025 C. Obra 161 / Adición Inicios 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente

Actividades

• V El moro - tramo 1: Suministro de materiales para tramo y actividades de partida de piedra rejón.

• V. El moro - tramo 2: encofrado y fundida de rampa

Laura Galindo. William O.T

Anggie S Juliana D

07/10/2025 C. Obra 161 / Adición Inicio 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes Y 1 residente

Actividades

· V El moro - tramo 1: Suministro figurado y armado refuerzo e instalación encofrado

· V El moro - tramo 2: fundido sobreconcho y cuneta

Laura Galindo. Anggie S William O.T

Juliana D

170

1209

08/10/2025	C. Obra 161 / Adición Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades ·V El moro - tramo 1: Suministro fundida sobre ancho ·V El moro · Tramo 2: fundida Cuneta y rompa Laura Galindo. ZGM William O.T Anggie S SlianaD
09/10/2025	Obra 161 / Adición Clima: Dia nublado, Sin lluvias Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades ·V. El moro - Tramo 1: fundida Carriles y cuneta ·V El moro - Tramo 2: Desencofrado y limpieza Laura Galindo. ZGM William O.T Anggie S SlianaD

171

1210

10/10 hors	C. obra 161 / Adición Clima: Soleado, Sin lluvias Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residen. Actividades · V El moro - Tramo 1: Descofrado y limpieza Entrega de placa huella finalizada completamen. · V El moro - Tramo 2: limpieza y entrega placa huella finalizada completamente Laura Bolinda Anggie S William O.T Suliana T

172

PAGO SENA FIT

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

Cto 181 - 2025

1212

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7769486

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido maximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 141063295		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
10	09	2025
FECHA VENCIMIENTO		
15	09	2025

Nombre Pagador PROYECTOS DE INGENIERIA NIT o C.C. 900976357

Dirección VDA Teléfono +57,305

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Cundinamarca		
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 1,636,500.00 VALOR FACTURA
	IVA	$ 1,636,500.00
	TOTAL FACTURA	$ 1,636,500.00

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
EL GRUPO: 0000029192236 FECHA: 2025/09/10 HORA: 16:55:0
CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:339
TOTAL EFC: $ 1,636,500.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 1,636,500.00
NRO. FACTURA
7769486

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7769486(3900)000001636500(96)20250915

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 141063295

Ciudad | NIT 900976357 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: PROYECTOS DE

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

124

1213

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	141063295	682036949268	10/09/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900976357**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **161.18.255.196**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,636,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,636,500.00	COP$ 1,636,482.00

ecollect

175

1214

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	141063295	682036949268	10/09/2025

Número de Identificación
900976357

Primer Nombre ó Razón Social
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
VDA CHUNTAME QUINTAS DE MOLINO CA 56

Ciudad de Domicilio
CAJICA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,305 3678028

Correo electrónico
ingenieros.aas@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cundinamarca

Regional Centros SIIF
36-02-00-025-000000

Número Licencia de Obra
CTO 161-2025

Número Contrato de Obra
CTO 161-2025

Nombre Obra
CONV 707,738,716 DE 2024

Fecha Inicio Obra
03/06/2025

Fecha Terminación Obra
02/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
LA VEGA CUNDINAMARCA

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
9

Costo Total de Obra a Todo Costo
654592937.39

Costo Total Mano de Obra
654592937.39

Número de Trabajadores en el Periodo
6

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1636482.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1636482.00

ecollect

176

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1214

REPORTE DE CALIDAD DE PRODUCTO

Fecha: 25/06/18	Versión: 6	Código: FR.CC.34	Página 1 de 1

CEMENTOS TEQUENDAMA

MES: Septiembre 2025

CEMENTO: ■ **TIPO UG** ☐ **TIPO ART**

REQUISITOS FÍSICOS-MÉCANICOS	MÉTODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN*	INCERTIDUMBRE	CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S
Finura Blaine, m^2/kg	NTC 33	No especifica	0,36	433
Densidad (g/cm^3)	NTC 221	No especifica	0,03	2,95
Finura Tamiz 45µm (No. 325). %	NTC 294	No especifica	0,4	90,3
Cambio de longitud por autoclave, %	NTC 107	Máximo 0,80	0,0066	0,015
Tiempo de fraguado inicial, no menos de, minutos	NTC 118	No menos de 45	8,17	175
Tiempo de fraguado inicial, no más de, minutos	NTC 118	No más de 420		
Tiempo de fraguado final, minutos	NTC 118	No especifica	3,48	262
Expansión de barra de mortero 14 días. %	NTC 4927	Máximo 0,02	0,002	0,001
Contenido de aire en volumen de mortero. %	NTC 224	Máximo 12,0	0,55	2,75
Resistencia a la compresión, a 1 día, MPa	NTC 220	No especifica	1,01	6,8
Resistencia a la compresión, a 3 días, MPa		Mínimo 8,0	0,31	15,9
Resistencia a la compresión, a 7 días, MPa		Mínimo 15,0	0,94	20,1
Resistencia a la compresión, a 28 días, MPa		Mínimo 24,0	0,73	26,7

NTC: Norma Técnica Colombiana

Nota:

*Los requisitos físicos definidos en la norma NTC-121 , para cemento Tipo UG.

*Las condiciones ambientales estan controladas de acuerdo con las normas referenciadas en este informe.

***Los datos reportados corresponden al promedio mes de Julio**

*El muestreo se realizó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspección y Ensayo "PL.CC.01"

JEFE CONTROL DE CALIDAD

Nombre: Renán Jaimes

Email: rjaimes@cetesa.com.co

Tel. 6017420090 Ext. 2006

Vereda Chitiva, Abajo Finca La María

Suesca, Cundinamarca

Fin del Informe

128

1217

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico Resolución 2003:2022 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. TOC-80057

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 4/07/2025

CLIENTE	FIGURADOS SABANORTE S.A.S.	**DESTINO**	LA VEGA	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	34426
		PLACA	UTW 853	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	34448
						FACTURA No.	114626

					ENSAYOS FÍSICOS																					
						RESULTADOS DE TRACCIÓN				ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
R - No. 5	12	20251904	2	324	✓	490.0	647.5	15.3	1.32	0.26	1.14	0.0246	0.031	0.19	0.18	0.10	0.10	0.020	0.00045	0.0026	0.47	1.490	1.090	10.520	70.8	1.700
		20251901	1		✓	490.2	642.6	14.8	1.31	0.26	1.17	0.0154	0.035	0.21	0.19	0.08	0.10	0.015	0.00032	0.0022	0.48	1.495	1.110	10.520	70.8	1.660
R - No. 6	6	8958890001	1	150	✓	484.6	621.2	14.8	1.28	0.27	1.08	0.019	0.013	0.20	0.02	0.06	0.08	0.019	-	0.0040	0.46	2.143	1.320	13.090	69.9	2.310
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

Enviado: figunorte@hotmail.com

Ing. Sandra Cabrera
DIRECTOR CONTROL CALIDAD

18

1218

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad NTC 2289:2036 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reconocimiento Técnico Resolución 2893:2022 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. TOC-79999

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 2/07/2025

CLIENTE	FIGURADOS SABANORTE S.A.S.	**DESTINO**	LA VEGA
		PLACA	UTW 853
NORMA	NTC 2289	**PEDIDO No.**	34392
GRADO	420	**REMISIÓN No.**	34412
		FACTURA No.	114444

						ENSAYOS FÍSICOS				ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
R - No. 4	6	20251546	2	672	✓	462.2	613.3	14.8	1.33	0.27	1.14	0.0124	0.022	0.19	0.16	0.08	0.06	0.018	0.00069	0.0014	0.47	0.962	0.920	8.450	72.2	1.590
R - No. 5	6	20251931	2	432	✓	476.5	621.3	15.2	1.30	0.27	1.17	0.0132	0.026	0.20	0.19	0.10	0.08	0.020	0.00055	0.0020	0.48	1.488	1.190	10.320	70.8	2.040
R - No. 4	12	20251047	1	168	✓	478.7	649.5	14.8	1.36	0.28	1.10	0.0152	0.022	0.21	0.19	0.08	0.10	0.015	0.00044	0.0020	0.48	0.964	0.780	8.330	72.7	1.630
R - No. 5	12	20251900	1	108	✓	487.9	634.6	15.1	1.30	0.26	1.15	0.0158	0.034	0.20	0.19	0.07	0.11	0.016	0.00043	0.0022	0.47	1.488	1.270	10.550	70.8	1.950
R - No. 6	12	20250844	1	76	✓	469.2	631.8	15.1	1.35	0.28	0.97	0.0128	0.030	0.19	0.18	0.07	0.08	0.016	0.00042	0.0020	0.46	2.149	1.500	13.000	69.4	2.410
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

Ing. Sandra Cabrera

DIRECTOR CONTROL CALIDAD

CCA-FOR-13 Versión. 05 24/01/2025

Enviado: figunorte@hotmail.com

180

CODIGO	FECHA
FO-GO-042	03-07-2025
VERSIÓN: 1	PAGINA 1 DE 1

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, LIMITES DE ATTERBERG Y HUMEDAD NATURAL

NORMAS I.N.V. E - 125 _ E - 126 _ E-123

1219

ENTIDAD CONTRATANTE: *AASING SAS*

FECHA DE ENSAYO: *jueves, 03 de julio de 2025*

ORDENADO POR: *AASING SAS*


Nº DE MUESTRA: *1*

PROCEDENCIA: *Planta de Trituración MTM PROYECTOS S.A.S*

MATERIAL: *SUB BASE CLASE B*

OBRA: *PLACA HUELLAS LA VEGA*

LOCALIZACION: *LA VEGA*

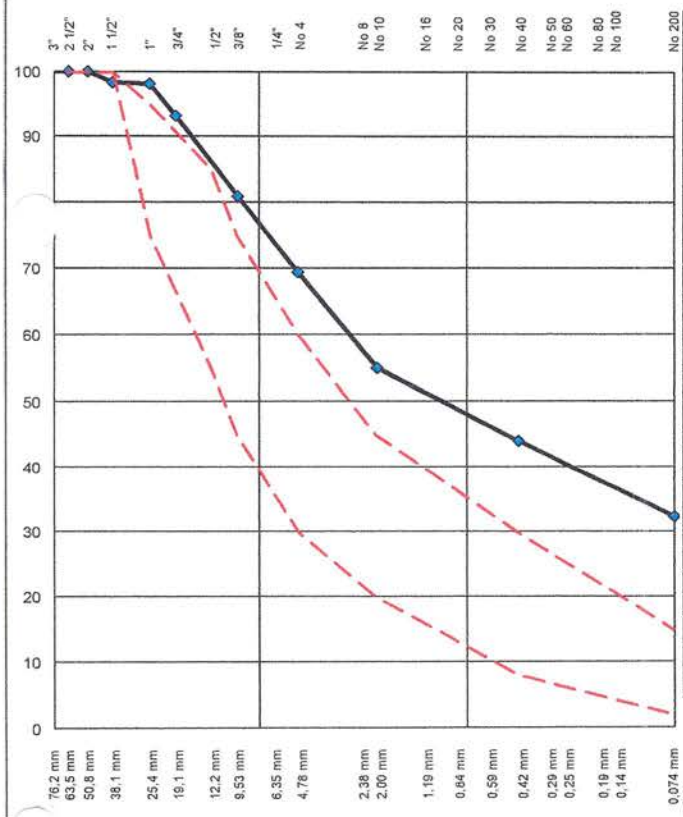

GRADACIÓN

PESO INICIAL (gr) :			7019,0
TAMIZ No	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% PASA
3"	0,0	0,0	100,0
2 1/2"	0,0	0,0	100,0
2"	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	112,1	1,6	98,4
1"	129,8	1,8	98,2
3/4"	343,1	4,9	93,3
1/2"	0,0	0,0	93,3
3/8"	860,7	12,3	81,0
1/4"	0,0	0,0	81,0
No 4	804,6	11,5	69,5
8	0,0	0,0	69,5
10	1017,6	14,5	55,0
16	0,0	0,0	55,0
20	0,0	0,0	55,0
30	0,0	0,0	55,0
40	774,3	11,0	44,0
50	0,0	0,0	44,0
60	0,0	0,0	44,0
80	0,0	0,0	44,0
100	0,0	0,0	44,0
200	819,7	11,7	32,3
200			

LIMITES DE ATTERBERG

LÍMITE LÍQUIDO				MAT. ORG
No GOLPES	35	25	15	
P_1 (gr)	29,06	33,55	31,23	
P_2 (gr)	24,00	26,90	24,15	
P_3 (gr)	4,37	4,30	4,41	
% HUMEDAD	25,8	29,4	35,9	


LÍMITE PLÁSTICO			w. Nral
P_1 (gr)	15,51	15,60	376,50
P_2 (gr)	13,81	13,88	354,10
P_3 (gr)	4,53	4,45	35,40
% HUMEDAD	18,3	18,2	7,03

GRAVAS:	ARENAS:	FINOS:
30,5%	37,2%	32,3%

	Especific.	Resultado
LÍMITE LÍQUIDO:		29,7
LÍMITE PLASTICO:		18,3
ÍNDICE DE PLASTICIDAD:		11,4
HUMEDAD NATURAL:		7,0
ÍNDICE DE LIQUIDEZ:		

C_u = _____ C_c = _____

LÍMITES DE ATTERBERG

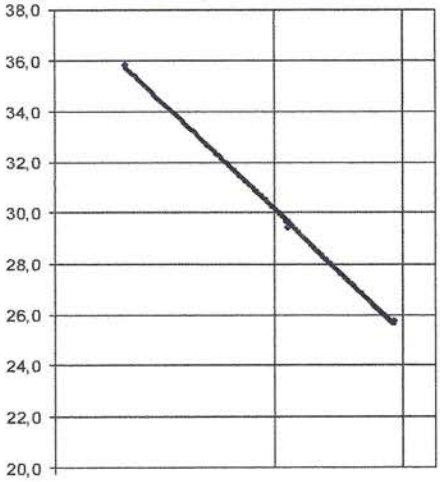

OBSERVACIONES:

SUB BASE CLASE B INVIAS

CLASIFICACIÓN

ÍNDICE DE GRUPO: **0**

A A S H T O : **A - 2 - 6**

U. S. C. : **SC**

LAB. CAMILO PADILLA
REALIZO

ING. GUILLERMO BASTIDAS
APROBO

Dirección: Cra 12C # 11-25 Villa Marcela, Mosquera – Cundinamarca. Sucursal: Cra 90 #149-70 Bogota D.C – Colombia.
Telefonos: 3105552531 3022884476 3123319273
Correos: Pavilabgerencia@gmail.com Pavilabadm@gmail.com Pavilabcomercial@gmail.com Pavilabdirector@gmail.com

181

CODIGO	FECHA	FORMATO	
FO-GO-010	03-07-2(		
VERSIÓN	PAGINA	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS INV E 133-13	
02	1 DE 1		

1220

ENTIDAD CONTRATANTE:	*AASING SAS*	**FECHA DE ENSAYO:**	*jueves, 03 de julio de 2025*
ORDENADO POR:	*AASING SAS*	**Nº DE MUESTRA:**	*1*
PROCEDENCIA:	*Planta de Trituración MTM PROYECTOS S.A.S*	**MATERIAL:**	*SUB BASE CLASE B*
OBRA:	*PLACA HUELLAS LA VEGA*	**LOCALIZACION:**	*LA VEGA*

LECTURAS	1	2	3
Lectura Arena mm.	45	40	41
Lectura Arcilla mm.	339	287,0	286
Equivalente de Arena %	13,27	13,94	14,34

Promedio De Equivalente De Arena = **15 %**

OBSERVACIONES:

EJECUTADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre:Camilo Padilla	Nombre: Ing Guillermo Bastidas	Nombre: James Muñoz
Cargo: Laboratorista	Cargo: Ingeniero de calidad	Cargo: Director Tecnico

Dirección: Cra 12C # 11-25 Villa Marcela, Mosquera – Cundinamarca. Sucursal: Cra 90 #149-70 Bogota D.C – Colombia.
Telefonos: 3105552531 3022884476 3123319273
Correos: Pavilabgerencia@gmail.com Pavilabadm@gmail.com Pavilabcomercial@gmail.com Pavilabdirector@gmail.com

182

CODIGO FO-GO-011	FECHA 04-07-2025	FORMATO
VERSIÓN 02	PAGINA 1 DE 1	RELACIONES HUMEDAD – PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN) INV E 141-13

7221

ENTIDAD CONTRATANTE:	*AASING SAS*	**FECHA DE ENSAYO:**	*viernes, 04 de julio de 2025*
ORDENADO POR:	*AASING SAS*	**N° DE MUESTRA:**	*1*
PROCEDENCIA:	*Planta de Trituración MTM PROYECTOS S.A.S*	**MATERIAL:**	*SUB BASE CLASE B*
OBRA:	*PLACA HUELLAS LA VEGA*	**OBJETO DE ESTUDIO:**	*ESTUDIO DE SUELOS*


ENSAYO DE COMPACTACION.

GRAVEDAD ESPECIFICA DE FINO	gr/cm3	
GRAVEDAD ESPECIFICA DE GRUESO	gr/cm3	

Caracteristicas del Martillo.

Dimensiones	
Peso	10 lbs
Altura de Caida	1,5 pies

PRUEBA.	1	2	3	4	
Humedad Natural [%].	3,0	6,0	9,0	11,0	
Número de Golpes por Capa.	56	56	56	56	
Número de Capas.	5	5	5	5	
Peso de la Muestra Humeda + Molde [gr].	10035	10511	10341	10300	
Peso del Molde [gr].	5833	5833	5833	5833	
Peso de la Muestra Humeda [gr].	4202	4678	4508	4467	
Volumen del Molde [cm3].	2086	2086	2086	2086	
Densidad Humeda del Material [gr/cm3].	2,014	2,243	2,161	2,141	
Humedad [%].	9,7	12,2	15,2	17,7	
Densidad Seca del Material [gr/cm3].	1,837	1,999	1,876	1,819	

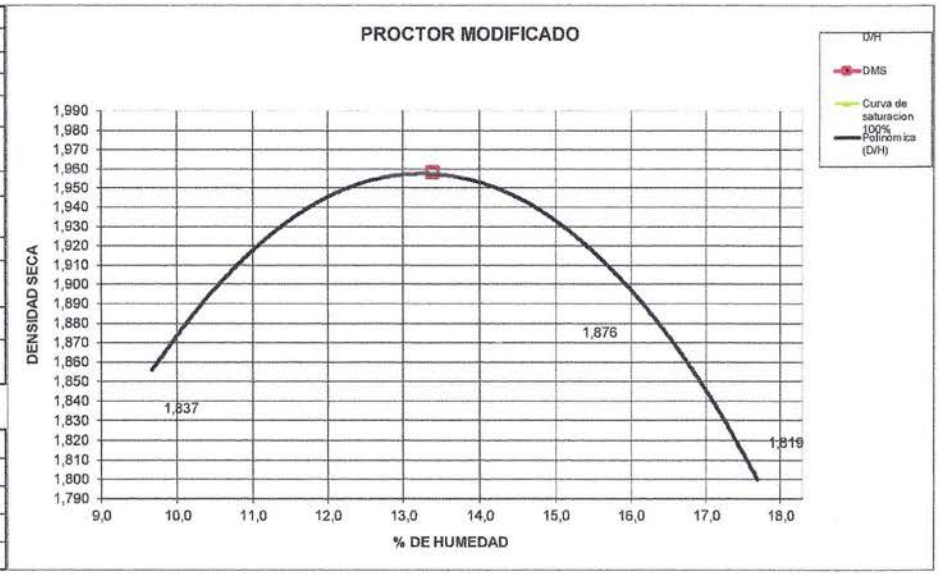

PRUEBA DE HUMEDAD DE HORNO

Capsula Numero.	18	481	37	41	
Peso capsula + suelo humedo (gr)	351,80	276,90	327,40	534,80	
Peso capsula + suelo seco (gr)	323,90	250,90	288,90	460,00	
Peso capsula (gr)	35,50	37,10	35,80	37,30	
Humedad (%).	9,7	12,2	15,2	17,7	

RESULTADOS.

Densidad Seca Máxima [gr/cm^3].	**1,958**
Contenido Optimo de Humedad [%].	**13,4 %**

Observaciones:

EJECUTADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Camilo Padilla	Nombre: Ing Guillermo Bastidas	Nombre: James Muñoz
Cargo: Laboratorista	Cargo: Ingeniero de calidad	Cargo: Director Tecnico

Dirección: Cra 12C # 11-25 Villa Marcela, Mosquera – Cundinamarca. Sucursal: Cra 90 #149-70 Bogota D.C – Colombia.
Telefonos: 3105552531 3022884476 3123319273
Correos: Pavilabgerencia@gmail.com Pavilabadm@gmail.com Pavilabcomercial@gmail.com Pavilabdirector@gmail.com

183

PAVI LAB	CONTROL DE DENSIDADES CON DENSIMETRO AST)22 D 3017	CODIGO RDAG 13-01 VERSION 13-01 1222

PROYECTO: ALCANTARILLADO TABIO
SECTOR: TABIO CUNDINAMARCA
DESCRIPCION: SUB BASE
FECHA: viernes, 30 de septiembre de 2022
ORDENADO POR: CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO

ABSCISA	TIPO DE MATERIAL	CAPA N°	COSTADO			PROCTOR		REVISION			PROFUNDIDAD (cm)	OBSERVACIONES
			IZQ	EJE	DER	DENSIDAD OPTIMA (kg/m3)	HUMEDAD OPTIMA (%)	DENSIDAD SECA (kg/m3)	COMPACTACION (%)	HUMEDAD DE CAMPO (%)		
K0+166	SUB TB	1			X	1958,0	13,4	1795,0	91,7	9,2	15,0	CALLE 11 ENTRE CRA 1 Y 3
K0+140	SUB TB	1	X			1958,0	13,4	1791,0	91,5	7,4	15,0	CALLE 11 ENTRE CRA 1 Y 3
K0+110	SUB TB	1		X		1958,0	13,4	1780,0	90,9	8,2	15,0	CALLE 11 ENTRE CRA 1 Y 3
K0+070	SUB TB	1			X	1958,0	13,4	1760,0	89,9	9,8	15,0	CALLE 11 ENTRE CRA 1 Y 3
K0+030	SUB TB	1			X	1958,0	13,4	1770,9	90,4	8,4	15,0	CALLE 11 ENTRE CRA 1 Y 3
K0+040	SUB TB	1			X	1958,0	13,4	1927,0	98,4	9,3	15,0	CALLE 2 ENTRE CRA 1
KO+110	SUB TB	1		X		1958,0	13,4	1834,6	93,7	7,5	15,0	CALLE 2 ENTRE CRA 1
K0+150	SUB TB	1	X			1958,0	13,4	1841,6	94,1	6,6	15,0	CALLE 2 ENTRE CRA 1

OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA SACAR FALLA EN CALLE 2 ENTRE CARRERA 1 Y 3

REALIZO: JAMES MUÑOZ	APROBO: GUILLERMO BASTIDAS

Dirección: Cra 12C # 11-25 Villa Marcela, Mosquera – Cundinamarca. Sucursal: Cra 90 #149-70 Bogota D.C – Colombia.
Telefonos: 3105552531 3022884476 3123319273
Correos: Pavilabgerencia@gmail.com Pavilabadm@gmail.com Pavilabcomercial@gmail.com Pavilabdirector@gmail.com

184

CERTIFICADO DE RCD

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1224

ALBORAL	CERTIFICA QUE: ANEXO II FORMATO CONSTANCIA GESTORES - Resolución 1257 de 2021	# IC. 2409014

DATOS BASICOS DEL GESTOR		
Numero unico asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	Registro No. 16	
Nombre o razón social	ALBORAL S.A.	
Documento de identificación o NIT	900.136.349-4	
Representante Legal	LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO	
Dirección	Predio Los Cerezos, Vereda Basillas	
Teléfono	3125178308	
Correo electrónico	planta.alboral@gmail.com	
Municipio o Distrito	Mosquera - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
	DATOS BASICOS DEL CLIENTE	
Número único asignado para el gestor por parte de autoridad ambiental competente por proyecto	REGISTRO No. 16	
Nombre o razón social	PROYECTOS DE INGENIERIA AASING SAS	
Documento de identificación o NIT	900.976.357-7	
Contratista	TRANSMATERIALES Y ZONAS VERDES S.A.S. Nit	
contratista	901.760.007-1	
Teléfono	305 3678028	
Correo electrónico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	Proyecto: Construcción Placa Huellas Municipio La Vega C/marca CTO 161-2025	

CANTIDADES DE RCD RECEPCIONADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cant. de RCD recibidos del generador (I)	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	162 m3	162 m3
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros		
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	25 m3	25 m3
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión		
Total RCD decepcionados (I)	187 m3	187 m3
Fecha de recepción de los RCD	03 de junio de 2025 al 10 de octubre de 2025	

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO
C.C. o NIT 900.136.349-4

Link Gestores de RCD inscritos en la jurisdicción CAR, modalidad Planta de Aprovechamiento RCD: https://www.car.gov.co/vercontenido/3795

217

1225

PÓLIZAS ACTUALIZADAS A ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

185

1224

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101251796	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2025	03	06	2025	00:00	03	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS	NIT: 900.976.357-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
vda chuntame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CAJICA, CUNDINAMARCA	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1	NIT: 800.073.475-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 NRO. 19 - 71	LA VEGA, CUNDINAMARCA	8458765

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. C-OBRA-No. 161-2025 REFERENTE A: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGUN CONVENIO ICCU 707 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGUN CONVENIO ICCU 738 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGUN CONVENIO ICCU 716 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2025	03/04/2026	$65,459,293.74	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/06/2025	03/12/2028	$32,729,646.87	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/10/2025	03/10/2030	$130,918,587.48	

ACLARACIONES

SEGUNACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA CON FECHA DE FIRMA DEL 10/10/2025. LOSDEMASTERMINOSY CONDICIONES NO MODIFICADOSCONTINUANVIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******229,107,528.09	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA	143373	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Carlos Andrés Pinzón Lopez

FIRMA TOMADOR

186

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7227

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101251796	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2025	03	06	2025	00:00	03	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS	**NIT: 900.976.357-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
vda chuntame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CAJICA, CUNDINAMARCA	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1	**NIT: 800.073.475-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 3 NRO. 19 - 71	LA VEGA, CUNDINAMARCA	8458765

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Carlos Andres Pinzón López

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1228

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101251796, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de OCTUBRE de 2025

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

185

1229

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101251796	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2025	03	06	2025	00:00	10	10	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS	NIT: 900.976.357-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
vda chuntame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CAJICA, CUNDINAMARCA	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1	NIT: 800.073.475-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 NRO. 19 - 71	LA VEGA, CUNDINAMARCA	8458765

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. C-OBRA-No. 161-2025 REFERENTE A: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGUN CONVENIO ICCU 707 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGUN CONVENIO ICCU 738 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGUN CONVENIO ICCU 716 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2025	03/04/2026	$65,459,293.74	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/06/2025	03/12/2028	$32,729,646.87	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/10/2025	10/10/2030	$130,918,587.48	$130,918,587.48

ACLARACIONES

SEGUNACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA CON FECHA DE FIRMA DEL 10/10/2025.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******229,107,528.09	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA	143373	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Carlos Andres Pinzon Lopez

FIRMA TOMADOR

189

1230

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101251796	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2025	03	06	2025	00:00	10	10	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS	**NIT: 900.976.357-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
vda chuntame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CAJICA, CUNDINAMARCA	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1	**NIT: 800.073.475-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 3 NRO. 19 - 71	LA VEGA, CUNDINAMARCA	8458765

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Carlos Andres Pinzon Lopez

FIRMA TOMADOR

190

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1231

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101251796, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de OCTUBRE de 2025

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

191

MANUAL DE MANTENIMIENTO

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1733

MANUAL DE MANTENIMIENTO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".



CONTRATO DE OBRA No. 161 DE 2025

Entidad contratante:
MUNICIPIO LA VEGA CUNDINAMARCA

OCTUBRE DE 2025

193

1. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como finalidad presentar las instrucciones de mantenimiento que van encaminadas a conocer las operaciones que periódicamente se precisan acometer debido a las actividades de obras ejecutas para el Municipio de La Vega Cundinamarca, mediante contrato de obra No. 161 de 2025., el objetivo principal de este documento es mencionar el conjunto de operaciones y cuidados de la infraestructura física, necesarios su adecuado funcionamiento.

El grupo de acciones contenidas en este manual, no pretende ser un escrito ampliamente detallado sobre el mantenimiento vial, sino que sirve como guía para enunciar las principales actividades de mantenimiento que se deben llevar a cabo para garantizar el buen estado de una vía, en todo caso ante cualquier duda se debe consultar a la entidad contratante El Municipio de La Vega, y el manual de mantenimiento de carreteras del INVIAS.

Se recomienda realizar estas actividades de mantenimiento, periódicamente o siempre que, mediante el diagnóstico del estado de las obras, se compruebe que hay deterioro y así lo requieran.

Cabe decir que este manual es una herramienta adecuada y útil, pero también a partir de ahora obligatoria con el fin de garantizar la vida útil de las obras civiles desarrolladas.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ASPECTOS GENERALES 5
2.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 5
2.2 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. OBJETIVOS 9
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10
5. OBRAS CONSTRUIDAS 11
5.1 Placa-huella 11
5.2 Riostra 11
5.3 Piedra pegada 11
5.4 Berma, cuneta y bordillo 11
6. FRECUENCIA Y TIPOS DE INSPECCIÓN 12
7. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO. 13
7.1 Limpieza de las obras de drenaje 13
7.2 La rocería de las zonas laterales. 13
8. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO. 14
8.1 Inspección visual 14
8.2 Reparaciones superficiales del concreto 14
9. PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 15
9.1 Mantenimientos rutinarios 15
9.2 Mantenimientos periódicos 15
10. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RECOMENDADAS 16
10.1 Propósito de la bitácora de mantenimiento 16
10.2 Frecuencia de diligenciamiento 16
10.3 Contenido mínimo recomendado 16
10.4 Conservación y archivo de la bitácora 18
11. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 19

12. RECOMENDACIONES GENERALES 20
12.1 Técnicas 20
12.2 SG-SST 21
12.3 ADMINISTRATIVAS 21
13. CONCLUSIONES 22
14. BIBLIOGRAFÍA 23

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Mantenimientos rutinarios 15
Tabla 2 Registro fotográfico socialización del proyecto a la comunidad 15

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega 6
Ilustración 2 Localización general de la vía que comunica la vereda San Antonio sector Bole ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda Ucrania sector La Torre .. **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 4 Localización general de la vía vereda la Alianza sector Buenos Aires ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1237

2. ASPECTOS GENERALES

El mantenimiento pretende proteger y prolongar la vida útil de la infraestructura física, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a los usuarios, disminuir las tasas de deterioro de la infraestructura física y evitar pérdidas de inversión de capital y costos de operación.

El mantenimiento es el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades o bienes (inmuebles, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, etc.), en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido

Existen dos facetas para ejecutar un efectivo mantenimiento para un mejoramiento de vías:

2.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del camino y que se realizan diariamente en los diferentes tramos de la vía. Tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos que conforman la vía con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción.

Debe ser de carácter preventivo dichas actividades están destinadas a reparar o reponer situaciones de deterioro que se producen en la carretera y en sus elementos conexos a lo largo del año y que, en cierta medida, son independientes de la intensidad del tránsito y de las condiciones meteorológicas.

2.2 MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Acciones que se requieren ocasionalmente o con una periodicidad superior a un año en una carretera y sus elementos conexos y que, en cierta medida, se pueden programar con antelación, debido a que son determinadas principalmente por el tránsito y las condiciones meteorológicas.

Son aquellas operaciones de mantenimiento enfocadas a prevenir un deterioro en las características del material, equipo o instalación intervenida, en el tiempo.

197

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Vega es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia, que se caracteriza por su entorno rural y su riqueza natural, se encuentra en la región central de Colombia.

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega



Características:

- Extensión total: 146 km²
- Altitud de la cabecera municipal:1510 m.s.n.m
- Temperatura media: 19 °C
- Habitantes: 7361 hab

Fuente: Alcaldía de la Vega

Las zonas por intervenir son parte del área rural del municipio de la vega son vías que comunican veredas entre sí y con la zona urbana, el proyecto tiene como objetivo brindar mejoramiento a las condiciones de circulación por las veredas que comunica esta vía, facilitando la comunicación y movilización de productos del sector campesino del municipio.

198

a. Vía que conduce de la vereda Nagui a la vereda Hoya Grande sector la Ye el Descanso

Ilustración 2 Localización general de la vía que a la vereda Hoya Grande sector la Ye el descanso



Fuente: Alcaldía de la Vega

b. vía que comunica la vereda Centro con la vereda La Alianza sector El Rosario.

Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda la Alianza sector El Rosario.



Fuente: Alcaldía de la Vega

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

4. OBJETIVOS

- Preservar la integridad estructural de la placa huella, garantizando su funcionalidad y prolongando su vida útil.

- Prevenir el deterioro prematuro de la superficie de rodadura y de los elementos de confinamiento mediante acciones de mantenimiento periódico y correctivo.

- Asegurar condiciones óptimas de transitabilidad para vehículos y peatones, especialmente en zonas rurales con alto tránsito de maquinaria agrícola o transporte local.

- Controlar el escurrimiento superficial de aguas lluvias mediante la conservación de cunetas, drenajes y demás elementos complementarios.

- Cumplir con los estándares técnicos y normativos aplicables para infraestructura vial rural, promoviendo la seguridad y la sostenibilidad de la vía.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de La Vega Cundinamarca, ha identificado la necesidad para el mantenimiento, rehabilitación y conservación de vías del sector rural, las cuales, a pesar de contar con un bajo volumen de tránsito, principalmente de vehículos livianos como los automóviles, camperos o motocicletas, son esenciales para la conectividad de las comunidades. En este contexto, considerando la prioridad de mejorar la infraestructura vial para el bienestar de los habitantes rurales, se destinarán recursos para la construcción de pavimentos de placa huella de concreto reforzado.

Este proyecto se justifica a partir de la previa la evaluación técnica que ha determinado la urgencia y la viabilidad de intervenir las siguientes vías, en búsqueda de mejorar las condiciones de accesibilidad de la población rural hacia el casco urbano del municipio y, a su vez, facilitar la conexión con otras regiones del país.

La intervención contempla el mejoramiento de aproximadamente 500 metros de placa huella.

- Mejoramiento De La Via Que Comunica La Vereda Nagui Con La Vereda Hoya Grande Sector La Ye El Descanso Según Convenio Iccu 707 – 2024.
- Mejoramiento De La Via Que Comunica La Vereda Centro Con La Vereda La Alianza Sector El Rosario Según Convenio Iccu 738 – 2024.
- Mejoramiento De La Via Que Comunica La Vereda Naguy Alto Con La Vereda La Hoya Grande Sector Cuatro Esquinas Según Convenio 716 - 2024
- Mejoramiento De La Via en la vereda Naguy alto Sector Monte Oscuro
- Mejoramiento De La Via en la Vereda Guarumal Sector El Moro

El desarrollo del proyecto busca mejorar la conectividad y accesibilidad vial en el sector rural, lo cual impactará positivamente en la calidad de vida de los habitantes y en el desarrollo económico de la región, fortaleciendo los vínculos entre la zona rural y el resto del municipio y la región.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

5. OBRAS CONSTRUIDAS

A continuación, se mencionan las principales actividades realizadas

5.1 Placa-huella

Es una losa de concreto reforzado, fundida sobre la subbase. Esta entre otros, soporta los esfuerzos que se producen por el paso de los ejes de los vehículos.

5.2 Riostra

Es una viga transversal de concreto reforzado, este acero de refuerzo se entrecruza con el acero de la placa huella, la función es de confinamiento transversal y longitudinal de los elementos del pavimento que se construyen sobre la subbase como son las placas-huella, la piedra pegada, la berma-cuneta y el bordillo.

5.3 Piedra pegada

La piedra pegada es una capa de concreto ciclópeo.

5.4 Berma, cuneta y bordillo

La Berma, cuneta y el bordillo son elementos de drenaje superficial construidos en concreto reforzado, fundidos monolíticamente y articulados estructuralmente con la riostra.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

6. FRECUENCIA Y TIPOS DE INSPECCIÓN

Se recomiendan dos tipos de inspecciones:

Inspección de rutina (visual)

Frecuencia: Mensual y/o después de eventos de lluvia intensa o sismos.

Objetivo: Detectar cambios visibles en la estructura (fisuras, deformaciones, corrosión de malla, etc.).

Inspección detallada (técnica)

Frecuencia: Cada 6 a 12 meses, o cuando se evidencien daños significativos en la inspección de rutina.

Objetivo: Verificar la condición interna de las celdas de contención, el estado del relleno de piedra, la tensión de la malla, la integridad de anclajes y la presencia de asentamientos en la base.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

7. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

7.1 Limpieza de las obras de drenaje.

Se deben realizar las labores de limpieza general, estas labores consideran la recolección y retiro de basuras y desechos, el retiro de obstáculo, animales muertos, remoción de elementos invasores

7.2 La rocería de las zonas laterales.

Esta actividad consiste en el trabajo de eliminación selectiva de vegetación existente en las zonas laterales de la vía, además considera la limpieza de residuos vegetales, que en la mayoría de los casos se manifiesta en maleza o especies invasoras, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos y así garantizar que las obras no se van a deteriorar por presencia de vegetación. La disposición de estos debe realizarse en sitios aprobados.

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

8. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

Uno de los principales atributos de las placas huellas es reducir los costos en construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento tradicional. Sin embargo, es necesario efectuar las operaciones de mantenimiento con el fin de inspeccionar y mantener un adecuado estado del pavimento.

8.1 Inspección visual.

Se recomienda realizar inspección visual del mejoramiento realizado de forma periódica, con el fin de identificar la condición de la vía y hallar patologías existentes. En todo caso de presentarse alguna patología, se debe consultar un técnico especializado.

8.2 Reparaciones superficiales del concreto.

Los deterioros superficiales menores (descamados, desportilladuras, etc.) se podrán realizar mediante la demarcación del área a reparar, se hará remoción del concreto deteriorado, Limpieza de la superficie, reparación de las juntas y aplicación de un puente de adherencia, colocación, terminación y curado del material de relleno. y sellado de las juntas. La selección de materiales debe ser adelantado por un profesional. Sin carácter limitante, se pueden mencionar los morteros y concretos convencionales y los morteros a base de resinas sintéticas

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

9. PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

9.1 Mantenimientos rutinarios

Tabla 1 Mantenimientos rutinarios

OPERACIÓN	FRECUENCIA
Rocería de las zonas laterales	Por lo menos dos veces al año, se sugiere en periodos diferente a la temporada de lluvias que o cada vez que la inspección de como resultado que se debe realizar limpieza.

Fuente: AASING S.A.S

9.2 Mantenimientos periódicos

Tabla 2 Mantenimientos periódicos

OPERACIÓN	FRECUENCIA
Inspección visual	Periodicidad superior a un año.
Reparaciones superficiales del concreto	Periodicidad superior a un año o cada vez que se presenten.

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

10. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RECOMENDADAS

A continuación, se describe de manera detallada cómo debe estructurarse y diligenciarse la bitácora de mantenimiento, entendida como el documento o registro oficial en el que se consignan todas las actividades de inspección y mantenimiento realizadas sobre las estructuras de placa huella:

10.1 Propósito de la bitácora de mantenimiento

- Registrar de manera sistemática todas las actividades de inspección y mantenimiento, incluyendo fechas, responsables, acciones tomadas y observaciones relevantes.
- Proveer trazabilidad y evidencia documental de las acciones correctivas o preventivas efectuadas, así como de las condiciones en que se encuentra la obra en cada inspección.
- Facilitar la toma de decisiones en caso de requerir intervenciones adicionales, reforzamientos o reparaciones mayores.
- Garantizar la continuidad y coherencia de los trabajos de mantenimiento a lo largo del tiempo, permitiendo que futuras administraciones o equipos técnicos accedan al historial completo de la obra.

10.2 Frecuencia de diligenciamiento

Se recomienda actualizar la bitácora:

- Cada vez que se realice una inspección de rutina.
- Después de eventos de lluvias intensas, sismos o cualquier fenómeno que pueda comprometer la estabilidad de la estructura.
- Al efectuar una inspección detallada.
- Durante y después de cada actividad de mantenimiento, ya sea correctiva o preventiva.

10.3 Contenido mínimo recomendado

A continuación, se listan los campos o secciones que deben incluirse en cada registro de la bitácora. Para una mejor organización, se sugiere el uso de tablas o formatos prediseñados:

- Fecha y hora:

Registrar el día, mes, año y la hora de inicio y fin de la actividad o inspección.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

- Nombre de la obra o sección intervenida:

Identificar claramente la sección de la estructura donde se realizó la actividad.

- Equipo responsable / Nombre de los inspectores o técnicos:

Indicar quién o quiénes llevaron a cabo la inspección o el mantenimiento.

- Descripción de la actividad:

Detalle la acción ejecutada:

- Inspección visual.
- Retiro de escombros.
- Reposición de piedras.
- Ajuste de la malla metálica.
- Revisión de la subbase, etc.
- Mencionar si se utilizaron herramientas o equipos especiales.

- Observaciones y hallazgos:

Registrar cualquier anomalía o condición relevante encontrada, como fisuras, deformaciones, corrosión de elementos metálicos, asentamientos, pérdida de material, etc.
Anotar signos de humedad o filtraciones que puedan requerir atención.
Mencionar el estado general de la estructura (bueno, regular, crítico).

- Acciones correctivas o preventivas realizadas:

Describir de manera específica qué se hizo para corregir o prevenir el problema observado.

- Materiales utilizados (si aplica):

Enumerar los insumos o materiales empleados, indicando cantidades ejecutadas para cada una de las actividades de mantenimiento realizadas.

- Recomendaciones / acciones futuras:

Registrar sugerencias o necesidades detectadas para un mantenimiento posterior, así como la fecha tentativa para la próxima inspección.

- Registro fotográfico de la bitácora:

El registro fotográfico de la bitácora es un elemento fundamental en el reporte de seguimiento y control al mantenimiento de la obra, debido a que aporta evidencia indiscutible del estado de la estructura en un momento especifico de tiempo.

Por lo anterior, se recomienda que el o los formatos de registro fotográfico contengan al menos información técnica tal como fecha y hora, localización y orientación y descripción breve o comentario de la fotografía que destaque aspectos críticos, anomalías o avances en el mantenimiento.

Adicionalmente, la calidad de las imágenes es fundamental para garantizar la visibilidad de detalles importantes como grietas, fisuras, corrosión en la malla o signos de asentamientos, por lo tanto, se recomienda tomar fotografías desde distintos ángulos y perspectivas para

209

cubrir de manera completa cada sección del gavión. Esto incluye tomas generales y acercamientos específicos en áreas críticas.

Así mismo, como parte integral de la bitácora, para el registro fotográfico realizado en cada inspección o mantenimiento, se recomienda establecer un protocolo fotográfico que defina los puntos clave a documentar en cada inspección, asegurando la consistencia en el registro a lo largo del tiempo.

10.4 Conservación y archivo de la bitácora

Se recomienda mantener la bitácora en un lugar accesible para el personal autorizado y, preferiblemente, contar con una copia de respaldo en formato digital.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

11. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

1. **Personal calificado:**

   El mantenimiento debe ser realizado por personal con experiencia en obras civiles y construcción y/o mantenimiento de placa huellas, adicionalmente, como se ha mencionado en el presente manual, cada una de las intervenciones que se vayan a ejecutar por parte del personal deben contar con previa aprobación por parte de la entidad contratante, así como que se debe contar con el acompañamiento y supervisión de un profesional especialista en el área con el propósito de garantizar un buen mantenimiento de la obra.

2. **Equipo de protección personal (EPP)**

   Se requiere que el personal que realizará los mantenimientos use casco, guantes, botas de seguridad, arnés, chaleco reflectivo, gafas de protección.

   Adicionalmente, se recomienda capacitar al personal que intervendrá en las actividades de mantenimiento, sobre el uso adecuado y la necesidad de la implementación de dichos elementos de protección personal, así como el actuar en caso de presentarse una contingencia durante la ejecución del mantenimiento.

3. **Delimitación y señalización del área de trabajo:**

   Cuando se realicen trabajos de mantenimiento, se deben instalar señales de precaución y, de ser necesario, desvíos provisionales. Lo anterior incluye, establecer un perímetro de seguridad claro alrededor del muro.

4. **Monitoreo de condiciones climáticas:**

   Evitar trabajos de mantenimiento en días de lluvia intensa o cuando existan alertas de deslizamientos en la zona.

   En este apartado, es imperante recordar que se desarrollaran actividades de un riesgo medio-alto, toda vez que las actividades de mantenimiento se ejecutaran en un muro de contención, el cual colinda con una quebrada, por lo que es de vital importancia previo a la realización de cualquier intervención, realizar un monitoreo de las condiciones climáticas y en caso de presentarse lluvias intensas que generen inestabilidad en el caudal de la quebrada, considerar suspender las actividades.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

12. RECOMENDACIONES GENERALES

12.1 Técnicas

- Realizar la ejecución de todas las actividades de mantenimiento, y ante cualquier inquietud que se presente consultar con la entidad contratante (Municipio de La Vega)

- Se solicita no realizar actividades invasivas y no invasivas con el fin de proteger la integridad de las obras civiles realizadas.

- Realizar revisión periódica, identificando patología, daño o suciedad; presente en la estructura vial, con el fin de diagnosticarlas y solucionarlas tempranamente.

- Se recomienda que cada vez que se vaya a realizar una actividad de mantenimiento, se haga con el acompañamiento de un experto en el área, para garantizar la buena ejecución de este.

- Es importante que el municipio genere bitácora e informes de mantenimiento con su correspondiente registro fotográfico.

- Es indispensable que no se realicen reparaciones ni intervenciones a lo largo de las zonas de intervención sin autorización del contratista, ya que durante el periodo de garantía no se podrán realizar actividades por parte de terceros. De lo contrario no se dispondrá de las garantías correspondientes.

- Es importante que el municipio realice la señalización horizontal y vertical de control de velocidad y capacidad (peso) de los vehículos para que el transito que se cuenta en la zona no supere el permitido por el diseño de placa huella teniendo en cuenta que es una vía de tercer orden.

- En caso de presentarse condiciones de flujo de agua o humedades adyacentes a las placa huellas construidas, el municipio deberá gestionar de manera inmediata la instalación de filtros o sistemas pertinentes para conservar y garantizar la estabilidad de las obras, esto teniendo en cuenta que presupuestalmente no se contempló la instalación y ejecución de dichas actividades.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

12.2 SG-SST

- Los operarios o trabajadores se deberán encontrar en perfecto estado físico y mental, para la realización de cada una de las actividades de mantenimiento.

- El personal debe portar en todo momento la dotación que se le haya entregado y la cual lo identifique como trabajadores.

- El uso y conservación de los EPP deben ser obligatorios para la totalidad del tiempo que dure la actividad.

12.3 ADMINISTRATIVAS

- Se recomienda al municipio, vigilar el uso adecuado de las obras civiles realizadas, especialmente que no se depositen materiales y obstáculos en las obras de drenaje.

- Realizar y radicar evidencias físicas de cada uno de los mantenimientos realizados.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

13. CONCLUSIONES

- Es importante realizar un control de los periodos en los cuales se realiza mantenimientos y evidenciar el estado de la vía.

- Es primordial realizar cada uno de los mantenimientos expuestos en este manual, para garantizar la calidad y de las obras de mejoramiento realizadas.

- En las ocasiones que se vaya a realizar o a proceder con algún mantenimiento, se debe tener la certeza y la validación de un experto en el área que se va a intervenir, con el fin de ejecutarlo debidamente.

- Cada vez que se desee modificar alguna de las estructuras, se deberá acudir a un profesional en el tema, con el fin de garantizar la calidad de las obras civiles realizadas.

- Todos los materiales extraídos o sobrantes deberán ser recogidos, cargados y transportados a sitios autorizados de vertimiento, donde se dispondrán de la forma exigida por la autoridad ambiental correspondiente.

- El municipio deberá garantizar los mantenimientos descritos en este documento, igualmente deberán consignarse en bitácora e informes con su respectivo registro fotográfico, adicionalmente el municipio se encargará de realizar los trámites pertinentes para garantizar la señalización de las vías ejecutadas de tal manera se reduzca la velocidad de tráfico y no se permita la circulación de vehículos de carga pesada sobre las mismas.

- El municipio dentro de las revisiones periódicas verificara que no se presenten condiciones de humedades y/o infiltraciones de agua a las zonas de ejecución de placa huella, dado el caso que se presente, el municipio garantizara la implementación y ejecución inmediata de filtros u otros sistemas para velar por la estabilidad de las obras generadas en pro de extender la vida útil de las vías terciarias disponibles.

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

14. BIBLIOGRAFÍA

- INVIAS. (2015). *Guía de diseño de pavimentos con placa huella*. Obtenido de Instituto Nacional de Vías: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/6644-guia-de-disenoo-de-pavimentos-con-placa-huella/file

- INVIAS. (2015). *Instituto Nacional de Vías*. Obtenido de Guía de diseño de pavimentos con placa-huella: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/6644-guia-de-disenoo-de-pavimentos-con-placa-huella/file

- SENA. (s.f.). *Formación complementaria, prevención y construcción de obras de arte para vías.* Obtenido de MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE PARA VÍAS: http://files.construccion-de-edificaciones.webnode.com.co/200000172-5bdeb5cd84/MANTENIMIENTO%20DE%20OBRAS%20DE%20DRENAJE%20PARA%20VIAS.pdf

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1257

DAPCIL S.A.S.
INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E – 410

CODIGO: FO - RE - 09
VERSION: 3
FECHA: 20-ene.-18

PROYECTO: VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO TRAMO 1

UBICACIÓN: VEREDA GUARUMAL MUNICIPIO DE LA VEGA
INTERVENTOR: INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERÍA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS

NI : _____

O.T. : _____

PROB No.	FECHA FUNDIDA	UBICACION	EDAD [DIAS]	FECHA ROTURA	AST. Pulg	TIPO DE MEZCLA	LECT. PRENSA KN	DIMENSIONES Long [cm]	DIMENSIONES Diametro [cm]	PESO [g]	PESO UNITARIO [g/cm³]	RESISTENCIA f'c [PSI]	% DESARROLLO	OBSERVACIONES
1	25/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	7	2/10/2025	3 "	3000	269	30,12	15,11	12.732	2,36	2176	73	
2	25/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	14	9/10/2025	3 "	3000	323	30,12	15,11	12.732	2,36	2613	87	
3	25/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	21	16/10/2025	3 "	3000	360	30,12	15,11	12.732	2,36	2912	97	
4	25/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	28	23/10/2025	3 "	3000	389	30,12	15,11	12.732	2,36	3146	105	
5	24/09/2025	HUELLA CICLOPEO	7	1/10/2025	3 "	2000	177	30,12	15,11	12.732	2,36	1432	72	
6	24/09/2025	HUELLA CICLOPEO	14	8/10/2025	3 "	2000	201	30,12	15,11	12.732	2,36	1626	81	
7	24/09/2025	HUELLA CICLOPEO	21	15/10/2025	3 "	2000	233	30,12	15,11	12.732	2,36	1885	94	
8	24/09/2025	HUELLA CICLOPEO	28	22/10/2025	3 "	2000	254	30,12	15,11	12.732	2,36	2054	103	
9	30/09/2025	CUNETAS	7	7/10/2025	3 "	2500	206	30,12	15,11	12.732	2,36	1666	67	
10	30/09/2025	CUNETAS	14	14/10/2025	3 "	2500	264	30,12	15,11	12.732	2,36	2135	85	
11	30/09/2025	CUNETAS	21	21/10/2025	3 "	2500	291	30,12	15,11	12.732	2,36	2354	94	
12	30/09/2025	CUNETAS	28	28/10/2025	3 "	2500	316	30,12	15,11	12.732	2,36	2556	102	

DAPCIL S.A.S.

ELABORO: NELSON PARDO GONZALES
JEFE DE LABORATORIO

REVISO:

Calle 143 No 96 - 55 Teléfono (1) 258 59 75 - 310 886 19 72 Bogotá D.C. - Colombia

219

12

1258

DAPCIL S. A. S.
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E - 410

CODIGO: FO - RE - 09
VERSION: 3
FECHA: 20-ene.-18

PROYECTO: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024

NI : _____

UBICACIÓN: LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO
INTERVENTOR: INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERÍA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS

O.T. : _____

PROB No.	FECHA FUNDIDA	UBICACION	EDAD [DIAS]	FECHA ROTURA	AST. Pulg	TIPO DE MEZCLA	LECT. PRENSA KN	DIMENSIONES Long [cm]	DIMENSIONES Diametro [cm]	PESO [g]	PESO UNITARIO [g/cm³]	RESISTENCIA f'c [PSI]	% DESARROLLO	OBSERVACIONES
1	26/06/2025	HUELLA CICLOPEO	7	3/07/2025	3 "	2000	185	30,12	15,11	12.732	2,36	1496	75	
2	26/06/2025	HUELLA CICLOPEO	14	10/07/2025	3 "	2000	210	30,12	15,11	12.732	2,36	1699	85	
3	26/06/2025	HUELLA CICLOPEO	21	17/07/2025	3 "	2000	229	30,12	15,11	12.732	2,36	1852	93	
4	26/06/2025	HUELLA CICLOPEO	28	24/07/2025	3 "	2000	252	30,12	15,11	12.732	2,36	2038	102	
5	27/06/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	7	4/07/2025	3 "	3000	271	30,12	15,11	12.732	2,36	2192	73	
6	27/06/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	14	11/07/2025	3 "	3000	318	30,12	15,11	12.732	2,36	2572	86	
7	27/06/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	21	18/07/2025	3 "	3000	360	30,12	15,11	12.732	2,36	2912	97	
8	27/06/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	28	25/07/2025	3 "	3000	396	30,12	15,11	12.732	2,36	3203	107	
9	8/07/2025	CUNETAS	7	15/07/2025	3 "	2500	209	30,12	15,11	12.732	2,36	1690	68	
10	8/07/2025	CUNETAS	14	22/07/2025	3 "	2500	261	30,12	15,11	12.732	2,36	2111	84	
11	8/07/2025	CUNETAS	21	29/07/2025	3 "	2500	288	30,12	15,11	12.732	2,36	2329	93	
12	8/07/2025	CUNETAS	28	5/08/2025	3 "	2500	313	30,12	15,11	12.732	2,36	2532	101	

DAPCIL S.A.S.

ELABORO: NELSON PARDO GONZALES
JEFE DE LABORATORIO

REVISO:

Calle 181 No 46 – 55 Teléfono (1) 258 59 75 – 315 806 90 72 Bogotá D.C. – Colombia
www.dapcilsas.com.co

202

1259

DAPCIL S.A.S.
INGENIERÍA PROYECTOS Y OBRAS
SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E - 410

CODIGO: FO - RE - 09
VERSION: 3
FECHA: 20-ene.-18

PROYECTO: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024

UBICACIÓN: VEREDA ALIANZA MUNICIPIO DE LA VEGA
INTERVENTOR: INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERÍA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS

NI : _____

O.T. : _____

PROB No.	FECHA FUNDIDA	UBICACION	EDAD [DIAS]	FECHA ROTURA	AST. Pulg	TIPO DE MEZCLA	LECT. PRENSA KN	DIMENSIONES Long [cm]	DIMENSIONES Diametro [cm]	PESO [g]	PESO UNITARIO [g/cm³]	RESISTENCIA f'c [PSI]	% DESARROLLO	OBSERVACIONES
1	27/08/2025	HUELLA CICLOPEO	7	3/09/2025	3 "	2000	183	30,12	15,11	12.732	2,36	1480	74	
2	27/08/2025	HUELLA CICLOPEO	14	10/09/2025	3 "	2000	211	30,12	15,11	12.732	2,36	1707	85	
3	27/08/2025	HUELLA CICLOPEO	21	17/09/2025	3 "	2000	227	30,12	15,11	12.732	2,36	1836	92	
4	27/08/2025	HUELLA CICLOPEO	28	24/09/2025	3 "	2000	250	30,12	15,11	12.732	2,36	2022	101	
5	15/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	7	22/09/2025	3 "	3000	277	30,12	15,11	12.732	2,36	2240	75	
6	15/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	14	29/09/2025	3 "	3000	324	30,12	15,11	12.732	2,36	2621	87	
7	15/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	21	6/10/2025	3 "	3000	367	30,12	15,11	12.732	2,36	2968	99	
8	15/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	28	13/10/2025	3 "	3000	398	30,12	15,11	12.732	2,36	3219	107	
9	1/09/2025	CUNETAS	7	8/09/2025	3 "	2500	210	30,12	15,11	12.732	2,36	1699	68	
10	1/09/2025	CUNETAS	14	15/09/2025	3 "	2500	264	30,12	15,11	12.732	2,36	2135	85	
11	1/09/2025	CUNETAS	21	22/09/2025	3 "	2500	291	30,12	15,11	12.732	2,36	2354	94	
12	1/09/2025	CUNETAS	28	29/09/2025	3 "	2500	317	30,12	15,11	12.732	2,36	2564	103	

DAPCIL S.A.S.

ELABORO: NELSON PARDO GONZALES
JEFE DE LABORATORIO

REVISO:

Calle 143 No. 46 – 55 Oficina: (1) 258 59 75 – 310 806 10 72 Bogotá D.C. – Colombia
www.dapcilsas.com.co

221

1260

DAPCIL S. A. S.
INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y OBRAS
SERVICIOS Y SOLUCIONES

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E - 410

CODIGO: FO - RE - 09
VERSION: 3
FECHA: 20-ene.-18

PROYECTO: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024

UBICACIÓN: VEREDA LA HOYA GRANDE MUNICIPIO DE LA VEGA
INTERVENTOR: INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERÍA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS

NI : _____

O.T. : _____

PROB No.	FECHA FUNDIDA	UBICACION	EDAD [DIAS]	FECHA ROTURA	AST. Pulg	TIPO DE MEZCLA	LECT. PRENSA KN	DIMENSIONES Long [cm]	DIMENSIONES Diametro [cm]	PESO [g]	PESO UNITARIO [g/cm³]	RESISTENCIA f'c [PSI]	% DESARROLLO	OBSERVACIONES
1	15/07/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	7	22/07/2025	3 "	3000	270	30,12	15,11	12.732	2,36	2184	73	
2	15/07/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	14	29/07/2025	3 "	3000	320	30,12	15,11	12.732	2,36	2588	86	
3	15/07/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	21	5/08/2025	3 "	3000	360	30,12	15,11	12.732	2,36	2912	97	
4	15/07/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	28	12/08/2025	3 "	3000	385	30,12	15,11	12.732	2,36	3114	104	
5	16/07/2025	HUELLA CICLOPEO	7	23/07/2025	3 "	2000	180	30,12	15,11	12.732	2,36	1456	73	
6	16/07/2025	HUELLA CICLOPEO	14	30/07/2025	3 "	2000	203	30,12	15,11	12.732	2,36	1642	82	
7	16/07/2025	HUELLA CICLOPEO	21	6/08/2025	3 "	2000	235	30,12	15,11	12.732	2,36	1901	95	
8	16/07/2025	HUELLA CICLOPEO	28	13/08/2025	3 "	2000	260	30,12	15,11	12.732	2,36	2103	105	
9	12/07/2025	CUNETAS	7	19/07/2025	3 "	2500	209	30,12	15,11	12.732	2,36	1690	68	
10	12/07/2025	CUNETAS	14	26/07/2025	3 "	2500	266	30,12	15,11	12.732	2,36	2152	86	
11	12/07/2025	CUNETAS	21	2/08/2025	3 "	2500	293	30,12	15,11	12.732	2,36	2370	95	
12	12/07/2025	CUNETAS	28	9/08/2025	3 "	2500	315	30,12	15,11	12.732	2,36	2548	102	

DAPCIL S.A.S.

ELABORO: NELSON PARDO GONZALES
JEFE DE LABORATORIO

REVISO:

Calle 142 No 96 - 55 Oficina 11 258 59 76 - 310 806 10 72 Bogotá D.C. Colombia

222

1261

DAPCIL S. A. S.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E - 410

CODIGO: FO - RE - 09
VERSION: 3
FECHA: 20-ene.-18

PROYECTO: VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO

UBICACIÓN: VEREDA NAGUY ALTO MUNICIPIO DE LA VEGA
INTERVENTOR: INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERÍA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS

NI : _____

O.T. : _____

PROB No.	FECHA FUNDIDA	UBICACION	EDAD [DIAS]	FECHA ROTURA	AST. Pulg	TIPO DE MEZCLA	LECT. PRENSA KN	DIMENSIONES Long [cm]	DIMENSIONES Diametro [cm]	PESO [g]	PESO UNITARIO [g/cm³]	RESISTENCIA f'c [PSI]	% DESARROLLO	OBSERVACIONES
1	21/08/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	7	28/08/2025	3 "	3000	269	30,12	15,11	12.732	2,36	2176	73	
2	21/08/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	14	4/09/2025	3 "	3000	323	30,12	15,11	12.732	2,36	2613	87	
3	21/08/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	21	11/09/2025	3 "	3000	360	30,12	15,11	12.732	2,36	2912	97	
4	21/08/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	28	18/09/2025	3 "	3000	389	30,12	15,11	12.732	2,36	3146	105	
5	22/08/2025	HUELLA CICLOPEO	7	29/08/2025	3 "	2000	177	30,12	15,11	12.732	2,36	1432	72	
6	22/08/2025	HUELLA CICLOPEO	14	5/09/2025	3 "	2000	201	30,12	15,11	12.732	2,36	1626	81	
7	22/08/2025	HUELLA CICLOPEO	21	12/09/2025	3 "	2000	233	30,12	15,11	12.732	2,36	1885	94	
8	22/08/2025	HUELLA CICLOPEO	28	19/09/2025	3 "	2000	254	30,12	15,11	12.732	2,36	2054	103	
9	25/08/2025	CUNETAS	7	1/09/2025	3 "	2500	206	30,12	15,11	12.732	2,36	1666	67	
10	25/08/2025	CUNETAS	14	8/09/2025	3 "	2500	264	30,12	15,11	12.732	2,36	2135	85	
11	25/08/2025	CUNETAS	21	15/09/2025	3 "	2500	291	30,12	15,11	12.732	2,36	2354	94	
12	25/08/2025	CUNETAS	28	22/09/2025	3 "	2500	316	30,12	15,11	12.732	2,36	2556	102	

DAPCIL S.A.S.

ELABORO: NELSON PARDO GONZALES
JEFE DE LABORATORIO

REVISO:

Calle 141 No 96 – 54 Oficina 512 58 75 – 310 305 10 72 Bogotá D.C. – Colombia

223

1262

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900116619-9

La Vega – 16 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-161-019

LA VEGA 24/09/2025 15:36
Al Contestar cite este No.: 20251105498
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:102 FOLIOS Fol:2

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoria No. 179-2025

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: **AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No.3 C-OBRA-161-2025**

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.3 para el contrato de obra C-OBRA-161-2025 mediante el comunicado OFI 161-2025-010 de fecha 09 de septiembre de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

- Pólizas actualizadas a modificatorio No. 1 Cto obra 161
- Registro fotográfico convenio ICCU 738-2024
- Registro fotográfico Adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
- Registro fotográfico Adición vereda Guarumal sector El Moro
- Bitácora convenio ICCU 738-2024

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900116619-9

- Control estado del tiempo
- Correspondencia original enviada
- Correspondencia original recibida

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta

- Informe mensual de avance No.3 en ciento un (102) Folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1264

La Vega, 09 de septiembre de 2025

OFI 161-2025-0010

Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Lorena Gómez
RECIBIDO
INTERVENTORIA
DEL PROYECTO
09 Sep 2025

REFERENCIA: Contrato de obra No.161-2025

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No.3

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de Obra No. 161 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen y atendiendo la solicitud realizada por parte de la interventoría como contratista de obra hacemos entrega formal del informe mensual de obra No.3 comprendido entre el 03 de agosto de 2025 al 02 de septiembre de 2025, el cual contiene:

- Anexo 1. Pólizas actualizadas a modificatorio No. 1 Cto obra 161
- Anexo 2. Registro fotográfico convenio ICCU 738-2024
- Anexo 3. Registro fotográfico Adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
- Anexo 4. Registro fotográfico Adición vereda Guarumal sector El Moro
- Anexo 5. Bitácora convenio ICCU 738-2024
- Anexo 6. Control estado del tiempo
- Anexo 7. Correspondencia original enviada
- Anexo 8. Correspondencia original recibida

Total, Folios: Ciento treinta y siete (102) Folios

Lo anterior se remite para aprobación y tramites correspondientes.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andres Pinzón López
CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

INFORME MENSUAL No. 3

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 – 2024 MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"



CONTRATO DE OBRA No. 161 DE 2025

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

VERSIÓN	PERIODO	OBJETO	ELABORADO	REVISADO POR	APROBADO POR
01	03/08/2025 – 02/09/2025	Informe No. 3	Residente de obra	Director Obra	Supervisión Municipal

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 8
5 ASPECTOS JURÍDICOS 9
5.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO 9
5.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO 10
6 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 11
6.1 FORMA DE PAGO 11
6.2 CORTES DE OBRA 11
7 ASPECTOS TÉCNICOS 12
7.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO 12
7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
7.2.1 Vía que comunica la vereda Nagui con la vereda Hoya Grande sector la Ye el Descanso – Convenio ICCU 707 - 2024 13
7.2.2 Vía que comunica la vereda Centro con la vereda la Alianza Sector el Rosario – Convenio ICCU 738-2024 13
7.2.3 Vía que comunica la Vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas - Convenio ICCU 716 – 2024 15
7.2.4 Vía que comunica la Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro 15
7.2.5 Vía que comunica la Vereda Guarumal Sector el Moro 17
7.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 18
7.4 BITÁCORA DE OBRA 19
7.5 ESTADO DEL TIEMPO 19
8 ASPECTOS SOCIALES 20
8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 20
8.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS 20
9 ASPECTOS SG SST 21
9.1 PERSONAL DE OBRA 21
9.2 SEGURIDAD SOCIAL 21
9.3 DOTACIONES Y (EPP) 21
10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 22
10.1 SEGUIMIENTO DE PROYECTO 22
10.1.1 Control de correspondencia 22
10.1.2 Control comités 24
11 CONCLUSIONES 25
11.1 ASPECTOS TÉCNICOS 25
11.2 ASPECTOS SG-SST 25
11.3 ASPECTOS AMBIENTALES 26

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Datos contrato de obra AASING S.A.S 8
Tabla 2 Pólizas iniciales contrato de obra AASING S.A.S. 9
Tabla 3 Pólizas acta de inicio contrato de obra AASING S.A.S 9
Tabla 4 Pólizas actualizadas al modificatorio No. 1 contrato de obra AASING S.A.S 9
Tabla 5 Documentos legales contrato de obra AASING S.A.S. 10
Tabla 6 Forma de pago del contrato AASING S.A.S 11
Tabla 7 Cortes de obra AASING S.A.S. 11
Tabla 8 Programado VS Ejecutado AASING S.A.S 12
Tabla 9 Actividades Vía vereda La Alianza Sector El Rosario 13
Tabla 10 Actividades Vía vereda Naguy Alto sector Monte Oscuro 16
Tabla 11 Actividades Vía vereda Guarumal Sector el Moro 17
Tabla 12.Control del clima periodo actual 19
Tabla 13.Plan de acompañamiento a actividades técnicas 20
Tabla 14. Relación de personal de obra 21
Tabla 14 Relación - Correspondencia enviada 22
Tabla 15 Relación - Correspondencia recibida 23
Tabla 17 Relación – comité de obra 24
Tabla 18 Avance de obra en sitios de intervención 25

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega 6
Ilustración 2 Localización general de la vía que a la vereda Hoya Grande sector la Ye el descanso 6
Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda la Alianza sector El Rosario. 7
Ilustración 4 Localización general de la vía vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas 7
Ilustración 5. Programado Vs Ejecutado AASING S.A.S 12

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1 . Pólizas actualizadas a modificatorio No. 1 Cto obra-161 9
ANEXO 2 . Registro fotográfico Convenio ICCU 738-2024 18
ANEXO 3 . Registro fotográfico Adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro 18
ANEXO 4 . Registro fotográfico Adición vereda Guarumal Sector el Moro 18
ANEXO 5 . Bitácora Convenio ICCU 738-2024 19
ANEXO 6. Control estado del tiempo Cto 161-2025 19
ANEXO 7.. Correspondencia original enviada 23
ANEXO 8.. Correspondencia original recibida 24

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las labores realizadas por la empresa AASING S.A.S, en el periodo comprendido del 03 de agosto de 2025 al 02 de septiembre de 2025, para el contrato cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 – 2024 MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" de acuerdo con la propuesta presentada y con los respectivos términos de referencia con base al contrato No. 161-2025.

Siendo una de las obligaciones del contratista suministrar información sobre el proyecto con base al avance de este, en el presente documento se muestra el control de las actividades que se realizan durante el período especificado anteriormente, durante la ejecución de todas las actividades de desarrollo, enfatizando en la calidad, estudios técnicos y especificaciones del desempeño de las operaciones actuales.

Al final, se realiza conclusiones y observaciones sobre las actividades ejecutadas hasta el periodo mencionado y se realiza entrega del presente informe a la interventoría del proyecto, para su revisión y aprobación.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de La Vega Cundinamarca, ha identificado la necesidad para el mantenimiento, rehabilitación y conservación de vías del sector rural, las cuales, a pesar de contar con un bajo volumen de tránsito, principalmente de vehículos livianos como los automóviles, camperos o motocicletas, son esenciales para la conectividad de las comunidades. En este contexto, considerando la prioridad de mejorar la infraestructura vial para el bienestar de los habitantes rurales, se destinarán recursos para la construcción de pavimentos de placa huella de concreto reforzado.

Este proyecto se justifica a partir de la previa la evaluación técnica que ha determinado la urgencia y la viabilidad de intervenir las siguientes vías, en búsqueda de mejorar las condiciones de accesibilidad de la población rural hacia el casco urbano del municipio y, a su vez, facilitar la conexión con otras regiones del país.
La intervención contempla el mejoramiento de aproximadamente 331 metros de placa huella, distribuidos en tres tramos:

a) Vía que comunica la vereda Hoya Grande sector La Ye el Descanso. Convenio ICCU 707-2024
b) Vía que comunica la vereda la Alianza Sector el Rosario. Convenio ICCU 738 -2024
c) Vía que comunica la vereda la Hoya Grande Sector Cuatro Esquinas. Convenio ICCU 716-2024
d) Vía que comunica la vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro.
e) Vía que comunica la vereda Guarumal Sector el Moro.


El desarrollo del proyecto busca mejorar la conectividad y accesibilidad vial en el sector rural, lo cual impactará positivamente en la calidad de vida de los habitantes y en el desarrollo económico de la región, fortaleciendo los vínculos entre la zona rural y el resto del municipio y la región.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Vega es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia, que se caracteriza por su entorno rural y su riqueza natural, se encuentra en la región central de Colombia.

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega

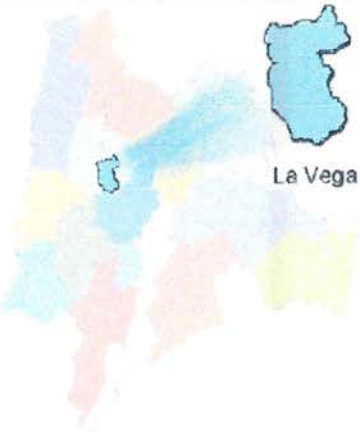

Características:

Extensión total: 146 km²
Altitud de la cabecera municipal:1510 m.s.n.m
Temperatura media: 19 °C
Habitantes: 7361 hab

Fuente: Alcaldía de la Vega

Las zonas por intervenir son parte del área rural del municipio de la vega son vías que comunican veredas entre sí y con la zona urbana, el proyecto tiene como objetivo brindar mejoramiento a las condiciones de circulación por las veredas que comunica esta vía, facilitando la comunicación y movilización de productos del sector campesino del municipio.

a. Vía que conduce de la vereda Nagui a la vereda Hoya Grande sector la Ye el Descanso

Ilustración 2 Localización general de la vía que a la vereda Hoya Grande sector la Ye el descanso



Fuente: Alcaldía de la Vega

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

b. vía que comunica la vereda Centro con la vereda La Alianza sector El Rosario.

Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda la Alianza sector El Rosario.



Fuente: Alcaldía de la Vega

c. Vía que comunica la vereda Naguy con la vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas.

Ilustración 4 Localización general de la vía vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas.



Fuente: Alcaldía de la Vega

4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Se hace la presentación detallada de la parte contractual y administrativa del contrato de obra del proyecto. Se describen a continuación los datos del contrato de obra indicando los tiempos y valores contractuales y el personal solicitado en el pliego de condiciones.

Tabla 1 Datos contrato de obra AASING S.A.S

CONTRATISTA	
Número de contrato	C-OBRA-No. 161 de 2025
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 – 2024 MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
Contratista	Proyectos de Ingeniería Diseños Construcciones y Consultorías S.A.S (AASING S.A.S)
Nit	900.976.357-7
Representante legal	Carlos Andrés Pinzón López
Valor inicial del contrato	$ 436.794.579,39
Adición No. 1	$ 217.798.358,00
Valor final del contrato	$ 654.592.937,39
Plazo de ejecución inicial	Cuatro (04) Meses
Prórroga No. 1	Dos (02) Meses
Plazo de ejecución final	Seis (06) Meses
Fecha inicio	03 de junio de 2025
Terminación inicial	02 de octubre de 2025
Terminación final	02 de diciembre de 2025
Supervisor	Laura Viviana Ortiz Robayo

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

5 ASPECTOS JURÍDICOS

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra expedidas por Seguros del Estado, con sus respectivas actualizaciones, así mismo la relación del seguimiento jurídico y legal del contrato bajo las siguientes consideraciones:

5.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO

Tabla 2 Pólizas iniciales contrato de obra AASING S.A.S.

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
11-44-101251796	Cumplimiento	27/03/2025	27/11/2025	$ 43.679.457,94
11-44-101251796	Prestaciones	27/03/2025	27/07/2028	$ 21.839.728,97
11-44-101251796	Estabilidad	27/03/2025	27/07/2030	$ 87.356.915,88
11-40-101076180	RCE	27/03/2025	27/07/2025	$284.700.000.00

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 3 Pólizas acta de inicio contrato de obra AASING S.A.S

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
11-44-101251796	Cumplimiento	03/06/2025	03/02/2026	$ 43.679.457,94
11-44-101251796	Prestaciones	03/06/2025	03/10/2028	$ 21.839.728,97
11-44-101251796	Estabilidad	03/10/2025	03/10/2030	$ 87.356.915,88
11-40-101076180	RCE	03/06/2025	03/10/2025	$284.700.000.00

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 4 Pólizas actualizadas al modificatorio No. 1 contrato de obra AASING S.A.S

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
11-44-101251796	Cumplimiento	03/06/2025	03/02/2026	$ 65.459.293,74
11-44-101251796	Prestaciones	03/06/2025	03/10/2028	$ 32.729.646,87
11-44-101251796	Estabilidad	03/10/2025	03/10/2030	$ 87.358.915,88
11-40-101076180	RCE	03/06/2025	03/12/2025	$284.700.000.00

Fuente: AASING S.A.S

ANEXO 1 . Pólizas actualizadas a modificatorio No. 1 Cto obra-161

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

5.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de obra tales como actas de inicio:

Tabla 5 Documentos legales contrato de obra AASING S.A.S.

No.	Objeto	Fecha de Firma
1	Contrato	27/03/2025
2	Acta de inicio	03/06/2025
3	Modificatorio No. 1	16/08/2025

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

6 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

6.1 FORMA DE PAGO

Para el presente contrato de obra No.161 de 2025, se establecieron, los siguientes parámetros de forma de pago, con su respectiva documentación de formalización de pago:

Tabla 6 Forma de pago del contrato AASING S.A.S

No. Pago	Forma de pago	Documentación general para pagos
1	0-90%	El municipio cancelara al contratista actas parciales correspondientes al avance de obra hasta alcanzar el 90%
2	10%	Una vez se finalicen los trabajos y se reciban a satisfacción por parte de la administración Municipal a través de la supervisión y/o interventoría, previa presentación del informe de actividades al superviso y/o interventor del contrato, el cual expedirá un informe de recibo a satisfacción.

Fuente: AASING S.A.S.

6.2 CORTES DE OBRA

Los cortes de obra se realizarán de acuerdo con el avance de las actividades ejecutadas, actividades que deben corresponder con los diseños, ítems aprobados y especificaciones técnicas del proyecto, previo recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. A la fecha no se han presentado cortes de obra.

Tabla 7 Cortes de obra AASING S.A.S.

No.	Objeto	Valor
1	Contrato	$ 436.794.579,39
2	Modificatorio No. 1	$ 217.798.358,00
3	Acta parcial No. 1	$ 536.442.358,00
4	Saldo por cobrar	$ 118.150.579,39

Fuente: AASING S.A.S


7 ASPECTOS TÉCNICOS

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades contractuales en obra:

7.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO

Se evidencia el avance de ejecución de obra de las actividades realizadas hasta la fecha:

Ilustración 5. Programado Vs Ejecutado AASING S.A.S

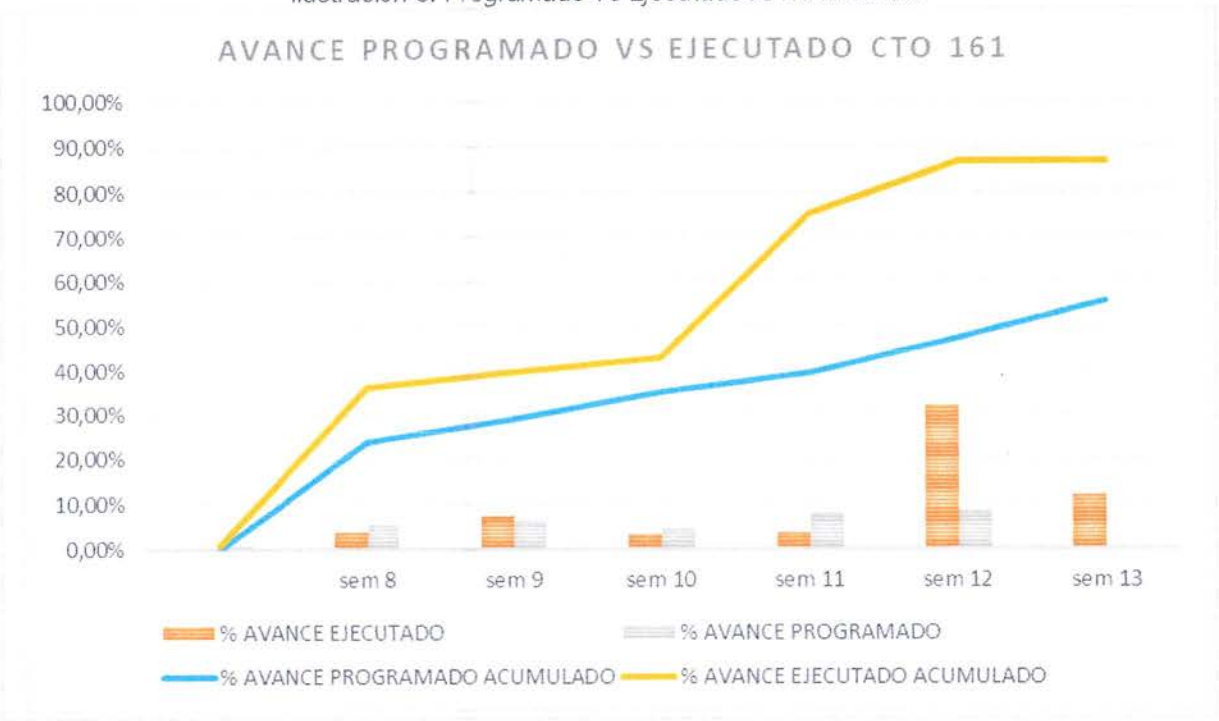

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 8 Programado VS Ejecutado AASING S.A.S

FECHA	PROGRAMADO	EJECUTADO
03 de agosto de 2025 al 02 de septiembre de 2025	55.56%	86.72%

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A la fecha del presente informe se han desarrollado las actividades constructivas en los frentes de trabajo en ejecución los cuales se detallan a continuación.

7.2.1 Vía que comunica la vereda Nagui con la vereda Hoya Grande sector la Ye el Descanso – Convenio ICCU 707 - 2024

Para el periodo en mención, en el frente de trabajo ya se han finalizado las actividades constructivas el día 27 de agosto de 2025 de acuerdo a las actividades y recursos aprobados mediante el modificatorio No.1

7.2.2 Vía que comunica la vereda Centro con la vereda la Alianza Sector el Rosario – Convenio ICCU 738-2024

Durante el periodo, se iniciaron las actividades en este frente de trabajo, conforme a la programación de obra establecida. Para ello, se dispuso en el sitio el material necesario para la ejecución incluyendo el acero de refuerzo, cemento y demás insumos requeridos. Con la disponibilidad total de los recursos, se procedió con el inicio de las obras, las cuales fueron desarrolladas de acuerdo con lo previsto en la planeación. Estas actividades se ejecutaron de manera continua. El avance físico y administrativo se encuentra alineado al cronograma, y se mantiene la coordinación para asegurar la continuidad eficiente de las labores constructivas.

Tabla 9 Actividades Vía vereda La Alianza Sector El Rosario

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	
CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

Tabla 10 Actividades Vía vereda Naguy Alto sector Monte Oscuro

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	
CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	

Fuente: AASING S.A.S

7.2.5 Vía que comunica la Vereda Guarumal Sector el Moro

Durante el periodo, como contratistas de obra y en cumplimiento a las obligaciones contractuales, se llevaron a cabo actividades de suministro, armado y figurado de acero de refuerzo de 60.000 PSI previo al inicio de actividades constructivas en obra.

Tabla 11 Actividades Vía vereda Guarumal Sector el Moro

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	
SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	

Fuente: AASING S.A.S

7.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el detalle fotográfico las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo, con el fin de dar constancia del desarrollo de las actividades descritas en el capítulo 7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ANEXO 2 . Registro fotográfico Convenio ICCU 738-2024
ANEXO 3 . Registro fotográfico Adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
ANEXO 4 . Registro fotográfico Adición vereda Guarumal Sector el Moro

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

7.4 BITÁCORA DE OBRA


Durante el periodo de ejecución del proyecto, se ha adelantado el registro de los trabajos y actividades diarias desarrolladas en el periodo descrito.

ANEXO 5 . Bitácora Convenio ICCU 738-2024

7.5 ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo de ejecución del proyecto, el tiempo fue favorable parta la ejecución de las actividades constructivas

Tabla 12.Control del clima periodo actual

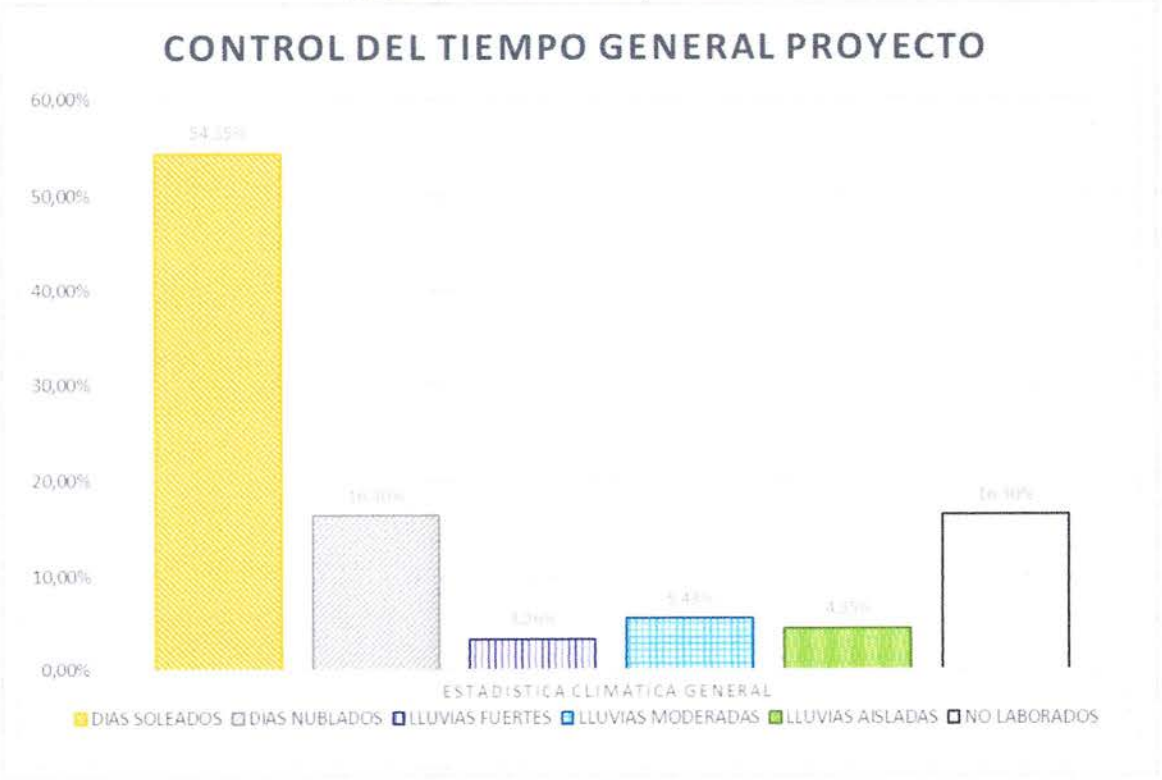

Fuente: AASING S.A.S

ANEXO 6. Control estado del tiempo Cto 161-2025

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

8 ASPECTOS SOCIALES

8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Con el objetivo de brindar atención y participación a la comunidad en el proyecto que se está ejecutando, se encuentra disponibilidad en la obra para recibir cualquier petición, queja y/o reclamos (PQR'S) con relación a la obra en ejecución. Este programa se implementa dado que, para **AASING S.A.S.**, es muy importante la participación de la comunidad para la cual se está ejecutando el proyecto, durante el periodo no se presentó ninguna PQRS.

Dentro de la gestión social realizada por el contratista de obra se resalta la vinculación laboral de personas habitantes del municipio de la Vega.

Previo al inicio de las actividades constructivas, se llevó a cabo la socialización del proyecto con la comunidad, la cual manifestó una recepción favorable ante las obras a ejecutar.

8.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS

En el periodo correspondiente a este informe se realiza apoyo a actividades técnicas de obra.

Tabla 13.Plan de acompañamiento a actividades técnicas

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	OBSERVACIONES
Realizar acompañamiento en temas de conflictos con propietarios. Brindar apoyo en el momento de que se generen imprevistos en obra por parte de la comunidad. Dar información al residente de obra con respecto a propietarios directamente implicados con el proyecto. Ser partícipe y dar apoyo de las capacitaciones que se brinden al personal de obra en los diferentes temas. Apoyo en la socialización y recepción de firmas de actas de aprovechamiento forestal.	Realizar acompañamiento social en obra en las actividades técnicas, para que así se genere de la mejor manera y sin afectar a la comunidad ni al contratista	Se realiza acompañamiento al residente de obra al momento de resolver dudas e inquietudes con los propietarios. Se apoya en las capacitaciones de obra en temas referentes a SG-SST Se realiza acompañamiento a viviendas que sufrieron afectaciones debido a la ejecución de la obra.

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phtavega25@gmail.com

9 ASPECTOS SG SST

Aspectos de sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro del proyecto:

9.1 PERSONAL DE OBRA

Para el inicio de las obras, se realizó la presentación de las hojas de vida del personal profesional de obra, conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato. Dicho personal ha hecho presencia en el sitio de la obra y se relaciona a continuación.

Tabla 14. Relación de personal de obra

PROFESIONAL
Director de obra
Residente de Obra
Ingeniero en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: AASING S.A.S

9.2 SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo del presente informe el contratista entrego a la interventoría los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social y ARL, es de aclarar que no se permitió el ingreso a la obra de ninguna persona sin la documentación antes mencionada.

9.3 DOTACIONES Y (EPP)

Al inicio de la obra el contratista entrega dotación y elementos de protección personal (EPP) a todo el personal que ingresó a trabajar en la obra; de igual manera a medida que nuevo personal ingresa a trabajar, se hará entrega de todos sus elementos de protección. En momento, los trabajadores cuentas con los siguientes elementos de protección personal: Casco amarillo, Botas de seguridad, gafas de seguridad, tapa oídos de inserción, tapabocas, guantes de carnaza.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

8.1	20-08-2025	Entrega cronograma de obra actualizado al modificatorio No. 1	Interventoría
9	27-08-2025	Entrega acta parcial No. 1 de obra solicitud de pago	Interventoría

Fuente: AASING S.A.S

ANEXO 7.. Correspondencia original enviada

Tabla 16 Relación - Correspondencia recibida

INFORME No. 1			
No.	Fecha	Asunto	Remitente
1	06-06-2025	Solicitud de información inicial para el desarrollo del contrato de obra no. 161-2025 (placa huella vereda Naguy Alto y vereda La Alianza)	Interventoría
2	18-06-2025	Val y entrega de hojas de vida, programación de obra, análisis de precios unitarios y PMT contrato de obra c-obra-154-2025	Interventoría
3	12-06-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 01 de fecha 11 de junio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 02 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
4	18-06-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 02 de fecha 18 de junio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 03 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
5	24-06-2025	Respuesta al oficio CTO 161-2025-004 del 24 de junio de 2025 solicitud de aclaración de IVA en el valor del contrato de obra no. C-obra-161-2025	Interventoría
6	25-06-2025	Aval y entrega de plan SG SST para el contrato de obra c-obra-161-2025	Interventoría
INFORME No. 2			
No.	Fecha	Asunto	Remitente
7	14-07-2025	Previstos y adición en valor y tiempo No.1 contrato de obra No. 161-2025	Interventoría
8	18-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 04 de fecha 09 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 05 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
9	18-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 05 de fecha 16 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 06 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
10	24-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 06 de fecha 23 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 07 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
11	24-07-2025	Aval y entrega informe mensual de avance No.1 c-obra-161-2025	Interventoría
12	02-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 07 de fecha 30 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 08 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
INFORME No. 3			
13	06-08-2025	Aval comunicado cto 161-2025-007 – "NO APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD"	Interventoría

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

14	08-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 08 de fecha 06 de agosto de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 09 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
15	13-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 09 de fecha 13 de agosto de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 10 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
15.1	15-08-2025	Aval y entrega informe mensual de avance no.2 c-obra-161-2025	Interventoría
15.2	25-08-2025	Aval y entrega cronograma de obra actualizado a modificatorio no.1 del contrato de obra c-obra-161-2025	Interventoría
16	27-08-2025	Aval y entrega acta parcial no. 1 c-obra-161-2025	Interventoría
17	01-09-2025	Entrega de acta comité de obra no. 10 de fecha de 20 de agosto de 2025, entrega acta comité de obra no. 11 y compromisos de fecha 27 de agosto de 2025, y citación al próximo comité de obra no. 11 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría

Fuente: AASING S.A.S

ANEXO 8.. Correspondencia original recibida

10.1.2 Control comités

Durante el periodo se llevaron a cabo los siguientes comités de obra.

Tabla 17 Relación – comité de obra

INFORME No 1		
No.	Fecha	Asunto
01	11/06/2025	Comité de seguimiento de las actividades
02	18/06/2025	Comité de seguimiento de las actividades
03	25/06/2025	Comité de seguimiento de las actividades
INFORME No 2		
No.	Fecha	Asunto
04	09/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
05	16/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
06	23/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
07	30/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
INFORME No 3		
08	06/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
09	13/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
10	20/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
11	27/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

11 CONCLUSIONES

11.1 ASPECTOS TÉCNICOS

- A la fecha el avance general de obra es de un 86.72% ejecutado frente al 55.56% programado representado en la ejecución de actividades contractuales.

- Para cada uno de los sectores de intervención se cuenta con el siguiente avance de obra:

Tabla 18 Avance de obra en sitios de intervención

SITIO DE INTERVENCIÓN	AVANCE DE OBRA
Vereda Hoya grande Sector la Ye el Descanso Convenio 707	100,00%
Vereda La Alianza Sector el Rosario Convenio738	65.81%
Vereda Hoya Grande sector Cuatro Esquinas Convenio 716	100.00%
Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro	100.00%
Vereda Guarumal Sector el Moro	26.96%

Fuente: AASING S.A.S

- A la fecha se han adelantado y finalizado los procesos constructivos en el convenio ICCU 707 -2024 y convenio ICCU 716-2024 y en la adición en la vereda Naguy alto Sector Monte Oscuro, correspondientes a el suministro, figurado y armado de acero de refuerzo, la fundida de concretos clase D, concreto ciclópeos en 2500 psi, excavaciones manuales y concretos de cunetas

- El clima presentado en el transcurso del proyecto ha sido favorable para la ejecución de las actividades.

- Durante el periodo del presente informe mensual, se suscribió la modificación, prórroga y adición No. 1 al contrato de obra No. 161 de 2025 el cual se detalla en el anexo jurídico del presente informe.

11.2 ASPECTOS SG-SST

- Durante este periodo de ejecución de actividades se mantuvo el personal afiliado al sistema de seguridad (ARL, EPS y pensión), de igual modo el personal contó con su respectiva dotación de elementos de protección personal.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

11.3 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se supervisaron las actividades diarias, con el fin de generar el menor impacto de contaminación posible, control de desechos orgánicos e inorgánicos y contaminación visual, además de mitigar del impacto frente a los vecinos colindantes a cada uno de los proyectos.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

ANEXO 1 . POLIZAS ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No. 1 Cto OBRA 161

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101251796	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2025	03	06	2025	00:00	03	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS	NIT: 900.976.357-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
vda chuntame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CAJICA, CUNDINAMARCA	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1	NIT: 800.073.475-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 NRO. 19 - 71	LA VEGA, CUNDINAMARCA	8458765

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. C-OBRA-No. 161-2025 REFERENTE A: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGUN CONVENIO ICCU 707 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGUN CONVENIO ICCU 738 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGUN CONVENIO ICCU 716 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2025	03/02/2026	$65,459,293.74	$43,679,457.94
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/06/2025	03/10/2028	$32,729,646.87	$21,839,728.97
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03/10/2025	03/10/2030	$87,358,915.80	$87,358,915.80

ACLARACIONES

SEGUNACLARACION, MODIFICACION, PRORROGA Y ADICION N. 01, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******86,670.00	$ *******8,000.00	$ ******18,367.00	$ **********115,038.00	$ ******185,547,856.49	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA	143373	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

Carlos Andrés Pinzón López

FIRMA TOMADOR

28

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101251796	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2025	03	06	2025	00:00	03	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS		NIT: 900.976.357-7
DIRECCIÓN: vda chuntame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CIUDAD: CAJICA, CUNDINAMARCA		TELEFONO: 3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1		NIT: 800.073.475-1
DIRECCIÓN: CR 3 NRO. 19 - 71	CIUDAD: LA VEGA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO: 8458765

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jorge Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

Carlos Andres Pinzon Lopez

FIRMA TOMADOR

CC

DLF1433/3A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101251796, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de AGOSTO de 2025

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101251796	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2025	03	06	2025	00:00	03	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS	NIT: 900.976.357-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
vda chuntame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CAJICA, CUNDINAMARCA	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1	NIT: 800.073.475-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 3 NRO. 19 - 71	LA VEGA, CUNDINAMARCA	8458765

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. C-OBRA-No. 161-2025 REFERENTE A: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGUN CONVENIO ICCU 707 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGUN CONVENIO ICCU 738 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGUN CONVENIO ICCU 716 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINANARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2025	03/04/2026	$65,459,293.74	$65,459,293.74
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/06/2025	03/12/2026	$32,729,646.87	$32,729,646.87
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03/10/2025	03/10/2030	$97,358,915.00	$97,358,915.00

ACLARACIONES

SEGUNACLARACION, MODIFICACION, PRORROGA Y ADICION N. 01, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******32,101.00	$ *******8,000.00	$ *******7,619.00	$ **********47,721.00	$ ******185,547,856.49	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA	143373	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Carlos Andrés Pinzón López

FIRMA TOMADOR

31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101251796	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2025	03	06	2025	00:00	03	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS		NIT: 900.976.357-7
DIRECCIÓN: vda chuntame QUINTAS DE MOLINO CA 56	**CIUDAD:** CAJICA, CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1		NIT: 800.073.475-1
DIRECCIÓN: CR 3 NRO. 19 - 71	**CIUDAD:** LA VEGA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8453765

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

Carlos Andrés Pinzón López

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101251796, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de AGOSTO de 2025

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101251796	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2025	03	06	2025	00:00	03	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS	NIT: 900.976.357-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
vda chuntame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CAJICA, CUNDINAMARCA	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1	NIT: 800.073.475-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 NRO. 19 - 71	LA VEGA, CUNDINAMARCA	8458765

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. C-OBRA-No. 161-2025 REFERENTE A: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA NOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGUN CONVENIO ICCU 707 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGUN CONVENIO ICCU 738 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA NOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGUN CONVENIO ICCU 716 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2025	03/04/2026	$65,459,293.74	$65,459,293.74
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/06/2025	03/12/2028	$32,729,646.87	$32,729,646.87
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03/10/2025	03/10/2030	$130,918,587.48	$87,358,915.00

ACLARACIONES

SEGUN ACLARACION, MODIFICACION, PRORROGA Y ADICION N. 01, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EN LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****435,835.00	$ *******8,000.00	$ ******84,328.00	$ **********528,164.00	$ ******229,107,528.09	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA	143373	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Carlos Andrés Pinzón López

FIRMA TOMADOR

34

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1249

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101251796	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2025	03	06	2025	00:00	03	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS		NIT: 900.976.357-7
DIRECCIÓN: vda chunlame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CIUDAD: CAJICA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1		NIT: 800.073.475-1
DIRECCIÓN: CR 3 NRO. 19 - 71	CIUDAD: LA VEGA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	8458765

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

Carlos Andres Pinzon Lopez

FIRMA TOMADOR

35

DLF143373A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1300

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101251796, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de AGOSTO de 2025

11-44-101251796

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

36

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101076180	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2025	03	06	2025	00:00	03	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS	NIT: 900.976.357-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
vda chunlame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CAJICA, CUNDINAMARCA	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1	NIT: 800.073.475-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 NRO. 19 - 71	LA VEGA, CUNDINAMARCA	8458765

BENEFICIARIO: 800073475 MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. C-OBRA-No. 161-2025 REFERENTE A: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGUN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGUN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGUN CONVENIO ICCU 716 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/06/2025	03/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/06/2025	03/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/06/2025	03/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

SEGUN ACLARACION, MODIFICACION, PRORROGA Y ADICION N. 01, SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****116,950.00	$ *******3,000.00	$ ******23,170.00	$ **********145,120.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA	143373	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101076180

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olaya - Vicepresidencia de Fianzas

Carlos Andrés Pinzón Lopez

FIRMA TOMADOR

37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101076180	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2025	03	06	2025	00:00	03	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS		NIT: 900.976.357-7
DIRECCION: vda chuntame QUINTAS DE MOLINO CA 56	**CIUDAD:** CAJICA, CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1		NIT: 800.073.475-1
DIRECCIÓN: CR 3 NRO. 19 - 71	CIUDAD: LA VEGA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	8458765

BENEFICIARIO: 800073475 - MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARC

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/06/2025	03/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/06/2025	03/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/06/2025	03/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 98-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101076180

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

Carlos Andrés Pinzón Lopez

FIRMA TOMADOR

38

DLF143973A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101076180	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2025	03	06	2025	00:00	03	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING SAS		NIT: 900.976.357-7
DIRECCIÓN: vda chuniame QUINTAS DE MOLINO CA 56	CIUDAD: CAJICA, CUNDINAMARCA	TELEFONO:	3107823762

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU NIT 900258711-1		NIT: 800.073.475-1
DIRECCIÓN: CR 3 NRO. 19 - 71	CIUDAD: LA VEGA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	8458765

BENEFICIARIO: 800073475 - MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARC

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-80/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101076180

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

Carlos Andres Pinzon Lopez

FIRMA TOMADOR

39

DLP1433734

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2 . REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVENIO ICCU 738-2024

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	-	**ITEM**	CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza conformación de la calzada existente previo al inicio de las actividades

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	-	**ITEM**	CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza la conformación de la calzada previo al inicio de las actividades

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	-	**ITEM**	CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza la conformación de la calzada previo al inicio de las actividades

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se Inicia el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

1309

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO			MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA			PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025
						CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

45

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	-	**ITEM**	SUMINISTRO DE MATERIAL	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registra suministro de material en campo para inicio de labores constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	1	**ITEM**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realizan excavaciones menores a mano

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	3	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

ANEXO 2 . REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVENIO ICCU 716-2024

305 3678028

aasing phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 716 - 2024		
CAP	-	**ITEM**	INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA	**LUGAR**	VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se cumple con la instalación de la valla informativa correspondiente al proyecto

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA HOYA GRANDE - SECTOR CUATRO ESQUINAS

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

ANEXO 3 . REGISTRO FOTOGRÁFICO ADICIÓN VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO			MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 YMEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DELMUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
CONTRATISTA			PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025
						CONVENIO	Adición Vereda Naguy alto sector Monteoscuro
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.
ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO			MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 YMEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DELMUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
CONTRATISTA			PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025
						CONVENIO	Adición Vereda Naguy alto sector Monteoscuro
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 YMEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DELMUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	Adición Vereda Naguy alto sector Monteoscuro		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	se continúa la instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 YMEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DELMUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	Adición Vereda Naguy alto sector Monteoscuro	
CAP	6	**ITEM**	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	**LUGAR**	VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	Se realiza la conformación de la calzada existente previa al inicio de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO			MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 YMEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DELMUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
CONTRATISTA			PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025
						CONVENIO	Adición Vereda Naguy alto sector Monteoscuro
CAP	10	**ITEM**	SUBBASE GRANULAR	**LUGAR**	VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA	Se realiza estabilización de subbase previo al inicio de actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

ANEXO 4 . REGISTRO FOTOGRÁFICO ADICIÓN VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	7	**ITEM**	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza localización y replanteo con elementos de precisión

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S			**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025
						CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO
CAP	7	**ITEM**	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza localización y replanteo con elementos de precisión

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

ANEXO 5 . BITÁCORA CONVENIO ICCU 738-2024

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

01/08/25	C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia Soleado sin lluvias Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades: • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Se comienzan las actividades de suministro de materiales. Laura Galindo Zerdt Anggie S William O.T Aux. Residente Obra
02/08/25	C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am: Clima: Dia soleado con lluvias suaves Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades: • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Continuan las actividades de suministro de materiales al sitio de obra. William O.T Laura Galindo Zerdt Anggie S Aux. Residente Obra

1335

04/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia soleado, con lluvias suaves Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro para carriles. Laura Galindo Anggie S William O.T Aux. Residente Obra SolianaD
05/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia soleado con lluvias Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro. Laura Galindo Anggie S William O.T Aux. Residente Obra

1336

06/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado con lluvia en la tarde
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte y figurado para cunetas, carriles y vigas.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Suliana D

08/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado con lluvias suaves
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de amarre de parrillas para carriles.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Suliana D

09/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro para parrillas de cunetas, cunetas y vigas. Laura Galindo Zeyd Anggie S William O.T Aux. Residente Obra
11/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am Clima: Dia soleado con lluvia Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro. Laura Galindo William O.T Aux. Residente Obra Zeyd Anggie S Supervisor

1338

12/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente. Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte figurado y amarre de hierro. William O.T Laura Galindo Aux. Residente Obra Anggie S Suliana D
13/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia seco, soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte figurado y amarre de hierro para parrillas camiles. William O.T Laura Galindo Anggie S Aux. Residente Obra Suliana D

1339

14/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de conformacion y replanteo de la via existente.

Laura Golindo Anggie S William O. T
Aux. Residente Obra
Suliana D

15/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia nublado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de demolicion de anfas en concreto existentes y conformacion de la via.

Laura Golindo Anggie S William O. T
Aux. Residente Obra
Suliana D

16/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte figurado y amarre de hierro.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Suliana D

19/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte figurado y amarre de hierro.

William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo

Anggie S

Suliana D

1341

20/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 residente, 1 oficial, 2 ayudantes
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Trama 1: Actividades de corte figurado y amarre de hierro.

Laura Galindo Zeyda Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Sulana D

21/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Trama 1: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro para parrillas de carriles, cunetas y vigas, partida de piedra.

William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo Zeyda

Anggie S

Sulana D

1342

22/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades. • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de partida de piedra rajon, suministro de materiales agregados. Laura Galindo Anggie S William O.T Aux. Residente Obra Suliana D
23/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia soleado sin lluvias Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de partida de piedra, corte, figurado y amarre de hierro. Laura Galindo Anggie S William O.T Aux. Residente Obra Suliana D

1343

25/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro, partida de piedra.

Laura Galindo William O.T
Aux. Residente Obra.
Anggie S
Suliana D

26/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia sin lluvias, sol todo el dia
CPersonal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de replanteo y nivelacion manual, armado de cajones para encofrado.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra
Suliana D

1344

27/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de encofrado y fundida de centros, sobre anchos y carriles.

Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo Suliana D

28/08/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente.
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de acomodado de piedra, encofrado y fundida de centros y sobre anchos en concreto ciclopeo.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Aux. Residente Obra

Suliana D

1345

29/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades: • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de encofrado, acomodado de hierro y fundida de cunetas y vigas, encofrado y fundida de centros y sobre anchos en ciclopeo. Laura Galindo Anggie S William O.T Aux. Residente Obra SulianaD
30/08/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am Clima: Dia seco, sin lluvias Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Actividades de partida de piedra, encofrado y acomodacion de hierro para cunetas. Laura Galindo William O.T Aux. Residente Obra Anggie S SulianaD

ANEXO 6 . CONTROL ESTADO DEL TIEMPO
CONTRATO Cto. 161-2025

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

1347

AASING S.A.S.	CONTROL ESTADO DEL TIEMPO	VERSIÓN 01
		Página 1 de 1
		Elaboró: Residente de obra

CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA - DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S)
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

MES / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JUNIO			DN	DN	LLF	DS	DN	NL	LLM	LLM	LLA	LLF	DN	DN	NL	DS	LLM	DS	DS	DS	DS	DN	NL	LLA	DS	DN	DS	DN	NL	NL	
JULIO	DS	DN	DS	DS	DN	NL	DS	LLM	DN	LLM	LLF	DS	NL	LLM	DN	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DN	LLA	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS
AGOSTO	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DN	DS	NL	DS	DS	DN	DS	DS	DS	NL	NL	DS	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DS	DS	NL
SEPTIEMBRE	DS	DS																													
OCTUBRE																															
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															
E																															
SEPTIEMBRE																															
OCTUBRE																															
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															

CONTROL DEL TIEMPO	DESDE :	3 JUN 25	HASTA	2 SEP 25

CONCEPTO	TOTALES		CONVENCIONES	CV	COLOR
TOTAL DE DÍAS SOLEADOS	50	54,35%	DIAS SOLEADOS	DS	
TOTAL DÍAS NUBLADOS	15	16,30%	DIAS NUBLADOS	DN	
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	3	3,26%	LLUVIAS FUERTES	LLF	
	5	5,43%	LLUVIAS MODERADAS	LLM	
	4	4,35%	LLUVIAS AISLADAS	LLA	
DÍAS NO LABORADOS	15	16,30%	NO LABORADOS	NL	
TOTAL	**92**	**100,00%**			

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA OBRA		
FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL	
3 JUN 2025	2 SEP 25	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
DÍAS SECOS	65	70,65%
DÍAS LLUVIOSOS	12	13,04%
NO LABORADOS (DOMINGOS Y FESTIVOS)	15	16,30%
TOTAL	**92**	**100,00%**

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL ULTIMO PERIODO		
DESDE	HASTA	
3 AGO 25	2 SEP 25	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
TOTAL DÍAS SECOS	25	80,65%
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	0	0,00%
TOTAL DÍAS NO LABORADOS (DOMINGOS Y FESTIVOS)	6	19,35%
TOTAL	**31**	100,00%

OBSERVACIONES :

-
-
-
-
-
-
-

RESPONSABLE		FECHA:
NOMBRE:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ	02/09/25
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA:	Carlos Andres Pinzón	


ELABORO: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S)

1348


AASING S.A.S.	CONTROL DEL TIEMPO	VERSIÓN 01
		Página 1 de 1
		Elaboró: Residente de obra

OBJETO CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S)
SUPERVISOR	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA, CUNDINAMARCA

CONTROL DEL TIEMPO GENERAL PROYECTO

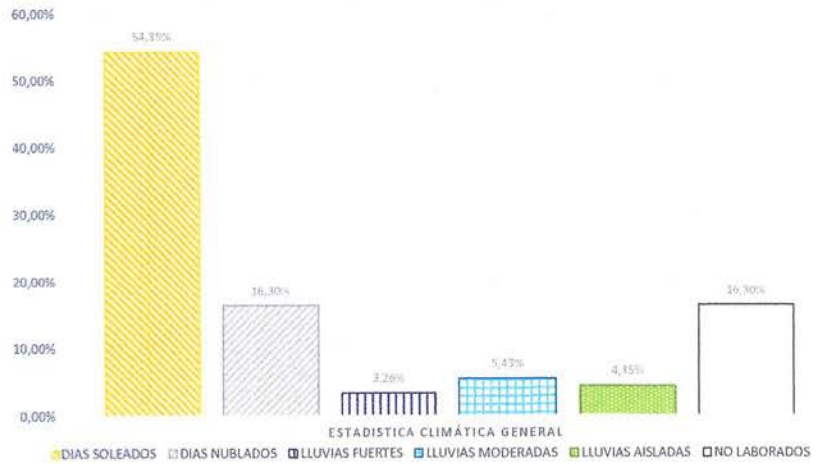

CONTROL DEL TIEMPO PERIODO ACTUAL

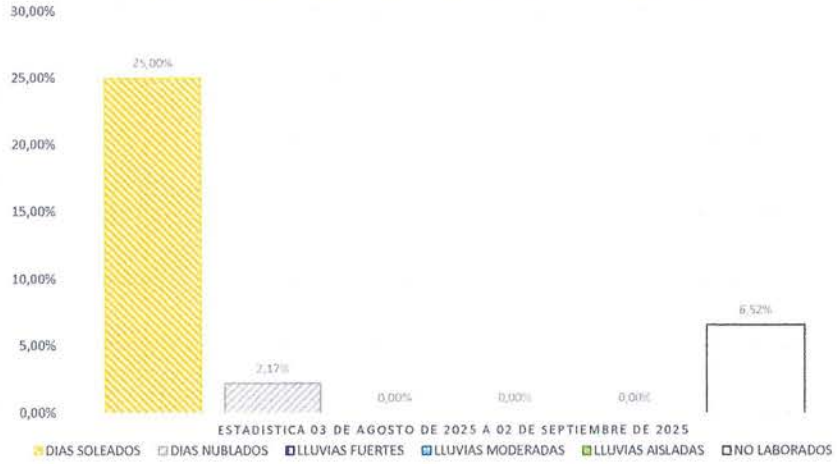

RESPONSABLE		FECHA:
NOMBRE:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ	
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	2/09/2025
FIRMA:	Carlos Andres Pinzon Lopez	

ELABORO: AASING S.A.S

08

ANEXO 7. CORRESPONDENCIA ORIGINAL ENVIADA

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1350

La Vega, 19 de agosto de 2025

CTO 161-2025-008

LA VEGA 22/08/2025 09:37
Al Contestar cite este No.: 20251104778
Origen:AASING S.A.S.
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:12 FOLIOS Fol:1

Señores
Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Carrera 3 No 19-71
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor de apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
La Vega- Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.161-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ASUNTO: **ENTREGA POLIZAS ACTUALIZADAS A MODIFICATORIO No.1 CONTRATO C-OBRA-161-2025**

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de Obra No. 161 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen, como contratista de obra hacemos entrega de las pólizas actualizadas al modificatorio No.1 para su respectiva verificación, aprobación y trámite correspondiente:

SEGUROS DEL ESTADO S. A		
Cumplimiento	11-44-101251796	Anexo 3, 4 y 5
RCE	11-40-101076180	Anexo 1 y 2

Lo anterior mencionado en doce (12) folios.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andrés Pinzon López
CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

86

La Vega, 27 de agosto de 2025

CTO 161-2025-009

Señores
Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.161-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ASUNTO: **ENTREGA ACTA PARCIAL No. 01 DE OBRA SOLICITUD DE PAGO**

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de obra No. 161 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen, como contratista de obra hacemos entrega del acta parcial No. 01 del contrato de obra.

En el acta parcial No. 01 en mención se adjunta toda la documentación en la cual se detalla el avance de las actividades de obra realizadas, todo lo anterior conforme a los términos contractuales establecidos.

A continuación, se detallan los documentos anexos:

RECIBIDO
INTERVENTORIA
DEL PROYECTO
Lorena Gómez
27-AGOSTO 2025

- Factura
- RUT
- Certificación bancaria
- Resolución de facturación
- Cédula representante legal
- Documentos contador
- Certificación pago de parafiscales
- Planillas de seguridad social
- Acta parcial No.01
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-707
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-738
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-716
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 adición vereda Guarumal Bajo sector El Moro
- Registro fotográfico convenio ICCU-707
- Registro fotográfico convenio ICCU-738

88

- Registro fotográfico convenio ICCU-716
- Registro fotográfico adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
- Registro fotográfico adición vereda Guarumal Bajo sector El Moro
- Radicados informes mensuales

Se anexan (103) folios

Lo anterior, se entrega para revisión, aprobación y trámite correspondiente a la interventoría, con el fin de que se otorgue el pago correspondiente.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ORIGINAL RECIBIDA

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1355

La Vega – 06 de agosto de 2025

CTO.179-2025-161-013

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vias e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL COMUNICADO CTO 161-2025-007 - "NO APLICACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD"

Cordial saludo

En calidad de interventoría del contrato en referencia, nos permitimos remitir el comunicado presentado por el contratista PROYECTOS DE INGENIERÍA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS, radicado con el número CTO 161-2025-007 con fecha 23 de julio de 2025, en el cual se informa que, conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y la Ley 2201 de 2022, ya no es obligatorio aplicar protocolos de bioseguridad en el desarrollo de las actividades del contrato, dado que la emergencia sanitaria fue oficialmente levantada.

Luego de la revisión correspondiente, esta interventoría da aval al contenido del comunicado, toda vez que la normativa vigente exime de dicha obligatoriedad al contratista, y no se identifican condiciones particulares del contrato que exijan su implementación.

Lo anterior se remite para los fines pertinentes dentro del seguimiento y control del contrato.

Se anexa: Comunicado CTO 161-2025-007 de fecha 23 de julio de 2025 remitido por Aasing SAS en dos (02) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Recibí
Carlos Andres Pinzón
06 · Ago · 2025

Lorena Gómez
INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1356

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901116619-9

La Vega – 08 de agosto de 2025

CTO.179-2025-161-014

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibi
Carlos Andres Pinzon Correo
08-Agos

Señores
Proyectos de Ingenieria – Diseños, Construcciones y Consultorias (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: ENTREGA DE ACTA Y COMPROMISOS DE COMITÉ DE OBRA No. 08 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025 Y CITACIÓN AL PROXIMO COMITÉ DE OBRA No. 09 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 161-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 08 para el contrato de obra No. 161-2025 con fecha del día el 06 de agosto de 2025.

ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 08:
En el comité técnico celebrado el día 06 de agosto de 2025, Se presento un informe sobre las actividades realizadas durante la semana:

Como resultado del presente comité se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900116619-9

Imagen 1. Compromisos Acta de Comité de fecha 06 de agosto de 2025

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Recibo Actividades Obra convenio /16	08/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
2	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad en físico avalado por interventoría	06/08/2025	Contratista Obra
3	Entrega Registro Fotográfico y Solicitud Valla	13/08/2025	Contratista Obra Supervisión
4	Subir Documentos Actas Comité Drive	08/08/2025	Interventoria
5	Comité Obra 13 de agosto de 2025	13/08/2025	Contratista Obra Supervisión

Fuente: Acta de comité de obra No. 08 del 06 de agosto de 2025

CITACIÓN A PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA:

Así mismo, se procede a realizar la citación al próximo comité de obra No. 09, para mantener un control en los avances y que los compromisos pactados se cumplan en las fechas establecidas, quedando de la siguiente manera:

Tabla No. 01. Detalle de citación a comité de Obra No. 09

Dia	Miércoles, 13 de agosto de 2025
Lugar:	Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de La Vega, Cundinamarca
Hora:	09:00 am

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 08 de fecha 06 de agosto de 2025

Total, de folios (4)

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1358

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900[illegible]9

La Vega – 13 de agosto de 2025

CTO.179-2025-161-015

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorias (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vias e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: ENTREGA DE ACTA Y COMPROMISOS DE COMITÉ DE OBRA No. 09 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2025 Y CITACIÓN AL PROXIMO COMITÉ DE OBRA No. 10 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 161-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoria, se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 10 para el contrato de obra No. 161-2025 con fecha del día el 13 de agosto de 2025.

ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 09:

En el comité técnico celebrado el día 13 de agosto de 2025, Se presento un informe sobre las actividades realizadas durante la semana:

Como resultado del presente comité se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

Recibi
Carlos Andres Pinzon
Correo
10:51 am
13 Agosto 2025

Imagen 1. Compromisos Acta de Comité de fecha 13 de agosto de 2025

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Recibo Actividades Obra convenio 716	15/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoria
2	Subir Documento Actas Comité Drive	13/08/2025	Interventoria
3	Comité Obra 20 de agosto de 2025	13/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoria

Fuente: Acta de comité de obra No. 09 del 13 de agosto de 2025

CITACIÓN A PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA:

Así mismo, se procede a realizar la citación al próximo comité de obra No. 10, para mantener un control en los avances y que los compromisos pactados se cumplan en las fechas establecidas, quedando de la siguiente manera:

Tabla No. 01. Detalle de citación a comité de Obra No. 10

Dia	Miércoles, 20 de agosto de 2025
Lugar:	Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de La Vega, Cundinamarca
Hora:	09:00 am

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 09 de fecha 13 de agosto de 2025

Total, de folios (4)

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1360

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901174661-9

La Vega – 15 de agosto de 2025

CTO.179-2025-161-015.1

Recibi
Carlos Andres Pinzon
15-Ago-2025

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No.2 C-OBRA-161-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.2 para el contrato de obra C-OBRA-161-2025 mediante el comunicado OFI 161-2025-007.1 de fecha 08 de agosto de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

Anexo 1 . Registro fotográfico convenio ICCU 707-2024
Anexo 2 . Registro fotográfico convenio ICCU 738-2024
Anexo 3 . Registro fotográfico convenio ICCU 716-2024
Anexo 4 . Bitácora convenio ICCU 707-2024
Anexo 5 . Bitácora convenio ICCU 738-2024
Anexo 6 . Bitácora convenio ICCU 716-2024
Anexo 7. Control estado del tiempo Cto 161-2025
Anexo 8.. Correspondencia original enviada
Anexo 9.. Correspondencia original recibida

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 900146019-9

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta

- Informe mensual de avance No.1 en ciento treinta y siete (137) Folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente, p

Lorena Gómez.

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1362

La Vega – 25 de agosto de 2025

CTO.179-2025-161-015.2

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibí
Carlos Andres Pinzón
25-Ago-2025

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL Y ENTREGA CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO A MODIFICATORIO No.1 DEL CONTRATO DE OBRA C-OBRA-161-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra mediante el comunicado CTO 161-2025-008.1 de fecha 20 de agosto de 2025 referente al cronograma de obra actualizado al modificatorio No.1, esta interventoría informa:

- Una vez revisada la información entregada por el contratista de obra en referencia al cronograma de obra actualizado al modificatorio No.1 este se avala.

Por lo anterior, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación, aprobación y trámite correspondiente. Se adjunta:

- Cronograma de obra actualizado en dos (02) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez
INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900166619-9

La Vega Cundinamarca 27 de agosto de 2025

CTO.179-2025-161-016

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Recibí
Carlos Andres Pinzón
27-Agosto 2025

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: **AVAL Y ENTREGA ACTA PARCIAL No. 1 C-OBRA-161-2025**

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del acta parcial No,1 para el contrato de obra C-OBRA-161-2025 mediante el comunicado CTO 161-2025-09 de fecha de 27 de agosto de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

anexo 1 · Factura
anexo 2 · RUT
anexo 3 · Certificación bancaria
anexo 4 · Resolución de facturación
anexo 5 · Cédula representante legal
anexo 6 · Documentos contador
anexo 7 · Certificación pago de parafiscales
anexo 8 · Planillas de seguridad social
anexo 9 · Acta parcial No.01

1364

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:9004466449-9

anexo 10	·	Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-707
anexo 11	·	Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-738
anexo 12	·	Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-716
anexo 13	·	Memorias de cantidades acta parcial No. 01 adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
anexo 14	·	Memorias de cantidades acta parcial No. 01 adición vereda Guarumal Bajo sector El Moro
anexo 15	·	Registro fotográfico convenio ICCU-707
anexo 16	·	Registro fotográfico convenio ICCU-738
anexo 17	·	Registro fotográfico convenio ICCU-716
anexo 18	·	Registro fotográfico adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
anexo 19	·	Registro fotográfico adición vereda Guarumal Bajo sector El Moro
anexo 20	·	Radicados informes mensuales

Total, folios: 105 folios.

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1365

La Vega Cundinamarca 01 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-161-017

Alcaldia Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibi
Carlos Andres Anton
01-sep-2025

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoria No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: ENTREGA DE ACTA COMITÉ DE OBRA No. 10 DE FECHA DE 20 DE AGOSTO DE 2025, ENTREGA ACTA COMITÉ DE OBRA No. 11 Y COMPROMISOS DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, Y CITACIÓN AL PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No. 11 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 161-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, se realiza entrega de la siguiente documentación al contratista de obra:

1. **ENTREGA ACTA DE COMITÉ No. 10**

Se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 10 con fecha del día 20 de agosto de 2025.

2. **ENTREGA ACTA DE COMITÉ No. 11**

Se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 11 con fecha del día 27 de agosto de 2025

3. **ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 11**

Como resultado del comité llevado a cabo el 27 de agosto de 2025 se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

Imagen 1. Compromisos Actas de Comité de fecha 27 de agosto de 2025

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	3/09/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos	Semanal	Contratista de Obra e interventoria
3	Solicitud de modelo valla informativa Convenio 738-2024	28/08/2025	Supervision

Fuente: *Acta de comité de obra No.11 del 27 de agosto de 2025*

4. CITACIÓN A PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No. 12

Así mismo, se procede a realizar la citación al próximo comité de obra No. 12, para mantener un control en los avances y que los compromisos pactados se cumplan en las fechas establecidas, quedando de la siguiente manera:

Día	Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Lugar:	Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de La Vega, Cundinamarca
Hora:	09:00 am

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 10 de fecha 20 de agosto de 2025
- Acta de comité de obra No. 11 de fecha 27 de agosto de 2025

Total, de folios diez (10) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1367

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900166619-9

La Vega – 08 de octubre de 2025

CTO.179-2025-161-021

Señores

LA VEGA 22/10/2025 16:06
Al Contestar cite este No.: 20251106069
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:104 Folios Fol:2

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: **AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No.4 C-OBRA-161-2025**
Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.4 para el contrato de obra C-OBRA-161-2025 mediante el comunicado OFI 161-2025-011 de fecha 06 de octubre de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

- Informe mensual No. 4 de obra
- Registro fotográfico detallado convenio ICCU 707-2024
- Registro fotográfico detallado convenio ICCU 738-2024
- Registro fotográfico Adición vereda Guarumal sector El Moro
- Bitácora convenio ICCU 738-2024
- Bitácora de obra adición vereda Guarumal sector El Moro
- Control estado del tiempo cto 161 de 2025

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900166649-9

- Correspondencia original enviada
- Correspondencia original recibida

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta

- Informe mensual de avance No.4 en ciento cuatro (104) Folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

La Vega, 6 de octubre de 2025

OFI 161-2025-0011

Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Lorena Gómez
RECIBIDO
INTERVENTORIA
DEL PROYECTO
06 oct 2025

REFERENCIA: Contrato de obra No.161-2025

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No.4

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de Obra No. 161 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen y atendiendo la solicitud realizada por parte de la interventoría como contratista de obra hacemos entrega formal del informe mensual de obra No.4 comprendido entre el 03 de septiembre de 2025 al 02 de octubre de 2025, el cual contiene:

- Anexo 1. Registro fotográfico detallado convenio ICCU 707-2024
- Anexo 2. Registro fotográfico detallado convenio ICCU 738-2024
- Anexo 3. Registro fotográfico Adición vereda Guarumal sector El Moro
- Anexo 4. Bitácora convenio ICCU 738-2024
- Anexo 5. Bitácora Adición vereda Guarumal sector El Moro
- Anexo 6. Control estado del tiempo
- Anexo 7. Correspondencia original enviada
- Anexo 8. Correspondencia original recibida

Total, Folios: Ciento cuatro (104) Folios

Lo anterior se remite para aprobación y tramites correspondientes.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andres Pinzon Lopez
CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
