INFORME MENSUAL No. 4

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 – 2024 MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"



CONTRATO DE OBRA No. 161 DE 2025

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN					
VERSIÓN	PERIODO	OBJETO	ELABORADO	REVISADO POR	APROBADO POR
01	03/09/2025 – 02/10/2025	Informe No. 4	Residente de obra	Director Obra	Supervisión Municipal

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN....5
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....6
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....7
4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO....9
5 ASPECTOS JURÍDICOS....10
5.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO....10
5.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO....11
6 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES....12
6.1 FORMA DE PAGO....12
6.2 CORTES DE OBRA....12
7 ASPECTOS TÉCNICOS....13
7.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO....13
7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS....14
7.2.1 Vía que comunica la vereda Nagui con la vereda Hoya Grande sector la Ye el Descanso – Convenio ICCU 707 - 2024....14
7.2.2 Vía que comunica la vereda Centro con la vereda la Alianza Sector el Rosario – Convenio ICCU 738-2024....14
7.2.3 Vía que comunica la Vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas - Convenio ICCU 716 – 2024....16
7.2.4 Vía que comunica la Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro....16
7.2.5 Vía que comunica la Vereda Guarumal Sector el Moro....17
7.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO....19
7.4 BITÁCORA DE OBRA....20
7.5 ESTADO DEL TIEMPO....20
8 ASPECTOS SOCIALES....21
8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD....21
8.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS....21
9 ASPECTOS SG SST....22
9.1 PERSONAL DE OBRA....22
9.2 SEGURIDAD SOCIAL....22
9.3 DOTACIONES Y (EPP)....22
10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS....23

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

10.1 SEGUIMIENTO DE PROYECTO 23
10.1.1 Control de correspondencia 23
10.1.2 Control comités 25
11 CONCLUSIONES 27
11.1 ASPECTOS TÉCNICOS 27
11.2 ASPECTOS SG-SST 27
11.3 ASPECTOS AMBIENTALES 28

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Datos contrato de obra AASING S.A.S 9
Tabla 2 Pólizas iniciales contrato de obra AASING S.A.S. 10
Tabla 3 Pólizas acta de inicio contrato de obra AASING S.A.S 10
Tabla 4 Pólizas actualizadas al modificatorio No. 1 contrato de obra AASING S.A.S 10
Tabla 5 Documentos legales contrato de obra AASING S.A.S. 11
Tabla 6 Forma de pago del contrato AASING S.A.S 12
Tabla 7 Cortes de obra AASING S.A.S. 12
Tabla 8 Programado VS Ejecutado AASING S.A.S 13
Tabla 9 Actividades Vía vereda La Alianza Sector El Rosario 14
Tabla 10 Actividades Vía vereda Guarumal Sector el Moro 17
Tabla 11.Control del clima periodo actual 20
Tabla 12.Plan de acompañamiento a actividades técnicas 21
Tabla 13. Relación de personal de obra 22
Tabla 14 Relación - Correspondencia enviada 23
Tabla 15 Relación - Correspondencia recibida 24
Tabla 16 Relación – comité de obra 25
Tabla 17 Avance de obra en sitios de intervención 27

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega 7
Ilustración 2 Localización general de la vía que a la vereda Hoya Grande sector la Ye el descanso 7
Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda la Alianza sector El Rosario. 8
Ilustración 4 Localización general de la vía vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas. 8
Ilustración 5. Programado Vs Ejecutado AASING S.A.S 13

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1 . Registro fotográfico detallado Convenio ICCU 707-2024 19
ANEXO 2 . Registro fotográfico detallado Convenio ICCU 738-2024 19
ANEXO 3 . Registro fotográfico Adición vereda Guarumal Sector el Moro 19
ANEXO 4 . Bitácora Convenio ICCU 738-2024 20
ANEXO 5 . Bitácora Adición vereda Guarumal Sector el Moro 20
ANEXO 6. Control estado del tiempo Cto 161-2025 20
ANEXO 7.. Correspondencia original enviada 24
ANEXO 8.. Correspondencia original recibida 25

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las labores realizadas por la empresa AASING S.A.S, en el periodo comprendido del 03 de septiembre de 2025 al 02 de octubre de 2025, para el contrato cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 – 2024 MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" de acuerdo con la propuesta presentada y con los respectivos términos de referencia con base al contrato No. 161-2025.

Siendo una de las obligaciones del contratista suministrar información sobre el proyecto con base al avance de este, en el presente documento se muestra el control de las actividades que se realizan durante el período especificado anteriormente, durante la ejecución de todas las actividades de desarrollo, enfatizando en la calidad, estudios técnicos y especificaciones del desempeño de las operaciones actuales.

Al final, se realiza conclusiones y observaciones sobre las actividades ejecutadas hasta el periodo mencionado y se realiza entrega del presente informe a la interventoría del proyecto, para su revisión y aprobación.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de La Vega Cundinamarca, ha identificado la necesidad para el mantenimiento, rehabilitación y conservación de vías del sector rural, las cuales, a pesar de contar con un bajo volumen de tránsito, principalmente de vehículos livianos como los automóviles, camperos o motocicletas, son esenciales para la conectividad de las comunidades. En este contexto, considerando la prioridad de mejorar la infraestructura vial para el bienestar de los habitantes rurales, se destinarán recursos para la construcción de pavimentos de placa huella de concreto reforzado.

Este proyecto se justifica a partir de la previa la evaluación técnica que ha determinado la urgencia y la viabilidad de intervenir las siguientes vías, en búsqueda de mejorar las condiciones de accesibilidad de la población rural hacia el casco urbano del municipio y, a su vez, facilitar la conexión con otras regiones del país.

La intervención contempla el mejoramiento de aproximadamente 331 metros de placa huella, distribuidos en tres tramos:

a) Vía que comunica la vereda Hoya Grande sector La Ye el Descanso. Convenio ICCU 707-2024
b) Vía que comunica la vereda la Alianza Sector el Rosario. Convenio ICCU 738 -2024
c) Vía que comunica la vereda la Hoya Grande Sector Cuatro Esquinas. Convenio ICCU 716-2024
d) Vía que comunica la vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro.
e) Vía que comunica la vereda Guarumal Sector el Moro.


El desarrollo del proyecto busca mejorar la conectividad y accesibilidad vial en el sector rural, lo cual impactará positivamente en la calidad de vida de los habitantes y en el desarrollo económico de la región, fortaleciendo los vínculos entre la zona rural y el resto del municipio y la región.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Vega es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia, que se caracteriza por su entorno rural y su riqueza natural, se encuentra en la región central de Colombia.

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega

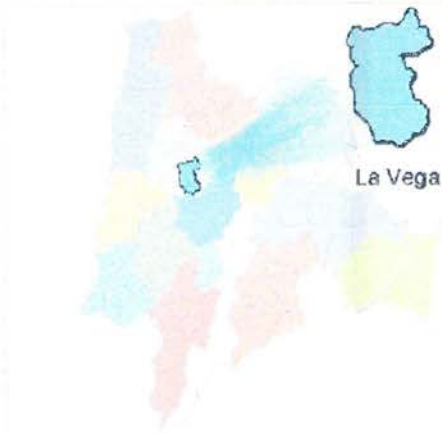

Características:

Extensión total: 146 km²
Altitud de la cabecera municipal:1510 m.s.n.m
Temperatura media: 19 °C
Habitantes: 7361 hab

Fuente: Alcaldía de la Vega

Las zonas por intervenir son parte del área rural del municipio de la vega son vías que comunican veredas entre sí y con la zona urbana, el proyecto tiene como objetivo brindar mejoramiento a las condiciones de circulación por las veredas que comunica esta vía, facilitando la comunicación y movilización de productos del sector campesino del municipio.

a. Vía que conduce de la vereda Nagui a la vereda Hoya Grande sector la Ye el Descanso

Ilustración 2 Localización general de la vía que a la vereda Hoya Grande sector la Ye el descanso



Fuente: Alcaldía de la Vega

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

b. vía que comunica la vereda Centro con la vereda La Alianza sector El Rosario.

Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda la Alianza sector El Rosario.



Fuente: Alcaldía de la Vega

c. Vía que comunica la vereda Naguy con la vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas.

Ilustración 4 Localización general de la vía vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas.



Fuente: Alcaldía de la Vega

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Se hace la presentación detallada de la parte contractual y administrativa del contrato de obra del proyecto. Se describen a continuación los datos del contrato de obra indicando los tiempos y valores contractuales y el personal solicitado en el pliego de condiciones.

Tabla 1 Datos contrato de obra AASING S.A.S

CONTRATISTA	
Número de contrato	C-OBRA-No. 161 de 2025
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 – 2024 MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
Contratista	Proyectos de Ingeniería Diseños Construcciones y Consultorías S.A.S (AASING S.A.S)
Nit	900.976.357-7
Representante legal	Carlos Andrés Pinzón López
Valor inicial del contrato	$ 436.794.579,39
Adición No. 1	$ 217.798.358,00
Valor final del contrato	$ 654.592.937,39
Plazo de ejecución inicial	Cuatro (04) Meses
Prórroga No. 1	Dos (02) Meses
Plazo de ejecución final	Seis (06) Meses
Fecha inicio	03 de junio de 2025
Terminación inicial	02 de octubre de 2025
Terminación final	02 de diciembre de 2025
Supervisor	Laura Viviana Ortiz Robayo

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

5.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de obra tales como actas de inicio:

Tabla 5 Documentos legales contrato de obra AASING S.A.S.

No.	Objeto	Fecha de Firma
1	Contrato	27/03/2025
2	Acta de inicio	03/06/2025
3	Modificatorio No. 1	16/08/2025

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

5 ASPECTOS JURÍDICOS

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra expedidas por Seguros del Estado, con sus respectivas actualizaciones, así mismo la relación del seguimiento jurídico y legal del contrato bajo las siguientes consideraciones:

5.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO

Tabla 2 Pólizas iniciales contrato de obra AASING S.A.S.

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
11-44-101251796	Cumplimiento	27/03/2025	27/11/2025	$ 43.679.457,94
11-44-101251796	Prestaciones	27/03/2025	27/07/2028	$ 21.839.728,97
11-44-101251796	Estabilidad	27/03/2025	27/07/2030	$ 87.356.915,88
11-40-101076180	RCE	27/03/2025	27/07/2025	$284.700.000.00

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 3 Pólizas acta de inicio contrato de obra AASING S.A.S

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
11-44-101251796	Cumplimiento	03/06/2025	03/02/2026	$ 43.679.457,94
11-44-101251796	Prestaciones	03/06/2025	03/10/2028	$ 21.839.728,97
11-44-101251796	Estabilidad	03/10/2025	03/10/2030	$ 87.356.915,88
11-40-101076180	RCE	03/06/2025	03/10/2025	$284.700.000.00

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 4 Pólizas actualizadas al modificatorio No. 1 contrato de obra AASING S.A.S

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
11-44-101251796	Cumplimiento	03/06/2025	03/02/2026	$ 65.459.293,74
11-44-101251796	Prestaciones	03/06/2025	03/10/2028	$ 32.729.646,87
11-44-101251796	Estabilidad	03/10/2025	03/10/2030	$ 87.358.915,88
11-40-101076180	RCE	03/06/2025	03/12/2025	$284.700.000.00

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

6 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

6.1 FORMA DE PAGO

Para el presente contrato de obra No.161 de 2025, se establecieron, los siguientes parámetros de forma de pago, con su respectiva documentación de formalización de pago:

Tabla 6 Forma de pago del contrato AASING S.A.S

No. Pago	Forma de pago	Documentación general para pagos
1	0-90%	El municipio cancelara al contratista actas parciales correspondientes al avance de obra hasta alcanzar el 90%
2	10%	Una vez se finalicen los trabajos y se reciban a satisfacción por parte de la administración Municipal a través de la supervisión y/o interventoría, previa presentación del informe de actividades al superviso y/o interventor del contrato, el cual expedirá un informe de recibo a satisfacción.

Fuente: AASING S.A.S.

6.2 CORTES DE OBRA

Los cortes de obra se realizarán de acuerdo con el avance de las actividades ejecutadas, actividades que deben corresponder con los diseños, ítems aprobados y especificaciones técnicas del proyecto, previo recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. A la fecha no se han presentado cortes de obra.

Tabla 7 Cortes de obra AASING S.A.S.

No.	Objeto	Valor
1	Contrato	$ 436.794.579,39
2	Modificatorio No. 1	$ 217.798.358,00
3	Acta parcial No. 1	$ 536.442.358,00
4	Saldo por cobrar	$ 118.150.579,39

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com


7 ASPECTOS TÉCNICOS

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades contractuales en obra:

7.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO

Se evidencia el avance de ejecución de obra de las actividades realizadas hasta la fecha:

Ilustración 5. Programado Vs Ejecutado AASING S.A.S

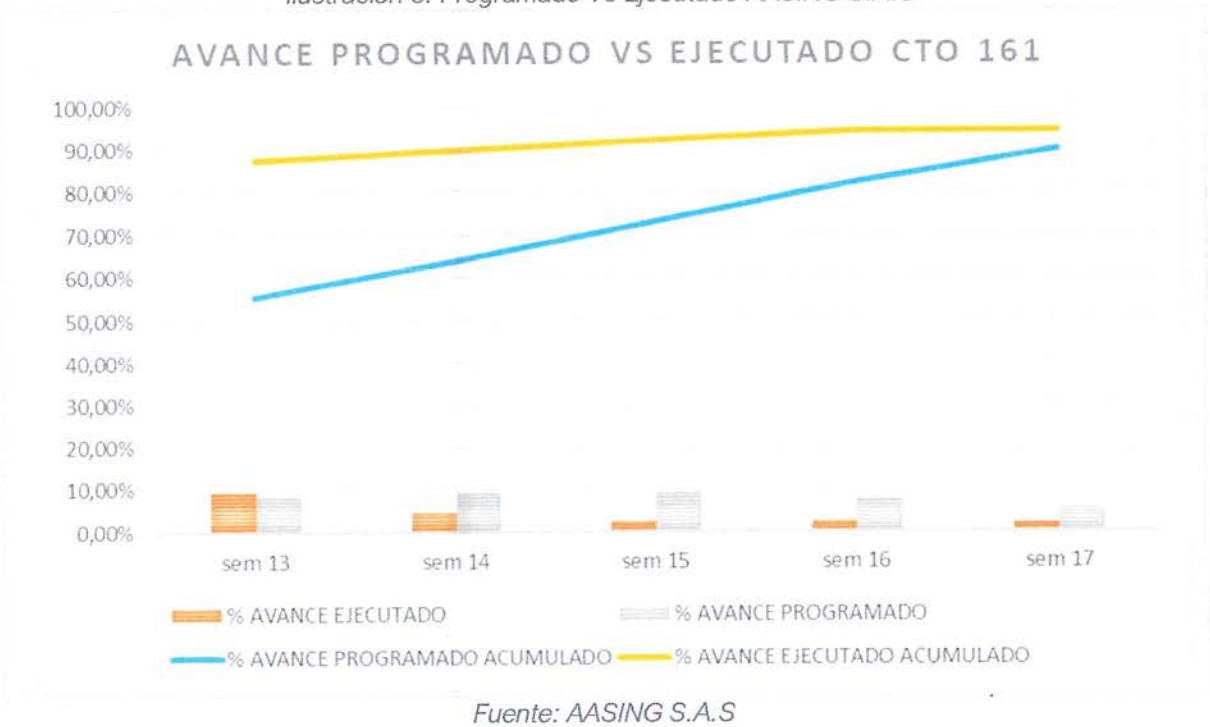

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 8 Programado VS Ejecutado AASING S.A.S

FECHA	PROGRAMADO	EJECUTADO
03 de septiembre de 2025 al 02 de septiembre de 2025	89.54%	93.86%

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	

Fuente: AASING S.A.S

7.2.3 Vía que comunica la Vereda La Hoya Grande sector Cuatro Esquinas - Convenio ICCU 716 – 2024

Para el periodo en mención, en el frente de trabajo ya se han finalizado las actividades constructivas el día 17 de agosto de 2025 de acuerdo a las actividades y recursos aprobados en el modificatorio No.1

7.2.4 Vía que comunica la Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro

Para el periodo en mención, en el frente de trabajo ya se han finalizado las labores constructivas de acuerdo a las actividades y recursos aprobados mediante el modificatorio No.1

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com


7.2.5 Vía que comunica la Vereda Guarumal Sector el Moro

Durante el periodo, como contratistas de obra y en cumplimiento a las obligaciones contractuales, se llevaron a cabo actividades de suministro, armado y figurado de acero de refuerzo de 60.000 PSI previo al inicio de actividades constructivas en obra.

Tabla 10 Actividades Vía vereda Guarumal Sector el Moro

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	
SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

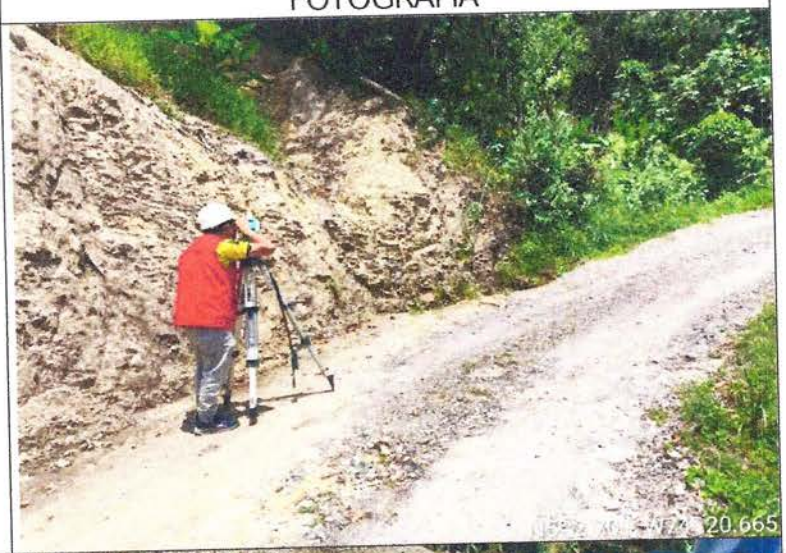REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	
CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

7.4 BITÁCORA DE OBRA


Durante el periodo de ejecución del proyecto, se ha adelantado el registro de los trabajos y actividades diarias desarrolladas en el periodo descrito.

ANEXO 4 . Bitácora Convenio ICCU 738-2024
ANEXO 5 . Bitácora Adición vereda Guarumal Sector el Moro

7.5 ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo de ejecución del proyecto, el tiempo fue favorable parta la ejecución de las actividades constructivas

Tabla 11.Control del clima periodo actual

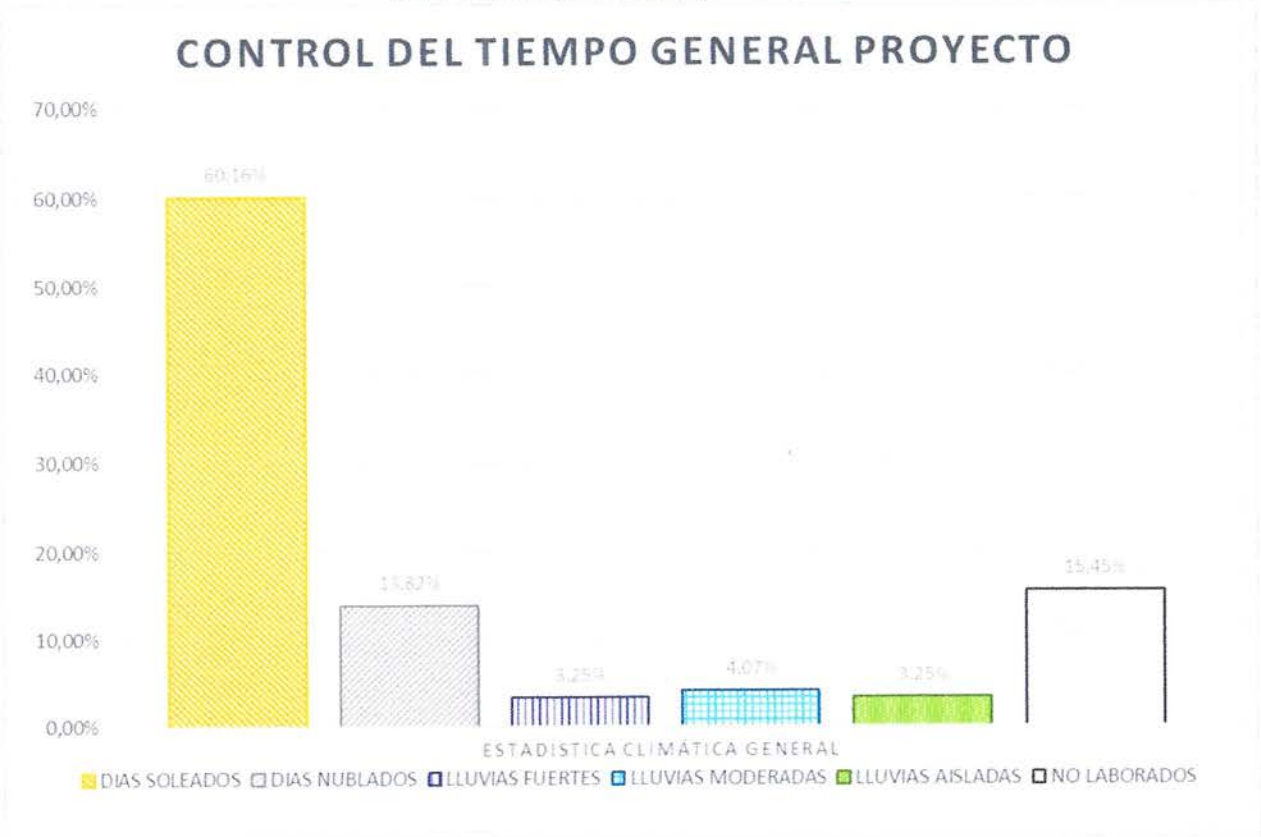

Fuente: AASING S.A.S

ANEXO 6. Control estado del tiempo Cto 161-2025

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

8 ASPECTOS SOCIALES

8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Con el objetivo de brindar atención y participación a la comunidad en el proyecto que se está ejecutando, se encuentra disponibilidad en la obra para recibir cualquier petición, queja y/o reclamos (PQR'S) con relación a la obra en ejecución. Este programa se implementa dado que, para AASING S.A.S., es muy importante la participación de la comunidad para la cual se está ejecutando el proyecto, durante el periodo no se presentó ninguna PQRS.

Dentro de la gestión social realizada por el contratista de obra se resalta la vinculación laboral de personas habitantes del municipio de la Vega.

Previo al inicio de las actividades constructivas, se llevó a cabo la socialización del proyecto con la comunidad, la cual manifestó una recepción favorable ante las obras a ejecutar.

8.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS

En el periodo correspondiente a este informe se realiza apoyo a actividades técnicas de obra.

Tabla 12.Plan de acompañamiento a actividades técnicas

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	OBSERVACIONES
Realizar acompañamiento en temas de conflictos con propietarios. Brindar apoyo en el momento de que se generen imprevistos en obra por parte de la comunidad. Dar información al residente de obra con respecto a propietarios directamente implicados con el proyecto. Ser partícipe y dar apoyo de las capacitaciones que se brinden al personal de obra en los diferentes temas. Apoyo en la socialización y recepción de firmas de actas de aprovechamiento forestal.	Realizar acompañamiento social en obra en las actividades técnicas, para que así se genere de la mejor manera y sin afectar a la comunidad ni al contratista	Se realiza acompañamiento al residente de obra al momento de resolver dudas e inquietudes con los propietarios. Se apoya en las capacitaciones de obra en temas referentes a SG-SST Se realiza acompañamiento a viviendas que sufrieron afectaciones debido a la ejecución de la obra.

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el presente capítulo se relaciona las actas administrativas realizadas durante el desarrollo del contrato, al igual, las decisiones tomadas y los diferentes requerimientos realizados de la interventoría al contratista, al igual que las respuestas dadas por ellos, de igual forma se relacionan la correspondencia generada.

10.1 SEGUIMIENTO DE PROYECTO

Se relaciona el seguimiento del proyecto durante la ejecución de la obra en los siguientes aspectos:

10.1.1 Control de correspondencia

La correspondencia que a continuación se relaciona es la que se ha generado en el transcurso de la ejecución del proyecto; se menciona la correspondencia enviada y recibida de la supervisión u otra entidad.

Tabla 14 Relación - Correspondencia enviada

INFORME No 1			
No.	Fecha	Asunto	Destinatario
1	09-06-2025	Entrega cronograma, apu, hojas de vida personal mínimo requerido, pmt y soportes de maquinaria	Supervisión, interventoría
2	09-06-2025	Entrega pólizas acta de inicio contrato c-obra-161-2025	Supervisión,
3	11-06-2025	Entrega plan de seguridad y salud en el trabajo sst	Supervisión,
4	24-06-2025	Solicitud de aclaración de inclusión de iva en el valor del contrato de obra no. C-obra-161-2025	Supervisión,
5	24-06-2025	Subsanación de observaciones al plan del sg-sst del contrato de obra no. C-obra-161-2025	interventoría
INFORME No 2			
No.	Fecha	Asunto	Destinatario
6	11-07-2025	Solicitud aprobación modificatoria por adición en el valor, adición en tiempo e inclusión de ítems no previstos al al contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
6.1	11-07-2025	Entrega informe mensual de obra No.1	Interventoría
7	23-07-2025	No aplicación de protocolos de bioseguridad	Supervisión, interventoría
INFORME No 3			
8	19-08-2025	Entrega pólizas actualizadas a modificatorio No. 1 Contrato C-OBRA-161-2025	Supervisión, Interventoría

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

8.1	20-08-2025	Entrega cronograma de obra actualizado al modificatorio No. 1	Interventoría
9	27-08-2025	Entrega acta parcial No. 1 de obra solicitud de pago	Interventoría
		INFORME No. 4	
10	09-09-2025	Entrega informe mensual de obra No. 3	Interventoría

Fuente: AASING S.A.S

ANEXO 7.. Correspondencia original enviada

Tabla 15 Relación - Correspondencia recibida

INFORME No. 1			
No.	Fecha	Asunto	Remitente
1	06-06-2025	Solicitud de información inicial para el desarrollo del contrato de obra no. 161-2025 (placa huella vereda Naguy Alto y vereda La Alianza)	Interventoría
2	18-06-2025	Val y entrega de hojas de vida, programación de obra, análisis de precios unitarios y PMT contrato de obra c-obra-154-2025	Interventoría
3	12-06-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 01 de fecha 11 de junio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 02 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
4	18-06-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 02 de fecha 18 de junio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 03 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
5	24-06-2025	Respuesta al oficio CTO 161-2025-004 del 24 de junio de 2025 solicitud de aclaración de IVA en el valor del contrato de obra no. C-obra-161-2025	Interventoría
6	25-06-2025	Aval y entrega de plan SG SST para el contrato de obra c-obra-161-2025	Interventoría
		INFORME No. 2	
No.	Fecha	Asunto	Remitente
7	14-07-2025	Previstos y adición en valor y tiempo No.1 contrato de obra No. 161-2025	Interventoría
8	18-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 04 de fecha 09 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 05 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
9	18-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 05 de fecha 16 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 06 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
10	24-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 06 de fecha 23 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 07 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
11	24-07-2025	Aval y entrega informe mensual de avance No.1 c-obra-161-2025	Interventoría
12	02-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 07 de fecha 30 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 08 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

		INFORME No. 3	
13	06-08-2025	Aval comunicado cto 161-2025-007 – "NO APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD"	Interventoría
14	08-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 08 de fecha 06 de agosto de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 09 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
15	13-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 09 de fecha 13 de agosto de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 10 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
15.1	15-08-2025	Aval y entrega informe mensual de avance no.2 c-obra-161-2025	Interventoría
15.2	25-08-2025	Aval y entrega cronograma de obra actualizado a modificatorio no.1 del contrato de obra c-obra-161-2025	Interventoría
16	27-08-2025	Aval y entrega acta parcial no. 1 c-obra-161-2025	Interventoría
17	01-09-2025	Entrega de acta comité de obra no. 10 de fecha de 20 de agosto de 2025, entrega acta comité de obra no. 11 y compromisos de fecha 27 de agosto de 2025, y citación al próximo comité de obra no. 11 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
		INFORME No. 4	
18	08-09-2025	Entrega de acta comité de obra no. 12 de fecha de 03 de septiembre de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 13 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
19	16-09-2025	Aval y entrega de informe mensual de avance No. 3 C-OBRA-161-2025	Interventoría
20	26-09-2025	Entrega de acta comité de obra no. 13 de fecha de 24 de septiembre de 2025 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría

Fuente: AASING S.A.S

ANEXO 8.. Correspondencia original recibida

10.1.2 Control comités

Durante el periodo se llevaron a cabo los siguientes comités de obra.

Tabla 16 Relación – comité de obra

	INFORME No 1	
No.	Fecha	Asunto
01	11/06/2025	Comité de seguimiento de las actividades
02	18/06/2025	Comité de seguimiento de las actividades
03	25/06/2025	Comité de seguimiento de las actividades
	INFORME No 2	
No.	Fecha	Asunto
04	09/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
05	16/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
06	23/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

07	30/07/2025	Comité de seguimiento de las actividades
		INFORME No 3
08	06/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
09	13/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
10	20/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
11	27/08/2025	Comité de seguimiento de las actividades
		INFORMES No. 4
12	03/09/2025	Comité de seguimiento de las actividades
13	24/09/2025	Comité de seguimiento de las actividades

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

11 CONCLUSIONES

11.1 ASPECTOS TÉCNICOS

- A la fecha el avance general de obra es de un 93.86% ejecutado frente al 89.54% programado representado en la ejecución de actividades contractuales.

- Para cada uno de los sectores de intervención se cuenta con el siguiente avance de obra:

Tabla 17 Avance de obra en sitios de intervención

SITIO DE INTERVENCIÓN	AVANCE DE OBRA
Vereda Hoya grande Sector la Ye el Descanso Convenio 707	100,00%
Vereda La Alianza Sector el Rosario Convenio738	88.77%
Vereda Hoya Grande sector Cuatro Esquinas Convenio 716	100.00%
Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro	100.00%
Vereda Guarumal Sector el Moro	71.13%

Fuente: AASING S.A.S

- A la fecha se han adelantado y finalizado los procesos constructivos en el convenio ICCU 707 -2024 y convenio ICCU 716-2024 y en la adición en la vereda Naguy alto Sector Monte Oscuro, correspondientes a el suministro, figurado y armado de acero de refuerzo, la fundida de concretos clase D, concreto ciclópeos en 2500 psi, excavaciones manuales y concretos de cunetas

- El clima presentado en el transcurso del proyecto ha sido favorable para la ejecución de las actividades.

- Para el contrato de obra No. 161 de 2025 se suscribió la modificación, prórroga y adición No. 1 al contrato de obra No. 161 de 2025 el cual se detalla en el anexo jurídico del presente informe.

- Se tiene proyección de finalización de las actividades en el frente del convenio ICCU-738 y en la adición sector el moro, durante el siguiente periodo.

11.2 ASPECTOS SG-SST

- Durante este periodo de ejecución de actividades se mantuvo el personal afiliado al sistema de seguridad (ARL, EPS y pensión), de igual modo el personal contó con su respectiva dotación de elementos de protección personal.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

11.3 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se supervisaron las actividades diarias, con el fin de generar el menor impacto de contaminación posible, control de desechos orgánicos e inorgánicos y contaminación visual, además de mitigar del impacto frente a los vecinos colindantes a cada uno de los proyectos.

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

ANEXOS CONTRATO DE OBRA No 161-2025

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO CONVENIO ICCU 707-2024

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 707 - 2024		
CAP	-	**ITEM**	INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA	**LUGAR**	VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registra la instalación de la valla informativa correspondiente, se evidencia la finalización de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA HOYA GRANDE - SECTOR LA "YE" EL DESCANSO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRÉS PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO CONVENIO ICCU 738-2024

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	1	**ITEM**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registran excavaciones menores a mano para la instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	1	**ITEM**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registran excavaciones menores a mano para la instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, actividad que se ejecuta de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, actividad que se ejecuta de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO


AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA





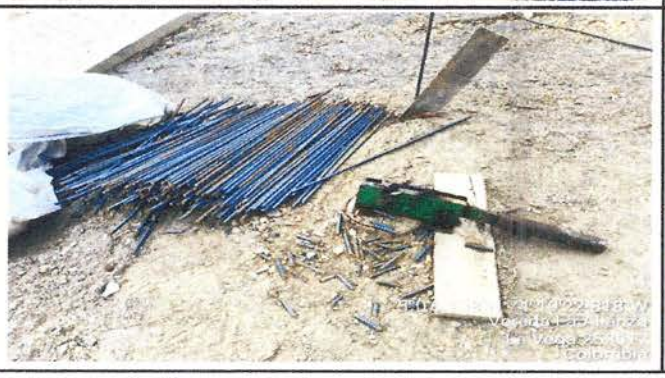



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	1	**ITEM**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registran excavaciones menores a mano para la instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, actividad que se ejecuta de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024		
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, actividad que se ejecuta de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 738 - 2024	
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO ADICIÓN VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO

305 3678028

aasing phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO Nº**	161 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzón López 7

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO		
CAP	-	**ITEM**	SUMINISTRO DE MATERIAL	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registra el suministro de material correspondiente para el desarrollo de las labores constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO - TRAMO 1

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA


ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA





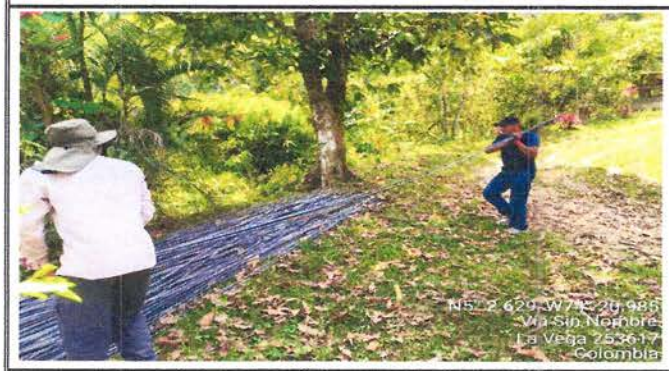



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	

CAP	6	**ITEM**	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza conformación de la calzada existente previo al inicio de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO - TRAMO 1

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	10	**ITEM**	SUBBASE GRANULAR	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza la estabilización de la subbase granular, previso al inicio de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO - TRAMO 1

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO		
CAP	1	**ITEM**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registran excavaciones menores a mano de material común seco para colocación de formaleta y acero de refuerzo de los módulos de la placa huella

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO		
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Antoñ Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	3	**ITEM**	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO	
CAP	3	**ITEM**	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	**4**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Antón Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	161 DE 2025
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA EL MORO

CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO	**INFORME**	4

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

ANEXO 4. BITÁCORA DE OBRA CONVENIO ICCU 738-2024

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

03/09/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738/2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
- V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de vigas, centros en concreto ciclopeo.

Laura Galindo Anggie S William O. T

Suliana T

04/09/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
- V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de centros en ciclopeo, corte, figurado y amarrado de hierro para carriles y vigas.

Laura Galindo Anggie S William O. T

Suliana T

05/09/25 C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima : Dia soleado
Personal : 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Corte, figurado y amarrado de hierro para cunetas y vigas.

Laura Galindo. Anggie S William O.T

Suliana D

06/09/25 C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima : Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Corte, figurado y amarrado de hierro para cunetas y vigas.

Laura Galindo. Anggie S William O.T

Suliana D

1436

08/09/25 C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2ayudantes y 1residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Corte, figurado y amarrado de hierro, acomodado de piedra rajon.

Laura Golindo. Anggie S William O.T

Suliana D

09/09/25 C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2ayudantes y 1residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Corte, figurado y amarre de parrillas de vigas.

Laura Golindo Anggie S William O.T

Suliana D

10/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado, acomodado de piedra y fundida de centros y sobre anchos en concreto ciclopeo.

Laura Galindo. Anggies. William O.T

Juliana D

11/09/25 C. Obra: 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Mañana nublada, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Partida de piedra, encofrado y acomodado de piedra para fundir centros y sobre anchos en concreto ciclopeo.

Laura Galindo. Anggies William O.T

Juliana D

1438

12/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y acomodado de piedra para fundida de sobre anchos y centros en ciclopeo, excavaciones para vigas.

Laura Galindo Anggies William O.T

Suliana D

13/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Trama 1: Excavaciones y acomodado de hierro para vigas y carriles.

Laura Galindo Anggies William O.T

Suliana D

15/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y acomodado de hierro, fundida de carriles y vigas.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Suliana D

16/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de carriles y vigas, encofrado y fundida cunetas.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Suliana D

1440

17/09/25	C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de carriles y cunetas. • V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte y figurado de hierro para carriles. Laura Galindo Anggie S William O.T Suliana D
18/09/25	C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am. Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de cunetas y sobre anchos. • V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte y figurado de hierro. Laura Galindo. Anggie S William O.T Suliana D

1441

19/09/25

C.Obra 167-2025 / Conv ICCO 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Fundida de sobre anchos y cunetas. Se termina la primera mitad de placa huella, para dar tiempo de fraguado.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Galindo. Anggie S William O.T
Juliana D

20/09/25

C.Obra 167-2025 / Conv ICCO 738-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Galindo Anggie S William O.T
Juliana D

1442

22/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y nivelacion manual, suministro de agregados.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Galindo Anggie S William O. T
Suliana D

23/09/25 C. Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia seco, sin lluvia
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de sobre anchos en concreto ciclopeo, excavaciones para vigas y nivelacion manual.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Galindo Anggie S William O. T
Suliana D

1443

24/09/25

C.Obra 161-2025 / Conv ICC 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima : Dia seco
Personal : 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1 : Encofrado, acomodado de hierro y fundida de vigas y carriles.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2 : Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Golindo Jefft Anggie S William O.T
Juliana D

25/09/25

C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Fundida de carriles y vigas
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Golindo Anggie S William O.T
Juliana D

26/09/25 C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de cunetas y carriles con vigas.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro.

Laura Galindo Anggie S. William O.T Suliana D

27/09/25 C.Obra 167-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de sobre anchos en concreto ciclopeo.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarre de hierro.

Laura Galindo Anggie S William O.T Suliana D

1445

29/09/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y acomodado de hierro para carriles y cunetas. • V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Corte, figurado y amarre de hierro. Laura Galindo Anggie S William O.T Sdiana D
30/09/25	C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00am Clima: Dia soleado, sin lluvias Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de carriles y cunetas. • V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Conformacion de la via existente. Laura Galindo Anggie S William O.T Sdiana D

1446

01/10/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de sobre anchos en ciclopeo y cunetas
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Partida de piedra rajon para ciclopeos.

Laura Galindo Anggies William O.T
Suliana D

02/10/25 C.Obra 161-2025 / Conv ICCU 738-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia nublado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra
Actividades
• V. Alianza S. Rosario Tramo 1: Encofrado y fundida de sobre anchos, carriles y cunetas.
• V. Alianza S. Rosario Tramo 2: Nivelacion manual y encofrado.

Laura Galindo Anggies William O.T
Suliana D

ANEXO 5. BITÁCORA DE OBRA VEREDA GUARUMAL SECTOR EL MORO

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

01/09/2025	C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - Tramo 2: replanteo y nivelación Laura Golindo. Anggie S William O.T Suliana D
02/09/2025	C. Obra 161 / Adición , Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro Laura Golindo. Anggie S William O.T Suliana D

03/09/2025	C. Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades. • V. El Moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro Laura Galindo. Anggie S. William O.T Juliana D
04/09/2025	C. Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades • V. El moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarre de hierro Pura cuentas Laura Galindo. Anggie S William O.T Juliana D

1450

05/09/2025	C. Obra 161 / Adicion — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarre de hierro para cuentas Laura Galindo. Angie S William O.T Suliana D
06/09/2025	C. Obra 161 / Adicion — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado sin lluvias Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades: • V. El moro = Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro Laura Galindo. Angie S William O.T Suliana D

08/09/2025	C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 ofical, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades • V. El moro - Tramo 2: corte, figurado y amarrado de hierro para carriles y vigas Laura Galindo. Anggie S. William O. T Suliana D
09/09/2025	C. Obra 161/Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 ofical, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades • V. El moro - Tramo 2: Corte, figurado y amarrado de hierro para carriles y vigas Laura Galindo. William O T Anggie S Suliana D

1453

12/09/2025	C.Obra 161/Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V.El moro-Tramo 2: corte, figurado y amarrado de hierro Laura Galindo. Anggie S William O T Juliana D
13/09/2025	C.Obra 161/Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V.El moro-Tramo 2: Suministro de hierro para tramos 1 y 3 Laura Galindo. Anggie S William O.T Juliana D

15/09/2025	C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - tramo 2: Conformación de la via para tramo 1 Laura Galindo. Anggie S William O.T Suliana D
16/09/2025	C.Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente. Actividades • V El moro - tramo 2: conformación de la via en los tres tramos Laura Galindo. Suliana D... William. O.T Anggie S

19/09/2025	C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El mono - tramo 1: corte, figurado y amarrado de hierro • V. El mono - tramo 2: Suministro de materiales agregados y partida de piedra rajón Laura Galindo. William. O. T Anggie S Suliana D
20/09/2025	C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades: V. El mono - Tramo 1: corte, figurado y amarrado de hierro V. El mono - Tramo 2: Suministro de materiales agregados y partida de piedra rajon Laura Galindo William O.T Anggie S Suliana D

1457

22/04/2025	C-Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades V. El moro - tramo 2: Suministro de materiales, partida de piedra rajon y encofrado •V. El moro - tramo 1: se terminan actividades de corte, figurado y amarrado de hierro Laura Galindo Angie S William O.T Juliana D
23/04/2025	C-Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades •V. El moro - Tramo 2: Suministro de materiales, partida de piedra rajon y encofrado •V. El moro - tramo 3: Corte, figurado y amarrado de hierro. Laura Galindo. Angie S William O.T Juliana D

24/09/2025	C.obra 161/Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente obra Actividades • V.El moro- tramo 2: encofrado, acomodado de piedra y fundida de centros en concreto ciclópeo Laura Golindo Anggie S William O.T Juliana D
25/09/2025	C.Obra 161/Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades: • V.El moro - tramo 2: encofrado y fundida de carril Laura Golindo Anggie S William O.T Juliana D

1459

26/09/2025 C.Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado Sin lluvias.

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente

Actividades.

• V.El moro Tramo 2: encofrado y fundida de carril.

Laura Galindo. Angie S William O.T

Suliana D

27/09/2025 C.Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m

Clima: Dia soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades

• V.El moro - tramo 2: encofrado y fundida de carriles.

Laura Galindo. Angie S William O.T

Suliana D

1460

29/09/2025	C. Obra 161 / Adición Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades: • V. El moro – tramo 2: excavaciones superficiales y nivelación para vigas y cunetas Laura Galindo. Angyes William O.T Suliana D
30/09/2025	C. Obra 161 / Adición Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro-tramo 2: encofrado, acomodado de hierro y fundida de cunetas Laura Galindo. Angyes William O.T Suliana D

1461

01/10/2025	C.Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades • V. El moro - tramo 2: fundida de cunetas y desencofrado Laura Galindo. Ernest Anggies William O.T Suliana D
02/10/2025	C.Obra 161 / Adición — Inicio: 7:00 a.m Clima: Dia Soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente Actividades. -V. El moro - tramo 2: encofrado y fundida de carnles, sobre archos y cunetas. Laura Galindo. Ernest Anggies William O.T Suliana D

ANEXO 6. CONTROL ESTADO DEL TIEMPO CONTRATO Cto. 161-2025

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

1463

AASING S.A.S.	CONTROL ESTADO DEL TIEMPO	VERSIÓN 01
		Página 1 de 1
		Elaboró: Residente de obra

CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA - DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S)
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

MES / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JUNIO			DN	DN	LLF	DS	DN	NL	LLM	LLM	LLA	LLF	DN	DN	NL	DS	LLM	DS	DS	DS	DS	DN	NL	LLA	DS	DN	DS	DN	NL	NL	
JULIO	DS	DN	DS	DS	DN	NL	DS	LLM	DN	LLM	LLF	DS	NL	LLM	DN	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DN	LLA	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS
AGOSTO	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DN	DS	NL	DS	DS	DN	DS	DS	DS	NL	NL	DS	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DS	DS	NL
SEPTIEMBRE	DS	DS	DS	DN	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	LLF	DS	NL	DS	DS	DN
OCTUBRE	DS	DS																													
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															
ENERO																															
SEPTIEMBRE																															
OCTUBRE																															
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															

CONTROL DEL TIEMPO	DESDE :	3 JUN 25	HASTA	2 OCT 25

CONCEPTO	TOTALES		CONVENCIONES	CV	COLOR
TOTAL DE DÍAS SOLEADOS	74	60,16%	DIAS SOLEADOS	DS	
TOTAL DÍAS NUBLADOS	17	13,82%	DIAS NUBLADOS	DN	
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	4	3,25%	LLUVIAS FUERTES	LLF	
	5	4,07%	LLUVIAS MODERADAS	LLM	
	4	3,25%	LLUVIAS AISLADAS	LLA	
DÍAS NO LABORADOS	19	15,45%	NO LABORADOS	NL	
TOTAL	**123**	**100,00%**			

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA OBRA		
FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL	
3 JUN 2025	2 OCT 25	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
DÍAS SECOS	91	73,98%
DÍAS LLUVIOSOS	13	10,57%
NO LABORADOS (DOMINGOS Y FESTIVOS)	19	15,45%
TOTAL	**123**	**100,00%**

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL ULTIMO PERIODO		
DESDE	HASTA	
3 SEP 25	2 OCT 25	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
TOTAL DÍAS SECOS	26	83,87%
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	1	3,23%
TOTAL DÍAS NO LABORADOS (DOMINGOS Y FESTIVOS)	4	12,90%
TOTAL	**31**	100,00%

OBSERVACIONES :

-
-
-
-
-
-
-

RESPONSABLE		FECHA:
NOMBRE:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ	02/10/25
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA:	Carlos Andres Pinzón López	


ELABORO: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S)

94


AASING S.A.S.	CONTROL DEL TIEMPO	VERSIÓN 01
		Página 1 de 1
		Elaboró: Residente de obra

OBJETO CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO 716 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S)
SUPERVISOR	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA, CUNDINAMARCA

CONTROL DEL TIEMPO GENERAL PROYECTO

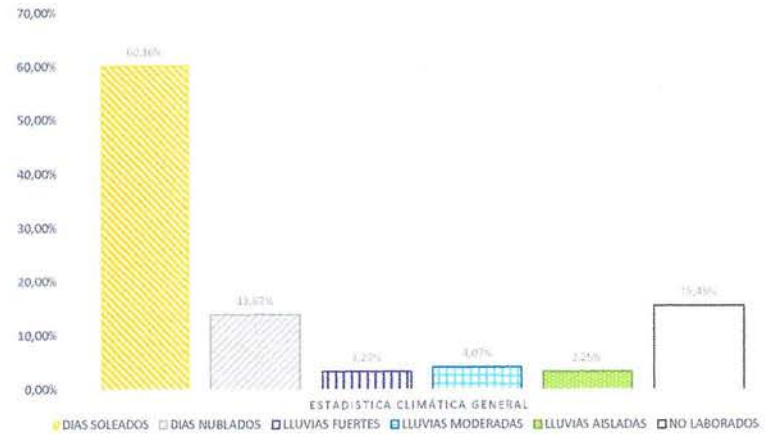

CONTROL DEL TIEMPO PERIODO ACTUAL

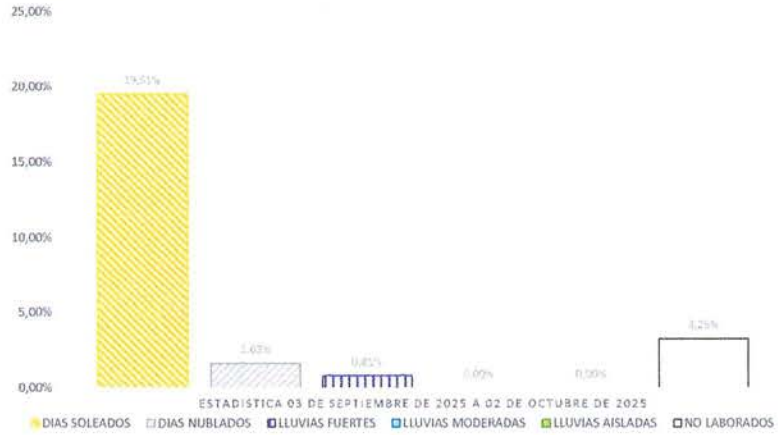

ELABORO: AASING S.A.S

	RESPONSABLE	FECHA:
NOMBRE:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ	2/10/2025
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA:	Carlos Andres Pinzón López	

ANEXO 7. CORRESPONDENCIA ORIGINAL ENVIADA

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1466

La Vega, 09 de septiembre de 2025

OFI 161-2025-0010

Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.161-2025

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No.3

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de Obra No. 161 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen y atendiendo la solicitud realizada por parte de la interventoría como contratista de obra hacemos entrega formal del informe mensual de obra No.3 comprendido entre el 03 de agosto de 2025 al 02 de septiembre de 2025, el cual contiene:

- Anexo 1. Pólizas actualizadas a modificatorio No. 1 Cto obra 161
- Anexo 2. Registro fotográfico convenio ICCU 738-2024
- Anexo 3. Registro fotográfico Adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
- Anexo 4. Registro fotográfico Adición vereda Guarumal sector El Moro
- Anexo 5. Bitácora convenio ICCU 738-2024
- Anexo 6. Control estado del tiempo
- Anexo 7. Correspondencia original enviada
- Anexo 8. Correspondencia original recibida

Total, Folios: Ciento treinta y siete (102) Folios

Lo anterior se remite para aprobación y tramites correspondientes.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andres Pinzón López
CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

97

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ORIGINAL RECIBIDA

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1468

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 900.976.357-7

La Vega – 08 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-161-018

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibí correo
Carlos Andres Pinzon
08. sep
10:37am

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: ENTREGA DE ACTA Y COMPROMISOS DE COMITÉ DE OBRA No. 12 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y CITACIÓN AL PROXIMO COMITÉ DE OBRA No. 13 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 161-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 12 para el contrato de obra No. 161-2025 con fecha del día el 03 de septiembre de 2025.

ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 12:

En el comité técnico celebrado el día 03 de septiembre de 2025, Se presentó un informe sobre las actividades realizadas durante la semana:

Como resultado del presente comité se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

Imagen 1. Compromisos Acta de Comité de fecha 03 de septiembre de 2025

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DE COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento [illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Actas con el cierre y [illegible]	Semanal	Contratista de Obra e Interventoría
3	Solicitud vista convenio ICCU 738-2024	3/09/2025	Supervisión

Fuente: Acta de comité de obra No. 12 del 03 de septiembre de 2025

CITACIÓN A PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA:

Así mismo, se procede a realizar la citación al próximo comité de obra No. 13, para mantener un control en los avances y que los compromisos pactados se cumplan en las fechas establecidas, quedando de la siguiente manera:

Tabla No. 01. Detalle de citación a comité de Obra No. 13

Dia	Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Lugar:	Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de La Vega, Cundinamarca
Hora:	09:00 am

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 13 de fecha 03 de septiembre de 2025

Total, de folios cinco (5)

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1470

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900166619-9

La Vega – 16 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-161-019

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibi
Carlos Andres Pinzon
16. sep. 2025

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: **AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No.3 C-OBRA-161-2025**

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.3 para el contrato de obra C-OBRA-161-2025 mediante el comunicado OFI 161-2025-010 de fecha 09 de septiembre de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

- Pólizas actualizadas a modificatorio No. 1 Cto obra 161
- Registro fotográfico convenio ICCU 738-2024
- Registro fotográfico Adición vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
- Registro fotográfico Adición vereda Guarumal sector El Moro
- Bitácora convenio ICCU 738-2024

1472

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900146649-9

La Vega – 26 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-161-020

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibí correo
Carlos Andres Anzón
26 sep. 2023
5:35pm

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: **ENTREGA DE ACTA Y COMPROMISOS DE COMITÉ DE OBRA No. 13 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 161-2025**

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 13 para el contrato de obra No. 161-2025 con fecha del día el 24 de septiembre de 2025.

ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 13:

En el comité técnico celebrado el día 24 de septiembre de 2025, Se presentó un informe sobre las actividades realizadas durante la semana:

Como resultado del presente comité se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

1473

Imagen 1. *Compromisos Acta de Comité de fecha 24 de septiembre de 2025*

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Actualizacion Carpetas Drive.	Semanal	Cta Obra Interventoria.
2	Comite de Seguimiento y Control.	De acuerdo a concertacion entre las partes	Cta Obra Interventoria Supervision.

Fuente: Acta de comité de obra No. 13 del 24 de septiembre de 2025

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 13 de fecha 24 de septiembre de 2025

Total, de folios cinco (5)

La citación a la próxima reunión será remitida en el momento en el que sea concertada por las partes involucradas

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1474

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 01	**FECHA: 11/06/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CONLA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚNCONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUECOMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZASECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 YMEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINASSEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1				
2				
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Socialización Parametros Comunicaciones y varios Desarrollo Contrato
2) Documentación Inicial (Hojas de Vida - Documentación Maquinaria - Programación de Obra - Pólizas Iniciales, etc)
3) Socialización Inicial Balance de Obra
4) Ejecución Actividades de Obra
5) Proposiciones y Varios

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Se da inicio al comite de obra No. 01 de seguimiento y control en presencia del Ing. Dayron Alexis Celis apoyo a la supervisión del Municipio de la Vega, Juan Carlos Pinto Chavez, director de (Int) Obra de Proyectos de Ingeniería, Diseños, Construcciones y Consultorias SAS (AASING SAS) en calidad de contratista de obra, la ing. Laura , como residente de Interventoría de Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS en su calidad de Interventoría.

1.) Se estableció los medios de comunicación oficiales por parte del contratista de obra e Interventoría, Junto con la supervisión.

2.) Se socializó por parte de la interventoría la revisión, aval y entrega de la documentación inicial solicitada para el contratista de obra, como hojas de vida de los profesionales, cronograma de obra, Apalpis de Precios Unitarios, certificaciones de disponibilidad de maquinaria y PMT para el contrato de obra No. 161 - 2025

3.) Se socializó cuales serían los alcances reales para cada uno de los convenios ICCU 707, 738 y 716

4.) Por parte del contratista de obra informa que ya se realizó el trasiego de acero a cada una de los sectores de la vda. Nagoy alto sectos la Ye el descanso y Cuatro esquinas y ya se viene trabajando en el corte y figurado de acero.
Para la vda. la Alianza se está a la espera por parte del INVIAS de una comunicación oficial donde definan si se puede cerrar o no el paso de este sector para poder iniciar con

	ACTA SOCIALIZACIÓN	
VIAMBIENTAL	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

la construcción de esta placa huella.

5.) El Ing. Alexis Celis menciona que es importante ir revisando el tramo de vía de la vereda Naguy Alto sector monte oscuro para ejecutar este tramo adicional, ya que, el supervisor manifiesta que la comunidad del sector viene solicitando a la administración municipal el arreglo de esta vía.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entregar Registro fotográfico semanal de las actividades para la Supervisión.	18/06/25	Contratista - Interventoría.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1478

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeacion	
Correo eléctronico	ingenieriadaccllavega@gmail.com	
Teléfono	3227322390	
Nombre	Laura Regio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventorias y Obras Civiles SAS	Laura Galindo.
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Pelfinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventorias y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Jean Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato.

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 02	**FECHA: 18/06/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior


ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entregar registro fotográfico Semanal de las actividades para la supervisión	18/06/2025	18/06/2025	Contratista - Interventoría
2				
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Lectura de compromisos del Acta de Comité No. 01
2) Socialización de avance en la solicitud de Vallas Informativas al ICCU por parte de la Supervisión
3) Socialización de Avance de Actividades
4) Socialización de Posible Adición de tramos
5) Proposiciones y Varios

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:05 am del 18 de junio de 2025 inicia el comité virtual de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 161-2025, en presencia del Ing. Alexis Celis, apoyo a la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS

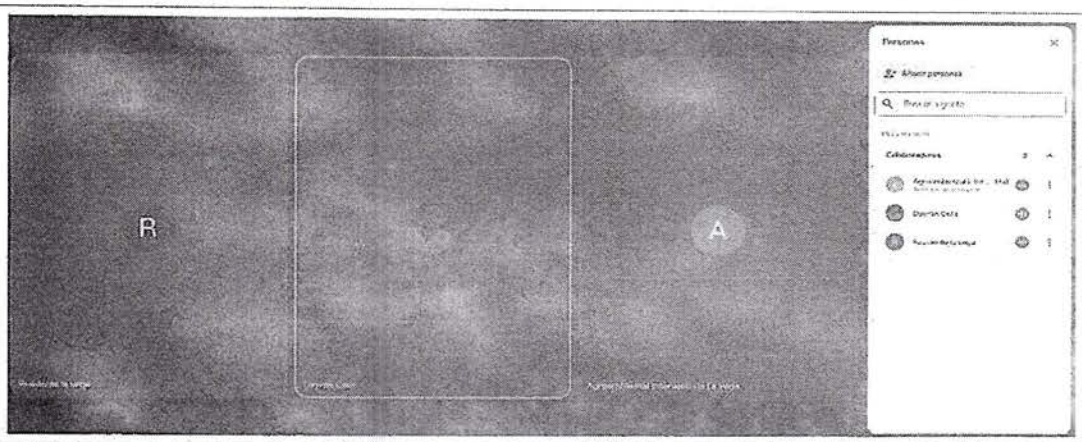

1.) Lectura de compromisos del acta de comité No. 01

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 161-2025, se leen los compromisos del acta de comité No. 01 donde el Ing. Alexis Celis pregunta sobre el cumplimiento de la creación y entrega del archivo de registro fotográfico semanal de las actividades hechas en cada convenio referente al presente contrato, a lo que el Ing. Juan Carlos informa que se viene trabajando en la actualización de la información de la semana pasada, en tanto se tenga completado el cargue total de la información se le compartirá a la supervisión.

2.) Socialización del avance en la solicitud de las vallas informativas

El Ing. Juan Carlos Pinto pregunta al Ing. Alexis Celis sobre el estado de la solicitud hecha por el municipio al ICCU para el diseño de la Valla Informativa de cada uno de los convenios en referencia del presente contrato, a lo que el Ing. Alexis Celis informa que para el contrato C-OBRA No. 161-2025 ya se realizó la solicitud al ICCU para los Convenios No. 707 y No. 716. También informa que esta solicitud ya fue atendida por parte del ICCU, no obstante, se tuvieron errores por parte del ICCU en la digitación de los plazos de los convenios y en el valor del convenio, por lo que ya fueron comunicadas estas observaciones al área encargada en el ICCU y se está a la espera de que nuevamente hagan el envio de las vallas corregidas, para que estas sean enviadas al contratista de obra y se puedan imprimir e instalar en cada una de las veredas y sectores.

De igual forma, el Ing. Alexis Celis informa que no se ha hecho la solicitud al ICCU para el Convenio No. 738-2025 ya que en este sector no se ha hecho la conformación de la vía considerando los inconvenientes que se tienen al no poder cerrar la vía por la construcción de unas placa huellas del INVIAS metros más abajo de la zona de intervención. Por lo tanto, hasta tanto no se haga la conformación de la vía no se puede enviar el registro fotográfico que necesita el ICCU para el diseño de la valla informativa.

3.) Socialización del avance de actividades

La Ing. Laura Galindo, solicita al Ing. Juan Carlos Pinto informe sobre los avances en las actividades de obra que se llevan hasta la fecha del presente comité, a lo que el Ing. Juan Carlos informa que para el Convenio 707-2024, Vereda Naguy Alto Sector La Ye El Descanso, se tiene programado finalizar con la amarre y figurado del acero para poder iniciar la siguiente semana con las excavaciones necesarias y la instalación de formaleta para iniciar con la fundida de los carriles. También que ya se hizo el trasiego y acopio de 200 Bultos de cemento hasta el sitio para iniciar con estas actividades.

4.) Socialización de posible adición de tramos

El Ing. Alexis Celis menciona que de acuerdo con las solicitudes hechas por la comunidad del sector, es necesario ir evaluando una posible adición al contrato en referencia para ejecutar la construcción de un tramo de vía en la vereda Naguy Alto, sector Monte Oscuro y en la Vereda El Moro.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

5.) Revisión de Documentos Iniciales Aportados por Contratista de Obra

El Ing. Alexis Cells comunica que ya fue recibida y revisada la información inicial solicitada por la interventoría así como el aval de la misma, sin embargo, en dicha revisión resalta que dentro de las obligaciones especificas del contrato de obra, solicitan la entrega del PAPSO y protocolos de Bioseguridad, a lo que el Ing. Juan Carlos Pinto responde que esta información ya no tiene validez ya que en la resolución 2624 de 2024 "Por la cual se deroga la resolución 676 de 2020 "Por lo cual se establece el sistema de información para el reporte y seguimiento de las personas afectadas por COVID-19 modificada por la resolución 992 de 2020"

Siendo las 9:44 am del 18 de junio de 2025 se da por finalizada el comité de seguimiento y control No. 02 para el contrato de obra C-OBRA-161-2025



ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Próximo Comité de Seguimiento y Control de Obra No. 03	25/06/2025	Interventoria - Supervisión - Contratista de Obra
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

1482

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR
El Ing. Alexis Celis menciona que se hace necesario evaluar los tramos anteriormente para adicionar al contrato.

ANEXOS
Asistencia del personal al comité Virtual

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	Laura Galindo
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 03	**FECHA: 25/06/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1				
2				
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Socialización de Subsanaciones del SG-SST
2) Socialización de avance en la solicitud de Vallas Informativas al ICCU por parte de la Supervisión
3) Ejecución Actividades de Obra
4) Socialización de Posible Adición de tramos
5) Proposiciones y Varios

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CODIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:45 am inicia el comite de seguimiento y Control No. 03 para el contrato de obra No. 161-2025 en presencia de la Arq. Laura Ortiz, Secretaria de Planeación e Infraestructura, el Ing. Juan Carlos Pinto, director de Obra, la Ing. Laura Bolindo, residente de interventoria.

1.) Socialización de subsanaciones SG-SST

El Ing. Juan Carlos Pinto expresa que ya se realizó el envío de las subsanaciones a los observaciones hechas por la supervisión del contrato, a lo que, la Ing. Laura Bolindo informa que ya se revisó la información aportado y que a su vez, ya se realizó el aval y traslado a la supervisión, para su revisión y aprobación.

La Arq. Laura Ortiz solicita al contratista de obra que se aporte una certificación donde se comuniquen las razones por las cuales no se aporta el PAPSO, solicitado dentro de los obligaciones del contrato de obra en referencia.

2.) Solicitud de Vallas informativas

La Arq. Laura Ortiz informa que ya se recibió el diseño de la valla informativa para los convenios ICCU No. 707-2024 y 716-2024, sin embargo, el ICCU remite una valla, con unas dimensiones de 5m de ancho por 2 m de alto, por lo que el Ing. Juan Carlos Pinto expresa que de acuerdo con la circular No. 017 de 2025 del ICCU las dimensiones de la valla, teniendo en cuenta que el monto de la inversión por contrato y por convenio no supera los 500 SMMLV, por lo que las dimensiones correctas serían de 2 m de ancho por 1.5 m de alto, por lo que la Arq. Laura informa que solicitará la modificación al ICCU.

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

3.) Ejecución de la Obra.

El Ing. Juan Carlos Pinto informa que para el convenio 707 - 2024, Vda. Nagüy sector lo Yé el descanso. se viene adelantando la instalación de formaleta, parrillas de refuerzo y, ya se ha realizado la fundida de los cunetes en concreto. Por lo que se viene trabajando conforme al cronograma de obra.

4.) Socialización de Posible adición de tramos.

La Arq. Laura Ortiz, solicita al contratista de obra, que se proyecte, un acta donde se evidencie los items y actividades que se van a ejecutar, para ir evaluando Junto con la interventoria.

1486

ROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSION: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pag. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Actualizar el registro fotografico con las actividades que vienen desarrollando	02/07/25	Contratista.
2	Modificaciones y/o aclaraciones a los dimensiones de las vallas informativas.	02/07/25	Supervisión
3	Presentar el balance de los posibles adiciones de los tramos	02/07/25	Contratista.
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de _

PARTICIPANTES		
Nombre	Arq. Laura Viviana Ortiz	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsablidad expresa de los que intervienen.

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] OBRA [ ]

ACTA No. 04	**FECHA: 09/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Detallizar el registro fotográfico con las actividades desarrolladas	02/07/2025	02/07/2025	Contratista
2	Modificaciones y/o aclaraciones a las dimensiones vallas	02/07/2025	02/07/2025	Supervisión
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Ejecución Actividades obra

Siendo las 10:10 a.m Se inicia el comité de seguimiento Contrato 161 2025, comité No. 4, en presencia de Supervisión, interventoría y contratista de obra

Ing. Juan Carlos Pinto de obra informa que para el convenio 707 de 2024 ya se tienen actividades de fundidas de huellas y concreto ciclopeo, además de las vigas riostra y cunetas.

Ingr. Laura Ortiz Supervisión solicita que se realice un traslado de 30 metros del punto de inicio de la placahuella, esto debido a las condiciones topográficas del terreno.

ROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Lo anterior se solicita, toda vez que aún se encuentra en ejecución la placahuella y se puede realizar el traslado.

Ing. Juan Carlos Pinto director de obra informa que en cuanto a 738 convenio, se tiene pendiente programar trasiego de material al punto y alistamiento del terreno.

Ing. Juan Carlos pinto director de obra informa que en cuanto al convenio 716 se encuentra en ejecución de actividades de fundida.

2. Vallas informativas

Arq. Laura ortiz supervisión informa que se realizó envio a interventoria y contratista de obra la valla del convenio 707, aún no se ha recibido por parte del ICCU la modificación de la valla del convenio 716.

Se aclara además que se tiene pendiente la entrega del registro fotográfico para el trámite de la vala del convenio 738.

3). Solicitud Adición

Ing. Juan Carlos Pinto contratista obra informa que está tramando documentos de solicitud de adición, por lo que realizará entrega a interventoría el día de hoy para revisión.

Ing. Laura Galindo de interventoria informa que

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

una vez reciba la información al respecto, realizará la revisión correspondiente y trámite.

4) Proposiciones y varios

Dra. Laura Ortiz, Supervisión Solicita se realice entrega de certificado de la no aplicabilidad de solicitud de protocolo de bioseguridad

Además solicita se anexe y entreguen en soportes administrativos para el proceso de archivo registro fotográfico de implementación de la señalización del PMT.

ROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega documento Solicitud Adición	9/07/2025	Contratista obra
2	Entrega Certificación no aplicación protocolo Bioseguridad	16/07/2025	Contratista obra
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Arq. Laura Viviana Ortiz	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 05	**FECHA: 16/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega **Documentos** Solicitud **Adición**	09/07/2025	16/07/2025	Contratista
2	Entrega **Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad**	16/07/2025	N/A	Contratista
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
2) Socialización Ejecución Obra
3) Adición Contrato
4) Proposiciones y Varios
Se da inicio a comité de obra del 16 de julio de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha el contratista de obra ha realizado entrega de los compromisos pactados
Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha tan solo tiene pendiente la entrega del certificado en cuanto al protocolo de bioseguridad
2) Socialización Ejecución Obra
Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera
Convenio 707

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Se están realizando actividades de fundida en cuanto a adecuaciones de accesos de viviendas, se aclara que las actividades globales o gruesas de este convenio ya se finalizaron en la ejecución de la placahuella, se debe realizar visita para recibo de las actividades de obra, se informa por parte de supervisión que de acuerdo con estas condiciones, se realizará recorrido de recibo de placahuella el día 21 de julio de 2025

Convenio 738

En esta zona no se ha copmenzado actividades, sin embargo se programa para la semana del 21 de julio de 2025 dar inicio con las actividades de suministro de materiales

Convenio 716

Se informa que a la fecha se tienen 30 m de placahuella construida, incluida rampa de ingreso, se espera que en dos semanas se terminen las actividades de obra

3) Adición Contrato

Ing. Juan Carlos Pinto Chaves de contratista de obra informa que a la fecha realizó entrega de los documentos correspondientes

Ing. Laura Galindo de interventoría informa que efectivamente una vez recibida la información en cuanto a la adición, se realizó el aval correspondiente, por lo que a la fecha se encuentra radicado en la entidad contratante, radicado del 16 de julio de 2025

Supervisión Arq. Laura Ortiz Informa que en el entendido del recibo de la información el día de hoy, se realizará la revisión correspondiente

4) Proposiciones y Varios

Se aclara por parte de supervisión que se realizará la revisión de los valores que se incluiran dentro de las vallas informativas para la presentación de este documento y proceder a la instalación de este por parte del contratista de obra

La vala del convenio 738 se revisará y ajustará de acuerdo con los valores correspondientes

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Recibo Actividades Obra	21/07/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

2	Inicio Entrega Material Convenio 738	23/07/2025	Contratista Obra
3	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	16/07/2025	Contratista Obra
4	Entrega Registro Fotográfico y Solicitud Valla	23/07/2025	Contratista Obra Supervisión
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

PARTICIPANTES		
Nombre	Arq. Laura Ortiz	Firma
En representacion de	Secretaria de planeación	
Correo eléctronico	planeación@lavega-cundinamarca	
Teléfono		
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo	Firma
En representacion de	Agroambiental	Laura Galindo
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392.	
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	Aasing	
Correo eléctronico	Aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

1497

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CODIGO: PI-IN-F04
		VERSION: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01 mar-14
		PAG ___ de ___

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORIA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 06	**FECHA: 23/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Recibo Actividades Obra	21/07/2025	23/07/2025	Contratista Supervisión
2	Inicio Entrega Material Convenio 738	23/07/2025	N/A	Contratista
3	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	16/07/2025		
4	Entrega Registro Fotográfico y Solicitud Valla	23/07/2025		
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

2) Socialización Ejecución Obra

3) Adición Contrato

4) Proposiciones y Varios

Se da inicio a comité de obra del 23 de julio de 2025 en compañía de interventoria, contratista de obra y supervisión municipal

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha se tienen pendientes algunos compromisos los cuales se volverán a pactar en la presente acta

Se informa por parte de supervisión Ing. Alexis Celis que se tiene espacio el dia de hoy 23 de julio para poder realizar la visita del recibo de las actividades de obra del convenio 707

Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se está revisando el tema logistico para poder efectuar la entrega de material en el convenio 738, lo cual se podrá lograr el día 31 de julio de 2025

Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tiene pendiente la entrega del certificado en cuanto al protocolo de bioseguridad el cual se realizará el dia de hoy

En cuanto a la entrega del registro fotográfico se informa que se tiene pendiente el inicio de actividades del convenio 738 para poder tomar el registro fotográfico pertinente y realizar la solicitud de valla correspondoente

2) Socialización Ejecución Obra

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-09-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01 may 17
		Pág. __ de __

Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera

Convenio 707

Se informa que se realizará visita de recibo de obra el día 23 de julio de 2025

Convenio 738

En esta zona no se ha copmenzado actividades, sin embargo se programa para la semana del 21 de julio de 2025 dar inicio con las actividades de suministro de materiales

Convenio 716

Se informa que se sigue fundiendo y aproximadamente se cuenta con 110 metros lineales ejecutados, se espera terminar estas actividades de obra en la proxima semana

3) Adición Contrato

Ingeniero Alexis Celis de supervisión informa que se realizará la revisión en cuanto a la inclusión de items no previstos y efectuara la consulta correspondiente ante la oficina de contratación para el trámite pertinente

4) Proposiciones y Varios

Se informa por parte de Ing, Alexis Celis supervisión que una vez se entregue el registro fotográfico se efectuará el trámite pertinente ante el ICCU para la instalación de la valla

Se solicita además por parte de supervisión Ing. Alexis Celis de supervisión que se debe realizar seguimiento a diseño de mezcla y la toma de muestras respectivas para los concretos de las placahuellas

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Recibo Actividades Obra	21/07/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoria

1499

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: FT-SEG-01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01/08/2019
		Pág. 1 de 1

2	Inicio Entrega Material Convenio 738	31/07/2025	Contratista Obra
3	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	16/07/2025	Contratista Obra
4	Entrega Registro Fotográfico y Solicitud Valla	23/07/2025	Contratista Obra Supervisión
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

PARTICIPANTES		
Nombre	Darwin Alexis Solis Triana	Firma
En representacion de	Sec. Planeación e Infraestructura	
Correo eléctronico	ingenieradactlavega@gmail.com	
Teléfono	3202532379	
Nombre	Laura Roco Galindo	Firma
En representacion de	Agroambiental SAS.	Laura Galindo
Correo eléctronico	agroambiental.intelavega@gmail.com	

1500

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: FT-SG-014
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-17
		Pag. 4 de 5

Teléfono	3223892392	
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Fredy Alexander Martinez Agroambiental. agroambiental.ingfelavega@gmail.com	Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Juan Carlos Pinto. Aasing SAS. aasing.phlavega@gmail.com	Firma
Nombre		Firma
En representacion de **Correo eléctronico** **Teléfono**		
Nombre **En representacion de** **Teléfono**		Firma
Correo eléctronico		
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**		Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**		Firma

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

1501

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [X] **OBRA** [ ]

ACTA No. 07	**FECHA: 30/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	**Visita Recibo Actividades Obra**	21/07/2025	24/07/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
2	**Inicio Entrega Material Convenio 738**	30/07/2025	No se cumplió	Contratista Obra
3	**Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad**	16/07/2025	23/07/2025	Contratista Obra
4	**Entrega Registro Fotográfico y Solicitud Valla**	23/07/2025	NO SE HA ENTREGADO	Contratista Obra Supervisión
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
2) Socialización Ejecución Obra
3) Adición Contrato
4) Proposiciones y Varios
Se da inicio a comité de obra del 30 de julio de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
Se realiza por parte de interventoría Ing. Laura Galindo lectura del acta anterior del 23 de julio de 2025
En cuanto a la visita de recibo de obra del convenio 707, la cual se efectuó por parte de supervisión, contratista de obra e interventoría, se deja la observación por parte de la supervisión ing. Alexis Celis, de la construcción de 3 metros de cuneta ubicadas sobre la rampa de acceso
En cuanto a la entrega de material del convenio 738 se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto contratista de obra que a la fecha no se ha podido realizar entrega del material correspondiente, por lo que se espera que el día 04 de agosto se realice la entrega de material
Ing. Fredy Alexander Martínez interventoría solicita a contratista de obra realizar las acciones necesarias para poder atender el suministro de material de manera rápida
En cuanto a la entrega del certificado de no aplicación de protocolo de bioseguridad, se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos pinto que esta información se entregó el día 23 de julio de 2025

ROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Se informa que como no se han iniciado actividades en el convenio 738, no se ha podido realizar entrega de la fotografía pertinente para la valla, se espera realizar entrega en la proxima semana

2) Socialización Ejecución Obra

Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera

Convenio 707

Se terminó y se realizó visita el día 23 de julio de 2025

Convenio 738

En esta zona no se ha copmenzado actividades, sin embargo se programa para la semana del agosto de 2025 dar inicio con las actividades de suministro de materiales

Convenio 716

Se informa que se están ejecutando cunetas y bordillos, por lo que a la fecha resta de ejecución aproximadamente 20 metros lineales, por lo que se espera terminar el día sabado 02 de agosto de 2025, por lo que se puede estar programando un recibo en la semana dle 04 de agosto de 2025

3) Adición Contrato

Se informa por parte de Ing. Alexis Celis de supervisión que ya se reviso la información en cuanto a la solicitud de adición del contrato de obra No. 161 de 2025, donde se manifiesta lo siguiente:
1) Se debe realizar un ajuste de presentación de la adición a los formatos oficiales de la alcaldía municipal
2) Se debe realizar una revisión y ajuste a las actividades y sectores a contemplar en la adición
3) Se encuentra pendiente revisión presupuestal por parte del municipio para la adición del contrato
4) Se solicitan los APU´s de los items no previstos presentados

4) Proposiciones y Varios

Se informa por parte de ing. Alexis Celis Supervisión que se recibio el documento correspondiente a la no aplicación del protocolo de bioseguridad, sin embargo aclara que este documento debe ser entregado en fisico, revisado y avalado por parte de la interventoría, este documento en fisico para que repose en el expediente del contrato

Se solicita por parte de Ing. Alexis Celis Supervisión que se vinculen las actas de comité de seguimiento y control al drive que se tiene de consulta por parte de contratista de obra e interventoría

Se solicita por parte de Ing. Alexis Celis Supervisión que se realice programación de visita para revisión de manejo de aguas en el convenio 738, además se debe efectuar una programación adicional de visita para poder realizar el recibo de la placahuella del convenio 716

1503

ROAMBIENTAL	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Recibo Actividades Obra convenio 716	05/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
2	Visita Manejo Aguas Convenio 738	05/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
3	Inicio Entrega Material Convenio 738	04/08/2025	Contratista Obra
4	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad en fisico avalado por interventoría	06/08/2025	Contratista Obra
5	Entrega Registro Fotográfico y Solicitud Valla	23/07/2025	Contratista Obra Supervisión
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

PARTICIPANTES

1504

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS	Laura Galindo
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Myron Alexis Colis	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeacion	
Correo eléctronico	ingenieriadetlavega@gmail.com	
Teléfono	3201522370	
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		

1505

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORIA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 08	**FECHA: 06/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	**Visita Recibo Actividades Obra convenio 716**	**05/08/2025**	**SE APLAZA**	**Contratista Obra Supervisión Interventoría**
2	**Visita Manejo Aguas Convenio 738**	**05/08/2025**	**SE APLAZA**	**Contratista Obra Supervisión Interventoría**
3	**Inicio Entrega Material Convenio 738**	**04/08/2025**	**01/08/2025**	**Contratista Obra**
4	**Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad en fisico avalado por interventoría**	**06/08/2025**	**N/A**	**Contratista Obra**
5	**Entrega Registro Fotográfico y Solicitud Valla**	**23/07/2025**	**SE APLAZA**	**Contratista Obra Supervisión**

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

2) Socialización Ejecución Obra

3) Adición Contrato

4) Proposiciones y Varios

Se da inicio a comité de obra del 06 de agosto de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Se realiza por parte de interventoría Ing. Laura Galindo lectura del acta anterior del 30 de julio de 2025

En cuanto a la visita de recibo de actividades de obra del convenio 716 se informa por parte de la supervisión Ing. Alexis celis que se debe efectuar la visita el día viernes 08 de agosto de 2025

En cuanto a la observacion correspondiente para el manejo de aguas del convenio 738 se plantea por parte de la supervisión ingeniero Alexis Celis la construcción de un cabezote de descole para la alcantarilla, esto se debe verificar por parte de contratista de obra e interventoría en el balance correspondiente

Ing. Juan Carlos Pinto contratista de obra informa que el día viernes 01 de agosto de 2025, realizó entrega de material en la zona del convenio 738, además informa que se iniciaron actividades en este sector el día lunes 04 de agosto de 2025
En cuanto a la entrega del certificado de no aplicación de protocolo de bioseguridad, se informa por parte de interventoría Ing. Fredy Martinez que se realizará entrega fisica el día de hoy 06 de agosto de 2025

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PT-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

2) Socialización Ejecución Obra

Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera

Convenio 738

En esta zona se están ejecutando actividades de corte figurado y amarrado de acero, se espera dar inicio a actividades de formaleteado para fundir concretos el día 15 de agosto de 2025

Convenio 716

Se finalizaron actividades se encuentra pendiente la programación para el recibo de las obras

3) Adición Contrato

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que el día viernes 01 de agosto de 2025 se realizó entrega del documento correspondiente.
A la fecha se informa por parte de Ing. Alexis Celis supervisión que se encuentra en revisión, sin embargo de manera inicial se observa que es necesario que las adiciones se discriminen individualmente las cantidades de los tramos contemplados en la adición
Se informa por parte de contratista de obra Juan Carlos Pinto que se estará realizando el ejercicio solicitado, sin embargo en necesidad de trabajar un solo compilado de observaciones se solicita se realicen completas para la entrega general del documento

4) Proposiciones y Varios

Se realizará visita de obra para recibo de actividades el día viernes 08 de agosto de 2025 del convenio 716

VALLA INFORMATIVA

Ingeniero Alexis Celis supervisión informa que para los convenios 716 y 707 ya se entregaron a contratista de obra, del convenio 738 no se cuenta aun con fotografía para solicitud de valla informativa

1507

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
ROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Recibo Actividades Obra convenio 716	08/08/2025	Contratista Obra Supervisión Interventoría
2	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad en fisico avalado por interventoría	06/08/2025	Contratista Obra
3	Entrega Registro Fotográfico y Solicitud Valla	13/08/2025	Contratista Obra Supervisión
4	Subir Documentos Actas Comité Drive	08/08/2025	Interventoría
5	Comité Obra 13 de agosto de 2025	13/08/2025	Contratista Obra Supervisión
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-TN-F04
AGROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: [illegible]
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

2) Socialización Ejecución Obra

Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera

Convenio 738

En esta zona se terminó actividades de corte figurado y amarrado de acero, se espera dar inicio a actividades de formaleteado para fundir concretos el día 19 de agosto de 2025

3) Adición Contrato

Se informa por parte de Ing. Alexis Celis supervisión que se realizaron observaciones a la adición el día 10 de agosto de 2025
Ing. Juan Carlos Pinto contratista de obra informa que se encuentra en revisión y elaboración de la subsanación pertinentes

4) Proposiciones y Varios

Se realizará visita de obra para recibo de actividades el día viernes 08 de agosto de 2025 del convenio 716

VALLA INFORMATIVA

Ingeniero Alexis Celis supervisión informa que para los convenios 716 y 707 ya se entregaron a contratista de obra, del convenio 738 no se cuenta aun con fotografía para solicitud de valla informativa

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Laura Rocio Galindo Castro Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS agroambiental.interlavega@gmail.com 3223892392	Firma Laura Galindo
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Fredy Alexander Martinez Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS agroambiental.interlavega@gmail.com	Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Juan Carlos Pinto AASING SAS - Contratista de Obra aasing.phlavega25@gmail.com	Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**		Firma
Nombre **En representacion de** **Teléfono** **Correo eléctronico**		Firma

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 10	**FECHA: 20/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	**Vita Recibo actividades convenio 716-2024**	15/08/2025	Pendiente	Contratista de Obra, interventoria, Supervision
2	**Subir documentos actas de comité drive**	13/08/2025	13/08/2025	interventoria
3	**comité de obra 20 agosto de 2025**	20/08/2025	20/08/2025	Contratista de Obra, interventoria, Supervision
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura acta anterior y verificacion compromisos
2. Seguimiento ejecucion de frentes

1514

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
Siendo las 10:50 am del 20 de agosto de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 161-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocío Galindo, en su calidad de residente de interventoria de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervision de los contratos.
1. Lectura del acta anterior
Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 161-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados se cumplieron los sigueintes: actualizacion actas de comite en drive y siguiente comite de control. Para la visita del convenio 716-2024 este se reprograma por agenda de las partes.
2. Desarrollo de actividades constructivas
Convenio 707-2024
Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1 el cual incluye los recursos del convenio y los recursos de adicion los cuales son del Municipio.
En relacion a la valla informativa ya se cuenta con el modelo y esta en fabricacion para su instalacion.
Convenio 738-2024
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se continua con la ejecucion de las actividades en el convenio tales como suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.
- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 50%
En relacion a la valla informativa ya se cuenta con los registros fotograficos para que el municipio realice la solicitud del modelo al ICCU.
Convenio 716-2024
Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1 el cual incluye los recursos del convenio y los recursos de adicion los cuales son del Municipio.
Adicion frente Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se inicio con la ejecucion de las actividades en el frente de adicion Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro de suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.
- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro se tiene un avance del 50%, esto con base a la suscripcion del modificatorio el dia 16 de agosto de 2025.

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Adicion frente Vereda Guarumal Bajo Sector El Moro

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se inicio con la ejecucion de las actividades en el frente de adicion Vereda Guarumal Bajo Sector El Moro de suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi,

- La interventoria informa que con base a la ejecuion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda Guarumal Bajo Sector El Moro se tiene un avance del 12%, esto con base a la suscripcion del modificatorio el dia 16 de agosto de 2025.

3. Acta parcial No,1

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que conforme a los avances de obra realizara la presentacion del acta parcial No,1 el dia hoy a la interventoria con base a las cantidades ya verificadas en campo por las dos partes.

- La interventoria señala que en caso de que la documentacion se encuentre completa conforme a lo ya solicitado se realizara tramite a la supervision del proyecto.

1516




	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	3/09/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos	Semanal	Contratista de Obra e Interventoría
3	Solicitud de modelo valla informativa Convenio 738-2024	28/08/2025	Supervision
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma 
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadecitlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma 
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma 
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma 
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 11	**FECHA: 27/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	3/09/2025	Pendiente	Contratista de Obra, interventoría, Supervision
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos	Semanal	27/08/2025	Interventoría
3	Solicitud de modelo valla informativa Convenio 738-2024	28/08/2025		Contratista de Obra, interventoría, Supervision
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura acta anterior y verificacion compromisos
2. Seguimiento ejecucion de frentes

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de ___

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 10:05 am del 27 de agosto de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 161-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocío Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervision de los contratos.

1. Lectura del acta anterior

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 161-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados se cumplieron los sigueintes: actualizacion actas de comite en drive y siguiente comite de control.
Solicitud modelo de valla informativa convenio 738-2024 fecha sin cumplirse

2. Desarrollo de actividades constructivas

Convenio 707-2024

Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1 el cual incluye los recursos del convenio y los recursos de adicion los cuales son del Municipio.

En relacion a la valla informativa ya se cuenta con el modelo y esta en fabricacion para su instalacion.

Convenio 738-2024

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se continua con la ejecucion de las actividades en el convenio tales como suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.

- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 65%

En relacion a la valla informativa ya se cuenta con los registros fotograficos para que el municipio realice la solicitud del modelo al ICCU.

Convenio 716-2024

Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1 el cual incluye los recursos del convenio y los recursos de adicion los cuales son del Municipio.

Adicion frente Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se finalizo con la ejecuion de las actividades en el frente de adicion Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro de suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.

- La interventoria informa que con base a la ejecuion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro se tiene un avance del 100%, esto con base a la suscripcion del modificatorio el dia 16 de agosto de 2025.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Adicion frente Vereda Guarumal Bajo Sector El Moro

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se finalizo con la ejecucion de las actividades en el frente de adicion Vereda Guarumal Bajo Sector El Moro de suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, el contratista de obra manifiesta que se encuentra en las gestiones pertinentes para iniciar las actividades de conformacion de calzada, localizacion y replanteo e instalacion de subbase granular, para posterior instalacion de formaleta y fundicion de concretos.

- La interventoria informa que con base a la ejecuion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda Guarumal Bajo Sector El Moro se tiene un avance del 26%, esto con base a la suscripcion del modificatorio el dia 16 de agosto de 2025.

3. Acta parcial No,1

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que conforme a los avances de obra realizara la presentacion del acta parcial No,1 el dia hoy a la interventoria con base a las cantidades ya verificadas en campo por las dos partes.

- La interventoria señala que en caso de que la documentacion se encuentre completa conforme a lo ya solicitado se realizara tramite a la supervision del proyecto.

1521

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	3/09/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos	Semanal	Contratista de Obra e interventoría
3	Solicitud de modelo valla informativa Convenio 738-2024	28/08/2025	Supervision
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1522

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadeclavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabildad expresa de los que intervienen.

1523

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 12	**FECHA:03/09/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-161-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	3/09/2025	3/09/2025	Contratista de Obra, Interventoria, Supervision
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos	Semanal	27/08/2025	Interventoría
3	Solicitud de modelo valla informativa Convenio 738-2024	28/08/2025	3/09/2025	Contratista de Obra, Interventoria, Supervision
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura acta anterior y verificacion compromisos
2. Seguimiento ejecucion de frentes

1524

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pag. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 10:16 am del 03 de septiembre de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 161-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervision de los contratos.

1. Lectura del acta anterior

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 161-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados se cumplieron los siguientes: actualizacion actas de comite en drive y siguiente comite de control.
Solicitud modelo de valla informativa convenio 738-2024 se cumple hoy

2. Desarrollo de actividades constructivas

Convenio 707-2024

Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1, para lo cual esta ejecucion ya fue reconocida en el acta parcial No,1 presentada por el contratista de obra, avalada por la interventoria y aprobada por la enticad contratante

En relacion a la valla informativa el dia de hoy se realizo su instalacion.

Convenio 738-2024

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se continua con la ejecucion de las actividades en el convenio tales como suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias.

- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 76%

Es de anotar que a la fecha se estan ejecutando actividades en el tramo 1 en relacion a concretos, para lo cual una vez se finalicen las actividades y el concreto cumpla el fraguado se iniciara la ejecucion de concretos en el tramo 2.

La supervision realiza envio del registro fotografico al ICCU para la solicitud del modelo de la valla informativa.

Convenio 716-2024

Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1, para lo cual esta ejecucion ya fue reconocida en el acta parcial No,1 presentada por el contratista de obra, avalada por la interventoria y aprobada por la entidad contratante

Adicion frente Vereda Naguy Alto Sector Monte Oscuro

Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1, para lo cual esta ejecucion ya fue reconocida en el acta parcial No,1 presentada por el contratista de obra, avalada por la interventoria y aprobada por la entidad contratante

1525

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Adicion frente Vereda Guarumal Bajo Sector El Moro

- Se informa por parte de contratista de obra ing. Juan Carlos Pinto que se iniciaron las actividades de conformacion de calzada, localizacion y replanteo e instalacion de subbase granular, para posterior instalacion de formaleta y fundicion de concretos.

- La interventoria informa que con base a la ejecuion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda Guarumal Bajo Sector El Moro se tiene un avance del 35%, esto con base a la suscripcion del modificatorio el dia 16 de agosto de 2025.

3. Acta parcial No.1

- Se informa por parte de la interventoria que una vez se recibio la cuenta de cobro No,1 presentada por el contratista de obra esta contaba con la informacion solicitada y las cantidades correspondian a las ejecutadas en campo, para lo cual se dio el respectivo aval y tramite al Municipio.

- La supervision del proyecto indica que una vez recibida la cuenta, revisada y aprobada se procedio con el respectivo tramite de pago, quedando el reporte y trazabilidad en el expediente del contrato.

1524

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pag. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	17/09/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos y actas de comité	Semanal	Contratista de Obra e Interventoría
3	Solicitud valla convenio ICCU 738-2024	3/09/2025	Supervision
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __


PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaría de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieradactlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambientalinterlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambientalinterlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.nhlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infirma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

PLANOS RECORD

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

1529

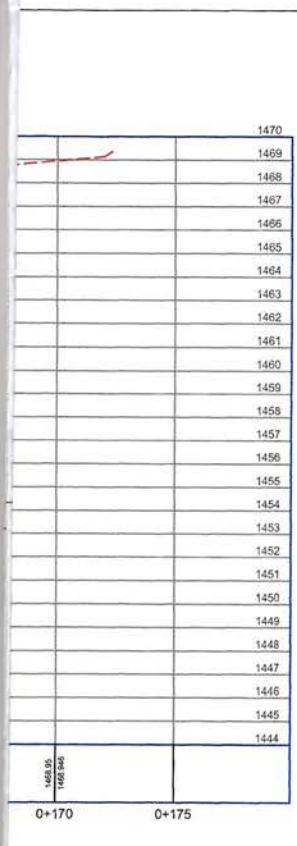

MUNICIPIO DE LA VEGA

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 - 2024
CONTRATO DE OBRA 161-2025

Localizacion:

VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE

1530

	1588
	1586
	1584
	1582
	1580
	1578
	1576
	1574
	1572
	1570
	1568
	1566
1566.95	1566.959

0+150

MUNICIPIO DE LA VEGA

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA


Producto

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 - 2024
CONTRATO DE OBRA 161-2025

Localizacion:

VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS

1531

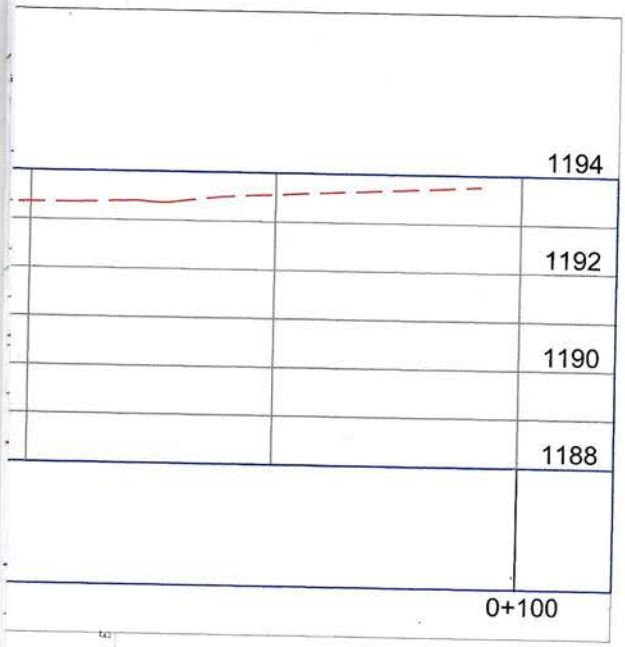

MUNICIPIO DE LA VEGA

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 - 2024

CONTRATO DE OBRA 161-2025

Localizacion:

VEREDA LA ALIANZA
SECTOR EL ROSARIO

1532

MUNICIPIO DE LA VEGA

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO

CONTRATO DE OBRA 161-2025

Localizacion:

VEREDA NAGUY ALTO
SECTOR MONTE OSCURO

1533

1322

1320

1318

1316

MUNICIPIO DE LA VEGA

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO
CONTRATO DE OBRA 161-2025

Localizacion:

VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO

ALCALDÍA DE LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

INFORME DE SUPERVISION N°2
FECHA INFORME: 31-10-2025
CONTRATO DE OBRA PUBLICA C-OBRA-No. 161-2025
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 28-08-2025 A 10-10-2025

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)
IDENTIFICACION:	NIT N° 900.976.357-7
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
IDENTIFICACION:	C.C. N° 1.019.044.913 de Bogotá D.C.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
VALOR: M/CTE.	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 436.794.579,39) M/CTE.
DURACION:	EL TERMINO DE DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE OCTUBRE DE 2025
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	
ADICION EN VALOR:	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 217.798.358,00) M/CTE
FECHA DE LA ADICION:	16 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÒN:	02 DICIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 602.872.803,02) M/CTE

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los **Artículos 83, 84 y 85** de la **Ley 1474 de 2011** y de las funciones establecidas dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal,

como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al pago No. 2 del **CONTRATO DE OBRA No. 161-2025, de fecha: 11/03/2025** en los siguientes términos:

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual:

El avance financiero y el avance de obra en la ejecución del contrato es del 100 %,

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dentro de las actividades desarrolladas en el presente contrato se encuentran actividades de:

- Conformación de la Calzada Existente
- Localización y Replanteo con Elementos de Precisión
- Demolición de Concreto Estructural (Incluye Cargue y Retiro de Sobrantes a una Distancia Máxima de 5 Km)
- Transporte de Material Provenientes de Explanación, Prestamos, Sobre Acarreos, Derrumbes, Excavación y/o Demolición
- Subbase Granular
- Excavaciones varias en material común seco a mano (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
- Concreto clase D, f´c = 3000 PSI (bases)
- Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases
- Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar
- Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI

Dichas cantidades se encuentran expresadas en la memoria de cantidades entregadas anexa a este informe, las cuales fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.


REGISTRO FOTOGRAFICO DE PROCESOS

Como soporte al registro fotográfico de actividades desarrollas del presente informe se anexa el informe de obra y registro fotográfico presentado por parte del contratista.

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707-2024

117.15 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 4.5 mts, con rampa de acceso y salida para un total de 120.15 ml de vía mejorada, según el alcance del objeto contractual en el sector, la construcción de la placa huella en mención cumple con las características y especificaciones técnicas exigidas tanto en el convenio como en el contrato, las actividades desarrolladas fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.


PLACA HUELLA CONSTRUIDA

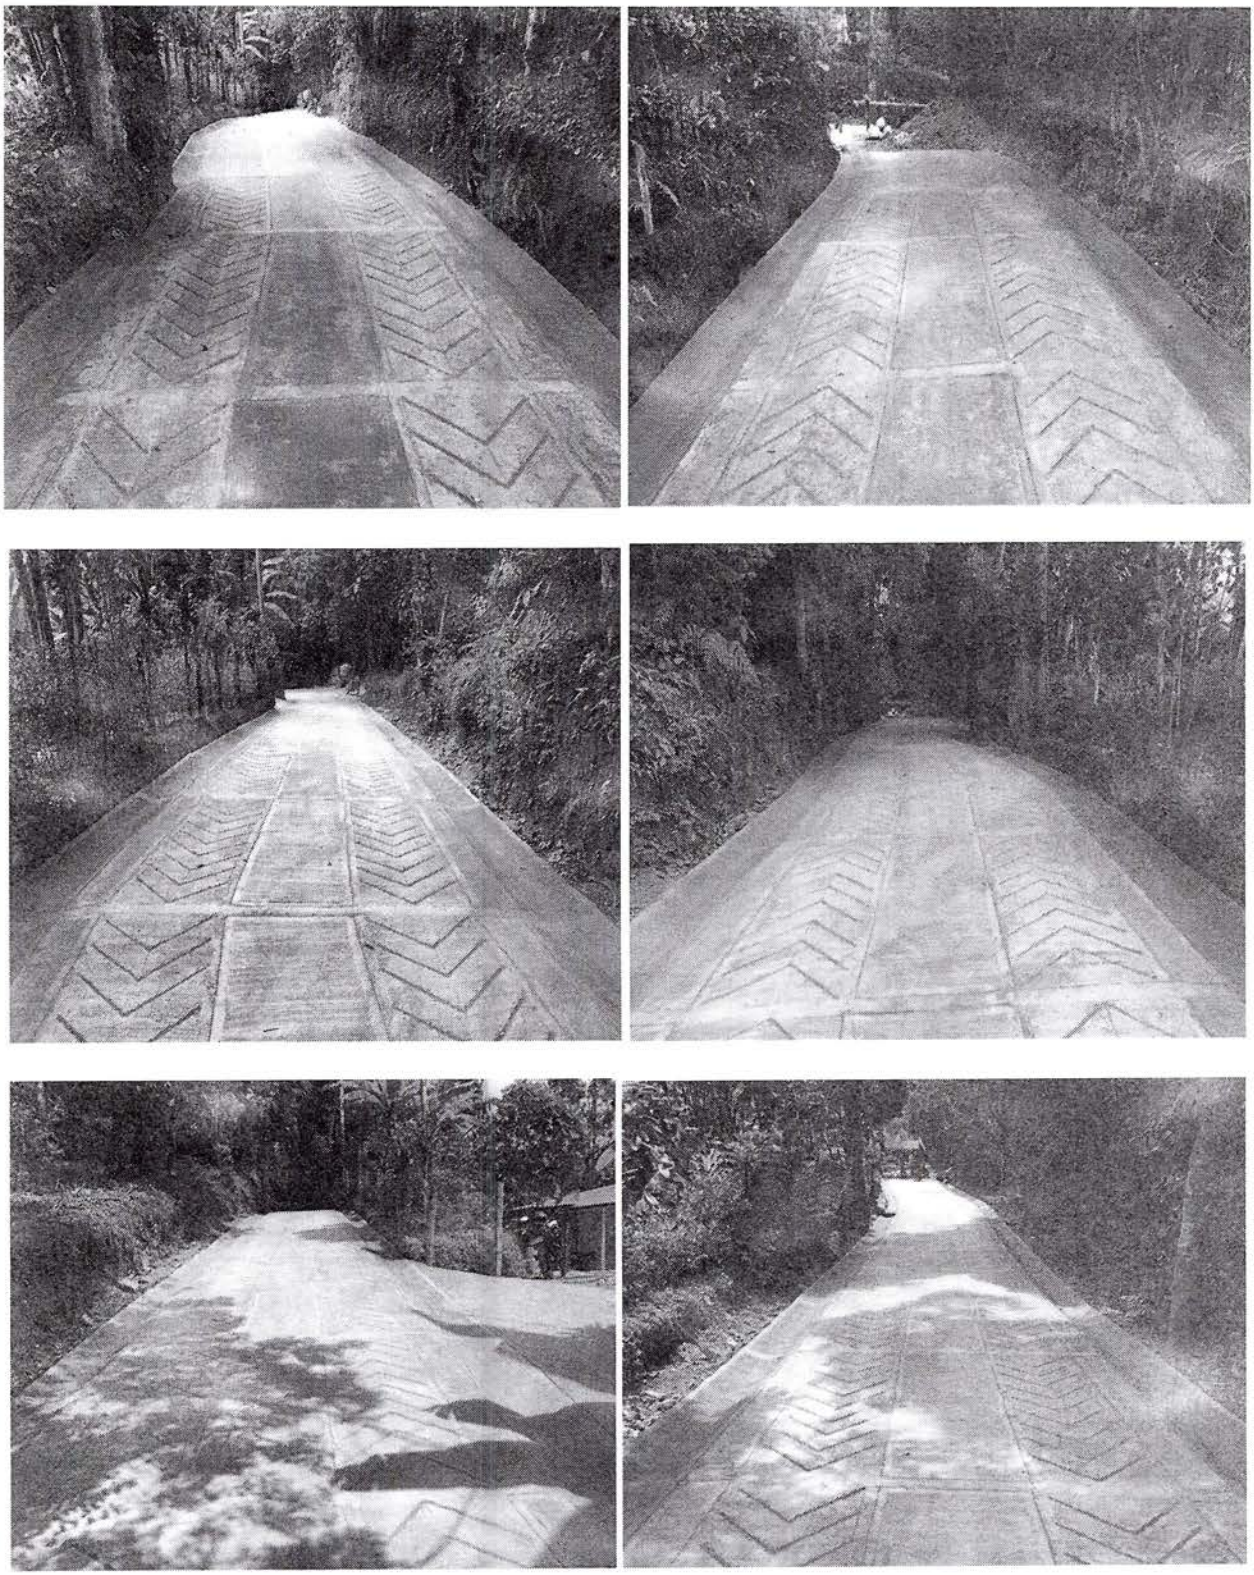


MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO 738-2024

207.15 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 5.0 mts, permitiendo el empalme con las placas huellas existentes en el sector, para un total de 207.15 ml de vía mejorada, según el alcance del objeto contractual en el sector, la construcción de la placa huella en mención cumple con las características y especificaciones técnicas exigidas tanto en el convenio como en el contrato, las actividades desarrolladas fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.



CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

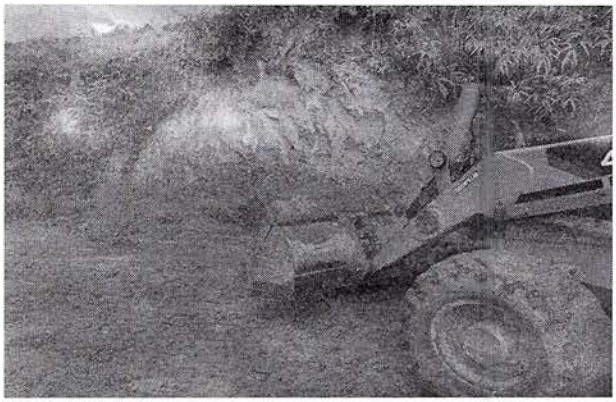




LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

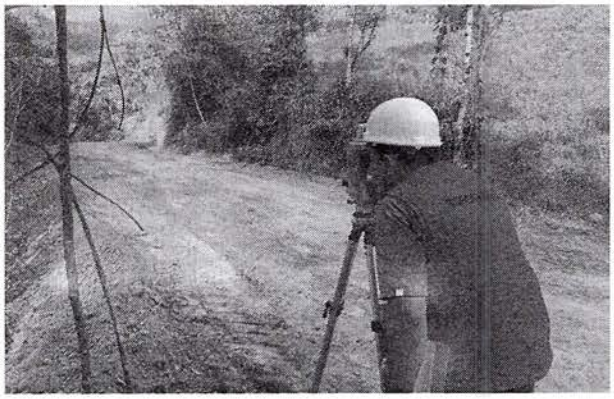


DEMOLICIÒN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM)

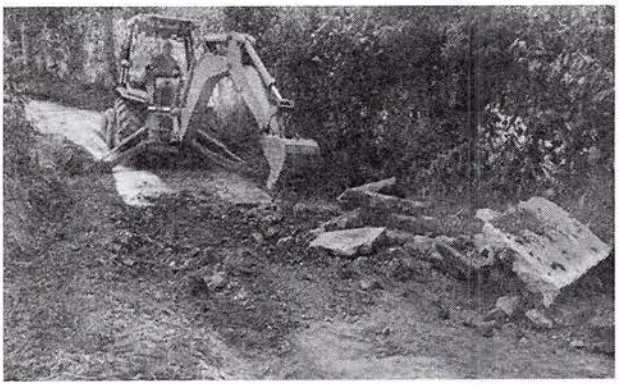
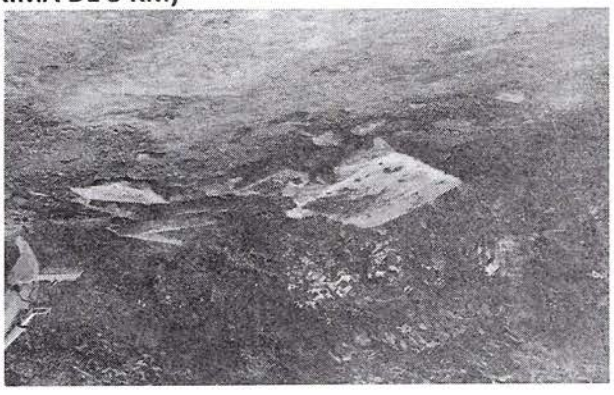
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN


SUBBASE GRANULAR

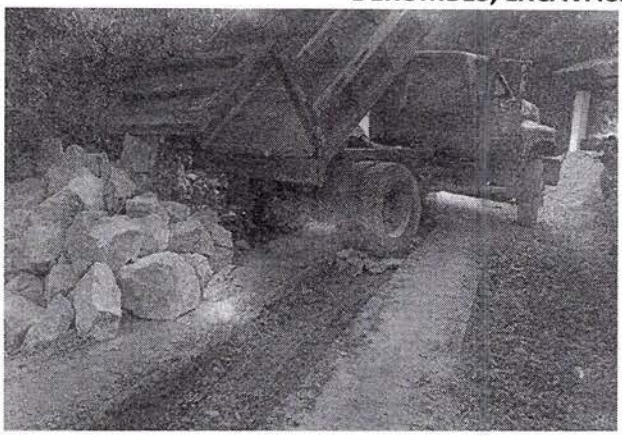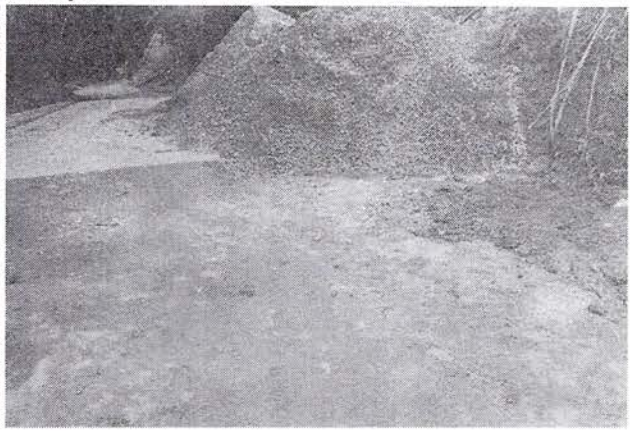



EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

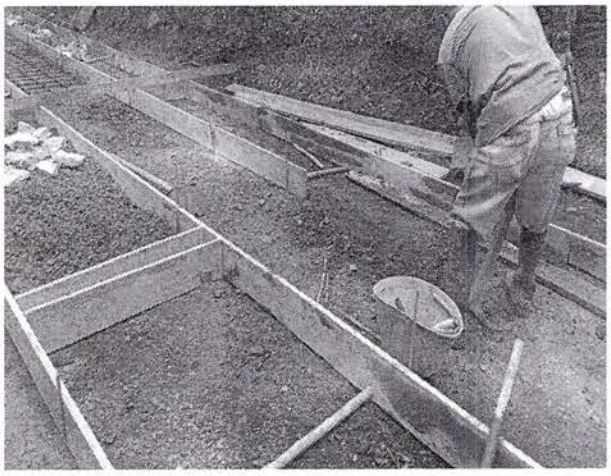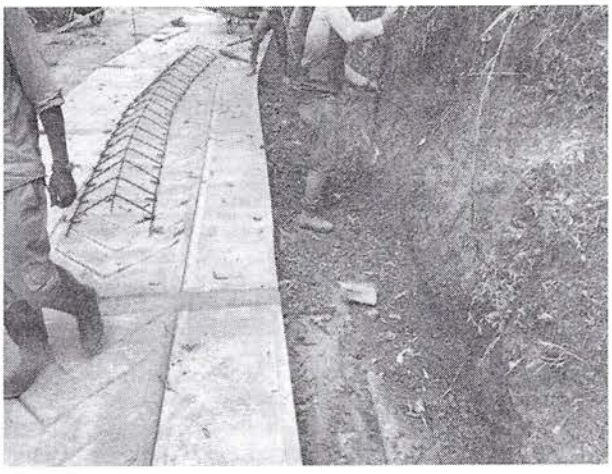



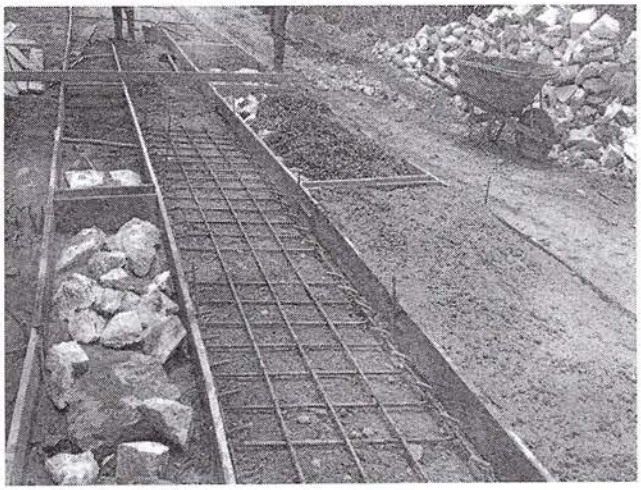
CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA BASES

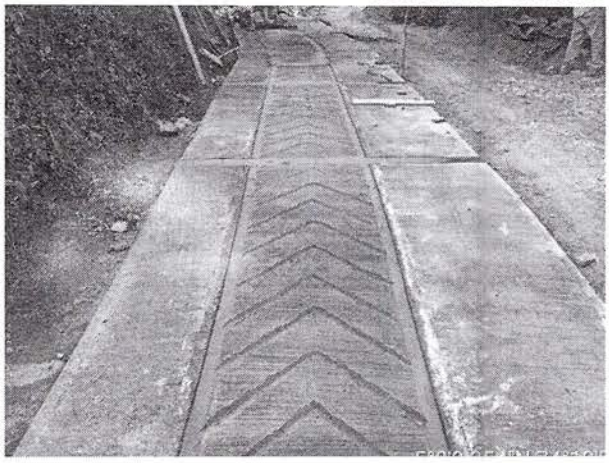

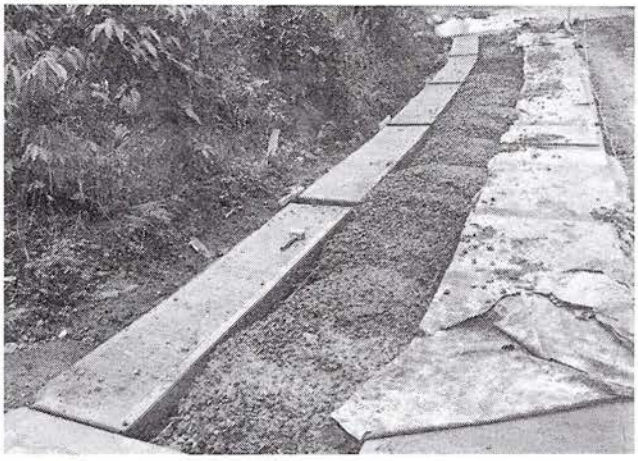



CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES

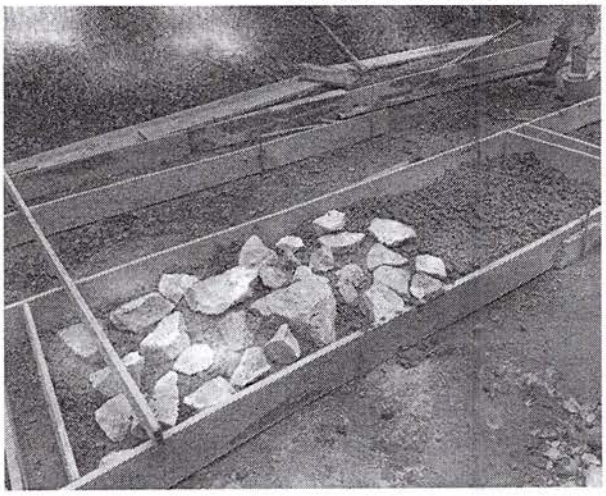









CUNETA EN CONCRETO CLASE E 2500 PSI FUNDIDA EN LUGAR

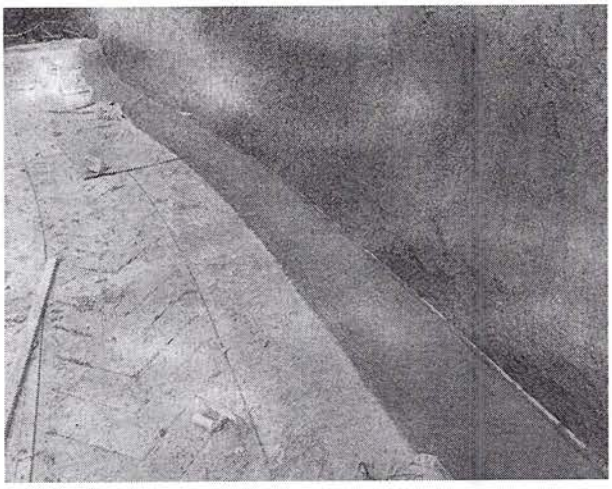

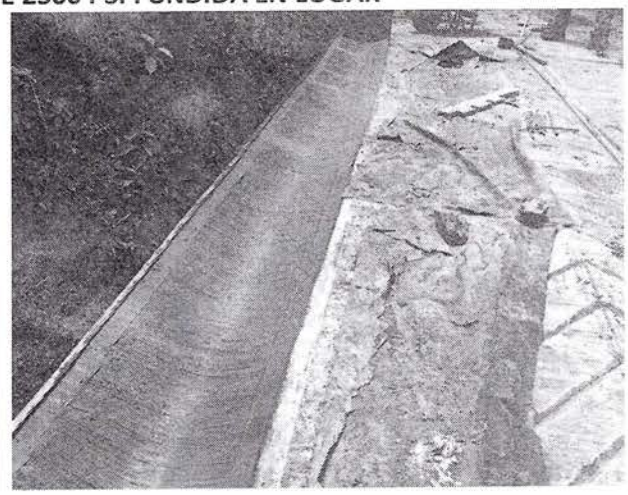


PLACA HUELLA CONSTRUIDA

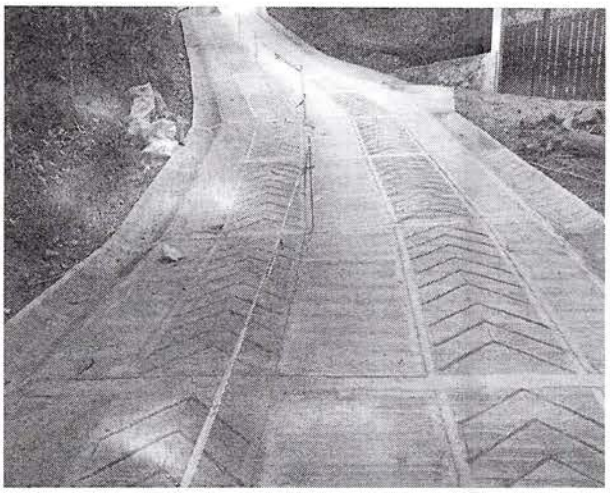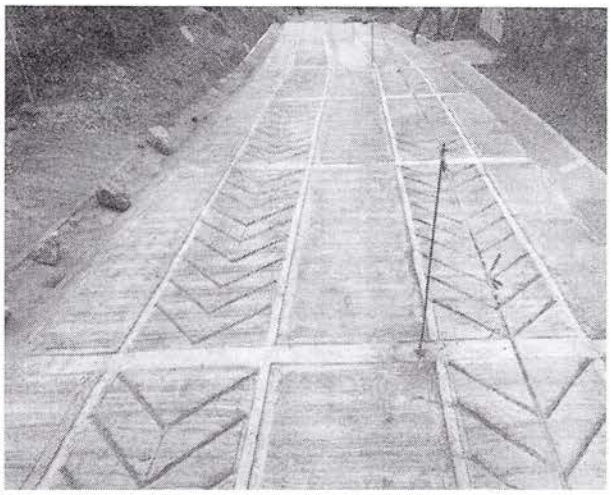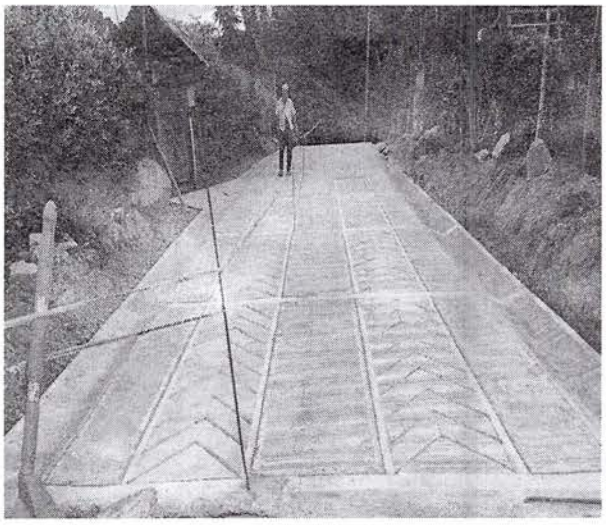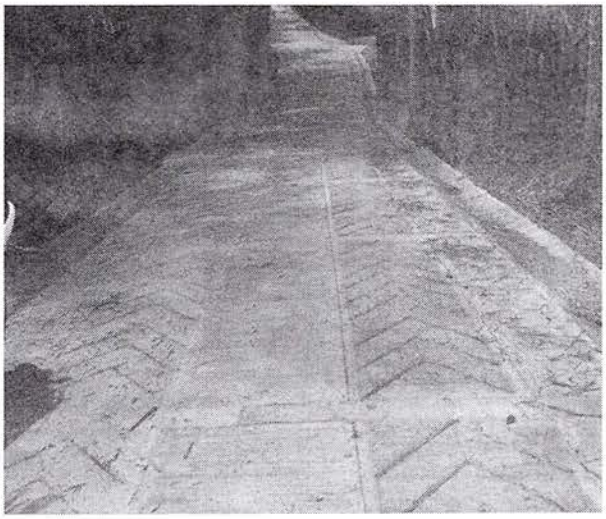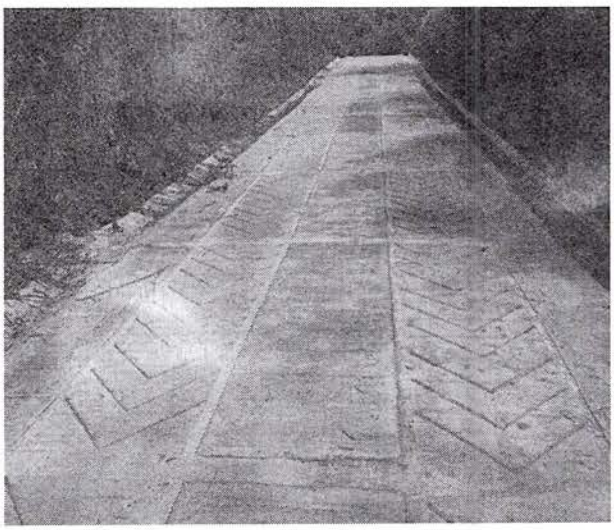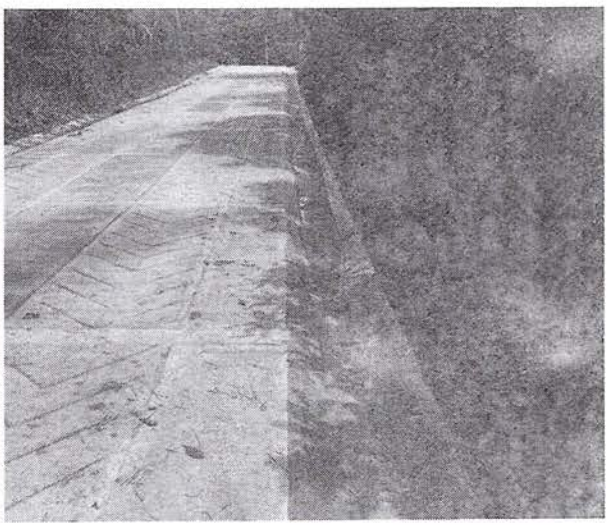







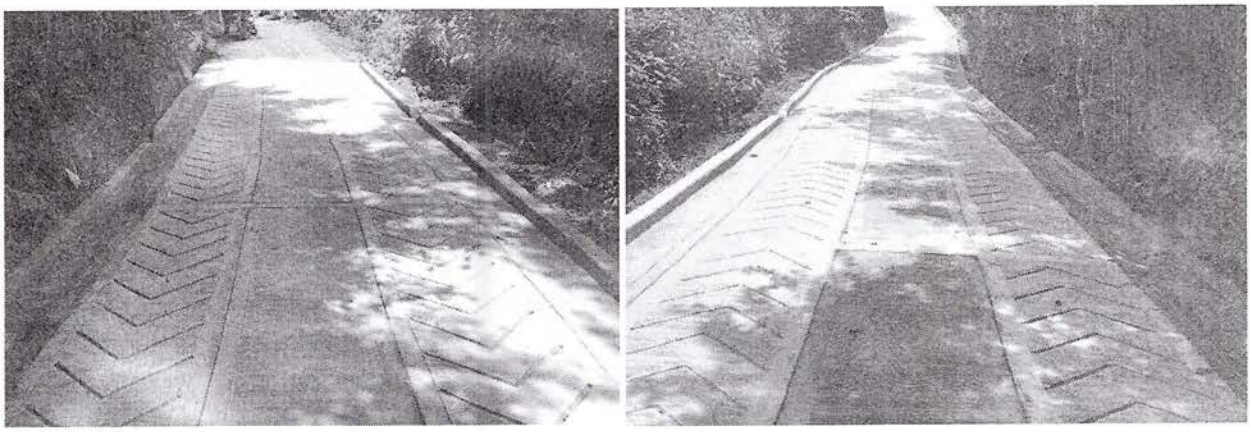
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716-2024

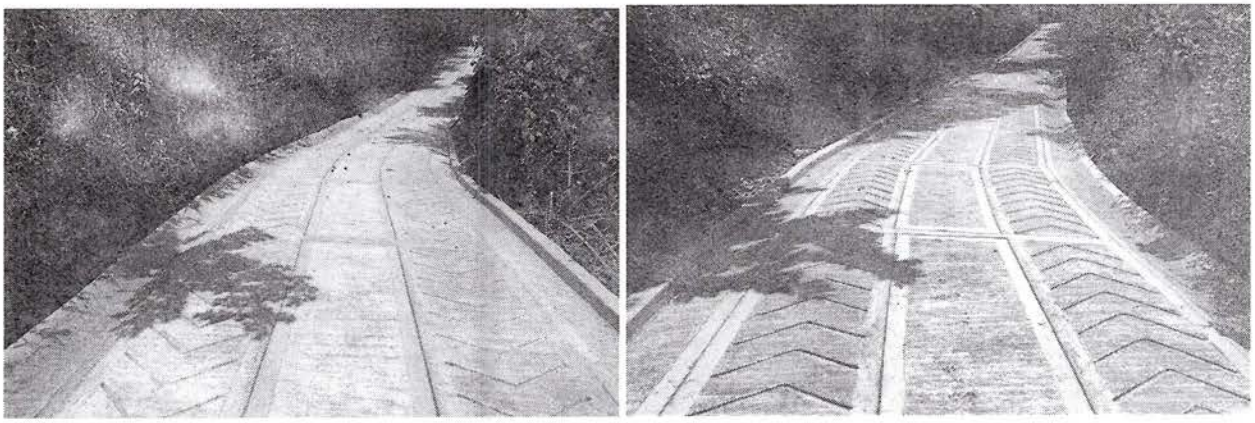147.15 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 5.0 mts, con dos rampas de acceso, para un total de 150 ml de vía mejorada, según el alcance del objeto contractual en el sector, la construcción de la placa huella en mención cumple con las características y especificaciones técnicas exigidas tanto en el convenio como en el contrato, las actividades desarrolladas fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.

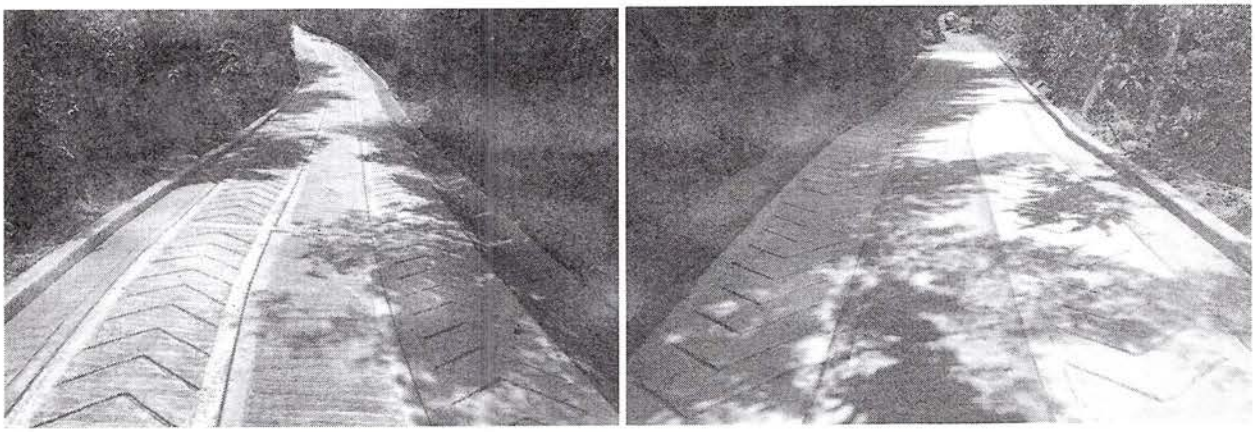PLACA HUELLA CONSTRUIDA












MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO SECTOR MONTE OSCURO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

78.15 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 5.0 mts, con una rampa de acceso, para un total de 79.65 ml de vía mejorada, según el alcance del objeto contractual en el sector, la construcción de la placa huella en mención cumple con las características y especificaciones técnicas exigidas tanto en el convenio como en el contrato, las actividades desarrolladas fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.

PLACA HUELLA CONSTRUIDA

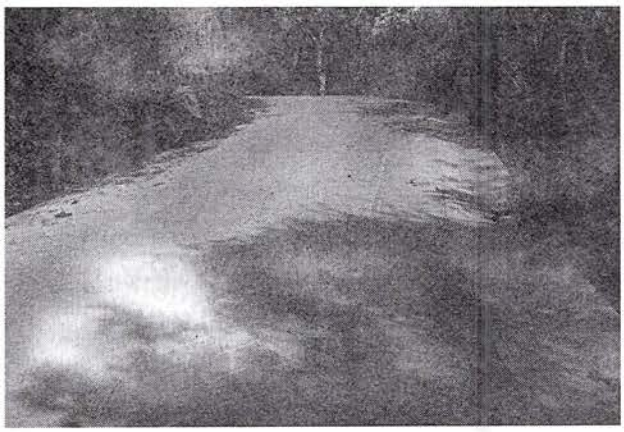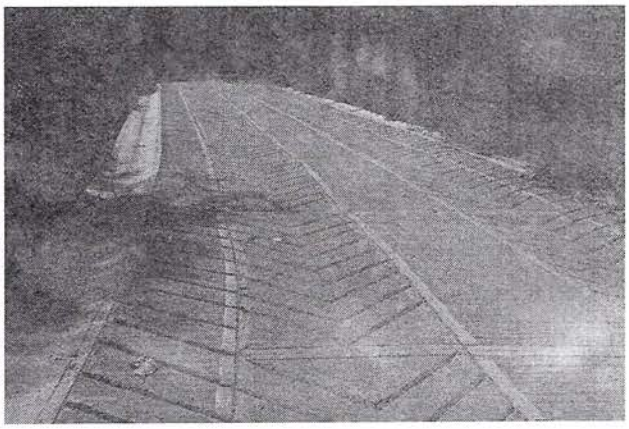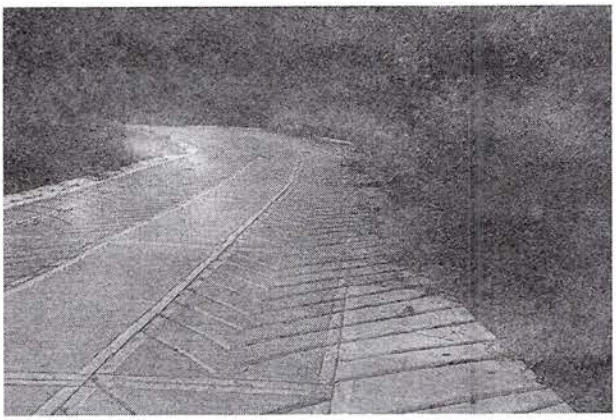MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL BAJO SECTOR EL MORO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

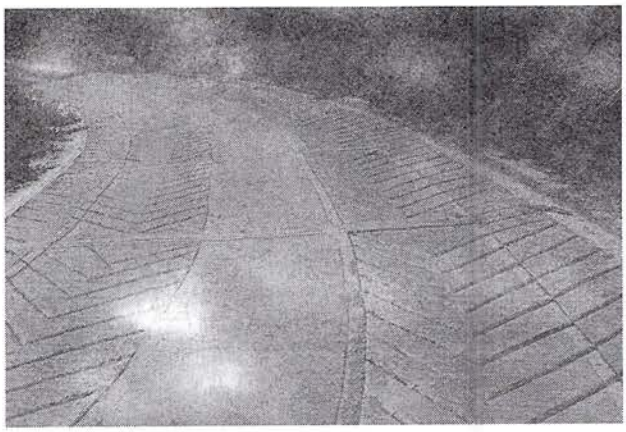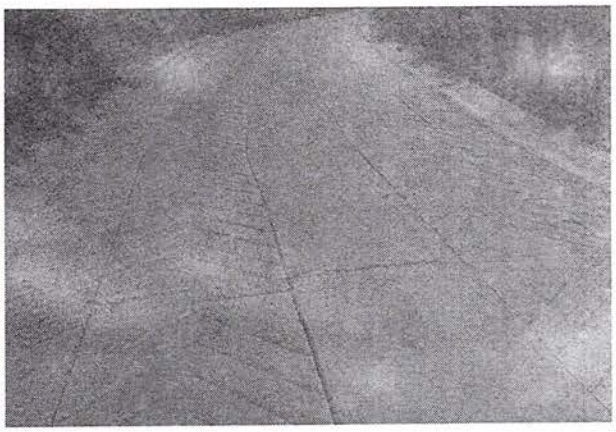30.15 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 5.0 mts, con una rampa de acceso y una de salida, para un total de 33.15 ml de vía mejorada, según el alcance del objeto contractual en el sector, la construcción de la placa huella en mención cumple con las características y especificaciones técnicas exigidas tanto en el convenio como en el contrato, las actividades desarrolladas fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.


CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE






LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO




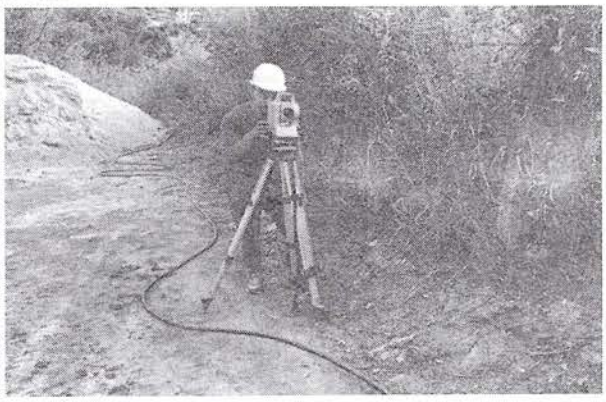


DEMOLICIÒN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM)

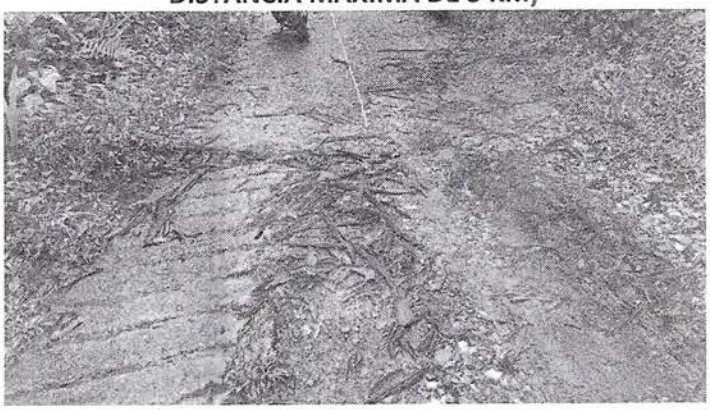


TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÒN, PRESTAMOS, COBREACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÒN Y/O DEMOLICIÒN

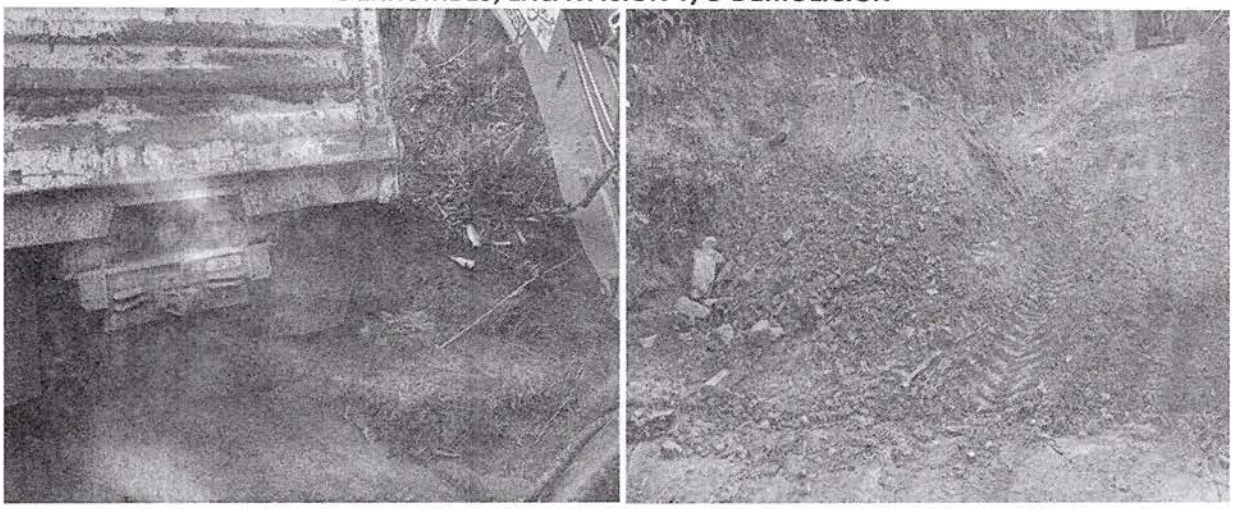


SUBBASE GRANULAR

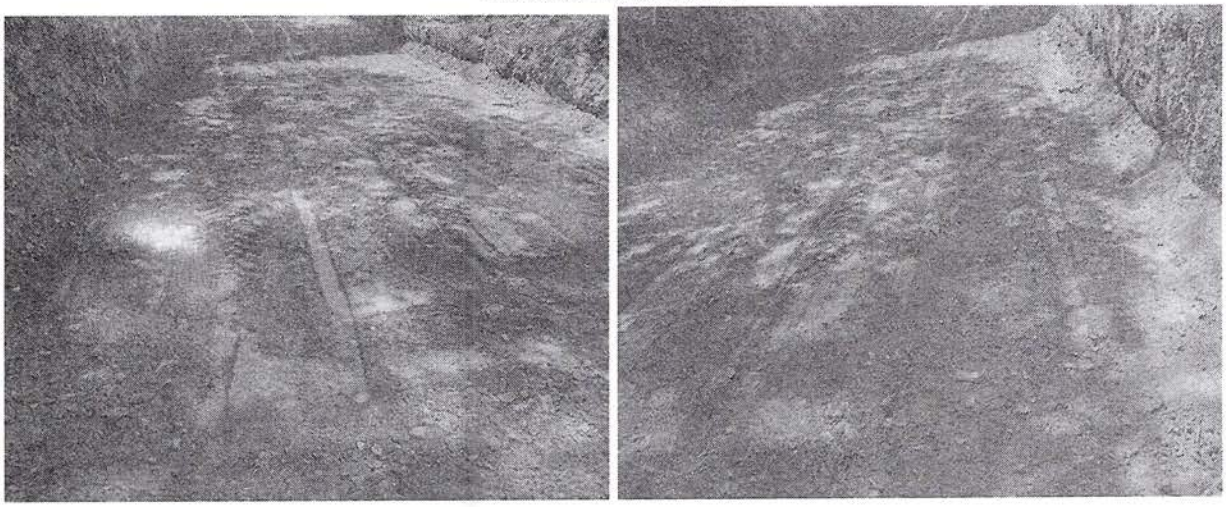


EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

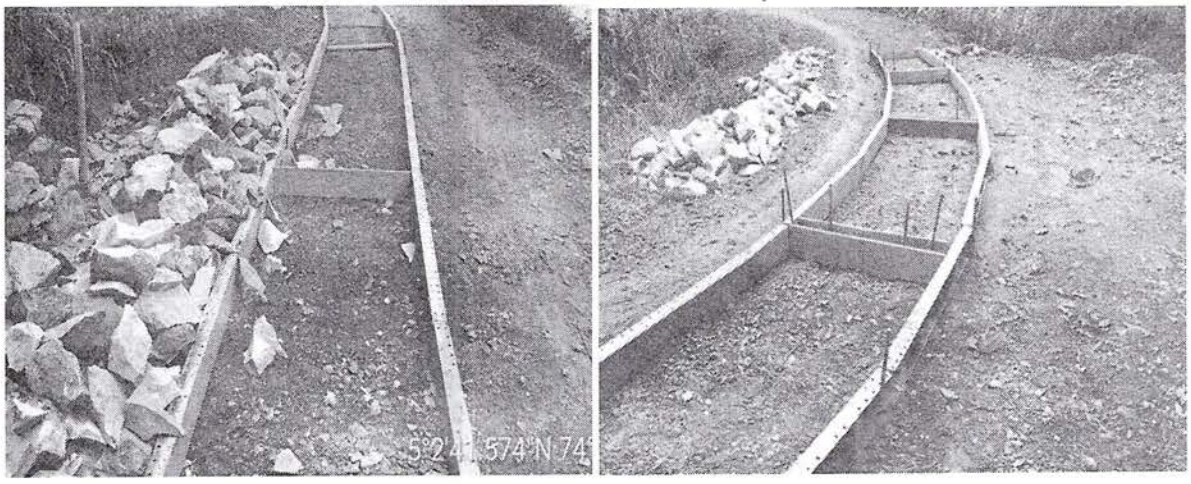



CONCRETO CLASE D, 3000 PSI PARA (BASES)

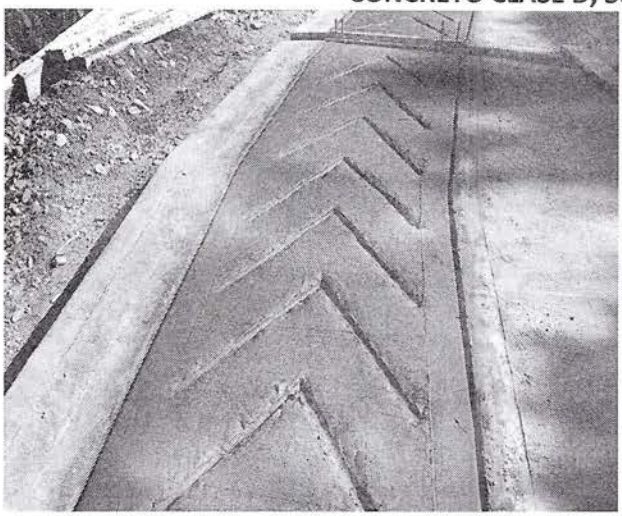

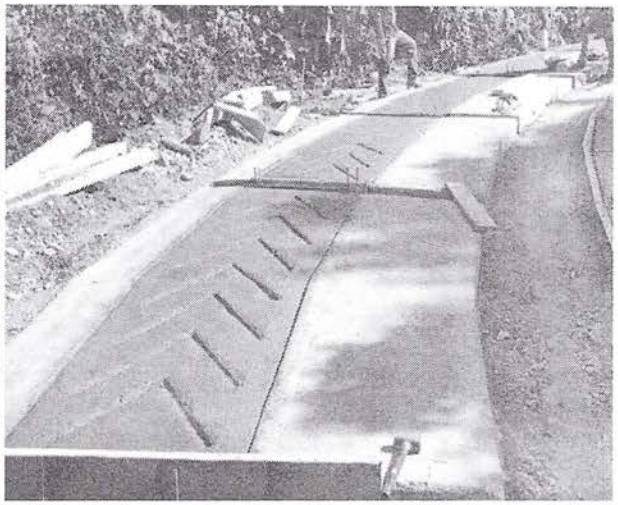



CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

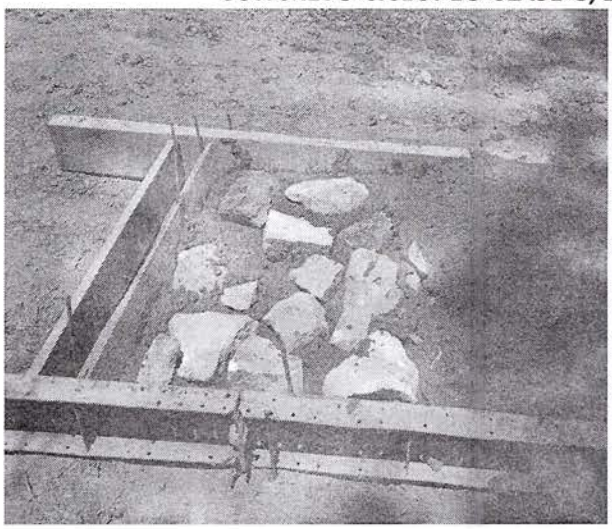

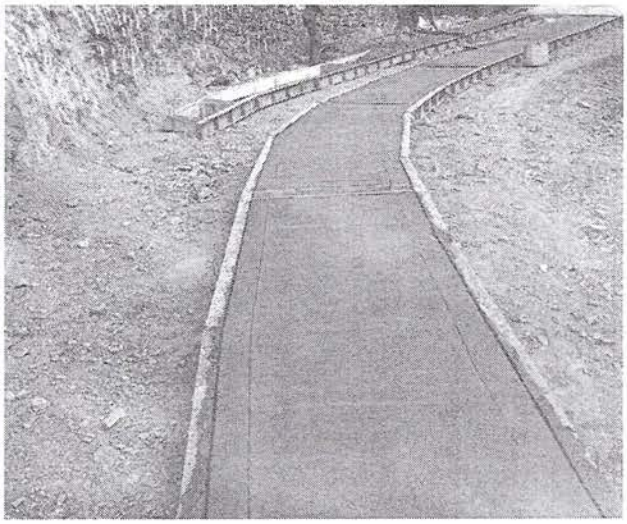


CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

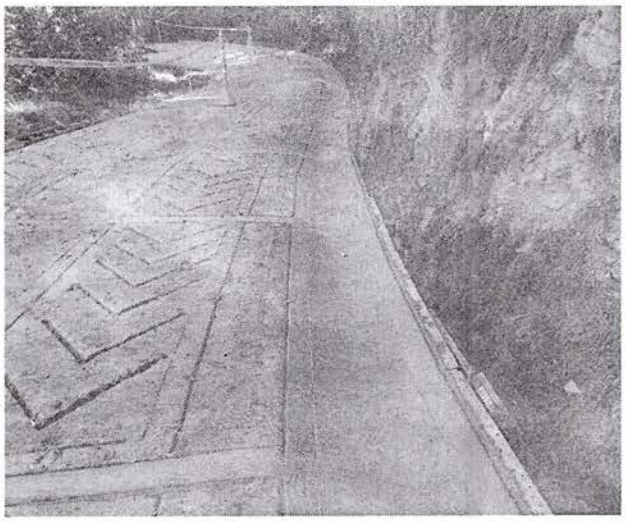

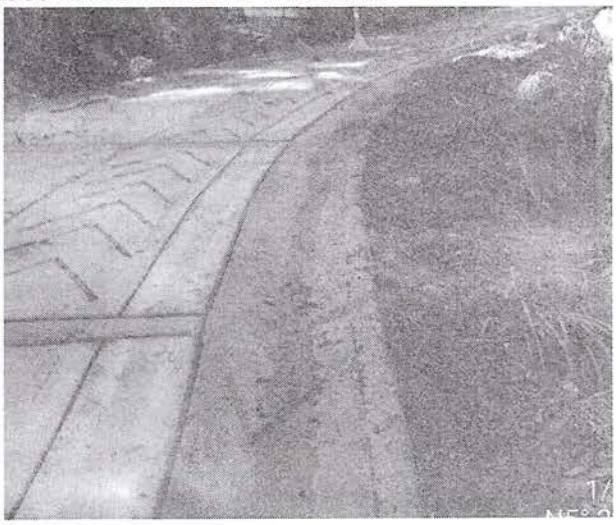

PLACA HUELLA CONSTRUIDA

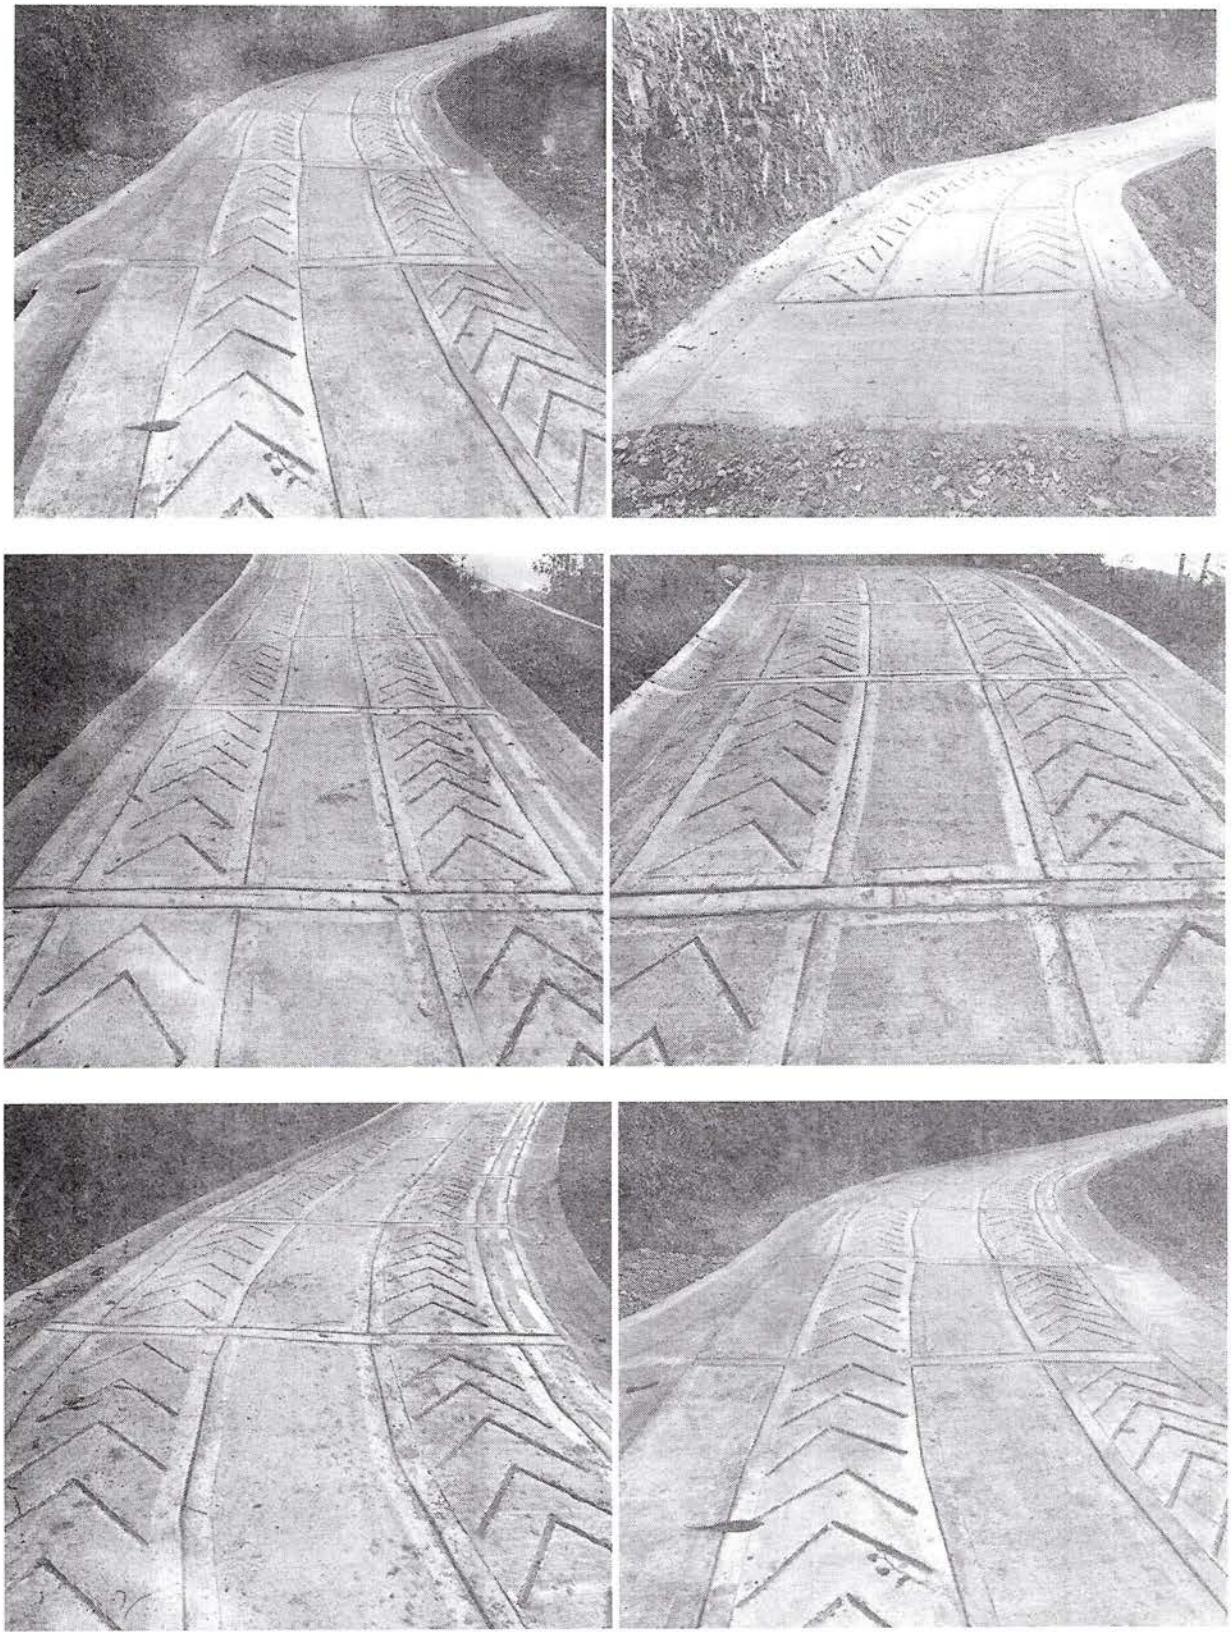

4. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance físico en la ejecución es del (100%).

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13** del **Decreto 1072 de 2015,** se procedió a verificar el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) y parafiscales correspondientes al periodo de agosto y septiembre de 2025.

El contratista aporta dentro del informe de obra la respectiva certificación de parafiscales.

6. AVANCE FINANCIERO

6. 1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2025000013 DIS-2025000014 DIS-2025000012
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025000408 RES-2025000409 RES-2025000410
REDUCCIÓN DISPONIBILIDAD	DIS-2025000052 DIS-2025000053 DIS-2025000054
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 436.794.579,39
ADICIONES	$ 217.798.358,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	DIS-2025000680
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	RES-2025000898
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 654.592.937,39**

6.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMER PAGO	27-08-2025	$ 536.442.358,00
SEGUNDO PAGO	31-10-2025	$ 52.691.285,65
LIQUIDACION	31-10-2025	$ 65.459.293,74
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 654.592.937,39**

6.3 TOTAL PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
EGR-2025000714	27-08-2025	$ 536.442.358,00
TOTAL PAGADO		**$ 536.442.358,00**

6.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 436.794.579,39
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 217.798.358,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 654.592.937,39
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 654.592.937,39
SALDO POR EJECUTAR	$ 00,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 536.442.358,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA 90%	$ 52.691.285,65
VALOR PENDIENTE A PAGAR LIQUIDACION	$ 65.459.293,74
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$00,00

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por el valor de ***CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 52.691.285,65) M/CTE***

Dado a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025.

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria de planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

Elaboro: DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

1549

La Vega Cundinamarca, 31 de octubre de 2025.

Señores
Oficina de Contratación
Alcaldía de La Vega Cundinamarca

Asunto: Entrega de Documentos Liquidación Contrato de Obra No. 161-2025

Por medio de la presente se hace entrega formal de los siguientes documentos, con el fin de adelantar el trámite de Liquidación del Contrato de Obra No. 161-2025 del contratista PROYECTOS DE INGENIERIA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING S.A.S. NIT. 900.976.357-7, representada por el señor JUAN CARLOS PINTO CHAVEZ Identificado con CC. No. 1.019.044.913 de Bogotá D.C.

Contrato No.	Nombre del Documento	Numero de Folios, medios magnéticos u otros
161-2025	Liquidación	
	Factura	03
	Rut	02
	Certificación Bancaria	02
	Resolución Facturación	03
	Cedula Representante Legal	02
	Documentos Contador	04
	Certificación Parafiscales	02
	Acta de Liquidación	04

NOTA: ***En el caso de documentos para trámite de pago debe venir una copia para entregar a la secretaria de Hacienda donde van los siguientes documentos, los cuales deben también ser relacionados en el cuadro anterior:***

- *Acta de Liquidación*
- *Factura del Contratista*
- *Soportes Seguridad Social*
- *Certificación contratista pago seguridad social*
- *Certificación Bancaria*

Atentamente,

DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
Profesional Universitario
Secretaria De Planeación E Infraestructura

FACTURA – AVANCE 100%

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1551

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
022be8f81fdb71aceda15b48e1bcc610f239397efa0d3cefb831413416382a9254288cda72971485d9edb99d1e5e7ce9

Número de Factura: AS-55
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 31/10/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
Nombre Comercial: PROYECTOS DE INGENIERIA DISE?OS CONSTRUCCIONES Y C
Nit del Emisor: 900976357
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cajicá
Dirección: VDA CHUNTAME QUINTAS DE MOLINO CA 56
Teléfono / Móvil: 031|3053678028|
Correo: ingenieros.aas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / MUNICIPIO LA VEGA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800073475
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6013056694000
Correo: alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	CONTRATO DE OBRA No. 161 DE 2025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGÚN CONVENIO ICCU 738 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGÚN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ZZ	1,00	$ 49.217.514,09	$ 0,00	$ 16.241.779,65					$ 65.459.293,74

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: CONTRATO DE OBRA CIVIL

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2025 10:42:00
Documento validado por la DIAN:
31/10/2025 10:43:06
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	49.217.514,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	16.241.779,65
Total Bruto Factura	65.459.293,74
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	65.459.293,74
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 65.459.293,74

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100901892 Rango desde: 54 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-10-31

RUT

1554

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165613644

(415)7707212489984(8020) 000014116561364 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 6 3 5 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AASING SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	La Vega 4

41. Dirección principal
CR 4 8 169 CONJ BALCONES DE SAN MARTIN TO 8 AP 202

42. Correo electrónico ingenieros.aas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 3 6 7 8 0 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 5 1 9	4 3 9 0	2 0 1 6 0 5 1 9	7 1 1 2 4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renova

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PINZON LOPEZ CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 04-03-2025 08:4 AM

CERTIFICACIÓN BANCARIA

1556

Bancolombia

Bogotá D.C, 14 de Octubre de 2025

Señores
A QUIEN CORRESPONDA Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **AASING SAS** identificado(a) con **NIT Nro. 900976357,** tiene con el Banco los Siguientes Productos:

Nombre Producto	Número	Estado	Fecha de apertura
CUENTA CORRIENTE	892-924359-20	Activa	2018/04/19

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información a la fecha, en el teléfono 4273070 de Bogotá, o en nuestra sucursal Salitre ubicada en la Calle 25 N° 68B 02.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Bogota - Of. 171 Salitre
Asesor de servicios Nº 154
Cédula Nº

Christian Julian Luna Rodriguez
Asesor Pyme
Sucursal Ciudad Salitre

10

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

1558

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764082640150

(415)7707212489984(8020) 001876408264015 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900976357	7				

11. Razón social

PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección

CR 4 8 169 CONJ BALCONES DE SAN MARTIN TO 8 AP 202

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	La Vega

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN

2024-10-31 / 04:31:21 PM

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLU

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI N

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PINZON LOPEZ CARLOS ANDRES

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1019044913 1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y

12

997. Fecha formalización 2024-10-31 16:31 1

AUTORIZADO

1559

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764082640150

(415)7707212489984(8020) 001876408264015 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900976357	7				

11. Razón social

PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	C
1	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS CR 4 8 169 CONJ BALCONES DE SAN MARTIN TO 8 AP 202	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AS	31	100	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

13

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.019.044.913
PINZON LOPEZ

APELLIDOS
CARLOS ANDRES

NOMBRES

Carlos Andrés Pinzón López

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1990
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

29-ABR-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00083521-M-1019044913-20080929 0003851334A 1 25767293

1562

DOCUMENTOS CONTADORA

16

1563

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D873B02CB172239B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VIVIANA ANDREA NAVA GRANADOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075671382 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 273257-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

1564

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.075.671.382**
NAVA GRANADOS

APELLIDOS
VIVIANA ANDREA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **22-NOV-1993**
ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

29-NOV-2011 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1534000-00359760-F-1075671382-20120203 0029149285A 1 37738364

Uso Exclusivo Rama Verificación De Datos Biográficos

1565

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

273257-T



VIVIANA ANDREA
NAVA GRANADOS
C.C. 1075671382
RES. INSCRIPCION 1403 DEL 21/08/2020
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

293900

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

307873

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

19

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

Cajicá Cundinamarca, 12 de octubre de 2025.

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

La empresa **PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS** identificada con NIT: 900.976.357-7, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones y la de sus empleados, provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002

Atentamente

VIVIANA ANDREA NAVA GRANADOS
CONTADOR PUBLICO
273257-T

2

1568

LA SUSCRITA SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que el contratista **PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS),** identificado con el NIT N° 900.976.357-7, una vez verificada la información para el trámite de pago Parcial N° 2 cumplió con el OBJETO CONTRACTUAL **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI CON LA VEREDA HOYA GRANDE SECTOR LA YE EL DESCANSO SEGÚN CONVENIO ICCU 707 – 2024, MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR EL ROSARIO SEGUN CONVENIO ICCU 738 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUY ALTO CON LA VEREDA LA HOYA GRANDE SECTOR CUATRO ESQUINAS SEGUN CONVENIO ICCU 716 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA,** durante el periodo comprendido entre el 28 de agosto del 2025 al 10 de octubre de 2025, según contrato de obra pública **C-OBRA-No. 161-2025** con los Registros Presupuestales Iniciales No. **RES-2025000408 RES-2025000409 RES-2025000410** y Registro de Adición No. **RES-2025000898.**

Que el contratista cumple con el pago de seguridad de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión y ARL) Correspondiente al periodo de agosto y septiembre de 2025.

Se expide en el municipio de La Vega Cundinamarca, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025, con destino a la Secretaria de Hacienda para el segundo pago parcial por valor de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 52.691.285,65) M/CTE**

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboro: DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
