DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	DICIEMBRE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 5432 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORIA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORIA NO.	4227 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA	NIT:	891.680.089-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.		

FECHA DE INICIO:	2 de diciembre 2024	2024S-VBOG-091015	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00		
ADICIÓN No 01	$ 52.567.320		
VALOR ACTUAL:	$ 8.752.567.320		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 4.350.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 4.350.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.0		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	(12 meses) Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA 2	(4 meses) Hasta 30 de abril de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1124124	14/11/2024	NACIÓN	10	$ 3.200.000.000	$ 3.200.000.000	$ 00
		NACIÓN	10	$ 5.500.000.000	$ 5.500.000.000	$ 00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
880125	23/12/2025	NACIÓN	10	$ 52.567.320	$ 00	$ 52.567.320

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00
Acta 2 enero 2025	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00

Acta 3 febrero 2025	$ 185.122.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00
Acta 4 marzo 2025	$ 235.568.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00
Acta 5 abril 2025	$ 114.126.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00
Acta 6 mayo 2025	$ 182.492.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00
Acta 7 junio 2025	$ 156.047.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00
Acta 8 julio 2025	$ 266.818.400,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00
Acta 9 agosto 2025	$ 1.958.563.885,74	$ 979.281.942,87	$ 979.281.942,87
Acta 10 septiembre 2025	$ 873.915.077,01	$ 349.566.030,80	$ 524.349.046,21
Acta 11 octubre 2025	$ 3.042.224.041,15	$ 1.216.889.616,46	$ 1.825.334.424,69
Acta 12 noviembre 2025	$ 947.717.873,90	$ 710.788.405,43	$ 236.929.468,48
Acta 13 diciembre 2025	$ 544.960.770,20	$ 427.164.828,44	$ 117.795.941,76

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de diciembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

% Básico programado acumulado: 99.40%
% Básico ejecutado acumulado: 99.40%

1.1.1. **ANTICIPO**

Otorgado	$4.350.000.000,00
Amortizado	$4.350.000.000,00
Saldo	$00

1.1.2. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

- Meta física programada %: 90.3%
- Meta física ejecutada %: 90.05%

1.2. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.3. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
Diciembre 2025	4

1.4. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre de 2025	5	Aprobado

1.5. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.6. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/12/20252	56	Adición No 01 y Prorroga No 02	Aprobada

1.7. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición No 01 y Prorroga No. 2 de 2025.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/12/20252

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Pendiente

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza Única a Favor de Entidades Estatales NOMBRE: Aseguradora Previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 875.256.732	3002762 Anexo 6 – Adición No 01 Prórroga No 02	22/12/2025	01/11/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 4.376.283.660		22/12/2025	01/11/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.750.513.464		22/12/2025	01/05/2029
Calidad	$ 2.625.770.196		30/04/2026	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

1.8. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4262 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC	NIT:	891.800.330-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA		

FECHA DE INICIO:	2 de diciembre de 2024	2024S-VBOG-087817	
VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00		
VALOR ADICION No 01	$ 48.037.920		
VALOR ACTUAL:	$ 2.423.037.920,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.187.500.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.187.500.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.0		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	(12 meses) Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA 2:	(4 meses) Hasta 30 de abril de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1124024	14/11/2024	NACIÓN	10	$2.300.000.000	$2.300.000.000	$00
		NACIÓN	10	$75.000.000	$75.000.000	$00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
877425	23/12/2025	NACIÓN	10	$48.037.920	$00	$48.037.920

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200	$ 22.611.200
Acta 2 enero 2025	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00
Acta 3 febrero 2025	$ 84.109.000,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00
Acta 4 marzo 2025	$ 114.346.000,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00
Acta 5 abril 2025	$ 35.970.200,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00

Acta 6 mayo 2025	$ 51.962.000,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00
Acta 7 junio 2025	$ 64.694.419,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50
Acta 8 julio 2025	$ 148.418.477,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50
Acta 9 agosto 2025	$ 576.278.477,00	$ 288.139.238,50	$ 288.139.238,50
Acta 10 septiembre 2025	$ 199.284.477,00	$ 99.642.238,50	$ 99.642.238,50
Acta 11 octubre 2025	$ 555.044.796,00	$ 55.504.479,60	$ 499.540.316,40
Acta 12 noviembre 2025	$ 365.227.477,00	$ 346.966.103,15	$ 18.261.373,85
Acta 13 diciembre 2025	$ 128.282.477,00	$ 121.806.792,25	$ 6.475.684,75

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
04/12/2025	4

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/12/2025	56	Adición No 01 y Prorroga No 02	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS Berkley International Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 242.303.792,00	83183 Anexo 5– Según Adición 1 Prorroga 2	12/11/2024	30/10/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.211.518.960,00		12/11/2024	30/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 484.607.584,00		12/11/2024	30/04/2029
Calidad del Servicio	$ 726.911.376,00		12/11/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición No.1 Prorroga No. 2 de 2025

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/12/2025.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Pendiente

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Para el presente periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Componente Técnico:

Durante el período evaluado (08 al 20 de diciembre de 2025), la Consultoría, con acompañamiento de la Interventoría y supervisión del Instituto Nacional de Vías, desarrolló actividades técnicas en campo correspondientes a los componentes de topografía, georreferenciación, fotogrametría y nivelación, abarcando los Tramos 2, 3, 4 y 5 del corredor vial objeto de estudio.

Levantamiento Topográfico y Poligonal

Se ejecutó el levantamiento y cierre de poligonales en los diferentes tramos del proyecto, incluyendo:

- Finalización del Tramo No. 5 e inicio y cierre del Tramo No. 4.
- Levantamientos complementarios en el Tramo No. 3.
- Verificación y repetición de levantamientos en sectores específicos mediante equipos RTK y estación total, debido a interferencias por vegetación y condiciones climáticas.
- Corrección e instalación de nuevos mojones para puntos GPS y poligonal en los Tramos 2 y 3, garantizando precisión y estabilidad en los puntos de control.

Estas actividades permitieron consolidar la estructura geométrica base del corredor y asegurar la confiabilidad de la información planimétrica.

Georreferenciación con Equipos GPS

Se desarrolló la georreferenciación progresiva de los tramos mediante la instalación y operación de pares de equipos GPS, tomando como referencia puntos previamente establecidos (GPS 16 al GPS 4), cubriendo la totalidad del proyecto desde el K 96+890 hasta el K 60+100 aproximadamente.

Se georreferenciaron longitudes parciales sucesivas hasta completar la totalidad del corredor, incluyendo sectores como el corregimiento de La Italia, San Pedro de Ingará y la vereda El Socorro, garantizando continuidad y amarre geodésico del proyecto.

Fotogrametría y Control de Vuelo con Dron

Se realizaron actividades de:

- Marcación de puntos de control terrestre (GCP) en los Tramos 2, 3 y 4.
- Ejecución de vuelos fotogramétricos con dron para captura de información altimétrica y generación de modelos digitales del terreno.
- Complementación de información obtenida en tierra con datos de alta precisión aérea.

Con estas actividades se logró consolidar el modelo tridimensional (3D) del terreno como insumo fundamental para los diseños geométricos y demás estudios técnicos.

Nivelación y Contra Nivelación

Se ejecutaron actividades de nivelación y contra nivelación en:

- Tramo No. 4 (K 89+000 al K 84+790).
- Tramo No. 2 (K 60+100 al K 67+070).
- Tramo No. 3, mediante trabajo simultáneo de equipos hasta empalmar con el punto auxiliar en el K 67+070.

Estas labores permitieron validar cierres altimétricos, garantizar precisión en las cotas y consolidar el perfil longitudinal del corredor.

Condiciones Operativas y Ajustes Técnicos

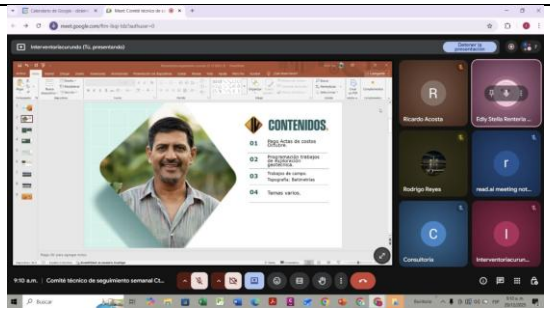
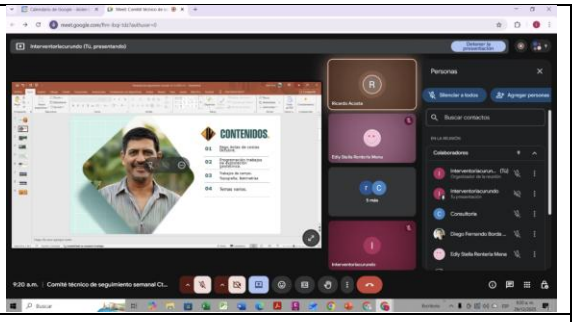
Las actividades en campo se desarrollaron bajo condiciones climáticas adversas (lluvia y neblina), propias de la temporada invernal, así como limitaciones por obstrucción de mojones debido a vegetación. Esto implicó:

- Limpieza y verificación adicional de puntos.
- Repetición de levantamientos en sectores donde la señal RTK presentó interferencias.
- Ajustes metodológicos para asegurar la calidad y precisión de la información.

REGITRO FOTOGRAFICO

	
Toma de topografía tramos 3 y 2	Toma de topografía tramos 3 y 2

	
Toma de topografía tramos 3 y 2	Toma de topografía tramos 3 y 2
	
Toma de topografía tramos 3 y 2	Toma de topografía tramos 3 y 2
	
Toma de topografía tramos 3 y 2	Instalación de mojones base

	
Comité de seguimiento semanal 29-12-2025	Comité de seguimiento semanal 29-12-2025

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

En este periodo no se presentaron aspectos jurídicos.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

-El trámite acta de costo del mes de diciembre de 2025
-El trámite de la Adición No 01 y Prorroga No 02 de 2025

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No hay comisiones que reportar en el periodo.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No hay reporte para el presente periodo.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato
