
Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Texto4	Texto2	Costo
1			**Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la carrera 3 No 10-27 de Bogotá D.C, de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño**	**66 días**	**lun 19/01/26**	**sáb 18/04/26**				**$ 332,547,564.00**
2		**1**	**PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 19/01/26**	**vie 23/01/26**				**$ 1,930,086.42**
3		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 19/01/26**	**vie 23/01/26**				**$ 1,930,086.42**
4		1.1.1	CLAUSURA TEMPORAL DE ALGUNOS SECTORES CON CINTA DE PRECAUCIÓN Y CERRAMIENTO EN YUTE VERDE.	5 días	lun 19/01/26	vie 23/01/26		un	1.00	$ 1,930,086.42
5		**2**	**ANDAMIAJE**	**59 días**	**lun 26/01/26**	**jue 16/04/26**				$ 64,645,251.50
6		**2.1**	**ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO**	**59 días**	**lun 26/01/26**	**jue 16/04/26**				**$ 64,645,251.50**
7		2.1.1	ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra) duplicado	58 días	lun 26/01/26	mié 15/04/26	4	kg	8000.00	$ 52,645,920.00
8		2.1.2	TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO IDA Y VUELTA	6 días	lun 26/01/26	jue 16/04/26	4	kg	8000.00	$ 3,076,640.00
9		2.1.3	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS	55 días	mié 28/01/26	mar 14/04/26	7CC+2 días	mes	3.00	$ 8,922,691.50
10		**3**	**OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS**	**55 días**	**vie 30/01/26**	**jue 16/04/26**				$ 200,500,244.32
11		**3.1**	**APUNTALAMIENTO Y SOBRECUBIERTA**	**55 días**	**vie 30/01/26**	**jue 16/04/26**				**$ 200,500,244.32**
12		3.1.1	ESTRUCTURA SOBRE CUBIERTA, INCLUYE PASARELA	52 días	vie 30/01/26	lun 13/04/26	8CC+4 días	m2	490.00	$ 132,504,506.40
13		3.1.2	SOBRE CUBIERTA INCLUYE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	35 días	vie 27/02/26	jue 16/04/26	12CC+20 días	m2	490.00	$ 62,725,654.60
14		3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TEMPORAL EN GUADUA PARA ACCESO A SOBRECUBIERTA	5 días	mié 4/02/26	mar 10/02/26	12CC+3 días	un	2.00	$ 5,270,083.32
15		**4**	**COMPLEMENTARIAS**	**54 días**	**mar 3/02/26**	**vie 17/04/26**				$ 51,512,389.88
16		**4.1**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**	**54 días**	**mar 3/02/26**	**vie 17/04/26**				**$ 51,512,389.88**
17		4.1.1	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80% FILTRACIÓN UV.	10 días	lun 9/02/26	vie 20/02/26	7CC+10 días	m2	9.00	$ 3,520,289.88
18		4.1.2	EMBOQUILLADO EN MORTERO 1:4 Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 2 BLANCO PARA SELLAR PASANTES EN CIELORASOS. D: 20 cm.	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	13FC-4 días	un	45.00	$ 2,771,749.80
19		4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 6 PARA PROTECCIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	20 días	mar 3/02/26	lun 2/03/26	12CC+2 días	m2	490.00	$ 23,720,988.20
20		4.1.4	LIMPIEZA CON VIRUTA DE ACERO Y APLICACIÓN DE ACEITE DE LINAZA PARA HIDRATACIÓN DE ELEMENTOS EN GUADUA D:10-12 CM	30 días	mié 11/02/26	mar 24/03/26	14	ml	900.00	$ 21,499,362.00
21		**5**	**ASEO DE OBRA**	**56 días**	**vie 30/01/26**	**sáb 18/04/26**				$ 13,959,591.88
22		**5.1**	**ASEO GENERAL DE OBRA**	**56 días**	**vie 30/01/26**	**sáb 18/04/26**				**$ 13,959,591.88**
23		5.1.1	ASEO DURANTE OBRA	50 días	vie 30/01/26	jue 9/04/26	12CC	mes	3.00	$ 7,277,373.84
24		5.1.2	ASEO FINAL DE OBRA	6 días	vie 10/04/26	sáb 18/04/26	23	m2	490.00	$ 6,682,218.04

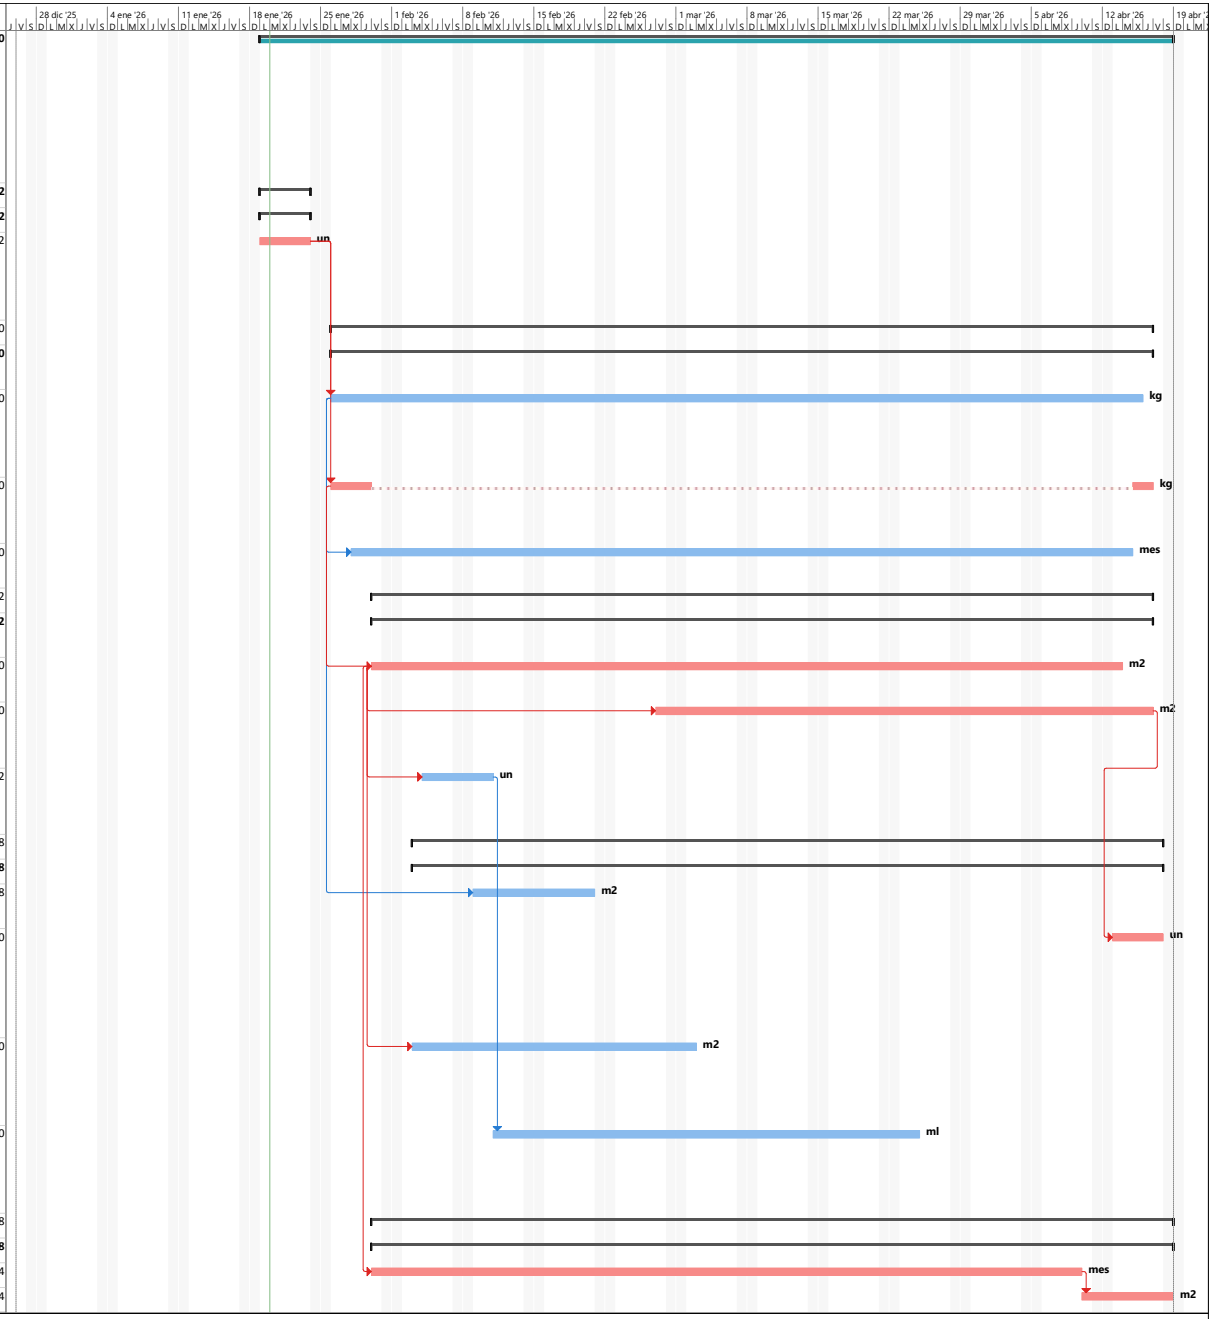

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: mar 20/01/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual
