CLINICA GIRON E.S.E.		
CLÍNICA GIRÓN	**ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO**	

DATOS DEL CONTRATO		
ACTA DE EJECUCIÓN No.:	2	
FECHA DEL ACTA:	09/02/2026	
N° DE CONTRATO	CP SC-002-2025	
CONTRATANTE:	CLINICA DE GIRON E.S.E	
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA CLÍNICA GIRON E.S.E DEL MUNICIPIO DE GIRON.	
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO GIRON E.S.E 2025
	C.C/NIT	902.014.657 -1
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLOS
	C.C/NIT	1.075.226.305 de Neiva.
SUPERVISOR	NOMBRE:	MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS
	CARGO:	SUPERVISOR
INTERVENTOR:	NOMBRE:	ENLACE CONSULTOR
	C.C/NIT	901686261-8
VALOR INICIAL:	$ 504.066.947,1 COP	
VALOR ADICIONAL:	$ 0	
VALOR TOTAL:	$ 504.066.947,1 COP	
ANTICIPO (30%)	N/A	
PLAZO INICIAL	23 DÍAS	
PLAZO ADICIONAL	2 MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2026	
MUNICIPIO:	GIRÓN	

GARANTIAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS BOLIVAR	Cumplimiento	B-100072134.	04/12/2025	28/02/2026	$ 100.813.389,42
SEGUROS BOLIVAR	Prestaciones sociales	B-100072134.	04/12/2025	28/02/2026	$ 50.406.694,71
SEGUROS BOLIVAR	Calidad del servicio	B-100072134.	04/12/2025	28/02/2026	$ 50.406.694,71

Powered by CamScanner

SEGUROS BOLIVAR	Estabilidad de la obra	B-100072134.	04/12/2025	28/02/2026	$ 151.220.084,13
SEGUROS BOLIVAR	Amparo básico- Predios, labores y operaciones	B-100019990	04/12/2025	28/02/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS BOLIVAR	Patronal	B-100019990	04/12/2025	28/02/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS BOLIVAR	Contratistas y subcontratistas	B-100019990	04/12/2025	28/02/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS BOLIVAR	Vehículos propios y no propios	B-100019990	04/12/2025	28/02/2026	$ 284.700.000,00

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO DE COBRO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 06 DE FEBRERO DE 2026
VALOR A COBRAR	CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO COMA CINCO MILLONES DE PESOS. ($115.130.285,5)

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Girón, se reunieron **MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS** quien actúa en nombre y representación de la **ESE CLINICA DE GIRON** en calidad de **CONTRATANTE**, y por la otra **MARLON FABIAN LOPEZ DURAN** quien actúa en nombre y representación de **ENLACE CONSULTOR** como interventor, y por la otra **CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLOS** quien actúa en nombre y representación del **CONSORCIO GIRON ESE 2025** en calidad de contratista de obra, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

3. El contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el interventor.

4. El interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$ 115.130.285,5
Valor IVA:	N/A
Saldo por ejecutar	$ 344.119.625,5

Powered by CamScanner

CLINICA GIRON E.S.E.		
CLÍNICA GIRÓN	**ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO**	

Valor bruto ejecutado a pagar	**$ 115.130.285,58**

Se firma en Girón a los nueve (09) días del mes de febrero de 2026.

MARLON FABIAN LOPEZ DURAN
R.L ENLACE CONSULTOR
Interventor

CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLOS
R.L CONSORCIO GIRON ESE 2025
Contratista

MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS
Gerencia ESE Clínica de Girón

Powered by CamScanner

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA E.S.E CLINICA DE GIRÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 504.066.947,1	VALOR ADICIONAL:	N/A		VALOR TOTAL:	$ 504.066.947,10	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	31,73%

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No.1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1. PRELIMINARES											
1.01	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M (NO INCLUYE RETIRO)	M2	203,06	$ 12.934,00	$ 2.626.378,11	130,57	$ 1.688.795,01	22,79	$ 294.716,72	130,57	$ 1.688.743,28
1.04	DEMOLICION PLACA MACIZA E:0,15M (NO INCLUYE RETIRO)	M2	136,55	$ 38.345,00	$ 5.236.009,75	182,06	$ 6.980.975,67	50,78	$ 1.947.044,07	182,06	$ 6.980.975,67
1.05	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,2M	M2	22,08	$ 3.085,00	$ 68.116,80	46,98	$ 144.933,30	25,20	$ 77.742,00	46,98	$ 144.933,30
1.06	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (NO INCLUYE RETIRO)	UND	18,00	$ 20.975,00	$ 377.550,00	15,00	$ 314.625,00	0,00	$ -	15,00	$ 314.625,00
1.07	DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO (NO INCLUYE RETIRO)	M2	250,70	$ 12.120,00	$ 3.038.484,00	214,74	$ 2.602.624,56	0,00	$ -	214,74	$ 2.602.624,56
1.08	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UND	15,00	$ 21.349,00	$ 320.235,00	18,00	$ 384.282,00	3,00	$ 64.047,00	18,00	$ 384.282,00
1.09	DESMONTE VENTANAS	M2	16,08	$ 18.858,00	$ 303.236,64	14,95	$ 282.010,08	0,00	$ -	14,95	$ 282.010,08
1.10	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25M	M2	5,78	$ 22.630,00	$ 130.801,40	16,22	$ 367.040,50	11,64	$ 263.413,20	16,22	$ 367.040,50
1.11	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE	UND	23,00	$ 5.552,00	$ 127.696,00	23,00	$ 127.696,00	0,00	$ -	23,00	$ 127.696,00
1.12	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 18 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	61,00	$ 84.845,00	$ 5.175.545,00	94,08	$ 7.982.291,16	35,17	$ 2.984.343,71	94,08	$ 7.982.291,16
SUB TOTAL					**$ 21.705.957,97**		**$ 22.972.651,66**		**$ 5.631.306,69**		**$ 22.972.590,18**
2. MUROS, REVOQUES Y REPELLOS											
2.01	MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12M	M2	10,68	$ 62.920,00	$ 671.671,00	35,95	$ 2.262.099,84	25,83	$ 1.625.223,60	35,95	$ 2.261.974,00
2.02	ACERO FIGURADO 37000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	1725,35	$ 6.751,00	$ 11.647.837,85	1868,69	$ 12.615.526,19	201,78	$ 1.362.216,78	1.868,69	$ 12.615.526,19
2.03	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	164,14	$ 8.155,00	$ 1.338.561,70	164,14	$ 1.338.561,70	147,20	$ 1.200.416,00	147,20	$ 1.200.416,00
2.04	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	420,46	$ 9.269,00	$ 3.897.243,74	380,35	$ 3.525.464,15	22,00	$ 203.918,00	380,15	$ 3.523.610,35
2.05	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	691,61	$ 11.749,00	$ 8.125.725,89	691,61	$ 8.125.701,22	270,57	$ 3.178.966,43	691,60	$ 8.125.647,90
2.06	MEDIA CAÑA EN GRANITO ALTURA 9 CM (PISO - PARED), INCLUYE DILACIONES	ML	67,18	$ 64.554,00	$ 4.336.737,72	67,18	$ 4.336.737,72	0,00	$ -	0,00	$ -
2.07	MEDIACAÑA EN PVC ALTURA 9 CM (PISO - PARED Y/O PARED - CIELO RASO)	ML	128,32	$ 32.086,00	$ 4.117.275,52	128,32	$ 4.117.275,52	0,00	$ -	0,00	$ -
2.08	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	18,40	$ 1.031.951,00	$ 18.987.898,40	18,40	$ 18.987.898,40	18,40	$ 18.985.318,52	18,40	$ 18.985.318,52
2.09	PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1.5 CM	M2	935,93	$ 22.040,00	$ 20.627.897,20	580,21	$ 12.787.828,40	159,18	$ 3.508.261,08	580,21	$ 12.787.762,28
2.10	PAÑETE LISO PLACAS 1:4 E=1.5 CM	M2	107,27	$ 21.373,00	$ 2.292.681,71	107,27	$ 2.292.671,02	0,00	$ -	0,00	$ -
SUB TOTAL					**$ 76.043.530,73**		**$ 70.389.764,16**		**$ 30.064.320,41**		**$ 59.500.255,24**
3. CUBIERTAS Y CIELO RASO											
3.01	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	57,60	$ 34.765,00	$ 2.002.464,00	57,60	$ 2.002.464,00	12,30	$ 427.609,50	12,30	$ 427.609,50

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA E.S.E CLINICA DE GIRÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 504.066.947,1	VALOR ADICIONAL:	N/A		VALOR TOTAL:	$ 504.066.947,10	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	31,73%

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICATORIA No.1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
3.02	CABELLETE TEJA TERMOACUSTICA	ML	26,20	$ 79.188,00	$ 2.074.725,60	40,00	$ 3.167.520,00	14,00	$ 1.108.632,00	40,00	$ 3.167.520,00
3.03	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DS=90	ML	52,90	$ 53.823,00	$ 2.847.236,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.04	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	165,75	$ 88.900,00	$ 14.735.175,00	165,75	$ 14.735.175,00	51,68	$ 4.594.352,00	165,70	$ 14.730.445,52
3.05	TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE TRANSPORTE)	M2	260,56	$ 91.500,00	$ 23.841.240,00	272,16	$ 24.902.640,00	26,16	$ 2.393.274,00	272,16	$ 24.902.274,00
	SUB TOTAL				**$ 45.500.841,30**		**$ 44.807.799,00**		**$ 8.523.867,50**		**$ 43.227.849,02**
4. CARPINTERIA											
4.01	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA X 0.20M	UND	17,00	$ 382.620,00	$ 6.504.540,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.02	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPELX-TABLEX 0.76-1.0M	M2	37,84	$ 232.338,00	$ 8.791.669,92	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.03	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	6,40	$ 105.820,00	$ 677.248,00	6,40	$ 677.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.04	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC ANTICORROSIVO	M2	16,08	$ 209.410,00	$ 3.367.312,80	16,19	$ 3.390.347,90		$ -	0,00	$ -
4.05	VIDRIO TRANSPARANTE 4 MM	M2	16,08	$ 72.632,00	$ 1.167.922,56	16,19	$ 1.175.912,08		$ -	0,00	$ -
4.06	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	27,96	$ 131.222,00	$ 3.668.967,12	16,19	$ 2.124.484,18		$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL				**$ 24.177.660,40**		**$ 7.367.992,16**		**$ -**		**$ -**
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
5.01	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	1,00	$ 353.288,00	$ 353.288,00	1,00	$ 353.288,00	1,00	$ 353.288,00	1,00	$ 353.288,00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA	UND	1,00	$ 1.141.275,00	$ 1.141.275,00	1,00	$ 1.141.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.03	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	49,43	$ 33.325,00	$ 1.647.254,75	27,50	$ 916.437,50	27,50	$ 916.437,50	27,50	$ 916.437,50
5.04	REGISTRO 2"	UND	3,00	$ 374.264,00	$ 1.122.792,00	3,00	$ 1.122.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.05	TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 618.808,00	$ 618.808,00	1,00	$ 618.808,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.06	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/ PARAL 1/2"	UND	7,00	$ 54.858,00	$ 384.006,00	7,00	$ 384.006,00	7,00	$ 384.006,00	7,00	$ 384.006,00
5.07	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	42,50	$ 15.710,00	$ 667.675,00	27,50	$ 432.025,00	27,50	$ 432.025,00	27,50	$ 432.025,00
5.08	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	39,60	$ 18.111,00	$ 717.195,60	22,00	$ 398.442,00	22,00	$ 398.442,00	22,00	$ 398.442,00
5.09	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	62,50	$ 66.085,00	$ 4.130.312,50	26,25	$ 1.734.731,25	26,25	$ 1.734.731,25	26,25	$ 1.734.731,25
5.10	REGISTRO 1/2"	UND	6,00	$ 88.754,00	$ 532.524,00	6,00	$ 532.524,00	6,00	$ 532.524,00	6,00	$ 532.524,00
5.11	REGISTRO 3/4"	UND	6,00	$ 110.654,00	$ 663.924,00	6,00	$ 663.924,00	3,00	$ 331.962,00	3,00	$ 331.962,00
5.12	REVENTILACION 2"	ML	26,80	$ 27.762,00	$ 744.021,60	26,80	$ 744.021,60	0,00	$ -	0,00	$ -

ANEXO Nº 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA E.S.E CLINICA DE GIRÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 504.066.947,1	VALOR ADICIONAL:	N/A		VALOR TOTAL:	$ 504.066.947,10	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	31,73%

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICATORIA No.1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA Nº 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
5.13	PUNTO SANITARIO AIRE ACONDICONADO 1/2"	UND	3,00	$ 72.633,00	$ 217.899,00	4,00	$ 290.532,00	4,00	$ 290.532,00	4,00	$ 290.532,00
	SUB TOTAL				$ 12.940.975,45		$ 9.332.806,35		$ 5.373.947,75		$ 5.373.947,75
6. INSTALACIONES ELECTRICAS											
6.01	SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA	UND	29,00	$ 97.013,00	$ 2.813.377,00	29,00	$ 2.813.377,00	25,00	$ 2.425.325,00	25,00	$ 2.425.325,00
6.02	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	29,00	$ 80.304,00	$ 2.328.816,00	29,00	$ 2.328.816,00	29,00	$ 2.328.816,00	29,00	$ 2.328.816,00
6.03	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	2,00	$ 142.651,00	$ 285.302,00	2,00	$ 285.302,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.04	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 "	ML	98,72	$ 5.748,00	$ 567.442,56	98,72	$ 567.442,56	81,50	$ 468.462,00	81,50	$ 468.462,00
6.05	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$ 363.029,00	$ 363.029,00	1,00	$ 363.029,00	1,00	$ 363.029,00	1,00	$ 363.029,00
6.06	LUMINARIA LED 40W (INCLUYE LUMINARIA, SOPORTE, DERIVACION EN SALIDA Y DEMAS ELEMENTOS NECEESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	29,00	$ 132.482,00	$ 3.841.978,00	29,00	$ 3.841.978,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.07	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4,00	$ 129.656,00	$ 518.624,00	4,00	$ 518.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.08	PUNTO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO	UND	3,00	$ 57.391,00	$ 172.173,00	4,00	$ 229.564,00	4,00	$ 229.564,00	4,00	$ 229.564,00
	SUB TOTAL				$ 10.890.741,56		$ 10.948.132,56		$ 5.815.196,00		$ 5.815.196,00
7. OBRAS DE URBANISMO											
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	43,24	$ 78.691,00	$ 3.402.598,84	43,24	$ 3.402.598,84	0,00	$ -	0,00	$ -
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	18,73	$ 95.170,00	$ 1.782.534,10	18,73	$ 1.782.534,10	0,00	$ -	0,00	$ -
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ANDEN DE 2500 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M2	112,52	$ 100.657,00	$ 11.325.925,64	112,52	$ 11.325.925,64	84,23	$ 8.478.339,11	84,23	$ 8.478.339,11
7.04	RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO. ACABADO CON LLANA METÁLICA / MADERA O ESCOBILLADO	M3	13,50	$ 677.302,00	$ 9.143.577,00	13,50	$ 9.143.577,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.05	TUBERIA PVC DRENAJE 100 MM SIN FILTRO	ML	75,20	$ 21.913,00	$ 1.647.857,60	75,20	$ 1.647.857,60	75,20	$ 1.647.857,60	75,20	$ 1.647.857,60
7.06	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE TAMAÑO ENTRE 19mm (3/4") Y 75mm (3")	M3	17,40	$ 122.724,00	$ 2.135.397,60	17,40	$ 2.135.397,60	17,40	$ 2.135.397,60	17,40	$ 2.135.397,60
7.07	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 O SIMILAR, PARA FILTRACIÓN, DRENAJE Y SEPARACIÓN DE SUELOS (GEOSINTÉTICOS PERMEABLES DE POLIPROPILENO)	M2	75,00	$ 10.525,00	$ 789.375,00	75,00	$ 789.375,00	75,00	$ 789.375,00	75,00	$ 789.375,00
	SUB TOTAL				$ 30.227.265,78		$ 30.227.265,78		$ 13.050.969,31		$ 13.050.969,31
8. PISOS, ACABADOS Y ENCHAPES											
8.01	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 60X60 CALIDAD PRIMERA	M2	171,16	$ 89.024,00	$ 15.237.347,84	171,16	$ 15.237.347,84	0,00	$ -	0,00	$ -
8.02	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	203,06	$ 113.000,00	$ 22.945.780,00	130,57	$ 14.754.432,60	0,00	$ -	0,00	$ -
8.03	GUARDAESCOBA GRANO MARMOL P2;PAYANDE FONDO BLANCO	ML	138,42	$ 19.731,00	$ 2.731.165,02	138,42	$ 2.731.165,02	0,00	$ -	0,00	$ -

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÈ DE MOTOSO DE LA E.S.E CLINICA DE GIRÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 504.066.947,1	VALOR ADICIONAL:	N/A		VALOR TOTAL:	$ 504.066.947,10	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	31,73%

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICATORIA No.1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
8.04	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UND	7,00	$ 175.533,00	$ 1.228.731,00	7,00	$ 1.228.731,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8.05	REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2 ANTICUCARACHA	UND	11,00	$ 22.240,00	$ 244.640,00	11,00	$ 244.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8.06	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL	M2	203,06	$ 28.995,00	$ 5.887.724,70	130,57	$ 3.785.882,95	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL				**$ 48.275.388,56**		**$ 37.982.199,41**		**$ -**		**$ -**
9. EXCAVACIONES Y RELLENOS											
9.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M	M3	57,23	$ 30.284,00	$ 1.733.153,32	132,10	$ 4.000.651,53	33,54	$ 1.015.725,36	90,09	$ 2.728.323,42
9.02	RELLENO DE MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	37,25	$ 51.950,00	$ 1.935.137,50	94,35	$ 4.901.297,69	36,71	$ 1.906.980,60	36,71	$ 1.906.980,60
9.03	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUB BASE GRANULAR, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON APISONADOR, INCLUYE HUMECTACIÓN CON ASPERSOR MANUAL	M3	18,00	$ 222.300,00	$ 4.001.400,00	18,00	$ 4.001.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL				**$ 7.669.690,82**		**$ 12.903.349,22**		**$ 2.922.705,96**		**$ 4.635.304,02**
10. APARATOS SANITARIOS											
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INLCUYE GRIFERIA)	UND	7,00	$ 799.559,00	$ 5.596.913,00	7,00	$ 5.596.913,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INLUYE GRIFERIA)	UND	7,00	$ 327.946,00	$ 2.295.622,00	7,00	$ 2.295.622,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL				**$ 7.892.535,00**		**$ 7.892.535,00**		**$ -**		**$ -**
11. PINTURAS											
11.01	IMPERMEABILIZACION DE FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	128,27	$ 15.538,77	$ 1.993.157,93	128,27	$ 1.993.157,93	0,00	$ -	0,00	$ -
11.02	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA	M2	260,56	$ 19.748,20	$ 5.145.592,08	260,56	$ 5.145.592,08	63,00	$ 1.244.136,86	63,00	$ 1.244.136,86
11.03	ESTUCO	M2	935,93	$ 13.755,00	$ 12.873.717,15	580,21	$ 7.980.788,55	265,70	$ 3.654.662,24	265,70	$ 3.654.662,24
11.04	PINTURA ANTIBACTERIAL DE ALTA ASEPSIA PARA ZONAS RESIDUOS Y POCETAS DE ASEO	M2	110,53	$ 26.193,00	$ 2.895.112,29	62,56	$ 1.638.634,08	0,00	$ -	0,00	$ -
11.05	PINTURA EPOXICA (ODONTOLOGIA, PROCEDIMIENTOS Y ESTERILIZACION DE ALTA ASEPSIA)	M2	112,56	$ 21.500,00	$ 2.420.040,00	67,07	$ 1.441.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11.06	PINTURA TIPO 1	M2	584,57	$ 21.661,00	$ 12.662.370,77	162,06	$ 3.510.381,66	0,00	$ -	0,00	$ -
11.07	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	128,27	$ 23.892,00	$ 3.064.626,84	288,92	$ 6.902.876,64	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL				**$ 41.054.617,06**		**$ 28.613.392,94**		**$ 4.898.799,10**		**$ 4.898.799,10**
12. SUMINISTROS											$ 4.898.799,10
12.01	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU	UND	3,00	$ 2.755.660,01	$ 8.266.980,04	4,00	$ 11.022.640,06	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES DE PARED	UND	6,00	$ 320.238,10	$ 1.921.428,63	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.03	SUMINISTRO DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA	UND	2,00	$ 3.287.500,00	$ 6.575.000,00	2,00	$ 6.575.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÈ DE MOTOSO DE LA E.S.E CLINICA DE GIRÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 504.066.947,1	VALOR ADICIONAL:	N/A		VALOR TOTAL:	$ 504.066.947,10	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	31,73%

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICATORIA No.1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
12.04	BARRA PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	10,00	$ 458.225,00	$ 4.582.250,00	10,00	$ 4.582.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12.05	SUMINISTRO DE LAVATRAPEROS EN ACERO INDUSTRIAL	UND	2,00	$ 2.159.900,00	$ 4.319.800,00	2,00	$ 4.319.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12.06	BARANDAS PARA RAMPA DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE EN TUBERÍA DE 2" Y 1.1/2 CALIBRE 16 ACABADO SATINADO Y BASES DE 3.1/2" DE DIÁMETRO Y 4.5MM DE ESPESOR (H=1,00m)	ML	19,20	$ 782.820,00	$ 15.030.144,00	19,20	$ 15.030.144,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL				$ 40.695.602,67		$ 41.529.834,06		$ -		$ -
13. ITEM NO PREVISTOS											
NP 13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA COOLL ROLLED CAL 20 ESTAMPADA, TUBERIA 1 1/2 CUADRADA CAL 20, INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20, CHAPA ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	0,00	778.645,00	$ -	36,80	$ 28.654.136,00		$ -	0,00	$ -
NP 13.02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS=60, BOQUILLA DE 3", INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	0,00	145.566,00	$ -	63,00	$ 9.170.658,00		$ -	0,00	$ -
NP 13.03	ACOMETIDA ELECTRICA GENERAL CON CABLE CONCENTRICO 1 X 8 + 8, INCLUYE CAJA 'PARA EL CONTADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA	ML	0,00	95.247,00	$ -	40,00	$ 3.809.880,00		$ -	0,00	$ -
NP 13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMATICO CON TACOS ENCHUFABLES	UND	0,00	472.411,00	$ -	1,00	$ 472.411,00	1,00	$ 472.411,00	1,00	$ 472.411,00
	SUB TOTAL						$ 42.107.085,00		$ 472.411,00		$ 472.411,00
	SUB TOTAL OBRAS				$ 367.074.807,29		$ 367.074.807,30		$ 76.753.523,72		$ 159.947.321,61
	TOTAL COSTO (CON AIU)				$ 367.074.807,29		$ 367.074.807,30		$ 76.753.523,72		$ 159.947.321,61
	Administración 19%				$ 69.744.213,39		$ 69.744.213,39		$ 14.583.169,51		$ 30.389.991,11
	Imprevistos 1%				3670748,073		3670748,073		767535,2372		1599473,216
	Utilidad 5%				$ 18.353.740,36		$ 18.353.740,36		$ 3.837.676,19		$ 7.997.366,08
	Costos Indirectos (AIU 25%)				$ 91.768.701,82		$ 91.768.701,82		$ 19.188.380,93		$ 39.986.830,40
	VALOR TOTAL OBRA				$ 458.843.509,12		$ 458.843.509,12		$ 115.130.285,58		$ 159.947.321,61

MOBILIARIO	UND	CANT	VR UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
	UND	1	$ 3.599.000,00	$ 3.599.000,00	1	$ 3.599.000,00	0	$ -	0	$ -
	UND	7	$ 1.600.000,00	$ 11.200.000,00	7	$ 11.200.000,00	0	$ -	0	$ -
	UND	3	$ 431.146,00	$ 1.293.438,00	3	$ 1.293.438,00	0	$ -	0	$ -
	UND	6	$ 765.000,00	$ 4.590.000,00	6	$ 4.590.000,00	0	$ -	0	$ -
	UND	4	$ 575.000,00	$ 2.300.000,00	4	$ 2.300.000,00	0	$ -	0	$ -
	UND	10	$ 805.000,00	$ 8.050.000,00	10	$ 8.050.000,00	0	$ -	0	$ -

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA E.S.E CLINICA DE GIRÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 504.066.947,1	VALOR ADICIONAL:	N/A		VALOR TOTAL:	$ 504.066.947,10	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	31,73%

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No.1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		UND	6	$ 862.500,00	$ 5.175.000,00	6	$ 5.175.000,00	0	$ -	0	$ -
		UND	6	$ 966.000,00	$ 5.796.000,00	6	$ 5.796.000,00	0	$ -	0	$ -
		UND	14	$ 230.000,00	$ 3.220.000,00	14	$ 3.220.000,00	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL MOBILIARIO					$ 45.223.438,00		$ 45.223.438,00		$ -		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 504.066.947,1	TOTAL DEL CO	$ 504.066.947,1	VALOR EJECUTADO	$ 115.130.285,58	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 159.947.321,61
SALDO POR EJECUTAR:											$ 344.119.625,5

VALOR PRESENTE ACTA	$115.130.285,58
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	$115.130.285,58

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

PRESENTO:


CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

MARLON FABIAN LOPEZ DURAN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,01	PRELIMINARES	ITEM	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M (NO INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

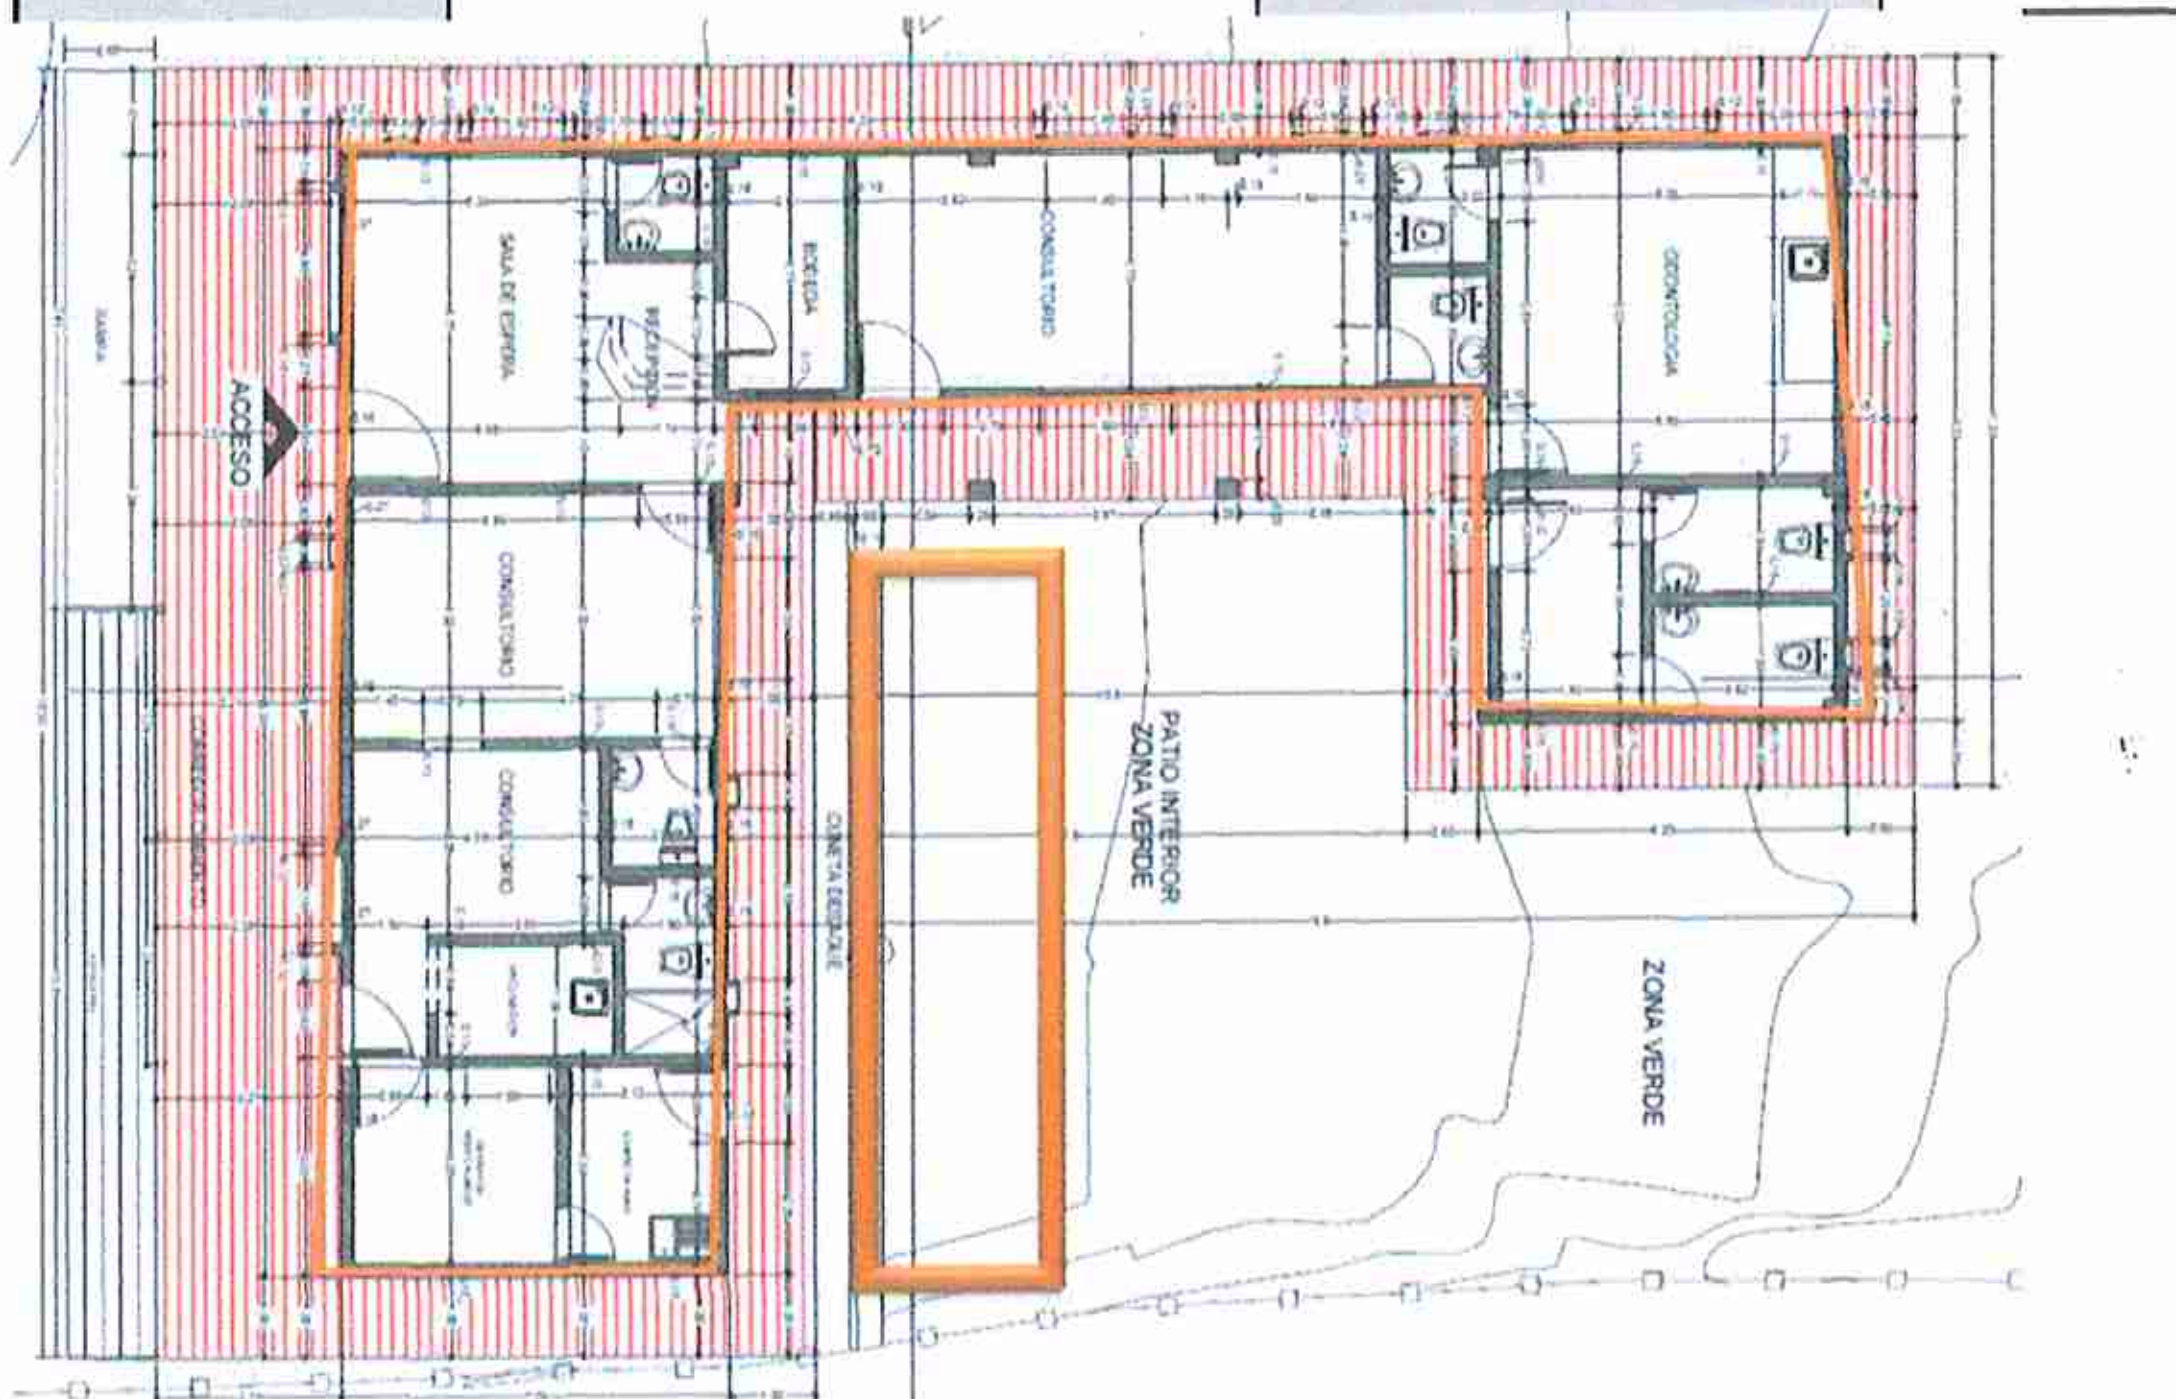




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	DESECHOS HOSPITALARIOS	0,62		2,00	1,00	1,24
	CUARTO DE ASEO	2,00		2,78	1,00	5,55
	CUNETA EXISTENTE	31,00		0,52	1,00	16,00
Subtotal						22,79
TOTAL						**22,79**

ELABORO: ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO GIRON E.S.E 2025	**APROBO:** LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,04	PRELIMINARES	ITEM	DEMOLICION PLACA MACIZA E:0,15M (NO INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

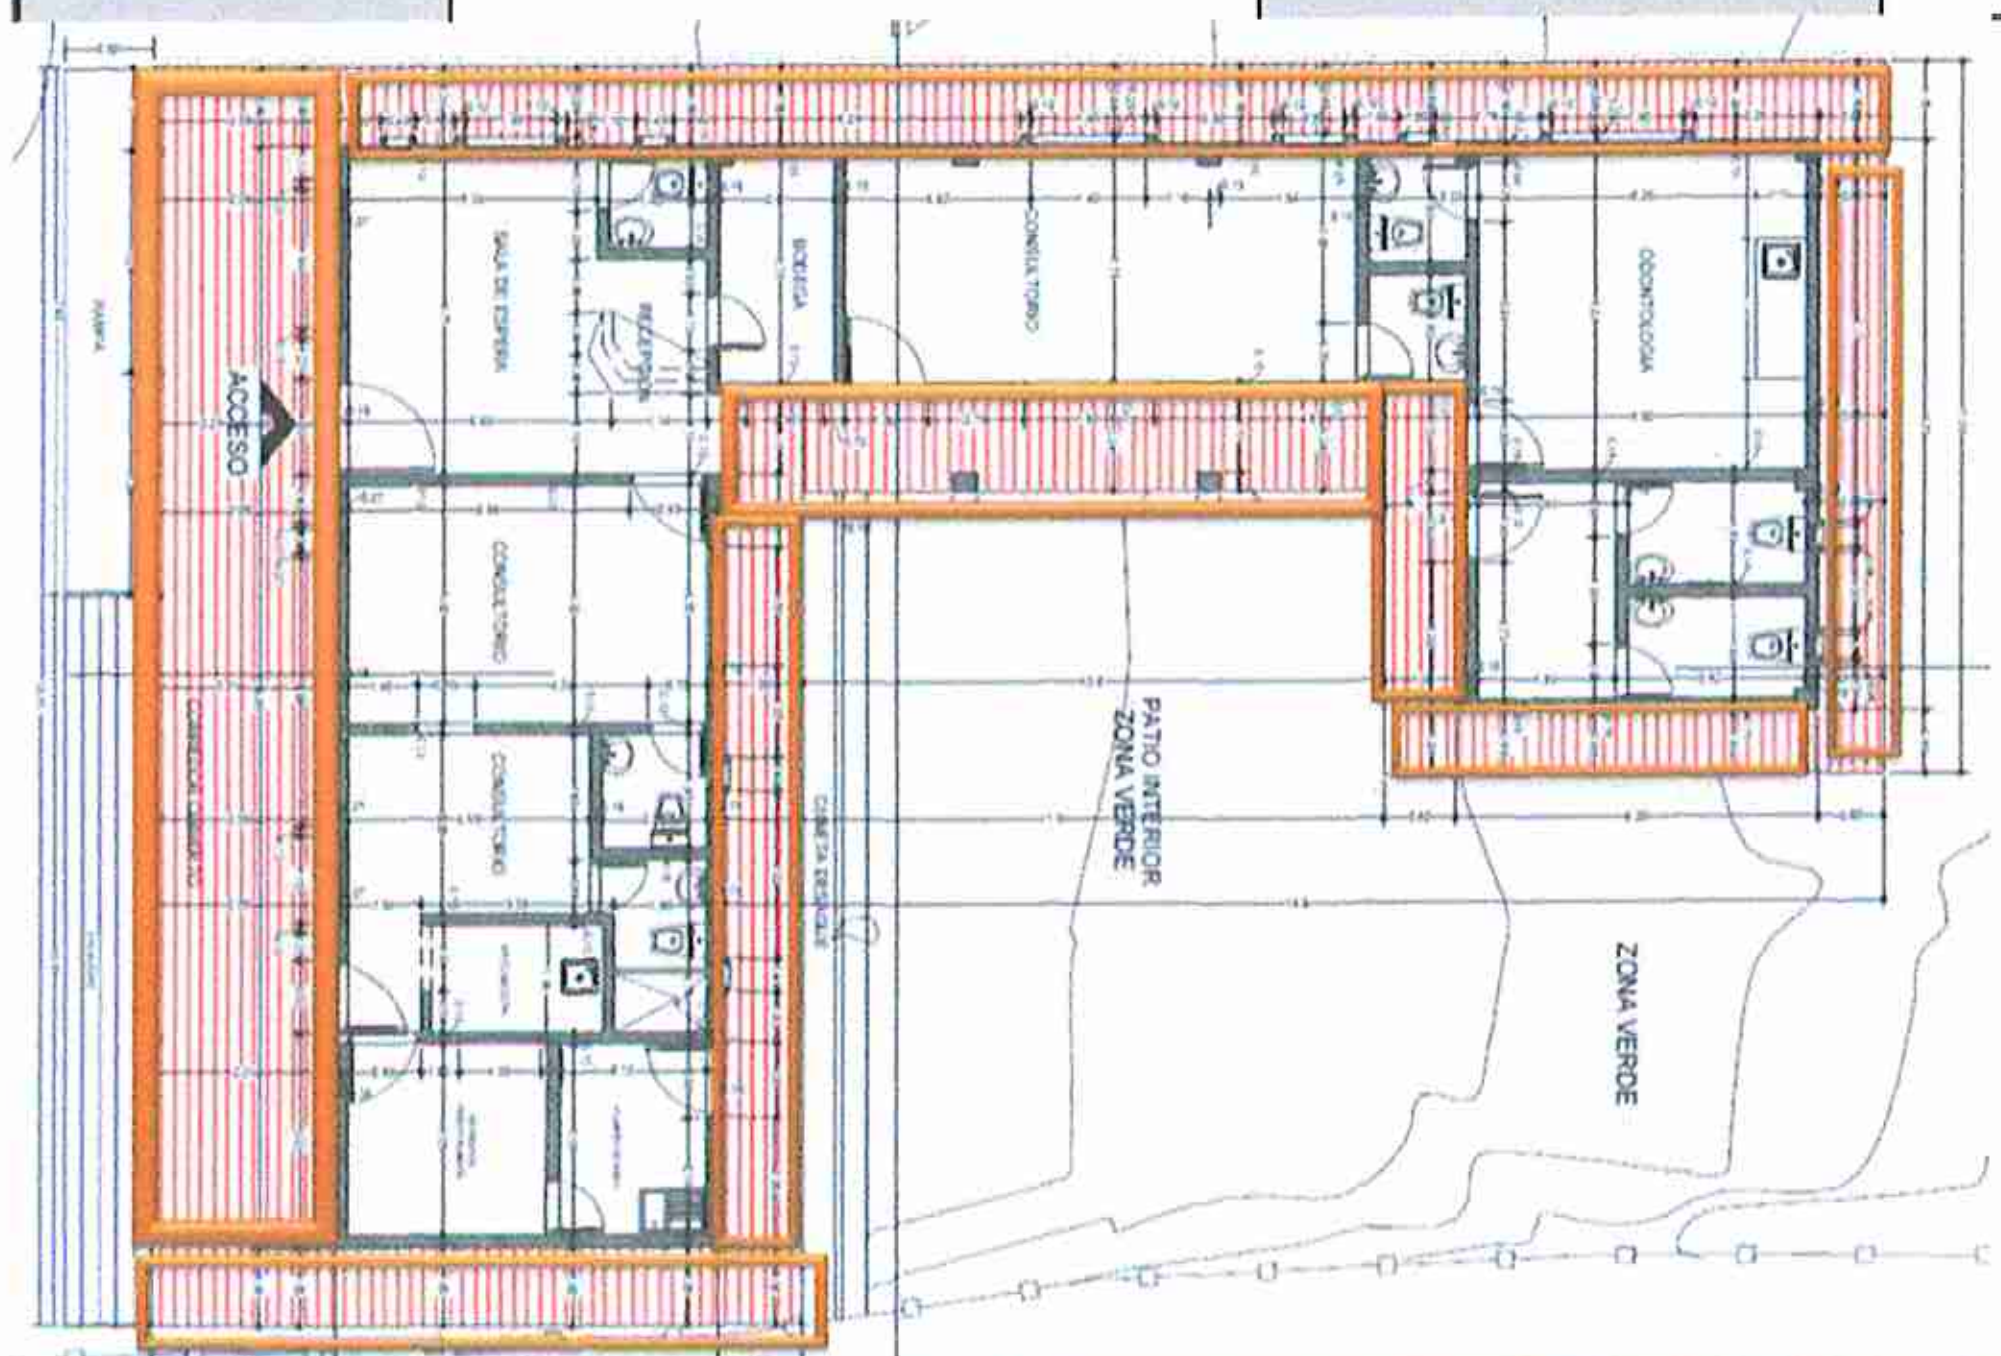





Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	ANDEN FACHADA	2,20		16,60	1,00	36,52
	RAMPA INTERNA	1,00		10,00	1,00	10,00
	ANDEN ACCESO BANOS EXISTENTES	1,00		4,26	1,00	4,26
	Subtotal					50,78
	TOTAL					**50,78**

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,05	PRELIMINARES	ITEM	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,2M	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

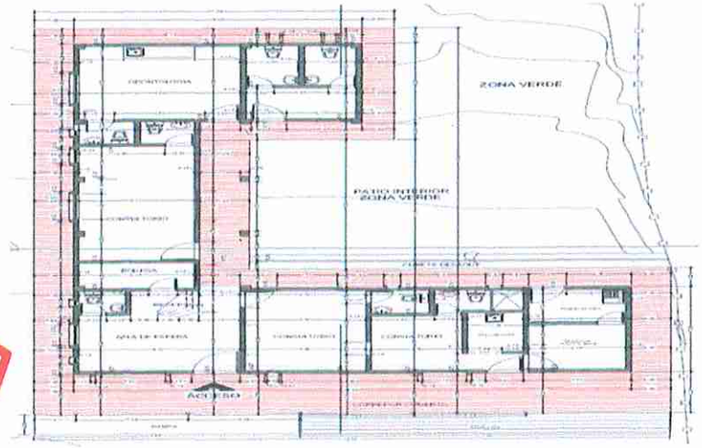



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	DESCAPOTE PARA REALIZACION DE FILTRO	1,80		14,00	1,00	25,20
Subtotal						25,20
TOTAL						25,20

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN:01
PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON

1,08	PRELIMINARES	ITEM	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



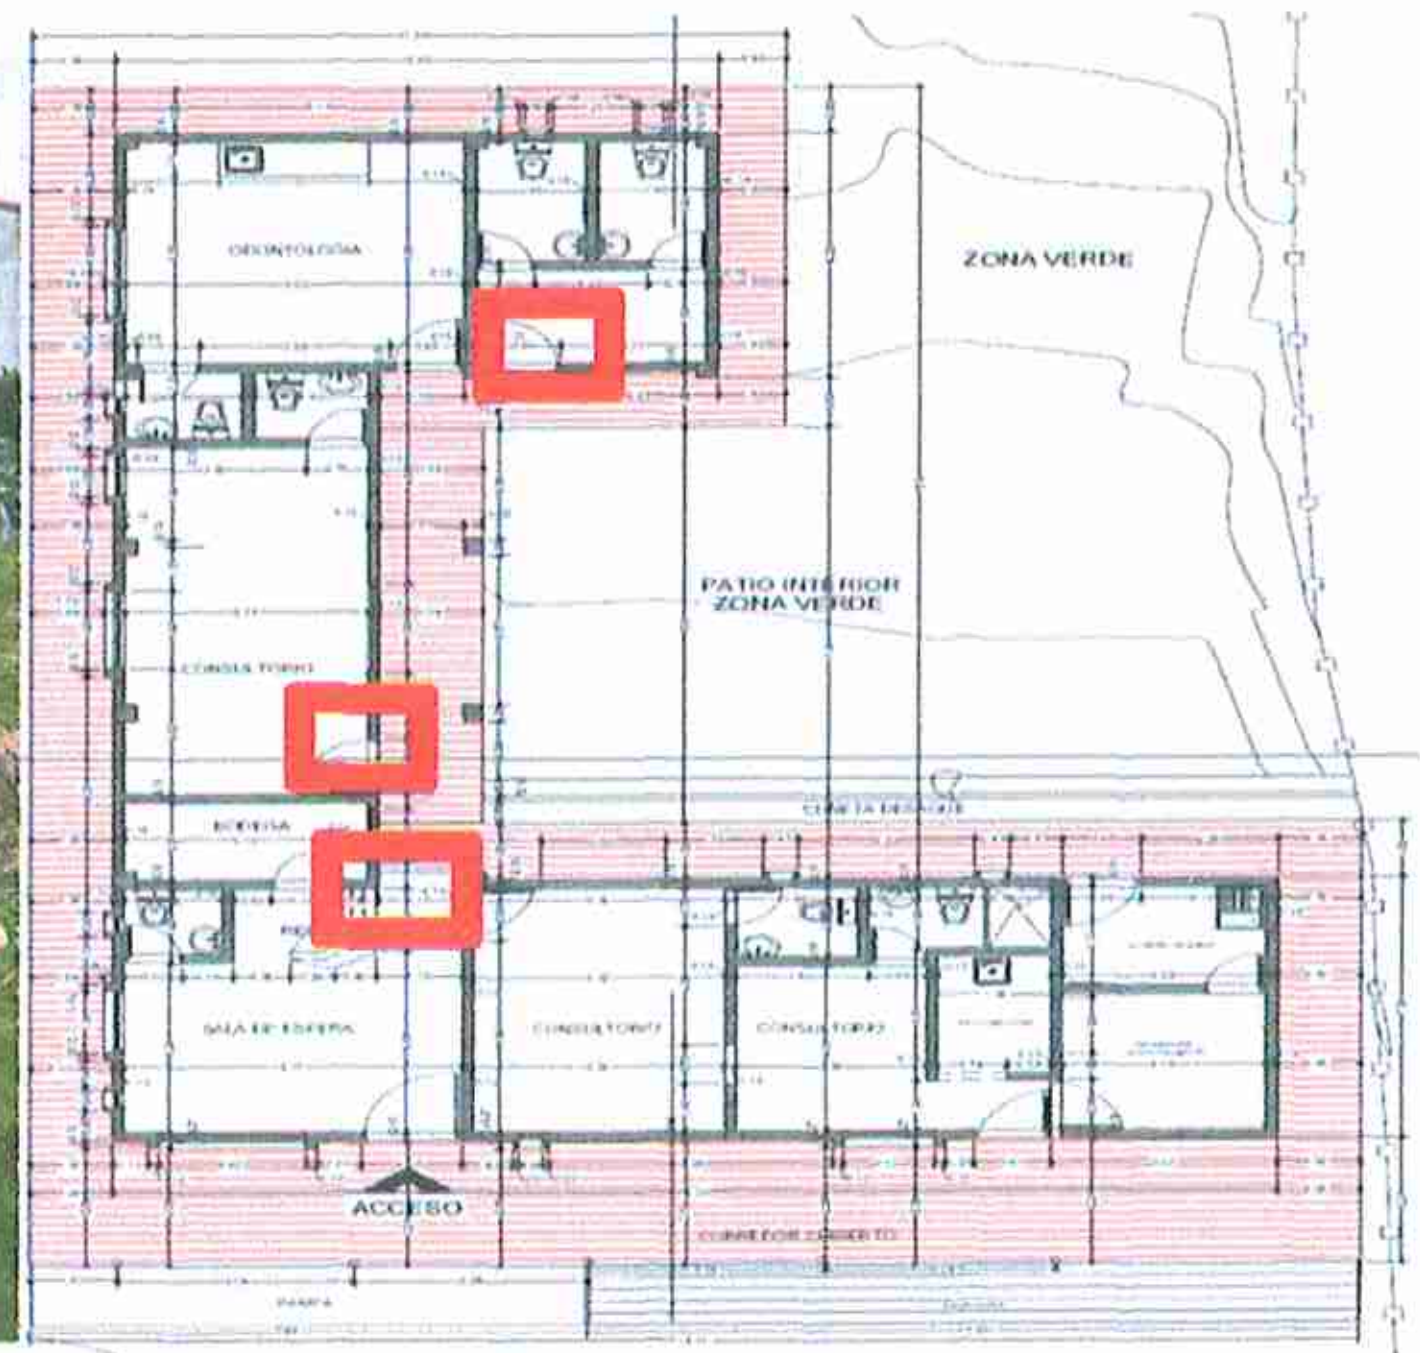

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	CONSULTORIO 3				1,00	1,00
	SALA DE ESPERA AL PATIO				1,00	1,00
	BAÑO AUXILIAR EXISTENTE				1,00	1,00
				Subtotal		3,00
				TOTAL		3,00

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,10	PRELIMINARES	ITEM	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 0,25M	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

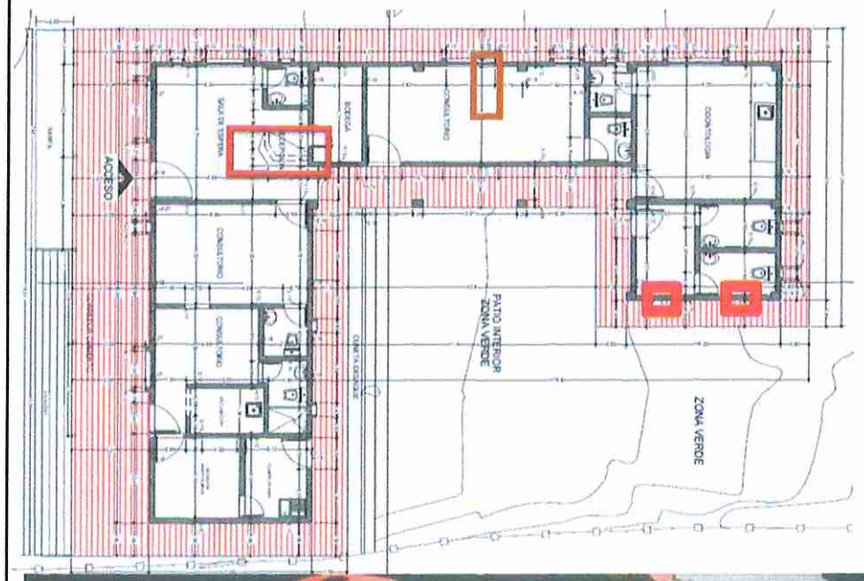



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	MURO DIVISORIO CONSULTORIO #3	1,50	2,00		1,00	3,00
	MURO RECEPCION	1,60	1,80		1,00	2,88
	MURO APERTURA DE PUERTAS BAÑOS ALIX	2,00	1,44		2,00	5,76
	Subtotal					11,64
	TOTAL					11,64

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,12	PRELIMINARES	ITEM	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 18 KM (INCLUYE CARGUE)	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	DEMOLICION ANDEN	5,55		2,00		11,10
	EXCAVACION FILTRO	72,00		0,33		24,07
	Subtotal					35,17
	TOTAL					35,17

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

2,01	MUROS, REVOQUE Y REPELLOS	ITEM	MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12M	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

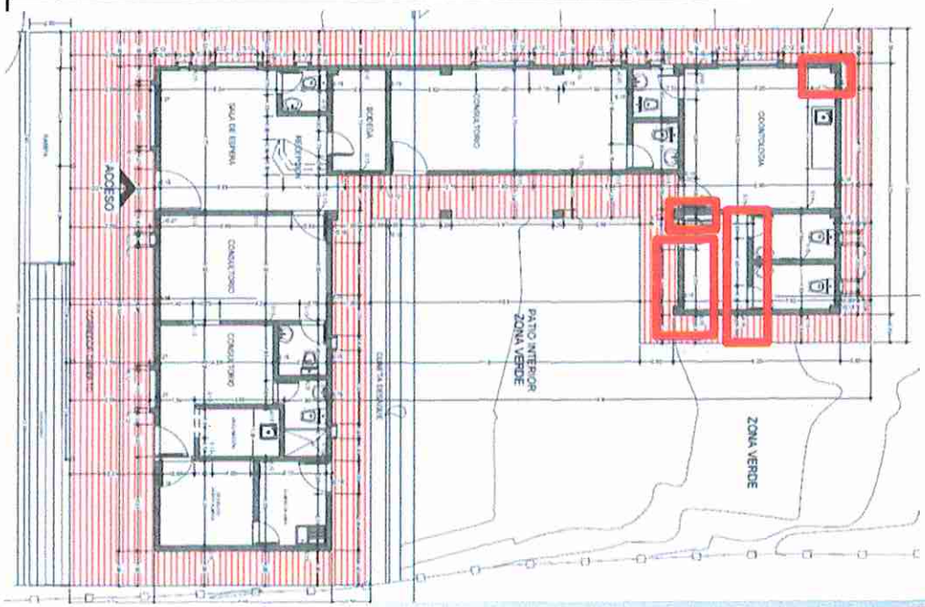



Fecha	Localización	Dimensiones			KG	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SEPARACION BAÑO 1	2,9		2,84		8,24
	SEPARACION BAÑO 2	2,9		2,84		8,24
	MURO CUARTO COMPRESOR	2,80		1,30		3,64
	MURO CUARTO COMPRESOR	2,80		1,60		4,48
	AREA PUERTA	2,80		0,44		1,24
	Subtotal					25,83
	TOTAL					25,83

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

2,02	MUROS, REVOQUE Y REPELLOS	ITEM	ACERO FIGURADO 37000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)	UNID.	KG	UBICACIÓN	GENERAL



POS	DIAMETRO	CANT	LONG.	LONG. TOTAL	PESO (KG)	TOTAL
ACERO DE MURO DE CONTENCION						
1	29,50	6,88	203,00		0,99	201,78
Subtotal						201,78
TOTAL						201,78

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

2,03	MUROS, REVOQUE Y REPELLOS	ITEM	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

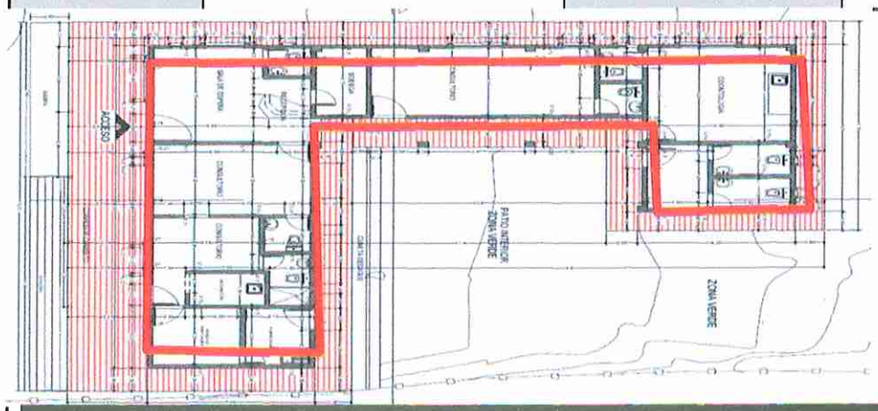



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CONSULTORIO 1			4,40	2,00	8,80
	CONSULTORIO 2			3,00	2,00	6,00
	CONSULTORIO 3			6,00	2,00	12,00
	CONSULTORIO 4			4,00	4,00	16,00
	CONSULTORIO 3			3,00	2,00	6,00
	CONSULTORIO 2			2,25	2,00	4,50
	CONSULTORIO 1			4,40	2,00	8,80
	BAÑO CON 1.			1,42	2,00	2,84
	BAÑO CON 1			1,25	2,00	2,50
	BAÑO CON 2.			2,23	2,00	4,46
	BAÑO CON 2			1,10	2,00	2,20
	BAÑO CON 3.			1,34	2,00	2,68
	BAÑO CON 3			1,17	2,00	2,34
	BAÑO CON 4.			1,36	2,00	2,72
	BAÑO CON 4.			1,17	2,00	2,34
	BAÑO DISCAPACITADOS			2,85	2,00	5,70
	BAÑO DISCAPACITADOS			1,78	2,00	3,56
	BAÑO AUX 1.			2,80	2,00	5,60
	BAÑO AUX 1			1,43	2,00	2,86
	BAÑO AUX 2.			2,80	2,00	5,60
	BAÑO AUX 2.			1,50	2,00	3,00
	DESECHOS HOSPITALARIOS			2,38	2,00	4,76
	DESECHOS HOSPITALARIOS			2,41	2,00	4,82
	CUARTO ASEO			1,88	2,00	3,76
	CUARTO ASEO			2,41	2,00	4,82
	PASILLO			1,55	2,00	3,10
	PASILLO			0,90	2,00	1,80
	VACUNACION			2,10	2,00	4,20
	VACUNACION			1,42	2,00	2,84
	BAÑO RESEPCION			1,40	2,00	2,80
	BAÑO RESEPCION			1,90	2,00	3,80
	Subtotal					147,20
	TOTAL					**147,20**

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

2,04	MUROS, REVOQUE Y REPELLOS	ITEM	FILOS O DILATACIONES S/MURO	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

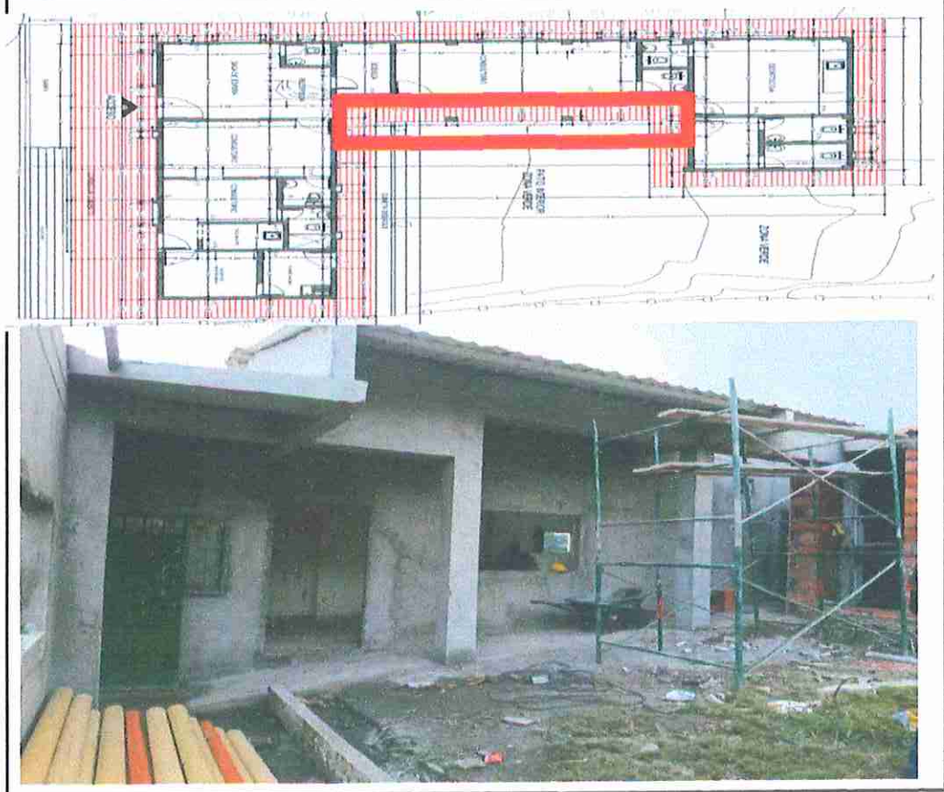

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FILOS DE COLUMNAS PASILLO			4,00	4,00	16,00
	FILOS DE MOCHETA VOLADO PATIO			6,00	1,00	6,00
	Subtotal					22,00
	TOTAL					22,00

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA/ENLACE CONSULTOR


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

2,05	MUROS, REVOQUES Y REPELLOS	ITEM	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL




HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika®-1

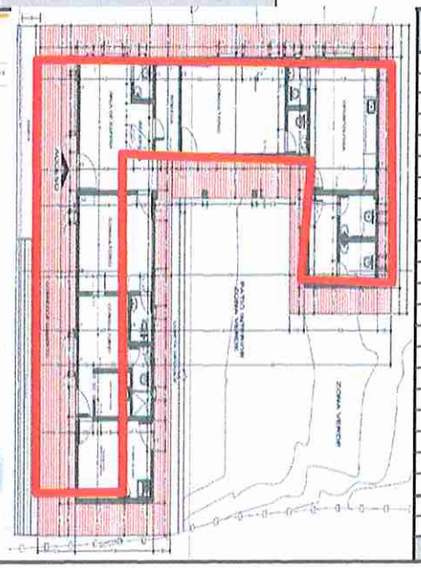

Fecha	Localización	Dimensiones			M2	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Consultorio 2	2,89	3,56	6,19		82,54
	Consultorio 3	3,03	3,56	4,35		65,73
	Consultorio 4	2,28	3,56	2,94		43,87
	Baño 1	2,14	3,56	1,31		27,37
	BODEGA	2,89	3,56	1,39		14,30
	BAÑO 2	2,14	3,56	1,31		9,97
	BAÑO 3	1,39	3,56	1,34		6,63
	BAÑO 4	1,39	3,56	1,34		6,63
	BAÑO 5	1,33	3,56	1,16		5,49
	BAÑO 6	1,26	3,56	1,45		6,50
	BAÑO 7	1,54		1,00		1,54
Subtotal						270,57
TOTAL						270,57

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	PÁGINA: 1 DE 1

2,08	MUROS, REVOQUES Y REPELLOS	ITEM	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	ZARPA	25,00	0,30	1,00		7,50
	MURO 1 SECION	8,50	0,30	1,50		3,83
	MURO 2 SECION	3,50	0,30	2,10		2,21
	MURO 3 SECION	3,50	0,30	2,00		2,10
	MURO 4 SECION	5,00	0,30	1,10		1,65
	MURO 5 SECION	5,00	0,30	0,75		1,12
				Subtotal		18,40
				TOTAL		18,40

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

2,09	MUROS, REVOQUES Y REPELLOS	ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1.5 CM	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

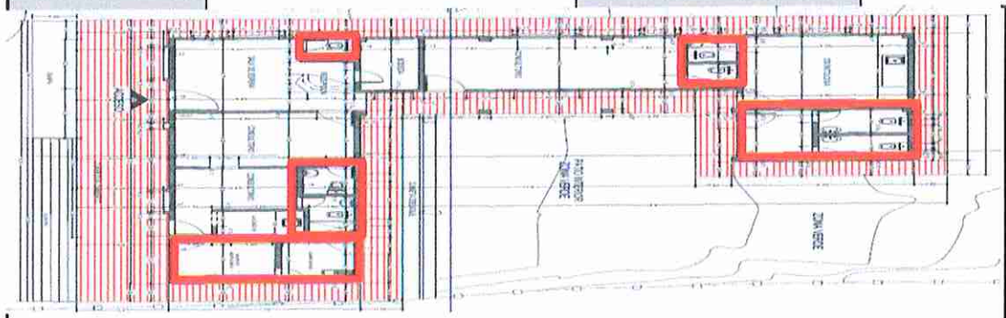







Fecha	Localización	Dimensiones			CANTODAD	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CUATO ASEO PARED 1	1,88	2,70		4,00	20,30
	CUATO ASEO PARED 2	2,41	2,70		4,00	26,03
	VACUNACION PARED 1	2,10	2,70		4,00	22,68
	VACUNACION PARED 2	1,42	2,70		4,00	15,34
	DESECHOS HOSPITALARIOS PR 1	2,38	2,70		4,00	25,70
	DESECHOS HOSPITALARIOS PR2	2,41	2,70		4,00	26,03
	BAÑO CONSULTORIO 1	1,42	2,70		4,00	15,34
	BAÑO CONSULTORIO 2	2,23	2,70		1,00	6,02
	MOCHETA PUERTA BAÑO	1,74	1,00		1,00	1,74
						-
						-
Subtotal						159,18
TOTAL						159,18

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

3,01	CUBIERTAS Y CIELO RASO	ITEM	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

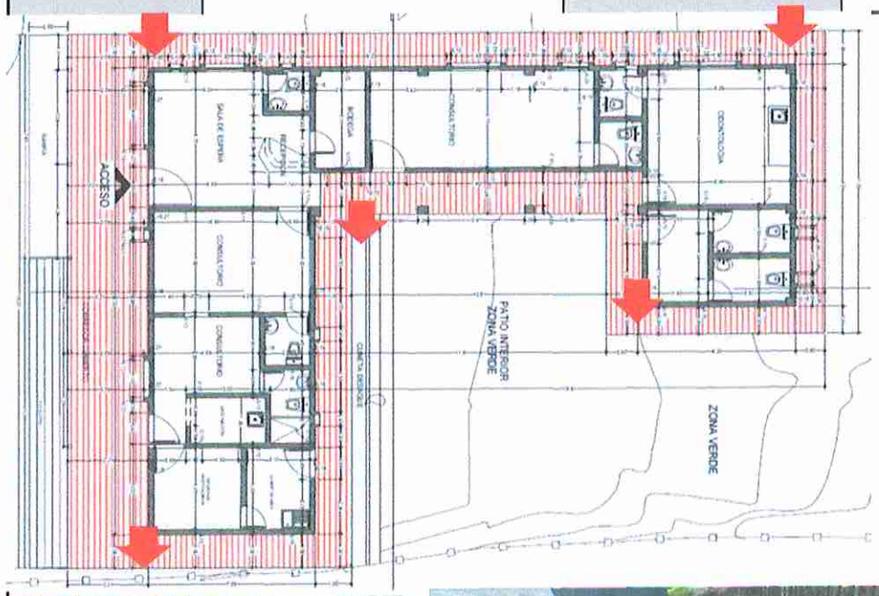





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAJANTE COSTADO IZQUIERDO			2,20	1,00	2,20
	BAJANTE COSTADO DERECHO			2,20	1,00	2,20
	BAJANTE PARTE TRASERA DEL CENTRO			1,50	1,00	1,50
	BAJANTE PATIO INTERNO FRENTE A BAÑOS			3,00	1,00	3,00
	BAJANTE PATIO TRASERO			3,40	1,00	3,40
Subtotal						12,30
TOTAL						12,30

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

3,02	CUBIERTAS Y CIELO RASO	ITEM	CABELLETE TEJA TERMOACUSTICA	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

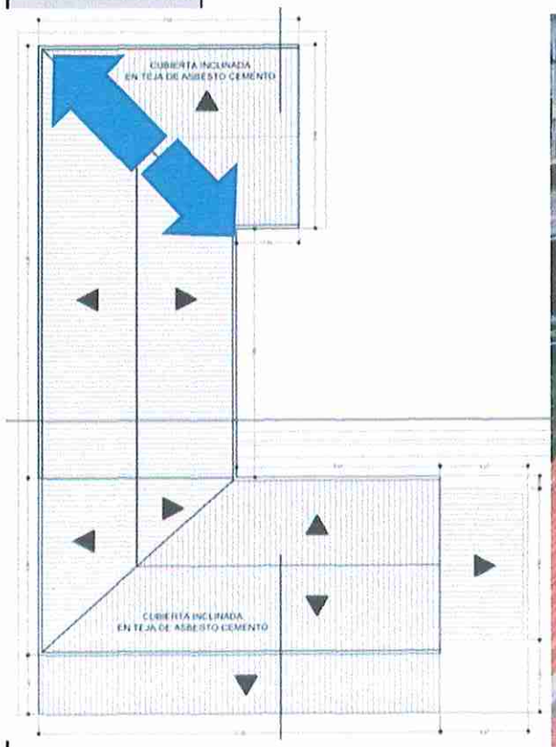



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CABALLETE BAÑOS AUXILIARES			2,00	7,00	14,00
	Subtotal					14,00
	TOTAL					14,00

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

3,04	CUBIERTAS Y CIELO RASO	ITEM	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

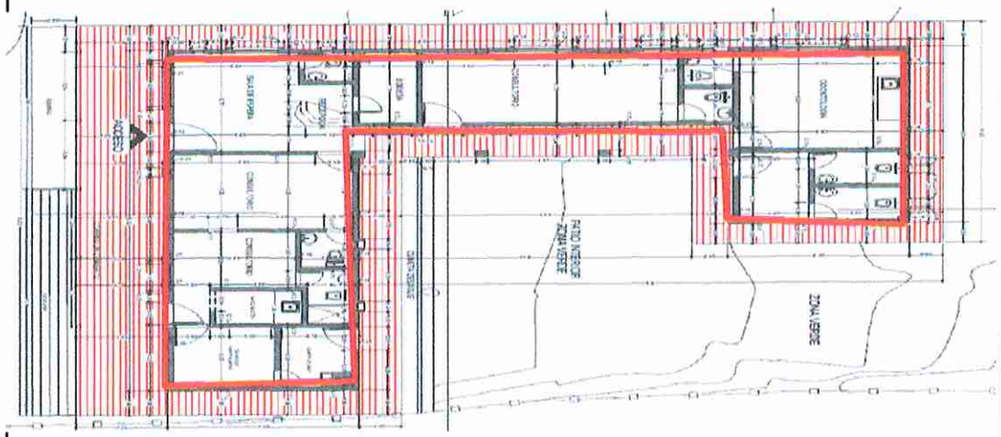







Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	ODONTOLOGIA	4,00		4,00		16,00
	CONSULTORIO 3	6,20		3,00		18,60
	RESEPCION	4,00		4,00		16,00
	BAÑO	1,08		1,00		1,08
	Subtotal					51,68
	TOTAL					51,68

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO RUIZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

3,05	CUBIERTAS Y CIELO RASO	ITEM	TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE TRANSPORTE)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

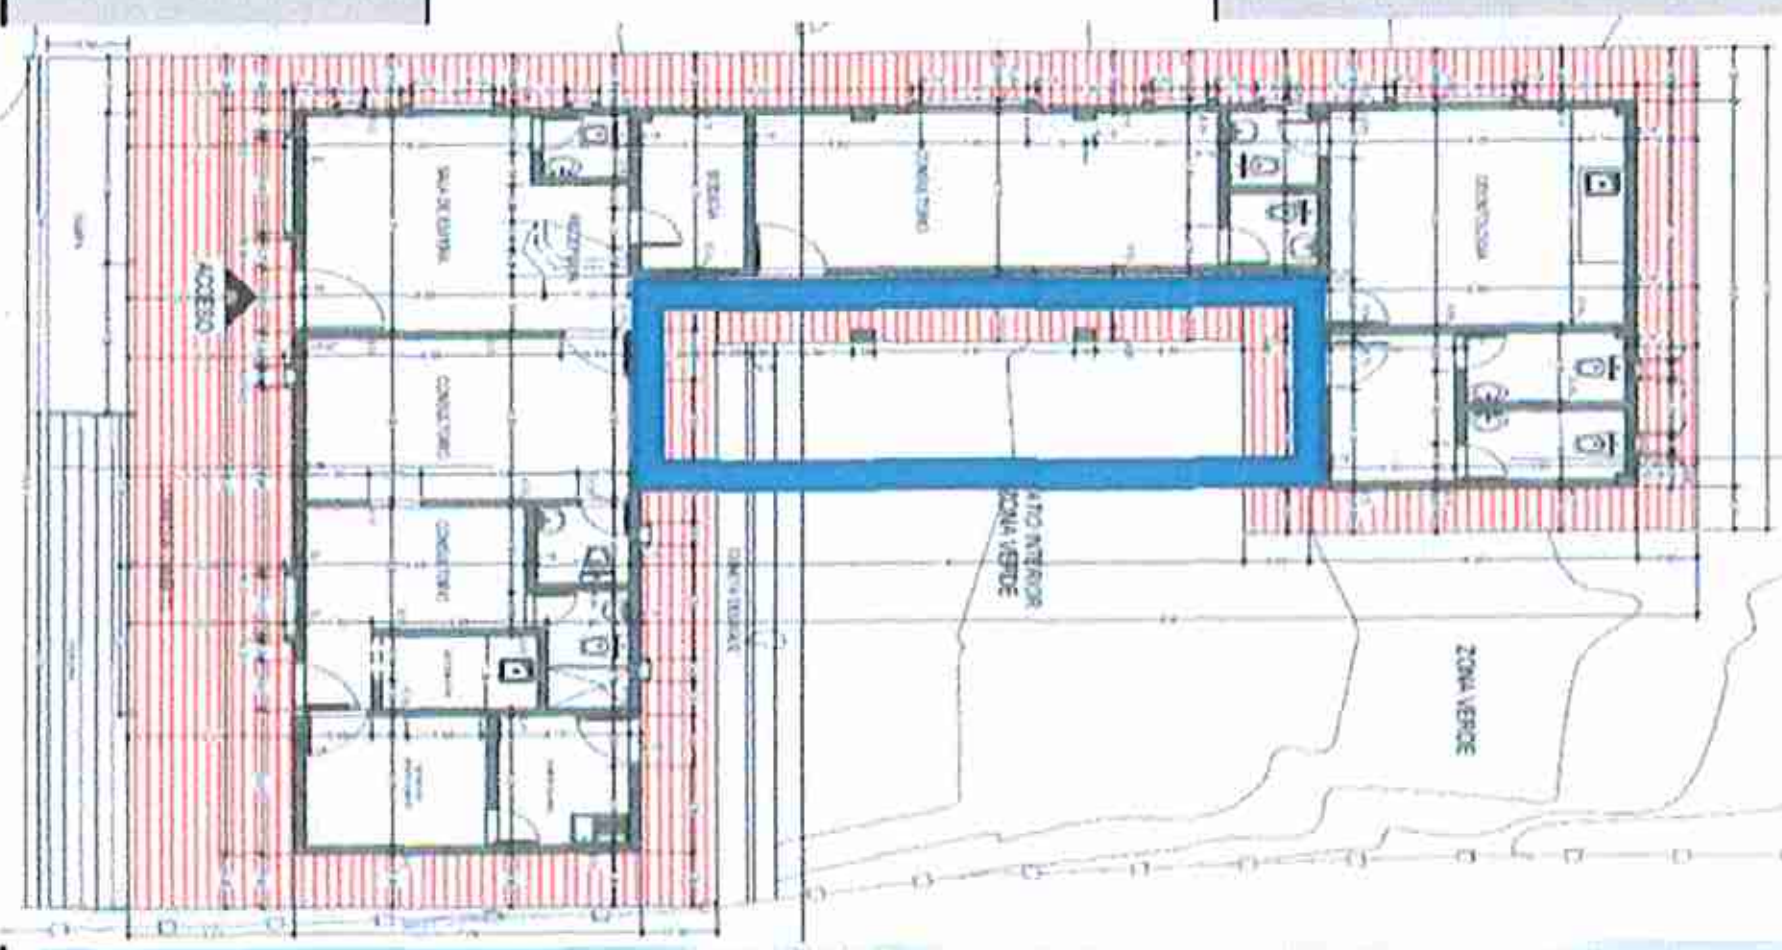



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	BOLADO ANDEN DISCAPACITADOS	2,01		13,00		26,16
	Subtotal					26,16
	TOTAL					26,16

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

5,01	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

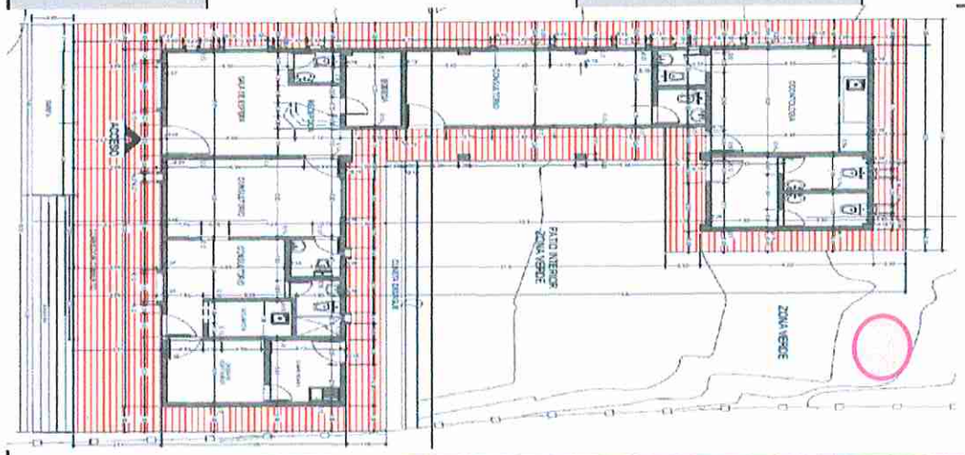



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CONEXIÓN TANQUE				1,00	1,00
Subtotal						1,00
TOTAL						1,00

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

5,03	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	RED SUMINISTRO PVC 2"	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	BAÑO AUXILIAR 2			2,10	2,00	4,20
	BAÑO AUXILIAR 1			1,40	2,00	2,80
	BAÑO DISCAPACITADOS			1,50	2,00	3,00
	CONSULTORIO ODONTOLOGIA			6,80	1,00	6,80
	BAÑO ODONTOLOGIA			1,60	2,00	3,20
	BAÑO CONSULTORIO 3			1,50	2,00	3,00
	BAÑO CONSULTORIO 1			3,40	1,00	3,40
	BAÑO CONSULTORIO 2			1,10	1,00	1,10
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						27,50
TOTAL						**27,50**

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN:01
PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON

5,06	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/ PARAL 1/2"	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

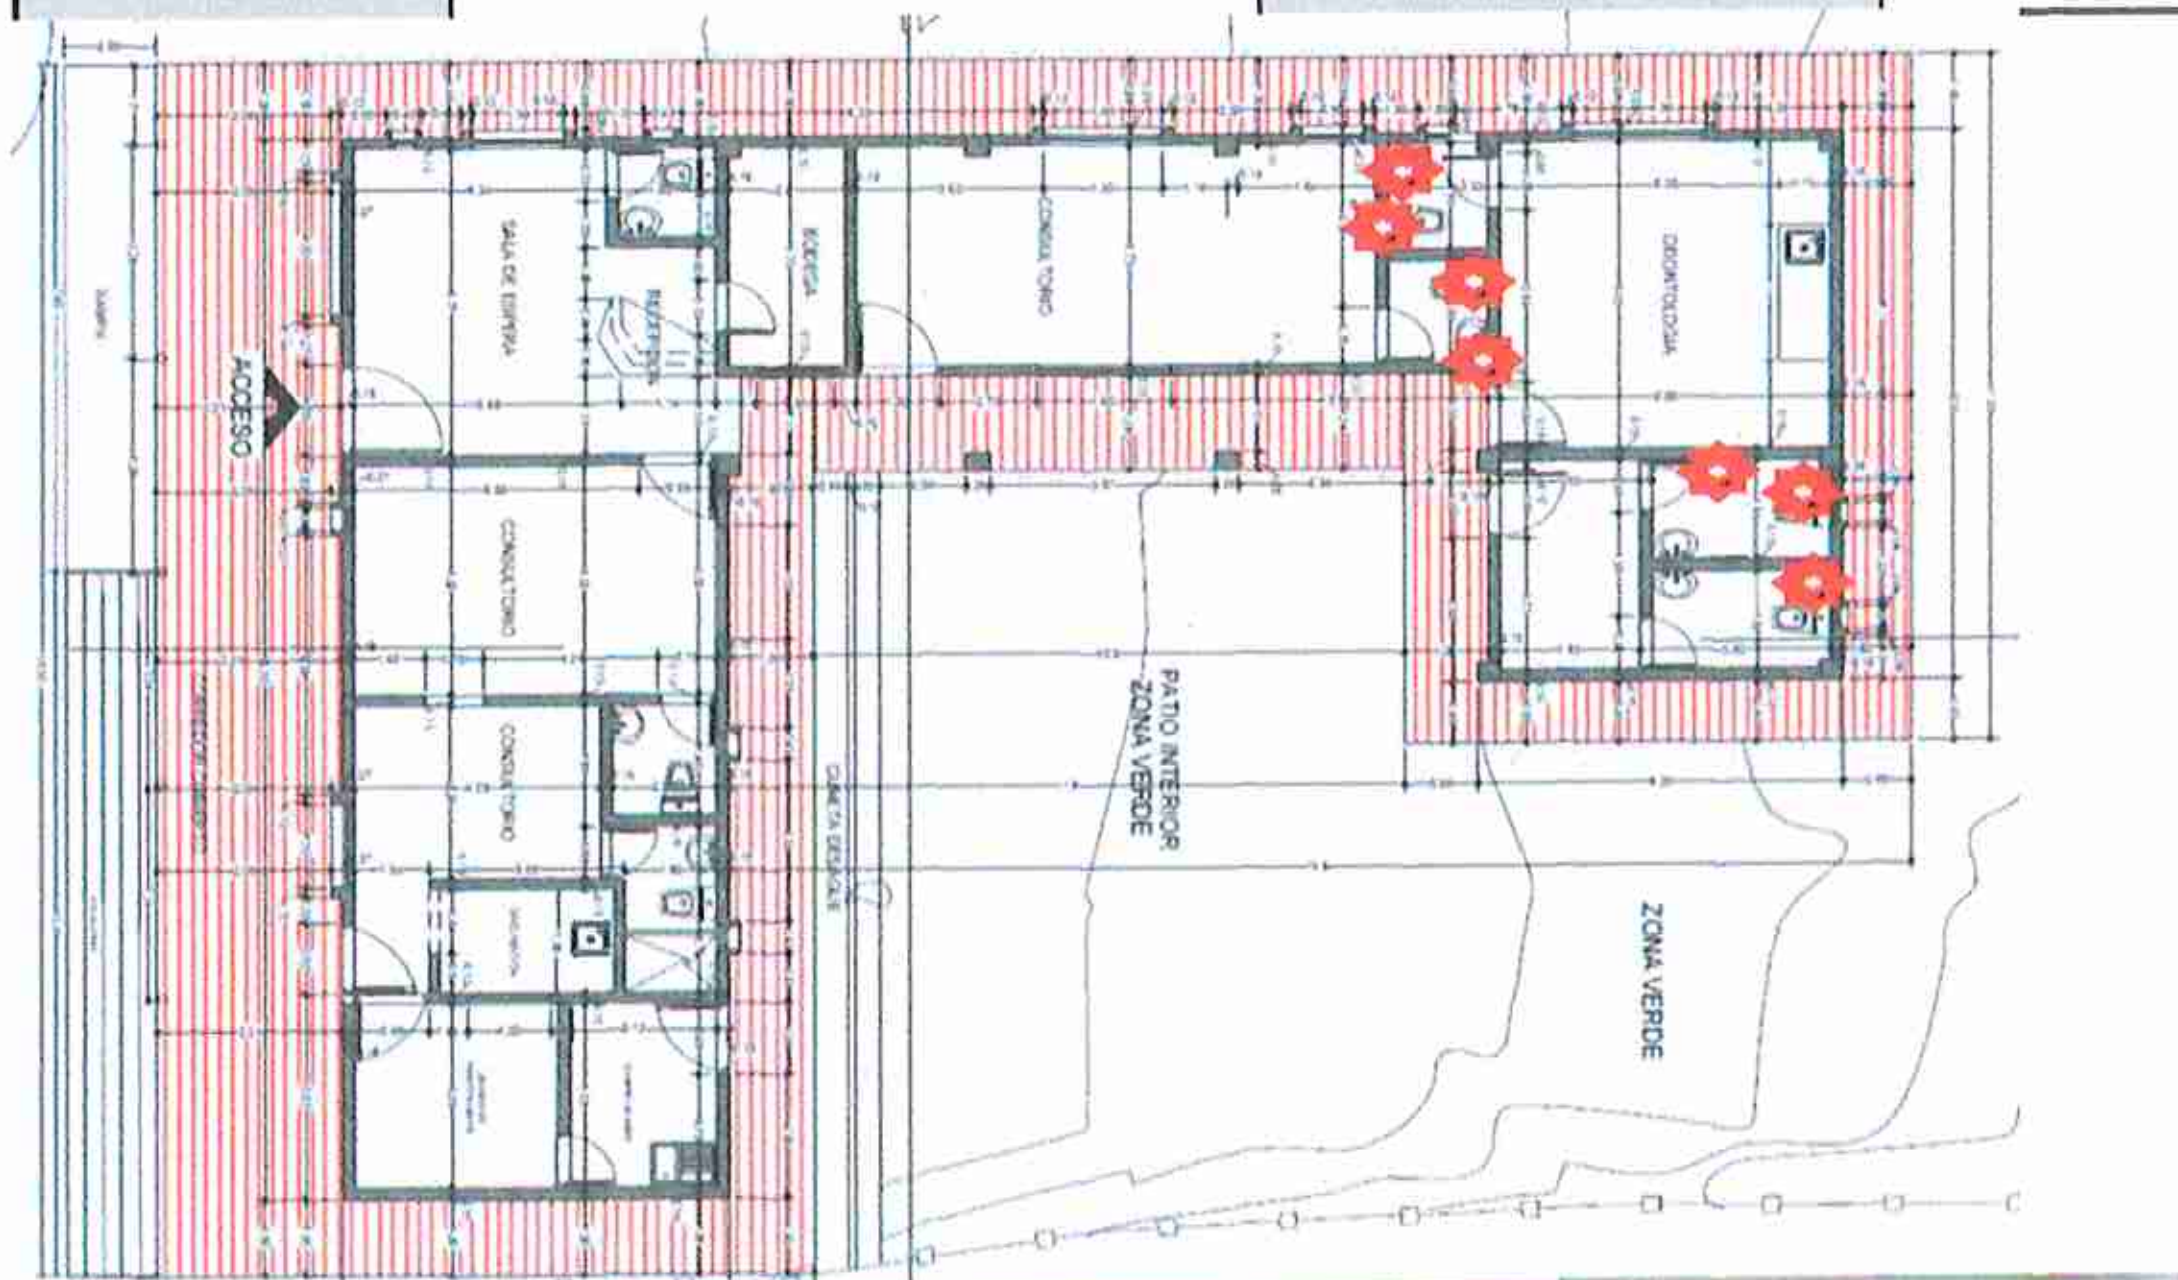







Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
	BAÑO AUXILIAR 1				1,00	1,00
	BAÑO AUXILIAR 2				1,00	1,00
	BAÑO CONSUL 1				1,00	1,00
	BAÑO CONSUL 2				1,00	1,00
	BAÑO CONSUL 3				1,00	1,00
	BAÑO CONSUL 4				1,00	1,00
	Subtotal					7,00
	TOTAL					**7,00**

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

5,07	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

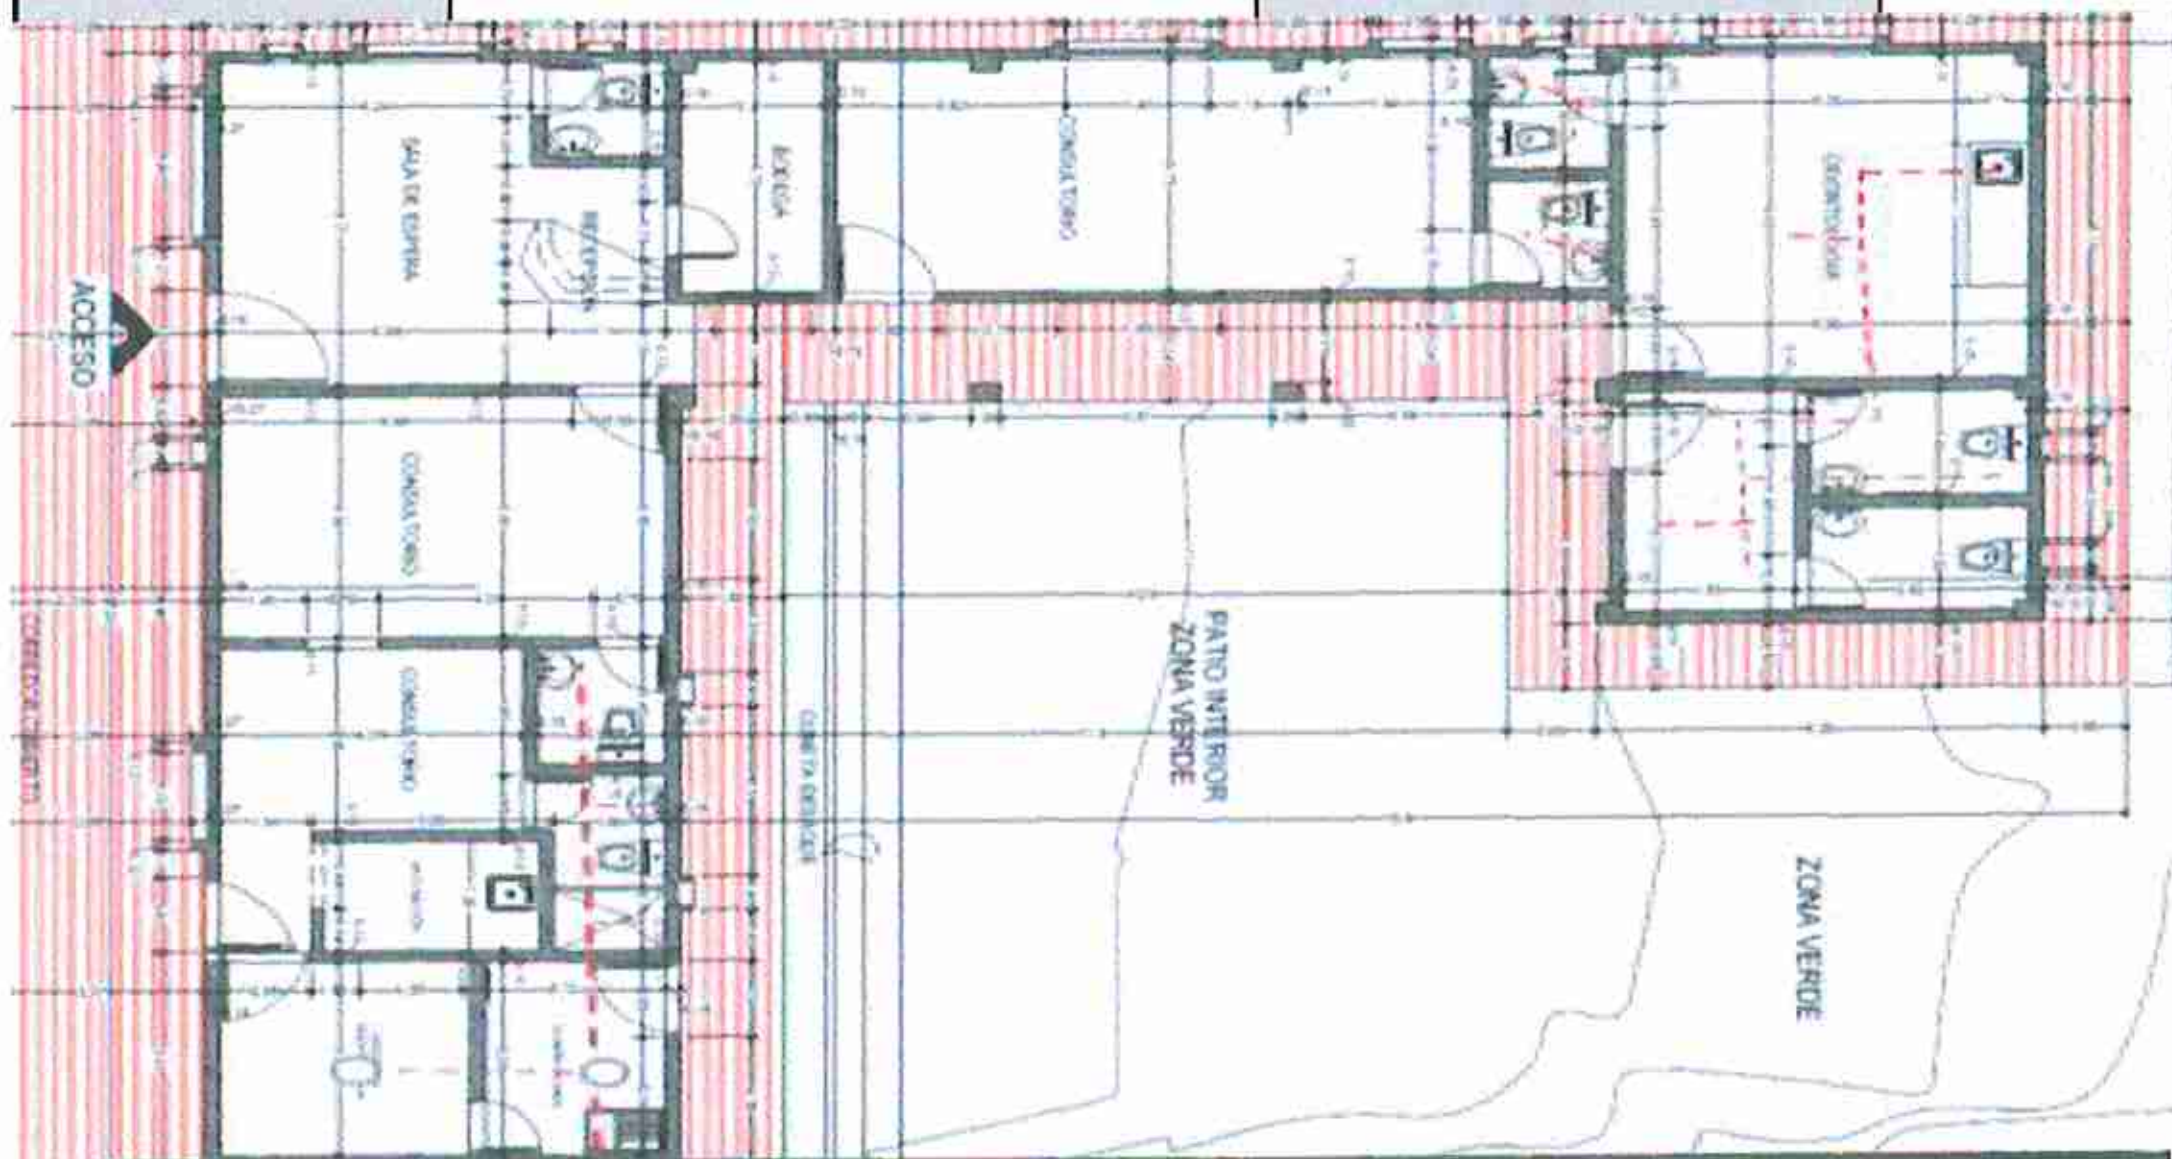



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO AUXILIAR 2			2,10	2,00	4,20
	BAÑO AUXILIAR 1			1,40	2,00	2,80
	BAÑO DISCAPACITADOS			1,50	2,00	3,00
	CONSULTORIO ODONTOLOGIA			6,80	1,00	6,80
	BAÑO ODONTOLOGIA			1,60	2,00	3,20
	BAÑO CONSULTORIO 3			1,50	2,00	3,00
	BAÑO CONSULTORIO 1			3,40	1,00	3,40
	BAÑO CONSULTORIO 2			1,10	1,00	1,10
	Subtotal					27,50
	TOTAL					27,50

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN:01
PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON

5,08	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

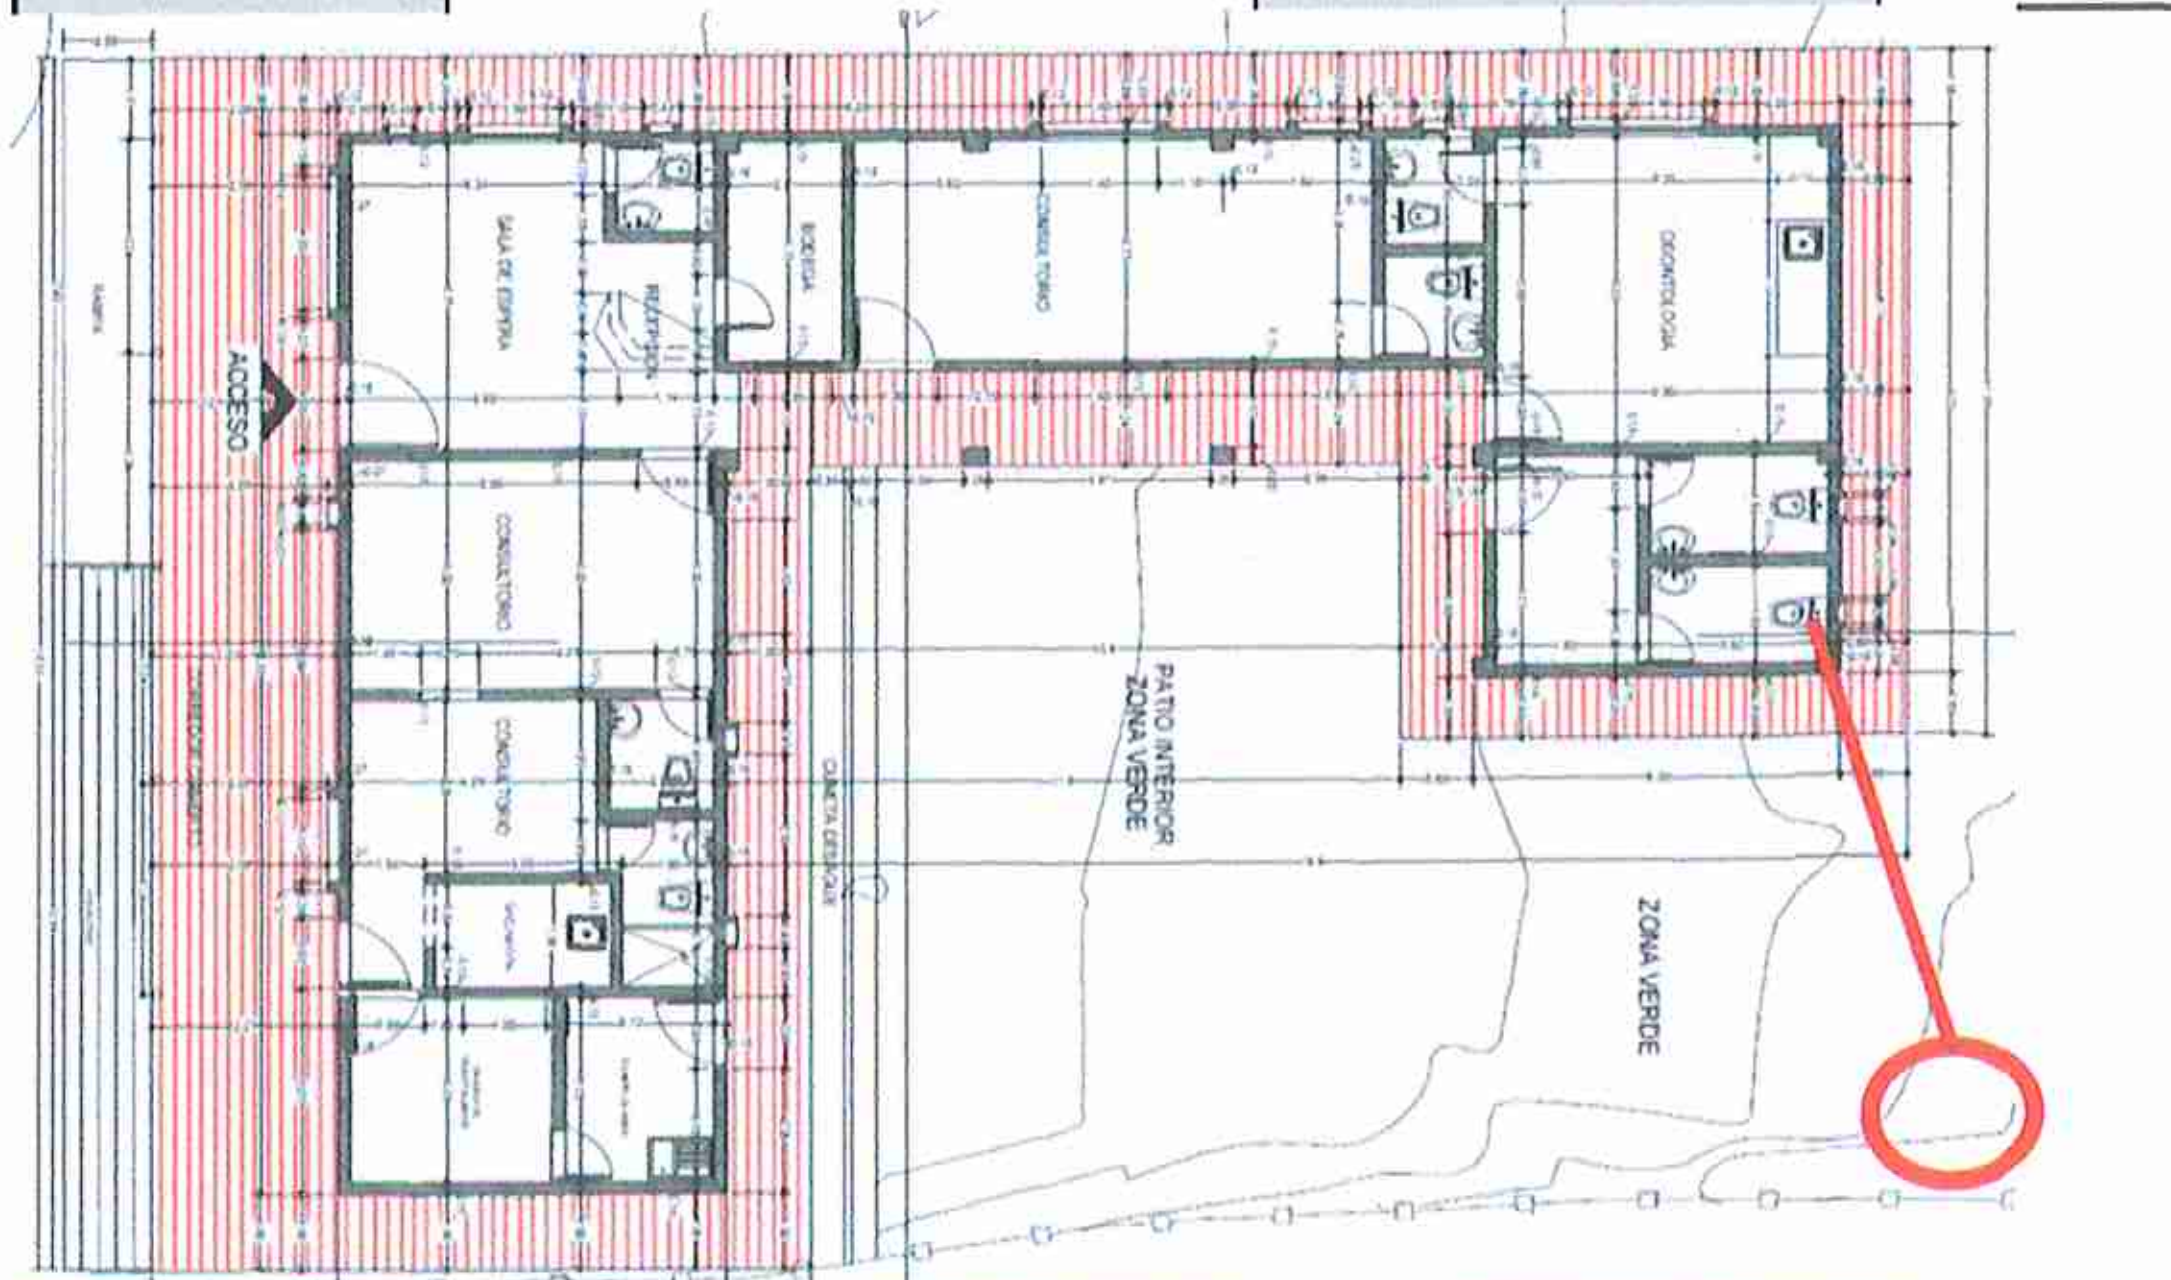



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	DESCARGUE DE TANQUE				22,00	22,00
Subtotal						22,00
TOTAL						**22,00**

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

5,09	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	RED SANITARIA PVC-S 4"	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL







Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO AUXILIAR 2			4,20	1,00	4,20
	BAÑO AUXILIAR 1			2,80	1,00	2,80
	BAÑO DISCAPACITADOS			3,00	1,00	3,00
	CONSULTORIO ODONTOLOGIA			6,80	1,00	6,80
	BAÑO ODONTOLOGIA			1,60	2,00	3,20
	BAÑO CONSULTORIO 3			1,50	2,00	3,00
	BAÑO CONSULTORIO 1			3,25	1,00	3,25
	Subtotal					26,25
	TOTAL					26,25

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

5,10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	REGISTRO 1/2"	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

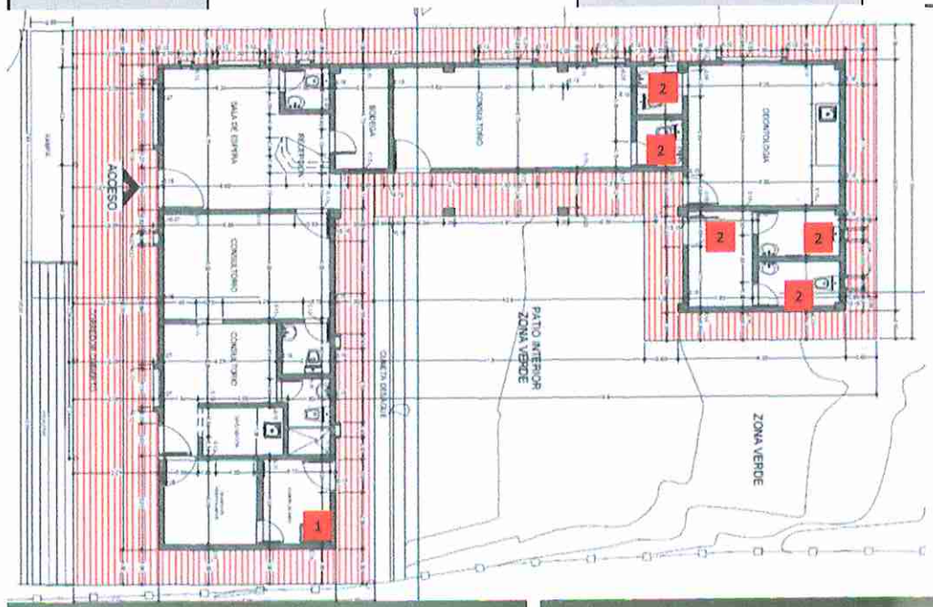





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO CN1				2,00	2,00
	BAÑO CN2				2,00	2,00
	BAÑO CN3				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						6,00
TOTAL						6,00

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	CÓDIGO: GPL-FO-024 VERSIÓN:01 PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

5,11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	REGISTRO 3/4"	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

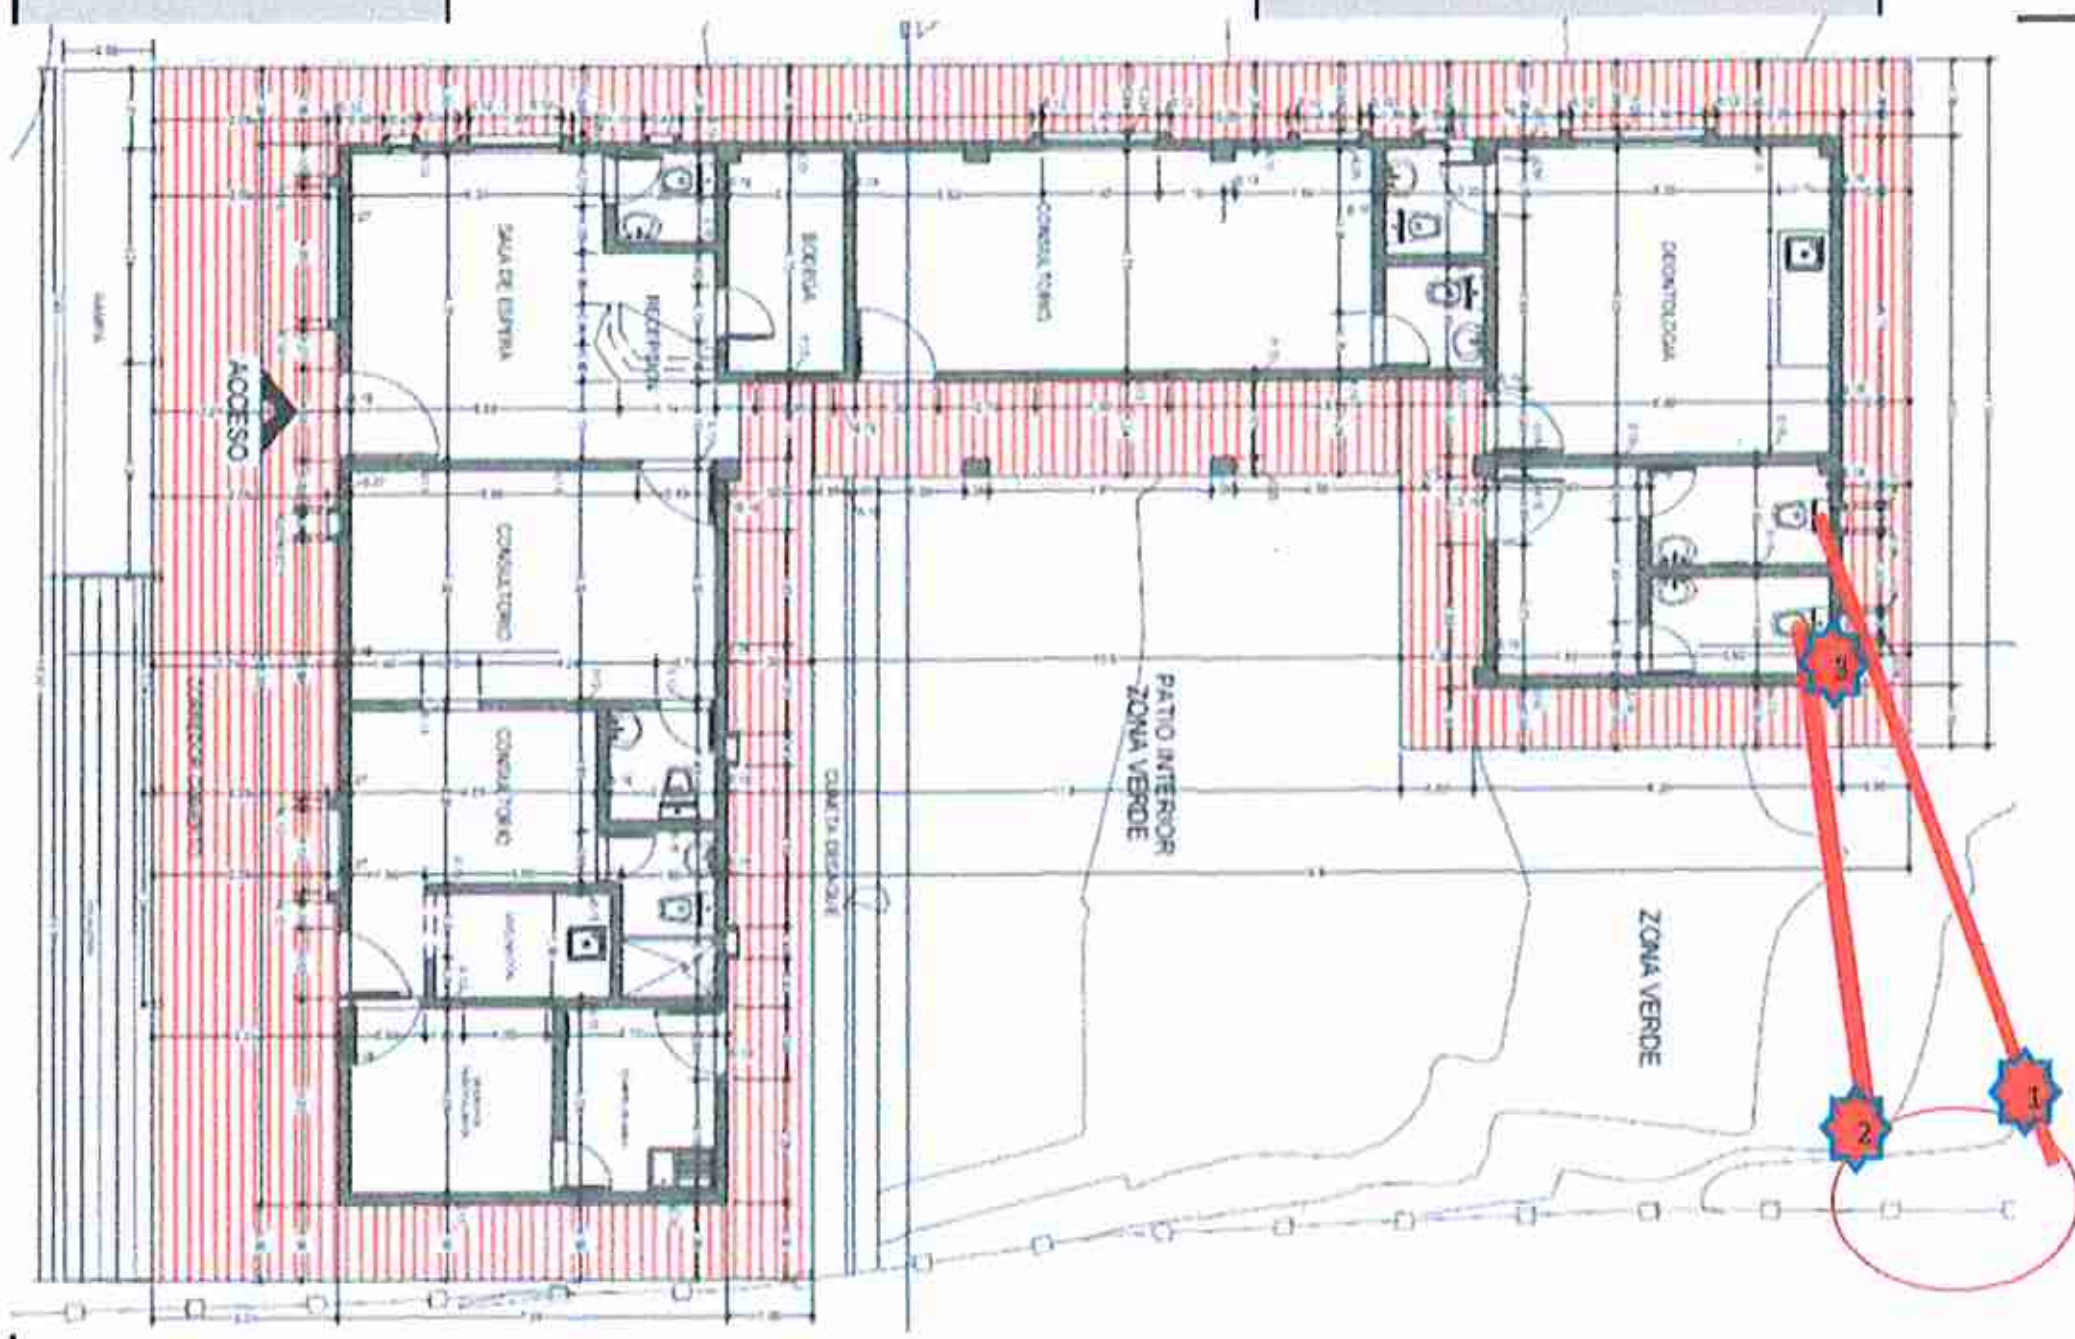

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	REGISTRO TAMQUE				3,00	3,00
Subtotal						3,00
TOTAL						3,00

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

5,13	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	PUNTO SANITARIO AIRE ACONDICIONADO 1/2"	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

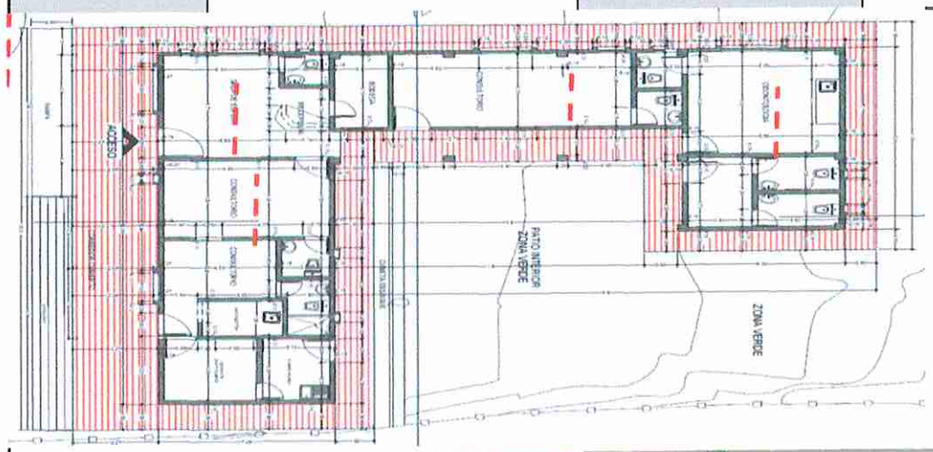





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CONSULTORIO 1				1,00	1,00
	CONSULTORIO 2				1,00	1,00
	CONSULTORIO 3				1,00	1,00
	CONSULTORIO 4				1,00	1,00
Subtotal						4,00
TOTAL						4,00

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN:01
PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON

6,01	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

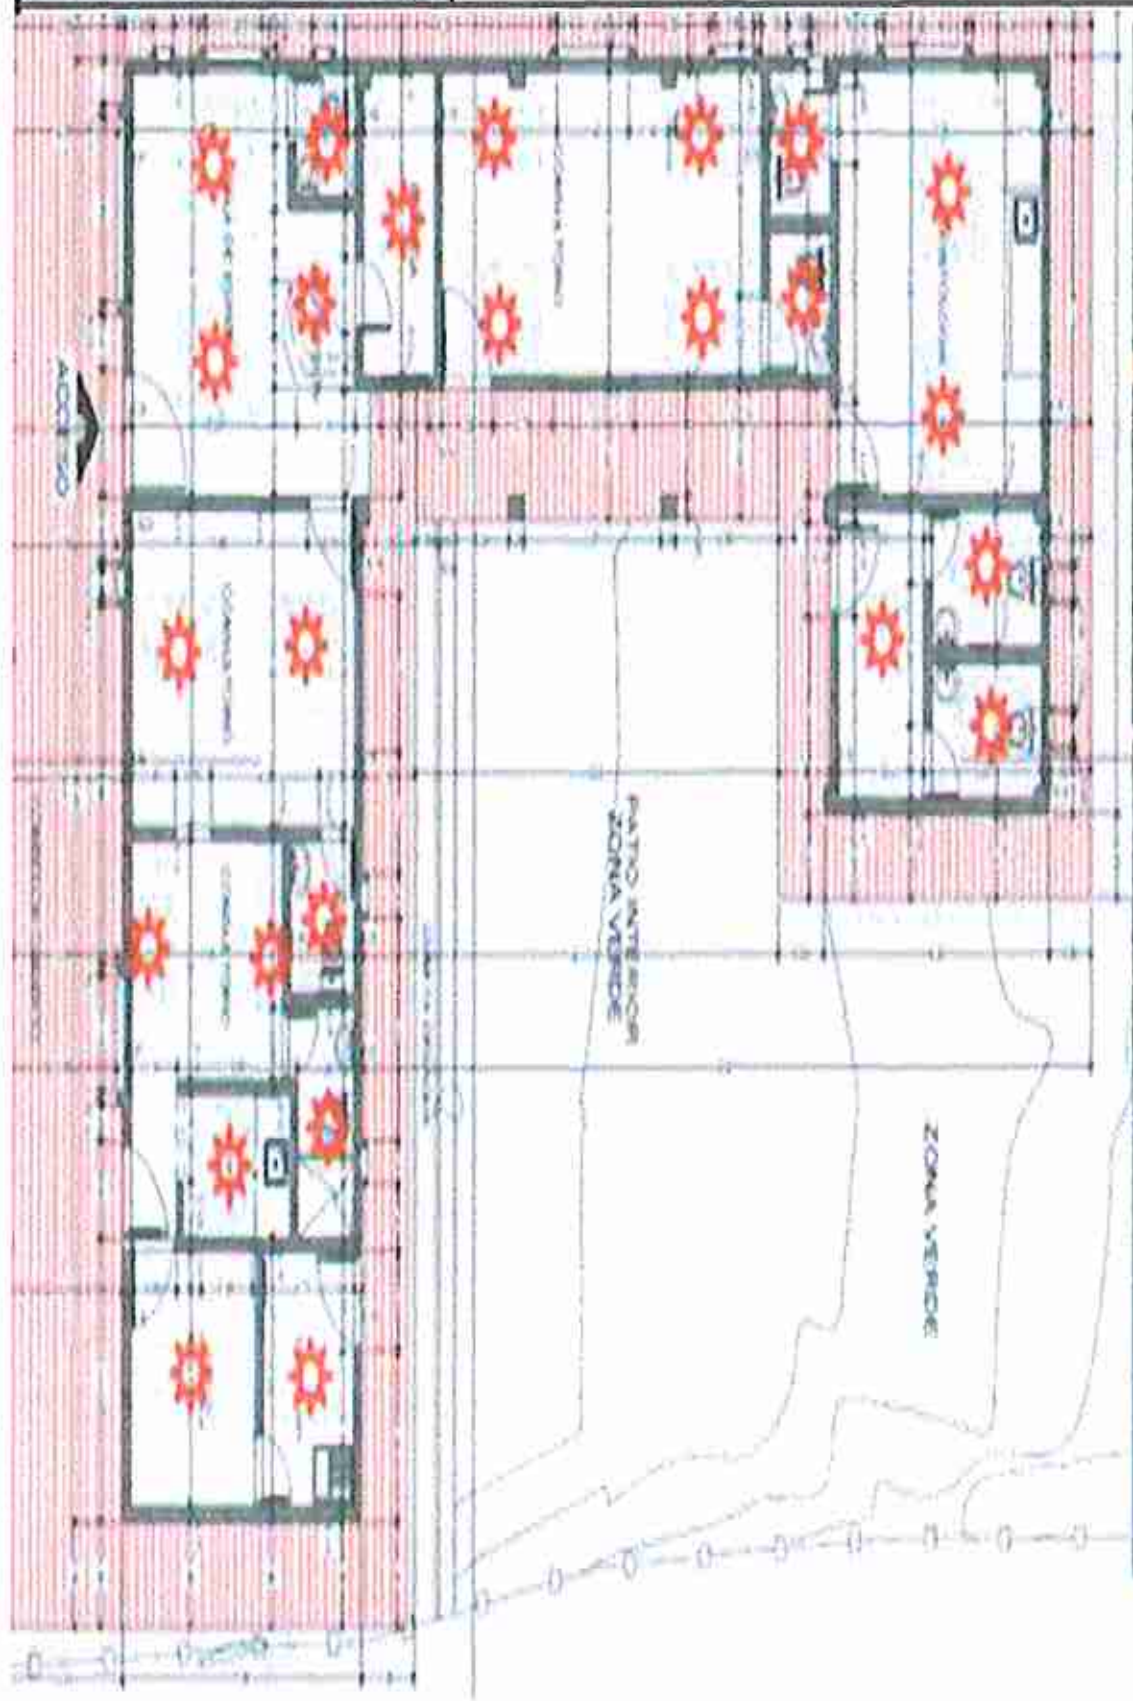



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	RESEPCION				5,00	5,00
	CONSULTORIO 1				3,00	3,00
	CONSULTORIO 2				4,00	4,00
	CONSULTORIO 3				5,00	5,00
	CONSULTORIO 4				3,00	3,00
	CUARTO ASEO				1,00	1,00
	CUARTO DESECHOS				1,00	1,00
	BOAÑO AUXILIAR 1				1,00	1,00
	BOAÑO AUXILIAR 2				1,00	1,00
	BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
	Subtotal					25,00
	TOTAL					**25,00**

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

6,02	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

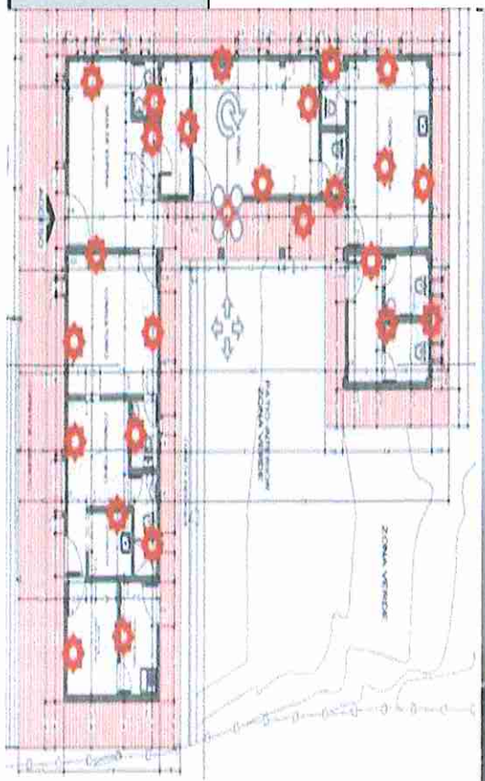



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CONSUL 1				3,00	3,00
	CONSUL 2				3,00	3,00
	CONSUL 3				3,00	3,00
	CONSUL 4				3,00	3,00
	BAÑO CONS 1				1,00	1,00
	BAÑO CONS 2				1,00	1,00
	BAÑO CONS 3				1,00	1,00
	BAÑO CONS 4				1,00	1,00
	RESEPCION				4,00	4,00
	BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
	BAÑO AUXILIAR 1				1,00	1,00
	BAÑO AUXILIAR 2				1,00	1,00
	BAÑO RESEPCION				1,00	1,00
	VACUNACION				3,00	3,00
	DESECHOS				1,00	1,00
	ASEO				1,00	1,00
	Subtotal					29,00
	TOTAL					29,00

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

6,04	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 "	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	RESEPCION			15,00		15,00
	CONSULTORIO 1			9,50		9,50
	CONSULTORIO 2			15,30		15,30
	CONSULTORIO 3			11,20		11,20
	CONSULTORIO 4			10,80		10,80
	BAÑO AUXILIAR 1			6,90		6,90
	BAÑO AUXILIAR 2			1,50		1,50
	BAÑO DISCAPACITADOS			1,00		1,00
	DESECHOS HOSPITALARIOS			4,80		4,80
	CUARTO ASEO			5,50		5,50
Subtotal						81,50
TOTAL						81,50

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

6,05	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

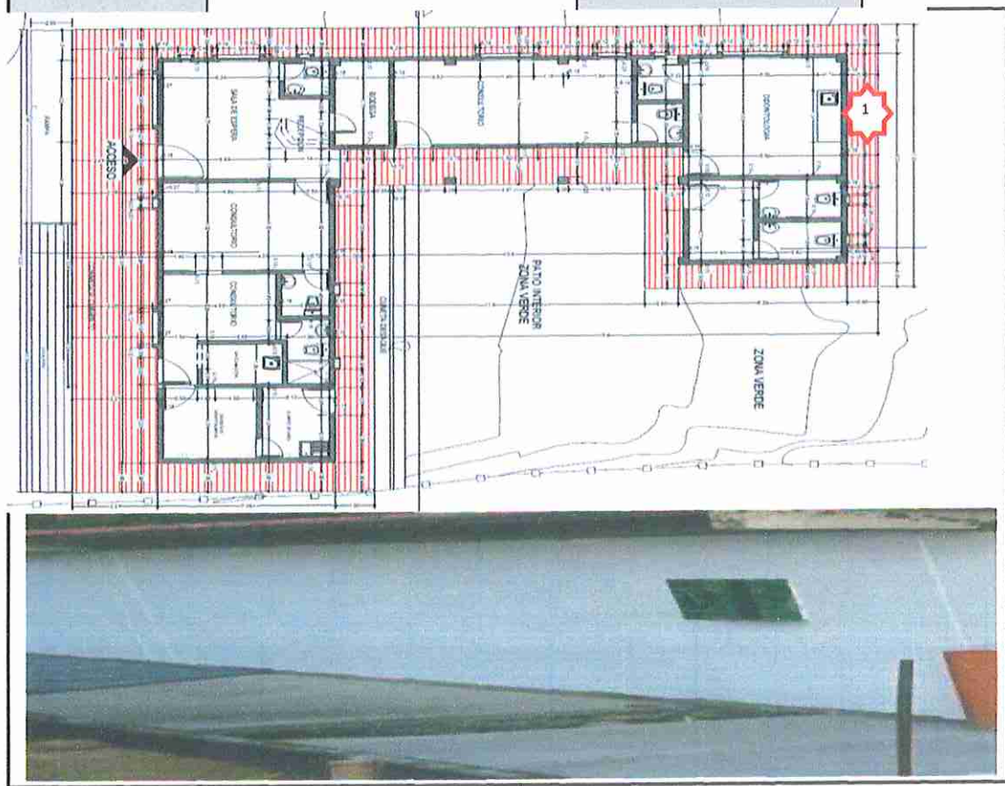

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PUNTO CONTADOR PARTE TRASERA				1,00	1,00
	Subtotal					1,00
	TOTAL					1,00

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

6,08	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	PUNTO ELECTRICO DE AIRE ACONDICIONADO	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

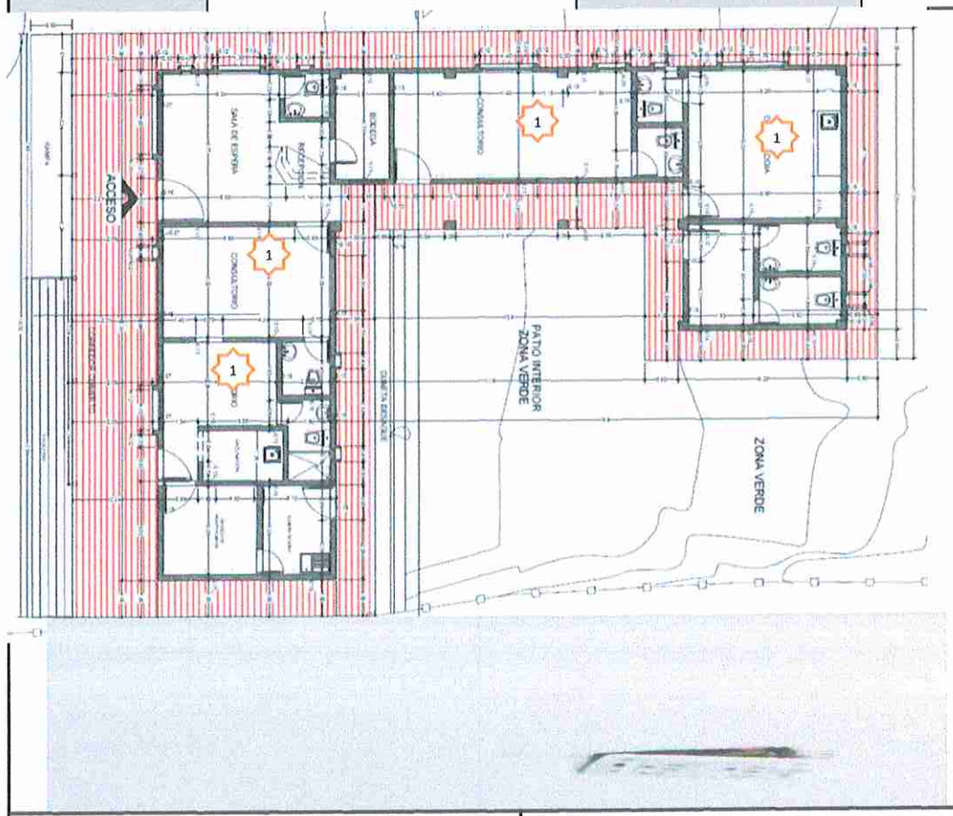

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CONSULTORI 1				1,00	1,00
	CONSULTORI 2				1,00	1,00
	CONSULTORI 3				1,00	1,00
	CONSULTORI 4				1,00	1,00
Subtotal						4,00
TOTAL						4,00

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

7,03	OBRAS DE URBANISMO	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ANDEN DE 2500 PSI (INCLUYE REFUERZO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

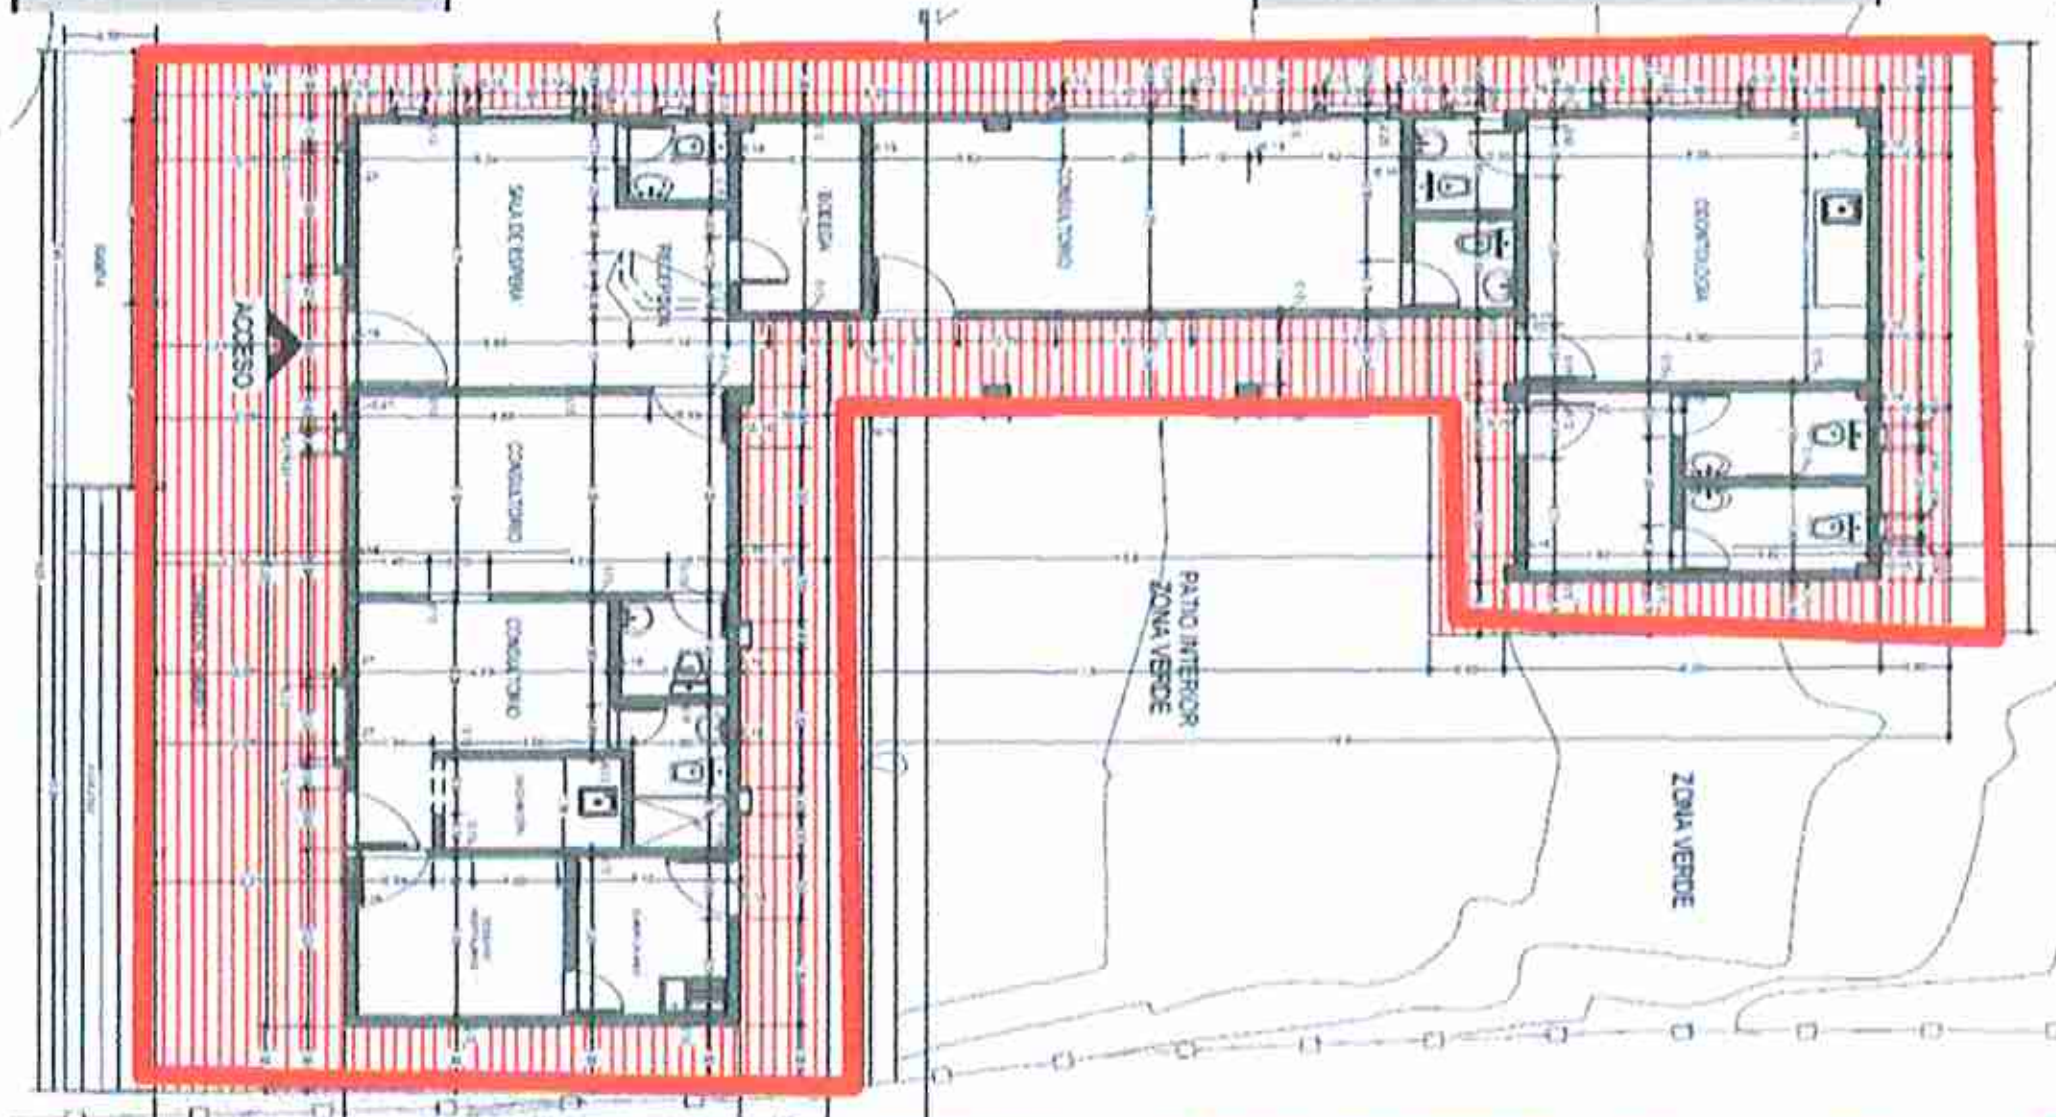

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	ANDEN FACCHADA PRINCIPAL	2,20		11,30	1,00	24,86
	ANDEN LATERAL IZQUIERDO	1,00		18,73	1,00	18,73
	ANDEN POSTERIOR	1,00		7,45	1,00	7,45
	ANDEN BAÑO AUXILIARES	1,00		5,25	1,00	5,25
	BAÑO DISCAPACITADOS	1,00		4,07	1,00	4,07
	ANDEN ENTRE RECEPCION Y ODONTOLOGIA	1,00		10,00	1,00	10,00
	ANDEN DE CUARTO ASEO	1,00		8,20	1,00	8,20
	ANDEN FRENTE MURO CONTENCIO...	1,00		5,67	1,00	5,67
	Subtotal					84,23
	TOTAL					**84,23**





ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

7,05	OBRAS DE URBANISMO	ITEM	TUBERIA PVC DRENAJE 100 MM SIN FILTRO	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

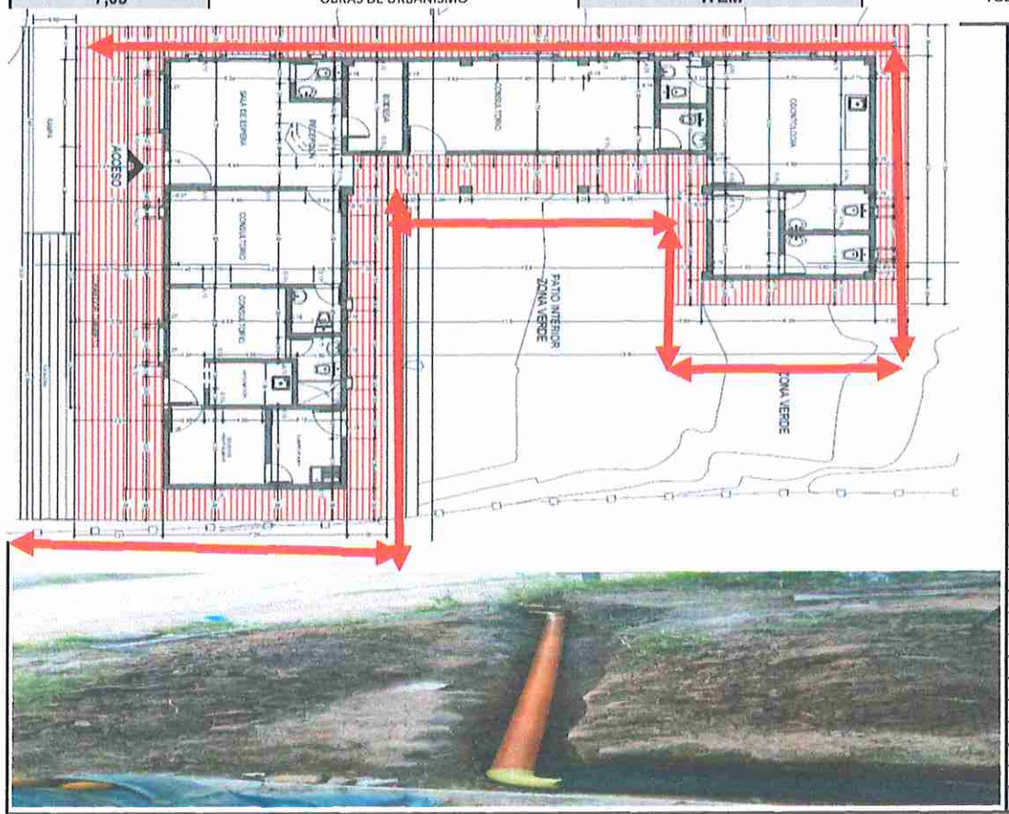

Fecha	Localización	Dimensiones			M2	Medida Total
		Ancho	Espesor	Longitud		
	FILTRO COSTADO IZQUIERDO DESAGUE			21,90		21,90
	FILTRO COSTADO IZQUIERDO			16,00		16,00
	FILTRO PARTE TRASERA			9,50		9,50
	FILTRO FRENTE A BAÑO			7,20		7,20
	ALIVIO FRENTE A BAÑO			3,50		3,50
	FILTRO COSTADO DERECHO			10,00		10,00
	FILTRO DE CUARTO ASEO A PUERTA RECEPCION			7,10		7,10
						-
						-
						-
						-
Subtotal						75,20
TOTAL						75,20

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA TABARES DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

7,06	OBRAS DE URBANISMO	ITEM	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE TAMAÑO ENTRE 19mm (3/4") Y 75mm (3")	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL

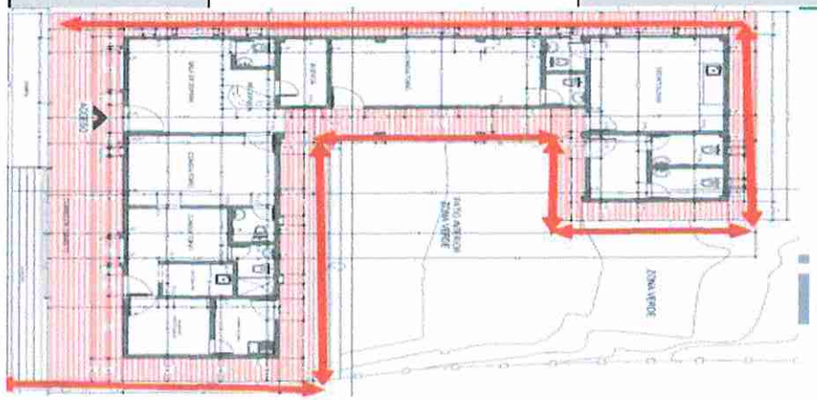



Fecha	Localización	Dimensiones			M3	Medida Total
		Ancho	Espesor	Longitud		
	FILTRO COSTADO IZQUIERDO DESAGUE	0,40	0,30	21,90	2,00	5,26
	FILTRO COSTADO IZQUIERDO	0,40	0,30	16,00	2,00	3,84
	FILTRO PARTE TRASERA	0,40	0,30	9,50	2,00	2,28
	FILTRO FRENTE A BAÑO ALVILLAR	0,40	0,30	7,20	2,00	1,73
	FILTRO FRENTE A BAÑO PILLAO Y FRENTE AL	0,40	0,30	3,50	2,00	0,84
	FILTRO DE CUARTO ASEO A	0,40	0,30	10,00	2,00	2,40
		0,40	0,30	9,00	0,98	1,06
	Subtotal					17,40
	TOTAL					17,40

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

7,07	OBRAS DE URBANISMO	ITEM	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 O SIMILAR, PARA FILTRACIÓN, DRENAJE Y SEPARACIÓN DE SUELOS (GEOSINTÉTICOS PERMEABLES DE POLIPROPILENO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL





Fecha	Localización	Dimensiones			M3	Medida Total
		Ancho	Espesor	Longitud		
	FILTRO COSTADO IZQUIERDO DESAGUE	1,00		21,90		21,90
	FILTRO COSTADO IZQUIERDO	1,00		16,00		16,00
	FILTRO PARTE TRASERA	1,00		9,50		9,50
	FILTRO FRENTE A BAÑO ALIVIAR	1,00		7,20		7,20
	FILTRO FRENTE A BAÑO PIEZA ADMITADOR	1,00		3,50		3,50
	FILTRO FRENTE AL CONSULTORIO 2	1,00		10,00		10,00
		1,00		6,90		6,90
Subtotal						75,00
TOTAL						75,00

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

9,01	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL

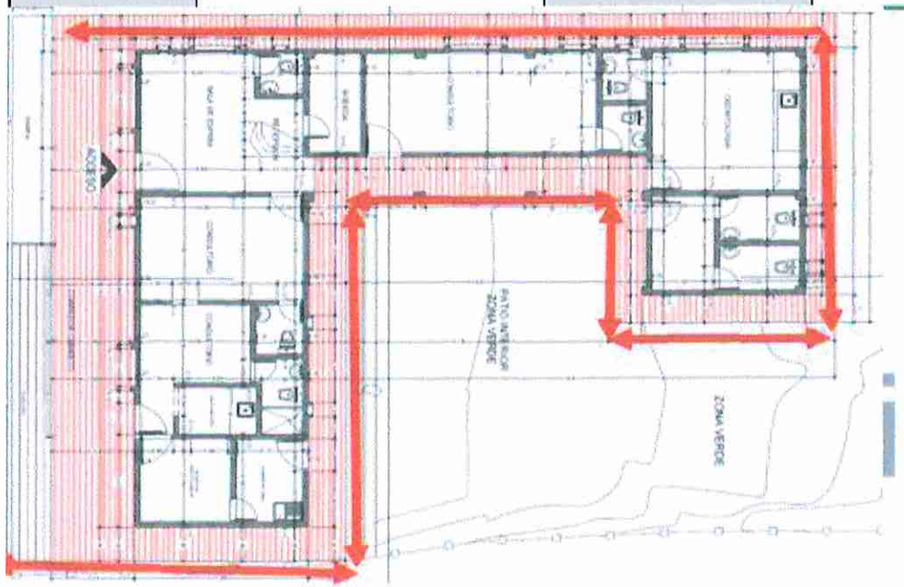



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FILTRO COSTADO IZQUIERDO DESAGUE	0,40	0,75	21,90		6,57
	FILTRO COSTADO IZQUIERDO	0,40	0,75	16,00		4,80
	FILTRO PARTE TRASERA	0,40	0,75	9,50		2,85
	FILTRO FRENTE A BAÑO AUXILIAR	0,40	0,75	7,20		2,16
	FILTRO FRENTE A BAÑO DISCAPACITADOS	0,40	0,75	3,50		1,05
	FILTRO FRENTE AL CONSULTORIO 3	0,40	0,75	10,00		3,00
	FILTRO DE CUARTO ASEO A PUERTA RESEPCION	0,40	0,75	8,50		2,55
	FRENTE A MURO DE CONTENCION	0,40	0,75	5,20		1,56
	VORDE DE MURO	0,40	0,75	25,00		7,50
	CRUCE PARA DESAGUE	0,40	0,75	5,00		1,50
	Subtotal					33,54
	TOTAL					33,54

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024 VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

9,02	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	RELLENO DE MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL

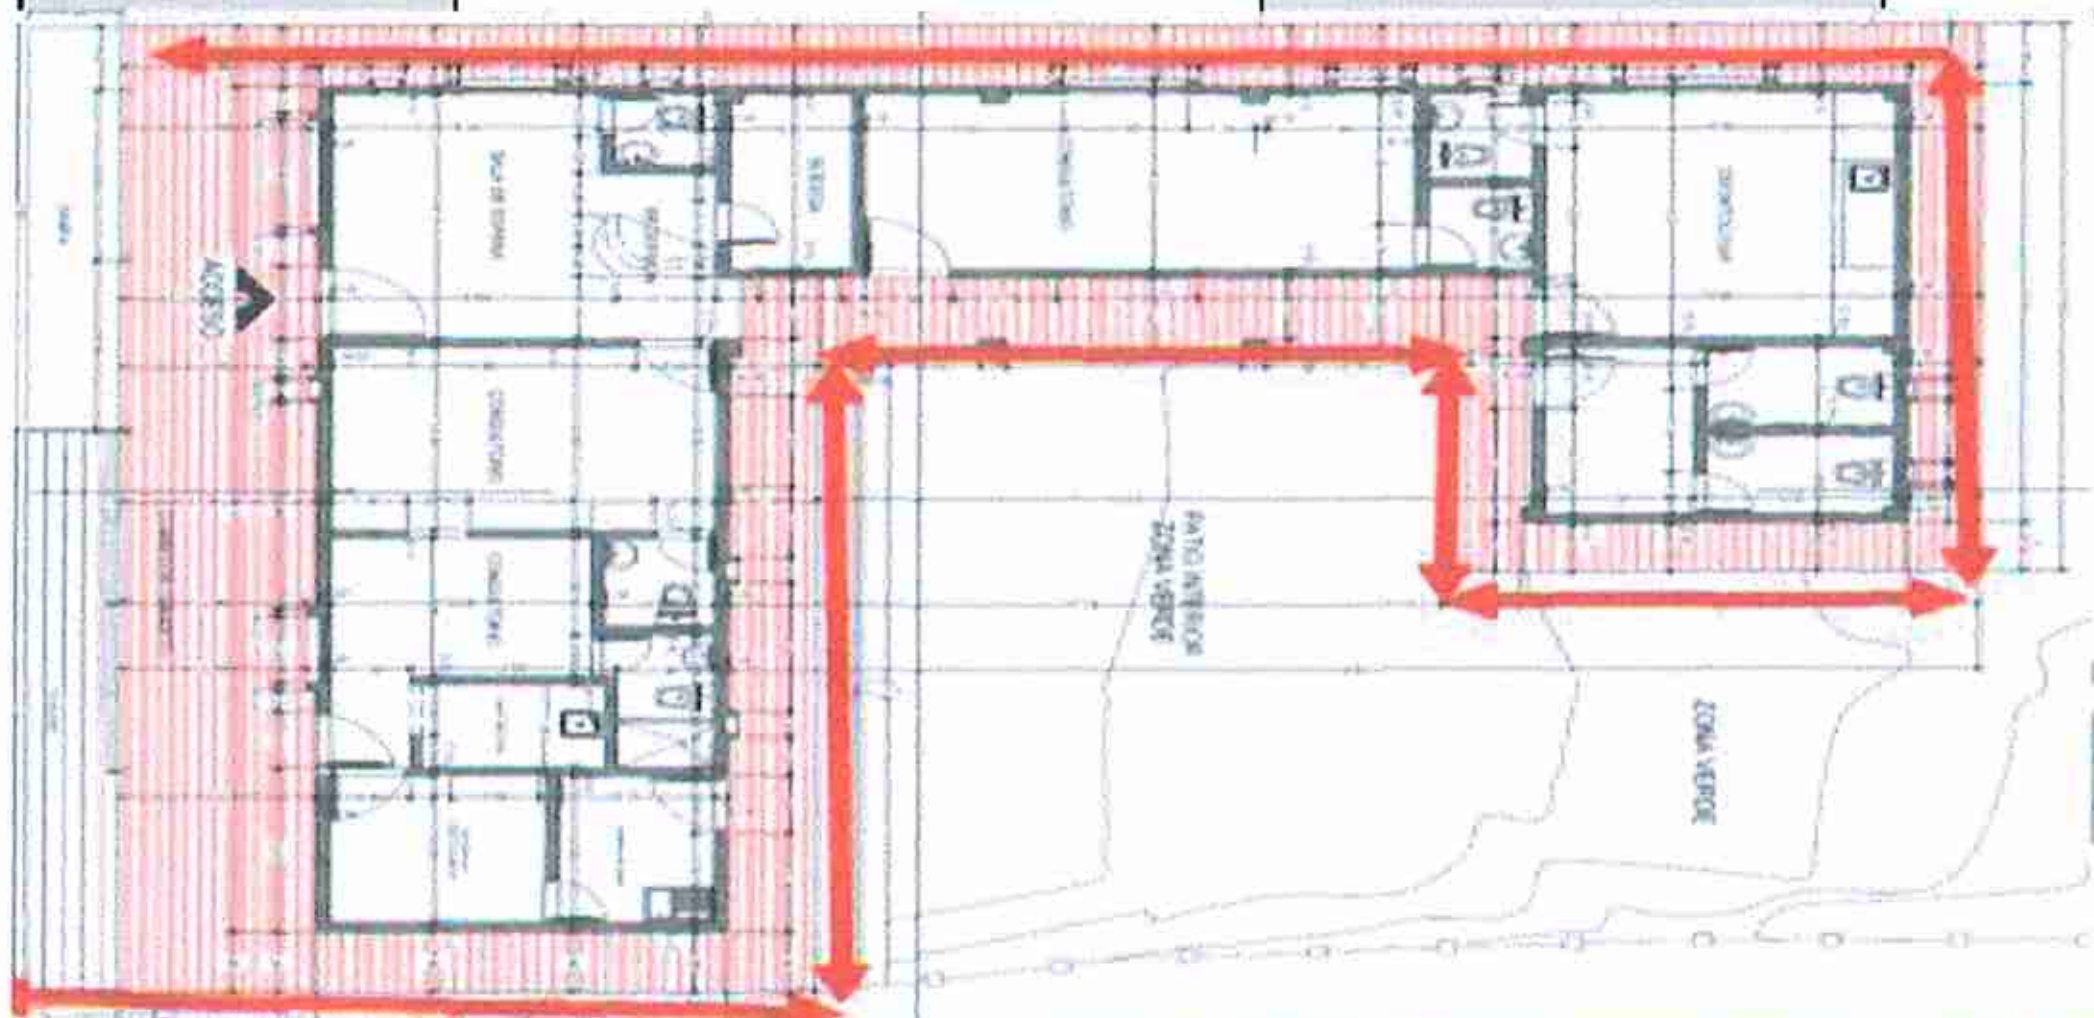





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FILTRO COSTADO IZQUIERDO DESAGUE	0,40	0,15	21,90		1,31
	FILTRO COSTADO IZQUIERDO	0,40	0,15	16,00		0,96
	FILTRO PARTE TRASERA	0,40	0,15	9,50		0,57
	FILTRO FRENTE A BAÑO AUXILIAR	0,40	0,15	7,20		0,43
	FILTRO FRENTE A BAÑO PICADA RETAPOS	0,40	0,15	3,50		0,21
	FILTRO FRENTE AL CONSULTORIO	0,40	0,15	10,00		0,60
	FILTRO DE CUARTO ASEO A PUERTA RECEPCION	0,40	0,15	8,50		0,51
	FRENTE A MURO DE CONTENCION	0,40	0,15	5,20		0,31
	VORDE DE MURO	0,40	0,15	25,00		1,50
	CRUCE PARA DESAGUE	0,40	0,15	5,00		0,30
	RELLENO MURO	0,60	2,00	25,00		30,00
	Subtotal					36,71
	TOTAL					**36,71**

ELABORO:		APROBO:
ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO GIRON E.S.E 2025		LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

11,02	PINTURAS	ITEM	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

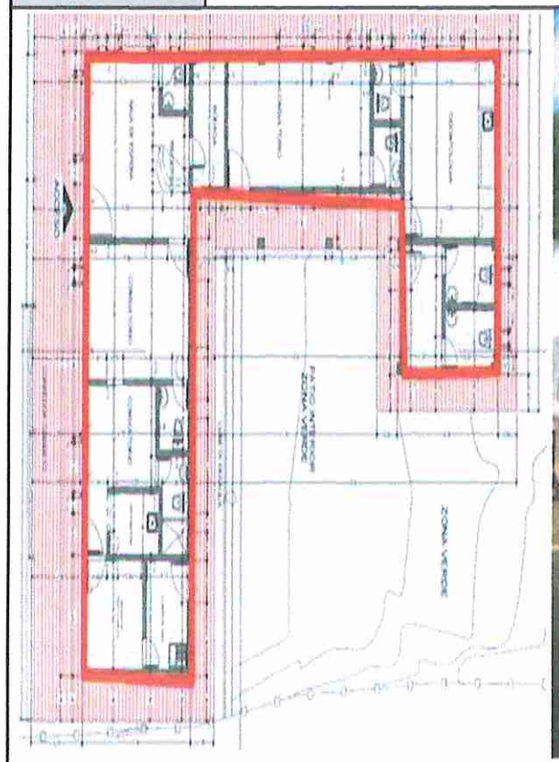

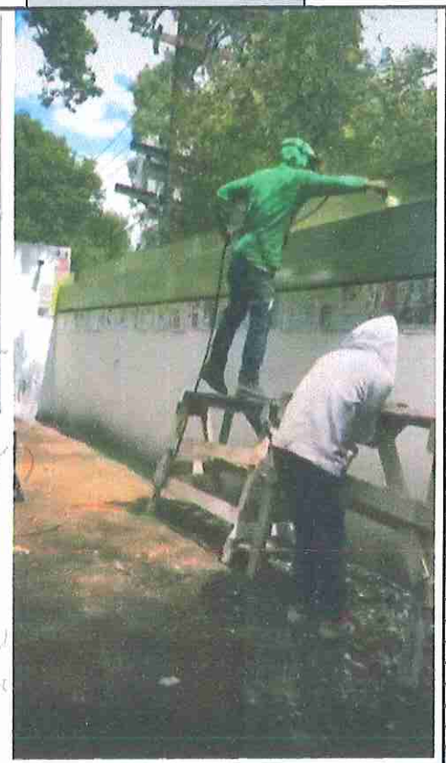

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA PRINCIPAL	1,00		9,63		9,63
	LATERAL IZQUIRDA	1,00		18,35		18,35
	PARTE POSTERIOR	1,00		8,10		8,10
	BAÑOS AUXILIARES	1,00		5,25		5,25
	BAÑO DISCAPACITADO	1,00		3,50		3,50
	CONSULTORIO 3	1,00		6,30		6,30
	CONSULTORIO 1 Y CUARTO ASEO	1,00		7,20		7,20
	FRENTE MURO CONTENCION	1,00		4,67		4,67
	Subtotal					63,00
	TOTAL					63,00

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

11,03	PINTURAS	ITEM	ESTUCO	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

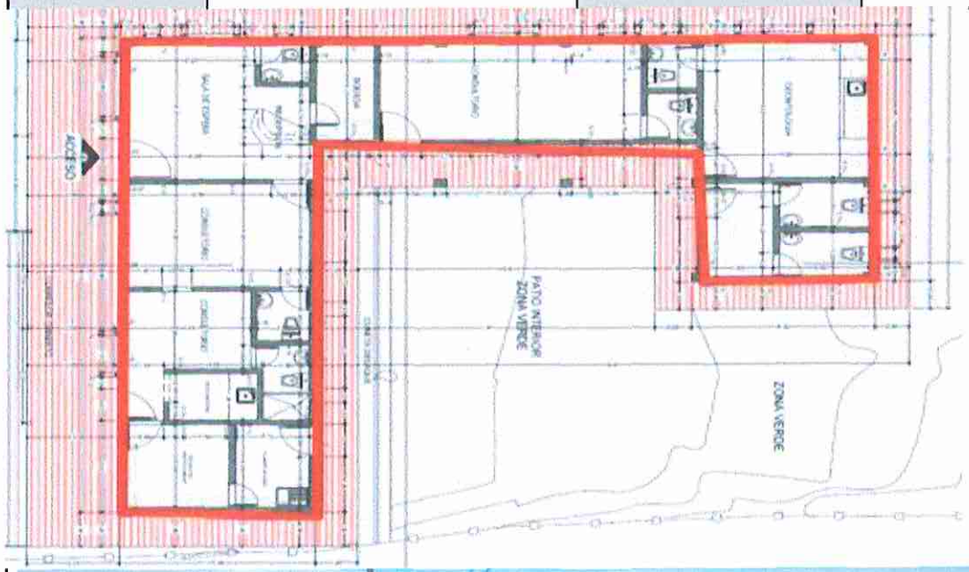



Fecha	Localización	Dimensiones			M2	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA BPINCIPAL	11,30	3,50		1,00	39,55
	FACHADA COSTADO IZQUIERDO	17,73	3,40		1,00	60,28
	FACHADA PARTE POSTERIOR	7,45	2,40		1,00	17,88
	FACHADA BAÑOS	5,25	3,00		1,00	15,75
	PARTE SUPERIOR BAÑOS	5,25	0,90		1,00	4,73
	BAÑO DISCAPACITADOS	3,07	3,00		1,00	9,21
	MOCGETA PUERTA ODONTOLOGIA	1,10	3,00		1,00	3,30
	PARTE SUPERIOR PUERTA ODONTOLOGIA	1,00	1,50		1,00	1,50
	CONSULTORIO 3	9,00	4,00		1,00	36,00
	DE PUERTA RESEPCION A CUARTO ASEO FACHADA	7,20	3,40		1,00	24,48
	CUARTO ASEO MOCHETA	2,56	2,50		1,00	6,40
	FACHADA FRENTE MURO CONTENCION	2,56	2,50		1,00	6,40
	COLUMNAS	1,60	4,00		3,00	19,20
	PARTE SUPERIOR VOLADO	9,00	0,60		1,00	5,40
	BAÑO SUPERIOR CONSULTORIO 1	1,42	0,75		2,00	2,13
	BAÑO SUPERIOR CONSULTORIO 1	1,25	0,75		2,00	1,88
	BAÑO SUPERIOR CONSULTORIO 2	2,23	0,75		2,00	3,35
	BAÑO SUPERIOR CONSULTORIO 2	1,10	0,75		2,00	1,65
	BAÑO SUPERIOR CONSULTORIO 3	1,34	0,75		2,00	2,01
	BAÑO SUPERIOR CONSULTORIO 3	1,17	0,75		2,00	1,76
	BAÑO SUPERIOR CONSULTORIO 4	1,17	0,75		2,00	1,76
	BAÑO SUPERIOR CONSULTORIO 4	1,34	0,75		2,00	2,01
	BAÑO SUPERIOR DISCAPACITADOS	2,85	0,75		2,00	4,28
	BAÑO SUPERIOR DISCAPACITADOS	1,78	0,75		2,00	2,67
	BAÑO AUXILIAR 1	2,80	0,75		2,00	4,20
	BAÑO AUXILIAR 1	1,43	0,75		2,00	2,15
	BAÑO AUXILIAR 2.	2,80	0,75		2,00	4,20
	BAÑO AUXILIAR 2.	1,50	0,75		2,00	2,25
	VACUNCION	2,10	0,75		2,00	3,15
	VACUNCION	1,42	0,75		2,00	2,13
	CUARTO DESECHOS	2,38	0,75		2,00	3,57
	CUARTO DESECHOS	2,41	0,75		2,00	3,62
	CUARTO ASEO	1,88	0,75		2,00	2,82
	CUARTO ASEO	2,41	0,75		2,00	3,62
Subtotal						265,70
TOTAL						265,70

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

NP 13.04	ITEM NO PREVISTOS	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMATICO CON TACOS ENCHUFABLES	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

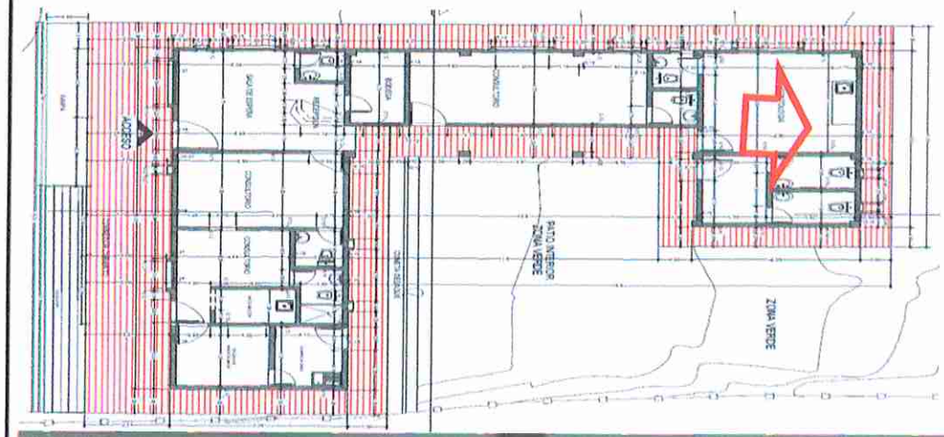



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	ODONTOLOGIA				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						1,00
TOTAL						1,00

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR
