UT Corredores Verdes 2025

Formato del acta MPA-01-F-23
ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ACTA PARCIAL N°: 2 ACTA FINAL

<table>
<tr><td>CONTRATO No y FECHA</td><td>LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>Obra</td></tr>
<tr><td>LUGAR Y FECHA DEL ACTA</td><td>San José de Cúcuta, 10 de Febrero de de 2026</td></tr>
<tr><td>No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA</td><td>1405 del 19 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (1.559.614.622,00), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.</td></tr>
<tr><td>FUENTE DE FINANCIACIÓN</td><td>
<table>
<tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>14</td><td>EVALUACIÓN</td><td>$</td></tr>
<tr><td>15</td><td>SOBRETASA AMBIENTAL</td><td>$</td></tr>
<tr><td>17</td><td>SEGUIMIENTOS</td><td>$</td></tr>
<tr><td>18</td><td>TASA POR USO DE AGUA</td><td>$</td></tr>
<tr><td>23</td><td>TASA RETRIBUTIVA</td><td>$</td></tr>
<tr><td>24</td><td>SECTOR ELÉCTRICO</td><td>$</td></tr>
<tr><td>21</td><td>RENTAS CONTRACTUALES</td><td>$ 1.536.000.000,00</td></tr>
<tr><td>27</td><td>CERTIFICACIONES</td><td>$ 23.614.622,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>nueve (9) meses.</td></tr>
<tr><td>ASISTENTES</td><td>UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
Contratista

UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
Interventor

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Supervisor</td></tr>
<tr><td>COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR</td><td>Del 01 al 31 de Enero del 2026</td></tr>
<tr><td>VALOR A COBRAR</td><td>DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 244,806,290.00)</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA</td><td>Porcentaje de ejecución 20.30 %</td></tr>
</table>

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE **($ 316,573,062.00)**
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Limpieza general y deshierbe, Excavación y nivelación, Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación,Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico), suministro de Veranes, agaves, Palma Bismarckia, Palma Real, Palma Botella, Palma Manila, Palma Roubellina, Cordyline, Cancion de la india, Cheflera Variegada, Amancay, Phillodendro Sellium, Pandanus Variagado, Veranera Tallo alto, Flor del Llano, Árbol Carbonero, Árbol oiti y plantas Rastreras.

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$1.559.614.622,00
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$1.559.614.622,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$ 71.766.772,00
Primer pago Acta No 1	$ 71.766.772,00	$0,00
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 244,806,290.00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 1,243,041,560.00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El INTERVENTOR / SUPERVISOR del contrato hace constar, que el contratista, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	0306000100056599 Cuenta Corriente banco BBVA
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

Formato del avance de obra acumulado y ejecutado en el periodo del acta MPA-01-F-26 INFORME MENSUAL OBRA EJECUTADA

Corponor

CUADRO INFORME MENSUAL OBRA EJECUTADA

MPA-01-F-26, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**	UT Corredores Verdes 2025	**CONTRATO No.:**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**	UNION TEMPORAL INTER VERDES
OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.		**OBJETO:**	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	
CONTRATISTA:	**EDINSON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025**		**INTERVENTOR:**	**NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES 2025**	

PERIODO REPORTADO	
DESDE:	1/1/2026
HASTA:	1/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION			TOTAL CONTRATADO		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**
1	**DIAGNOSTICO**															
1,1	Analisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$0.00	1.00	$9,398,169.00	0.30	$ 2,819,451.00		$ - .00	0.30	$ 2,819,451.00
1,2	Identificacion de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$0.00	1.00	$2,184,229.00	0.30	$ 655,269.00		$ - .00	0.30	$ 655,269.00
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$0.00	1.00	$2,135,276.00	0.30	$ 640,583.00		$ - .00	0.30	$ 640,583.00
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ - .00		$ - .00		$ -
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$6,069,425.00	21,289.22	$28,783,025.00	3,328.21	$ 4,499,740.00	2,895.52	$ 3,914,743.00	6,223.73	$ 8,414,483.00
2,2	Excavacion y nivelacion	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00		(240.00)	-$14,424,000.00	600.00	$36,060,000.00	332.84	$ 20,003,684.00	98.76	$ 5,935,596.00	431.60	$ 25,939,280.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- .00	$0.00	50.00	$33,510,000.00		$ - .00		$ - .00	-	$ -
2,4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	-$33,778,450.00	860.24	$34,602,350.00	649.03	$ 26,106,583.00		$ - .00	649.03	$ 26,106,583.00
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$96,133,265.00	8,551.26	$96,133,265.00			2,895.52	$ 32,551,436.00	2,895.52	$ 32,551,436.00
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y organico)	m3	1,680.00	$ 117,873.00	$ 198,026,640.00	(-)	(1,126.0)	-$132,720,834.00	554.0	$65,305,806.00		$ -	98.76	$ 11,641,373.00	98.76	$ 11,641,373.23
3,2	**siembra de material vegetal**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	2,120.00	$ 33,942.00	$ 71,957,040.00	(-)	(1,820.00)	-$61,774,440.00	300.00	$10,182,600.00		$ -	153.00	$ 5,193,126.00	153.00	$ 5,193,126.00
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	1,918.00	$ 41,798.00	$ 80,168,564.00	(-)	(1,818.00)	-$75,988,764.00	100.00	$4,179,800.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00	100.00	$ 4,179,800.00
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	620.00	$ 46,798.00	$ 29,014,760.00	(-)	(520.00)	-$24,334,960.00	100.00	$4,679,800.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	125.00	$ 66,974.00	$ 8,371,750.00	(-)	(125.00)	-$8,371,750.00	- .00	$0.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,5	Suministro de material vegetal especiel Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	247.00	$ 86,974.00	$ 21,482,578.00	(-)	(247.00)	-$21,482,578.00	- .00	$0.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	420.00	$ 26,974.00	$ 11,329,080.00	(-)	(320.00)	-$8,631,680.00	100.00	$2,697,400.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1,500.00	$ 16,090.00	$ 24,135,000.00	(-)	(1,400.00)	-$22,526,000.00	100.00	$1,609,000.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2,500.00	$ 11,090.00	$ 27,725,000.00	(-)	(2,400.00)	-$26,616,000.00	100.00	$1,109,000.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	1,000.00	$ 12,737.00	$ 12,737,000.00	(-)	(900.00)	-$11,463,300.00	100.00	$1,273,700.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1,820.00	$ 14,090.00	$ 25,643,800.00	(-)	(1,620.00)	-$22,825,800.00	200.00	$2,818,000.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	85.00	$ 64,778.00	$ 5,506,130.00	(-)	(85.00)	-$5,506,130.00	- .00	$0.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00		- .00	$0.00	20.00	$401,800.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00		- .00	$0.00	80.00	$1,607,200.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	6,250.00	$ 17,290.00	$ 108,062,500.00	(-)	(5,250.00)	-$90,772,500.00	1,000.00	$17,290,000.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	0.00	$ 426,984.00	$ -	(+)	80.00	$34,158,720.00	80.00	$34,158,720.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	0.00	$ 390,942.00	$ -	(+)	80.00	$31,275,360.00	80.00	$31,275,360.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	0.00	$ 535,942.00	$ -	(+)	14.00	$7,503,188.00	14.00	$7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00	14.00	$ 7,503,188.00
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	0.00	$ 410,942.00	$ -	(+)	50.00	$20,547,100.00	50.00	$20,547,100.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	35.00	$13,566,315.00	35.00	$13,566,315.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	36.00	$19,353,924.00	36.00	$19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00	36.00	$ 19,353,924.00
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	9.00	$4,838,481.00	9.00	$4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00	9.00	$ 4,838,481.00

Corponor

CUADRO INFORME MENSUAL OBRA EJECUTADA

MPA-01-F-26, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**	UT Corredores Verdes 2025	**CONTRATO No.:**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**	**PERIODO REPORTADO**
OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.		**OBJETO:**	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**DESDE:** 1/1/2026
CONTRATISTA:	**EDINSON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025**		**INTERVENTOR:**	**NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES 2025**	**HASTA:** 1/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION			TOTAL CONTRATADO		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	80.00	$31,008,720.00	80.00	$31,008,720.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 422,609.00	$ -	(+)	80.00	$33,808,720.00	80.00	$33,808,720.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00	10.00	$ 4,226,090.00
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	0.00	$ 389,275.00	$ -	(+)	80.00	$31,142,000.00	80.00	$31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00	80.00	$ 31,142,000.00
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	0.00	$ 61,825.00	$ -	(+)	300.00	$18,547,500.00	300.00	$18,547,500.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00	221.00	$ 13,663,325.00
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 61,942.00	$ -	(+)	150.00	$9,291,300.00	150.00	$9,291,300.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 62,442.00	$ -	(+)	200.00	$12,488,400.00	200.00	$12,488,400.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00	55.00	$ 3,434,310.00
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	180.00	$10,819,620.00	180.00	$10,819,620.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00	100.00	$ 6,010,900.00
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	100.00	$6,010,900.00	100.00	$6,010,900.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	0.00	$ 26,442.00	$ -	(+)	1,000.00	$26,442,000.00	1,000.00	$26,442,000.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	400.00	$21,643,600.00	400.00	$21,643,600.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00	85.00	$ 4,599,265.00
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	0.00	$ 26,775.00	$ -	(+)	250.00	$6,693,750.00	250.00	$6,693,750.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	250.00	$13,527,250.00	250.00	$13,527,250.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	500.00	$27,054,500.00	500.00	$27,054,500.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00	259.00	$ 14,014,231.00
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	235.00	$12,715,615.00	235.00	$12,715,615.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00	32.00	$ 1,731,488.00
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	0.00	$ 57,442.00	$ -	(+)	60.00	$3,446,520.00	60.00	$3,446,520.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00	38.00	$ 2,182,796.00
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,609.00	$ -	(+)	500.00	$13,304,500.00	500.00	$13,304,500.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 27,942.00	$ -	(+)	22.00	$614,724.00	22.00	$614,724.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	1,000.00	$26,109,000.00	1,000.00	$26,109,000.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00	50.00	$ 1,305,450.00
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	100.00	$2,610,900.00	100.00	$2,610,900.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 55,275.00	$ -	(+)	20.00	$1,105,500.00	20.00	$1,105,500.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$4,807,854.00	37.00	$4,807,854.00		$ -	5.00	$ 649,710.00	5.00	$ 649,710.00
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$4,807,854.00	37.00	$4,807,854.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00	19.00	$ 2,468,898.00
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	0.00	$ 54,942.00	$ -	(+)	50.00	$2,747,100.00	50.00	$2,747,100.00		$ -		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	900.00	$15,885,000.00	900.00	$15,885,000.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00	60.00	$ 1,059,000.00
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	250.00	$4,412,500.00	250.00	$4,412,500.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00		- .00	$0.00	285.92	$32,272,271.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	203.00	$ 128,873.00	$ 26,161,219.00	(-)	(103.00)	-$13,273,919.00	100.00	$12,887,300.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$0.00	2.00	$4,180,400.00		$ -		$ - .00	-	$ -
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$0.00	2.00	$5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00	2.00	$ 5,076,400.00
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ -		$ - .00	-	$ -
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$0.00	672.00	$52,080,000.00		$ -		$ - .00	-	$ -
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$0.00	47,600.00	$64,355,200.00		$ -		$ - .00	-	$ -

Corponor

CUADRO INFORME MENSUAL OBRA EJECUTADA

MPA-01-F-26, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**	**CONTRATO No.:**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**	**PERIODO REPORTADO**
OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**OBJETO:**	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**DESDE:** 1/1/2026
CONTRATISTA:	**EDINSON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025**	**INTERVENTOR:**	**NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES 2025**	**HASTA:** 1/31/2026

UT Corredores Verdes 2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION			TOTAL CONTRATADO		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$0.00	15,400.00	$86,886,800.00		$ -		$ - .00	-	$ -
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$0.00	11,000.00	$32,395,000.00		$ -		$ - .00	-	$ -
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00		- .00	$0.00	1,075.12	$43,157,326.00		$ -		$ - .00	-	$ -
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ -		$ - .00	-	$ -
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$0.00	2,500.00	$27,735,000.00		$ -		$ - .00	-	$ -
COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL					**$ 1,189,274,532**			**$0.00**		**$1,189,274,532.00**		**$ 54,725,310.00**		**$ 186,675,530.00**		**$ 241,400,840.23**
ADMINISTRACION(22%)				22%	$ 261,640,397.00			$0.00		$261,640,397.00		$ 12,039,568.20		$ 41,068,616.60		$ 53,108,184.85
IMPREVISTOS (2%)				2%	$ 23,785,491.00			$0.00		$23,785,491.00		$ 1,094,506.20		$ 3,733,510.60		$ 4,828,016.80
UTILIDADES (6%)				6%	$ 71,356,472.00			$0.00		$71,356,472.00		$ 3,283,518.60		$ 11,200,532.00		$ 14,484,050.41
IVA sobre utilidad 19%)				19%	$ 13,557,730.00			$0.00		$13,557,730.00		$ 623,868.53		$ 2,128,101.00		$ 2,751,969.58
VALOR TOTAL					**$ 1,559,614,622.00**			**$0.00**		**$1,559,614,622.00**		**$ 71,766,772.00**		**$ 244,806,290.00**		**$ 316,573,062.00**
PORCENTAJE DE AVANCE												**4.60%**		**15.70%**		**20.30%**

AVANCE FÍSICO : **20.30%**

OBSERVACIONES:

Edinson Ramiro Castro Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Nelson David Acevedo Torres
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL INTER VERDES

Luis Carlos Carvajalino Rodriguez
SUPERVISOR - CORPONOR
JEFE DE OFICINAS DE PROYECTOS DE CORPONOR

UT Corredores Verdes
2025

Factura (Sin tachones, ni enmendaduras)

PAGE - MEMBRETE FORMAT

UT Corredores Verdes 2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-2
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 06/02/2026 15:28:18
FEC. VENCE: 16/02/2026
VAL. DIAN: 06/02/2026 03:32:26

CUFE: 422f77dea9344d83d8cbb973e09f438397a9f9ae64b7418ac2b8a7bf551272ff207e260ec4f278a79058b46f79b4dcb9

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
NIT: 902018300-6
Dirección: 1 - Cúcuta
Teléfonos:
Email: CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
NIT: 890505253-4
Dirección: CALLE 13 AVENIDA EL BOSQUE No. 3E-278 CAOBOS - Cúcuta
Teléfonos:
Email: DPENA@CORPONOR.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	02	1.00	UND	Pago de Acta de recibo Parcial N°2 - CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 cuyo objeto es ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, P	186,675,530.00	0	0	0.00	186,675,530.00	186,675,530.00

Total items: 1

Totales

Subtotal:		186,675,530.00
Administración	**22% :**	41,068,616.60
Imprevistos	**2%:**	3,733,510.60
Utilidad	**6%:**	11,200,532.00
Iva sobre Utilidad	**19%:**	2,128,101.00
IVA:		0.00
ICO:		0.00
BASE EXENTA:		0.00
VALOR NETO:		244,806,290.00

Total Cantidades: 1
Monto en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Pago de Acta de recibo Parcial N°2-CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 cuyo objeto es ESTABLECIMIENTO,CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES,REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764103791888 con Prefijo FE desde 1 hasta 50 con vigencia desde 29/12/2025 hasta 29/12/2027

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Certificación de paz y salvo en pago de aportes, seguridad integral del periodo a cobrar expedida por el representante legal.

UT Corredores Verdes
2025

San José de Cúcuta, 9 de febrero de 2026

Señor
Rafael Humberto Camacho Carrillo
Director General
CORPONOR
San José de Cúcuta

REFERENCIA: CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo , **EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ**, identificado con cedula de ciudadanía número **1090379197**, expedida en Cúcuta en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales. Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, desde los últimos seis meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en el mes de febrero de 2026, en San José de Cúcuta.

EDISON RAMIRO CASTRO H.
C.C. 1090379197 de Cúcuta
Representante Legal

LA SUSCRITA INTERVENTORIA CUYO CONTRATO LIC 731-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO

CERTIFICA

Qué, UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025, identificado con el NIT 902018300- 6, cuyo Representante Legal es EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ , identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.090.379.197 de Cúcuta, cumplió a satisfacción con el objetivo del contrato en mención, de acuerdo con lo consignado en el informe de acta parcial No. 02 correspondiente al periodo del 01 de enero del 2026 al 31 de enero del 2026

Que presentó pagos de pensión, salud, riesgos profesionales y parafiscales del personal que ha laborado en la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

PERIODO	PLANILLA	VALOR PAGADO	OPERADOR
Enero -2026	36227624	7.913.800	Asopagos

San José de Cúcuta, 10 de Febrero 2026

Sin otro Particular

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
CC.1.090.490.104 de Cúcuta
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

Planillas de pago del periodo a cobrar

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET	3022726357	CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36227624	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.913.800	5.500	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
20	36227624	2026-02-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13195283	GUTIERREZ PEÑARANDA JESUS ALBEIRO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
2	CC 13719287	SUAREZ DELGADO LUIS FERNANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
3	CC 13928770	SALAZAR GOYENECHE JOSE ALEXANDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
4	CC 88001405	MEJIA CAICEDO ISMAEL	1.750.905	F	X															0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.517.451	242.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.517.451	60.700	COMFAORIENTE-CCF36	1.517.451	60.700	1.517.451	15.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	380.100	S	2024001
5	CC 1005066478	FERNANDEZ JAUREGUI JUAN MANUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
6	CC 1090174911	BENITEZ CARVAJAL FREDDY ALONSO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
7	CC 1090175835	CAÑAS PEÑARANDA LUIS CARLOS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
8	CC 1090176560	DIAZ TOLOZA MIGUEL HUMBERTO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
9	CC 1090177446	LOPEZ RAMIREZ ALAN KENNY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
10	CC 1090379197	CASTRO HERNANDEZ EDISON RAMIRO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAORIENTE-CCF36	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	626.100	S	2024001
11	CC 1090461423	HERNANDEZ BOHORQUEZ ARIANA PRHISTLEY	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAORIENTE-CCF36	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	626.100	S	2024001
12	CC 1092342880	TORRES GALINDO WILMER ALEXANDER	1.750.905	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	466.908	74.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	466.908	18.700	COMFAORIENTE-CCF36	466.908	18.700	466.908	4.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	117.100	S	2024001
13	CC 1092386993	USECHE BETANCOURT JUNIOR ALEXANDER	1.750.905	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	466.908	74.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	466.908	18.700	COMFAORIENTE-CCF36	466.908	18.700	466.908	4.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	117.100	S	2024001
14	CC 1093144012	GARAVITO RAMIREZ JUAN MIGUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
15	CC 1096249395	LOZADA PIMENTEL LINA MARCELA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
16	CC 1096952550	JAIMES CORONADO ANGELA GIOCONDA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
17	CC 1127595181	CARRUYO PALACIN WILMER AUGUSTO	1.750.905	F	X	X														0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.342.361	214.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.342.361	53.700	COMFAORIENTE-CCF36	1.403.156	56.200	1.342.361	14.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	338.800	S	2024001
18	PT 5330612	GARRIDO RIVAS LUIS JOSE	1.750.905	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	466.908	74.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	466.908	18.700	COMFAORIENTE-CCF36	466.908	18.700	466.908	4.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	117.100	S	2024001
19	PT 6914058	VILLALBA MATA FREDDY JESUS	1.750.905	F	X															0			26	26	26	26	PROTECCION -230201	1.517.451	242.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.517.451	60.700	COMFAORIENTE-CCF36	1.517.451	60.700	1.517.451	15.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	380.100	S	2024001
20	PT 7143344	MARTINEZ GONZALEZ SAMUEL JOSE	1.750.905	F	X															0			26	26	26	26	PROTECCION -230201	1.517.451	242.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.517.451	60.700	COMFAORIENTE-CCF36	1.517.451	60.700	1.517.451	15.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	380.100	S	2024001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET		3022726357			CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36227624	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.913.800	5.500	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	36227624	2026-02-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
31.555.393	31.555.393	31.555.393	31.616.188	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				20	5.049.800	0	3.300	0	5.053.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.240.600	0	800	0	1.241.400
PORVENIR	230301	800224808	8	12	2.763.200	0	1.800	0	2.765.000
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.046.000	0	700	0	1.046.700
EPS(Administradoras: 4)				20	1.263.000	0	1.000	0	1.264.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	622.900	0	400	0	623.300
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	121.400	0	100	0	121.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	168.200	0	200	0	168.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	350.500	0	300	0	350.800
ARP(Administradoras: 1)				20	330.000	0	300	0	330.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	20	330.000	0	300	0	330.300
CCF(Administradoras: 1)				20	1.265.500	0	900	0	1.266.400
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	20	1.265.500	0	900	0	1.266.400
Gran Total					7.908.300	0	5.500	0	7.913.800

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025** identificado(a) con **número 902.018.300** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130306000100056599** aperturada el **19 de diciembre de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **306056599**
10 dígitos: **0306056599**
16 dígitos: **0306000100056599**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el dia **29** de **diciembre** de **2025** a las **08:28**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 141226005364

(415)7707212489984(8020) 000014122600536 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 3 0 0	6	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
MZ 41 LT 3 BRR CLARET

42. Correo electrónico corredoresverdes2025@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 2 7 2 6 3 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 2 4 0	2 0 2 5 1 2 0 1	0 1 6 1	2 0 2 5 1 2 0 1	8 1 3 0	0 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARENAS ARGUELLO ANDERSON

985. Cargo Punto de Contacto Presencial

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226005364

(415)7707212489984(8020) **000014122600536 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 3 0 0	6	Impuestos de Cúcuta	7

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 1 2 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 1 2 0 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 1 2 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226005364

(415)7707212489984(8020) **000014122600536 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 3 0 0	6	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 0 3 7 9 1 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTRO	HERNANDEZ	EDISON	RAMIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226005364

(415)7707212489984(8020) **000014122600536 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 3 0 0	6	Impuestos de Cúcuta	7

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 9 5 6 7 8 1	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SISTEMAS AMBIENTALES DEL NORTE SAS BIC

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 0	2 0 2 5 1 2 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 0 2 7 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: FORESTAL CONSULTORES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 5 1 2 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA
DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE

PROYECTO:
ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

El municipio de San José de Cúcuta presenta condiciones climáticas particulares caracterizadas por altas temperaturas, las cuales se han visto intensificadas en los últimos años por fenómenos climáticos como *El Niño*, generando afectaciones en la cobertura vegetal urbana, deterioro de zonas verdes y pérdida de calidad paisajística en espacios públicos estratégicos.

Actualmente, diversas zonas verdes del municipio, especialmente aquellas asociadas a corredores viales, redomas, separadores y jardineras, evidencian deterioro producto de la falta de mantenimiento continuo, crecimiento descontrolado de malezas, deficiencias en riego y acumulación puntual de residuos sólidos, lo que incide negativamente en la percepción ciudadana y en el adecuado aprovechamiento del espacio público.

En concordancia con lo establecido en el **Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 "Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva"**, y en el marco del programa **"Cúcuta Conserva la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos"**, surge la necesidad de adelantar un proyecto orientado al mejoramiento, mantenimiento y recuperación integral de las zonas verdes urbanas, priorizando el uso de especies vegetales adecuadas a las condiciones climáticas locales y funcionales del espacio público.

La **Avenida Libertadores**, como eje vial estructurante y corredor urbano de alta importancia para la ciudad, constituye un punto estratégico de intervención, debido a su impacto paisajístico, ambiental y social. La recuperación de sus zonas verdes contribuye al fortalecimiento de la infraestructura verde urbana, mejora la calidad ambiental, aporta a la regulación microclimática y favorece el bienestar de peatones y conductores.

Este proyecto se concibe como una intervención integral que busca no sólo el embellecimiento paisajístico, sino también la conservación ambiental, el fortalecimiento del sentido de pertenencia ciudadano y la consolidación de espacios públicos más funcionales, sostenibles y acordes con las dinámicas urbanas del municipio.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto tiene como alcance la **recuperación, establecimiento, conservación y mantenimiento integral de las zonas verdes del espacio público** del municipio de San José de Cúcuta, en el marco del programa **"Cúcuta Conserva la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos"**, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 *"Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva"*.

La intervención se enfoca en corredores viales, redomas, separadores, jardineras y zonas verdes estratégicas de la **Avenida Libertadores**, priorizadas a partir de un diagnóstico técnico que considera el estado actual de la cobertura vegetal, el nivel de deterioro, la funcionalidad del espacio público y su impacto paisajístico y ambiental.

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de las siguientes **fases y actividades generales**:

Fase 1. Diagnóstico y alternativa de intervención

Incluye el análisis del estado actual de las zonas verdes a intervenir, la identificación de puntos críticos relacionados con cobertura vegetal, residuos sólidos, mantenimiento y arbolado existente, así como la formulación de la alternativa de intervención que define los lugares, acciones y actividades a desarrollar.

Las áreas objeto de análisis comprenden, entre otras:

- Redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas.
- Separadores de la Avenida Libertadores hasta el retorno de Circus Pop (calle 9).
- Redomas del parque CORPONOR y parque de los Ingenieros.
- Jardineras desde la Calle 15 con Avenida Libertadores hasta el puente Elías M. Soto.
- Jardineras desde el parque Pamplonita (CENS) hasta 50 metros hacia el parque Rodizio.
- Laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías de parqueo.



Fase 2. Desmonte y limpieza manual

Comprende las actividades preliminares necesarias para preparar el terreno, tales como limpieza general, deshierbe manual, excavación y nivelación puntual, podas técnicas al arbolado existente conforme al diagnóstico y retiro del material sobrante generado durante estas labores.

Fase 3. Establecimiento del componente verde

Corresponde a la ejecución del diseño paisajístico mediante la mejora del suelo, la siembra de especies vegetales ornamentales y nativas adaptadas a las condiciones climáticas del sector, así como la instalación de elementos decorativos y señalización informativa del proyecto.

Fase 4. Mantenimiento y consolidación

Incluye labores de riego programado, limpieza continua, nutrición vegetal, control fitosanitario, podas de formación y retiro de residuos, con el fin de garantizar el adecuado establecimiento y sostenibilidad inicial de la vegetación intervenida.

Fase 5. Educación ambiental y sostenibilidad

Contempla acciones de cultura ciudadana y educación ambiental orientadas a promover la apropiación social del espacio público, el cuidado de las zonas verdes y la adopción de prácticas responsables que contribuyan a la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

El alcance del proyecto podrá ser **ajustado o actualizado** durante su ejecución, de acuerdo con las condiciones encontradas en campo, las recomendaciones técnicas y las directrices de la supervisión del proyecto.

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el **área urbana del municipio de San José de Cúcuta**, específicamente en las zonas verdes asociadas a la **Avenida Libertadores**, corredor vial estratégico que articula espacios de movilidad, recreación y encuentro social, y que hace parte del sistema de infraestructura verde urbana de la ciudad.

La intervención se enfoca exclusivamente en **corredores verdes, redomas, separadores, jardineras y zonas verdes aledañas**, priorizadas a partir de un diagnóstico técnico que considera el estado actual de la cobertura vegetal, el nivel de deterioro, el impacto paisajístico y la coherencia con el entorno urbano inmediato. Esta actuación busca generar una intervención integral que contribuya a la continuidad ecológica y estética de la avenida, en articulación con otras iniciativas adelantadas por la administración municipal en el sector del Malecón.

Las áreas específicas de intervención comprenden:



- **Redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas**, incluyendo los separadores de la Avenida Libertadores hasta el retorno de Circus Pop (calle 9 con

Avenida Libertadores).

- **Redomas del parque CORPONOR y del parque de los Ingenieros**.
- **Jardineras desde la Calle 15 con Avenida Libertadores hasta el puente Elías M. Soto**.
- **Jardineras desde el parque Pamplonita (CENS) hasta 50 metros en dirección al parque Rodizio**.
- **Zonas laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías de parqueo**.

Dentro del área definida se identifican sectores correspondientes a **zonas previamente intervenidas**, en las cuales se realizarán labores de mantenimiento, así como **zonas que requieren intervención directa**, orientada al mejoramiento, recuperación y establecimiento del componente vegetal.

1.4 POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto beneficiará de manera **directa e indirecta** a la población del municipio de **San José de Cúcuta**, alrededor de 800,000 habitante especialmente a los habitantes, peatones, conductores y usuarios frecuentes de los espacios públicos asociados a la **Avenida Libertadores**, sus redomas, separadores, jardineras y zonas verdes aledañas.

De manera directa, se beneficiará la población que reside, labora o transita diariamente por los sectores intervenidos, al contar con espacios públicos más ordenados, funcionales y ambientalmente adecuados, que contribuyen a mejorar la calidad paisajística, el confort térmico y las condiciones de uso del entorno urbano.

De forma indirecta, el proyecto impacta positivamente al conjunto de la ciudadanía cucuteña, al fortalecer la infraestructura verde urbana, mejorar la calidad ambiental de un corredor vial estratégico y aportar a la mitigación de los efectos del cambio climático, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027.


La cuantificación específica de la población beneficiada se encuentra consignada en la **Matriz General de Ajustes (MGA)** y en la ficha técnica del proyecto, documentos que hacen parte integral del soporte del presente informe.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. LIC 731-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN
TIPO DE CONTRATO	OBRA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DICIEMBRE 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1405 del 19 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL- CORPONOR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 . EDINSON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
OBJETO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (1,559,614,622.00), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (1,559,614,622.00), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	9 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	9 MESES
FECHA DE INICIO	12/24/2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	10/24/2026

2.2 PLAZO CONTRACTUAL



Con relación al plazo contractual, es de NUEVE (9) meses que corresponde a 270 días calendario para el contrato de obra para el contrato de interventoría DIEZ (10) meses que corresponde a 300 días.

2.3 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS INICIALES

CONTRATO DE OBRA LIC 731-2025			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-44-101488408
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23/12/2025	**FECHA DE APROBACIÓN:**	24/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	19/12/2025	19/01/2027	155,961,462.20
PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2025	19/09/2029	155,961,462.20
CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2025	19/01/2027	155,961,462.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA		2 Años a partir de acta de recibo final	467,884,386.60

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-40-101268130
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23/12/2025	**FECHA DE APROBACIÓN:**	24/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00

Anexo *de pólizas iniciales contrato de obra.*

2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Las actividades cantidades de obra a desarrollar según contrato inicial, adiciones y/o modificaciones:

ÍTEMS Y VALORES DEL CONTRATO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**
1	**DIAGNÓSTICO**				
1,1	Análisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00
1,2	Identificación de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00

2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00
2,2	Excavación y nivelación	m2	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	1,680.00	$ 117,873.00	$ 198,026,640.00
3,2	**siembra de material vegetal**				
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	2,120.00	$ 33,942.00	$ 71,957,040.00
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	1,918.00	$ 41,798.00	$ 80,168,564.00
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	620.00	$ 46,798.00	$ 29,014,760.00
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	125.00	$ 66,974.00	$ 8,371,750.00
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	247.00	$ 86,974.00	$ 21,482,578.00
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	420.00	$ 26,974.00	$ 11,329,080.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1,500.00	$ 16,090.00	$ 24,135,000.00
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2,500.00	$ 11,090.00	$ 27,725,000.00

3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	1,000.00	$ 12,737.00	$ 12,737,000.00
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1,820.00	$ 14,090.00	$ 25,643,800.00
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	85.00	$ 64,778.00	$ 5,506,130.00
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	6,250.00	$ 17,290.00	$ 108,062,500.00
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**				
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	203.00	$ 128,873.00	$ 26,161,219.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**				
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**				
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00
COSTO DIRECTO					**$ 1,189,274,532.00**
ADMINISTRACIÓN				22%	$ 261,640,397.04
IMPREVISTOS				2%	$ 23,785,490.64

UTILIDADES	6%	$ 71,356,471.92
IVA sobre utilidad	19%	$ 13,557,729.66
COSTO INDIRECTO		**$ 370,340,089.00**
VALOR TOTAL		**$ 1,559,614,621.00**

2.4.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCIÓN	***FECHA***
CONTRATO DE OBRA No.LIC 731-2025	
CONTRATO DE OBRA	19/12/2025
ACTA DE INICIO	24/12/2025

Anexo. *Actas inicio*

3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Con relación al plazo contractual, han transcurrido siete (7) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.

Cumplimiento de los tiempos de ejecución: 2.59 %

Ver Anexo No. 1 *(Cronograma de actividades y flujo de fondos)*

Ver Anexo No. 2 *(Control de tiempos)*

4 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato de obra es 4.60% del valor total contratado.

El avance de ejecución del proyecto es de 4.6 %.

Ver anexo No. 3. *(Balance físico – financiero contrato de obra)*

5. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y/O ORDEN PÚBLICO

Describir las condiciones climáticas y/o de orden público durante el periodo del informe y si estas afectaron el desarrollo normal de las actividades del proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

1.1. Análisis del estado actual

Comprende el levantamiento de información primaria en campo y el análisis técnico para establecer una línea base detallada del estado de las zonas a intervenir. Esta actividad es fundamental para orientar y justificar las acciones de las fases posteriores.

- Procedimiento: Se realizará un recorrido técnico por todas las zonas verdes aledañas a la redoma del puente de Guadua y el área comprendida esta iniciativa se concentra específicamente desde la redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas a esta redoma (separadores de la avenida Libertadores hasta el retorno de Circus Pop calle 9 con Avenida Libertadores), (redomas del parque CORPONOR y parque de ingenieros), (jardineras desde Calle 15 con Avenida Libertadores hasta el puente Elías M. Soto). Adicional (jardineras desde parque pamplonita CENS hasta 50 metros hacia parque Rodizio) y los laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías zona de parqueo).

- Entregable: Documento técnico y cartográfico con la línea base del proyecto.

1.2 Puntos Críticos

Consiste en la evaluación específica de las problemáticas que afectan la funcionalidad y estética del área.

Procedimiento: Se identificarán y mapean los siguientes puntos:

- Cobertura Vegetal: Se documentará mediante registro fotográfico y fichas técnicas el grado de deterioro de la vegetación, identificando áreas con compactación de suelo, deficiencia de nutrientes y presencia de especies no aptas.

- Residuos Sólidos: Se mapean los focos de acumulación de residuos y se analizará la tipología de los mismos para entender las dinámicas que generan la contaminación.

- Mantenimiento: Se evaluarán las rutinas de mantenimiento actuales (frecuencia y calidad de riego, poda, limpieza) para identificar deficiencias.

- Criterios de aceptación: El informe de diagnóstico deberá ser aprobado por la supervisión del proyecto y contendrá las recomendaciones técnicas para las intervenciones.

1.3 Inventario del arbolado existente

Realización de un censo forestal completo de los individuos arbóreos en el área de influencia directa para determinar su estado y manejo requerido.

- Entregable: Fichas de inventario por individuo y un plano georreferenciado. Este inventario es el insumo para solicitar los permisos de intervención (poda o tala) ante la autoridad ambiental competente.

- Concertación del diseño: se realizará una concertación del diseño original con el objeto de garantizar que la intervención planificada responda al diagnóstico integral realizado en esta fase.

- Planteamiento de la alternativa de intervención: Actividad que resulta del diagnóstico y se definen lugares, acciones y actividades a desarrollar

2.1 Limpieza general y deshierbe

Retiro manual de toda la vegetación no deseada, malezas desde la raíz, basura, escombros y cualquier otro elemento ajeno al área de intervención.

- Procedimiento: Se realizará una limpieza exhaustiva de la superficie del terreno, dejando únicamente los árboles y plantas que serán conservados según el diagnóstico.

- Criterios de Aceptación: La superficie deberá quedar completamente limpia, a nivel de suelo mineral, sin residuos de ningún tipo.

2.2 Excavación y nivelación

Esta actividad comprende los movimientos de tierra necesarios para adecuar el terreno a las cotas de diseño paisajístico, garantizando que el suelo tenga la profundidad y la pendiente adecuadas para el sostenimiento de la vegetación.

Objetivo: Proporcionar una base física óptima que facilite la aireación del suelo y el correcto desarrollo radicular, asegurando que el diseño paisajístico sea funcional, estético y duradero frente a las condiciones climáticas de la ciudad.

2,4 Retiro de material sobrante

Consiste en la recolección, carga, transporte y disposición final de todos los residuos generados durante las etapas de limpieza, excavación y poda, garantizando que el corredor vial quede libre de obstáculos y en óptimas condiciones estéticas.

Una vez retirado el material, se realiza un barrido final de las calzadas y zonas duras adyacentes para eliminar rastros de tierra o polvo que puedan generar riesgos de deslizamiento para motociclistas o afectar la calidad del aire.

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas en el presente periodo:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	V/R PARCIAL
1	**DIAGNÓSTICO**				
1,1	Análisis del estado actual	Und	0.30	$ 9,398,169.00	$ 2,819,451.00
1,2	Identificacion de puntos criticos	Und	0.30	$ 2,184,229.00	$ 655,269.00
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	0.30	$ 2,135,276.00	$ 640,583.00
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				-
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	3,328.21	$ 1,352.00	$ 4,499,740.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	332.84	$ 60,100.00	$ 20,003,684.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	649.03	$ 40,224.00	$ 26,106,583.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 54,725,310.00**
ADMINISTRACIÓN 26%					$ 12,039,568.20
IMPREVISTOS 2%					$ 1,094,506.20
UTILIDAD 6%					$ 3,283,518.60
IVA 19%					$ 623,868.53
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 17,041,462.00**
COSTO TOTAL OBRA					**$ 71,766,772.00**
INTERVENTORÍA					**$ 2,547,871.00**
TOTAL PROYECTO					**$ 74,314,643.00**

Ver anexo No. 4. *(Memorias de cálculo de cantidades de obra desarrolladas en el periodo del informe)*

Ver Anexo No. 5. *(Registro fotográfico del avance del proyecto del periodo del informe presentado y condiciones climáticas)*

6.1 ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS

Se informa que, de acuerdo con el presupuesto oficial del proyecto y los alcances contratados, **no se tiene contemplada la ejecución de ensayos de laboratorio** por parte de la interventoría.

En consecuencia, el control de calidad realizado durante este periodo por la obra se basó en:

- **Inspección Visual:** Verificación directa en campo de los procesos constructivos.
- **Fichas Técnicas:** Revisión de la calidad de los materiales e insumos suministrados por los proveedores.

- **Certificados de Calidad:** Validación de los documentos de origen de los materiales utilizados.

Se certifica que, mediante estos mecanismos de control, las actividades ejecutadas cumplen con las normas técnicas y las especificaciones requeridas para la naturaleza del proyecto

7. ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS

El financiero pagado del contrato de obra es 4.60% del valor total contratado.

Ver Anexo No. 6. *(Estado financiero de obra y relación de pagos)*

Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $71,766,772.00, para un valor total a cobrar de $ $71,766,772.00 del valor total contratado de $1,559,614,621.00.

Saldo por pagar $1,487,847,850.00, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas

8. CONTROL SOCIAL

Se informa que, durante el presente periodo de corte de ejecución, **no se realizaron visitas presenciales** por parte de los miembros del Comité Veedor ni de representantes de la Junta de Acción Comunal a las instalaciones de la obra o a la oficina técnica.

Sin embargo, es importante precisar lo siguiente:

- **Canales Abiertos:** Se mantienen los canales de comunicación dispuestos por el Contratista y la Interventoría para atender cualquier requerimiento de la comunidad.
- **Soportes:** En el evento en que se realicen dichas visitas en periodos futuros, las constancias, actas de vecindad o registros de asistencia serán anexados debidamente en el **Informe de Ejecución del Contratista de Obra**, previa validación de esta Interventoría.

A la fecha del presente informe, no se han radicado inquietudes o solicitudes por parte de la comunidad que requieran el desplazamiento del comité veedor al sitio de los trabajos

Ver Anexo 7. *(Actas de reuniones de socialización)*

9. CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS HSEQ DE CORPONOR

Durante el periodo del informe se diligenció el formato **MPA-01-F-28 versión 2**, correspondiente al *Informe mensual de seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas*, incluyendo los anexos requeridos por la Corporación. Así mismo, se realizó y presentó el control diario del equipo de trabajo del contratista de la obra, conforme a lo establecido.

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2).*

Anexo. *Planes, seguimiento y aplicación de planes (Riesgo, Ambiental, Señalización, emergencia y calidad)*

9.1 LISTADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA

Para la ejecución del proyecto se contó con el siguiente personal, correspondiente a las personas que laboraron durante el periodo del informe.



UT Corredores Verdes 2025

CONTROL DIARIO PERSONAL DE OBRA

Control de asistencia: 24 diciembre al 30 diciembre 2025

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	Ayudante	✓	✓	NA	NA	NA	NA
2	ALAN XENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	Ayudante	✓	✓	NA	NA	NA	NA
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	Ayudante	✓	✓	NA	NA	NA	NA
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090179640	Ayudante	✓	✓	NA	NA	NA	NA
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	Ayudante	✓	✓	NA	NA	NA	NA
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	Ayudante	✓	✓	NA	NA	NA	NA

Alan López

ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ
CC. 1090177446
AYUDANGE ENCARGADO DE LA ASISTENCIA

Anexo. *Control diario del personal de obra (Asistencia)*

9.2 LISTADO DE PERSONAL INGRESADO

Se presenta el listado del personal técnico y administrativo vinculado al proyecto, organizado en orden alfabético e incluyendo la respectiva fecha de ingreso. Para cada una de las personas registradas, se dio cumplimiento a lo establecido en los numerales

CARGO	Nombre	Cédula
Ayudante	Alan kenny lopez ramirez	1090177446
Ayudante	freddy alonso benitez Carvajal	1098783455
Ayudante	Juan Miguel Garavito Ramirez	1093144012
Ayudante	Juan Manuel Fernandez JAuregui	1005066478

Ayudante	Freddy Alonso Benitez Carvajal	1090174911
Ayudante	Luis Carlos Cañas Peñaranda	1090175835

9.2.1 EXÁMENES DE INGRESO

Se presentan las copias de los exámenes de ingreso del personal de técnico y administrativo vinculado en el periodo del informe.

Anexo *(Exámenes de ingreso del personal ingresado)*

9.3 AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de las certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social, salud, pensión y ARL del personal de obra y administrativo vinculado en el periodo del informe.

9.3.1 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado - Salud)*

9.3.2 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIÓN

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- Pensión)*

9.3.3 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - ARL

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- ARL)*

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Anexar *(Pólizas iniciales).*

Anexo. *Actas inicio*

Ver Anexo No. 1. *CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS*

Ver Anexo No. 2. *CONTROL DE TIEMPOS*

Ver Anexo No. 3. *BALANCE FÍSICO FINANCIERO*

Ver *Anexo No. 4.* *MEMORIAS DE CÁLCULO*

Ver *Anexo No. 5.* *REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA*

Ver *Anexo No. 6*. *RELACIÓN DE PAGOS DE OBRA*

Ver Anexo *No.* 7. *ACTA DE SOCIALIZACIÓN*

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos MPA-01-F28 Versión 2).*

Anexo. *Planes, seguimiento y aplicación de planes (Riesgo, Ambiental, Señalización, emergencia y calidad)*

Anexo. *Control diario del personal de obra (Asistencia)*

Anexo *(Exámenes del personal ingresado)*

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado - Salud)*

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- Pensión)*

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- ARL)*

UT Corredores Verdes
2025

Actas suscritas

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 01

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 6 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Interventor LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

Señalización del proyecto en trabajos vía pública.

Solicitud de Modificatorio contractual.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 8 am en las instalaciones de la subdirección de Corponor, para revisión de las actividades contractuales de la ejecución del proyecto ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

1. Tema: Señalización del proyecto

La Interventoría resalta la importancia de la intervención y señalización necesaria durante la ejecución del proyecto, indicando que esta debe implementarse conforme a los manuales vigentes, los cuales deben ser revisados detalladamente para garantizar su correcta complementación, cumplimiento y aplicación en todas las etapas de la obra.

2. Tema: Solicitud de modificatorio contractual

El Contratista de Obra manifiesta la necesidad de realizar un modificatorio contractual, sustentado en las situaciones técnicas que han surgido durante el desarrollo del proyecto, específicamente en lo relacionado con el diseño paisajístico.

Se expone que, producto del análisis técnico contratado y de las condiciones reales de ejecución, se evidencia la necesidad de realizar ajustes al alcance contractual, lo cual conlleva a la formulación de un modificatorio que contemple modificaciones en cantidades de obra, posibles ítems no previstos.

La Interventoría informa que, para efectos de la Revisión formal del modificatorio, el Contratista deberá entregar la siguiente documentación completa:

- Sábana o presupuesto ajustado, donde se evidencien claramente:
    - Cantidades contractuales que aumentan
    - Cantidades contractuales que disminuyen
    - Inclusión de ítems no previstos
- Memorias de cantidades de obra, debidamente enlazadas con el presupuesto.
- Informe técnico de justificación del balance presupuestal del contratista de obra.
- Justificación técnica, administrativa y financiera de la interventoría.
- APU’s (Análisis de Precios Unitarios).
- Cotizaciones.
- Estudio de mercado.

- Especificaciones técnicas.

La Interventoría aclara que únicamente con la entrega completa de la documentación anteriormente relacionada se procederá a la revisión, emisión de recibido y posterior evaluación del modificatorio.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. El contratista deberá realizar la revisión integral de los manuales técnicos de señalización aplicables al proyecto y determinar la necesidad de implementar
2. El contratista deberá estructurar y presentar el paquete completo de documentos requeridos para la solicitud de modificatorio.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 02

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 13 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Interventor LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

Seguimiento a señalización del proyecto

Socialización del Modificatorio.

Compromisos y conclusiones

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento a la señalización del proyecto conforme al Manual de Señalización de la Alcaldía

El contratista de obra informa que se realizó nuevamente la revisión integral del manual de señalización, con el fin de verificar la correcta implementación de la señalización requerida para la ejecución del proyecto, en concordancia con los lineamientos del Manual de Señalización de la Alcaldía.

Como resultado de dicha revisión del Manual de Señalización de la Alcaldía, se dejan consignados como parte adicional de señalización integral del proceso de señalización los siguientes lineamientos operativos:

1. Instalación de colombinas delimitantes cada 3 a 5 metros, conectadas entre sí con cinta de peligro, para la delimitación continua de las áreas de trabajo.

2. Señalización permanente de excavaciones que perduren de un día para otro y que sean mayores a 50 centímetros, mediante avisos preventivos luminosos.

3. Delimitación de trabajos sobre la vía con colombinas y cinta de peligro, complementando con conos en actividades de cargue y descargue de material.

4. Organización, señalización y control de herramientas, productos químicos y materiales, garantizando rotulación y fichas de seguridad para productos químicos.

5. Implementación de medidas de almacenaje y disposición final temporal, mediante el cubrimiento con lona de materiales como arena, triturado, abono y desechos vegetales, con el fin de prevenir la dispersión de material particulado.

Se deja constancia de que todas las acciones descritas hacen parte de un sistema integrado de señalización y control de riesgos, el cual se encuentra en implementación y fortalecimiento continuo, y será aplicado de manera estricta conforme a las condiciones operativas de la obra.

2. Excavaciones en el área de intervención.

En el marco del seguimiento al avance y ejecución del proyecto, se realiza un análisis técnico de las actividades en campo, evidenciándose que en las áreas iniciales de ejecución se realizó una excavación aproximadamente de **10 cm.**

Asimismo, se identificaron sectores específicos donde, de acuerdo con el estado del terreno, no es adecuado realizar las excavaciones planificadas. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de ejecutar trabajos previos de nivelación y conformación en las áreas aledañas a la zona de trabajo. esto, con el fin de garantizar que el terreno no presente problemas de erosión o inestabilidad, considerando las condiciones actuales del mismo.

2. Socialización del modificatorio.

Se realiza la **socialización del modificatorio N 01** que se proyecta presentar, el cual tiene como finalidad realizar los ajustes técnicos, requeridos conforme a las condiciones identificadas durante la ejecución del proyecto.

El interventor solicita al contratista realizar los ajustes pertinentes para su revisión y aprobación.

Por otra parte el contratista informa que el modificatorio será estructurado y entregado formalmente el 17 de enero de 2025. Asimismo se establece que el contenido definitivo será presentado y concertado con la entidad en el siguiente comité de obra.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. Mantener la señalización adecuada, para las actividades que requieran durante la ejecución del proyecto.

2. El interventor deberá presentar el modificatorio definitivo con justificación jurídica técnica para aprobación por parte de la entidad.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 03

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 19 enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Intervento LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

Aclaración referente al aumento de cantidad estipulado en el ítem 2,1.

Necesidad de disminución de cantidad en los ítems: 2,2 - 2,4 – 3,1 – 3,2,1 – 3,2,2 – 3,2,3 – 3,2,6 – 3,2,7 – 3,2,8 – 3,2,9 – 3,2,10 – 3,2,14 – 3,3,2

Aclaración de eliminación de ítems: 3,2,4 – 3,2,5 – 3,2,11

Necesidad de crear ítems no previstos: NP 2,5 – NP 3,2,15 – NP 3,2,16 – NP 3,2,17 – NP 3,2,18 – NP 3,2,19 – NP 3,2,20 – NP 3,2,21 – NP 3,2,22 – NP 3,2,23 – NP 3,2,24 – NP 3,2,25 – NP 3,2,26 – NP 3,2,27 – NP 3,2,28 – NP 3,2,29 – NP 3,2,30 – NP 3,2,31 – NP 3,2,32 – NP 3,2,33 – NP 3,2,34 – NP 3,2,35 – NP 3,2,36 – NP 3,2,37 – NP 3,2,38 – NP 3,2,39 – NP 3,2,40 – NP 3,2,41 – NP 3,2,42 – NP 3,2,43 – NP 3,2,44 – NP 3,2,45 – NP 3,2,46

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 8 am en las instalaciones de la subdirección de Corponor, la subdirectora de Planeación y Fronteras de Corponor para revisión justificación del modificatorio N°1 del proyecto; ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

En relación con el ítem **2,1 (Limpieza general y deshierbe)**, se informa que, tras realizar el barrido inicial y la identificación de las zonas de intervención durante la fase de ejecución, se procedió a efectuar un levantamiento topográfico detallado.

Como resultado de este proceso técnico y de la posterior elaboración de las memorias de cálculo, se determinó una diferencia en el área total de intervención. Dicho levantamiento permitió constatar un incremento en las cantidades proyectadas originalmente, debido a la precisión en la delimitación de las áreas reales a intervenir en el terreno.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2.1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00
2.2	Excavación y nivelación	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00
2.3	Poda y/o erradicación de árboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- 00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00
2.4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00
NP 2,5	Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00

En lo que respecta al ítem **2.2 (Excavación y nivelación)**, de acuerdo con el seguimiento del avance y la ejecución del proyecto, se realizó un análisis técnico de la actividad en campo. Se evidenció que en las áreas iniciales de ejecución, donde se efectuó una excavación aproximada de 10 cm, el terreno presentaba en algunos sectores un talud pronunciado, cuya intervención generó procesos erosivos e inestabilidad del suelo.

A partir de los resultados obtenidos en las ejecuciones anteriores, se determinó que no es procedente realizar excavaciones masivas en las áreas restantes. En su lugar, se propone ejecutar únicamente excavaciones localizadas en los lados de siembra, con el fin de minimizar los impactos erosivos y garantizar la estabilidad del terreno.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2.1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00
2.2	Excavación y nivelación	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00
2.3	Poda y/o erradicación de árboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- 00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00
2.4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00
NP 2,5	Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00

Adicionalmente, con el objetivo de lograr la nivelación del terreno y mejorar las condiciones del suelo existente, en las áreas restantes del proyecto se realizará una conformación y nivelación del terreno.

Esta intervención consiste en retirar el material sobrante de los puntos más elevados para utilizarlo en las zonas que requieren relleno y nivelación. De esta manera, se optimiza el uso del material disponible y se mejora la eficiencia en la ejecución de la obra.

Bajo este criterio de aprovechamiento de recursos y eficiencia técnica, se establece la creación del ítem **NP 2.5 (Conformación, relleno y nivelación con material de excavación)**, lo cual permite una adecuación del terreno técnicamente viable para el proyecto.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2.1	Limpieza general y desherbe	m2	16,000.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,068,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00
2.3	Excavación y nivelación	m3	560.00	$ 60,100.00	$ 60,464,800.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	800.00	$ 36,040,800.00
2.3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- 00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00
2.4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,460.00)	860.24	$ 34,602,340.00
NP 2.5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$ 96,133,266.00	8,551.26	$ 96,133,266.00

En cuanto al ítem **2.4 (Retiro de material sobrante)**, se informa una reducción en las cantidades ejecutadas. Esto se debe a que el material obtenido de las excavaciones será reutilizado dentro del mismo proyecto para las labores de conformación y nivelación del terreno.

Al aprovechar este material en el sitio de la obra, se reduce la necesidad de retirarlo y disponerlo fuera del proyecto, lo que disminuye el volumen de material sobrante que inicialmente se tenía previsto retirar.

Continuando con el diseño paisajístico, tras una revisión detallada del diseño del proyecto, se determinó que las especificaciones técnicas de las especies contempladas originalmente en los **ítems 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.11** resultaban insuficientes en términos de escala, y dimensiones para el impacto urbano proyectado.

Se identificó que dichas especies, suministradas en presentaciones de **bolsa de 1 kg** y con alturas limitadas (oscilando entre los 30 cm y 60 cm), no proporcionaban la volumetría necesaria para garantizar la percepción que se quiere lograr el en el proyecto. La instalación de plantas de estas dimensiones reducidas nos limitaba la armonía y el impacto visual deseado en la ciudad.

Con el propósito de consolidar un entorno funcional y de impacto con el entorno urbano, se ha decidido suprimir los ítems mencionados e integrar los **ítems NP 3.2.22, NP 3.2.23 y NP 3.2.24**. y adicionar nuevas referencias presentan una tamaño superior, con suministros en **bolsa de 30 kg o superior** y alturas que alcanzan rangos de hasta **1.00 m y 2.50 m**, asegurando así la calidad estética y la consolidación del paisaje desde el momento de su plantación.

ITEM	DESCRIPCION	ITEM	DESCRIPCION
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m

Según los objetivos de impacto urbano y paisajístico del proyecto, se ha realizado un diagnóstico integral de las áreas de intervención. Considerando las condiciones bioclimáticas de la región, caracterizada por zonas áridas, se determinó la necesidad de incorporar especies vegetales idóneas que garanticen la sostenibilidad y supervivencia en el entorno.

Como resultado de este análisis técnico, se formaliza la inclusión de los nuevos ítems: **NP 3,2,15 – NP 3,2,16 – NP 3,2,17 – NP 3,2,18 – NP 3,2,19 – NP 3,2,20 – NP 3,2,21 – NP 3,2,25 – NP 3,2,26 – NP 3,2,27 – NP 3,2,28 – NP 3,2,29 – NP 3,2,30 – NP 3,2,31 – NP 3,2,32 – NP 3,2,33 – NP 3,2,34 – NP 3,2,35 – NP 3,2,36 – NP 3,2,37 – NP 3,2,38 – NP 3,2,39 – NP 3,2,40 – NP 3,2,41 – NP 3,2,42 – NP 3,2,43 – NP 3,2,44 – NP 3,2,45 – NP 3,2,46.** Estas especies han sido seleccionadas por su alta resistencia y adaptabilidad climática.

NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.00	Und	0.00	$ 426,984.00	$ -	(+)	80.00	$ 34,158,720.00	80.00	$ 34,158,720.00
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 2.00 m	Und	0.00	$ 800,942.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,275,360.00	80.00	$ 31,275,360.00
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 80, con una altura Con altura de 2.00 m	Und	0.00	$ 535,942.00	$ -	(+)	14.00	$ 7,503,188.00	14.00	$ 7,503,188.00
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	0.00	$ 410,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 20,547,100.00	50.00	$ 20,547,100.00
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	35.00	$ 13,566,315.00	35.00	$ 13,566,315.00
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	36.00	$ 19,353,924.00	36.00	$ 19,353,924.00
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 60, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	9.00	$ 4,838,481.00	9.00	$ 4,838,481.00
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0.80 a 1.00 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,008,720.00	80.00	$ 31,008,720.00

NP 3.2.23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 422,500.00	$ -	(+)	80.00	$ 33,808,720.00	80.00	$ 33,808,720.00
NP 3.2.24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROBELINA: En bolsa de 30 kg número 55 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	0.00	$ 389,275.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,142,000.00	80.00	$ 31,142,000.00
NP 3.2.25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE: En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	0.00	$ 61,525.00	$ -	(+)	300.00	$ 18,547,500.00	300.00	$ 18,547,500.00
NP 3.2.26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 30 y 40 cm	Und	0.00	$ 61,042.00	$ -	(+)	150.00	$ 9,291,300.00	150.00	$ 9,291,300.00
NP 3.2.27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 62,442.00	$ -	(+)	200.00	$ 12,488,400.00	200.00	$ 12,488,400.00
NP 3.2.28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 6 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	180.00	$ 10,819,620.00	180.00	$ 10,819,620.00
NP 3.2.29	Suministro de material vegetal especie MARGIÑANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 6,010,900.00	100.00	$ 6,010,900.00
NP 3.2.30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 25 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	0.00	$ 26,442.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,442,000.00	1,000.00	$ 26,442,000.00
NP 3.2.31	Suministro de material vegetal especie ANIANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	400.00	$ 21,643,600.00	400.00	$ 21,643,600.00
NP 3.2.32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 25, de largo entre 20 cm	Und	0.00	$ 26,725.00	$ -	(+)	250.00	$ 6,693,750.00	250.00	$ 6,693,750.00
NP 3.2.33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	250.00	$ 13,527,250.00	250.00	$ 13,527,250.00
NP 3.2.34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	500.00	$ 27,054,500.00	500.00	$ 27,054,500.00
NP 3.2.35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	235.00	$ 12,715,615.00	235.00	$ 12,715,615.00
NP 3.2.36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	0.00	$ 37,443.00	$ -	(+)	60.00	$ 3,446,520.00	60.00	$ 3,446,520.00
NP 3.2.37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 25 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,809.00	$ -	(+)	500.00	$ 13,304,500.00	500.00	$ 13,304,500.00
NP 3.2.38	Suministro de material vegetal especie LUJADA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 27,842.00	$ -	(+)	22.00	$ 614,724.00	22.00	$ 614,724.00
NP 3.2.39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 25 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,109,000.00	1,000.00	$ 26,109,000.00
NP 3.2.40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 25 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 2,610,900.00	100.00	$ 2,610,900.00
NP 3.2.41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 55,275.00	$ -	(+)	20.00	$ 1,105,500.00	20.00	$ 1,105,500.00
NP 3.2.42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00
NP 3.2.43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OTE: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00
NP 3.2.44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	0.00	$ 54,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 2,747,100.00	50.00	$ 2,747,100.00
NP 3.2.45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 16, de largo entre 15 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,050.00	$ -	(+)	900.00	$ 15,885,000.00	900.00	$ 15,885,000.00
NP 3.2.46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 15 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,050.00	$ -	(+)	250.00	$ 4,412,500.00	250.00	$ 4,412,500.00

En consecuencia, y con el fin de optimizar el diseño y mantener el equilibrio presupuestal de la intervención, se ha procedido a realizar una reducción proporcional en las cantidades de los siguientes ítems existentes: **3,2,1 – 3,2,2 – 3,2,3 – 3,2,6 – 3,2,7 – 3,2,8 – 3,2,9 – 3,2,10 – 3,2,14**

3.2	**siembra de material vegetal**										
3.2.1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	2,120.00	$ 33,942.00	$ 71,957,040.00	(-)	(1,820.00)	$ (61,774,440.00)	300.00	$ 10,182,600.00
3.2.2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	1,918.00	$ 41,796.00	$ 80,168,664.00	(-)	(1,818.00)	$ (75,988,784.00)	100.00	$ 4,179,880.00
3.2.3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	620.00	$ 46,796.00	$ 29,014,760.00	(-)	(520.00)	$ (24,334,080.00)	100.00	$ 4,679,800.00
3.2.4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm durante el desarrollo del contrato	Und	125.00	$ 66,974.00	$ 8,371,750.00	(-)	(125.00)	$ (8,371,750.00)	- .00	$ -
3.2.5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	347.00	$ 66,974.00	$ 21,482,578.00	(-)	(347.00)	$ (21,482,578.00)	- .00	$ -
3.2.6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	420.00	$ 26,974.00	$ 11,329,080.00	(-)	(320.00)	$ (8,631,680.00)	100.00	$ 2,697,400.00
3.2.7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1,500.00	$ 16,090.00	$ 24,135,000.00	(-)	(1,400.00)	$ (22,526,000.00)	100.00	$ 1,609,000.00
3.2.8	Suministro de material vegetal especie lora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2,500.00	$ 11,090.00	$ 27,725,000.00	H	(2,400.00)	$ (26,616,000.00)	100.00	$ 1,109,000.00
3.2.9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 12 cm	Und	1,000.00	$ 12,737.00	$ 12,737,000.00	H	(900.00)	$ (11,463,300.00)	100.00	$ 1,273,700.00
3.2.10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1,820.00	$ 14,090.00	$ 25,643,800.00	H	(1,620.00)	$ (22,825,800.00)	200.00	$ 2,818,000.00
3.2.11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	65.00	$ 84,778.00	$ 5,505,130.00	H	(65.00)	$ (5,506,120.00)	- .00	$ -
3.2.12	Suministro de material vegetal especie Uraga: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00		- .00	$ -	20.00	$ 401,800.00
3.2.13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00		- .00	$ -	80.00	$ 1,607,200.00
3.2.14	Suministro e instalación de Grama manil forajero	m2	6,250.00	$ 17,290.00	$ 108,062,500.00	H	(5,250.00)	$ (90,772,500.00)	1,000.00	$ 17,290,000.00

En relación con el ítem **3.1 (Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico))**, se ha constatado durante la fase de ejecución que la aplicación del material de enmienda se realizará de manera focalizada, limitándose exclusivamente a las áreas y hoyos de siembra donde se instalará cada espécimen vegetal.

respecto a lo anterior se ha generado una disminución proporcional en la cantidad ejecutada de este ítem respecto a la proyección inicial del proyecto.

3	ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE									
3.1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	1,680.00	$ 117,873.00	$ 198,026,640.00	(-)	(1,125.96)	$ (132,728,934.00)	554.0	$ 65,305,806.00

En lo referente al ítem 3,3,2 (Suministro e instalación de piedra bola), tras un análisis detallado del diseño paisajístico final y los criterios estéticos del proyecto, se ha determinado una modificación en el uso decorativos.

Se concluye que se priorizará el uso de material triturado por sobre la piedra bola. En consecuencia, se procede a realizar una reducción en las cantidades ejecutadas de este ítem, ajustando el volumen de suministro a los requerimientos actuales de la propuesta paisajística.

3.3	INSTALACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS										
3.3.1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00		- 00	$ -	285.92	$	32,272,271.00
3.3.2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	203.00	$ 128,873.00	$ 26,161,219.00		(103.00)	$ (13,273,819.0	100.00	$	12,887,300.00
3.3.3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,080,200.00	$ 4,160,400.00		- 00	$ -	2.00	$	4,160,400.00
3.3.4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- 00	$ -	2.00	$	5,076,400.00

Tras el análisis del modificatorio del proyecto, la **Interventoría** ha verificado que los ajustes propuestos, correspondientes al balance de cantidades y a la inclusión de ítems no previstos, no alteran el alcance financiero establecido inicialmente

Así mismo, se ha constatado que la solicitud de balance no requiere la adición de recursos financieros, ya que el contrato mantiene su equilibrio económico a la fecha del presente informe. Una vez elaborado y revisado el balance detallado, la **Interventoría** evidencia que la compensación entre ítems garantiza la ejecución total de las obras proyectadas sin incrementar el valor contractual vigente, asegurando así la eficiencia administrativa y presupuestal de la intervención.

Por las anteriores consideraciones expresadas la presente interventoría considera que la modificación de mayores y menores cantidades es conveniente para el proyecto.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 03

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 19 enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Intervento LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

Aclaración referente al aumento de cantidad estipulado en el ítem 2,1.

Necesidad de disminución de cantidad en los ítems: 2,2 - 2,4 – 3,1 – 3,2,1 – 3,2,2 – 3,2,3 – 3,2,6 – 3,2,7 – 3,2,8 – 3,2,9 – 3,2,10 – 3,2,14 – 3,3,2

Aclaración de eliminación de ítems: 3,2,4 – 3,2,5 – 3,2,11

Necesidad de crear ítems no previstos: NP 2,5 – NP 3,2,15 – NP 3,2,16 – NP 3,2,17 – NP 3,2,18 – NP 3,2,19 – NP 3,2,20 – NP 3,2,21 – NP 3,2,22 – NP 3,2,23 – NP 3,2,24 – NP 3,2,25 – NP 3,2,26 – NP 3,2,27 – NP 3,2,28 – NP 3,2,29 – NP 3,2,30 – NP 3,2,31 – NP 3,2,32 – NP 3,2,33 – NP 3,2,34 – NP 3,2,35 – NP 3,2,36 – NP 3,2,37 – NP 3,2,38 – NP 3,2,39 – NP 3,2,40 – NP 3,2,41 – NP 3,2,42 – NP 3,2,43 – NP 3,2,44 – NP 3,2,45 – NP 3,2,46

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 8 am en las instalaciones de la subdirección de Corponor, la subdirectora de Planeación y Fronteras de Corponor para revisión justificación del modificatorio N°1 del proyecto; ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

En relación con el ítem **2,1 (Limpieza general y deshierbe)**, se informa que, tras realizar el barrido inicial y la identificación de las zonas de intervención durante la fase de ejecución, se procedió a efectuar un levantamiento topográfico detallado.

Como resultado de este proceso técnico y de la posterior elaboración de las memorias de cálculo, se determinó una diferencia en el área total de intervención. Dicho levantamiento permitió constatar un incremento en las cantidades proyectadas originalmente, debido a la precisión en la delimitación de las áreas reales a intervenir en el terreno.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2.1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00
2.2	Excavación y nivelación	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00
2.3	Poda y/o erradicación de árboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- 00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00
2.4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00
NP 2,5	Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00

En lo que respecta al ítem **2.2 (Excavación y nivelación)**, de acuerdo con el seguimiento del avance y la ejecución del proyecto, se realizó un análisis técnico de la actividad en campo. Se evidenció que en las áreas iniciales de ejecución, donde se efectuó una excavación aproximada de 10 cm, el terreno presentaba en algunos sectores un talud pronunciado, cuya intervención generó procesos erosivos e inestabilidad del suelo.

A partir de los resultados obtenidos en las ejecuciones anteriores, se determinó que no es procedente realizar excavaciones masivas en las áreas restantes. En su lugar, se propone ejecutar únicamente excavaciones localizadas en los lados de siembra, con el fin de minimizar los impactos erosivos y garantizar la estabilidad del terreno.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2.1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00
2.2	Excavación y nivelación	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00
2.3	Poda y/o erradicación de árboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- 00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00
2.4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00
NP 2,5	Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00

Adicionalmente, con el objetivo de lograr la nivelación del terreno y mejorar las condiciones del suelo existente, en las áreas restantes del proyecto se realizará una conformación y nivelación del terreno.

Esta intervención consiste en retirar el material sobrante de los puntos más elevados para utilizarlo en las zonas que requieren relleno y nivelación. De esta manera, se optimiza el uso del material disponible y se mejora la eficiencia en la ejecución de la obra.

Bajo este criterio de aprovechamiento de recursos y eficiencia técnica, se establece la creación del ítem **NP 2.5 (Conformación, relleno y nivelación con material de excavación)**, lo cual permite una adecuación del terreno técnicamente viable para el proyecto.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2.1	Limpieza general y desherbe	m2	16,000.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,068,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00
2.3	Excavación y nivelación	m3	560.00	$ 60,100.00	$ 60,464,800.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	800.00	$ 36,040,800.00
2.3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- 00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00
2.4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,460.00)	860.24	$ 34,602,340.00
NP 2.5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$ 96,133,266.00	8,551.26	$ 96,133,266.00

En cuanto al ítem **2.4 (Retiro de material sobrante)**, se informa una reducción en las cantidades ejecutadas. Esto se debe a que el material obtenido de las excavaciones será reutilizado dentro del mismo proyecto para las labores de conformación y nivelación del terreno.

Al aprovechar este material en el sitio de la obra, se reduce la necesidad de retirarlo y disponerlo fuera del proyecto, lo que disminuye el volumen de material sobrante que inicialmente se tenía previsto retirar.

Continuando con el diseño paisajístico, tras una revisión detallada del diseño del proyecto, se determinó que las especificaciones técnicas de las especies contempladas originalmente en los **ítems 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.11** resultaban insuficientes en términos de escala, y dimensiones para el impacto urbano proyectado.

Se identificó que dichas especies, suministradas en presentaciones de **bolsa de 1 kg** y con alturas limitadas (oscilando entre los 30 cm y 60 cm), no proporcionaban la volumetría necesaria para garantizar la percepción que se quiere lograr el en el proyecto. La instalación de plantas de estas dimensiones reducidas nos limitaba la armonía y el impacto visual deseado en la ciudad.

Con el propósito de consolidar un entorno funcional y de impacto con el entorno urbano, se ha decidido suprimir los ítems mencionados e integrar los **ítems NP 3.2.22, NP 3.2.23 y NP 3.2.24**. y adicionar nuevas referencias presentan una tamaño superior, con suministros en **bolsa de 30 kg o superior** y alturas que alcanzan rangos de hasta **1.00 m y 2.50 m**, asegurando así la calidad estética y la consolidación del paisaje desde el momento de su plantación.

ITEM	DESCRIPCION	ITEM	DESCRIPCION
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m

Según los objetivos de impacto urbano y paisajístico del proyecto, se ha realizado un diagnóstico integral de las áreas de intervención. Considerando las condiciones bioclimáticas de la región, caracterizada por zonas áridas, se determinó la necesidad de incorporar especies vegetales idóneas que garanticen la sostenibilidad y supervivencia en el entorno.

Como resultado de este análisis técnico, se formaliza la inclusión de los nuevos ítems: **NP 3,2,15 – NP 3,2,16 – NP 3,2,17 – NP 3,2,18 – NP 3,2,19 – NP 3,2,20 – NP 3,2,21 – NP 3,2,25 – NP 3,2,26 – NP 3,2,27 – NP 3,2,28 – NP 3,2,29 – NP 3,2,30 – NP 3,2,31 – NP 3,2,32 – NP 3,2,33 – NP 3,2,34 – NP 3,2,35 – NP 3,2,36 – NP 3,2,37 – NP 3,2,38 – NP 3,2,39 – NP 3,2,40 – NP 3,2,41 – NP 3,2,42 – NP 3,2,43 – NP 3,2,44 – NP 3,2,45 – NP 3,2,46.** Estas especies han sido seleccionadas por su alta resistencia y adaptabilidad climática.

NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.00	Und	0.00	$ 426,984.00	$ -	(+)	80.00	$ 34,158,720.00	80.00	$ 34,158,720.00
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 2.00 m	Und	0.00	$ 800,942.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,275,360.00	80.00	$ 31,275,360.00
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 80, con una altura Con altura de 2.00 m	Und	0.00	$ 535,942.00	$ -	(+)	14.00	$ 7,503,188.00	14.00	$ 7,503,188.00
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	0.00	$ 410,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 20,547,100.00	50.00	$ 20,547,100.00
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	35.00	$ 13,566,315.00	35.00	$ 13,566,315.00
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	36.00	$ 19,353,924.00	36.00	$ 19,353,924.00
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 60, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	9.00	$ 4,838,481.00	9.00	$ 4,838,481.00
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0.80 a 1.00 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,008,720.00	80.00	$ 31,008,720.00

NP 3.2.23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 422,500.00	$ -	(+)	80.00	$ 33,808,720.00	80.00	$ 33,808,720.00
NP 3.2.24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROBELINA: En bolsa de 30 kg número 55 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	0.00	$ 389,275.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,142,000.00	80.00	$ 31,142,000.00
NP 3.2.25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE: En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	0.00	$ 61,525.00	$ -	(+)	300.00	$ 18,547,500.00	300.00	$ 18,547,500.00
NP 3.2.26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 30 y 40 cm	Und	0.00	$ 61,042.00	$ -	(+)	150.00	$ 9,291,300.00	150.00	$ 9,291,300.00
NP 3.2.27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 62,442.00	$ -	(+)	200.00	$ 12,488,400.00	200.00	$ 12,488,400.00
NP 3.2.28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 6 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	180.00	$ 10,819,620.00	180.00	$ 10,819,620.00
NP 3.2.29	Suministro de material vegetal especie MARGIÑANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 6,010,900.00	100.00	$ 6,010,900.00
NP 3.2.30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 25 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	0.00	$ 26,442.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,442,000.00	1,000.00	$ 26,442,000.00
NP 3.2.31	Suministro de material vegetal especie ANIANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	400.00	$ 21,643,600.00	400.00	$ 21,643,600.00
NP 3.2.32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 25, de largo entre 20 cm	Und	0.00	$ 26,725.00	$ -	(+)	250.00	$ 6,693,750.00	250.00	$ 6,693,750.00
NP 3.2.33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	250.00	$ 13,527,250.00	250.00	$ 13,527,250.00
NP 3.2.34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	500.00	$ 27,054,500.00	500.00	$ 27,054,500.00
NP 3.2.35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	235.00	$ 12,715,615.00	235.00	$ 12,715,615.00
NP 3.2.36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	0.00	$ 37,443.00	$ -	(+)	60.00	$ 3,446,520.00	60.00	$ 3,446,520.00
NP 3.2.37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 25 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,809.00	$ -	(+)	500.00	$ 13,304,500.00	500.00	$ 13,304,500.00
NP 3.2.38	Suministro de material vegetal especie LUJADA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 27,842.00	$ -	(+)	22.00	$ 614,724.00	22.00	$ 614,724.00
NP 3.2.39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 25 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,109,000.00	1,000.00	$ 26,109,000.00
NP 3.2.40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 25 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 2,610,900.00	100.00	$ 2,610,900.00
NP 3.2.41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 55,275.00	$ -	(+)	20.00	$ 1,105,500.00	20.00	$ 1,105,500.00
NP 3.2.42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00
NP 3.2.43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OTE: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00
NP 3.2.44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	0.00	$ 54,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 2,747,100.00	50.00	$ 2,747,100.00
NP 3.2.45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 16, de largo entre 15 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,050.00	$ -	(+)	900.00	$ 15,885,000.00	900.00	$ 15,885,000.00
NP 3.2.46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 15 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,050.00	$ -	(+)	250.00	$ 4,412,500.00	250.00	$ 4,412,500.00

En consecuencia, y con el fin de optimizar el diseño y mantener el equilibrio presupuestal de la intervención, se ha procedido a realizar una reducción proporcional en las cantidades de los siguientes ítems existentes: **3,2,1 – 3,2,2 – 3,2,3 – 3,2,6 – 3,2,7 – 3,2,8 – 3,2,9 – 3,2,10 – 3,2,14**

3.2	**siembra de material vegetal**										
3.2.1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	2,120.00	$ 33,942.00	$ 71,957,040.00	(-)	(1,820.00)	$ (61,774,440.00)	300.00	$ 10,182,600.00
3.2.2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	1,918.00	$ 41,796.00	$ 80,168,664.00	(-)	(1,818.00)	$ (75,988,784.00)	100.00	$ 4,179,880.00
3.2.3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	620.00	$ 46,796.00	$ 29,014,760.00	(-)	(520.00)	$ (24,334,080.00)	100.00	$ 4,679,800.00
3.2.4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm durante el desarrollo del contrato	Und	125.00	$ 66,974.00	$ 8,371,750.00	(-)	(125.00)	$ (8,371,750.00)	- .00	$ -
3.2.5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	347.00	$ 66,974.00	$ 21,482,578.00	(-)	(347.00)	$ (21,482,578.00)	- .00	$ -
3.2.6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	420.00	$ 26,974.00	$ 11,329,080.00	(-)	(320.00)	$ (8,631,680.00)	100.00	$ 2,697,400.00
3.2.7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1,500.00	$ 16,090.00	$ 24,135,000.00	(-)	(1,400.00)	$ (22,526,000.00)	100.00	$ 1,609,000.00
3.2.8	Suministro de material vegetal especie lora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2,500.00	$ 11,090.00	$ 27,725,000.00	H	(2,400.00)	$ (26,616,000.00)	100.00	$ 1,109,000.00
3.2.9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 12 cm	Und	1,000.00	$ 12,737.00	$ 12,737,000.00	H	(900.00)	$ (11,463,300.00)	100.00	$ 1,273,700.00
3.2.10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1,820.00	$ 14,090.00	$ 25,643,800.00	H	(1,620.00)	$ (22,825,800.00)	200.00	$ 2,818,000.00
3.2.11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	65.00	$ 84,778.00	$ 5,505,130.00	H	(65.00)	$ (5,506,120.00)	- .00	$ -
3.2.12	Suministro de material vegetal especie Uraga: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00		- .00	$ -	20.00	$ 401,800.00
3.2.13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00		- .00	$ -	80.00	$ 1,607,200.00
3.2.14	Suministro e instalación de Grama manil forajero	m2	6,250.00	$ 17,290.00	$ 108,062,500.00	H	(5,250.00)	$ (90,772,500.00)	1,000.00	$ 17,290,000.00

En relación con el ítem **3.1 (Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico))**, se ha constatado durante la fase de ejecución que la aplicación del material de enmienda se realizará de manera focalizada, limitándose exclusivamente a las áreas y hoyos de siembra donde se instalará cada espécimen vegetal.

respecto a lo anterior se ha generado una disminución proporcional en la cantidad ejecutada de este ítem respecto a la proyección inicial del proyecto.

3	ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE									
3.1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	1,680.00	$ 117,873.00	$ 198,026,640.00	(-)	(1,125.96)	$ (132,728,934.00)	554.0	$ 65,305,806.00

En lo referente al ítem 3,3,2 (Suministro e instalación de piedra bola), tras un análisis detallado del diseño paisajístico final y los criterios estéticos del proyecto, se ha determinado una modificación en el uso decorativos.

Se concluye que se priorizará el uso de material triturado por sobre la piedra bola. En consecuencia, se procede a realizar una reducción en las cantidades ejecutadas de este ítem, ajustando el volumen de suministro a los requerimientos actuales de la propuesta paisajística.

3.3	INSTALACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS									
3.3.1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00		- .00	$ -	285.92	$ 32,272,271.00
3.3.2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	203.00	$ 128,873.00	$ 26,161,219.00		(103.00)	$ (13,273,819.0	100.00	$ 12,887,300.00
3.3.3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,080,200.00	$ 4,160,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,160,400.00
3.3.4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00

Tras el análisis del modificatorio del proyecto, la **Interventoría** ha verificado que los ajustes propuestos, correspondientes al balance de cantidades y a la inclusión de ítems no previstos, no alteran el alcance financiero establecido inicialmente

Así mismo, se ha constatado que la solicitud de balance no requiere la adición de recursos financieros, ya que el contrato mantiene su equilibrio económico a la fecha del presente informe. Una vez elaborado y revisado el balance detallado, la **Interventoría** evidencia que la compensación entre ítems garantiza la ejecución total de las obras proyectadas sin incrementar el valor contractual vigente, asegurando así la eficiencia administrativa y presupuestal de la intervención.

Por las anteriores consideraciones expresadas la presente interventoría considera que la modificación de mayores y menores cantidades es conveniente para el proyecto.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**	**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**1,1**	**Análisis del estado actual**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**1.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**1.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
19	1	2026	Análisis del estado Actual								1		1	**AREA TOTAL DEL PROYECTO**
												TOTAL:	**1.00**	

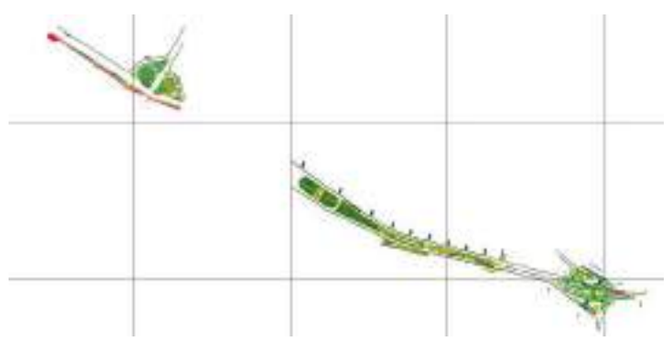

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**1,2**	**Identificación de puntos criticos**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**1.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**1.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Identificación de puntos criticos								1		1	AREA TOTAL DEL PROYECTO
													TOTAL:	**1.00**

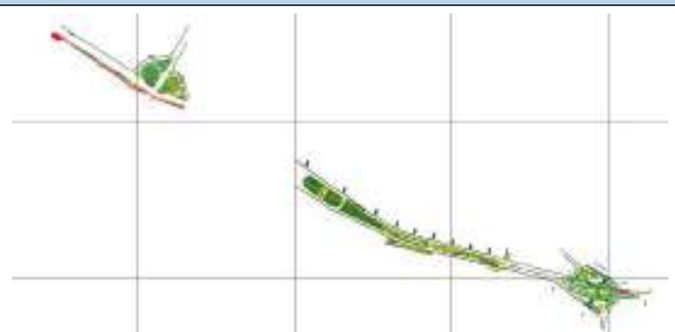

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**1,3**	**Inventario del arbolado existente**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**1.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**1.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Fichas de inventario por individuo y plano georreferenciado.								1		1	AREA TOTAL DEL PROYECTO
												TOTAL:	**1.00**	

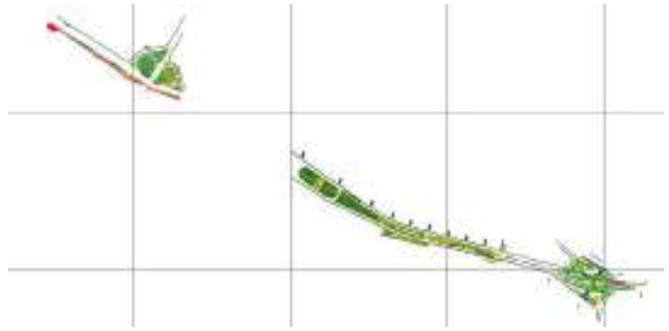

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**21,289.22**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**21,289.22**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1				454.08						454.08	
19	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 3				28.10						28.10	
19	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2				693.78						693.78	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 1	1.30	0.61								0.79	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 2	1.47	0.62								0.91	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 3	1.40	0.63								0.88	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 4	1.40	0.62								0.87	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 5	1.40	0.57								0.80	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 6	1.40	0.61								0.85	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 7	1.40	0.65								0.91	
												TOTAL:	**1,181.97**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 20

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**	**16,800.00**	**CANT EJECUTADA**	**21,289.22**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**21,289.22**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 8	1.40	0.69								0.97	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 9	1.40	0.71								1.00	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 10	0.94	0.71								0.66	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 11	1.40	0.70								0.98	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 12	1.40	0.69								0.97	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 13	1.40	0.72								1.01	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 14	1.10	0.75								0.82	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 15	1.05	0.80								0.84	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 16	1.50	0.83								1.25	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 17	1.20	0.92								1.10	
												TOTAL:	**9.60**	

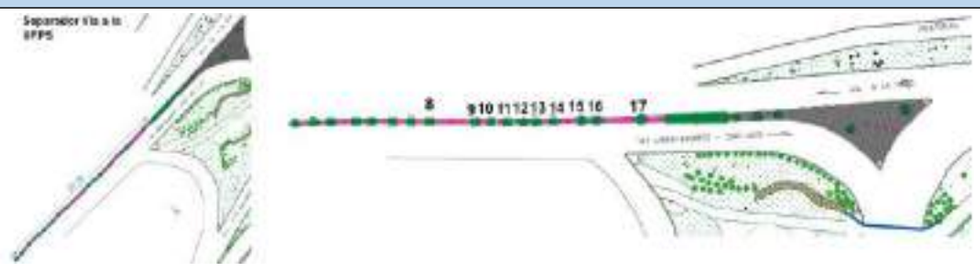

OBSERVACIONES:Hoja 2 de 20

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**	**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**		

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**	**16,800.00**	**CANT EJECUTADA**	**21,289.22**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**21,289.22**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 18	14.05	1.17								16.37	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 19				1.04				5		5.19	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 20				1.57						1.57	
19	1	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 21				1.85						1.85	
19	1	2026	Peatonal UFPS Área 1				324.55						324.55	
19	1	2026	Peatonal UFPS Área 2				115.30						115.30	
19	1	2026	Lateral izquierdo puente de guadua; entrada túneles				199.70						199.70	
19	1	2026												
												TOTAL:	**664.53**	

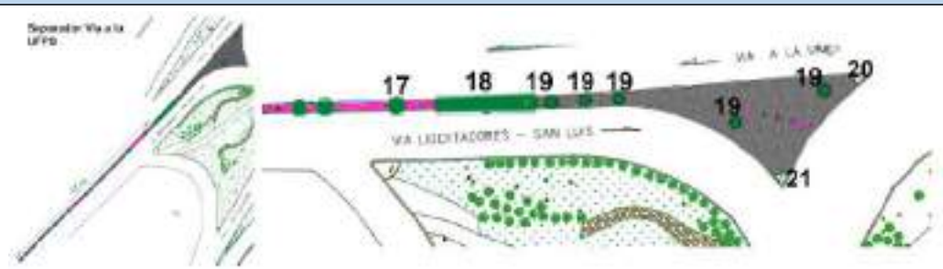



OBSERVACIONES: Hoja 3 de 20

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	16	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1		**HASTA:**	16	1	2026


ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**	**16,800.00**	**CANT EJECUTADA**	**21,289.22**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**21,289.22**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente ÁREA 1				739.07						739.07	
19	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente ÁREA 1				733.04						733.04	
19	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1				806.60						806.60	
19	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 2				673.90						673.90	
19	1	2026	Lateral derecho puente de guadua; entrada túneles				229.20						229.20	
19	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 1				298.87						298.87	
19	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 2				328.84						328.84	
19	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 3				49.98						49.98	
19	1	2026	Entrada via Libertadores - San Luis ÁREA 1				374.91						374.91	
19	1	2026	Entrada via Libertadores - San Luis ÁREA 2				133.22						133.22	
												TOTAL:	**4,367.63**	







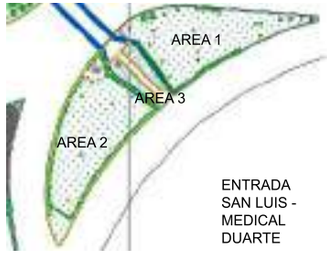



OBSERVACIONES:Hoja 4 de 20

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

	CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025					PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	16	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 1	HASTA:	16	1	2026

ÍTEM:	2,1	Limpieza general y deshierbe	UNIDAD	m2	CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA	21,289.22	CANTIDAD ACUMULADA	21,289.22

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Separador Via Libertadores San Luis ÁREA 1				1.84						1.84	
19	1	2026	Separador Via Libertadores San Luis ÁREA 2				2.54						2.54	
19	1	2026	Separador Via Libertadores San Luis ÁREA 3				4.59						4.59	
19	1	2026	Separador Via Libertadores San Luis ÁREA 4				1.04						1.04	
19	1	2026	Separador Inferior Bajo Puente Guadua				73.35						73.35	
19	1	2026	Separador Superior Bajo Puente Guadua				109.64						109.64	
19	1	2026	Separador Via San Mateo Área 1				100.00						100.00	
19	1	2026	Separador Via San Mateo Área 2				28.29						28.29	
												TOTAL:	321.29	







OBSERVACIONES:Hoja 5 de 20

Luis Fernando Suárez Delgado	Nelson David Acevedo Torres	Angela Gioconda Jaimes Coronado	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**		**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**21,289.22**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**21,289.22**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 3				893.13						893.13	
19	1	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4				3204.39						3,204.39	
19	1	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5				2001.78						2,001.78	
19	1	2026												
19	1	2026												
19	1	2026												
19	1	2026												
19	1	2026												
19	1	2026												
19	1	2026												
												TOTAL:	**6,099.30**	

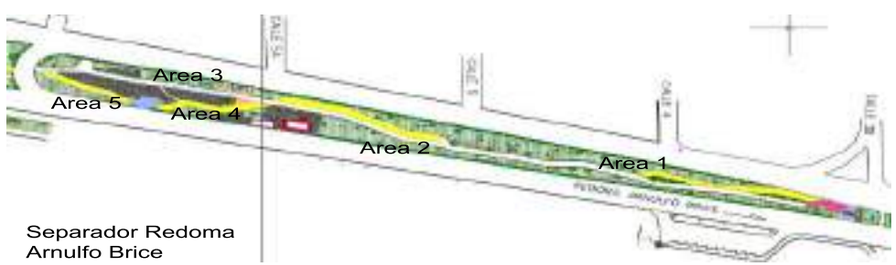

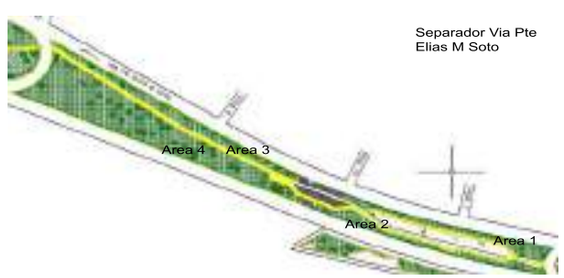



OBSERVACIONES:Hoja 6 de 20

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexill Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

	CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025					PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.								DESDE:	16	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		INFORME No.	MODIFICATORIO 1	HASTA:	16	1	2026

ÍTEM:	2,1	Limpieza general y deshierbe	UNIDAD	m2	CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA	21,289.22	CANTIDAD ACUMULADA	21,289.22

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6				2,028.63						2,028.63	
19	1	2026	Lateral Derecho entre calles 6 a 7A ÁREA 1				239.85						239.85	
19	1	2026	Lateral Derecho entre calles 6 a 7A ÁREA 2				207.22						207.22	
19	1	2026	Lateral Derecho entre calles 6 a 7A ÁREA 3				327.94						327.94	
19	1	2026	Redoma de Corponor ÁREA 1				479.11						479.11	
19	1	2026	Redoma de Corponor ÁREA 2				297.90						297.90	
19	1	2026	Redoma de Corponor ÁREA 3				1,084.17						1,084.17	
19	1	2026	Redoma de Corponor ÁREA 4				152.18						152.18	
19	1	2026	Redoma de Corponor ÁREA 5				822.53						822.53	
19	1	2026	Redoma de Corponor ÁREA 6				343.94						343.94	
												TOTAL:	5,983.47	



Lateral Derecho Entre calles 6 a 7A



OBSERVACIONES:Hoja 7 de 20

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**21,289.22**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**21,289.22**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Redoma de Corponor ÁREA 7				192.70						192.70	
19	1	2026	Redoma de Corponor ÁREA 8				1,155.15						1,155.15	
19	1	2026	Redoma de Corponor ÁREA 9				861.26						861.26	
19	1	2026	Redoma de Corponor ÁREA 10				126.80						126.80	
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 1				2.31						2.31	
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 2				26.53						26.53	
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 3				11.49						11.49	
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 4, 5, 6				6.41						6.41	
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 7				30.46						30.46	
												TOTAL:	**2,413.11**	



OBSERVACIONES:Hoja 8 de 20

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	16	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	16	1	2026

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**21,289.22**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**21,289.22**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 8				22.26						22.26	
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 9				15.01						15.01	
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 10				13.20						13.20	
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 11				83.00						83.00	
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 12				73.89						73.89	
19	1	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 13				40.96						40.96	
													248.32	
												TOTAL ACUMULADO	**21,289.22**	





OBSERVACIONES:Hoja 9 de 20

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	19	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	19	1	2026

ÍTEM:	**2,2**	**Excavación y nivelación**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**600.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**600.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA (M2)**	**VOLUMEN (M3)**	**LONGITUD (ML)**	**KILO (KG)**	**UNIDAD (UND)**	**HORAS (HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**		**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**								
19	1	2026	En las areas de intervencion del proyecto					600					600.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
												TOTAL:	**600.00**	

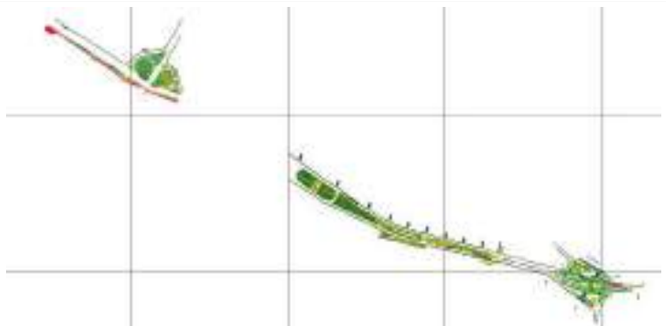

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**2,3**	**Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**50.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**50.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Erradicacion Arboles porte alto en las areas de intervencion del proyecto								50		50	
												TOTAL:	**50.00**	

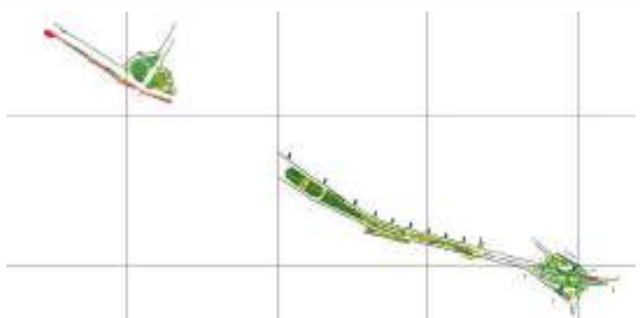

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	19	1	2026	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	19	1	2026	

ÍTEM:	**2,4**	**Retiro de material sobrante**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**860.24**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**860.24**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Área total de limpieza			0.05	3328.21						166.41	
19	1	2026	ÁREA total de excavación					**332.84**					332.84	
			Area total de limpieza por intervencion del proyecto					359.6909					359.69	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
												SUBTOTAL:	**858.9414**	
												Factor área de expansión:	**1.3000**	
												TOTAL:	**0.241400000**	

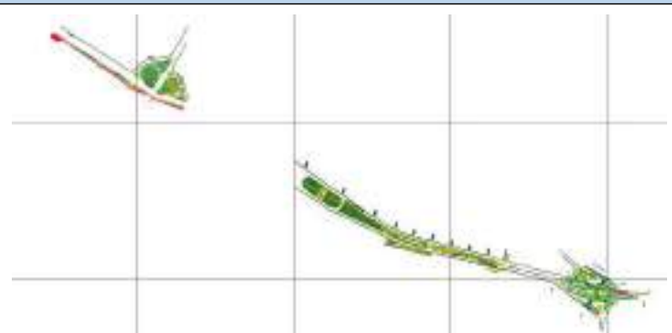

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 2,5**	**Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**8551.26**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**8551.26**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
19	1	2026	conformacion y nivelacion material de excavacion en las areas de intervencion				2,835.52						2,835.52	
							5,515.74						5515.74	
							200						200.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
												SUBTOTAL:	**8551.26**	
												Factor área de expansión:	**1.00**	
												TOTAL:	**8551.26**	

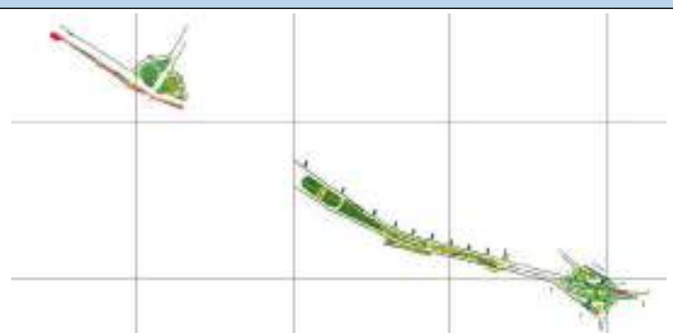

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	19	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1	**HASTA:**	19	1	2026

ÍTEM:	3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA	554.04	CANTIDAD ACUMULADA	554.04

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Mejora de suelo en las areas de intervencion del proyecto					554					554	
												TOTAL:	554.04	

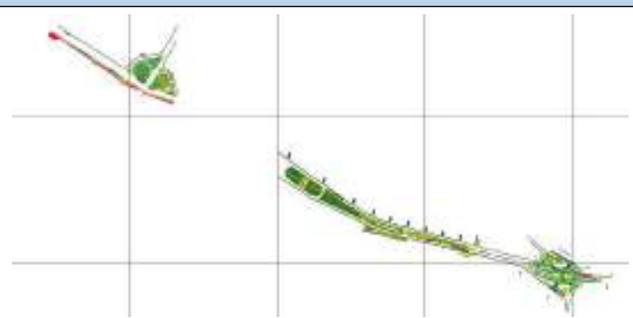

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	Nelson David Acevedo Torres	Angela Gioconda Jaimes Coronado	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,1**	**Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**300.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**300.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Veranera en las areas de intervencion del proyecto								300		300	
												TOTAL:	**300.00**	

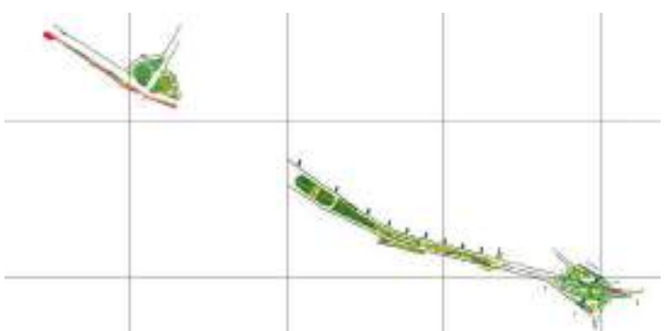



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025					**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**										**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,2**	**Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Agave en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	**100.00**	

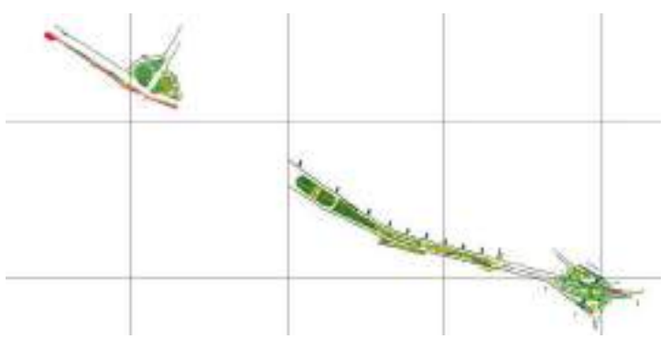



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,3**	**Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**100.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
19	1	2026	Maguey en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	**100.00**	

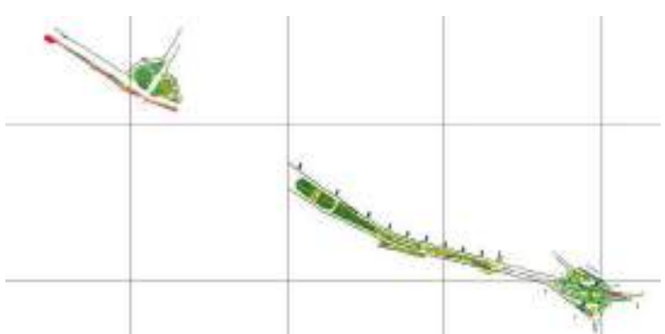



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1		**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,4**	**Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**0.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**0.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Palma CICA en las areas de intervencion del proyecto								0		0	
												TOTAL:	0.00	

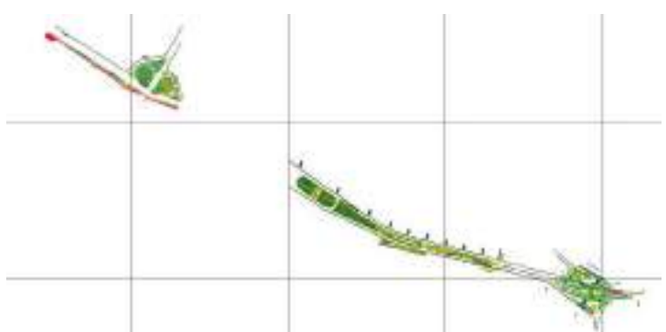



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,5**	**Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**0.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**0.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Palma Manila en las areas de intervencion del proyecto								0		0	
												TOTAL:	**0.00**	

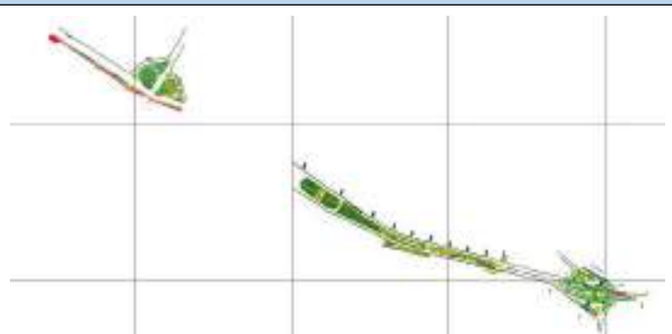



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,6**	**Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Cinta de Colores en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	**100.00**	

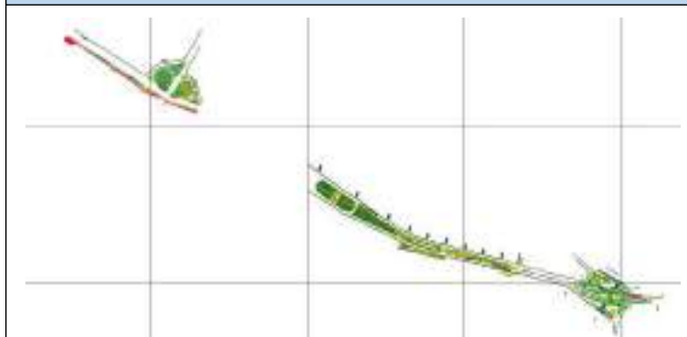



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1		**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,7**	**Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Cactus en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	**100.00**	

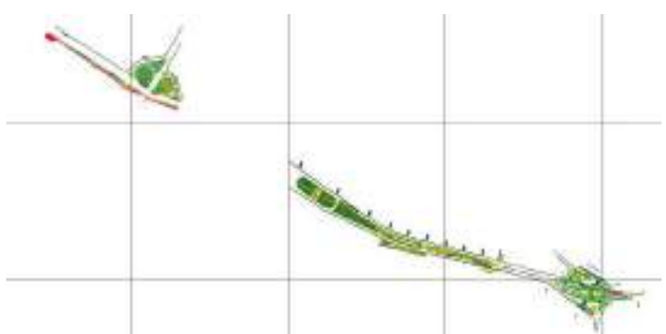



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,8**	**Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Isora blanca y roja en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	**100.00**	

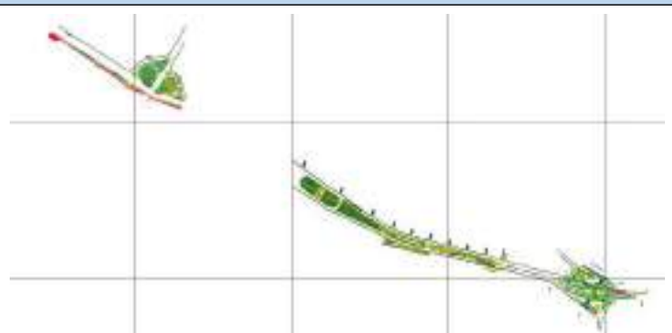

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**	**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,9**	**Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Duranta en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	**100.00**	

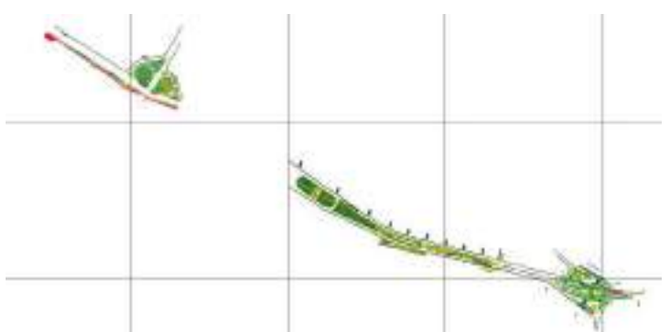



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,10**	**Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**200.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**200.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Lengua de Suegra en las areas de intervencion del proyecto								200		200	
												TOTAL:	**200.00**	

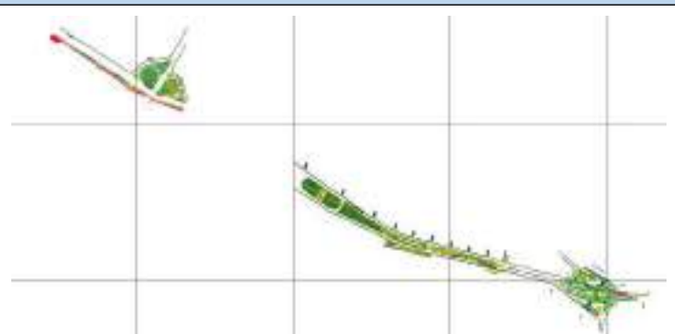



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,11**	**Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**0.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**0.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Palma rubelina en las areas de intervencion del proyecto								0		0	
												TOTAL:	0.00	

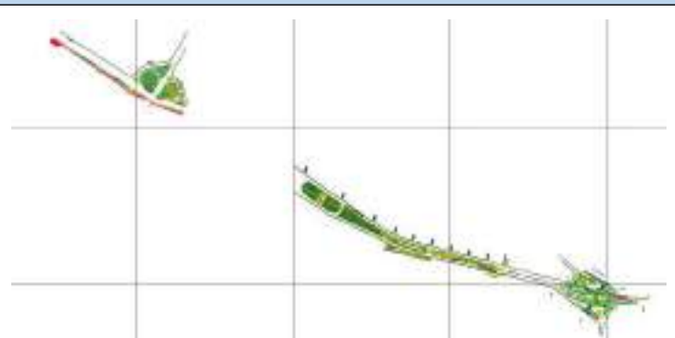



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,12**	**Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**20.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**20.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Urapo en las areas de intervencion del proyecto								20		20	
												TOTAL:	**20.00**	

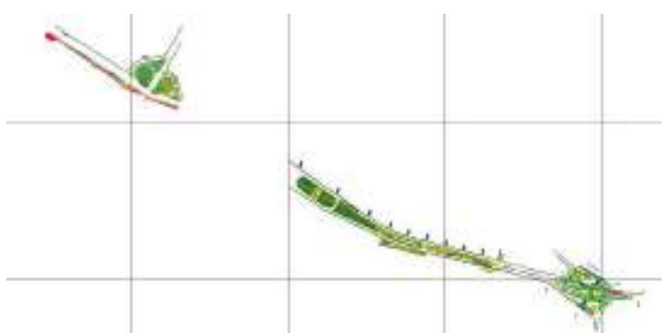



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**	**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,13**	**Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**80.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**80.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Guayacán en las areas de intervencion del proyecto								80		80	
												TOTAL:	**80.00**	

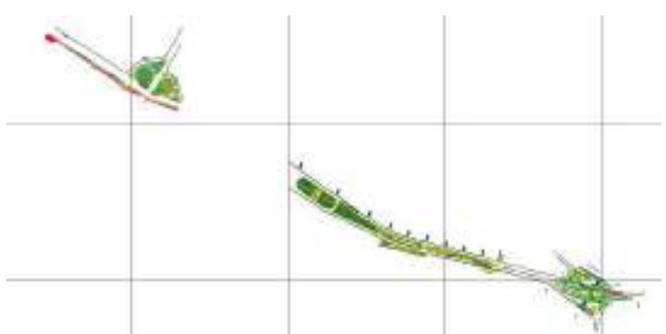



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,14**	**Suministro e Instalación de Grama maní forrajero**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**1000.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**1000.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	Maní Forrajero en las areas de intervencion del proyecto				1000						1000	
													TOTAL:	**1000.00**

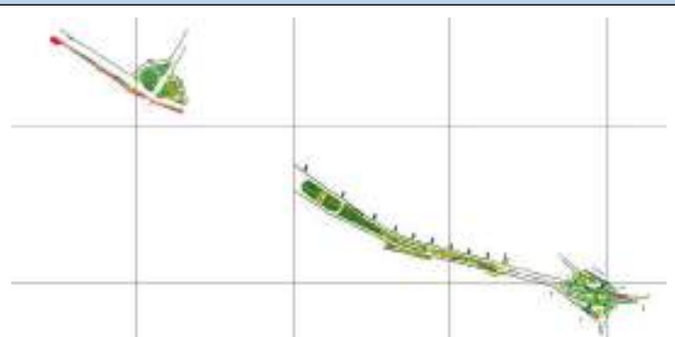



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,15**	**Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**80.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**80.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	PALMA MARIPOSA en las areas de intervencion del proyecto								80		80	
												TOTAL:	**80.00**	

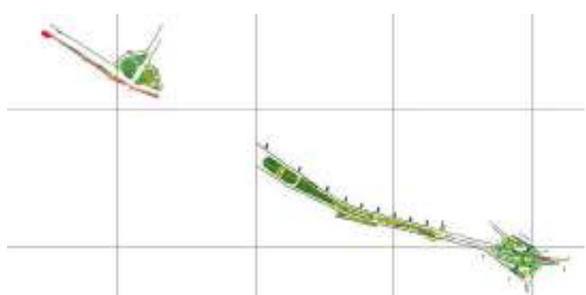



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,16**	**Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**80.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**80.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
19	1	2026	PALMA COLA DE ZORRO en las areas de intervencion del proyecto								80		80	
												TOTAL:	**80.00**	

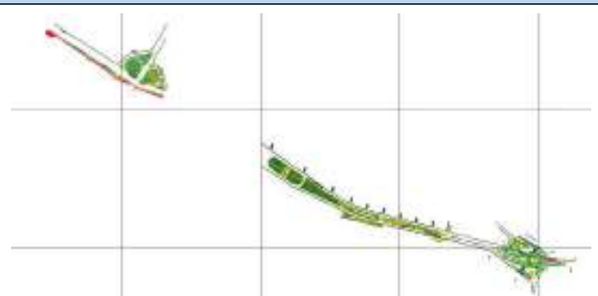



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	19	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 1	HASTA:	19	1	2026

ÍTEM:	NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA	14.00	CANTIDAD ACUMULADA	14.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	PALMA BISMARCKIA en las areas de intervencion del proyecto								14		14	
												TOTAL:	14.00	

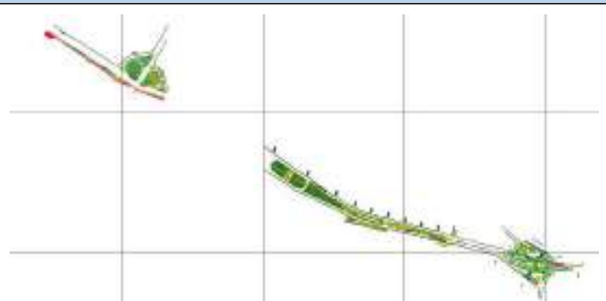



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	Nelson David Acevedo Torres	Angela Gioconda Jaimes Coronado	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,18**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**50.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**50.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	PALMA BISMARCKIA en las areas de intervencion del proyecto								50		50	
												TOTAL:	**50.00**	

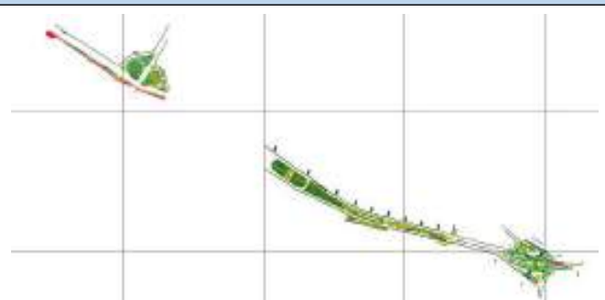



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,19**	**Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**35.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**35.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	PALMA AREKA en las areas de intervencion del proyecto								35		35	
												TOTAL:	**35.00**	

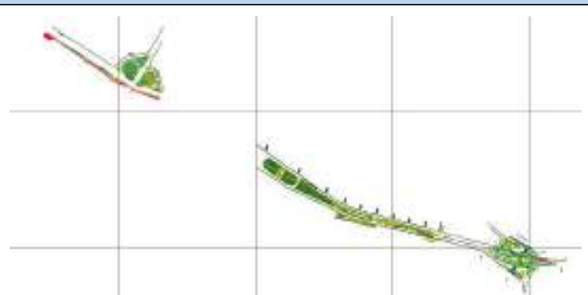



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,20**	**Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**36.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**36.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	PALMA REAL en las areas de intervencion del proyecto								36		36	
												TOTAL:	**36.00**	

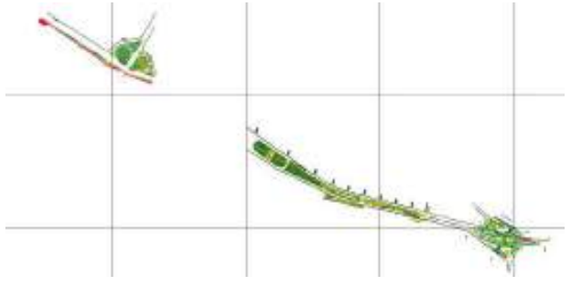



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**NP 3,2,21**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**9.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**9.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	PALMA BOTELLA en las areas de intervencion del proyecto								9		9	
												TOTAL:	**9.00**	

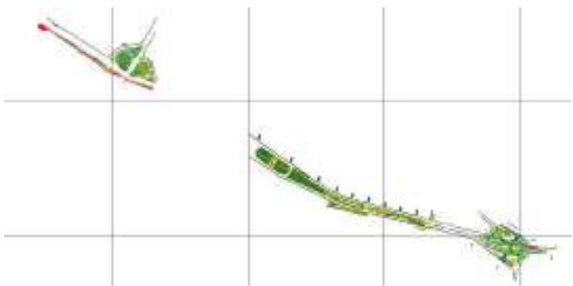



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,22**	**Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**80.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**80.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	PALMA CICA en las areas de intervencion del proyecto								80		80	
												TOTAL:	**80.00**	

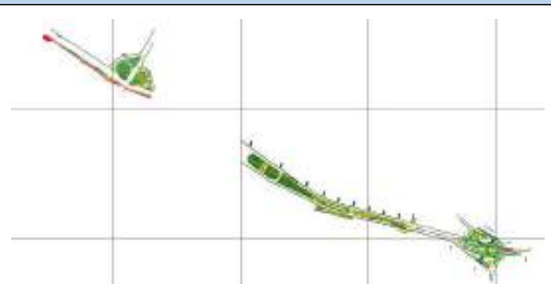



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,23**	**Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**80.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**80.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	PALMA MANILA en las areas de intervencion del proyecto								80		80	
												TOTAL:	**80.00**	

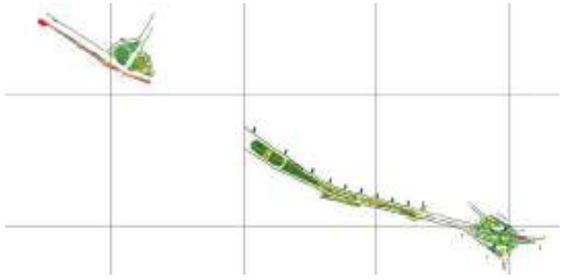



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	19	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 1	HASTA:	19	1	2026

ÍTEM:	NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	80.00	CANTIDAD ACUMULADA	80.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	PALMA ROUBELINA en las areas de intervencion del proyecto								80		80	
												TOTAL:	80.00	

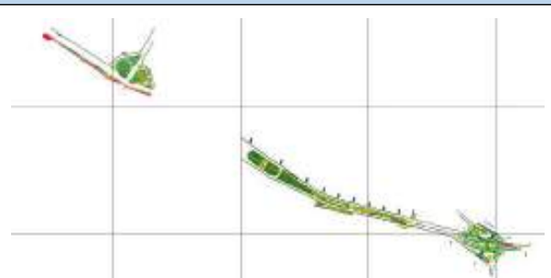



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	Nelson David Acevedo Torres	Angela Gioconda Jaimes Coronado	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,25**	**Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**300.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**300.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	PALMA CORDYLINE en las areas de intervencion del proyecto								300		300	
												TOTAL:	**300.00**	

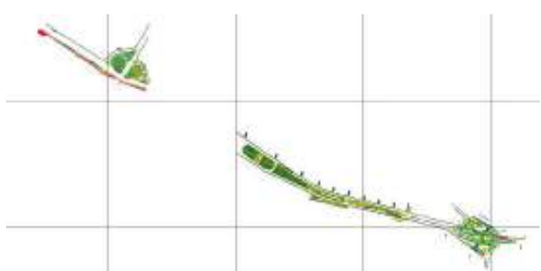



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,26**	**Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**150.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**150.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	GINGER AMARILLA en las areas de intervencion del proyecto								150		150	
												TOTAL:	**150.00**	

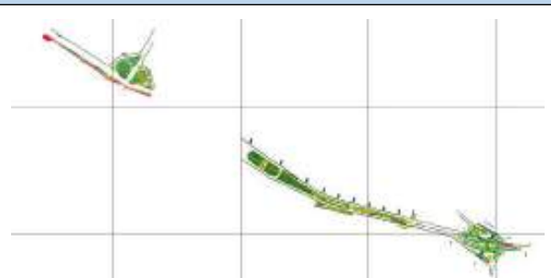



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexill Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,27**	**Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**200.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**200.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	CANCION DE LA INDIA en las areas de intervencion del proyecto								200		200	
												TOTAL:	**200.00**	

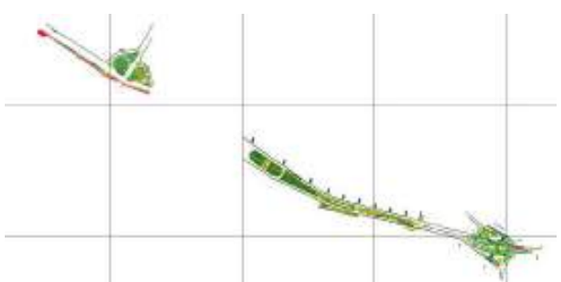



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,28**	**Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**180.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**180.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	CHEFLERA VARIAGADA en las areas de intervencion del proyecto								180		180	
												TOTAL:	**180.00**	

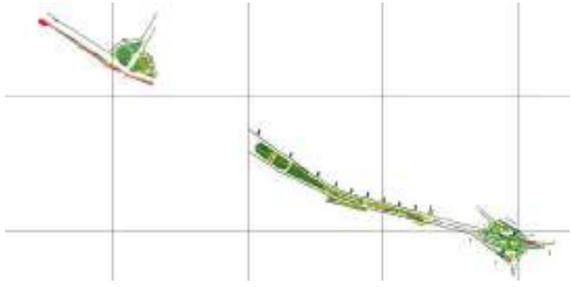



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**NP 3,2,29**	**Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	MARGITANA en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	**100.00**	

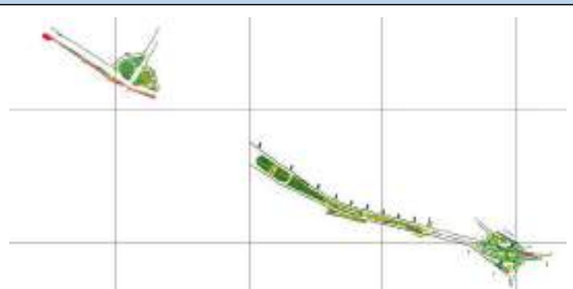



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,30**	**Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**1000.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**1000.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	FRAILEJON en las areas de intervencion del proyecto								1000		1000	
												TOTAL:	**1000.00**	

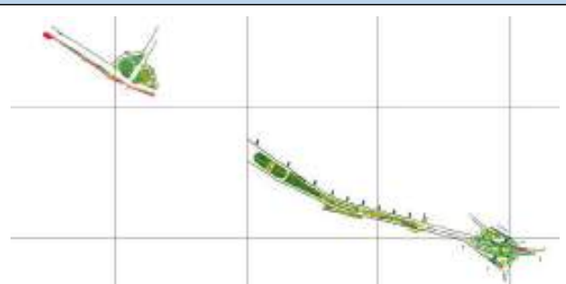



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,31**	**Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**400.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**400.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	Amancay en las areas de intervencion del proyecto								400		400	
												TOTAL:	**400.00**	

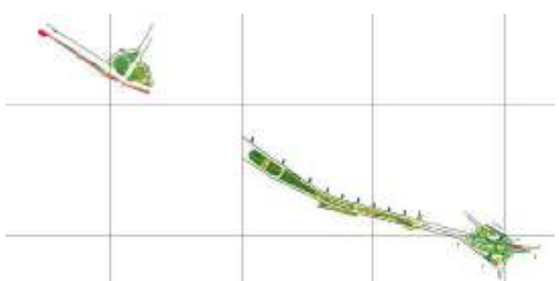



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP**												
	3,2,32	**Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**250.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**250.00**			

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	SPRING en las areas de intervencion del proyecto								250		250	
												TOTAL:	**250.00**	

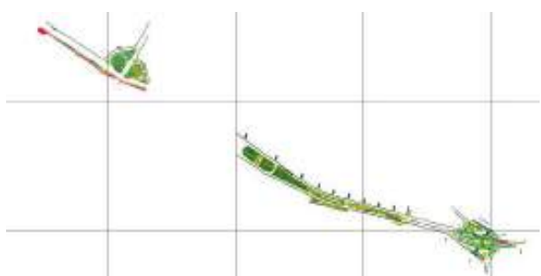



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,33**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**250.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**250.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	PHILODENDRO CORAZON en las areas de intervencion del proyecto								250		250	
												TOTAL:	**250.00**	

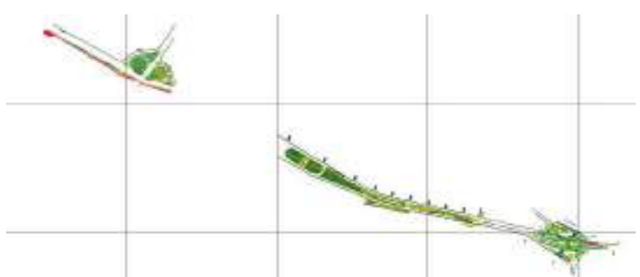



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,34**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**500.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**500.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	PHILODENDRO SELLOUM en las areas de intervencion del proyecto								500		500	
												TOTAL:	**500.00**	

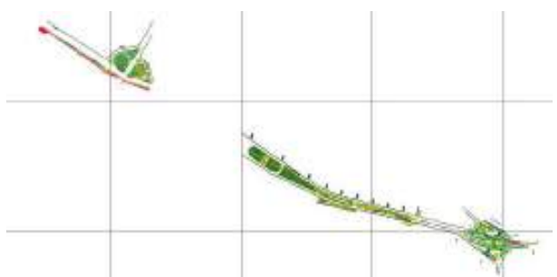



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,35**	**Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**235.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**235.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	PANDANUS VARIEGADO en las areas de intervencion del proyecto								235		235	
												TOTAL:	**235.00**	





OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**	**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**			

ÍTEM:	**NP 3,2,36**	**Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**60.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**60.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	VERANERA TALLO ALTO en las areas de intervencion del proyecto								60		60	
												TOTAL:	**60.00**	

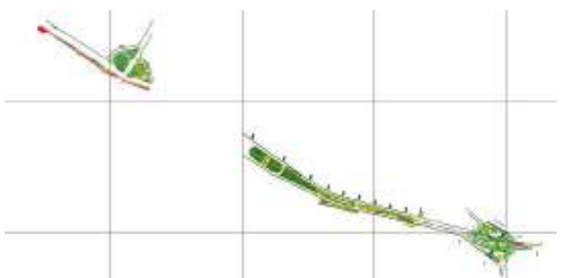



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,37**	**Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm**			**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**500.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**500.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	CINTA LIRIOPE en las areas de intervencion del proyecto								500		500	
												TOTAL:	**500.00**	

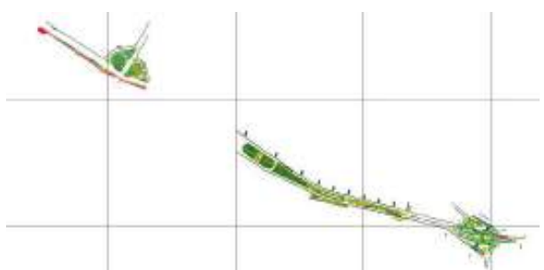



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,38**	**Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**22.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**22.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	LILIACEA en las areas de intervencion del proyecto								22		22	
												TOTAL:	**22.00**	

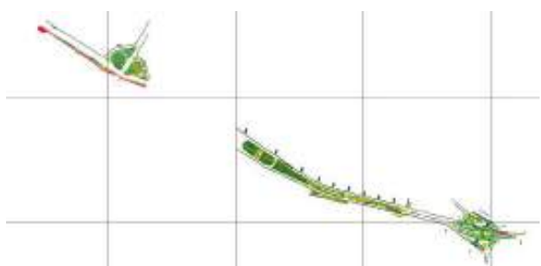



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,39**	**Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**1000.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**1000.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	FLOR DE LLANO en las areas de intervencion del proyecto								1000		1000	
												TOTAL:	**1000.00**	

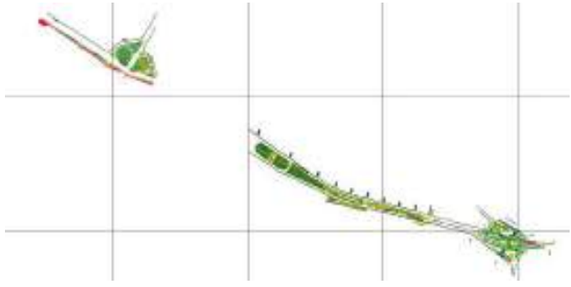



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**NP 3,2,40**	**Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**100.00**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	LANTANA en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	**100.00**	

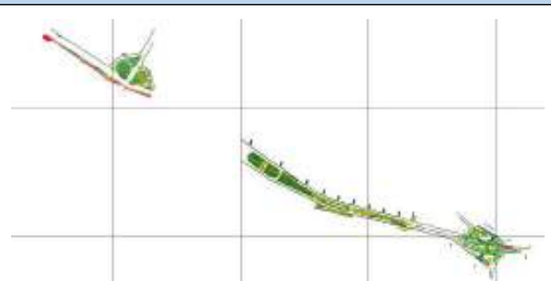

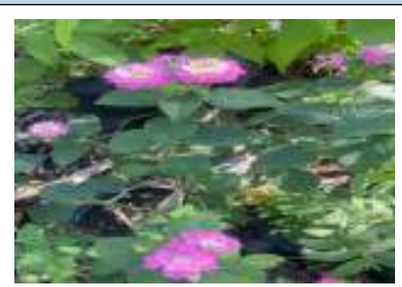

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	19	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 1	HASTA:	19	1	2026

ÍTEM:	NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	20.00	CANTIDAD ACUMULADA	20.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	PANAMEÑAS en las areas de intervencion del proyecto								20		20	
												TOTAL:	20.00	

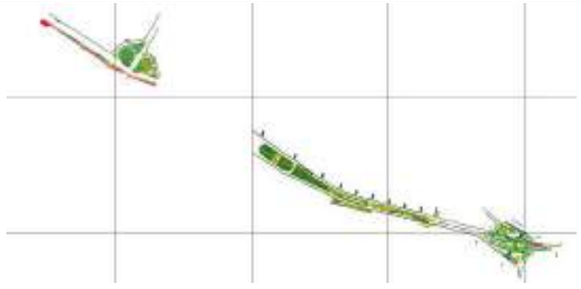



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	Nelson David Acevedo Torres	Angela Gioconda Jaimes Coronado	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**NP 3,2,42**	**Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**37.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**37.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	ARBOLES CARBONERO en las areas de intervencion del proyecto								37		37	
												TOTAL:	**37.00**	

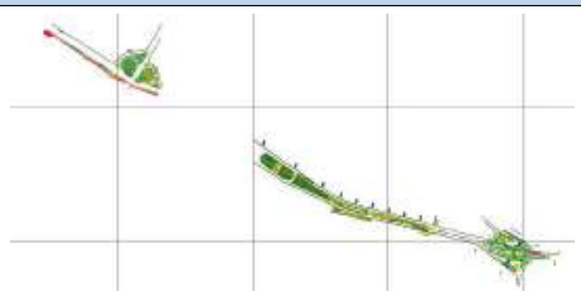



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,43**	**Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**37.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**37.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	ARBOLES OITI en las areas de intervencion del proyecto								37		37	
												TOTAL:	**37.00**	

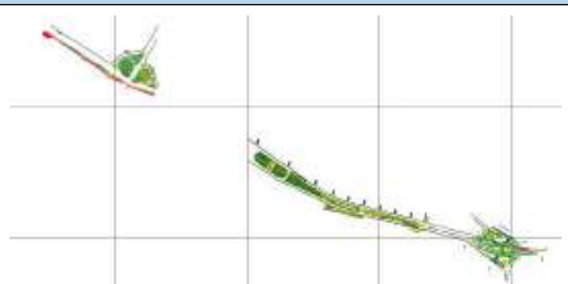



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	19	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 1	HASTA:	19	1	2026

ÍTEM:	NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	50.00	CANTIDAD ACUMULADA	50.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	IXORA PATILLA en las areas de intervencion del proyecto								50		50	
												TOTAL:	50.00	





OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	Nelson David Acevedo Torres	Angela Gioconda Jaimes Coronado	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	19	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 1	HASTA:	19	1	2026

ÍTEM:	NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	900.00	CANTIDAD ACUMULADA	900.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
19	1	2026	PLANTAS RASTRERAS en las areas de intervencion del proyecto								900		900	
													TOTAL:	900.00	

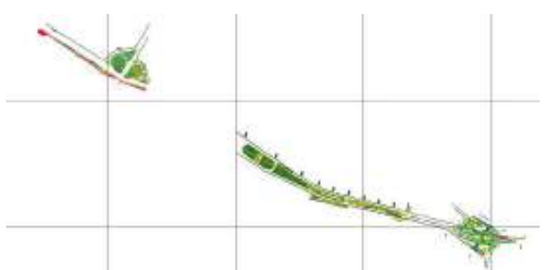



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	Nelson David Acevedo Torres	Angela Gioconda Jaimes Coronado	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**19**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**19**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**NP 3,2,46**	**Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**250.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**250.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
19	1	2026	TU Y YO en las areas de intervencion del proyecto								250		250	
												TOTAL:	**250.00**	

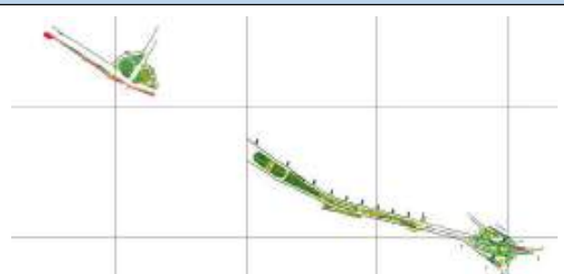



OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,3,1**	**Suministro e instalación de material triturado**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**285.92**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**285.92**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
16	1	2026	Triturado en las areas de intervencion del proyecto					285.9166585					285.9166585	
												TOTAL:	**285.92**	

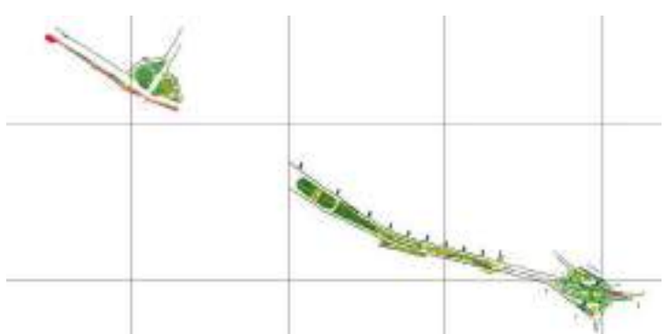

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexill Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**		**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**3,3,2**	**Suministro e instalación de piedra bola**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
16	1	2026	Piedra Bola en las areas de intervencion del proyecto					100					100	
												TOTAL:	**100.00**	

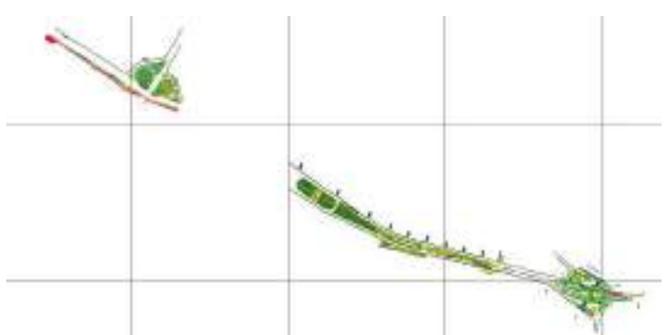

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,3,3**	**Instalación de nombres en material vegetal**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**2.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**2.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
16	1	2026	Nombres en material vegetal en las areas de intervencion del proyecto								2		2	
												TOTAL:	**2.00**	

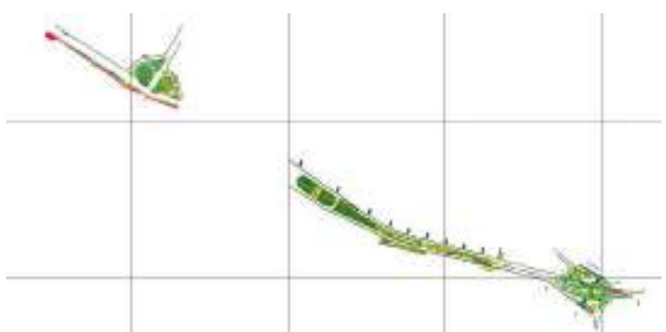

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**3,3,4**	**Instalación de vallas informativas**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**2.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**2.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
16	1	2026	Vallas informativas								2		2	
												TOTAL:	**2.00**	

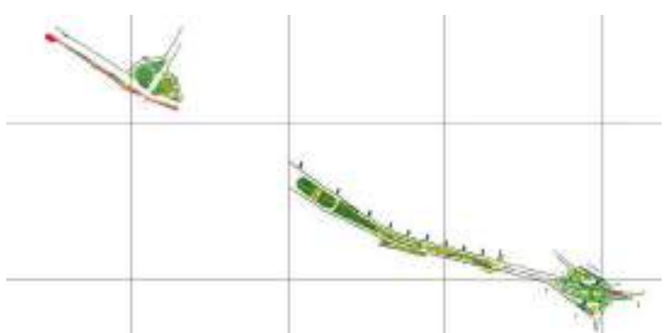

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 1		**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**4,1**	**Riego programado**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**672.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**672.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
16	1	2026	Riego en las areas de intervencion del proyecto					672					672	
TOTAL:													**672.00**	

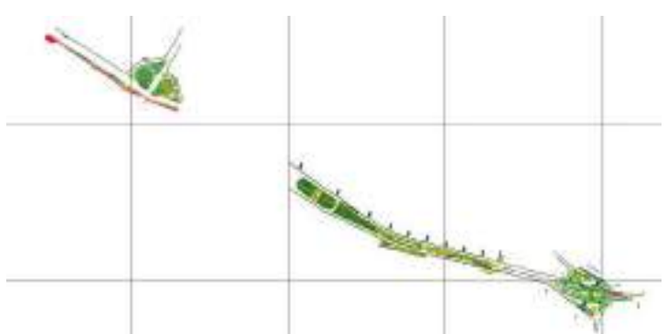

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**4,2**	**Limpieza continua de maleza**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**47600.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**47600.00**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
16	1	2026	Limpieza continua en las areas de intervencion del proyecto				47600						47600	
													TOTAL:	**47600.00**	

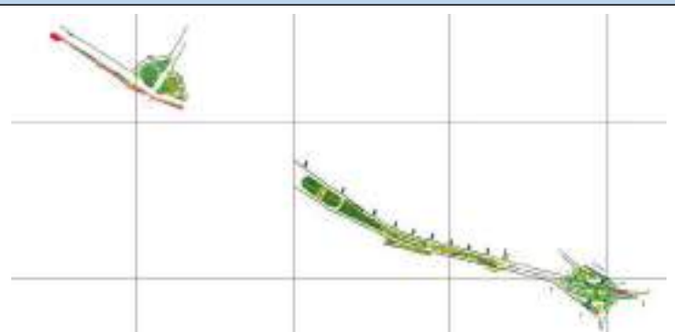

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**			**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**4,3**	**Nutrición y control fitosanitario**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**15400.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**15400.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
16	1	2026	Nutricion y control fitosanitario en las areas de intervencion del proyecto				15400						15400	
													TOTAL:	**15400.00**

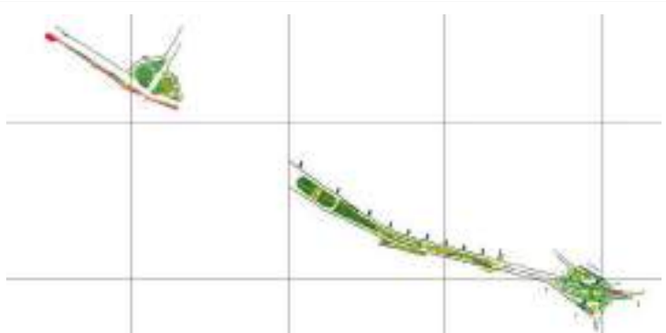

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**	**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**4,4**	**Poda y jardinería**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**11000.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**11000.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
16	1	2026	Poda y jarineria en las areas de intervencion del proyecto				11000						11000	
												TOTAL:	**11000.00**	

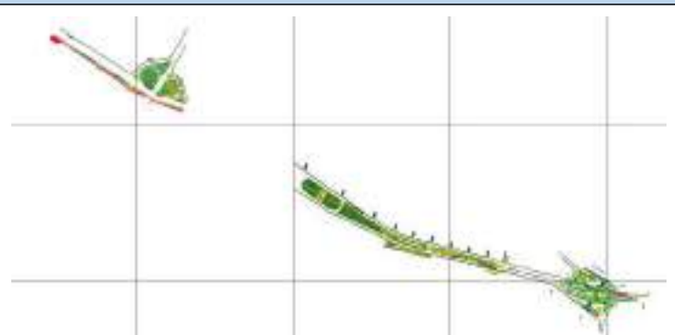

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**	**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**4,5**	**Retiro de residuos de mantenimiento**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**1075.12**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**1075.12**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
16	1	2026	Retiro de residuos de mantenimiento					1075.116475					1075.116475	
												TOTAL:	**1075.12**	

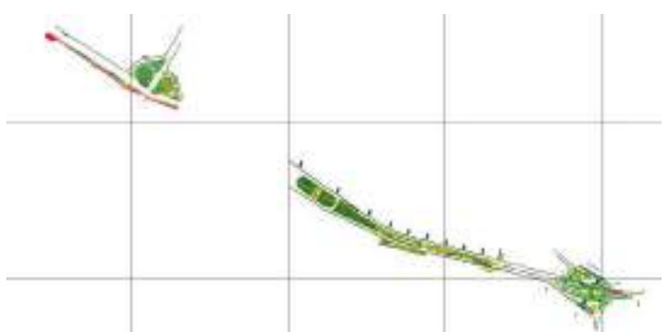

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**16**	**1**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 1**		**HASTA:**	**16**	**1**	**2026**	

ÍTEM:	**5,1**	**Campaña de cultura ciudadana**	**UNIDAD**	**Per**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**2500.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**2500.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
16	1	2026	Campaña de cultura ciudadana										2500	
												TOTAL:	**2500.00**	

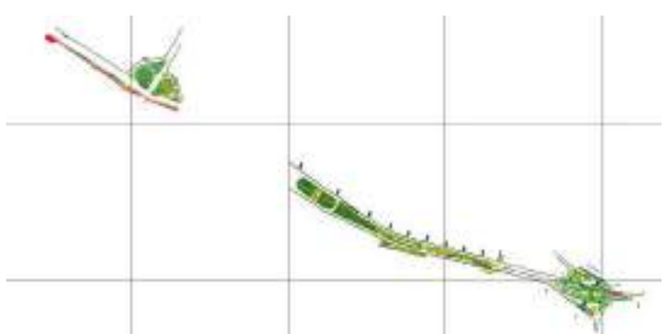

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 0x2	125,000.00	1.80	225,000.00	23.00	9,783.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,783

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				0

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					1,459
SUBTOTAL EQUIPOS					1,459

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 11,242.00
ADMINISTRACION	22%	$ 2,473.00
IMPREVISTOS	2%	$ 225.00
UTILIDAD	6%	$ 675.00
COSTO TOTAL		**$14,615.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	8.00	39,375.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					39,375

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	1.00	386,667.00	386,667.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				386,667

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 426,984.00
ADMINISTRACION	22%	$93,936.00
IMPREVISTOS	2%	$ 8,540.00
UTILIDAD	6%	$25,619.00
COSTO TOTAL		**$ 555,079.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	9.00	35,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					35,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	1.00	355,000.00	355,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				355,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 390,942.00
ADMINISTRACION	22%	$86,007.00
IMPREVISTOS	2%	$ 7,819.00
UTILIDAD	6%	$23,457.00
COSTO TOTAL		**$ 508,225.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	9.00	35,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					35,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	1.00	500,000.00	500,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				500,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 535,942.00
ADMINISTRACION	22%	$ 117,907.00
IMPREVISTOS	2%	$10,719.00
UTILIDAD	6%	$32,157.00
COSTO TOTAL		**$ 696,725.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	9.00	35,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					35,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	1.00	375,000.00	375,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				375,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 410,942.00
ADMINISTRACION	22%	$90,407.00
IMPREVISTOS	2%	$ 8,219.00
UTILIDAD	6%	$24,657.00
COSTO TOTAL		**$ 534,225.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	9.00	35,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					35,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	1.00	351,667.00	351,667.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				351,667

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 387,609.00
ADMINISTRACION	22%	$85,274.00
IMPREVISTOS	2%	$ 7,752.00
UTILIDAD	6%	$23,257.00
COSTO TOTAL		**$ 503,892.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	9.00	35,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					35,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	1.00	501,667.00	501,667.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				501,667

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 537,609.00
ADMINISTRACION	22%	$ 118,274.00
IMPREVISTOS	2%	$10,752.00
UTILIDAD	6%	$32,257.00
COSTO TOTAL		**$ 698,892.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	9.00	35,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					35,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	1.00	501,667.00	501,667.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				501,667

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 537,609.00
ADMINISTRACION	22%	$ 118,274.00
IMPREVISTOS	2%	$10,752.00
UTILIDAD	6%	$32,257.00
COSTO TOTAL		**$ 698,892.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	9.00	35,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					35,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	1.00	351,667.00	351,667.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				351,667

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 387,609.00
ADMINISTRACION	22%	$85,274.00
IMPREVISTOS	2%	$ 7,752.00
UTILIDAD	6%	$23,257.00
COSTO TOTAL		**$ 503,892.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	9.00	35,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					35,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	1.00	386,667.00	386,667.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				386,667

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 422,609.00
ADMINISTRACION	22%	$92,974.00
IMPREVISTOS	2%	$ 8,452.00
UTILIDAD	6%	$25,357.00
COSTO TOTAL		**$ 549,392.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	9.00	35,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					35,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	1.00	353,333.00	353,333.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				353,333

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 389,275.00
ADMINISTRACION	22%	$85,641.00
IMPREVISTOS	2%	$ 7,786.00
UTILIDAD	6%	$23,357.00
COSTO TOTAL		**$ 506,059.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	1.00	51,883.00	51,883.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				51,883

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$61,825.00
ADMINISTRACION	22%	$13,602.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,237.00
UTILIDAD	6%	$ 3,710.00
COSTO TOTAL		**$80,374.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	52,000.00	52,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				52,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$61,942.00
ADMINISTRACION	22%	$13,627.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,239.00
UTILIDAD	6%	$ 3,717.00
COSTO TOTAL		**$80,525.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	52,500.00	52,500.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				52,500

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$62,442.00
ADMINISTRACION	22%	$13,737.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,249.00
UTILIDAD	6%	$ 3,747.00
COSTO TOTAL		**$81,175.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	50,167.00	50,167.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				50,167

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$60,109.00
ADMINISTRACION	22%	$13,224.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,202.00
UTILIDAD	6%	$ 3,607.00
COSTO TOTAL		**$78,142.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	50,167.00	50,167.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				50,167

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$60,109.00
ADMINISTRACION	22%	$13,224.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,202.00
UTILIDAD	6%	$ 3,607.00
COSTO TOTAL		**$78,142.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1.00	16,500.00	16,500.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				16,500

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$26,442.00
ADMINISTRACION	22%	$ 5,817.00
IMPREVISTOS	2%	$ 529.00
UTILIDAD	6%	$ 1,587.00
COSTO TOTAL		**$34,375.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	1.00	44,167.00	44,167.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				44,167

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$54,109.00
ADMINISTRACION	22%	$11,904.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,082.00
UTILIDAD	6%	$ 3,247.00
COSTO TOTAL		**$70,342.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	1.00	16,833.00	16,833.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				16,833

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$26,775.00
ADMINISTRACION	22%	$ 5,891.00
IMPREVISTOS	2%	$ 536.00
UTILIDAD	6%	$ 1,607.00
COSTO TOTAL		**$34,809.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	1.00	44,167.00	44,167.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				44,167

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$54,109.00
ADMINISTRACION	22%	$11,904.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,082.00
UTILIDAD	6%	$ 3,247.00
COSTO TOTAL		**$70,342.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	1.00	44,167.00	44,167.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				44,167

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$54,109.00
ADMINISTRACION	22%	$11,904.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,082.00
UTILIDAD	6%	$ 3,247.00
COSTO TOTAL		**$70,342.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	1.00	44,167.00	44,167.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				44,167

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$54,109.00
ADMINISTRACION	22%	$11,904.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,082.00
UTILIDAD	6%	$ 3,247.00
COSTO TOTAL		**$70,342.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	1.00	47,500.00	47,500.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				47,500

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$57,442.00
ADMINISTRACION	22%	$12,637.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,149.00
UTILIDAD	6%	$ 3,447.00
COSTO TOTAL		**$74,675.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	16,667.00	16,667.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				16,667

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$26,609.00
ADMINISTRACION	22%	$ 5,854.00
IMPREVISTOS	2%	$ 532.00
UTILIDAD	6%	$ 1,597.00
COSTO TOTAL		**$34,592.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	18,000.00	18,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				18,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$27,942.00
ADMINISTRACION	22%	$ 6,147.00
IMPREVISTOS	2%	$ 559.00
UTILIDAD	6%	$ 1,677.00
COSTO TOTAL		**$36,325.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	16,167.00	16,167.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				16,167

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$26,109.00
ADMINISTRACION	22%	$ 5,744.00
IMPREVISTOS	2%	$ 522.00
UTILIDAD	6%	$ 1,567.00
COSTO TOTAL		**$33,942.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	16,167.00	16,167.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				16,167

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$26,109.00
ADMINISTRACION	22%	$ 5,744.00
IMPREVISTOS	2%	$ 522.00
UTILIDAD	6%	$ 1,567.00
COSTO TOTAL		**$33,942.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	45,333.00	45,333.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				45,333

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$55,275.00
ADMINISTRACION	22%	$12,161.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,106.00
UTILIDAD	6%	$ 3,317.00
COSTO TOTAL		**$71,859.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	120,000.00	120,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				120,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 129,942.00
ADMINISTRACION	22%	$28,587.00
IMPREVISTOS	2%	$ 2,599.00
UTILIDAD	6%	$ 7,797.00
COSTO TOTAL		**$ 168,925.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	120,000.00	120,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				120,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 129,942.00
ADMINISTRACION	22%	$28,587.00
IMPREVISTOS	2%	$ 2,599.00
UTILIDAD	6%	$ 7,797.00
COSTO TOTAL		**$ 168,925.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	1.00	45,000.00	45,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				45,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$54,942.00
ADMINISTRACION	22%	$12,087.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,099.00
UTILIDAD	6%	$ 3,297.00
COSTO TOTAL		**$71,425.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	40.00	7,875.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					7,875

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	1.00	8,833.00	8,833.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				8,833

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$17,650.00
ADMINISTRACION	22%	$ 3,883.00
IMPREVISTOS	2%	$ 353.00
UTILIDAD	6%	$ 1,059.00
COSTO TOTAL		**$22,945.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	40.00	7,875.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					7,875

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	1.00	8,833.00	8,833.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				8,833

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$17,650.00
ADMINISTRACION	22%	$ 3,883.00
IMPREVISTOS	2%	$ 353.00
UTILIDAD	6%	$ 1,059.00
COSTO TOTAL		**$22,945.00**

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 20 enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Interventor LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

DESARROLLO: Modificación de las siguientes cantidades de obra del presupuesto inicial presentado de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Mediante el acta de comité de obra N° 03 del 19 de enero del 2026 se justificó y las modificaciones de las cantidades de obra de los ítems contratados y modificados según acta de modificación n° 1 y otros ajustes recomendados , a continuación se presenta el balance de los mayores y menores cantidades de obra, así como la aprobación precios unitarios de los ítems no previstos

1. se Aumentan las cantidades de los siguientes ítems, las cuales quedarán así.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTI	VALOR UNITARIO	VALOR ($)
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				
2.1	Limpieza general y deshierbe	m2	4489.22	$ 1,352.00	$ 6,069,425
COSTO TOTAL					**$ 6,069,425**

2. se disminuyen las cantidades de los siguientes ítems, las cuales quedarán así.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CAN	V/UNITARIO	VALOR ($)
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				
2.2	Excavación y nivelación	M3	240	$ 60,100.00	$ 14,424,000.00
2.4	Retiro de material sobrante	M3	839.76	$ 40,224.00	$ 33,778,450.00
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				
3.1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	M3	1125.96	$ 117,873.00	$ 132,720,834.00
3.2	**siembra de material vegetal**				
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	1820	$ 33,942.00	$ 61,774,440.00
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	1818	$ 41,798.00	$ 75,988,764.00
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	520	$ 46,798.00	$ 24,334,960.00
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	320	$ 26,974.00	$ 8,631,680.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1400	$ 16,090.00	$ 22,526,000.00
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2400	$ 11,090.00	$ 26,616,000.00
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	900	$ 12,737.00	$ 11,463,300.00
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1620	$ 14,090.00	$ 22,825,800.00
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	M2	5250	$ 17,290.00	$ 90,772,500.00
3.3	**INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS**				
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	M3	103	$ 128,873.00	$ 13,273,919.00
COSTO TOTAL					**$ 539,130,647.00**

3. Se incluyen las cantidades de los siguientes ítems, las cuales quedarán así.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR ($)
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				
NP 2,5	Conformación, relleno y nivelación con material de excavación.	m3	8551	$ 11,242	$ 96,133,265.00
3.2	**siembra de material vegetal**				$ -
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	80	$ 426,984.00	$ 34,158,720.00
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	80	$ 390,942.00	$ 31,275,360.00
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	14	$ 535,942.00	$ 7,503,188.00
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	50	$ 410,942.00	$ 20,547,100.00
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	35	$ 387,609.00	$ 13,566,315.00
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	36	$ 537,609.00	$ 19,353,924.00
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	9	$ 537,609.00	$ 4,838,481.00
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	80	$ 387,609.00	$ 31,008,720.00
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	80	$ 422,609.00	$ 33,808,720.00

NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80	$ 389,275.00	$ 31,142,000.00
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	300	$ 61,825.00	$ 18,547,500.00
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	150	$ 61,942.00	$ 9,291,300.00
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	200	$ 62,442.00	$ 12,488,400.00
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180	$ 60,109.00	$ 10,819,620.00
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100	$ 60,109.00	$ 6,010,900.00
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1000	$ 26,442.00	$ 26,442,000.00
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	400	$ 54,109.00	$ 21,643,600.00
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	250	$ 26,775.00	$ 6,693,750.00
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	500	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	235	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	60	$ 57,442.00	$ 3,446,520.00
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	500	$ 26,609.00	$ 13,304,500.00

NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	22	$ 27,942.00	$ 614,724.00
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1000	$ 26,109.00	$ 26,109,000.00
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	100	$ 26,109.00	$ 2,610,900.00
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	20	$ 55,275.00	$ 1,105,500.00
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50	$ 54,942.00	$ 2,747,100.00
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900	$ 17,650.00	$ 15,885,000.00
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	250	$ 17,650.00	$ 4,412,500.00
COSTO TOTAL					**$ 568,421,680.00**

4. Se Eliminan las cantidades de los siguientes ítems, las cuales quedarán así

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR ($)
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				
3.2	**siembra de material vegetal**				
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	125	$ 66,974.00	$ 8,371,750
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	247	$ 86,974.00	$ 21,482,578

3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	85	$ 64,778.00	$ 5,506,130
COSTO TOTAL					**$ 35,360,458.00**

BALANCE FINANCIERO	DEBE	HABER
AUMENTAR		$ 6,069,425
DISMINUIR	$ 539,130,647.00	
INCLUIR		$ 568,421,680.00
ELIMINAR	$ 35,360,458.00	
TOTAL	**$ 574,491,105.00**	**$ 574,491,105.00**
DIFERENCIA A FAVOR DE CORPONOR	$ -	
	$ 574,491,105.00	**$ 574,491,105.00**

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

Anexo N°3 *Balance Físico - Financiero*

ANEXO 3. BALANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	01/01//2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES NELSON DAVID ACEVEDO TORRES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	1/31/2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 20 enero 2025			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 24/12/2025 - 31/12/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 31/01/2026		INFORME No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)	
1	**DIAGNÓSTICO**																					
1,1	Análisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00	0.30	$ 2,819,451.00		$ -		$ -	0.30	$ 2,819,451.00	**30%**	0.70	$ 6,578,718.00	**70%**
1,2	Identificación de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00	0.30	$ 655,269.00		$ -		$ -	0.30	$ 655,269.00	**30%**	0.70	$ 1,528,960.00	**70%**
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00	0.30	$ 640,583.00		$ -		$ -	0.30	$ 640,583.00	**30%**	0.70	$ 1,494,693.00	**70%**
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**																			-		
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00	3,328.21	$ 4,499,740.00	2,895.52	$ 3,914,743.00		$ -	6,223.73	$ 8,414,483.00	**29%**	15,065.49	$ 20,368,542.00	**71%**
2,2	Excavación y nivelación	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00	332.84	$ 20,003,684.00	98.76	$ 5,935,596.00		$ -	431.60	$ 25,939,280.00	**72%**	168.40	$ 10,120,720.00	**28%**
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- .00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 33,510,000.00	**100%**
2,4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00	649.03	$ 26,106,583.00		$ -		$ -	649.03	$ 26,106,583.00	**75%**	211.21	$ 8,495,767.00	**25%**
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00	**34%**	5,655.74	$ 63,581,829.00	**66%**
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**											$ -								-		
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	1,680.00	$ 117,873.00	$ 198,026,640.00	(-)	(1,126.0)	$ (132,720,834.00)	554.0	$ 65,305,806.00	-	$ -	98.76	$ 11,641,373.00		$ -	98.76	$ 11,641,373.00	**18%**	455.27	$ 53,664,433.00	**82%**
3,2	**siembra de material vegetal**																			-		
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	2,120.00	$ 33,942.00	$ 71,957,040.00	(-)	(1,820.00)	$ (61,774,440.00)	300.00	$ 10,182,600.00	-	$ -	153.00	$ 5,193,126.00		$ -	153.00	$ 5,193,126.00	**51%**	147.00	$ 4,989,474.00	**49%**
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	1,918.00	$ 41,798.00	$ 80,168,564.00	(-)	(1,818.00)	$ (75,988,764.00)	100.00	$ 4,179,800.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00	**100%**	-	$ -	
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	620.00	$ 46,798.00	$ 29,014,760.00	(-)	(520.00)	$ (24,334,960.00)	100.00	$ 4,679,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 4,679,800.00	**100%**
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	125.00	$ 66,974.00	$ 8,371,750.00	(-)	(125.00)	$ (8,371,750.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	247.00	$ 86,974.00	$ 21,482,578.00	(-)	(247.00)	$ (21,482,578.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	420.00	$ 26,974.00	$ 11,329,080.00	(-)	(320.00)	$ (8,631,680.00)	100.00	$ 2,697,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 2,697,400.00	**100%**
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1,500.00	$ 16,090.00	$ 24,135,000.00	(-)	(1,400.00)	$ (22,526,000.00)	100.00	$ 1,609,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,609,000.00	**100%**
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2,500.00	$ 11,090.00	$ 27,725,000.00	(-)	(2,400.00)	$ (26,616,000.00)	100.00	$ 1,109,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,109,000.00	**100%**
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	1,000.00	$ 12,737.00	$ 12,737,000.00	(-)	(900.00)	$ (11,463,300.00)	100.00	$ 1,273,700.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,273,700.00	**100%**
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1,820.00	$ 14,090.00	$ 25,643,800.00	(-)	(1,620.00)	$ (22,825,800.00)	200.00	$ 2,818,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		200.00	$ 2,818,000.00	**100%**
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	85.00	$ 64,778.00	$ 5,506,130.00	(-)	(85.00)	$ (5,506,130.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	

ANEXO 3. BALANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025			PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.						**DESDE:**	01/01//2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES NELSON DAVID ACEVEDO TORRES	**INFORME No.** 2	**HASTA:**	1/31/2026

3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00		- .00	$ -	20.00	$ 401,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 401,800.00	**100%**
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00		- .00	$ -	80.00	$ 1,607,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 1,607,200.00	**100%**
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	6,250.00	$ 17,290.00	$ 108,062,500.00	(-)	(5,250.00)	$ (90,772,500.00)	1,000.00	$ 17,290,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,000.00	$ 17,290,000.00	**100%**
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	0.00	$ 426,984.00	$ -	(+)	80.00	$ 34,158,720.00	80.00	$ 34,158,720.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 34,158,720.00	**100%**
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	0.00	$ 390,942.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,275,360.00	80.00	$ 31,275,360.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 31,275,360.00	**100%**
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	0.00	$ 535,942.00	$ -	(+)	14.00	$ 7,503,188.00	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	0.00	$ 410,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 20,547,100.00	50.00	$ 20,547,100.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 20,547,100.00	**100%**
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	35.00	$ 13,566,315.00	35.00	$ 13,566,315.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		35.00	$ 13,566,315.00	**100%**
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	36.00	$ 19,353,924.00	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	9.00	$ 4,838,481.00	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,008,720.00	80.00	$ 31,008,720.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 31,008,720.00	**100%**
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 422,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 33,808,720.00	80.00	$ 33,808,720.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00	**13%**	70.00	$ 29,582,630.00	**88%**
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	0.00	$ 389,275.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,142,000.00	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	0.00	$ 61,825.00	$ -	(+)	300.00	$ 18,547,500.00	300.00	$ 18,547,500.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00	**74%**	79.00	$ 4,884,175.00	**26%**
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 61,942.00	$ -	(+)	150.00	$ 9,291,300.00	150.00	$ 9,291,300.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		150.00	$ 9,291,300.00	**100%**
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 62,442.00	$ -	(+)	200.00	$ 12,488,400.00	200.00	$ 12,488,400.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00	**28%**	145.00	$ 9,054,090.00	**73%**
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	180.00	$ 10,819,620.00	180.00	$ 10,819,620.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00	**56%**	80.00	$ 4,808,720.00	**44%**

ANEXO 3. BALANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025			PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**						**DESDE:**	01/01//2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES NELSON DAVID ACEVEDO TORRES	**INFORME No.** 2	**HASTA:**	1/31/2026

NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 6,010,900.00	100.00	$ 6,010,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 6,010,900.00	**100%**
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	0.00	$ 26,442.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,442,000.00	1,000.00	$ 26,442,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,000.00	$ 26,442,000.00	**100%**
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	400.00	$ 21,643,600.00	400.00	$ 21,643,600.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00	**21%**	315.00	$ 17,044,335.00	**79%**
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	0.00	$ 26,775.00	$ -	(+)	250.00	$ 6,693,750.00	250.00	$ 6,693,750.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 6,693,750.00	**100%**
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	250.00	$ 13,527,250.00	250.00	$ 13,527,250.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 13,527,250.00	**100%**
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	500.00	$ 27,054,500.00	500.00	$ 27,054,500.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00	**52%**	241.00	$ 13,040,269.00	**48%**
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	235.00	$ 12,715,615.00	235.00	$ 12,715,615.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00	**14%**	203.00	$ 10,984,127.00	**86%**
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	0.00	$ 57,442.00	$ -	(+)	60.00	$ 3,446,520.00	60.00	$ 3,446,520.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00	**63%**	22.00	$ 1,263,724.00	**37%**
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,609.00	$ -	(+)	500.00	$ 13,304,500.00	500.00	$ 13,304,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		500.00	$ 13,304,500.00	**100%**
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 27,942.00	$ -	(+)	22.00	$ 614,724.00	22.00	$ 614,724.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		22.00	$ 614,724.00	**100%**
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,109,000.00	1,000.00	$ 26,109,000.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00	**5%**	950.00	$ 24,803,550.00	**95%**
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 2,610,900.00	100.00	$ 2,610,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 2,610,900.00	**100%**
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 55,275.00	$ -	(+)	20.00	$ 1,105,500.00	20.00	$ 1,105,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 1,105,500.00	**100%**
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00		$ -	5.00	$ 649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00	**14%**	32.00	$ 4,158,144.00	**86%**
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00	**51%**	18.00	$ 2,338,956.00	**49%**
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	0.00	$ 54,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 2,747,100.00	50.00	$ 2,747,100.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 2,747,100.00	**100%**
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	900.00	$ 15,885,000.00	900.00	$ 15,885,000.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00	**7%**	840.00	$ 14,826,000.00	**93%**
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	250.00	$ 4,412,500.00	250.00	$ 4,412,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 4,412,500.00	**100%**
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**																			-		
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00		- .00	$ -	285.92	$ 32,272,271.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		285.92	$ 32,272,271.00	**100%**

ANEXO 3. BALANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	01/01//2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES NELSON DAVID ACEVEDO TORRES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	1/31/2026

3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	203.00	$ 128,873.00	$ 26,161,219.00	(-)	(103.00)	$ (13,273,919.00)	100.00	$ 12,887,300.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 12,887,300.00	**100%**
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		2.00	$ 4,180,400.00	**100%**
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00	**100%**	-	$ -	
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**						- .00													-		
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		672.00	$ 52,080,000.00	**100%**
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		47,600.00	$ 64,355,200.00	**100%**
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		15,400.00	$ 86,886,800.00	**100%**
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		11,000.00	$ 32,395,000.00	**100%**
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00		- .00	$ -	1,075.12	$ 43,157,326.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,075.12	$ 43,157,326.00	**100%**
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**																			-		
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		2,500.00	$ 27,735,000.00	**100%**
COSTO DIRECTO					**$ 1,189,274,532.00**			**$ -**		**$ 1,189,274,532.00**		**$ 54,725,310.00**		**$186,675,530.00**		**$ -**		**$ 241,400,840.00**			**$ 947,873,692.00**	
ADMINISTRACIÓN				22%	$ 261,640,397.00			0		$ 261,640,397.00		$ 12,039,568.20		$41,068,616.60		0		$ 53,108,184.80			$ 208,532,212.24	
IMPREVISTOS				2%	$ 23,785,491.00			0		$ 23,785,491.00		$ 1,094,506.20		$3,733,510.60		0		$ 4,828,016.80			$ 18,957,473.84	
UTILIDADES				6%	$ 71,356,472.00			0		$ 71,356,472.00		$ 3,283,518.60		$11,200,531.80		0		$ 14,484,050.40			$ 56,872,421.52	
IVA sobre utilidad				19%	$ 13,557,730.00			0		$ 13,557,730.00		$ 623,868.53		$2,128,101.04		0		$ 2,751,969.58			$ 10,805,760.09	
COSTO INDIRECTO					**$ 370,340,090.00**			**$ -**		**$ 370,340,090.00**		**$ 17,041,462.00**		**$ 58,130,760.00**		**$ -**		**$ 75,172,222.00**			**$ 295,167,868.00**	
VALOR TOTAL					**$ 1,559,614,622.00**			**$ -**		**$ 1,559,614,622.00**		**$ 71,766,772.00**		**$244,806,290.00**		**$ -**		**$ 316,573,062.00**			**$ 1,243,041,560.0**	
PORCENTAJE DE AVANCE												**4.60%**		**15.70%**		**0.00%**		**20.30%**			**79.70%**	

AVANCE FÍSICO : 20.30%

OBSERVACIONES:




Luis Fernando Suárez Delgado
RESIDENTE DE OBRA



Nelson David Acevedo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Angela Gioconda Jaimes Coronado
DIRECTOR DE OBRA



Freddy Alexili Villan Valencia
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo N°4 *Memorias de Cálculo*


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**	**21,289.22**	**CANT EJECUTADA**	**2,895.52**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**6,223.73**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1				806.60						806.60	REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 2				673.90						673.90	REDOMA PUENTE GUADUA
														REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Lateral derecho puente de guadua; entrada túneles				229.20						229.20	REDOMA PUENTE GUADUA
														REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 1				298.87						298.87	REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 2				328.84						328.84	REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 3				49.98						49.98	REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Entrada via Libertadores - San Luis ÁREA 1				374.91						374.91	REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Entrada via Libertadores - San Luis ÁREA 2				133.22						133.22	REDOMA PUENTE GUADUA
												TOTAL:	**2,895.52**	

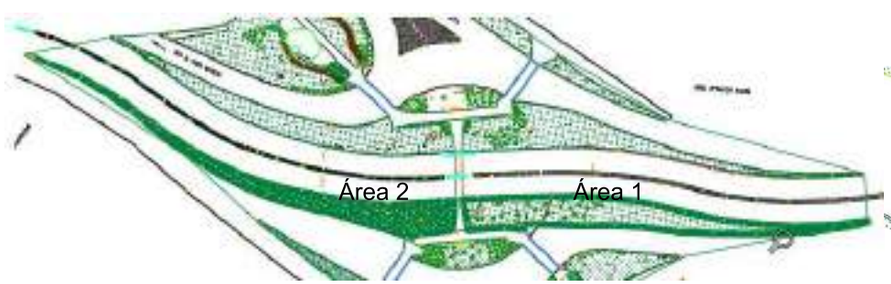



LATERAL DERECHO



ENTRADA SAN LUIS - MEDICAL DUARTE



ENTRADA VIA LIBERTADOR ES - SAN LUIS

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024


CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026

ÍTEM:	**2,2**	**Excavación y nivelación**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**600.00**	**CANT EJECUTADA**	**98.76**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**98.76**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente	0.70	0.70	0.70					40.00		13.72	**Abertura Para PALMA ROUBELINA**
31	1	2026	Lateral Derecho debajo del puente	0.70	0.70	0.70					40.00		13.72	**Abertura Para PALMA ROUBELINA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1	0.70	0.70	0.70					7.00		2.40	**Abertura Para PALMA REAL**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2	0.70	0.70	0.70					10.00		3.43	**Abertura Para PALMA REAL**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 3	0.70	0.70	0.70					4.00		1.37	**Abertura Para PALMA REAL**
31	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte Área 3	0.70	0.70	0.70					7.00		2.40	**Abertura Para PALMA REAL**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1	0.70	0.70	0.70					8.00		2.74	**Abertura Para PALMA REAL**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1	0.70	0.70	0.70					6.00		2.06	**Abertura para PALMA BOTELLA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2	0.70	0.70	0.70					3.00		1.03	**Abertura para PALMA BOTELLA**
												TOTAL:	**42.88**	





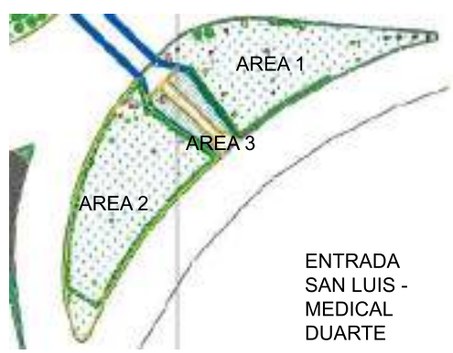

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 5

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026		

ÍTEM:	**2,2**	**Excavación y nivelación**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**600.00**	**CANT EJECUTADA**	**98.76**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**98.76**


FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1	0.80	0.80	0.90					2.00		1.15	**Abertura Para PALMA BISMARCKIA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2	0.80	0.80	0.80					3.00		1.54	**Abertura Para PALMA BISMARCKIA**
31	1	2026	area frente a la clinica duarte	0.80	0.80	0.80					9.00		4.61	**Abertura Para PALMA BISMARCKIA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2	0.70	0.70	0.70					10.00		3.43	**Abertura Para PALMA MANILLA**
31	1	2026	Lateral izquierdo puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					120.00		3.24	**Abertura Para CORDYLINE**
31	1	2026	Lateral derecho puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					50.00		1.35	**Abertura Para CORDYLINE**
31	1	2026	Lateral derecho puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					51.00		1.38	**Abertura Para CORDYLINE**
31	1	2026	Lateral der-izq puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					55.00		1.485	**Abertura Para CANCION DE LA INDIA**
												TOTAL:	**18.18**	

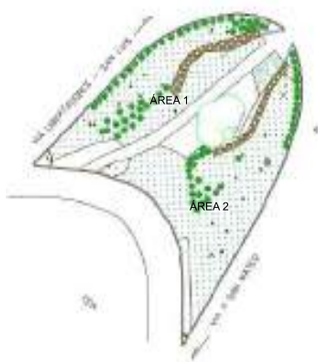

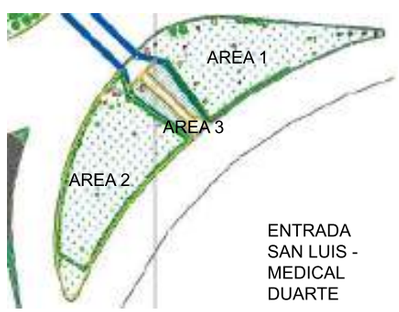

ENTRADA SAN LUIS - MEDICAL DUARTE





LATERAL DERECHO

OBSERVACIONES: Hoja 2 de 5

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024


UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2			**HASTA:**	31	1	2026

ÍTEM:	**2,2**	**Excavación y nivelación**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**600.00**	**CANT EJECUTADA**	**98.76**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**98.76**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral der-izq puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					50.00		1.35	**Abertura Para CHEFLERA VARIAGADA**
31	1	2026	Lateral der-izq puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					50.00		1.35	**Abertura Para CHEFLERA VARIAGADA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Bricceño Area 2 3	0.20	0.20	0.20					85.00		0.68	**Abertura Para AMANCAY**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Bricceño Area 1 2	0.40	0.40	0.40					50.00		3.20	**Abertura PHILODENDRON SELLOUM**
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1	0.40	0.40	0.40					100.00		6.40	**Abertura PHILODENDRON SELLOUM**
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1	0.40	0.40	0.40					30.00		1.92	**Abertura PHILODENDRON SELLOUM**
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1	0.40	0.40	0.40					79.00		5.06	**Abertura PHILODENDRON SELLOUM**
												TOTAL:	**19.96**	







OBSERVACIONES: Hoja 3 de 5

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2			**HASTA:**	31	1	2026

ÍTEM:	**2,2**	**Excavación y nivelación**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**600.00**	**CANT EJECUTADA**	**98.76**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**98.76**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1 2	0.20	0.20	0.20					113.00		0.90	**Abertura para PANDANUS VARIEGADO**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1 2	0.40	0.40	0.40					38.00		2.43	**Abertura VERANERA TALLA ALTO**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2	0.20	0.20	0.20					50.00		0.40	**Abertura para FLOR DEL LLANO**
31	1	2026	area lateral separador	0.70	0.70	0.70					19.00		6.52	**Abertura para ARBOL OITI**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1	0.70	0.70	0.70					5.00		1.72	**Abertura para CARBONERO**
												TOTAL ACUMULADO	**11.97**	



OBSERVACIONES: Hoja 4 de 5

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2			**HASTA:**	31	1	2026

ÍTEM:	**2,2**	**Excavación y nivelación**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**600.00**	**CANT EJECUTADA**	**98.76**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**98.76**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente	0.10	0.10	0.10					60.00		0.06	**Abertura para PLANTAS RASTRERAS**
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente	0.20	0.20	0.20					153.00		1.22	**Abertura VERANERA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1 2	0.30	0.30	0.30					158.00		4.27	**Abertura para AGAVE**
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente	0.10	0.10	0.10					235.00		0.24	**Abertura para MANI FORRAJERO**
												TOTAL:	**5.79**	
												TOTAL ACUMULADO	**98.76**	



OBSERVACIONES: Hoja 5 de 5

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2025


ÍTEM:	**NP 2,5**	**Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**	**8,551.26**	**CANT EJECUTADA**	**2,895.52**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**6,223.73**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1				806.60						806.60	REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 2				673.90						673.90	REDOMA PUENTE GUADUA
														REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Lateral derecho puente de guadua; entrada túneles				229.20						229.20	REDOMA PUENTE GUADUA
														REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 1				298.87						298.87	REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 2				328.84						328.84	REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 3				49.98						49.98	REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Entrada via Libertadores - San Luis ÁREA 1				374.91						374.91	REDOMA PUENTE GUADUA
31	1	2026	Entrada via Libertadores - San Luis ÁREA 2				133.22						133.22	REDOMA PUENTE GUADUA
												TOTAL:	**2,895.52**	

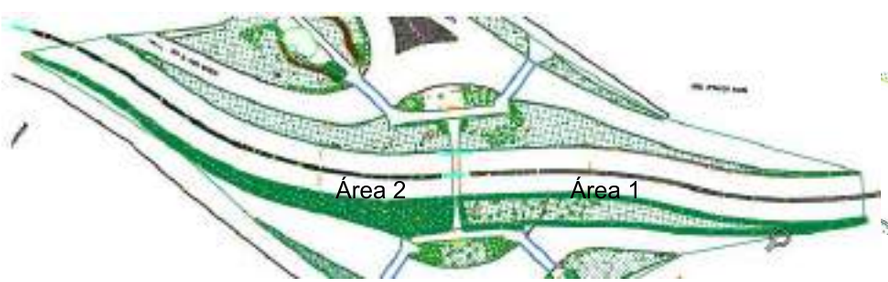



LATERAL DERECHO

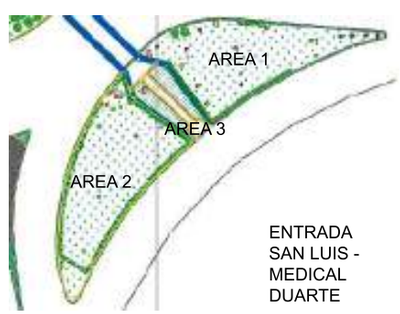

ENTRADA SAN LUIS - MEDICAL DUARTE



ENTRADA VIA LIBERTADOR ES - SAN LUIS

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026

ÍTEM:	3,1	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)**	**UNIDAD**	m3	**CANTIDAD TOTAL**	554.04	**CANT EJECUTADA**	98.76	**CANTIDAD ACUMULADA**	98.76

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente	0.70	0.70	0.70					40.00		13.72	**Abertura Para PALMA ROUBELINA**
31	1	2026	Lateral Derecho debajo del puente	0.70	0.70	0.70					40.00		13.72	**Abertura Para PALMA ROUBELINA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1	0.70	0.70	0.70					7.00		2.40	**Abertura Para PALMA REAL**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2	0.70	0.70	0.70					10.00		3.43	**Abertura Para PALMA REAL**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 3	0.70	0.70	0.70					4.00		1.37	**Abertura Para PALMA REAL**
31	1	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte Área 3	0.70	0.70	0.70					7.00		2.40	**Abertura Para PALMA REAL**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1	0.70	0.70	0.70					8.00		2.74	**Abertura Para PALMA REAL**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1	0.70	0.70	0.70					6.00		2.06	**Abertura para PALMA BOTELLA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2	0.70	0.70	0.70					3.00		1.03	**Abertura para PALMA BOTELLA**
												TOTAL:	**42.88**	





OBSERVACIONES: Hoja 1 de 5

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024


CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**		

ÍTEM:	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**554.04**	**CANT EJECUTADA**	**98.76**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**98.76**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1	0.80	0.80	0.90					2.00		1.15	**Abertura Para PALMA BISMARCKIA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2	0.80	0.80	0.80					3.00		1.54	**Abertura Para PALMA BISMARCKIA**
31	1	2026	area frente a la clinica duarte	0.80	0.80	0.80					9.00		4.61	**Abertura Para PALMA BISMARCKIA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2	0.70	0.70	0.70					10.00		3.43	**Abertura Para PALMA MANILLA**
31	1	2026	Lateral izquierdo puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					120.00		3.24	**Abertura Para CORDYLINE**
31	1	2026	Lateral derecho puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					50.00		1.35	**Abertura Para CORDYLINE**
31	1	2026	Lateral derecho puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					51.00		1.38	**Abertura Para CORDYLINE**
31	1	2026	Lateral der-izq puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					55.00		1.485	**Abertura Para CANCION DE LA INDIA**
												TOTAL:	**18.18**	



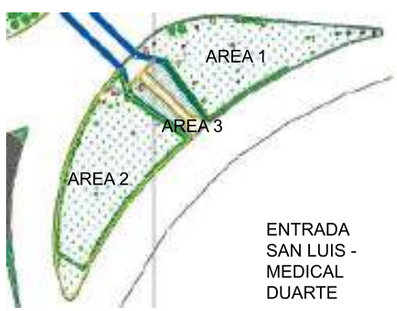



OBSERVACIONES: Hoja 2 de 5

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026

ÍTEM:	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**554.04**	**CANT EJECUTADA**	**98.76**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**98.76**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral der-izq puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					50.00		1.35	**Abertura Para CHEFLERA VARIAGADA**
31	1	2026	Lateral der-izq puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					50.00		1.35	**Abertura Para CHEFLERA VARIAGADA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Bricceño Area 2 3	0.20	0.20	0.20					85.00		0.68	**Abertura Para AMANCAY**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Bricceño Area 1 2	0.40	0.40	0.40					50.00		3.20	**Abertura PHILODENDRON SELLOUM**
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1	0.40	0.40	0.40					100.00		6.40	**Abertura PHILODENDRON SELLOUM**
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1	0.40	0.40	0.40					30.00		1.92	**Abertura PHILODENDRON SELLOUM**
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1	0.40	0.40	0.40					79.00		5.06	**Abertura PHILODENDRON SELLOUM**
												TOTAL:	**19.96**	









OBSERVACIONES: Hoja 3 de 5

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2			**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**554.04**	**CANT EJECUTADA**	**98.76**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**98.76**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1 2	0.20	0.20	0.20					113.00		0.90	**Abertura para PANDANUS VARIEGADO**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1 2	0.40	0.40	0.40					38.00		2.43	**Abertura VERANERA TALLA ALTO**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2	0.20	0.20	0.20					50.00		0.40	**Abertura para FLOR DEL LLANO**
31	1	2026	area lateral separador	0.70	0.70	0.70					19.00		6.52	**Abertura para ARBOL OITI**
			Monumento Arnulfo Briceño Área 1	0.70	0.70	0.70					5.00		1.72	**Abertura para CARBONERO**
												TOTAL ACUMULADO	**11.97**	



OBSERVACIONES: Hoja 4 de 5

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026		

ÍTEM:	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**554.04**	**CANT EJECUTADA**	**98.76**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**98.76**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente	0.10	0.10	0.10					60.00		0.06	**Abertura para PLANTAS RASTRERAS**
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente	0.20	0.20	0.20					153.00		1.22	**Abertura VERANERA**
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1 2	0.30	0.30	0.30					158.00		4.27	**Abertura para AGAVE**
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente	0.10	0.10	0.10					235.00		0.24	**Abertura para MANI FORRAJERO**
												TOTAL:	**5.79**	
												TOTAL ACUMULADO	**98.76**	



OBSERVACIONES: Hoja 5 de 5

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,1**	**Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**300.00**	**CANT EJECUTADA**	**153.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**153.00**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral Derecho debajo del puente								153		153	**Siembra de VERANERA**
												TOTAL:	**153.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,2**	**Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**100.00**	**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**100.00**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1 2								100		100	**Siembra de AGAVE**
													TOTAL:	**100.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,17**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**14.00**	**CANT EJECUTADA**	**14.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**14.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2								5		5	
31	1	2026	Entrada san luis medical duarte								9		9	
												TOTAL:	**14.00**	

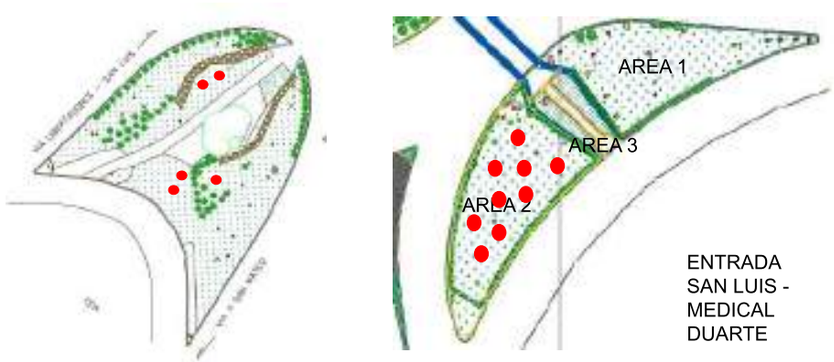

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**		

ÍTEM:	**NP 3,2,20**	**Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**36.00**	**CANT EJECUTADA**	**36.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**36.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2-3								21		21	
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2-3								7		7	
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2-3								8		8	
												TOTAL:	**36.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,21**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**9.00**	**CANT EJECUTADA**	**9.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**9.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2								9		9	
												TOTAL:	**9.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**		

ÍTEM:	**NP 3,2,23**	**Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**10.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**10.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
22	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2								10		10	
												TOTAL:	10.00	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026		

ÍTEM:	**NP 3,2,24**	**Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**80.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**80.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente ÁREA 1								20		20	
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1								20		20	
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente ÁREA 2								20		20	
31	1	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 2								20		20	
												TOTAL:	**80.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026		

ÍTEM:	**NP 3,2,25**	**Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**300.00**	**CANT EJECUTADA**	**221.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**221.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral izq- Der puente de guadua; entrada túneles								120		120	
31	1	2026	Lateral izq- Der puente de guadua; entrada túneles								50		50	
31	1	2026	Lateral izq- Der puente de guadua; entrada túneles								51		51	
												TOTAL:	**221.00**	





LATERAL DERECHO

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,27**	**Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**200.00**	**CANT EJECUTADA**	**55.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**55.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
31	1	2026	Lateral izq- der puente de guadua; entrada túneles								25		25	
31	1	2026	Lateral izq- der puente de guadua; entrada túneles								30		30	
													TOTAL:	**55.00**





LATERAL DERECHO

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026		

ÍTEM:	**NP 3,2,28**	**Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**180.00**	**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Lateral izq- der puente de guadua; entrada túneles								50		50	
31	1	2026	Lateral izq- der puente de guadua; entrada túneles								25		25	
											25		25	
												TOTAL:	**100.00**	



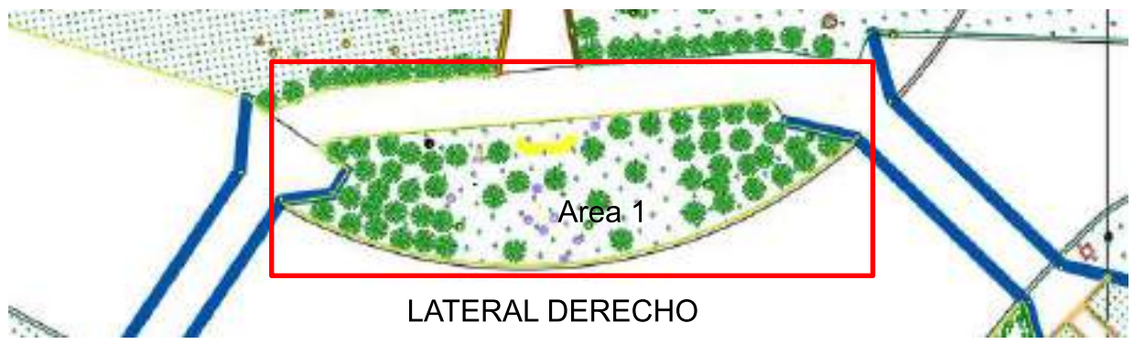

LATERAL DERECHO

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**		

ÍTEM:	**NP 3,2,31**	**Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**400.00**	**CANT EJECUTADA**	**85.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**85.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1 - 2								65		65	
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1 - 2								20		20	
												TOTAL:	**85.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2			**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,34**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**500.00**	**CANT EJECUTADA**	**259.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**259.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2								38		38	
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2								12		12	
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente								100		100	
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente								30		30	
31	1	2026	Lateral izquierdo debajo del puente								79		79	
												TOTAL:	**259.00**	





OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026		

ÍTEM:	**NP 3,2,35**	**Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**235.00**	**CANT EJECUTADA**	**32.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**32.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2-3								32		32	
												TOTAL:	**32.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2			**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,36**	**Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**60.00**	**CANT EJECUTADA**	**38.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**38.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2-								35		35	
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2-								3		3	
												TOTAL:	**38.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,39**	**Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**1,000.00**	**CANT EJECUTADA**	**50.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**50.00**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2								50		50	
												TOTAL:	50.00	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	1	2026		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	1	2026		

ÍTEM:	**NP 3,2,42**	**Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**37.00**	**CANT EJECUTADA**	**5.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**5.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2								5		5	
												TOTAL:	5.00	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**					
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**		
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**		

ÍTEM:	**NP 3,2,43**	**Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**37.00**	**CANT EJECUTADA**	**19.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**19.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA (M2)**	**VOLUMEN (M3)**	**LONGITUD (ML)**	**KILO (KG)**	**UNIDAD (UND)**	**HORAS (HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**								
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1-2								10		10	
31	1	2026	Entrada sal luis								9		9	
												TOTAL:	**19.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	2		**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,45**	**Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**900.00**	**CANT EJECUTADA**	**60.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**3,388.21**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA (M2)**	**VOLUMEN (M3)**	**LONGITUD (ML)**	**KILO (KG)**	**UNIDAD (UND)**	**HORAS (HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**								
31	1	2026	Monumento Arnulfo Briceño								60		60	
												TOTAL:	**60.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**1**	**1**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2			**HASTA:**	**31**	**1**	**2026**

ÍTEM:	**3,3,4**	**Instalación de vallas informativas**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**2.00**	**CANT EJECUTADA**	**2.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**2.00**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
31	1	2026	Valla								2		2	
												TOTAL:	**2.00**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 1

Luis Fernando Suárez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo N°5 *Registro Fotográfico*

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Se mantienen las actividades de limpieza en el costado derecho del puente de guadua, en el acceso a los túneles.



Se ejecutan trabajos de limpieza de la vegetación existente, incluyendo deshierve, limpieza del terreno y conformación del terreno.



Se evidencian los espacios con un gran cambio después de realizar las labores de limpieza (área lateral derecha del puente de guadua).



Se continúan las actividades de deshierve y limpieza en el área lateral derecha de la vía San Luis, frente al CAI. evidenciando falta de mantenimiento a la vegetacion existente

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**2,2**	**Excavación y nivelación**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Ejecución de excavaciones puntuales localizadas para la implantación de las especies vegetales proyectadas, de acuerdo con la ejecucion del proyecto.”



Ejecución de excavaciones puntuales localizadas para la implantación de las especies vegetales proyectadas, de acuerdo con la ejecucion del proyecto.”



Ejecución de excavaciones puntuales localizadas para la implantación de las especies vegetales proyectadas, de acuerdo con la ejecucion del proyecto.”



Ejecución de excavaciones puntuales localizadas para la implantación de las especies vegetales proyectadas, de acuerdo con la ejecucion del proyecto.”

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.		**INFORME No.**	**2**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 2,5**	**Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Conformación del terreno de rellenos en los laterales derechos del puente de guadua, con el fin de nivelar las zonas irregulares y realizar el retiro de material en las cotas superiores, para lograr la adecuada conformación del área.



Conformación del terreno de rellenos en los laterales derechos del puente de guadua, con el fin de nivelar las zonas irregulares y realizar el retiro de material en las cotas superiores, para lograr la adecuada conformación del área.



Conformación del terreno de rellenos en los laterales derechos del puente de guadua, con el fin de nivelar las zonas irregulares y realizar el retiro de material en las cotas superiores, para lograr la adecuada conformación del área.



Conformación del terreno de rellenos en los laterales derechos del puente de guadua, con el fin de nivelar las zonas irregulares y realizar el retiro de material en las cotas superiores, para lograr la adecuada conformación del área.

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.		**INFORME No.**	**2**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Distribución y acopio de bultos de material de enmienda en las áreas de siembra, destinados a su posterior aplicación durante las labores de implantación vegetal.



Aplicación de material de enmienda en las áreas de siembra, con el fin de mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo para la implantación vegetal



Aplicación de material de enmienda en las áreas de siembra, con el fin de mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo para la implantación vegetal



Distribución y acopio de bultos de material de enmienda en las áreas de siembra, destinados a su posterior aplicación durante las labores de implantación vegetal.

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.		**INFORME No.**	**2**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**3,2,1**	**Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Se está realizando la instalación de veraneras sobre los bordes bajos, con el fin de generar un impacto armónico mediante la floración característica de la especie.



Implantación de veraneras en el lateral derecho, en el área inferior del puente, conforme al diseño paisajístico del proyecto



Implantación de veraneras en el lateral derecho, en el área inferior del puente, conforme al diseño paisajístico del proyecto



Se está realizando la instalación de veraneras sobre los bordes bajos, con el fin de generar un impacto armónico mediante la floración característica de la especie.

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**3,2,2**	**Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Implantación de agaves de gran tamaño en las áreas intervenidas del Monumento Arnulfo Briseño, conforme al diseño paisajístico del proyecto.



Implantación de agaves de gran tamaño en las áreas intervenidas del Monumento Arnulfo Briseño, conforme al diseño paisajístico del proyecto.



presentacion de agaves en las áreas intervenidas del Monumento Arnulfo Briseño, conforme al diseño paisajístico del proyecto.



presentacion de agaves en las áreas intervenidas del Monumento Arnulfo Briseño, conforme al diseño paisajístico del proyecto.

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,17**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Se realizó la siembra de una palma de gran tamaño en el área del Monumento Arnulfo Briseño, como parte de la intervención paisajística



Se realizó la siembra de una palma de gran tamaño en el área del Monumento Arnulfo Briseño, como parte de la intervención paisajística



Se realizó la siembra de una palma de gran tamaño en el área frente a la clinica medical duarte, como parte de la intervención paisajística



Se realizó la siembra de una palma de gran tamaño en el área frente a la clinica medical duarte, como parte de la intervención paisajística

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,20**	**Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Implantación de palmas en zonas carentes de cobertura vegetal, con el fin de recuperar la estructura paisajística y mejorar la integración ambiental del área intervenida



Se realizaron instalaciones de palmas reales con el propósito de demarcar y estructurar la ruta peatonal del proyecto



Implantación de palmas en zonas carentes de cobertura vegetal, con el fin de recuperar la estructura paisajística y mejorar la integración ambiental del área intervenida



Se realizaron instalaciones de palmas reales con el propósito de demarcar y estructurar la ruta peatonal del proyecto

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,21**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Se realizaron instalaciones de palmas reales con el propósito de demarcar y estructurar la ruta peatonal del proyecto



Se realizaron instalaciones de palmas reales con el propósito de demarcar y estructurar la ruta peatonal del proyecto



Se realizaron instalaciones de palmas reales con el propósito de demarcar y estructurar la ruta peatonal del proyecto



Se realizaron instalaciones de palmas con el propósito de demarcar y estructurar la ruta peatonal del proyecto

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,23**	**Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Ejecución de labores de instalación de palmas manila orientadas a la creación de un oasis paisajístico, en articulación con las demás variedades de palmas definidas en el diseño del proyecto



Ejecución de labores de instalación de palmas manila orientadas a la creación de un oasis paisajístico, en articulación con las demás variedades de palmas definidas en el diseño del proyecto



Ejecución de labores de instalación de palmas manila orientadas a la creación de un oasis paisajístico, en articulación con las demás variedades de palmas definidas en el diseño del proyecto



Ejecución de labores de instalación de palmas manila orientadas a la creación de un oasis paisajístico, en articulación con las demás variedades de palmas definidas en el diseño del proyecto

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,24**	**Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Se realizó la instalación de un oasis de palmas rubelina en el costado derecho del proyecto del puente de guadua, como parte de la intervención paisajística



Se realizó la instalación de un oasis de palmas rubelina en el costado derecho del proyecto del puente de guadua, como parte de la intervención paisajística



Se realizó la instalación de un oasis de palmas rubelina en el costado izquierdo del proyecto del puente de guadua, como parte de la intervención paisajística



Se realizó la instalación de un oasis de palmas rubelina en el costado izquierdo del proyecto del puente de guadua, como parte de la intervención paisajística

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.		**INFORME No.**	**2**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,25**	**Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Implantación de cordyline en un diseño paisajístico armónico en los laterales derecho e izquierdo, en las zonas de acceso y salida de los túneles del puente de guadua.



Implantación de cordyline en un diseño paisajístico armónico en los laterales derecho e izquierdo, en las zonas de acceso y salida de los túneles del puente de guadua.



Implantación de cordyline en un diseño paisajístico armónico en los laterales derecho e izquierdo, en las zonas de acceso y salida de los túneles del puente de guadua.



Implantación de cordyline en un diseño paisajístico armónico en los laterales derecho e izquierdo, en las zonas de acceso y salida de los túneles del puente de guadua.

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,27**	**Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Ejecución de labores de instalación de cación de la India, acompañada de especies del género Cordyline, orientadas a la creación de un diseño de paisajismo orgánico y armónico



Ejecución de labores de instalación de cación de la India, acompañada de especies del género Cordyline, orientadas a la creación de un diseño de paisajismo orgánico y armónico



Ejecución de labores de instalación de cación de la India, acompañada de especies del género Cordyline, orientadas a la creación de un diseño de paisajismo orgánico y armónico



Ejecución de labores de instalación de cación de la India, acompañada de especies del género Cordyline, orientadas a la creación de un diseño de paisajismo orgánico y armónico

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,28**	**Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Se realizó la instalación de cheflera junto con otras especies de follaje en los laterales del puente de guadua, integrándose al diseño paisajístico del proyect



Se realizó la instalación de cheflera junto con otras especies de follaje en los laterales del puente de guadua, integrándose al diseño paisajístico del proyect



Se realizó la instalación de cheflera junto con otras especies de follaje en los laterales del puente de guadua, integrándose al diseño paisajístico del proyect



Se realizó la instalación de cheflera junto con otras especies de follaje en los laterales del puente de guadua, integrándose al diseño paisajístico del proyect

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,31**	**Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



instalacion en las area de bode de gabiones parate baja para delimitar la zona y darle color al area



instalacion en las area de bode de gabiones parate baja para delimitar la zona y darle color al area



instalacion en las area de bode de gabiones parate baja para delimitar la zona y darle color al area



planta de follaje colorido para integracion con el paisaje

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,34**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Implantación de especies vegetales sobre los laterales superiores de los gaviones, con el fin de aportar volumen, profundidad y estructura paisajística al área intervenida



Implantación de especies vegetales sobre los laterales superiores de los gaviones, con el fin de aportar volumen, profundidad y estructura paisajística al área intervenida



instalacion de planta en el lateral izquierdo bajo del puente en la entrada , esto con el fin de tupir ccon vegetacion dicha zona. ya que este arbusto es adecuado para el area



De manera general en el proyecto, se observa la presencia de pocos árboles secos y algunos que requieren tala. La fotografía corresponde a la redoma del Parque de Ingenieros

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,35**	**Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



paisajístico, se ejecutó la instalación de pandanus, destacando el área intervenida y aportando color y valor ornamental al paisajismo



Con el objetivo de conformar un oasis paisajístico, se ejecutó la instalación de pandanus, destacando el área intervenida y aportando color y valor ornamental al paisajismo del proyecto



Con el objetivo de conformar un oasis paisajístico, se ejecutó la instalación de pandanus, destacando el área intervenida y aportando color y valor ornamental al paisajismo del proyecto



Con el objetivo de conformar un oasis paisajístico, se ejecutó la instalación de pandanus, destacando el área intervenida y aportando color y valor ornamental al paisajismo del proyecto

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,36**	**Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Se realizó la apertura de espacios para la siembra de veraneras como parte de la preparación del área de intervención.



Se realizó la instalación de veraneras en los laterales del área del Arnulfo Briseño, como estrategia de fortalecimiento del color y la identidad paisajística del sector



Se realizó la instalación de veraneras en los laterales del área del Arnulfo Briseño, como estrategia de fortalecimiento del color y la identidad paisajística del sector



Se realizó la instalación de veraneras en los laterales del área del Arnulfo Briseño, como estrategia de fortalecimiento del color y la identidad paisajística del sector

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,39**	**Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Ejecución de labores de instalación de flor del llano en el interior del oasis vegetal, orientadas al realce paisajístico de la zona mediante su floración ornamenta



Ejecución de labores de instalación de flor del llano en el interior del oasis vegetal, orientadas al realce paisajístico de la zona mediante su floración ornamenta



Ejecución de labores de instalación de flor del llano en el interior del oasis vegetal, orientadas al realce paisajístico de la zona mediante su floración ornamenta



Ejecución de labores de instalación de flor del llano en el interior del oasis vegetal, orientadas al realce paisajístico de la zona mediante su floración ornamenta

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,42**	**Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Implantación de árboles en zonas carentes de cobertura vegetal, complementada con la instalación de un arbusto de floración roja, con el fin de aportar valor cromático al área y articular el diseño paisajístico con los cañaguates existentes



Implantación de árboles en zonas carentes de cobertura vegetal, complementada con la instalación de un arbusto de floración roja, con el fin de aportar valor cromático al área y articular el diseño paisajístico con los cañaguates existentes



Implantación de árboles en zonas carentes de cobertura vegetal, complementada con la instalación de un arbusto de floración roja, con el fin de aportar valor cromático al área y articular el diseño paisajístico con los cañaguates existentes



Implantación de árboles en zonas carentes de cobertura vegetal, complementada con la instalación de un arbusto de floración roja, con el fin de aportar valor cromático al área y articular el diseño paisajístico con los cañaguates existentes

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,43**	**Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Instalacion de oiti



Instalacion de oiti



Instalacion de oiti



Instalacion de oiti

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,45**	**Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Implantación de especies vegetales rastreras para la cobertura total del área, orientada a la generación de contraste visual y enriquecimiento del diseño paisajístico



Implantación de especies vegetales rastreras para la cobertura total del área, orientada a la generación de contraste visual y enriquecimiento del diseño paisajístico



Implantación de especies vegetales rastreras para la cobertura total del área, orientada a la generación de contraste visual y enriquecimiento del diseño paisajístico



Implantación de especies vegetales rastreras para la cobertura total del área, orientada a la generación de contraste visual y enriquecimiento del diseño paisajístico

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Enero a 31 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**3,3,4**	**Instalación de vallas informativas**	**DESDE:**	**1/1/2025**
			HASTA:	**31/1/2026**



Adecuacionn de espacio para instalacion de valla .



Presentacion de valla para la instalacion



Instalacion de valla en puente de guadua



Instalacion de valla en puente dde guadua .

Anexo N°6 *Relación de Pagos*

ANEXO 6. RELACIÓN DE PAGOS DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1/1/2026
CONTRATISTA:	EDINSON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	2	HASTA:	1/31/2026

ÍTEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACIÓN O ADICIÓN N/A			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 24/12/2025 - 31/12/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 31/01/2026		ACTA PARCIAL No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
1	**DIAGNÓSTICO**																					
1,1	Análisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00	0.30	$ 2,819,451.00		$ -		$ -	0.30	$ 2,819,451.00	**30%**	0.70	$ 6,578,718.00	**70%**
1,2	Identificación de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00	0.30	$ 655,269.00		$ -		$ -	0.30	$ 655,269.00	**30%**	0.70	$ 1,528,960.00	**70%**
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00	0.30	$ 640,583.00		$ -		$ -	0.30	$ 640,583.00	**30%**	0.70	$ 1,494,693.00	**70%**
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**						- .00													-		
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00	3,328.21	$ 4,499,740.00	2,895.52	$ 3,914,743.00		$ -	6,223.73	$ 8,414,483.00	**29%**	15,065.4	$ 20,368,542.00	**71%**
2,2	Excavación y nivelación	m2	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00		(240.00)	$(14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00	332.84	$ 20,003,684.00	98.76	$ 5,935,596.00		$ -	431.60	$ 25,939,280.00	**72%**	168.40	$ 10,120,720.00	**28%**
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- .00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 33,510,000.00	**100%**
2,4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$(33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00	649.03	$ 26,106,583.00		$ -		$ -	649.03	$ 26,106,583.00	**75%**	211.21	$ 8,495,767.00	**25%**
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	0.00	$ 11,242.00		(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00	**34%**	5,655.74	$ 63,581,829.00	**66%**
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**						- .00													-		
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	1,680.00	$ 117,873.00	$ 198,026,640.00	(-)	(1,126.0)	$ (132,720,834.0	554.0	$ 65,305,806.00		$ -	98.76	$ 11,641,373.00		$ -	98.76	$ 11,641,373.00	**18%**	455.27	$ 53,664,433.00	**82%**
3,2	**siembra de material vegetal**						- .00													-		
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	2,120.00	$ 33,942.00	$ 71,957,040.00	(-)	(1,820.00)	$(61,774,440.00)	300.00	$ 10,182,600.00		$ -	153.00	$ 5,193,126.00		$ -	153.00	$ 5,193,126.00	**51%**	147.00	$ 4,989,474.00	**49%**
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	1,918.00	$ 41,798.00	$ 80,168,564.00	(-)	(1,818.00)	$(75,988,764.00)	100.00	$ 4,179,800.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00	**100%**	-	$ -	
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	620.00	$ 46,798.00	$ 29,014,760.00	(-)	(520.00)	$(24,334,960.00)	100.00	$ 4,679,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 4,679,800.00	**100%**
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	125.00	$ 66,974.00	$ 8,371,750.00	(-)	(125.00)	$ (8,371,750.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	247.00	$ 86,974.00	$ 21,482,578.00	(-)	(247.00)	$(21,482,578.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	420.00	$ 26,974.00	$ 11,329,080.00	(-)	(320.00)	$ (8,631,680.00)	100.00	$ 2,697,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 2,697,400.00	**100%**
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1,500.00	$ 16,090.00	$ 24,135,000.00	(-)	(1,400.00)	$(22,526,000.00)	100.00	$ 1,609,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,609,000.00	**100%**
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2,500.00	$ 11,090.00	$ 27,725,000.00	(-)	(2,400.00)	$(26,616,000.00)	100.00	$ 1,109,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,109,000.00	**100%**
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	1,000.00	$ 12,737.00	$ 12,737,000.00	(-)	(900.00)	$(11,463,300.00)	100.00	$ 1,273,700.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,273,700.00	**100%**

3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1,820.00	$ 14,090.00	$ 25,643,800.00	(-)	(1,620.00)	$(22,825,800.00)	200.00	$ 2,818,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	200.00	$ 2,818,000.00	**100%**
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	85.00	$ 64,778.00	$ 5,506,130.00	(-)	(85.00)	$ (5,506,130.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00		- .00	$ -	20.00	$ 401,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20.00	$ 401,800.00	**100%**
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00		- .00	$ -	80.00	$ 1,607,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	80.00	$ 1,607,200.00	**100%**
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	6,250.00	$ 17,290.00	$ 108,062,500.00	(-)	(5,250.00)	$(90,772,500.00)	1,000.00	$ 17,290,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,000.00	$ 17,290,000.00	**100%**
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	0.00	$ 426,984.00	$ -	(+)	80.00	$ 34,158,720.00	80.00	$ 34,158,720.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	80.00	$ 34,158,720.00	**100%**
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	0.00	$ 390,942.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,275,360.00	80.00	$ 31,275,360.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	80.00	$ 31,275,360.00	**100%**
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	0.00	$ 535,942.00	$ -	(+)	14.00	$ 7,503,188.00	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00	**100%**	$ -	
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	0.00	$ 410,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 20,547,100.00	50.00	$ 20,547,100.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	50.00	$ 20,547,100.00	**100%**
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	35.00	$ 13,566,315.00	35.00	$ 13,566,315.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	35.00	$ 13,566,315.00	**100%**
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	36.00	$ 19,353,924.00	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00	**100%**	$ -	
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	9.00	$ 4,838,481.00	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00	**100%**	$ -	
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,008,720.00	80.00	$ 31,008,720.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	80.00	$ 31,008,720.00	**100%**
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 422,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 33,808,720.00	80.00	$ 33,808,720.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00	**13%**	70.00	$ 29,582,630.00	**88%**
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	0.00	$ 389,275.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,142,000.00	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00	**100%**	$ -	
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	0.00	$ 61,825.00	$ -	(+)	300.00	$ 18,547,500.00	300.00	$ 18,547,500.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00	**74%**	79.00	$ 4,884,175.00	**26%**
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 61,942.00	$ -	(+)	150.00	$ 9,291,300.00	150.00	$ 9,291,300.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	150.00	$ 9,291,300.00	**100%**
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 62,442.00	$ -	(+)	200.00	$ 12,488,400.00	200.00	$ 12,488,400.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00	**28%**	145.00	$ 9,054,090.00	**73%**
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	180.00	$ 10,819,620.00	180.00	$ 10,819,620.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00	**56%**	80.00	$ 4,808,720.00	**44%**
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 6,010,900.00	100.00	$ 6,010,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	100.00	$ 6,010,900.00	**100%**

NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	0.00	$ 26,442.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,442,000.00	1,000.00	$ 26,442,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,000.00	$ 26,442,000.00	**100%**
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	400.00	$ 21,643,600.00	400.00	$ 21,643,600.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00	**21%**	315.00	$ 17,044,335.00	**79%**
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	0.00	$ 26,775.00	$ -	(+)	250.00	$ 6,693,750.00	250.00	$ 6,693,750.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 6,693,750.00	**100%**
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	250.00	$ 13,527,250.00	250.00	$ 13,527,250.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 13,527,250.00	**100%**
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	500.00	$ 27,054,500.00	500.00	$ 27,054,500.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00	**52%**	241.00	$ 13,040,269.00	**48%**
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	235.00	$ 12,715,615.00	235.00	$ 12,715,615.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00	**14%**	203.00	$ 10,984,127.00	**86%**
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	0.00	$ 57,442.00	$ -	(+)	60.00	$ 3,446,520.00	60.00	$ 3,446,520.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00	**63%**	22.00	$ 1,263,724.00	**37%**
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,609.00	$ -	(+)	500.00	$ 13,304,500.00	500.00	$ 13,304,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		500.00	$ 13,304,500.00	**100%**
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 27,942.00	$ -	(+)	22.00	$ 614,724.00	22.00	$ 614,724.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		22.00	$ 614,724.00	**100%**
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,109,000.00	1,000.00	$ 26,109,000.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00	**5%**	950.00	$ 24,803,550.00	**95%**
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 2,610,900.00	100.00	$ 2,610,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 2,610,900.00	**100%**
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 55,275.00	$ -	(+)	20.00	$ 1,105,500.00	20.00	$ 1,105,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 1,105,500.00	**100%**
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00		$ -	5.00	$ 649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00	**14%**	32.00	$ 4,158,144.00	**86%**
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00	**51%**	18.00	$ 2,338,956.00	**49%**
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	0.00	$ 54,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 2,747,100.00	50.00	$ 2,747,100.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 2,747,100.00	**100%**
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	900.00	$ 15,885,000.00	900.00	$ 15,885,000.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00	**7%**	840.00	$ 14,826,000.00	**93%**
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	250.00	$ 4,412,500.00	250.00	$ 4,412,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 4,412,500.00	**100%**
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**																					
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00		- .00	$ -	285.92	$ 32,272,271.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		285.92	$ 32,272,271.00	**100%**
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	203.00	$ 128,873.00	$ 26,161,219.00	(-)	(103.00)	$(13,273,919.00)	100.00	$ 12,887,300.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 12,887,300.00	**100%**
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		2.00	$ 4,180,400.00	**100%**
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00	**100%**	-	$ -	
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**						- .00													-		
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		672.00	$ 52,080,000.00	**100%**
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		47,600.0	$ 64,355,200.00	**100%**
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		15,400.0	$ 86,886,800.00	**100%**
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		11,000.0	$ 32,395,000.00	**100%**
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00		- .00	$ -	1,075.12	$ 43,157,326.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,075.12	$ 43,157,326.00	**100%**

5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**																		-		
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00	**100%**
COSTO DIRECTO					**$ 1,189,274,532.00**			**$ -**		**$ 1,189,274,532.00**		**$ 54,725,310.00**		**$ 186,675,530.00**		**$ -**		**$241,400,840.00**		**$ 947,873,692.00**	
ADMINISTRACIÓN				22%	$ 261,640,397.00			0		$ 261,640,397.00		$ 12,039,568.20		41068616.6		0		$ 53,108,184.80		$ 208,532,212.24	
IMPREVISTOS				2%	$ 23,785,491.00			0		$ 23,785,491.00		$ 1,094,506.20		3733510.6		0		$ 4,828,016.80		$ 18,957,473.84	
UTILIDADES				6%	$ 71,356,472.00			0		$ 71,356,472.00		$ 3,283,518.60		11200531.8		0		$ 14,484,050.40		$ 56,872,421.52	
IVA sobre utilidad				19%	$ 13,557,730.00			0		$ 13,557,730.00		$ 623,868.53		2128101.042		0		$ 2,751,969.58		$ 10,805,760.09	
COSTO INDIRECTO					**$ 370,340,090.00**			**$ -**		**$ 370,340,090.00**		**$ 17,041,462.00**		**$ 58,130,760.00**		**$ -**		**$ 75,172,222.00**		**$ 295,167,868.00**	
VALOR TOTAL					**$ 1,559,614,622.00**			**$ -**		**$ 1,559,614,622.00**		**$ 71,766,772.00**		**$ 244,806,290.00**		**$ -**		**$316,573,062.00**		**$ 1,243,041,560.00**	
PORCENTAJE DE AVANCE												**4.60%**		**15.70%**		**0.00%**		**20.30%**		**79.70%**	

AVANCE FÍSICO : **20.30%**

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suárez Delgado
RESIDENTE DE OBRA

Nelson David Acevedo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Angela Gioconda Jaimes Coronado
DIRECTOR DE OBRA

Freddy Alexili Villan Valencia
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Valor inicial del contrato	**$**	**1,559,614,622.00**
Valor Adicional del contrato	**$**	**-**
Valor Total del contrato	**$**	**1,559,614,622.00**

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones
						Desde	Hasta			
Acta Parcial N°1	$ 71,766,772.00	$ 71,766,772.00	$ 1,487,847,850.00	4.60%	4.60%	24/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		
Acta Parcial N°2	$ 244,806,290.00	$ 316,573,062.00	$ 1,243,041,560.00	15.70%	20.30%	01/01/2026	31/01/2026	02/10/2026		

Luis Fernando Suárez Delgado
RESIDENTE DE OBRA

Nelson David Acevedo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Angela Gioconda Jaimes Coronado
DIRECTOR DE OBRA

Freddy Alexili Villan Valencia
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO No Y FECHA	LC731-2025 30 DE DICIEMBRE DE 2025	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
SEMANA No:	06	
FECHA DEL INFORME	DESDE:01/01/2026	HASTA: 31/01/2026
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	31/01/2026	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	
INTERVENTOR	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES	
SUPERVISOR CORPONOR	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ	
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO	

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE EJECUCION
Contratación	Durante el período evaluado, la Unión Temporal Corredores Verdes 2025 adelantó las actividades de contratación del personal requerido para dar continuidad con el contrato, conforme a las necesidades operativas y a los lineamientos legales vigentes.
Afiliación	El personal contratado fue afiliado oportunamente al Sistema General de Seguridad Social Integral, garantizando su vinculación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS), Caja de Compensación Familiar (CCF) y Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), según corresponda.
Exámenes médicos ocupacionales	Al personal vinculado se le practicaron los exámenes médicos ocupacionales de preingreso, con el propósito de verificar su aptitud física y mental para el desempeño de las labores asignadas, de acuerdo con los factores de riesgo identificados y las exigencias del cargo.
Inducción en seguridad y salud en el trabajo	Se realizó la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, socializando las políticas internas, normas de seguridad, identificación de peligros, medidas de control, uso adecuado de los elementos de protección personal y los riesgos asociados a las actividades a ejecutar.

Dotación y elementos de protección personal	Se efectuó la entrega de la dotación y de los elementos de protección personal necesarios, conforme a los riesgos identificados y a las actividades a desarrollar, asegurando su adecuado uso y conservación por parte del personal.
Inspección de áreas	Se llevó a cabo la inspección de las áreas donde se desarrollarán las actividades de la obra, con el fin de identificar condiciones locativas, actos y condiciones inseguras, así como factores de riesgo, estableciendo las acciones preventivas y correctivas correspondientes.
Inspección de equipos de emergencia	Se realizó la inspección de los equipos de atención y respuesta a emergencias, tales como botiquines, camilla de emergencia, inmovilizadores y extintores, verificando su disponibilidad, estado y condiciones de operatividad.
Inspección de volquetas	Se realizó la inspección de las volquetas utilizadas para el transporte de residuos vegetales y material de desecho, verificando sus condiciones mecánicas, de seguridad y documentación, con el fin de garantizar una operación segura y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo de las actividades.
Conformación del COPASST	Se realizaron las actividades de postulación y votación de los candidatos al COPASST, garantizando la participación de los trabajadores y el cumplimiento de la normatividad vigente para la conformación del comité.
Conformación del COVILA	Se llevó a cabo el proceso de postulación y votación de los integrantes del Comité de Convivencia Laboral, asegurando un proceso democrático y transparente conforme a la normativa aplicable.
Capacitación	Se desarrollaron capacitaciones en protocolo de bioseguridad, uso adecuado de los elementos de protección personal, higiene postural, y en funciones y responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral (COVILA) y del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), con el fin de fortalecer la prevención de riesgos y promover ambientes laborales seguros y saludables.

Atentamente,

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O

Tabla registro de anexos

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
1.	Anexo 0. Novedades de personal de obra.	X	
2.	Anexo 1. Empleos generados de obra.	X	
3.	Anexo 2. Constancia de entrega de dotación en obras.	X	
4.	Anexo 3. Capacitación o charla en obras públicas.	X	
5.	Anexo 4. Formato inspección de botiquín y camilla en obras públicas.	X	
6.	Anexo 5. Formato inspección de extintores en obras públicas.	X	
7.	Anexo. Formato inspección de vehículos en obras públicas.		X
8.	Anexo 6. Formato inspección de volquetas en obras públicas.	X	
9.	Anexo 7. Formato inspección de maquinaria pesada y equipos ligeros en obras públicas.	X	
10.	Anexo 8. Formato señalización en obras públicas.	X	
11.	Anexo 9. Matriz de riesgo de la obra.	X	
12.	Anexo 10. Plan de manejo ambiental (Formato propio de la unión temporal o consorcio).	X	
13.	Anexo 11. Plan de señalización.	X	
14.	Anexo 12. Plan de emergencia.	X	
15.	Anexo Plan calidad.		X
16.	Anexo 13. Seguimiento y aplicación de planes (plan de trabajo SST).	X	
17.	Anexo 14. Listado de personal administrativo y de obra.	X	
18.	Anexo 15. Control diario del personal de obra (asistencia).	X	
19.	Anexo 16. Exámenes de ingreso.	X	
20.	Anexo 17. Certificado EPS	X	
21.	Anexo 18. Certificado AFP.	X	
22.	Anexo 19. Certificado ARL.	X	
23.	Anexo 20. Exámenes de retiro.	X	
24.	Anexo 21. Planilla de pago al sistema de seguridad social.	X	

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

El presente informe se entrega como evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y manejo ambiental, correspondientes a la obra, contando con personal contratado.

REGSITRO FOTOGRAFICO

	
FOTO No.1 Inducción generalidades en SST	FOTO No. 2 Inducción generalidades en SST
	
FOTO No. 3 Entrega de dotación y EPP	FOTO No. 4 Socialización de protocolo de bioseguridad

	
FOTO No. 5 Socialización de protocolo de bioseguridad	FOTO No. 6 Uso de EPP
	
FOTO No. 7 Capacitación funciones y responsabilidades COPASST	FOTO No. 8 Capacitación funciones y responsabilidades COVILA

	
FOTO No. 9 Capacitación higiene postural	FOTO No. 10 Capacitación higiene postural
	
FOTO No. 11 Generalidades proceso de votación comités	FOTO No. 12 Proceso de votación

	
FOTO No. 13 Proceso de votación	FOTO No. 14 Proceso de votación
	
FOTO No. 15 Inspección de volquetas	FOTO No. 16 Inspección de volquetas

	
FOTO No. 17 Inspección de equipos de extintores	FOTO No. 18 Inspección de botiquín
	
FOTO No. 19 Inspección de botiquín	FOTO No. 20 Inspección de señalización

	
FOTO No. 21 Inspección de EPP	FOTO No. 22 Inspección de EPP
	
FOTO No. 23 Inspección de herramientas (Barra)	FOTO No. 24 Inspección de herramientas (Rastrillo)

	
FOTO No. 25 Inspección de herramientas (Palín)	FOTO No. 26 Inspección de herramientas (Pala)
	
FOTO No. 27 Entrega de EPP	FOTO No. 28 Inspección de EPP

	
FOTO No. 29 Inspección de máquinas y equipos (Equipos – martillo neumático)	FOTO No. 30 Inspección de máquinas y equipos (planta eléctrica -gasolina)
	
FOTO No. 31 Inspección de señalización	FOTO No. 32 Inspección de señalización

ANEXOS 0. NOVEDADES DEL PERSONAL DE OBRA

ANEXO 1. NOVEDADES DE PERSONAL DE OBRA

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.: LC731-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CMA765-2025
CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO DEL CONTRATO

MES No.	2	DESDE:	1/01/2026
		HASTA:	31/01/2026

No.	NOMBRE	APELLIDO	C.C.	NOVEDAD			Nº DIAS LABORADOS	DIRECTO	INDIRECTO	SALUD	ARL	PENSIÓN
				ING	RET	INC						
1	SAMUEL JOSE	MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	5/01/2026			23	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Protección
2	WILMER AUGUSTO	CARRUYO PALACIN	1127595181	5/01/2026	27/01/2026		20	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Porvenir
3	ISMAEL	MEJIA CAICEDO	88001405	5/01/2026			23	X		Coosalud	AXA COLPATRIA	Porvenir
4	FREDDY JESUS	VILLALBA MATA	PPT 6914058	5/01/2026			23	X		Coosalud	AXA COLPATRIA	Protección
5	LUIS JOSE	GARRIDO RIVAS	PPT 5330612	23/01/2026			8	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Porvenir
6	WILMER ALEXANDER	TORRES GALINDO	1092342880	23/01/2026			8	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Porvenir
7	JUNIOR ALEXANDER	USECHE BETANCOURT	1092386993	23/01/2026			8	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Porvenir

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXOS 1. EMPLEOS GENERADOS DE OBRA

ANEXO 2. EMPLEOS GENERADOS DE OBRA

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.: LC731-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CMA765-2025
CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO DEL CONTRATO

MES No.	**2**	**DESDE:**	1/01/2026
		HASTA:	31/01/2026

No.	CARGO	DIRECTOS	INDIRECTOS
1	AYUDANTE	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	
2	AYUDANTE	WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN	
3	AYUDANTE	ISMAEL MEJIA CAICEDO	
4	AYUDANTE	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	
5	AYUDANTE	LUIS JOSE GARRIDO RIVAS	
6	AYUDANTE	WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO	
7	AYUDANTE	JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCOURT	
TOTAL		7	0

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 2. ENTREGA DE DOTACIÓN DE OBRA

Corponor

ANEXO 3. CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

No.	NOMBRE	APELLIDO	FECHA DE ENTREGA	CASCO	TAPA BOCAS	GAFAS	GUANTES	BOTAS	PANTALON	CAMISA	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Samuel	Martinez	05/01/26	X	X	X	X	X	X	X	Samuel
2	Wilmer	Cadiyo	05/01/26	X	X	X	X	X	X	X	Wilmer
3	Jomar	Mejia C.	05/01/26.	X	X	X	X	X	X	X	Jomar Mejia C.
4	FREDDY	Vilbol	05/01/26.	X	X	X	X	X	X	X	
5	wilmer Alex	Torres Galvi	23/01/26	X	X	X	X	X	X	X	wilmer Alex
6	Junior A.	Uscche B.	23/01/26	X	X	X	X	X	X	X	Junior U.
7	Luis	Conido	23/01/26.	X	X	X	X	X	X	X	

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Corponor

ANEXO 3. CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

No.	NOMBRE	APELLIDO	FECHA DE ENTREGA	CASCO	TAPA BOCAS	GAFAS	GUANTES	BOTAS	PANTALON	CAMISA	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Jaimes	Maldonado	28/01/26		X	X	X				
2	FREDDY	Villabo	28/01/26		X	X	X				FREDDY Villabo
3	Willian	Flórez	28/01/26		X	X	X				Willian Flórez
4	FREDDY	Benitez	28/01/26		X	X	X				FREDDY Benitez
5	MIGUEL	Diaz	28/01/26		X	X	X				
6	Juan	Fernandez	28/01/26		X	X	X				Juan Fernandez
7	Luis	Canos	28/01/26		X	X	X				Jose Carlos Canos
8	Juan	Gavarito	28/01/26		X	X	X				
9	WILMER	torres	28/01/26		X	X	X				WILMER ATG
10	Junior	Useche	28/01/26		X	X	X				Junior Us
11	Samuel	Martinez	28/01/26		X	X	X				Samuel

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES
2025

ANEXO 3. CAPACITACIONES

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de inducción		
Inducción	X	Reinducción		05	01	2026.

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Samuel Martinez	N° de Identificación	1977334H
Cargo	Ayudante		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y especificos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS	/			
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	/			
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	/			
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO	/			
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES	/			
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/			
OBJETIVOS DEL SG-SST	/			
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL	/			
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	/			
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO	/			
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL	/			
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS	/			
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	/			
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	/			
RESPONSABILIDADES EN SST	/			
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.	/			
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE	/			
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	/			
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS	/			
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	/			

Responsable de Ejecución	
Nombre	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Asi mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podria acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	Samuel

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL								
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION							
Dia 05	Mes	01	Año	2026	Tiempo de duración		1 hora	
Evaluador	Ana Marcela			Aprobado	✓	Reprobado		
Participante	Samuel		Documento	1143544	Cargo	Aprendiz		

1. Describa con sus propias palabras tres responsabilidades que tiene ante el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
   Procurar el cuidado integral de su salud
   Aplicar lo aprendido
   estar atentos a los peligros

2. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   C. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

3. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   A. Jefe Inmediato.
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
   C. Alguno de los clientes.

4. ¿Qué es el peligro?
   A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. ¿Qué es el riesgo?
   A. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

6. ¿Cuándo se encuentra herramientas del trabajo en mal estado podemos decir que esto es:
   A. Un peligro, porque representa una fuente o situación con potencial de causar daño.
   b) Un accidente, porque inevitablemente ya causó una lesión.
   c) Una falta de interés, porque siempre depende de la actitud del trabajador.

7. Mencione dos (2) riesgos a los que se encuentre expuesto en su sitio de trabajo:

   1. Caida
   2. Lumbares

8. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado Sura Asistencia

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Samuel

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de inducción		
Inducción	x	Reinducción		05	01	2026.

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	FREDDY Villabi	N° de Identificación	6914058
Cargo	aob		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y especificos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS	/			
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	/			
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	/			
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO	/			
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES	/			
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/			
OBJETIVOS DEL SG-SST	/			
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL	/			
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	/			
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO	/			
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL	/			
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS	/			
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	/			
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	/			
RESPONSABILIDADES EN SST	/			
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.	/			
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE	/			
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	/			
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS	/			
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	/			

Responsable de Ejecución	
Nombre	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL							
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION						
Dia	05	Mes	01	Año	2026	Tiempo de duración	01:00. hora
Evaluador	Ing Marcela Jaral			Aprobado	✓	Reprobado	
Participante	FREDDY V.			Documento	6919058	Cargo	Ayudante Jardinero

1. Describa con sus propias palabras tres responsabilidades que tiene ante el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
   capacitarnos
   Reportar actos o condiciones inseg
   reporta un estado de salud

2. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   C. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

3. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   A. Jefe Inmediato
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
   C. Alguno de los clientes.

4. ¿Qué es el peligro?
   A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. ¿Qué es el riesgo?
   A. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

6. ¿Cuándo se encuentra herramientas del trabajo en mal estado podemos decir que esto es:
   a) Un peligro, porque representa una fuente o situación con potencial de causar daño.
   b) Un accidente, porque inevitablemente ya causó una lesión.
   c) Una falta de interés, porque siempre depende de la actitud del trabajador.

7. Mencione dos (2) riesgos a los que se encuentre expuesto en su sitio de trabajo:
   1. Cortadas
   2. Caidas a nivel

8. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado Axa Colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador _____

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de inducción		
Inducción	X	Reinducción		05	01	2026.

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Wilmer Augusto Carrero Palacin	N° de Identificación	1127595184
Cargo	Ayudante		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN: Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS	✓	✓		
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		✓		
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	✓			
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO		✓		
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES		✓		
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		✓		
OBJETIVOS DEL SG-SST		✓		
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL	✓	✓		
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	✓			
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO		✓		
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL	✓	✓		
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS		✓		
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	✓			
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	✓	✓		
RESPONSABILIDADES EN SST				
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.	✓			
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE		✓		
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	✓			
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS		✓		
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	✓			

Responsable de Ejecución	
Nombre	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	Wilmer Carrero

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL									
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION								
Día	05	Mes	01	Año	2026	Tiempo de duración		01:40 a	
Evaluador	Lina Marcela Posada			Aprobado	✓	Reprobado			
Participante	Wilmer Augusto Campo.			Documento	1127595181	Cargo	Ayudante de jardinero		

1. Describa con sus propias palabras tres responsabilidades que tiene ante el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Usar los epp
Reportar los actos o condiciones inseguras
Procurar el autocuidado

2. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
X. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

3. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
X. Jefe Inmediato.
B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
C. Alguno de los clientes.

4. ¿Qué es el peligro?
A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
X Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. ¿Qué es el riesgo?
A. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
B. aquellos que es un accidente de trabajo.
X. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

6. ¿Cuándo se encuentra herramientas del trabajo en mal estado podemos decir que esto es:
X Un peligro, porque representa una fuente o situación con potencial de causar daño.
b) Un accidente, porque inevitablemente ya causó una lesión.
c) Una falta de interés, porque siempre depende de la actitud del trabajador.

7. Mencione dos (2) riesgos a los que se encuentre expuesto en su sitio de trabajo:

1. picaduras de animales
2. caidas a nivel

8. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado otra Colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Wilma Campo

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de Inducción		
Inducción	X	Reinducción		05	01	2026.

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Ismael Mejia caicedo	N° de Identificación	8800 1.405
Cargo	Ayudante		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS		✓		
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	✓			
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		✓		
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO		✓		
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES		✓		
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		✓		
OBJETIVOS DEL SG-SST		✓		
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL		✓		
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	✓			
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO		✓		
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL		✓		
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS	✓			
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL		✓		
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		✓		
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		✓		
RESPONSABILIDADES EN SST		✓		
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.		✓		
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE	✓			
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	✓			
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS	✓			
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA		✓		

Responsable de Ejecución	
Nombre	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	Ismael Mejia caicedo

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL							
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION						
Dia	05	Mes	01	Año	2026	Tiempo de duración	01 hora
Evaluador	Ing Nicola Jaramillo			Aprobado	✓	Reprobado	
Participante	Ismael Mejia C			Documento	80041405	Cargo	Aprendiz Sostenimiento

1. Describa con sus propias palabras tres responsabilidades que tiene ante el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Cooperar en el
Reportar actos y condiciones
Portar los EPP

2. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
(C) Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

3. ¿En caso de accidente de trabajo debe informar a?
(A) Jefe Inmediato
B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
C. Alguno de los clientes.

4. ¿Qué es el peligro?
(A) Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. ¿Qué es el riesgo?
(A) La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
B. aquellos que es un accidente de trabajo.
C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

6. ¿Cuándo se encuentra herramientas del trabajo en mal estado podemos decir que esto es:
(A) Un peligro, porque representa una fuente o situación con potencial de causar daño.
b) Un accidente, porque inevitablemente ya causó una lesión.
c) Una falta de interés, porque siempre depende de la actitud del trabajador.

7. Mencione dos (2) riesgos a los que se encuentre expuesto en su sitio de trabajo:

1. Caidas a mismo nivel
2. Cortes con herramientas

8. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado Sura colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Ismael mejia caicedo

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de inducción		
Inducción	X	Reinducción		23	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Luis Jose Garrido Rivas	N° de Identificación	1530611
Cargo	Ayudante fundiciero		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y especificos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		X		
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS		X		
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		X		
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		X		
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO		X		
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES		X		
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		X		
OBJETIVOS DEL SG-SST			X	
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL		X		
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS		X		
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO		X		
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL		X		
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS		X		
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL		X		
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		X		
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	X			
RESPONSABILIDADES EN SST	X			
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.	X			
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE		X		
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	X			
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS		X		
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	X			

Responsable de Ejecución	
Nombre	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Asi mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL									
Evento		INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION							
Dia	23	Mes	01	Año	2026	Tiempo de duración		1 hora	
Evaluador		Ing Paola La		Aprobado	✓	Reprobado			
Participante		Jas Jose Camilo U		Documento	PPT 5330612	Cargo		Ayudante	

1. Describa con sus propias palabras tres responsabilidades que tiene ante el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
   participar capacitaciones
   reportar actos e condiciones inseguras
   procurar el cuidado integral de mi salud

2. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   X Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

3. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   X Jefe Inmediato.
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estèn enterados.
   C. Alguno de los clientes.

4. ¿Què es el peligro?
   X Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. ¿Què es el riesgo?
   A. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   X Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

6. ¿Cuándo se encuentra herramientas del trabajo en mal estado podemos decir que esto es:
   X Un peligro, porque representa una fuente o situación con potencial de causar daño.
   b) Un accidente, porque inevitablemente ya causó una lesión.
   c) Una falta de interés, porque siempre depende de la actitud del trabajador.

7. Mencione dos (2) riesgos a los que se encuentre expuesto en su sitio de trabajo:

   1. mesyo cardas
   2. picaduras animales

8. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuenira afiliado Axa colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador _____

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de Inducción		
Inducción	X	Reinducción		03	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Junior Alexander Useche B	N° de Identificación	1092386993
Cargo	Ayudante		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS	/			
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	/			
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	/			
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO	/			
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES	/			
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/			
OBJETIVOS DEL SG-SST	/			
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL	/			
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	/			
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO	/			
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL	/			
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS	/			
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	/			
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	/			
RESPONSABILIDADES EN SST	/			
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.	/			
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE	/			
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	/			
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS	/			
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	/			

Responsable de Ejecución	
Nombre	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	Junior U.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL								
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION							
Dia	23	Mes	01	Año	2026	Tiempo de duración		1 hora
Evaluador	Ana Marcela			Aprobado	✓	Reprobado		
Participante	Junior A Useche B			Documento	1092386993	Cargo	Ayudante	

1. Describa con sus propias palabras tres responsabilidades que tiene ante el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Cumplir con las reportar actos inseguros. preservar el buen estado de mis elementos

2. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
C. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

3. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
A. Jefe Inmediato.
B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
C. Alguno de los clientes.

4. ¿Qué es el peligro?
A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. ¿Qué es el riesgo?
A. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
B. aquellos que es un accidente de trabajo.
C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

6. ¿Cuándo se encuentra herramientas del trabajo en mal estado podemos decir que esto es:
A) Un peligro, porque representa una fuente o situación con potencial de causar daño.
b) Un accidente, porque inevitablemente ya causó una lesión.
c) Una falta de interés, porque siempre depende de la actitud del trabajador.

7. Mencione dos (2) riesgos a los que se encuentre expuesto en su sitio de trabajo:

1. Cortaduras
2. Precaución

8. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado Sura Colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Junior A. Useche B.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de inducción		
Inducción	X	Reinducción		23	11	2026

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Wilmer Alexander Torres	N° de Identificación	1092342880
Cargo	Aprendiz SENA		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS				
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO				
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO				
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES				
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
OBJETIVOS DEL SG-SST				
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL				
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS				
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO				
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL				
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS				
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL				
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL				
RESPONSABILIDADES EN SST				
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.				
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE				
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO				
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS				
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA				

Responsable de Ejecución	
Nombre	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	Wilmer Alexander Torres

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL									
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION								
Dia	23	Mes	01	Año	26	Tiempo de duración		1 hora	
Evaluador	Lina Marcela L			Aprobado	/	Reprobado			
Participante	Wilmer Alexander			Documento	1092869993	Cargo	Auxiliar mens		

1. Describa con sus propias palabras tres responsabilidades que tiene ante el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
   Participar de capacitaciones
   reporta: mi estado de salud
   procura: cuidados integral de salud

2. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   C. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

3. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   A. Jefe Inmediato.
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
   C. Alguno de los dientes.

4. ¿Qué es el peligro?
   A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. ¿Qué es el riesgo?
   A. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

6. ¿Cuándo se encuentra herramientas del trabajo en mal estado podemos decir que esto es:
   a) Un peligro, porque representa una fuente o situación con potencial de causar daño.
   b) Un accidente, porque inevitablemente ya causó una lesión.
   c) Una falta de interés, porque siempre depende de la actitud del trabajador.

7. Mencione dos (2) riesgos a los que se encuentre expuesto en su sitio de trabajo:

   1. Piraduras
   2. Cortaduras

8. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado Axa Colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Wilmer Alexander Torres C

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: Fortalecer las medidas de prevención, control y mitigación del contagio de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias en los trabajadores, garantizando un entorno laboral seguro durante las actividades en campo.
FECHA DE REALIZACIÓN:	09 de Enero de 2026.

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Wilson	Calderon	88.002.745	Wilson Calderon
2	Ismael	Mejia	8800.1405	Ismael Mejia C
3	Wilmer	Carrero	1127595181	Wilmer Carrero
4	Samuel	Martinez	14773344	Samuel
5	Juan	Gamalo	1093144012	Juan
6	Juan	Fernandez	1005066176	
7	FREDDY	Villada	73.272744	
8	Luis Carlos	Cantor P	1090175875	
9	Miguel Humberto	Diaz Rojas	1090765760	
10	FREDDY	Benitez	1090174911	FREDDY Benitez
11	Willian	flórez	88.001.606	Willian flórez
12	AIAN	lopez	1090777446	AIAN lopez

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	USO EPP: Capacitar a los trabajadores en el uso correcto, cuidado e importancia de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de prevenir lesiones oculares y otros accidentes derivados de las actividades operativas realizadas en corredores verdes.
FECHA DE REALIZACIÓN:	16 de Enero de 2026

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Nelson	Calderon	88.027745	Nelson Calderon
2	Ismael	Mejia cairedo	88001.4105	Ismael Mejia C.
3	Miguel Humberto	Diaz Rolon	1090176860	
4	Luis Carlos	Carios P	1090175835	Luis Carlos Carios P.
5	FREDDY ~~Benitez~~	Benitez	1090174911	FREDDY Benitez
6	Wilian	Flórez	88.001.606	Wilian Flórez
7	Juan	Garrafo	1093440172	Juan
8	Juan	Manuel	1005066478	Juan Fernandez
9	FREDDY	Villabia	13722744	
10	Samuel	Martinez	1497334M	Samuel
11	ALAN	Lopez	1090777446	ALAN Lopez

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O
PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	**HIGIENE POSTURAL**: Fortalecer los conocimientos y prácticas de higiene postural en los trabajadores de la Unión Temporal Corredores Verdes, con el fin de prevenir lesiones musculoesqueléticas, mejorar el desempeño laboral y reducir el ausentismo por enfermedad laboral.
FECHA DE REALIZACIÓN:	23 de enero de 2026.

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Nelson	Calderon	88.002.745	Nelson Calderon
2	Ismael	Cardona Mejia	8800l.405	Ismael Mejia C.
3	Miguel Hernando	Duca Tolosa	1090176560	
4	Luis Carlos	Cantos P	1090.175835	Luis Carlos Cantos P
5	FREDDY	Benitez	1090174911	FREDDY Benitez
6	William	Flórez	88.001.606	William Flórez
7	Jeam	Granito	1093499012	Jeam
8	Juan	Fernandez	1005068462	Juan Fernandez
9	FREDDY	Villalba	1357244	
10	Samuel	Martinez	14 733444	Samuel
11	ALAN	López	1090177446	ALAN López
12	Wilmer Alexander	Torres Galindo	1092342880	Wilmer A.T.G
13	Junior Alexander	Useche B.	1092386993	Junior U.
14	Luis Jose	Carrido R	5330612	
15				

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O
PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	Covila: Capacitar a los integrantes de comité de convivencia laboral en suspensiones y responsabilidades para prevenir y atender situaciones de maltrato y acoso sexual laboral y promover ambiente sano
FECHA DE REALIZACIÓN:	26 de Enero de 2026.

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Luis Carlos	Cañas P.	1090175835	
2	Nelson Calderon	Calderon	88.002.745	Nelson
3	Juan Manuel	Fernandez	1005068478	Juan Fernandez
4	Juan Angel	Garrido Ramirez	1093144012	
5	Ismael	Mesa Caicedo	8802.405	
6	Luis Garrido	Garrido	5330612	
7	Junior V.	A. B.	1092386993	Junior
8	Wilmer Alexander	Torres G	1092342850	Wilmer A-G
9	FREDDY	VILLA	7375744	
10	Samuel Martinez	Martinez	71433144	Samuel
11	William	Flórez	88.001.606	William Flórez
12	FREDDY	Benitez	1090744 11	FREDDY Benitez
13	MIGUEL	DIAZ	1090176560	
14	ALAN López	López	1090177446	ALAN LOPEZ

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O
PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	Copasst: Capacitar a los integrantes del copasst en sus funciones y responsabilidades para fortalecer la prevención de riesgos laborales y promover la prevención de riesgos y condiciones seguras.
FECHA DE REALIZACIÓN:	26 de Enero de 2026

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Samuel	Mejia caicedo	88001.405	Samuel M. C.
2	FREDDY	Villalba	1315744	FREDDY
3	William	Flórez	88.001.606	William Flórez
4	FREDDY	Benitez	1090174911	FREDDY Benitez
5	MIGUEL	DIAZ	1090176560	
6	Juan	Fernandez	1005066478	Juan Fernandez
7	Luis	Cantes	1090175835	Luis Carlos Cantes
8	Nelson	Caldaro Jaimes	88.002.745	Nelson caldaron
9	Juan	Garavito	1093144012	Juan Gar
10	wilmer fayes	Galindo	1092342886	wilmer TC
11	Junior A	Useche	1092386993	Junior
12	Ibana Hernandez	Bohorquez	1090961723	Ibana Hernan
13	Samuel	Martinez	71433144	Samuel
14	Alan I	lopez	1090177446	Alan lopez

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O
PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

UT Corredores Verdes 2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FO-02
		Versión: 01
	LISTA DE ASISTENCIA	Fecha: 27-08-2025

DATOS GENERALES					
FECHA:	26/01/26	LUGAR:	Obra UT	DURACIÓN:	30 Min
EVENTO:	Elección, votación y conformación del COVILA y COPASST				
TEMAS/ OBJETIVO:	Elegir y conformar los comités (COVILA y COPASST)				
PROVEEDOR:	UT Corredores Verdes 2025	EJECUTOR:	Ingrid V. Romero	FIRMA:	

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 Ley de Protección de Datos, reglamentado parcialmente por el Decreto 1377 de 2013, mediante el registro de sus datos personales en la presente plantilla autoriza al contratante para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de evidenciar su participación en el presente evento de formación, sensibilización, capacitación, actualización o información, de igual manera para el tratamiento de la imagen que pudiera capturarse en el desarrollo del evento contenida en fotografías, videos o en cualquier otro medio, bien sea en medio físico, digital o virtual, con el fin de promover temas institucionales y/o comerciales, considerando que tal uso no es contrario a la moral y las buenas costumbres, no constituyen injerencia arbitraria en la vida privada, ni afecta la honra, el buen nombre, la integridad moral, física o síquica. Se informa que sus datos serán tratados de manera segura y confidencial, y que le asisten los derechos a conocer, actualizar y rectificar sus datos en cualquier momento, así como solicitar prueba de esta autorización, realizar peticiones o reclamos. Para ejercer estos derechos podrá dirigir su solicitud al correo destinado para la empresa o entregarla en la oficina.

No	NOMBRE	C.C	CARGO	FIRMA
1.	Luis Carlos Conrado	1090175835	Jardinero	
2.	Nelson Calderon	88.002.743	Jardinero	Nelson
3.	Jon Hernandez	1005066478	Jardinero	Jon Hernandez
4.	Juan Miguel Gaviria Ramirez	1095444092	Jardinero	
5.	Luis Conido	3330611	Jardinero	
6.	Junior Useche	1092386993	Jardinero	
7.	Wilmar Alexander Jo	1092342850	Jardinero	Wilmar A-J-6
8.	Samuel Martinez	7143344	Jardinero	Samuel
9.	Asmael	8800/.40	Ayudante	
10.	FREDDY	875744	Villabol	
11.	William Flórez	88.001.606	Jardinero	William Flórez
12.	FREDDY Benitez	1090174911	Jardinero	FREDDY Benitez

UT Corredores Verdes 2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FO-02
		Versión: 01
	LISTA DE ASISTENCIA	Fecha: 27/08/2025

13.	Miguel Diaz	1090176860	Jardinero	
14.	Alan Kelly López	1090177446	Jardinero	Alan Lopez
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
OBSERVACIONES:				

ANEXO 4. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA

Corponor

ANEXO 5. FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y CAMILLA EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
FECHA DE INSPECCIÓN	14 de enero de 2026.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD RECOMENDADA (UND)	ESTADO		FECHA DE VECIMIENTO	OBSERVACIONES
		BUENO	NO TIENE		
ALCOHOL	1	✓		NOV 2029	
ALGODÓN (PAQUETE)	1	✓		NOV 2028	
ISODINE ESPUMA (FRASCO)	1	✓		Abr 2026	
ISODINE SOLUCION (FRASCO)	1	✓		NOV 2026	
GASA ESTERIL (PAQUETES PRECORTADA)	1	✓		May 2028	
CURITAS	1	✓		Jul 2026	
AGUA OXIGENADA	1	✓		Sep 2029	
VENDAS	1	✓		Ene 2029	
TIJERAS	1	✓		N/A	
SUERO ORAL (SOBRES)	1	✓		Jul 2026	
MICROPORE	1	✓		Abr 2026	
ESPARADRAPO	1	✓		Dic 2028	
TOALLAS HIGIENICAS	1	✓		N/A	
LINTERNA PEQUEÑA	1	✓		N/A	
BAJA LENGUAS	1	✓		Abr 2029	
GUANTES EN LATEX (PARES)	1	✓		Jul. 2026	
JERINGA	1	✓		N/A	
TAPABOCAS DESECHABLES	1	✓		NOV 2027	

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS DE LA CAMILLA	CANTIDAD RECOMENDADA (UND)	ESTADO		FECHA DE VECIMIENTO	OBSERVACIONES
		BUENO	NO TIENE		
SEÑALIZACIÓN	1	✓			
ESTADO DE LA LONA	1	✓			
CORREAS DE SEGURIDAD	1	✓			
SUJTADORES PARA CARGUE	1	✓			
CRUCETAS DE SEGURIDAD	1	✓			
SOPORTE DE DESCANSO	1		N/A		
JUEGO DE INMOVILIZADORES DE MIEBRO INFERIOR Y SUPERIOR	PARES	✓			

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 5. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Corponor

ANEXO 6. FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

TIPO DE EXTINTOR:			A	X	B	X	C	X	D
FECHA DE INSPECCIÓN:	29-01-2026		FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR:				Diciembre 2026		

No.	ESTADO DEL EXTINTOR	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1.	MANOMETRO	✓			
2.	PASADOR DE SEGURIDAD	✓			
3.	MANGUERA	✓			
4.	BOQUILLA	✓			
5.	MANIJA	✓			
6.	CILINDRO	✓			
7.	PINTURA	✓			
8.	SEÑALIZACIÓN	✓			
9.	ACCESO Y VISIBILIDAD	✓			

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 6. INSPECCIÓN DE VOLQUETAS

Corponor

ANEXO 8. FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 1, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

MARCA EQUIPO:	FORD	PLACA:	FDR072	CERTIFICADO DE GASES Y REVISIÓN TECNICO MECANICA	2025/08/29 2026/08/29	SEGURO	2025/08/21 2026/08/20

FECHA DE INSPECCIÓN: 8 de enero de 2026. / 30 de enero 2026

		ESTADO	BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO	
ITEM		DESCRIPCION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CHEQUEO ESTRUCTURAL (Marcar con una X la opción correcta)		ASEO EXTERIOR	✓													
		LLANTAS	✓													
		GATO HIDRAULICO	✓													
		ESTRUCTURA PLATON	✓													
		TERMINALES DE DIRECCION	✓													
		MUELLES	✓													
		TRANSMISION Y CAJA	✓													
		ESTRUCTURA CABINA	✓													
		FRENOS	✓													
		LUCES	✓													
CHEQUEO EN MAQUINA		FUGAS EN MOTOR	✓													
		FUGAS CAJA DE CAMBIOS	✓													
		FUGAS TRANSMISION	✓													
		FUGAS SISTEMA ENFRIAMIENTO	✓													
		FUGAS SISTEMA AIRE FRENOS	✓													
		FUGAS SISTEMA HIDRAULICO	✓													
CHEQUEO EN CABINA		INDICADORES EN TABLERO	✓													
		FRENO MOTOR	✓													
		PITO Y ALARMA DE RETROCESO	✓													
		EXTINTOR	✓													
		CINTURON DE SEGURIDAD	✓													
		BOTIQUIN	✓													

OBSERVACIONES:

OPERADOR RESPONSABLE:	Luis Hernan Parada O.	13489382	FIRMA	Luis Hernan Parada O
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA	Lina Marcela Se.		FIRMA	

ANEXO 8. FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

Corponor

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

MARCA EQUIPO:	DODGE	PLACA:	RC 6147	CERTIFICADO DE GASES Y REVISIÓN TECNICO MECANICA	25/10/17 26/10/17	SEGURO	25/10/09 26/10/11

FECHA DE INSPECCIÓN: 30 de enero de 2026 / 30 de enero 2026

ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO	
ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CHEQUEO ESTRUCTURAL (Marcar con una X la opción correcta)	ASEO EXTERIOR	✓													
	LLANTAS	✓													
	GATO HIDRAULICO	✓													
	ESTRUCTURA PLATON	✓													
	TERMINALES DE DIRECCION	✓													
	MUELLES	✓													
	TRANSMISION Y CAJA	✓													
	ESTRUCTURA CABINA	✓													
	FRENOS	✓													
	LUCES	✓													
CHEQUEO EN MAQUINA	FUGAS EN MOTOR	✓													
	FUGAS CAJA DE CAMBIOS	✓													
	FUGAS TRANSMISION	✓													
	FUGAS SISTEMA ENFRIAMIENTO	✓													
	FUGAS SISTEMA AIRE FRENOS	✓													
	FUGAS SISTEMA HIDRAULICO	✓													
CHEQUEO EN CABINA	INDICADORES EN TABLERO	✓													
	FRENO MOTOR	✓													
	PITO Y ALARMA DE RETROCESO	✓													
	EXTINTOR	✓													
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓													
	BOTIQUIN	✓													

OBSERVACIONES:				
OPERADOR RESPONSABLE:	Ferrel Martinez Jhonson	89205412	FIRMA	Jhonson Ferrel
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA	Lina Maicela L		FIRMA	

ANEXO 8. FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

Corponor

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

MARCA EQUIPO:	KODIAK.	PLACA:	CHW826	CERTIFICADO DE GASES Y REVISIÓN TECNICO MECANICA	06/Agosto/2026	SEGURO	04/02/2026

FECHA DE INSPECCIÓN: 8 de enero de 2026, 30 de enero de 2026

		ESTADO	BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO	
ITEM	DESCRIPCION		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CHEQUEO ESTRUCTURAL (Marcar con una X la opción correcta)	ASEO EXTERIOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	LLANTAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	GATO HIDRAULICO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ESTRUCTURA PLATON		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TERMINALES DE DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	MUELLES		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TRANSMISION Y CAJA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ESTRUCTURA CABINA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FRENOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	LUCES		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CHEQUEO EN MAQUINA	FUGAS EN MOTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FUGAS CAJA DE CAMBIOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FUGAS TRANSMISION		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FUGAS SISTEMA ENFRIAMIENTO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FUGAS SISTEMA AIRE FRENOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FUGAS SISTEMA HIDRAULICO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CHEQUEO EN CABINA	INDICADORES EN TABLERO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FRENO MOTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	PITO Y ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	EXTINTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	BOTIQUIN		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:			
OPERADOR RESPONSABLE:	Rafael Antonio Morales Acosta	FIRMA	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA	Lina Macola	FIRMA	

ANEXO 7. INSPECCIÓN DE MÁQUINAS PESADAS Y EQUIPOS LIGEROS

ANEXO 9. FORMATO INSPECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS LIGEROS EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO		FECHA DE INSPECCIÓN		OBSERVACIONES
			M	E			
1	Planta Electrica	Elektric		X	29 Enero	2026.	Planta electrica a gasolina
2.	Martillo de Demolición.	Einhell		X	29 Enero	2026.	Martillo TE - DH 50 Einhell

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 8. INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

ANEXO 10. FORMATO DE SEÑALIZACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

Corponor

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
FECHA DE INSPECCIÓN	

No.	PARAMETROS A REVISAR	SI	NO	NA
1	Hay señales informativas y preventivas en la obra.	✓		
2	Hay carteles que recuerden la importancia de utilizar los EPP en la obra.	✓		
3	Hay carteles que induzcan a mantener las áreas de trabajo ordenadas y limpias.	✓		
4	Hay señales de prohibido fumar en la obra.	✓		
5	Estan demarcadas las zonas donde se encuentran el extintor dentro de la obra.	✓		
6	Estan demarcadas las zonas donde se encuentra la camilla dentro de la obra.	✓		
7	Estn demarcadas la zona donde se encuentra el punto ecologico dentro de la obra.	✓		
8	Están demarcadas las áreas de trabajo.	✓		
9	Hay señales en las áreas de almacenamiento donde hay sustancias, grasas, aceites o productos inflamables dentro de la obra.			✓
10	Hay señales preventivas en las zonas de alto riesgo dentro de la obra.	✓		
11	Hay señales de información para el personal que ingresa o es ajeno a la obra	✓		
12	Hay señales de entrada y salida de vehiculo pesado.			✓
13	Hay señales de inicio y fin de la obra.	✓		

OBSERVACIONES:

las Señalizaciones se encuentran en buen estado y ubicadas en puntos estrategicos.

LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Y/O PESONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 9. MATRIZ DE PELIROS Y RIESGOS IPEVR

UT Corredores Verdes 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-MT-01
		Versión:	1
	MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	Fecha:	20/08/2025

ACTUALIZACIONES		
FEHA	QUIEN REALIZA LA ACTUALIUZACION	DESCRIPCION
2/12/2025	COORDINADOR SST	**Creación de matriz**
4/12/2025	COORDINADOR SST	**Actualziación de matriz**

ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES			AXA COLPATRIA	NIVEL DE RIESGO			2	NUMERO DE EMPLEADOS			6	AREA					PRODUCTIVA			PROFESIOANL SST		LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL										
PROCESO	ZONA/LUGAR	ACTIVIDAD	TAREA	EFECTOS POSIBLES	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO (FUENTE)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO (ACEPTABILIDAD)	NÚMERO EXPUE	MEDIDAS DE INTERVENSIÓN													RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN
							FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	ND	NE	NP(NO X NE)	INTERPRETACI	NC	NR	INTERPRETACI			ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	DESCRIPCIÓN								
Operativo	Frentes de trabajo	Análisis estado actual Identificación puntos críticos Inventario arbolado Limpieza manual Excavación Nivelación Poda árboles altos Retiro residuos	Inspección en campo Medición y registro Recorridos técnicos Deshierbe Uso de pala y pico Exposición ambiental Corte de ramas Carga y traslado	Pánico, parálisis parcial o total, politraumatismos, asfixia, afecciones respiratorias, lesiones. Daños y/o pérdidas	Terremotos / Temblores / Sismos, Vendaval, Inundación por estar cerca a	FENÓMENOS NATURALES		Equipos de respuesta a emergencias.		2	2	4	B	25	100	III	Mejorable	6				X		CA: Conformación de brigadas, capacitación a brigadas, Simulacros	CORDINADORA SST								
				Fiebre, dolor de cabeza, diarrea, dolor de garganta, dificultad respiratoria, perdida del gusto, y demas sintomas relacionados	Exposición directa o indirecta a microorganismos y sus toxinas, vía respiratoria o	BIOLÓGICO				0	2	0	B	10	0	IV	Aceptable	6				X		CA:Señalización alusiva a medidas de bioseguridad	GERENCIA / CORDINADORA SST								
				Picaduras, mordeduras	Presencia de insectos y animales o roedores.	Biológico				0	2	0	B	10	0	IV	Aceptable	6				X		CA: Señalización alusiva a medidas de seguridad	GERENCIA / CORDINADORA SST								
				Dolor de garganta, dificultad respiratoria	Exposición en la intervención de zonas a la intemperie con presencia de material arenoso	QUIMICO (Afectaciones respiratorias)				2	2	4	B	25	100	III	Mejorable	6				X	X	CA: Prevención de riesgo quimico. EPP: Mantener la dotación adecuada, elementos de protección personal.	GERENCIA / CORDINADORA SST								
				Cefalea, fatiga visual, Insomnio, Irritabilidad, ansiedad, estrés laboral	Radiaciones No ionizantes, emitidas por los rayos UV)	FISICO (Radiaciones no ionizantes)				0	2	0	B	25	0	IV	Aceptable	6				X		CA: Capacitación en conservación visual. CA: Pausas activas con ejercicios que ayuden a relajar la vista.	GERENCIA / CORDINADORA SST								
				Cefalea, fatiga visual, Insomnio, Irritabilidad, ansiedad, estrés laboral	Iluminación (Resplandores de rayos UV)	FISICO (Iluminación)				0	2	0	B	25	0	IV	Aceptable	6				X	X	CA: Capacitación en conservación visual y uso responsable de los EPP (gafas de seguridad) destinados a la prevención. CA: Capacitación	GERENCIA / CORDINADORA SST								
				Ansiedad, estrés laboral, cefaleas, cansancio físico y mental, alteraciones del sueño, problemas gastrointestinales,	Organización del Tiempo de Trabajo y Comunicación, direccionameinto y administracion	PSICOSOCIAL (Características de la organización del trabajo)				2	2	4	B	25	100	III	Mejorable	6				X		CA: Capacitación para prevención del riesgo Psicosocial, Control y manejo de emociones y estres. CA: Ejecutar	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL / ARL / COORDINADORA SST								
				Lesiones osteo musculares, fatiga, Lumbalgias, desviación de la columna vertebral, afección túnel carpiano, agotamiento muscular,	Posturas inadecuadas en el momento de realizar las actividades	BIOMECÁNICO (Posturas)			Pausas activas	0	2	0	B	10	0	IV	Aceptable	6				X		CA: Realizar evaluaciones médicas ocupacionales preingreso, periodico con énfasis osteomuscular y	GERENCIA / CORDINADORA SST								
				Lesiones osteo musculares, fatiga, Lumbalgias, desviación de la columna vertebral, afección túnel carpiano, agotamiento muscular,	Movimientos repetitivos en actividades relacionadas con trabajo en uso de herramientas manuales	BIOMECÁNICO (Movimientos repetitivos)				2	2	4	B	25	100	III	Mejorable	6				X		CA: Capacitación en Higiene postural y ejecución de pausas activas. Entrega sobre procedimientos de trabajo seguro	GERENCIA / CORDINADORA SST								

				Golpes, contuciones, caidas a nivel, fracturas, traumas, otros riesgos asociados	Superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel)	CONDICIONES DE SEGURIDAD				2	2	4	B	25	100	III	Mejorable	6				X		CA: Mantenimiento adecuado de las instalaciones e inspecciones programadas para la identificación de factores	GERENCIA / CORDINADORA SST
				Lesiones osteo musculares, fatiga, Lumbalgias, desviación de la columna vertebral, afección túnel carpiano, agotamiento muscular, dolor y calambres de	Manipulación manual de cargas como lo son las herramientas o residuos, así como las	BIOMECÁNICO				2	1	2	B	60	120	III	Mejorable	6				X		CA: Capacitación en Higiene postural y ejecución de pausas activas.	GERENCIA / CORDINADORA SST
				Golpes, contuciones, caidas, fracturas, traumas	Actividades desarrolladas cerca a carreteras con transito vehicular	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Accidentes de transito)				2	2	4	B	10	40	III	Mejorable	6				X		CA: Capacitacion prevención de riesgos viales	GERENCIA / CORDINADORA SST
				Golpe, traumas, machucones, fracturas, laseracion, amputaciones	Manejo de maquinas ligerias y equipos livianos	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecanico)				2	2	4	B	25	100	III	Mejorable	6				X		señalizacion alusiva a la prevención del riesgo CA: Realizar inspecciones a maquinas y equipos	GERENCIA / CORDINADORA SST
				Golpe, traumas, fracturas, laseracion, amputaciones	Exposicion al desarrollo de actividades cerca de peatones	CONDICIONES DE SEGURIDAD (publico)				2	2	4	B	25	100	III	Mejorable	6				X		CA: Capacitacion prevención de riesgos publicos	GERENCIA / CORDINADORA SST

ANEXO 10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

UT Corredores Verdes 2025

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBJETO DE CONTRATO: ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

2026

CONTENIDO

1. OBJETIVOS....3
2. ALCANCE....3
CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL....4
3. MARCO LEGAL....4
4. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES....7
8. EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS....11
EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 11
- 5.2. M. CONTROL DE EMSISIONES ATMOSFÉRICAS....17
- 5.3. M. MATRIZ MANEJO DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS USADOS. 19
- 5.4. M. MATRIZ MANEJO ADECUADO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE 21
- 5.6. M. MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS PESADOS...23
- 5.7. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA 24
- 5.9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 27

6. CONTROLES OPERACIONALES 30
7. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 30

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

1. OBJETIVOS

- Prevenir, Reducir y Mitigar los impactos ambientales que pueden llegar a generarse en el desarrollo del proyecto.
- Garantizar el cumplimiento de la Legislación Ambiental aplicable y vigente.
- Minimizar la incidencia de impactos sobre el medio abiótico del área de influencia del proyecto.
- Prevenir, Reducir y Mitigar los impactos ambientales presentes durante la ejecución del proyecto.
-

2. ALCANCE

El proyecto tiene como propósito fundamental el establecimiento, conservación y recuperación integral de los corredores verdes, redomas y el separador vial de la Avenida Libertadores en el área metropolitana de San José de Cúcuta, específicamente en su Primera Etapa. Esta intervención se concibe como una estrategia de infraestructura verde urbana destinada a la protección y mejoramiento del paisaje. El proyecto comprende la ejecución de las actividades de planeación, intervención física y seguimiento ambiental para el mejoramiento del paisaje urbano y la resiliencia climática de la Avenida Libertadores, en el tramo correspondiente a la primera etapa dentro del área metropolitana de San José de Cúcuta, además se integra una dimensión social y de apropiación ciudadana, mediante la cual se busca sensibilizar a los residentes y comerciantes sobre la importancia de la conservación de estos activos ambientales, consolidando a la Avenida Libertadores no solo como una vía de transporte, sino como un pulmón urbano que mejora la calidad del aire y reduce las islas de calor en el municipio.

AMBITO DE APLICACIÓN

Todos los procesos establecidos durante el desarrollo del proyecto están establecidos como asociación a los demás programas integrados de gestión.

CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La estructuración del plan de manejo ambiental se desarrolla en cuatro (4) divisiones las cuales tienen un avance en su cumplimiento:

- ✓ La primera parte se desarrolló una introducción, los objetivos, alcance, contenido y metodología, así como las consideraciones ambientales las cuales son de cumplimiento.
- ✓ La segunda parte, se ubicó el proyecto, la descripción del área de trabajo donde se visualiza las intervenciones de cada una de las zonas sobre la libertadores, las actividades de construcción y las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.
- ✓ La tercera parte presentó la caracterización ambiental del área de estudio mediante la descripción de los aspectos físicos, bióticos y socio-económico del entorno del proyecto, en el avance de obra nos brinda un adelanto del cambio de perspectiva de la zona.
- ✓ La cuarta parte contiene las medidas de manejo ambiental previstas, con el marco legal ambiental, la supervisión de las actividades ejecutadas tales como:
  Deshierbe, excavación, mejora de suelo, siembra de varias especies palmas, rubelina, real, Bismarck plateada, plantas rastreras, conglomeración, relleno y nivelación del terreno.

3. MARCO LEGAL

- **Ley 9 de 1979:** Las instalaciones interiores de las edificaciones y/o construcciones deberán diseñar y construir de modo que preserve la calidad del agua y garantice su suministro sin ruido, en cantidad y presión suficientes en los puntos de consumo.
- **Ley 99 de 1993:** Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
- **Decreto ley 2811 de 1974:** Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo.
- Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".
- **Decreto 4741 de 2005:** por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
- **Decreto 1323:** Por el cual se crea el sistema de información del recurso hídrico que hace parte del sistema de información ambiental para Colombia.

- **Decreto 2667:** Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.
- **Decreto 1575 de 2010:** establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada.
- **Decreto 3930 de 2010:** reglamenta parcialmente el uso de agua y los residuos líquidos, así como el ordenamiento del recurso hídrico, los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.
- **Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, 2010:** orienta el cambio de patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población. De esta manera contribuye a reducir la contaminación, conservar los recursos naturales, favorecer la integridad ambiental de los bienes y servicios ambientales y a estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes de competitividad empresarial y de calidad de vida.
- **Plan Nacional de Desarrollo Forestal:** aprobado mediante documento Conpes 3125 de 2001 determinó que el patrimonio forestal del país se ve afectado por la deforestación, proceso que es resultado de la ausencia de políticas y planes de ocupación de tierras para la colonización, de la aplicación de prácticas de roza y quema, del desarrollo de actividades agropecuarias no sostenibles y el uso intensivo de leña.
- **Política Integral de Salud Ambiental:** adoptada mediante documento Conpes 3550 de 2008 "Lineamientos para la formulación de la política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad del aire, calidad del agua y seguridad química". Entre sus objetivos específicos, busca fortalecer las acciones de la política de salud ambiental bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales, y contempla, en su plan de acción, la realización de estudios para evaluar la calidad del aire de ambientes interiores y su relación con el impacto en la salud, debido a que no se cuenta con información nacional relacionada con el tema de contaminación intramuros.
- **Política de Bosques:** adoptada mediante documento Conpes 2834 de 1996 identifica el consumo de leña como unas de las principales causas de deforestación en el país.
- **Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas No Convencionales (PROURE):** en su plan acción indicativo adoptado mediante Resolución 180919 de 2010 por el Ministerio de Minas y Energía incluye en el subprograma: sector residencial, una línea de acción para hornillas eficientes. consumo de leña como unas de las principales causas de deforestación en el país.
- **Decreto 1532:** Decreto Único Reglamentario sector ambiente. Por medio del cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en relación con las plantaciones forestales.
- **Resolución 631 de 2015:** por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.

- **Resolución 2254 de 2017**: establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión y adopta disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio nacional, con el objeto de garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud humana que pueda ser causado por la exposición de los contaminantes a la atmósfera.
- **Ley 1931 de 2018:** establece un marco de principios, normas y prohibiciones para la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales. También ordena que cualquier proyecto o actividad que pueda causar daños al medio ambiente debe obtener previamente una licencia ambiental.
-
- **Decreto 2041:** Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales
- **Decreto 1076:** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

DEFINICIONES

- ✓ **Impacto ambiental:** Cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado parcial o total de los aspectos ambientales en un proyecto.
- ✓ **Medio ambiente:** Entorno en el que opera una organización, incluye aire, agua, suelo, recursos, los seres humanos, flora, fauna y su interrelación.
- ✓ **Medidas de corrección:** Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones.
- ✓ **Medidas de mitigación:** Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un.
- ✓ **Medidas de prevención:** Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
- ✓ **Impacto ambiental:** Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
- ✓ **Programa Ambiental:** Planificación ordenada que se implementa al interior de una organización y/o proyecto, con el fin de preservar y cuidar los recursos naturales y el medio ambiente en genera.
- ✓ **Aspecto ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización/ proyecto que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
- ✓ **Desempeño Ambiental:** Producto cuantificable de la gestión que hace una organización/proyecto de sus aspectos ambientales.
- ✓ **Gestión integral:** Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la gestión de los residuos desde su generación hasta su disposición final.
- ✓ **Aprovechamiento y/o valorización de residuos:** Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.

- ✓ **Reciclaje:** Es el proceso de elaborar materiales a partir de productos ya utilizados para hacer nuevos productos. Es decir, poner de nuevo en el ciclo de consumo los materiales ya usados.
- ✓ **Almacenamiento de residuos:** Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.
- ✓ **Generador:** Persona natural o jurídica que realiza actividades de construcción y/o demolición, produciendo volúmenes de residuos para su aprovechamiento o disposición final según sus características.
- ✓ **Recolección:** Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores dentro del proyecto.
- ✓ **Residuos de construcción y demolición**: conocidos como escombro, Todo residuo sólido proveniente de actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas, entre los cuales se pueden encontrar (Res. 472 de 2012).
- ✓ **Residuos Aprovechables**: son todos aquellos residuos que se pueden reciclar tales como: plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
- ✓ **Residuos No aprovechables**: son aquellos que por sus complejas características no pueden ser reutilizados, reciclados o convertidos en nuevos artículos debido a varias razones, algunos de estos residuos son: servilletas papeles metalizados, contaminados con comida.
- ✓ **Residuos orgánicos aprovechables**: abarca una variedad de desechos biodegradables que provienen de fuentes naturales, entre los que podemos mencionar: restos de comida y desechos agrícolas.
- ✓ **Residuos peligrosos**: es aquel que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar algún riesgo o daño para la salud humana y el ambiente, cuando es inadecuadamente manejado, tales como: estos de sangre. Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables.
- ✓ **Prevención de la Contaminación:** Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios, o energía para reducir o evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión, o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

4. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

- **Descripción del Proyecto:**


El proyecto que tiene por objeto: "ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL

PAISAJE URBANO" ubicado en la Ciudad de Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, nos remitimos a los estudios previos, donde desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual llevo a cabo las respectivas inspecciones en las áreas locativas donde se ejecuta el proyecto, donde los aspectos ambientales generados durante las actividades desarrolladas no arrojaron ningún impacto negativo, por el contrario, arrojaron impactos positivos sobre el entorno.

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de San José de Cúcuta, en el Departamento Norte de Santander.

Localización de la zona de estudio a nivel departamental.

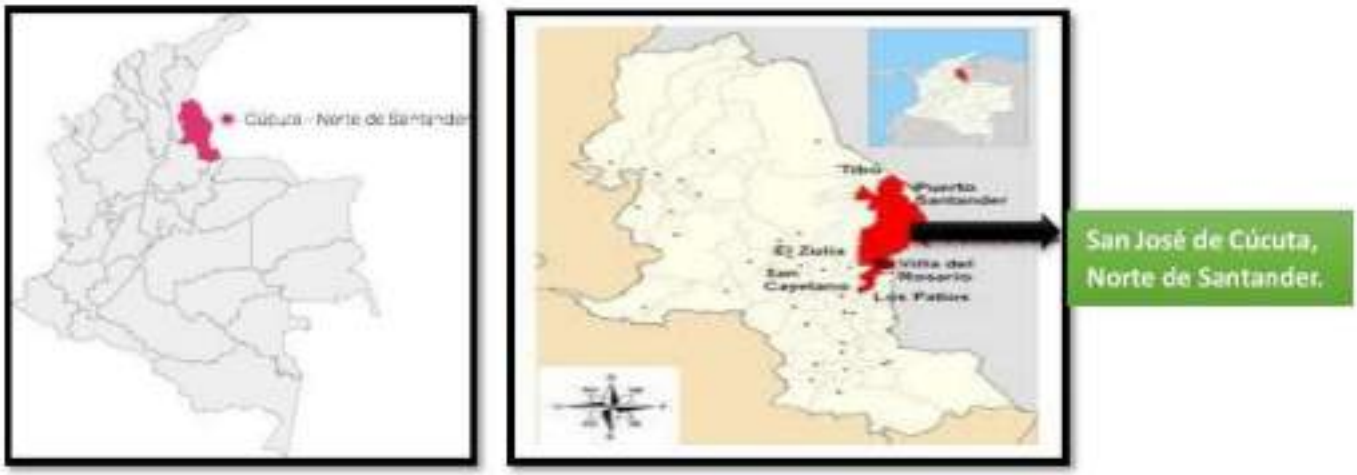

Fuente. Goolge maps. Ubicación más próxima al municipio San José de Cúcuta.

Caracterización Ambiental del Área de Estudio

Las ubicaciones del área de estudio están referenciadas en sitios estratégicos donde se tendrá en cuenta aspectos y factores determinantes para la continua el buen desarrollo del proyecto que tiene por objeto: "ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO".

Las características tales como: los aspectos físicos, siendo los componentes que determinan los espacios físicos tales como: agua, temperatura, humedad, aires, suelo entre otros y que hacen parte del proyecto.

- ✓ **Identificación de Aspectos Ambientales.**

  Todo elemento derivado de las actividades del proyecto de la adecuación y mejoramiento de y recuperación de corredores verdes y separador vial de la avenida libertadores en el municipio de san José de Cúcuta y las interacciones entre el medio ambiente, determinado el buen uso y manejo del suelo y el agua, la dinámica urbana, el mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes de estos corredores.

6. FACTORES DE RIESGO

Se consideran factores de riesgo la amenaza (A) y la vulnerabilidad (V). La interacción de estos dos factores genera el riesgo y puede llevar al desastre.

- ➢ AMENAZA: Es la probabilidad de que un fenómeno de origen natural o humano,

potencialmente capaz de causar daño, se produzca en un determinado momento y lugar. Existen diversas maneras de clasificar las amenazas. Por su origen pueden ser naturales, socio-naturales o antrópicas.

7. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la metodología se tiene en cuenta el siguiente proceso:

- La primera etapa consistió en la recopilación de información primaria y secundaria de la localización del proyecto, de las características ambientales de la zona de estudio, la población del área de estudio, clima, calidad del aire y ruido.
- La segunda etapa comprendió en el análisis de la información y desarrollo de la linea base ambiental, descripción del medio físico, biótico y socioeconómico del área de estudio.
- En la tercera etapa se realizó la evaluación de aspectos e impactos ambientales, y se formularán los programas de manejo ambiental, donde se dio cumplimiento en las actividades y las evidencias fotográficas que se tomaron durante el desarrollo de cada una de las tareas ejecutadas.
- La intervención, se pretende generar un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad, fomentar el sentido de pertenencia ciudadana y consolidar la Avenida Libertadores como un corredor vial sostenible, funcional y representativo del desarrollo urbano y ambiental, y de toda la comunidad que hace uso de este corredor vial neurálgico perteneciente al municipio de San José de Cúcuta.

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO	
DIAGNÓSTICO	Se realiza una intervención en le corredor vial, se realiza una identificación visual de las plantas, además se identifica las zonas donde no hay arborización y se pierde la continuidad, además de los accesos.
DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL	Se retira la capa vegetal y se realiza el plateo sobre cada árbol.
ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE	Para la siembra de arboles como parte del componente verde se procede a realizar un ahoyado o apertura de huecos, luego se prepara la especie entre ellas las palmas, se alista el sustrato y fertilizantes, se hace la plantación y la protección a través de encerramiento con estacas y lona verde en caso de ser necesario.
SIEMBRA DE MATERIAL VEGETAL	Se realiza siembra de diferentes especies la cuales son resistentes al clima y los tiempos atmosféricos presentados en la ciudad de Cúcuta.
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS	Recubrimiento y protección alrededor con lona verde.

MANTENIMIENTO	Los mantenimientos de cada planta como la poda y el riego se tienen preestablecidos por personal encargado de la tarea.
EDUCACIÓN AMBIENTAL	Se reliza una intervención social de la comunidad circundante de la zona y se relizara educación ambiental de la comunidad en general a través de canales de comunicación.

8. EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

El análisis detallado de las actividades del proyecto y la interacción con los componentes ambientales (geosférico, hidrosférico, atmosférico, y antropogénico), permitieron identificar los impactos ambientales que se puedan presentar durante la etapa de ejecución del proyecto.

La valoración y cuantificación de los principales aspectos e impactos ambientales relevantes detectados en el proceso de evaluación y perfil ambiental en el proyecto **"ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO".** Para tal efecto, se utilizan parámetros que determinan el grado de afectación en cada uno de los componentes del ambiente, de los impactos positivos o negativos ocasionados por los aspectos relevantes detectados en el trabajo de campo.

Para el proceso de valoración de impactos y aspectos ambientales se utilizó la metodología planteada por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) por considerarla un mecanismo completo de evaluación.

Según lo determinado por la metodología EPM, la calificación ambiental es la expresión de la interacción o acción conjugada de los criterios o factores que caracterizan los impactos ambientales y está definida por la ecuación:

$$Ca = C\,(P * (a * E * M) + (b * Du)$$

Donde,

Ca: Calificación ambiental que se obtiene a partir de cinco criterios o factores que le son característicos a cada impacto.

C: Carácter de efecto: determina el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción de la obra o actividad específica; puede ser positiva (+) o negativa (-) lo cual depende de si se mejora o degrada el ecosistema o la salud ambiental, aun a futuro.

P: Presencia: define la probabilidad de que un impacto del cual no se tenga certeza se pueda dar, se expresa como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia.

E: Desarrollo del efecto: evalúa la velocidad de aparición en el tiempo del proceso u ocurrencia del impacto desde que se inicia hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias.

M: Magnitud: determina la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por la obra o actividad, incluso en su operación o funcionamiento. Los valores de magnitud absoluta, cuantificados o referidos se transforman en términos de magnitud relativa, la cual se convierte en una expresión más real del nivel de afectación.

Du: Duración: determina el período en el cual existe el impacto y sus consecuencias desde que se manifiesta, se expresan en función del tiempo que permanece el impacto.

a y b: representan factores que dependen de la importancia que se dé al desarrollo (a) o duración y magnitud (b) del proyecto.

La tabla a continuación muestra los criterios de evaluación ambiental:

Tabla 1 Criterios de evaluación impactos ambientales – metodología EPM

ATRIBUTO	CALIFICACION	ESCALA	SIGNIFICADO
PRESENCIA (P)	Cierta	1	Existe absoluta certeza de que el impacto se presente
	Muy Probable	0.7 - 0.9	Es muy probable que el impacto se presente
	Probable	0.4 - 0.6	Es probable hasta un 50% que el impacto ocurra

	Poco Probable	0.1 - 0.3	Es poco probable que el impacto se presente
DESAROLLOS DEL EFECTO O EVOLUCION (E)	Muy Rápido	0.9 - 1.0	Menor a un mes
	Rápido	0.7 - 0.8	De uno a cinco meses
	Medio	0.5 - 0.6	De seis meses a un año
	Lento	0.3 - 0.4	De uno a dos años
	Muy Lento	0.1 - 0.2	Mayor a dos años
MAGNITUD (M)	Muy Severo	0.9 - 1	Daño permanente al Ambiente
	Severo	0.7 - 0.8	Daños serios pero temporales al Ambiente
	Medianamente Severo	0.5 - 0.6	Daños menores pero permanentes al Ambiente
	Ligeramente Severo	0.3 - 0.4	Daños menores al Ambiente
	No Severo	0.2 - 0.1	Ningún daño al Ambiente
DURACION (D)	Muy Larga	1	Más de 10 años
	Larga	0.7 - 0.9	De 7 a 9 años
	Media	0.4 - 0.6	De 4 a 6 años
	Corta	0.3 - 0.1	De 1 a 3 años
	Muy Corta	< 0.1	Menor de un año
CALIFICACION AMBIENTAL (Ca)	Muy Alto	8 - 10	Muy alta repercusión sobre el entorno
	Alto	6 - 8	Alta repercusión sobre el entorno
	Medio	4 - 6	Media repercusión sobre el entorno
	Bajo	2 - 4	Baja repercusión sobre el entorno
	Muy Bajo	0 - 2	Muy baja repercusión sobre el entorno

Fuente: Manual para la evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades, Jorge Alonso Arboleda González. 2005.

Nota: para la valoración final se tiene en cuenta los siguientes intervalos según el método

EPM: Las valoraciones están supeditas a los cálculos del consultor.

○ **Evolución:**	○ **Magnitud:**
-Muy rápida = 1	-Muy Alta = 1
-Rápida= (0.7-0.99)	-Alta= (0.7-0.99)
-Media= (0.4-0.69)	-Media= (0.4-0.69)
-Lenta= (0.2-0.39)	-Baja= (0.2-0.39)
-Muy lenta= (0.01-0.19)	-Muy Baja= (0.01-0.19)

○ **Presencia:** -Cierto = 1 -Muy probable= (0.7-0.99) -Probable= (0.4-0.69) -Poco probable= (0.2-0.39) -Muy poco probable= (0.01-0.19	○ **Duración:** -Muy larga o permanente = 1 -Larga= (0.7-0.99) -Media= (0.4-0.69) -Corta= (0.2-0.39) -Muy corta= (0.01-0.19)

Tabla 2. Evaluación de Impactos Ambientales. Etapa 1 .

Actividades realizadas: Deshierbe, excavación, mejora de suelo, siembra de varias especies palmas, rubelina, real, Bismarck plateada, plantas rastreras, conglomeración, relleno y nivelación del terreno.

ETAPA	ACTIVIDADES	ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTOS AMBIENTALES	VALORACIÓN					CALIFICACIÓN	ESCALA
				C	P	E	M	Du		
PROYECTO	RECUPERACIÓN DE CORREDORES VERDES	Residuos sólidos y sobrantes		Pos	0.1	0.4	0.2	0.3	0.31	M. BAJO
		Pérdida de capa orgánica		Pos	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	M. BAJO
		Alteración de zonas verdes		Pos	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	M. BAJO
		Material particulado		Pos	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	M. BAJO
		Ruido		Pos	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	M. BAJO

Fuente: Consultor.

- **Generación de residuos sólidos y sobrantes de mantenimiento:**

Este impacto fue muy bajo debido a que los sobrantes extraídos fueron utilizados en actividades conglomerado y relleno, dando cumplimiento al componente de generación de residuos muy bajo.

- **Aumento niveles de ruido**

Este impacto fue muy bajo debido a que las actividades fueron desarrolladas manualmente, sin uso de equipos que generen alto impacto de ruido.

- **Emisiones de gases**

Las emisiones de gases están asociadas principalmente al movimiento de vehículos, esta zona tiene un histórico de flujo vehicular alto, por ende, las autoridades ambientales tienen establecidos estudios y una intervención para su atenuación.

5.1. M. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Este impacto se refiere a la producción de posibles escombros causadas por la actividad de mantenimiento y a la producción de residuos sólidos propios de las actividades operativas o residuos sólidos por actividades conexas y los producidos por el personal. Los desechos sólidos se pueden caracterizar en tres grupos: residuos reciclables, residuos sólidos no reciclables que deben ser dispuestos en rellenos sanitarios y residuos peligrosos como guantes y tapabocas. La resolución 2184 del 2019 establece el siguiente código de colores: Los colores son: Blanco: residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Negro: residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En la imagen a continuación se ilustra el color específico de los contenedores junto a los residuos a depositar.



Objetivo:

-Reducir la generación de residuos sólidos en las actividades operativas de la obra.
-Separar los residuos de acuerdo a sus características.
-Manejo y disposición final de los residuos generados en la obra.

Etapa: esta direccionada en la fase de operatividad del proyecto.

Manejo y Acciones a implementadas:

Dentro de las acciones a desarrolladas se realiza el almacenamiento de los residuos según lo establecido por la resolución 2184 de 2019 en su código de colores los cuales están determinados de la siguiente manera:
Residuos aprovechables- recipiente color blanco (plástico, cartón, vidrio, papel, metales), Residuos Orgánicos Aprovechables- recipiente color verde (restos de comida, desechos

agrícolas), Residuos no aprovechables – recipiente color negro (papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados de comida, papeles metalizados).
Los recipientes y algunos elementos que sirvieron como recipientes estuvieron debidamente marcados y señalizados, para una mejor separación en la fuente capacitando a todo el personal de obra sobre la obligatoriedad y uso, también se debe realizar una limpieza exhaustiva de las zonas donde se desarrollaron las tareas.
Para lo concerniente a los residuos/escombros de construcción se trasladan a sitios de acopio para luego ser llevados y depositados en escombreras (los escombros generados deben estar apilados y cubierto por lona o plástico para evitar arrastre o erosión por agua y aire circundante.
Las canecas o recipientes deben ubicarse en sitios estratégicos o de mayor afluencia de personal, como son el ingreso a la obra, oficinas, campamentos de los trabajadores y caspete (zona de preparación de alimentos o casinos). Para residuos voluminosos, utilizar contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento.
Las etiquetas de los recipientes: se colocó la información clara y entendible. para todos, ser resistentes al agua y estar impresas en gran formato.
Los escombros generados en las actividades menor a 3 m3, tendrá un tiempo de residencia en un lugar adecuado para almacenarlo antes de su disposición final, además Los escombros deben disponerse en una escombrera que cuente con las autorizaciones ambientales y municipales, en este proyecto no superaron el volumen.

Cualquier derrame de combustible o sustancia oleosa deberá ser limpiado de inmediato con material absorbente como aserrín o arena. El material absorbente utilizado y el suelo contaminado deberán ser almacenados temporalmente en dicho contenedor, en este caso no se presentaron derrames.

Todas las canecas deben estar rotuladas en formato visible y tapadas con su respectiva manigueta para evitar proliferación de vectores (aunque estén bajo techo), los embalajes en obra son debidamente trasladados a lugares de recolección inmediata. En las imágenes se evidencia los recipientes de almacenamiento de residuos y capacitaciones.





Nota: se requiere capacitaciones periódicas a todo el personal en obra, dado el ingreso de personal nuevo, en caso de ocurrir. Como en las obras se generan grandes volúmenes de residuos, se requiere definir un acopio de escombros y/o residuos.

Monitoreo y Seguimiento:

A través del registro fotográfico se adjuntará la evidencia de él buen manejo de los residuos.

Responsables: Contratista de Obra (director de Obra, Ingeniero Residente Ambiental).

PROCESO	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
Siembra/ Embellecimiento	Gestión integral de residuos	Manejo de residuos sólidos.	Disposición inadecuada de residuos sólidos ordinarios, reciclables y peligrosos.

La significancia ambiental radica en el grado de impacto que puede llegar a generar los residuos con respecto a una disposición inadecuada, por ende, se tienen unos controles preventivos y reglamentarias que ayudan a contrarrestar los posibles impactos.

5.2. M. CONTROL DE EMSISIONES ATMOSFÉRICAS

Objetivo:

-Establecer medidas de reducción de los impactos generados por las emisiones atmosféricas en durante la ejecución de obra.

Etapa: la etapa esta direccionada en la fase de operatividad del proyecto (diseño y adecuación).

Manejo y Acciones a implementadas:

Los sitios donde se desarrollen las actividades deben cumplir con una serie de parámetros de obra deben estar protegidos con una tela o lona para tener un control del material particulado. Siempre se deben proteger con lona o plástico los materiales finos (arenas) para evitar la dispersión de material particulado. Los elementos, equipos o materiales se

deben mantener debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua, así mismo, implemente todas las medidas del programa de manejo de materiales de construcción.

Se debe garantizar el aislamiento del equipo y de los operarios para el uso de cortadoras y pulidoras realizando cerramiento con malla fina sintética, con el fin de mitigar el ruido y la generación de material particulado, en este caso no se presentó.

Los diferentes residuos generados por las actividades que se requieran durante la obra se almacenarán, transportaran y dispondrán con las medidas de mitigación y control necesarias en el menor tiempo posible, lo cual se está realizando a cabalidad y con las medidas pertinentes.

Cumplimiento de Resolución 2154 del 2017 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre emisión de fuentes móviles y la resolución 2254 la calidad del aire o nivel de inmisión.

Con respecto a la contaminación de emisión de ruido se tiene la resolución 0627 de 2006 que establece los aspectos, medidas y controles con respecto:

Uso de equipos con niveles altos de emisión sonora, a más de 80 decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por periodos cortos de tiempo.

Los horarios establecidos por la normatividad y los niveles permisibles a los cuales se les debe dar cumplimiento.

Si aplica, se debe notificar o advertir previamente a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de que tomen las medidas pertinentes, durante el desarrollo de las actividades por parte del contratista no se ha presentado este tipo de equipos. El aspecto ambiental es la disgregación de PM en la zona esl cual es controlado por mallas (lona verde) como se muestra en la imagen.





Monitoreo y Seguimiento:

A través del registro fotográfico se adjuntará la evidencia de la existencia o no de contaminación atmosférica.

Responsables: Contratista de Obra (director de Obra, Ingeniero Residente Ambiental).

PROCESO	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
Siembra/ Embellecimiento	Control de emisiones atmosféricas	Generación de emisiones atmosféricas fuentes fijas	Emisión de partículas y gases

Se valora el aspecto ambiental más relevante, el cual es el de PM y el control ejercido sobre el mismo.

5.3. M. MATRIZ MANEJO DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS USADOS.

Objetivo:

-Reducir los impactos sobre el ambiente generados por materiales usados y la optimización de su uso.

Etapa: la etapa esta direccionada en la fase de operatividad del proyecto de mejoramiento y embellecimiento.

Manejo y Acciones a implementadas:

Como primera medida se debe realizó un cerramiento para evitar expansión y contención del material particulado, todos los sitios usados para almacenar materiales deben estar debidamente demarcados y señalizados, el material vegetal usado en actividades de construcción be tener su permiso forestal vigente. Con el fin de evitar problemas socioambientales se debe evitar colocar residuos en zonas de uso público o invasión de espacios dedicados a otras actividades, Cuando se requiera almacenar productos químicos, identifiquelos con una marca o letrero. Para etiquetar o marcar los productos químicos existe una norma técnica colombiana NTC 1692 la cual se verifico, pero hasta el momento no se ha implementado por el no uso de químicos. Verificar las fichas de seguridad de los productos que se utilicen y el etiquetado correcto para prevención de incidentes y accidentes al manipularse, cada ficha de seguridad contiene unas secciones específicas que establecen los lineamientos y con los criterios armonizados del SGA para

los peligros físicos, para la salud o para el medio ambiente y para todas las mezclas que contengan componentes que satisfagan los criterios de carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción o toxicidad específica de órganos diana en concentraciones que superen los límites del valor de corte/límites de concentración para las FDS especificadas en los criterios relativos a las mezclas.
Se hace una verificación de las acciones en el Manejo de Materiales y Residuos generados.

Al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general y cada vez que se requiera se recogerán los desperdicios o basura presentes en el sitio de obra.
En el sitio de obra se deberá disponer canecas para el manejo de los residuos comunes.
El material que sea susceptible de recuperar se clasificará y se depositará en canecas para material de reciclaje.
Se capacitó al personal de acuerdo al Programa de capacitaciones que presente y de las cuales se deberá dejar registros y evidencias, para minimizar la generación de residuos en la divulgación sus políticas de producción limpia.

Los materiales que no se están utilizando, y que permanecieron dentro del frente de la obra, deberán estar debidamente cubiertos y demarcados en áreas autorizadas por la Interventoría con cintas de seguridad, para evitar derrames a áreas no previstas, incidentes y/o accidentes. Las zonas de almacenamiento de materiales deben estar debidamente señalizadas.





Nota: Los escombros se llevarán a escombreras autorizadas por la autoridad ambiental, se adecuará un sitio en la zona del proyecto para la disposición temporal de estos materiales reutilizables, debidamente almacenado y demarcado.

Monitoreo y Seguimiento:

A través del registro fotográfico se adjuntará la evidencia del manejo de los residuos.

Responsables: Contratista de Obra (director de Obra, Ingeniero Residente Ambiental.

PROCESO	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
Siembra/Embellecimiento	Uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción	Derrames de Sustancias.	Alteración de las características del suelo.

Se presenta un adecuado almacenamiento de los equipos y herramientas usados en el proyecto.

5.4. M. MATRIZ MANEJO ADECUADO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

Objetivo:

•Manejar adecuadamente la cobertura vegetal y descapote removido, en lo posible reutilizarla localmente, o usarla para la recuperación del área intervenida en la etapa de construcción.
•Prevenir la aparición de fenómenos de erosión en las áreas con cobertura vegetal intervenidas.

Etapa: la etapa esta direccionada en la fase de operatividad del proyecto.

Manejo y Acciones a implementadas:

La ejecución de técnicas o medidas de maneja conllevan a acciones para mitigar el impacto visual ocasionados por el proyecto, las medidas o técnicas de implementación que se usaron para prevenir la alteración del paisaje están basadas en la determinación de áreas de trabajo, las cuales tendrán un plan de restauración rápida en caso de ser necesario. La recuperación de los sitios específicos de intervención de las actividades, se realiza a través de la plantación de árboles y especies arbóreas como palmas. Todas las intervenciones

incluyendo la deforestación o poda de las especies arbóreas se solicitan a través de la autoridad ambiental, en este caso no se uso.
Para el manejo o acciones a implementarse se debe disponer de una zona de almacenamiento de los sobrantes, usar el suelo de descapote y nivelación en otras actividades en caso de ser necesario, todas las señalizaciones dentro de las áreas directa del proyecto deben estar fijas y con la información pertinente.

En la intervención sobre el paisaje o sobre cualquier especie arbórea se presentó una siembra técnica que conllevo al embellecimiento de la zona como se muestra a continuación:





Monitoreo y Seguimiento:

El registro fotográfico se adjuntará la evidencia del manejo y conservación de vegetación y el paisaje.

Responsables: Contratista de Obra (director de Obra, Ingeniero Residente Ambiental), Ingeniero Forestal.

PROCESO	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
Siembra/embellecimiento	Acondicionamiento del terreno para la ejecución de la obra.	Generación de residuos aprovechables.	Alteración del paisaje.

Se realizan los procesos adecuados, junto a los manejos se previene en gran medida la alteración del paisaje, incorporando especies arbóreas que mejoran el paisaje.

5.6. M. MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS PESADOS

Objetivo:

-Aplicar las medidas para asegurar el traslado y transporte de máquinas y equipos mediante el cumplimento ambiental y de seguridad de los trabajadores y las personas ajenas al proyecto.

Etapa: en la primera etapa se estableció un trabajo manual.

Manejo y Acciones a implementadas:

-Todos los vehiculos usados para el transporte de materiales deben cumplir con unas especificaciones con el fin de evitar derrames y caída de material durante su trayecto a la disposición final. Todos los vehiculos sin excepción deben tener la documentación (licencia, soat, técnico-mecánico certificado de emisiones atmosféricas, propiedad, permisos) actualizados. Los vehiculos deben cumplir con el pre-operacional para prestar su servicio dentro y fuera de la obra; también se prohíbe el lavado, mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria en los frentes de obra, además los vehiculos tendrán alarmas acústicas para operaciones de reverso para evitar cualquier accidente, para el traslado de material debe cumplir lo siguiente: contar con un kit antiderrames, cumplir con el formato preoperacional, equipo de primeros auxilios, extintor, para evitar derrames o caída de objetos el vehiculo debe ir cubierto por un lona que no permita el paso del material particulado, los vehiculos de carga de material no deben exceder las cargas de diseño de los equipos y deben respetar la carga legal permitida 6m3, 12m3 y 18m3. El uso e interpretación correcta de las hojas de seguridad y tarjetas de emergencia de acuerdo con la NTC 4435 y NTC 4532. Todos los vehículos de carga tienen una ruta establecida para cargue y descargue.
El vehículo de transporte debe llevar la señalización de carga pesada.
Los posibles riesgos e impactos ambientales y en salud y seguridad asociados a esa actividad, incluyendo (aplastamiento, choque a personas, choque de la maquina con estructuras fijas y estructuras aéreas); o Las medidas de control que eliminarán o minimizarán los potenciales impactos.
Todo el personal dedicado a la operación de los equipos debe certificar que ha sido capacitado sobre el manejo seguro de la maquinaria.

El estado y la integridad de la maquinaria debe ser inspeccionada antes y después de su uso. Se debe establecer un protocolo de inspección por parte de la empresa encargada, preferiblemente mediante el uso de una lista de chequeo de inspección de equipos, en busca de fugas, y fallas potenciales. No se debe permitir la operación de quipo con partes

dañadas o desgastadas en exceso, que pongan en riesgo la vida del operador, de terceros y de la integridad del equipo.
Establecer distancia mínima entre el equipo y el cerramiento de obra.
Deben contar con los dispositivos mínimos de seguridad: extintor de incendios y kit de contención de derrames, sonido de alarma automático de reversa, identificación de contrato, contratista y número de obra.

Monitoreo y Seguimiento:

A través de la lista de chequeo y el registro fotográfico se adjuntará la evidencia en el manejo de maquinaria y equipo en caso de ser necesario.

Responsables: Contratista de Obra (director de Obra, Ingeniero Residente Ambiental), Ingeniero Forestal.

PROCESO	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
Siembra/Embellecimiento	Traslado y transporte de maquinaria.	Generación de emisiones atmosféricas fuentes móviles.	Alteración de las características del aire

Nota: En caso de ser usado la maquinaria y equipos en el proyecto se realizará una verificación de los mismo y se tendrá evidencia fotográfica.

5.7. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA

Objetivo:

-Implementar la ubicación y estrategias en el manejo de señalización de la obra.
-Definir las estrategias para el manejo del tráfico con el fin de evitar accidentes del parque automotor y de peatones.

Etapa: esta direccionada en la fase de operatividad del proyecto en la primera etapa.

Manejo y Acciones a implementadas:

La señalización ubicada a lo largo de la obra tiene como objetivo informar y advertir a todo el personal de obra y a terceros sobre los peligros y los riesgos que puedan ocasionar las

actividades que se ejecutan. Dentro de las señales están las reglamentarias que son de cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual están destinadas, el no cumplimiento acarrea sanciones. Las señales preventivas de obra advierten la proximidad de una circunstancia o variación de la normalidad del proyecto que puede resultar sorpresiva o peligrosa a la circulación. Las señales informativas de obra destinadas a identificar, orientar y hacer referencia a servicios, lugares o cualquier otra información que sea útil para el usuario que transita por la zona de obra.

Las señalizaciones suministradas están supeditadas a las actividades que se realicen en obra, las dimensiones de cada una de las señales se tienen en cuenta conforme al área de seguridad/ área de trabajos donde se encuentran los trabajadores, equipos, maquinaria, vehículos, materiales.
Para prevenir incidentes o accidentes de trabajo se realiza capacitación sobre señalítica dentro y fuera de la obra.

Las instalaciones temporales están determinadas por campamentos, acopios temporales de materiales, bodegas, puntos de almacenamiento de combustibles, aceites y lubricantes, productos químicos, patio de máquinas y equipos, vistieres, entre otros. Estas instalaciones, deberán contener como mínimo los siguientes aspectos:

Así mismo la señalización de los frentes de obra está conformada de la siguiente manera:

Los frentes de obra deben tienen la siguiente señalización :

- Aislamiento y demarcación de todo el frente de obra
- Demarcación de la circulación interna del personal

Dentro de las señalizaciones utilizadas se tuvieron en cuenta tres formas de garantizar el cumplimiento de seguridad y protección:

Visibilidad: las señales deben son visibles tanto de día como de noche. Esto implica el uso de materiales reflectantes y colores contrastantes.

Ubicación: se colocaron en puntos estratégicos donde sean fácilmente visibles para los usuarios de la vía, antes de llegar a la zona de obras.

Contenido claro: la información debe se observa clara, evitando ambigüedades que puedan confundir a los conductores y peatones.

Los diversos tipos de señalización dentro de las que podemos mencionar la de peligro, la informativas, de advertencia, de prohibición, algunas pueden ser señales luminosas o señales acústicas. El extintor hace parte de las actividades y/o tareas como método de prevención.









Monitoreo y Seguimiento:

Se realizan capacitaciones y su respectivo registro fotográfico se adjuntará la evidencia las cuales se realizan conforme al avance de obra.

Responsables: Contratista de Obra (director de Obra, Ingeniero Residente Ambiental), Ingeniero Forestal.

PROCESO	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
Siembra/ Embellecimiento	Actividades Pre constructivas y constructivas.	Instalación /cumplimientos de señalizaciones	Tiempo de espera/retención.

Nota: Para dar cumplimiento se estableció una planificación detallada en cuanto a las actividades a desarrollar, el uso de señales provisionales, la capacitación de los trabajadores, los canales de comunicación con el público, la inspección, mantenimiento y control.

5.9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Objetivo:

-Establecer el seguimiento y control de obra en cumplimiento del cronograma de actividades.

Etapa: la etapa esta direccionada en la fase de operatividad del proyecto de mejoramiento y embellecimiento. Control y prevención.

Manejo y Acciones a implementadas:

- El avance de obra según el programa, se ha cumplido a cabalidad según las actividades planeadas y las entregas propuestas.
-Se realiza una programación a corto plazo, mediano y largo plazo con el objeto de encontrar errores y generar las correcciones pertinentes a los impactos ambientales, además de los recursos gastados hasta ese momento.
- Se estableció un plan de manejo ambiental que permitió prevenir y minimizar las afectaciones al medio ambiente por el desarrollo de la obra.
- Se estableció un programa de salud ocupacional que permitió lograr el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo, protegiéndolos de los riesgos inherentes a su labor.
-Se realiza seguimiento constante de cumplimiento a las obligaciones ambientales y en seguridad y salud en el trabajo.
-Se hace la revisión de todas las medidas implantadas para garantizar que sean eficaces, a través de un control de capacitaciones a todo el personal de obra.
-Monitoreo de actividades (las actividades de obra tienen que ir entrelazadas con la normatividad ambiental siempre y cuando lo requiera).

• Comparación del progreso con las actividades establecidas (los avances de obra esta supeditados a os recursos e impactos ambientales).
• Se implementan de acciones correctivas o preventivas. (Con el propósito de evitar cualquier incidente y/o accidente de trabajo o cualquier contingencia ambiental que se pueda presentar en el desarrollo de obra), en las imágenes a continuación son la evidencia clara de lo mencionado anteriormente.






Monitoreo y Seguimiento:

Se realizan inspecciones visuales acompañadas del registro fotográfico se adjuntará la evidencia de lo encontrado.

Responsables: Contratista de Obra (director de Obra, Ingeniero Residente Ambiental), Ingeniero Forestal.

PROCESO	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
Siembra/Embellecimiento	Ejecución de la obra.	Monitoreo y seguimiento de las actividades programadas.	Fomento de buenas prácticas Ambientales.

Nota: se establecen acciones correctivas o controles para mitigar o prevenir los impactos. Se toman medidas preventivas y medidas correctivas si no se cumple uno o varios de los requisitos anteriores, deben tomarse de inmediato las medidas necesarias para con el fin de contrarrestar las posibles malas prácticas ambientales en obra.

Algunas actividades concernientes al programa ambiental para la obra que tiene por objeto: "ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO"

-Fortalecer las buenas prácticas ambientales en las obras.

-Alargar el ciclo de vida de materiales mediante acciones como el uso adecuado de materiales, reciclaje y el reúso.

-Fortalecer actividades de mitigación y compensación.

-Mejorar la oferta de biodiversidad en los espacios construidos.

-Fortalecer la educación ambiental en los clientes internos y externos.

-Fortalecer la responsabilidad empresarial y social.

-Establecer procesos de Gestión integral de los residuos sólidos y vertidos.

-Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental que aplica.

-Realizar el control de los materiales y residuos.

Los ítems anteriormente mencionados son la clave para la protección y mejoramiento de las zonas intervenidas, contemplan las medidas y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

6. CONTROLES OPERACIONALES

ASPECTOS AMBIENTALES	CONTROLES OPERACIONALES
1 Consumo de agua.	Implementar la Política del Sistema de Gestión Ambiental. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique). Implementar el Programa de uso eficiente del agua. Implementar las directrices de la Guía de compras sostenibles bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
2 Consumo de combustibles.	Implementar la Política del Sistema de Gestión Ambiental. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique). Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique). Realizar seguimiento y medición del consumo de combustible del parque automotor.
3 Consumo de energía eléctrica.	Implementar la Política del Sistema de Eficiencia Energética. Implementar el procedimiento del Sistema de Eficiencia Energética. Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales del Sistema de Eficiencia Energética. Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
4 Generación de emisiones atmosféricas por fuentes de combustión externa (fuentes fijas).	Implementar la Política del Sistema De Gestión Ambiental. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique). Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

FUENTE: Min salud.

7. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Es importante tener en cuenta que los criterios al repetir la medición de la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales deberán ser siempre los mismos, conservando en lo posible las condiciones iniciales, es decir, muestrear en los mismos puntos y horarios preferiblemente, emplear el método analítico descrito en esta guía.

Para un correcto seguimiento y control ambiental se aplica el ciclo de Deming PHVA, realizando un compromiso sobre el cumplimiento de la políticas y normatividad legal vigente, análisis ambiental de las actividades macro y micro que se desarrollen dentro del proyecto, también a las medidas de manejo ambiental y monitoreo junto a la evaluación y mejoramiento continuo.

La evaluación y el seguimiento técnico del proyecto "ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y

SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO" deben articularse bajo un enfoque de ecología urbana aplicada a medida que se realicen los avances, fortaleciéndolo a través de una medición rigurosa de servicios ecosistémicos y protección de los mismos.

Atentamente,

JOSE ALEXANDER SALAZAR GOYENECHE
PROFESIONAL AMBIENTAL/FORESTAL

ANEXO 11. PLAN DE SEÑALIZACIÓN

UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

NIT 902018300

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS

SAN JOSE DE CUCUTA

DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1. OBJETIVO GENERAL 6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
3. MARCO LEGAL 7
4. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 8
4.1. Generalidades 8
4.3. SEÑALES DE SEGURIDAD 10
4.4. COLORES DE SEÑALIZACIÓN (DEMARCACIÓN) 15
4.5. BALIZAMIENTO 16
4.6. SEÑALIZACION VIAL 16
5.5. IDENTIFICACION DE TUBERÍAS 22

TABLA DE CONTENIDO (TABLAS)

Tabla 1 MARCO LEGAL SOBRE SEÑALIZACIÓN 7
Tabla 2 SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD 10
Tabla 3 SEÑALES DE PROHIBICIÓN 11
Tabla 4 SEÑALES DE OBLIGACIÓN 11
Tabla 5 SEÑALES DE PREVENCIÓN 12
Tabla 6 SEÑALES DE INFORMACIÓN 13
Tabla 7 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 13
Tabla 8 DIMENSIONES Y MATERIALES 14
Tabla 9 CÓDIGO DE COLORES 15
Tabla 10 SEÑALIZACIÓN VIAL 17
Tabla 11 COLORES DE CONTRASTE 18
Tabla 12 FORMA GEOMÉTRICA, COLOR Y SIGNIFICADO 19
Tabla 13 TAMAÑO DE LAS SEÑALES Y DISTANCIA MÁXIMA DE OBSERVACIÓN SEGÚN SU FORMA 20
Tabla 14 COLORES DE IDENTIFICACIÓN PARA TUBERÍAS 23

0. PRESENTACION DE LA EMPRESA:

Empresa	**UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025**
Nit:	NIT. 900.069.751-5
Actividad Económica	SERVICIO DE APOYO A LA SILVICULTURA
Gerente	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
Dirección	MZ 41 Lote 3 Barrio Claret – SAN JOSE DE CUCUTA
Teléfonos	3022726357
Correo electrónico	CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las estrategias de prevención de accidentes a nivel colectivo y que se utiliza cuando los riesgos no han podido eliminarse o reducirse adecuadamente durante el diseño de los procesos productivos o cuando se quiere enfatizar en algunos controles, ocupa un lugar destacado la señalización y demarcación, que brinda la posibilidad de advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos presentes en las diferentes áreas laborales.

Por este motivo, UT CORREDORES VERDES 2025**.** consciente de su compromiso de velar por la seguridad y bienestar integral de su población trabajadora y de la comunidad (visitantes, clientes y proveedores), ha realizado esta guía metodológica para el diseño e implementación de medidas básicas de prevención de riesgos, dando cumplimiento a las normas nacionales e internacionales existentes sobre señalización y demarcación, y así facilitar la identificación de áreas o zonas de riesgo, contribuyendo de esta manera a la prevención de accidentes y enfermedades de origen profesional.

La utilización e implementación de una señalización adecuada y oportuna, ayuda a prevenir los diferentes factores de riesgo ocupacionales, a realizar los trabajos en forma segura e indica óptima organización empresarial. Sin embargo, es importante recordar que la existencia de la misma no elimina el riesgo, ni la responsabilidad de realizar inspecciones periódicas de seguridad de acuerdo a lo establecido en los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UT CORREDORES VERDES 2025.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar la señalización y demarcación, dando cumplimiento a la resolución 2400 del 22 de mayo de 1979, por medio de la definición clara de necesidades que permitan la delimitación e identificación de áreas o zonas de posibles riesgos, encaminando las intervenciones a la disminución de la potencialidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Dar a conocer a la empresa herramientas que permitan facilitar la identificación de necesidades de señalización y demarcación por medio de un completo reconocimiento de los procesos productivos.
- A partir de las necesidades identificadas, proponer la implementación de la señalización y demarcación de áreas, zonas de trabajo y/o vías de circulación, dando a conocer a forma y los colores y símbolos utilizados y recomendados para la prevención de accidentes de trabajo.
- Identificar las necesidades de señalización y demarcación de acuerdo a los riesgos de exposición en las diferentes áreas de trabajo.

3. MARCO LEGAL

La legislación colombiana establece algunas normas generales de demarcación y señalización de áreas o zonas de trabajo, en empresas con actividades económicas y procesos de producción que puedan generar alguna clase de riesgo a la salud e integridad de la población trabajadora.

En la tabla 1 se presenta un resumen de la normatividad sobre señalización y demarcación.

Tabla 1 MARCO LEGAL SOBRE SEÑALIZACIÓN

NORMAS LEGALES	DISPOSICIÓN
Resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17).	Entre las principales actividades de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra: "Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes".
Res. 2400 de 1979 **Título V. Artículo 202. Código de colores.**	"En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y/o procesos que integren aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías etc. y demás instalaciones locativas necesarias para su funcionamiento se utilizarán los colores básicos recomendados por la **AMERICAN STANDARS ASSOCIATION (A.S.A)** y otros colores específicos, para identificar los elementos, materiales, etc., y demás elementos específicos que determinen o prevengan riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales".

Teniendo en cuenta lo anterior y otra reglamentación vigente, se pueden definir las siguientes responsabilidades del empleador frente a la señalización y demarcación:

- Establecer las medidas necesarias para asegurar que las señales y la aplicación del color para propósitos de seguridad e higiene.
- Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización indicados en el apartado anterior.
- Ubicar las señales de seguridad de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas y evitar que sean obstruidas.

Así mismo, los trabajadores deben comprometerse a:

- Participar en las actividades de formación
- Respetar y aplicar las instrucciones de los elementos de señalización y demarcación establecidos por el empleador.

4. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

4.1. Generalidades

La señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar. La señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de personas y bienes.

Para que la señalización preventiva atienda a los objetivos propuestos y sea realmente efectiva, debe cumplir con unas características elementales, entre las que se destacan:

- Atraer la atención de quien la observa
- Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad
- Informar sobre la conducta a seguir
- Ser clara y de interpretación única
- Permitir a quien la observe crear la necesidad de cumplir con lo indicado

La señalización nunca elimina un riesgo, solamente lo resalta. Por lo tanto, nunca da seguridad efectiva o real. Debe emplearse como técnica complementaria de las medidas de control, con buen criterio y sentido común para que no pierda su efecto

preventivo; la utilización incorrecta puede eliminar su eficacia. Por lo anterior, es conveniente utilizarla sólo en los siguientes casos:

- Cuando no es posible eliminar el riesgo
- Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista (altas temperaturas, alta tensión, pintura fresca, cemento fresco, etc.)
- Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección
- Como complemento a la protección ofrecida para resguardos, dispositivos de seguridad y protección personal.

4.2. CLASES DE SEÑALIZACIÓN

La señalización, empleada como técnica de seguridad, se puede clasificar en función del sentido por el cual se percibe:

Señalización óptica: Es el sistema de señalización que se basa en la apreciación de las formas y los colores por medio del sentido de la vista. Incluye:

- Señales de seguridad
- Colores de señalización
- Iluminación de emergencia

Señalización acústica: Se basa principalmente en la emisión de ondas sonoras que son recibidas por el oído en forma instantánea (alarmas, timbres, altavoces, etc.) y que, de acuerdo a códigos conocidos, informa de un determinado mensaje a las personas. Se usa principalmente para dar a conocer diferentes tipos de alerta en la empresa, en casos de emergencia.

Señalización Olfativa: Utiliza las propiedades odorantes que poseen ciertos productos para estimular las neuronas olfativas, a fin de combinarlos con otros productos determinados y poderlos detectar. Por eje
mplo al gas natural inoloro se le agrega un producto oloroso con el fin de ser detectado en caso de fuga.

Señalización Táctil: Se basa en las diferentes sensaciones experimentadas cuando se toca algo con cualquier parte del cuerpo. Aunque en general no está contemplada en la legislación, debido a su importancia se contempla en el diseño de los órganos de mando, herramientas y objetos manuales.

4.3. SEÑALES DE SEGURIDAD

Son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo o pictograma, con un significado determinado en relación con la información que se quiere comunicar de forma simple y rápida. Es el método de señalización más ampliamente usado. Según su significado, las señales se clasifican en:

- **DE PROHIBICION**: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
- **DE OBLIGACION:** Obligan a un comportamiento determinado.
- **DE PREVENCION:** Advierten de un peligro.
- **DE INFORMACION:** Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad, emergencias (salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros auxilios o de dispositivos de emergencia, etc.) o equipos contra incendio.

Los colores básicos empleados en las señales de seguridad se encuentran definidos y unificados por la norma ICONTEC 1461. Su significado se relaciona en la tabla 2.

Tabla 2 SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD

Color	Significado	Ejemplos de aplicación
ROJO	Prohibición Lucha contra incendios	Señales de prohibición Equipos contra incendio: Señalización, localización
AZUL *	Obligación	Uso obligatorio de elementos de protección personal
AMARILLO	Precaución Zona de riesgo	Señalización de riesgos Señalización de umbrales, pasillos de poca altura, obstáculos, etc.
VERDE	Condición de seguridad Primeros auxilios	Señalización de vías y salidas de emergencia Duchas de emergencia Puestos de primeros auxilios

* El azul se considera color de seguridad solo cuando se usa en forma circular

En las tablas 3, 4, 5, 6, y 7 se dan algunos ejemplos de las señales más comúnmente empleadas.

Tabla 3 SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Indicación	Contenido de imagen del símbolo	Símbolo
Prohibido fumar	Cigarrillo encendido	
Prohibido el paso	Silueta humana caminando	
Prohibido usar agua como agente extintor	Agua cayendo sobre el fuego	

Tabla 4 SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Indicación	Contenido de imagen del símbolo	Símbolo
Uso obligatorio de casco	Cabeza portando casco	
Uso obligatorio de protección auditiva	Cabeza llevando elementos de protección auditiva	
Uso obligatorio de protección ocular	Cabeza llevando anteojos de seguridad	

Uso obligatorio de calzado de seguridad	Un zapato de seguridad	
Uso obligatorio de guantes de seguridad	Un par de guantes	

Tabla 5 SEÑALES DE PREVENCIÓN

Indicación	**Contenido de imagen del símbolo**	**Símbolo**
Prevención general, precaución, riesgo de daño	Signo de admiración	
Precaución riesgo de intoxicación	Calavera y huesos cruzados	
Precaución, riesgo de incendio	Llama	
Precaución, riesgo de corrosión	Líquido goteando sobre una mano y una barra	
Precaución materiales oxidantes y comburentes	Corona circular con una flama	

Precaución, riesgo de explosión	Bomba estallando	
Precaución, riesgo de choque eléctrico	Flecha cortada en posición vertical hacia abajo	

Tabla 6 SEÑALES DE INFORMACIÓN

Indicación	**Contenido de imagen del símbolo**	**Símbolo**
Ubicación de extintor	Silueta de un extintor con flecha direccional	
Ubicación de salida de emergencia	Silueta humana avanzando hacia una salida de emergencia indicando con flecha direccional el sentido requerido	
Ubicación de estaciones y botiquín de primeros auxilios	Cruz y flecha direccional	
Ubicación de áreas y oficinas administrativas	Texto indicativo del nombre de la dependencia y número de oficina	

Tabla 7 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Indicación	**Contenido de imagen del símbolo**	**Símbolo**

Ubicación de Líquido Inflamable	Flama sobre barra horizontal	
Ubicación sustancias corrosivas	Líquido goteando sobre una mano y una barra	
Ubicación Gas Inflamable	Flama sobre barra horizontal	
Ubicación sólido Inflamable	Flama sobre barra horizontal. Barras rojas y blancas verticales	

La señalización para identificación de productos químicos se utilizará para indicar las zonas de almacenamiento. Aeronáutica Civil no rotulara cada uno de los contenedores o envases del producto químico, ya que esa responsabilidad corresponde al proveedor del producto.

Tabla 8 DIMENSIONES Y MATERIALES

DIMENSIONES (cm)		MATERIAL	
CUADRADA*	RECTANGULAR*	USO INTERIOR	USO EXTERIOR
22 X 22	20 X 40	Polietileno (calibre 40 o 1 mm)	Hojalata (Electrolítica calibre 0.18) Ó Polietileno (calibre 40 o 1 mm)

*La forma de la señal a utilizar se podrá elegir según las necesidades específicas de visualización y ubicación.

Para las áreas de almacenamiento de productos químicos se utilizará la forma de cuadrado teniendo en cuenta las características anotadas en la **tabla 7**

4.4. COLORES DE SEÑALIZACIÓN (DEMARCACIÓN)

El campo de la señalización por medio del color no queda restringido al uso de señales o avisos de seguridad, sino que puede emplearse para identificar algo sin necesidad de leyendas o para resaltar o indicar cualquier cosa.

Además de los colores y usos mencionados anteriormente (tabla 2), la Resolución 2400 de 1979 establece el código de colores presentado en la **tabla 9.**

Tabla 9 CÓDIGO DE COLORES

Color	Significado	Ejemplos
ROJO	Señala elementos y equipos de protección contra el fuego, recipientes comunes y de seguridad para el almacenamiento de toda clase de líquidos inflamables, mecanismos de parada	Hidrantes y tubería de alimentación de los mismos, cajas para mangueras, paradas de emergencia
AMARILLO	Señala áreas o zonas de trabajo, almacenamiento, áreas libres frente a equipos de incendios, puertas bajas, vigas, grúas de taller y equipos utilizados para transporte y movilización de materiales, etc.	áreas de maquinaria, Plantas de energía eléctrica , objetos sobresalientes, riesgos de caída.
NARANJA	Señala partes peligrosas de maquinaria, que puedan cortar, golpear, prensar, etc.	Bordes, expuestos de piñones, engranajes, poleas, rodillos, mecanismos de corte, entre otras.
BLANCO	Demarcación de zonas de circulación, indicación en el piso de recipientes de basura	Dirección o sentido de una circulación o vía.
ALUMINIO	Señala superficies metálicas expuestas a radiación solar y altas temperaturas	Cilindros de gas propano, tapas de hornos

GRIS	Señala recipientes para basuras, armarios y soportes para elementos de aseo.	Retales, desperdicios, lockers.
MARFIL	Partes móviles de maquinaria, bordes del área |de operación en maquinaria	Volantes de operación manual, brazos de palanca; marcos de tableros y carteleras
PURPURA	Señala los riesgos de radiación	Recipientes que contengan materiales radiactivos, equipo contaminado, rayos X, etc.
AZUL	Obligación Indicaciones	Uso obligatorio de elementos de protección personal. Localización de teléfono, talleres, etc.

4.5. **BALIZAMIENTO**

Consiste en la delimitación de una zona de trabajo para evitar el paso de personal. Esto puede efectuarse por varios métodos, como los siguientes:

- Banderolas, banderas o estandartes, generalmente en plástico e impresas con pintura reflectante. Deben tener el color de seguridad correspondiente a lo que se quiere indicar, con figuras o leyendas en el color de contraste.
- Barandillas o barreras: Estructuras apoyadas sobre el piso, a las que van unidos elementos horizontales que impiden el paso. Normalmente van pintadas en amarillo y negro.
- Cintas de delimitación: Son cintas plásticas que se colocan sobre varas o elementos clavados en el suelo para delimitar una zona.
- Luces: Consiste en la delimitación de áreas mediante un circuito de lámparas fijas o intermitentes.

4.6. **SEÑALIZACION VIAL**

Corresponde a los dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta como deben circular los usuarios de las calles o carreteras. Los mensajes de las señales de tránsito se dan por medio de símbolos y/o leyendas de fácil y rápida interpretación.

Su función es indicar al usuario de las vías las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones en los tramos de circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas de la vía. Sirven para:

- ✓ Advertir la existencia de posibles peligros;
- ✓ Dar a conocer determinadas restricciones;
- ✓ Indicar en forma concisa ciertas disposiciones legales;
- ✓ Determinar el derecho de paso de los vehículos y el sentido de las vías; y
- ✓ Ayudar a los peatones para atravesar las vías.

Las señales de tránsito deben ser refractivas o estar convenientemente iluminadas, para garantizar su visibilidad en las horas de oscuridad. La reflectividad puede lograrse cubriendo las señales con pinturas o materiales adecuados que reflejen las luces de los vehículos sin deslumbrar al conductor. La iluminación puede ser directa o indirecta; en el primer caso, la señal posee iluminación interna, mientras que en el segundo está iluminada por luces interiores.

4.7. CLASIFICACIÓN: Según la función que desempeñan, los dispositivos se clasifican en tres categorías:

4.8. SEÑALES DE PREVENCIÓN O PREVENTIVAS: Tienen por objeto advertir al trabajador de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta, todas las señales de prevención excepto la de paso a nivel de ferrocarril tienen forma cuadrada, esquinas redondeadas, fondo color amarillo, leyendas y bordes negros, Su empleo en las empresas depende de las características de las vías y de las instalaciones.

4.9. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN O REGLAMENTARIAS: Su objetivo es indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso, la mayoría de las señales de reglamentación son circulares, con fondo blanco, borde rojo y leyenda o símbolo negro. Si la señal está cruzada por una barra roja, la restricción consiste en una prohibición completa.

Las más usadas a nivel empresarial son:

Tabla 10 SEÑALIZACIÓN VIAL

SEÑAL	INDICACION	SIMBOLO

Altura máxima	Se emplea para notificar la altura máxima permitida para la entrada de vehículo por debajo de canopy	
Prohibido Parquear	Se emplea para notificar que en esa zona está prohibido parquear. Debe colocarse en todo lugar donde no esté permitido estacionar, puede ir pintado en el piso o aviso visible en la pared o de forma vertical.	
Prohibido Tocar la bocina	Se usa para notificar que está prohibido el uso de la bocina, esperar su turno para ser atendido sin causar contaminación auditiva.	
Velocidad máxima permitida	Indica la velocidad máxima a la cual se debe circular dentro de la estación de servicio y, expresada en kilómetros por hora.	
Sentido de circulación	Se emplea para notificar el sentido único de circulación en la vía a la cual se va a entrar o interceptar.	

Si se requiere un color de contraste para un color de seguridad, se debe usar el indicado en la tabla 3.

Tabla 11 COLORES DE CONTRASTE


COLOR	COLOR DE CONTRASTE
Rojo	Blanco

Azul	Blanco
Amarillo	Negro
Verde	Blanco

* El color de contraste para blanco será negro y para negro será blanco

Debido a los problemas que tienen algunas personas para percibir ciertos colores, se emplean formas geométricas a las cuales se les asignan algunos significados, tal como se aprecia en la tabla 4.

Tabla 12 FORMA GEOMÉTRICA, COLOR Y SIGNIFICADO.

Forma / **Color**	**Círculo*** 	**Triángulo** 	**Cuadrado o rectángulo** 
ROJO	Prohibición		Equipos de lucha contra incendios
AMARILLO		Prevención	
VERDE			Situación de seguridad Salidas de emergencia Primeros auxilios
AZUL	Obligación, acción de mando		Información o instrucciones Otras indicaciones

* Cuando el círculo se utilice en señales de prohibición, tendrá una línea oblicua de color rojo.

El tamaño de las señales depende de la distancia desde la cual debe observarse, según la expresión

$$S \geq \frac{L^2}{2000}$$

en la que S representa la superficie de la señal en metros cuadrados y L la distancia en metros desde la cual debe verse la señal. La tabla 9 presenta el tamaño recomendado de las señales, de acuerdo a la distancia desde la cual debe poderse observar.

Tabla 13 TAMAÑO DE LAS SEÑALES Y DISTANCIA MÁXIMA DE OBSERVACIÓN SEGÚN SU FORMA

Dimensión en mm	**Distancia máxima (en metros) según la forma**		
Diámetro o lado mayor	Triángulo	Círculo	Cuadrado - Rectángulo
1189	34.98	49.73	53.17
841	24.74	35.18	37.61
594	17.48	24.85	26.56
420	12.36	17.57	18.78
297	8.74	12.42	13.28
210	6.18	8.78	9.39
148	4.36	6.19	6.62
105	3.09	4.39	4.7

5. DEMARCACIÓN

Se entiende por áreas de trabajo todas las instalaciones comprendidas en el espacio utilizado por una empresa para el desarrollo de una actividad específica ; la eficacia y seguridad en las operaciones mejoran notablemente con una planificación cuidadosa de la ubicación y distribución de los diferentes sitios como : bodegas, maquinaria, almacenamiento, circulación entre otros ; los factores principales que determinan las dimensiones, forma y tipo de las estructuras son la naturaleza de los procesos y materiales, el equipo de manipulación y las condiciones de trabajo. (No se permiten espacios entre maquinas o equipos, o entre estos y muros, paredes u otros objetos estacionarios menores de 40cms de ancho. Resolución 2400 –79 Art. 281).

5.1. Dimensiones de la demarcación

- Áreas de trabajo: Franja de 5 centímetros de ancho.
- Demarcación de áreas libres frente a equipos de control de incendios: Semicírculos de 50 centímetros de radio y franja de 5 centímetros de ancho.
- Indicación de recipientes de basura: Un metro cuadrado por caneca.

5.2. EVALUACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Cuando se proyecta una instalación y distribución de áreas operativas hay que tener en cuenta los siguientes aspectos con el fin de identificar la necesidad de señalización a ubicar y demarcación a utilizar. (El espacio que se debe tener entre maquinas, equipos o muros es de 40cms de ancho. Ver Resolución 2400 –79 Articulo 281).

- Salidas y puertas de acceso y de emergencia.
- Pisos, pasillos, tipos de escaleras, rampas y plataformas.
- Locales e instalaciones para almacenamiento incluyendo los necesarios para materiales explosivos e inflamables y sustancias peligrosas.
- Equipo de manipulación de materiales: Grúas, transportadores, vehículos industriales (montacargas y ascensores).
- Calderas y otros equipos que trabajen a presión.
- Redes de tuberías para el transporte de sustancias sólidas, liquidas y gaseosas.

5.3. VÍAS DE CIRCULACIÓN

Dentro de las instalaciones de un local existen áreas de circulación tanto del personal como de vehículos de carga, donde se debe proteger a estos, instalando barandas o barreras firmes pintadas de color amarillo y negro a una distancia mínima de 60 cms de las maquinas o partes móviles de las mismas para impedir el acceso directo al igual se debe pintar sobre el piso con franjas de color amarillo de 10 cms de ancho en línea continua.

5.4. PARQUEADEROS

Para reducir el tráfico en los terrenos de la empresa, se deben adaptar zonas especiales de parqueo que deben estar definidas, delimitadas, pavimentadas y en perfectas condiciones.

Estos sitios de parqueo deben ser demarcados con líneas amarillas pintadas en el suelo, teniendo en cuenta las dimensiones de parqueo para automóviles las cuales deben ser como mínimo de 2.75 m. de ancho por 6 m. de largo.

Como medida de seguridad los vehículos se deben parquear en reverso para facilitar su movilización es casos de urgencias o emergencia.

El campo de la señalización por medio del color no queda restringido al uso de señales o avisos de seguridad, sino que puede emplearse para identificar algo sin necesidad de leyendas o para resaltar o indicar cualquier cosa.

Además de los colores y usos mencionados anteriormente (tabla 2), la Resolución 2400 de 1979 establece el código de colores presentado en la tabla 10.

5.5. IDENTIFICACION DE TUBERÍAS

Tanto la Resolución 2400 de 1979 como la norma técnica colombiana NTC 3458 establecen códigos de colores para la identificación de tuberías en instalaciones industriales. Teniendo en cuenta que esta última es más amplia en la definición de especificaciones, las recomendaciones que aparecen a continuación corresponden a la misma.

5.5.1 Colores de identificación: **Deben de estar de acuerdo con la tabla 9**

Tabla 14 COLORES DE IDENTIFICACIÓN PARA TUBERÍAS

Contenido de la tubería	Color
Agua Potable	**VERDE**
Aguas Negras	NEGRO
Agua Sistema contra Incendio	ROJO
Instalaciones Telefónicas	GRIS
Instalaciones Eléctricas	NARANJA
Red Transmisión de Datos	AZUL OSCURO
Líquidos Combustibles	AMARILLO
Aire	AZUL CLARO
Conductos de ventilación	BLANCO

ANEXO 12. PLAN DE EMERGENCIA

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 GENERALIDADES 5

3 MARCO CONCEPTUAL 6

4 MARCO LEGAL 10

5 OBJETIVOS 14

5.1 Objetivo General 14

5.2 Objetivos Específicos 14

6 ALCANCE 15

7 PRIORIDADES DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO 15

7.1 Personas 15

7.2 Medio Ambiente 16

7.3 Equipos y elementos a proteger 16

8 IDENTIFICACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 . 16

8.1 Descripción de instalaciones locativas 16

8.2 Características físicas 17

8.2.1 Área total de UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 17

8.2.2 Elementos estructurales 17

8.2.3 Carga Ocupacional 17

8.2.4 Descripción de la Ocupación 18

9 INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 18

10 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 21

10.1 Identificación, Descripción y Análisis de las Amenazas 21

10.2 Análisis de Vulnerabilidad 24

10.2.1 Calificación de las variables 24

10.2.2 Calificación de la vulnerabilidad 25
10.2.3 Vulnerabilidad 25
10.3 Consolidado Análisis de Vulnerabilidad 28
10.4 Clasificación Nivel De Riesgo Amenazas 29
10.4.1 Priorización de Amenazas 32
11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA 32
11.1 Niveles de Respuesta, Funciones y Responsabilidades 35
11.2 Esquema de Mando Durante las Emergencias 35
11.3 Soporte Administrativo: Brigada De Emergencias 36
11.3.1 Soporte Operativo: Brigada de Emergencias 38
11.3.2 Funciones generales de la brigada de emergencias 38
12 PLAN DE EVACUACIÓN 40
12.1 Objetivos 40
12.2 Alarmas 41
12.3 Responsable de activar la Alarma 41
12.4 Frecuencia de Instrucción 42
12.5 Fases del Proceso de Alarma 42
12.5.1 Primera Fase: Detección de la Emergencia 42
12.5.2 Segunda Fase: Alarma 42
12.5.3 Tercera Fase: Preparación de la Evacuación 43
12.5.4 Cuarta Fase: Salida del Personal 43
12.6 Procedimiento General para Evacuar las Instalaciones 43
12.7 Procedimiento para Coordinadores de Evacuación 45
12.7.1 Funciones y Responsabilidades de los Coordinadores de Evacuación 45
12.8 Punto de Encuentro 46
12.9 Evacuación de Heridos 46
12.10 Reconteo de Personal 47
12.11 Protección de Documentos de Interés 47
12.12 Restablecimiento de Actividades 47

13 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 48

13.1 Casos positivos y sospechosos 48

13.1.1 Reporte de casos 48

14 PLANES OPERATIVOS 48

Procedimientos Operativos Normalizados 49

14.1 Instrucciones de Convivencia con una persona de alto riesgo 49

14.2 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Movimiento Sísmico 50

14.3 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Incendio 51

14.4 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Explosión 52

14.5 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Evacuación 53

14.6 Otros PON Complementarios 54

15 PLAN DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN 65

15.1 Divulgación Del Plan De Emergencias 66

16 CONTACTOS DE EMERGENCIA Y APOYO 66

17 SIMULACROS 67

17.1 Objetivos 67

17.2 Clasificación de los Simulacros 68

17.3 Planeación de la actividad 68

17.4 Ejecución de la actividad 69

17.5 Evaluación de la actividad 69

17.6 Seguimiento y control 70

18 EL PLAN DE EMERGENCIA MÉDICO (PAEMED) 70

18.1 Objetivo 71

18.2 Clasificación 71

18.3 Responsabilidades y Funciones 72

18.4 Coordinación General del PAEMED 73

18.5 Directores, subdirectores o Jefe de Área 73
18.6 Brigada De Emergencias (Primeros Auxilios) 74
18.7 Grupo de Seguridad Física 75
18.8 Personal General de la empresa 75
18.9 Área de Triage 76
18.10 Rutas de Desplazamiento Interno 76
18.11 Rutas de Desplazamiento Externo 76
19 EVALUACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 76

1 INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que para la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 es importante contar con los recursos, personal competente, protocolos y estrategias adecuadas para la atención y mitigación de los peligros en situaciones de emergencia, se requiere establecer, divulgar e implementar el presente Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias; de tal manera que se propenda por la oportuna intervención antes, durante, y después de que suceda una eventual situación de emergencia.

El presente Plan de Prevención tiene alcance a todos los frentes de la obra y sus partes interesadas, con la sede ubicada en la Mz 41 Lote 3 barrio Claret. En este documento se encuentran detallados los procedimientos y estrategias que se deben implementar y atender por los trabajadores y contratistas de la empresa con el propósito de que en un evento fortuito se pueda minimizar, tanto el impacto socio-económico como la afectación individual o colectiva, salvaguardando la vida de las personas ocupantes de las instalaciones de la empresa en el momento de una emergencia.

2 GENERALIDADES

El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y sus procedimientos operativos Normalizados se encuentran disponibles a todos los trabajadores en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, su revisión y actualización será responsabilidad del responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Los procedimientos Operativos Normalizados se darán a conocer igualmente en la inducción y reinducción si aplica.

El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias se practicará mediante el desarrollo de mínimo un simulacro al año y deberá ser actualizado cada año o antes si llegase a presentarse cambios significativos en las condiciones sobre las cuales fue elaborado.

.

3 MARCO CONCEPTUAL

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias: Instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025.

Alarma: Aviso o señal preestablecido, que implica ejecutar una acción o se da para que se sigan instrucciones específicas, debido a la presencia real o inminente de un evento adverso.

Amenaza: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo determinado.

Análisis de vulnerabilidad: Es la medida o grado de debilidad de ser afectado por amenazas o riesgo según la frecuencia y severidad de los mismos. La vulnerabilidad depende de varios factores, entre otros: la posibilidad de ocurrencia del evento, la frecuencia de ocurrencia de éste, los planes y programas preventivos existentes, la posibilidad de programación anual entre otros.

Organización: Define el papel que tiene cada trabajador o grupo de trabajadores y trabajadores de la empresa para la prevención o atención de emergencias.

Planes de acción: Informa las acciones esperadas de los grupos de apoyo en los diferentes momentos de una emergencia antes, durante y después.

Procedimientos operativos normalizados: Planes específicos prefabricados para actuar en caso de que se presenten las situaciones de emergencia más probables y riesgosas dentro de cada empresa según su actividad. Su conocimiento facilita una respuesta rápida y eficiente.

PAEMED: Plan de Emergencias Médicas: Programa por medio del cual con procedimientos sencillos, claros y precisos todas las personas estarán en capacidad de responder de manera adecuada y segura ante un evento imprevisto en el cual se ven comprometidas vidas humanas.

Brigada de Emergencia: Es un grupo humano con liderazgo y formación para asumir procedimientos administrativos y operativos que han sido diseñados para prevenir o controlar una emergencia, este grupo de trabajadores especializados y equipados, cuya finalidad es minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de una emergencia para atender emergencias incipientes.

Comité Operativo de Emergencia COE: Instalación o estructura preestablecida responsable de diseñar y coordinar la ejecución de las actividades antes, durante y después de una emergencia o desastre, Para la empresa estará integrado por: El Coordinador de Evacuación, el Coordinador de Rescate y El Coordinador de Primeros Auxilios.

Coordinador de Evacuación: Son personas a las que se asignan funciones para coordinar actividades de evacuación

Control: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias.

Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

Emergencia Médica: Se denomina a toda situación que se presenta repentinamente, ocasionando perturbación, al poner en peligro la integridad física o mental de las personas.

Triage: Método utilizado para clasificar al personal accidentado de acuerdo con la severidad de la lesión (Código de colores), para determinar la prioridad de atención y el sitio al cual debe ser remitido.

Emergencia: Es toda perturbación parcial o total del sistema, que pueda poner en peligro su estabilidad y pueda requerir para su control, recursos y procedimientos

diferentes y/o superiores a los normalmente utilizados y la modificación temporal, parcial o total de la organización para poder atenderla.

Equipos para Atención de Emergencias: Equipos destinados para ser operados por los brigadistas de acuerdo al factor de riesgo.

Escenario: Descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él.

Evacuación: Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas de una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro, estableciendo una barrera (distancia) entre la fuente de riesgo y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de estas.

Impacto: Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas.

Jefe de Brigada: Es la persona asignada por el Coordinador de Emergencia para direccionar todas las actividades del grupo de apoyo interno (Brigada de Emergencias) ante cualquier emergencia.

Mitigación: Medidas tomadas con anticipación al desastre, con el ánimo de reducir o eliminar su impacto sobre la sociedad y el medio ambiente.

Prevención: Conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o evitar que sucesos naturales, tecnológicos o generados por la actividad humana, causen desastres. Son la secuencia lógica de la forma como debe actuar una persona en caso Procedimientos Operativos Normalizados para Emergencia (PONS): de emergencias, en los procedimientos operativos se establecen las directrices y se complementan con los diagramas.

Punto de Encuentro: Es un lugar amplio y libre de riesgos adecuado para recibir a todo el Personal que ha realizado la evacuación y en él se realiza el recuento o conteo para verificar que ocupantes pudieron salir con éxito y cuáles no.

PPPRAE: Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante una Emergencia.

PCN: Plan de Continuidad del Negocio

Recuperación: Actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia. Consiste en restablecer la operatividad de un sistema interferido.

Respuesta: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento humano y disminuir pérdidas.

Riesgo: Es definido como la probabilidad de ocurrencia de unas consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado, que puede perturbar la integridad física de las personas o el medio. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD

Esta expresión no es una fórmula matemática que se desarrolla con valores numéricos, solo es una expresión en la que se relacionan las variables amenaza y vulnerabilidad.

Ruta: Se entiende como ruta de evacuación, aquella que aleje a la persona que evacua de la zona de peligro en el menor tiempo posible y constituya un trayecto seguro hacia las zonas de refugio final.

Salida de Evacuación: Es la vía de salida de las instalaciones hacia el exterior proporcionando un camino protegido necesario para que los ocupantes puedan acceder con seguridad suficiente a la zona de refugio.

Sistema de Alarma: Es un sistema de comunicación que le indica al personal que debe seguir instrucciones de emergencias y estar preparados para evacuar.

Simulacro: Ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un escenario real o construido en la mejor forma posible para asemejar una emergencia en una o varias áreas para evaluar la respuesta de las personas y su capacidad de reacción, comparando los resultados obtenidos con los esperados.

Siniestro: Es un evento no deseado, no esperado, que puede producir consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro genera la emergencia, si la capacidad de respuesta de la empresa es insuficiente para controlarlo.

Vías de Evacuación: Pasillos, puertas, etc., que conducen a la salida de evacuación.

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto a sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una perdida, la diferencia de la vulnerabilidad de los elementos expuesta ante un evento determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de dicho evento sobre los mismos.

Explosión: Liberación brusca de una gran cantidad de energía con desprendimiento de calor, luz y gases.

Incendio: Fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas ya sea de vidas o de bienes valores.

Movimiento Sísmico: El rozamiento entre placas tectónicas ocasionando una enorme acumulación de energía, este proceso lento provoca fuertes deformaciones en rocas al interior de la tierra, las cuales, al romperse, hacen que la energía acumulada se libere de repente en forma de ondas y sacuda la superficie terrestre.

Nivel de Riesgo: Calificación relativa de un riesgo en función de la combinación de la amenaza por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo.

Primeros Auxilios: Son aquellas medidas o cuidados adecuados que se ponen en práctica en forma profesional, tan pronto se reconoce una emergencia y antes de su atención.

Probable: Amenaza que según su diagnóstico ya ha ocurrido bajo esas condiciones.

Partes Interesadas: Clientes, trabajadores, viajeros, Vigilantes, contratistas, arrendatarios Subcontratistas, proveedores y visitantes en general.

4 MARCO LEGAL

La legislación de Colombia en materia en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión del Riesgo establece en normas de obligatoriedad que las instituciones deben implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como organizar en sus instalaciones las brigadas de emergencias.

Entre la normatividad que hace referencia al tema podemos resaltar:

NORMA	TÍTULO
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
Ley 1523 de 2012	Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en su libro 2 parte 2 titulo 4 capitulo 6 establece los lineamientos aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 2.2.4.6.25 prevención, preparación y respuesta ante emergencia
Ley 9 Título III enero 24 de 1979 Congreso de la República	Por medio de la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
Ley 46 de 1988	“Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.”
Decreto 1400 de 1984	“Disposiciones Reglamentarias conforman el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y actualizado por la Ley 400 de 1997 y el Decreto 33 de 1998”.
Resolución 1016 de 1989	“Programa de Salud Ocupacional de empresa. Orienta la Organización y desarrollo de un Plan de Emergencias con todos sus componentes”. Artículo 11. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. Número 18. Organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas: Preventiva, Pasiva, Rama activa o control de las emergencias.
Ley 100 de 1993	“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral”.
Decreto 1295 de 1994	“Por el cual se determina la organización y

NORMA	TÍTULO
	administración del Sistema General de Riesgos Profesionales".
Ley 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos. Artículo 1	La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad.
Ley 1523 de 2012	"Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".
Ley 1562 de 2012	"Por la cual se modifica el Sistemas de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud Ocupacional."
Decreto 919 de 1989	Por el cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención de desastres y se dictan otras disposiciones. Este decreto consta de cinco capítulos en los que se plantean las actividades a realizar, los responsables de cada una de ellas y la disposición y distribución de los recursos necesarios en las situaciones de emergencia en el país.
Resolución 044 de 2014	La capacitación y entrenamiento de las Brigadas Contra incendio Industriales, Comerciales y similares debe llevarse a cabo por intermedio de las Escuelas, Academias, Departamentos o Áreas de Capacitación de los Cuerpos de Bomberos, las que han de estar debidamente reconocidos por las Secretarías de Educación y Salud Municipal o Departamental, y contar con la maquinaria, equipos y herramientas necesarias, en óptimo estado, para garantizar la capacitación y el entrenamiento."
NFPA 1071	Norma para calificaciones profesionales para miembros de brigadas industriales de incendios.

NORMA	TÍTULO
NFPA 600	Requisitos mínimos para organizar, operar y equipar una brigada.
NTC 31000/2011	Gestión de Riesgo
Guía Técnica Colombiana 202/06.	Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.
NT- 1700	Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación y código NFPA 101. Código de seguridad humana.
NTC-2885	Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. Establece en uno de sus apartes los requisitos para la inspección y mantenimiento de portátiles, igualmente el código 25 de la NFPA Standard for the inspection, testing and maintenance of Water – Based fire protection systems USA: 2002. Establece la periodicidad y pruebas que se deben realizar sobre cada una de las partes componentes de un sistema hidráulico contra incendio.
NTC-4764	Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales
NTC-4140	Edificios. Pasillos y corredores
NTC-4143	Edificios. Rampas fijas
NTC-4144	Edificios. Señalización
NTC-4145	Edificios. Escaleras.
NTC-4201	Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas
NTC-4279	Vías de circulación peatonal planas
NTC-4695	Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano.
NTC-2388	Símbolos para la información del público
NTC-1867	Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos
Resolución 666 del 24 de abril de 2020	Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19
Resolución 777 de	Por medio de la cual se definen los criterios y

NORMA	TÍTULO
2021	condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.
Resolución 0350 del 01 de marzo del 2022	Por medio del cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas".

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Establecer una estructura de respuesta ante cualquier emergencia e implementar un esquema administrativo y operativo de la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 que permita prevenir y controlar eventos de tipo catastrófico provocados por emergencias o desastres naturales o antrópicos mediante el desarrollo de un esquema organizado y documentado para su intervención, además de la protección de los bienes y activos, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

5.2 Objetivos Específicos

1. Analizar la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en que pueda estar involucrada la empresa, frente a las amenazas identificadas.
2. Valorar y evaluar los riesgos teniendo en cuenta a la comunidad, los bienes y servicios de la empresa.
3. Elaborar y establecer los procedimientos operativos normalizados de atención que permitan una eficaz actuación en emergencias.
4. Definir las funciones, responsabilidades y formas de actuar de todas las partes involucradas en el control de emergencias de UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025para dar respuesta oportuna y eficaz a las emergencias.
5. Evaluar a través del simulacro los procedimientos operativos normalizados y la implementación del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias.

6. Informar, capacitar y entrenar a los miembros de la brigada de emergencia de UNIÓN TEMPROAL CORREDORES VERDES 2025, y el personal en general en los temas específicos de atención a emergencias.
7. Gestionar los recursos necesarios para la implementación del plan de emergencias.
8. Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, previsión, mitigación, preparación, atención y recuperación en caso de desastres.

6 ALCANCE

El presente Plan de Emergencia aplica para la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 en su operación diaria durante las horas laborales e involucra a todo tipo de personal propio y flotante de la empresa que ocupe las edificaciones: trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes, usuarios regulares y esporádicos que en el momento de una emergencia se encuentren dentro de las instalaciones, así mismo este documento aplica para todos los procesos y áreas de la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025, con sede de Cúcuta en la Mz 41 Lote 3 barrio Claret.

Dada la importancia de las acciones establecidas en el presente documento en caso de presentarse una situación de emergencia real o potencial dentro de la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025, su conocimiento, divulgación y aplicación se considera obligatorio por todas las partes interesadas.

7 PRIORIDADES DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO

7.1 Personas

Como primera prioridad de protección y salvamento, se tiene a las personas, así:

- Niños
- Clientes
- Visitantes
- Trabajadores
- Contratistas
- Afectados de áreas cercanas y comunes de la zona.

7.2 Medio Ambiente

Todas las actividades adelantadas para la prevención y atención de emergencias y contingencias se desarrollarán atendiendo a la conservación o mínima afectación del entorno ambiental, así:

- Evacuar y/o proteger los equipos y elementos que puedan contaminar el ambiente.
- Disminuir el impacto ambiental que pueda generar la emergencia, por medio de intervenciones de recuperación ambiental, reposición de entes afectados y mitigación posterior de efectos.

7.3 Equipos y elementos a proteger

Los equipos propios de la labor deberán ser recuperados en el evento posterior inmediato a la emergencia, y de ser posible se protegerán durante la ocurrencia del evento.

Estos se han dividido en dos grandes grupos:

- Equipos de cómputo y archivos de documentos importantes.
- Equipos y elementos para atención de emergencias: Como botiquines, camillas, etc.
- Equipos que se empleen para la prestación del servicio.

8 IDENTIFICACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

8.1 Descripción de instalaciones locativas

Nombre:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
NIT:	902018300-6
Actividad económica	Servicio de apoyo a la silvicultura
Departamento:	Norte de Santander
Municipio:	Cúcuta
Dirección:	Manzana 41 Lote 3 barrio Claret
Horario de trabajo	8:00 a.m de 12 pm y de 2:00 p.m a 6:00 p.m lunes a viernes y sábados de 8:00 a.m a 12:00 a.m
Representante legal:	Edison Ramiro Castro Hernandez
Teléfonos:	3022726357
Correo electrónico:	Corredoresverdes2025@gmail.com

Nombre:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
NIT:	902018300-6
Actividad económica	Servicio de apoyo a la silvicultura
Departamento:	Norte de Santander
Municipio:	Cúcuta
Dirección:	Frentes, avenida libertadores
Horario de trabajo	9:00 a.m de 01 pm y de 2:00 p.m a 5:00 p.m lunes a viernes y sábados de 9:00 a.m a 01:00 p.m
Representante legal:	Edison Ramiro Castro Hernandez
Teléfonos:	3022726357
Correo electrónico:	Corredoresverdes2025@gmail.com

8.2 Características físicas

Las instalaciones se encuentran ubicadas en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, cuenta con dos plantas. Igualmente se cuenta con baño, cocina y las áreas de administrativas

8.2.1 Área total de ***UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025***

160 m^2 de área total.

8.2.2 Elementos estructurales

DETALLE	DESCRIPCION
FACHADA	la fachada está ubicada sobre la Manzana 41 Lote 3 barrio Claret la cual está construida en ladrillo y concreto, pintura Blanca, pañete un portón de metal color plateado.

8.2.3 Carga Ocupacional

Las instalaciones están distribuidas en el área administrativa y operativas la planta de personal de la empresa estará conformada por los trabajadores y posibles contratistas de prestación de servicios.

8.2.4 Descripción de la Ocupación

La ocupación de las instalaciones de UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025, está dada por el personal que en primera instancia trabaja en las instalaciones de la empresa, y otro grupo que está conformado por trabajadores que se encuentran en los diferentes frentes de trabajo.

El resto de la ocupación se relaciona al personal que visita las instalaciones por diferentes motivos. En determinado momento pueden ingresar personas con limitaciones físicas.

9 INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

RECURSOS	SI	NO	OBSERVACIONES
HUMANOS			
Existe comité de emergencia		X	
Tiene funciones asignadas		X	
Existen Brigadas de Emergencia	X		
Capacitada en primeros auxilios	X		
Capacitada en simulacro contraincendios y manejo de extintores.	X		
Capacitada contra siniestros	X		
Capacitada en evacuación	X		
Tiene dotación		X	
Existen otros grupos de apoyo			
De vigilancia		X	
Existe personal médico y/o paramédico		X	
Los trabajadores saben qué hacer			
Antes	X		
Durante	X		
Después de una emergencia	X		
RECURSOS	SI	NO	OBSERVACIONES

RECURSOS	SI	NO	OBSERVACIONES
FÍSICOS: Infraestructura			
La construcción es sismo resistente		X	
Hay estructuras inflamables (como papel, madera, tapetes, cortinas, etc.).	X		Archivos, muebles, material sólido como documentos contables, documentación, entre otros.
Existe:			
*Puertas contra fuego		X	
*Muros contra fuego		X	
*Barreras y diques		X	
El agua es:			
*Suministrada por el acueducto urbano	X		
*Tiene algún sistema de almacenaje		X	
La electricidad es:			
*Tomada de la red urbana	X		
*Tiene subestación interna		X	
*Tiene planta eléctrica		X	
*Combustible		X	
RECURSOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
RECURSOS			
*Almacenan combustible		X	
*Cumplen con la norma para almacenar combustibles.		N/A	
Las telecomunicaciones:			
*Tienen teléfono		X	
*Tienen otro sistema de comunicación	X		Se cuenta con el celular asignado a la empresa.
El gas es:			
*Gas natural	X		
*Gas propano		X	
Para emergencias:			
Existen salidas de emergencia	X		
RECURSOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
FÍSICOS – TÉCNICOS			

RECURSOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Extintores	X		
Hidrantes		X	
Gabinetes		X	
Red contra incendios		X	
Herramientas		X	
Dotación de Brigadas		X	
Botiquines	X		
Equipos especiales		X	
Camillas	X		
Equipos de transporte		X	
Sistemas de alarma	X		Actualmente cuentan con un pito ubicado en la empresa, y el timbre de la misma puede apoyar el sistema de alarma.
Sistemas de detección de humo.	X		
Mapa de la zona donde está la empresa	X		Pendiente actualización
Listado de empresas que puedan prestar auxilios		X	
Listado de áreas y capacidad para alojar personas.		X	
Teléfonos y números de emergencia	X		Se cuenta con la lista de números de emergencia.
Planos de la empresa con:			
*Sistemas de comunicación		X	
*Sistemas alternos de energía		X	
*Rutas de evacuación		X	
*Puntos de encuentro	X		No esta demarcado
RECURSOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
ECONÓMICOS			
Seguros para:			
Personas	X		Los trabajadores contratados directamente cuentan con el seguro de la ARL AXA COLPATRIA.
Recursos		X	
Sistemas	X		
Procesos	X		

10 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VALORACIÓN DEL RIESGO




En forma general, el análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de desestimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público. De acuerdo a las necesidades de la empresa, las amenazas más representativas son:


NATURAL	TECNOLÓGICO	SOCIAL
Movimientos Sísmicos	Incendios	Hurto
Vendavales / Caída de árboles	Explosiones	Robo
Tormentas eléctricas - Caída de rayos	Fugas	Secuestros
Inundación	Derrames	Asonadas
Lluvias torrenciales	Fallas Estructurales	Terrorismo
Vientos fuertes	Fallas en equipos y sistemas	Concentraciones masivas
Otros dependiendo de la ubicación geográfica y el clima	Intoxicaciones	Otros


10.1 Identificación, Descripción y Análisis de las Amenazas

EVENTO	COMPORTAMIENTO	COLOR ASIGNADO
Posible	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. NUNCA HA SUCEDIDO	Verde 
Probable	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. YA HA OCURRIDO	Amarillo
Inminente	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. EVIDENTE, DETECTABLE	Rojo 

A continuación, se valoran los riesgos para UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 que pueden afectar a las personas, los procesos y a la economía misma son:

AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR
Movimiento sísmico	San José de Cúcuta se encuentra ubicada sobre la falla frontal de la cordillera Oriental atravesada por las fallas Bocono y la Uribante – Caparo	PROBABLE	
Vendavales / Caída de árboles	Temporada invernal aumenta la posibilidad de vendavales, lo cual puede afectar las edificaciones por caídas de árboles y desprendimientos de las líneas de redes eléctricas.	INMINENTE	
Tormentas eléctricas - Caída de rayos	Temporada invernal Aumenta la posibilidad de tormentas eléctricas para las edificaciones aumenta el riesgo.	POSIBLE	
Inundaciones	En temporada invernal las calles se inundan por deficiencias en el alcantarillado de la ciudad.	INMINENTE	
Lluvias torrenciales	Temporada invernal aumenta la posibilidad de lluvias torrenciales que pueden afectar las edificaciones, sin embargo, las instalaciones están cerradas lo que evita que el agua se filtre o cree caos al interior.	INMINENTE	
Vientos fuertes	Temporada invernal aumenta la posibilidad de vendavales, y vientos fuertes que puede afectar las edificaciones.	POSIBLE	
Incendio Explosiones	Presencia de material combustible (papel, plásticos, maderas, cartones, sistemas eléctricos energizados). Incluso por falla con alguna herramienta o equipo.	INMINENTE	

AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR
Fugas	La empresa utiliza sistema de gas para la parte administrativa	POSIBLE	
Fallas estructurales	Deterioro de muros, ventanas y techos por el paso del tiempo.	POSIBLE	
Fallas de Equipos y Sistemas	Cortocircuito en Servidores y Equipos.	POSIBLE	
Eventos Biológicos	Cuando se manipulan productos de limpieza, el personal de servicios generales manipula residuos cuando hacen su labor.	INMINENTE	
Robo	La empresa está expuesta a sufrir robos de sus bienes, así como tiene este riesgo por el flujo de personal que tiene la parte operativa.	INMINENTE	
Hurto	La población que se mueve diario hace que esto se presente en la parte operativa y administrativa.	INMINENTE	
Terrorismo – secuestro	Situación del país, grupos al margen de la ley. Orden público.	INMINENTE	
Disturbios Civiles - Asonadas	Distintas manifestaciones de origen civil, por las actuales condiciones del sector.	INMINENTE	

AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR
Posibles atentados contra las instalaciones o integrantes de la comunidad en general.	Cualquier integrante de la empresa Administrativo, operativo.	INMINENTE	

10.2 Análisis de Vulnerabilidad


Nos permite evaluar la sensibilidad del sistema ante los diferentes riesgos de tipo colectivo que se puedan desencadenar, como son los incendios, atentados, descargas atmosféricas, sismos, etc. La calificación de la amenaza se realiza mediante colores teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente forma:

1. PERSONAS	2. RECURSOS	3. SISTEMAS Y PROCESOS
Organización	Materiales	Servicios públicos
Capacitación	Edificación	Sistemas alternos
Dotación	Equipos	Procedimientos de recuperación

10.2.1 Calificación de las variables

Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	INTERPRETACION
0	Bueno	Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los Procedimientos, entre otros.
0,5	Regular	Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los procedimientos de manera parcial, entre otros.
1	Malo	Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se realizan los procedimientos, entre otros.

10.2.2 Calificación de la vulnerabilidad

RANGO	CALIFICACION	VALOR
0.0 – 1.0	BAJA	VERDE 
1.1 – 2.0	MEDIA	AMARILLO
2.1 – 3.0	ALTA	ROJO 

10.2.3 Vulnerabilidad

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1. Organización		
Se conformara brigada de emergencias y se le asignara funciones	0	
La empresa participa y promueve activamente a los trabajadores y público en general el Plan de Prevención y Respuesta ante emergencias.	0	
Los trabajadores han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias	0	
Existe formato para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias	0	
Existe formato para realizar inspecciones a los equipos utilizados en emergencias.	0	
SUBTOTAL	1	
2. Capacitación		
Se cuenta con un programa de capacitación donde se incluyen actividades de prevención y control de emergencias	0	
Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas auto protegerse	0	

El personal de la brigada recibira entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias	0	
Esta divulgado el plan de prevención y preparación ante emergencias.	1	
Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias	1	
SUBTOTAL	0.33	
3. Dotación		
Existe dotación personal para el personal de la brigada y del comité de emergencias	1	
Se tienen implementos básicos de primeros auxilios en caso de requerirse	0.5	
Se cuenta con implementos básicos para el control de incendios tales como herramientas manuales, extintores, palas entre otros de acuerdo con las necesidades específicas y realmente necesarias para la Sede.	0	
Se cuenta con implementos básicos para el rescate de personas y bienes.	0	
SUBTOTAL	0.37	


VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1. Materiales		
Existen materiales inflamables al interior de las instalaciones	0.5	Existe material inflamable representado en solidos inflamables (papel, madera).
SUBTOTAL	0.5	
2. Edificaciones		
El tipo de construcción es sismo resistente	0	
Existen puertas y muros cortafuego.	0.5	
Las escaleras para el uso de emergencias cuentan con banda antideslizante y doble pasamanos	0	

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Existe más de una salida	0	
Existen rutas de evacuación	0	
Se cuenta con parqueaderos	0	
Están señalizadas vías de evacuación y equipos contra incendio	0	
SUBTOTAL	0.14	
3. Equipos		
Se cuenta con algún sistema de alarmas	1	
Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios	0	
Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios	0	
Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas	0	
Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia	0	
SUBTOTAL	0.25	

VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1. Servicios públicos		
Se cuenta con buen suministro de energía	0	
Se cuenta con buen suministro de agua	0	Es suministrada directamente de la Red Pública.
Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras	0	

VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Se cuenta con buen servicio de comunicaciones.	0	
SUBTOTAL	0.0	
2. Sistemas alternos		
Se cuenta con un tanque de reserva de agua	0	
Se cuenta con una planta de energía	1	
Sistema de iluminación autónoma de emergencia	0	
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física	0.5	
SUBTOTAL	0.37	
3. Recuperación		
Se cuenta con algún sistema de seguro para los trabajadores.	0	ARL – AXA COLPATRIA
Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terrorista etc.	1	
Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los expedientes medio magnético	1	
Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general	1	
SUBTOTAL	0.75	

10.3 Consolidado Análisis de Vulnerabilidad








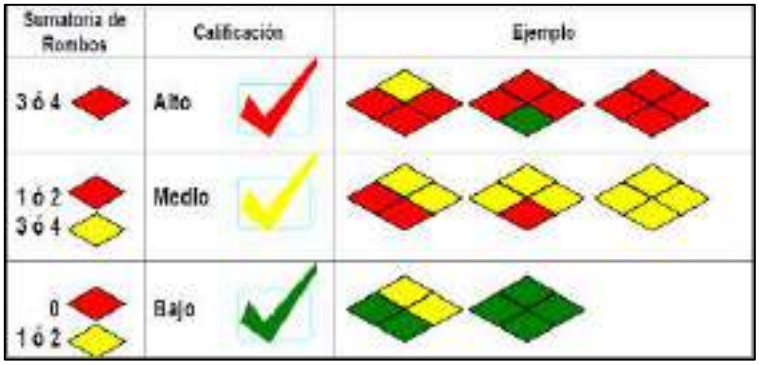










PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR		CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	COLOR
EN LAS PERSONAS		1.17	MEDIO	
Organización	1			
Capacitación	0.33			
Dotación	0.37			
EN LOS RECURSOS		0.89	BAJO	
Materiales	0.5			
Edificación	0.14			
Equipos	0.25			
SISTEMAS Y PROCESOS		1.12	MEDIO	
Servicios Públicos	0.0			
Sistemas Alternos	0.37			
Recuperación	0.75			
	BAJO 0,0 - 1,0	MEDIO 1,1 - 2,0	ALTO 2,1 - 3,0	
	POSIBLE	PROBABLE	INMINENTE	




10.4 Clasificación Nivel De Riesgo Amenazas

P = Personas / R= Recursos / A= Amenaza / SP= Sistemas y Procesos

Teniendo en cuenta la calificación y asignación de colores realizadas anteriormente tanto para las amenazas como para la vulnerabilidad, a continuación, se presenta el nivel de riesgo utilizando el diamante de riesgo para las amenazas presentes en UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 así

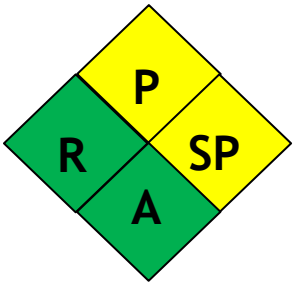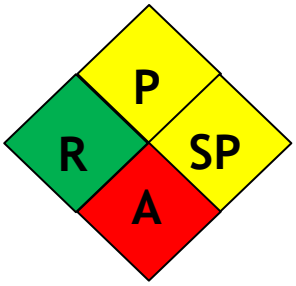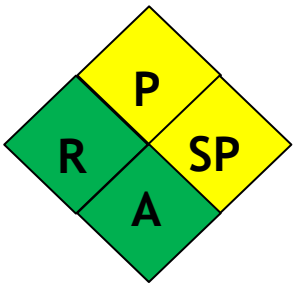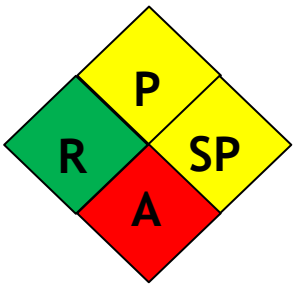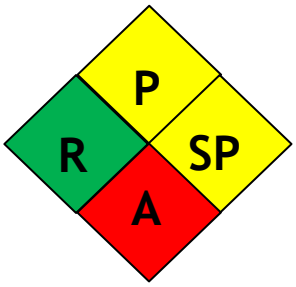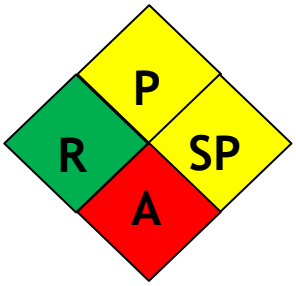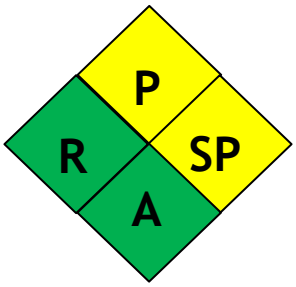AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL	AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL
Movimiento sísmico		BAJO	**Vendavales / Caída de árboles**		MEDIO
Tormentas eléctricas - Caída de rayos		BAJO	**Inundaciones**		MEDIO
Lluvias torrenciales		MEDIO	**Vientos fuertes**		BAJO
Incendio Explosiones		MEDIO	**Fugas**		BAJO

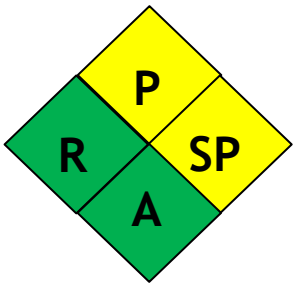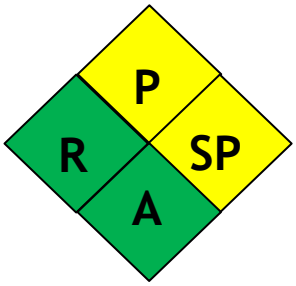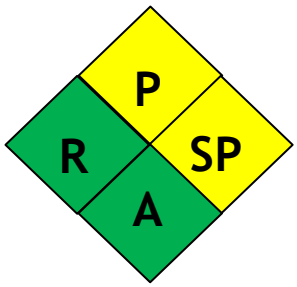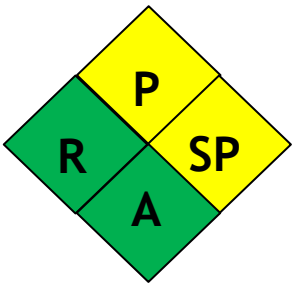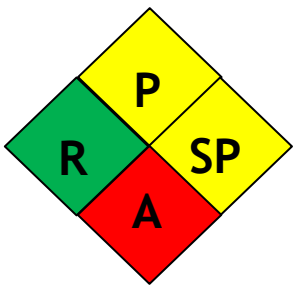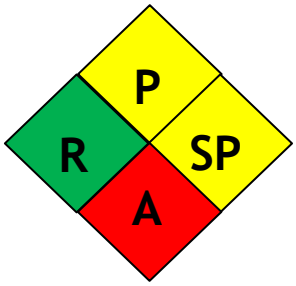AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL	AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL
Derrames		BAJO	**Fallas estructurales**		BAJO
Fallas de Equipos y Sistemas		BAJO	**Intoxicaciones**		BAJO
Eventos Biológicos		MEDIO	**Trabajos de alto riesgo**		BAJO
Robo		MEDIO	**Hurto**		MEDIO

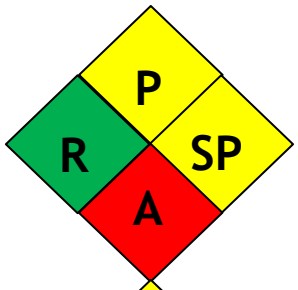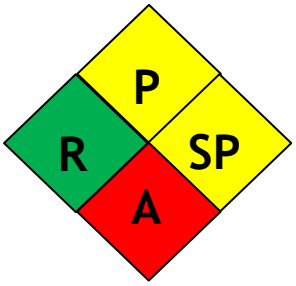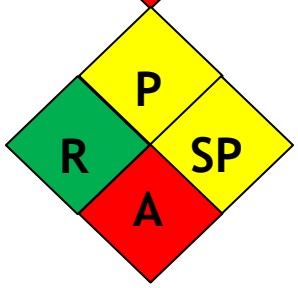AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL	AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL
Terrorismo – secuestro		MEDIO	**Disturbios Civiles - Asonadas**		MEDIO
Posibles atentados contra las instalaciones o integrantes de la Empresa		MEDIO			

10.4.1 Priorización de Amenazas

Las amenazas analizadas en Riesgo MEDIO, por lo general no dependen de la empresa, como por ejemplo las amenazas relacionadas con la zona de ubicación de la empresa por el conflicto armado o por los desastres naturales que son difícilmente prevenibles.

Mantener medidas de prevención relacionados con riesgo público en la empresa; promover el autocuidado; igualmente la empresa ha realizado acciones con los trabajadores, se requiere continuar con el reentrenamiento a la brigada, realizar la dotación de la misma. UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 se compromete a partir de la fecha al establecimiento de todas las acciones para la mejora de los procesos y la seguridad y salud de sus trabajadores.

11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA


En la prevención, preparación y atención de emergencias y contingencias de la

empresa se necesita del compromiso, liderazgo y apoyo de todos los trabajadores, teniendo en cuenta que este apoyo es la clave del éxito o fracaso de toda organización, expresándolo mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y económicos, incluso facilitando el cambio de la cultura organizacional hacia la prevención y el comportamiento seguro.


Este compromiso está reflejado en la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, mediante el cual se manifieste el alcance y el nivel de compromiso de todos los trabajadores en el tema.

En situaciones de emergencia, la empresa ha establecido funciones especiales que permitan actuar de manera eficiente y oportuna, aclarando que, ante la ocurrencia de una emergencia, esta forma organizativa, reemplaza las funciones de autoridad y la normalidad de la empresa en cuanto a roles laborales.

El siguiente es el modelo de actuación en casos generales de emergencias:

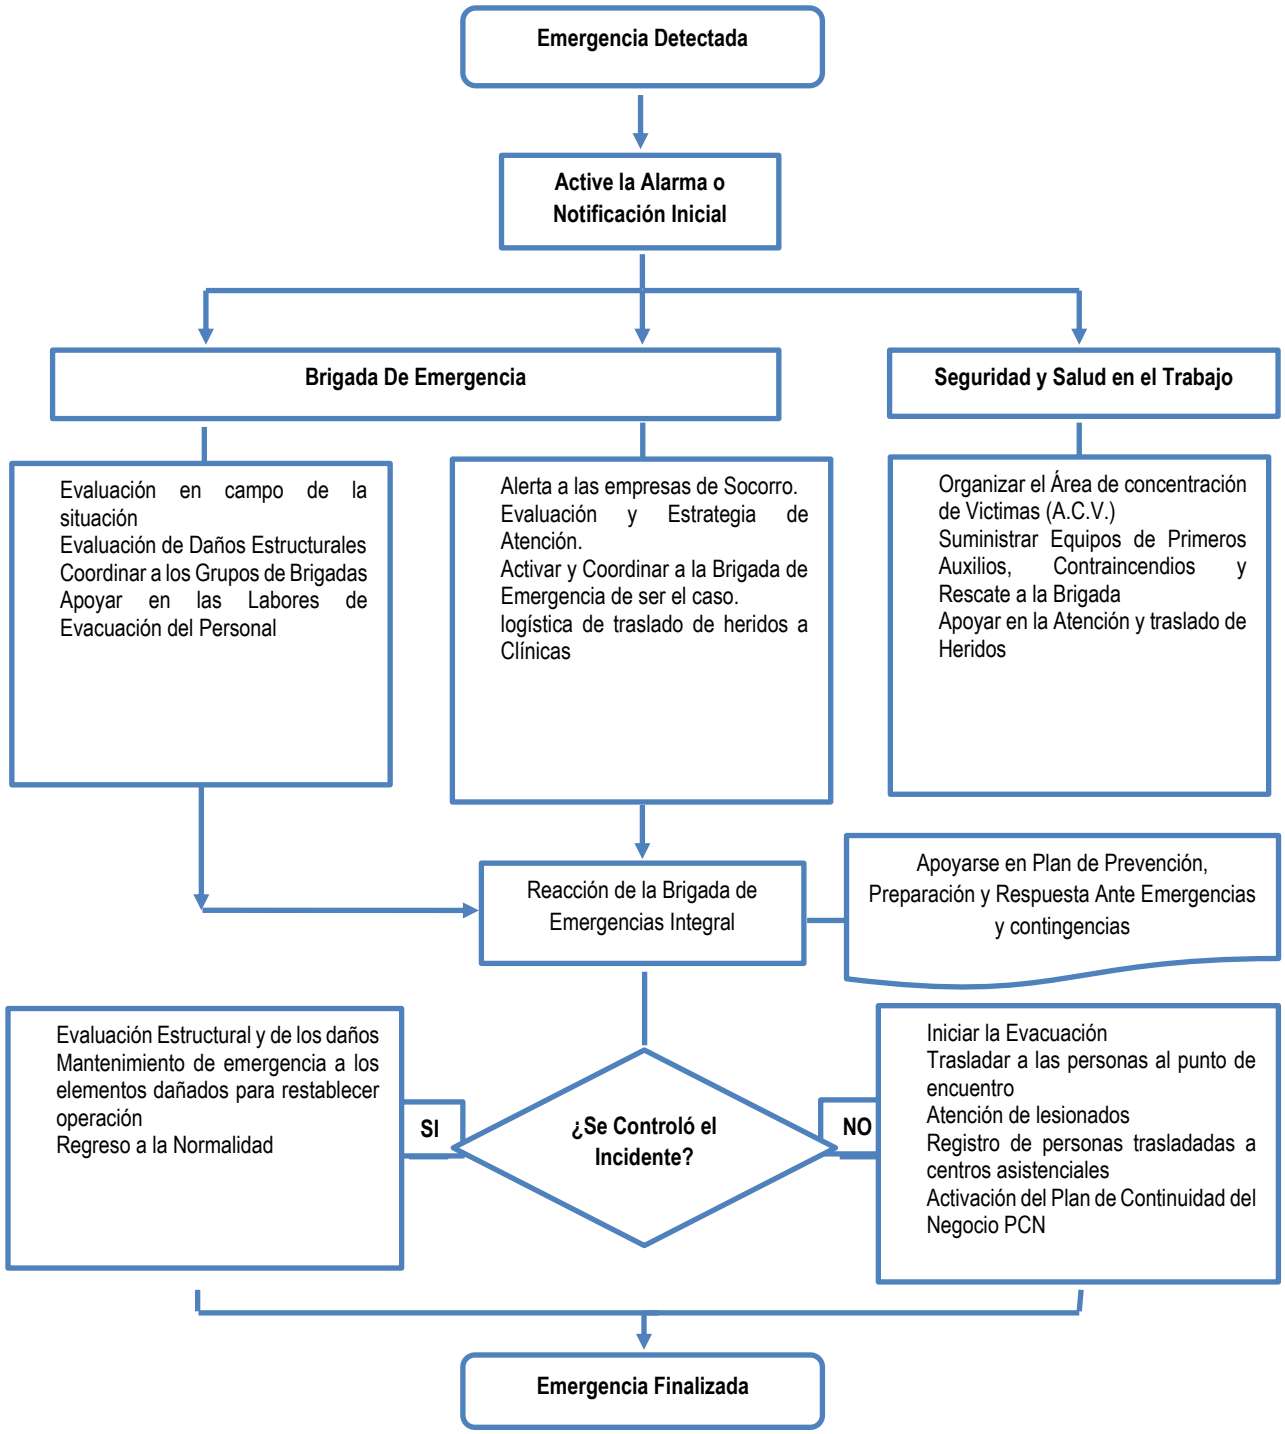


11.1 Niveles de Respuesta, Funciones y Responsabilidades

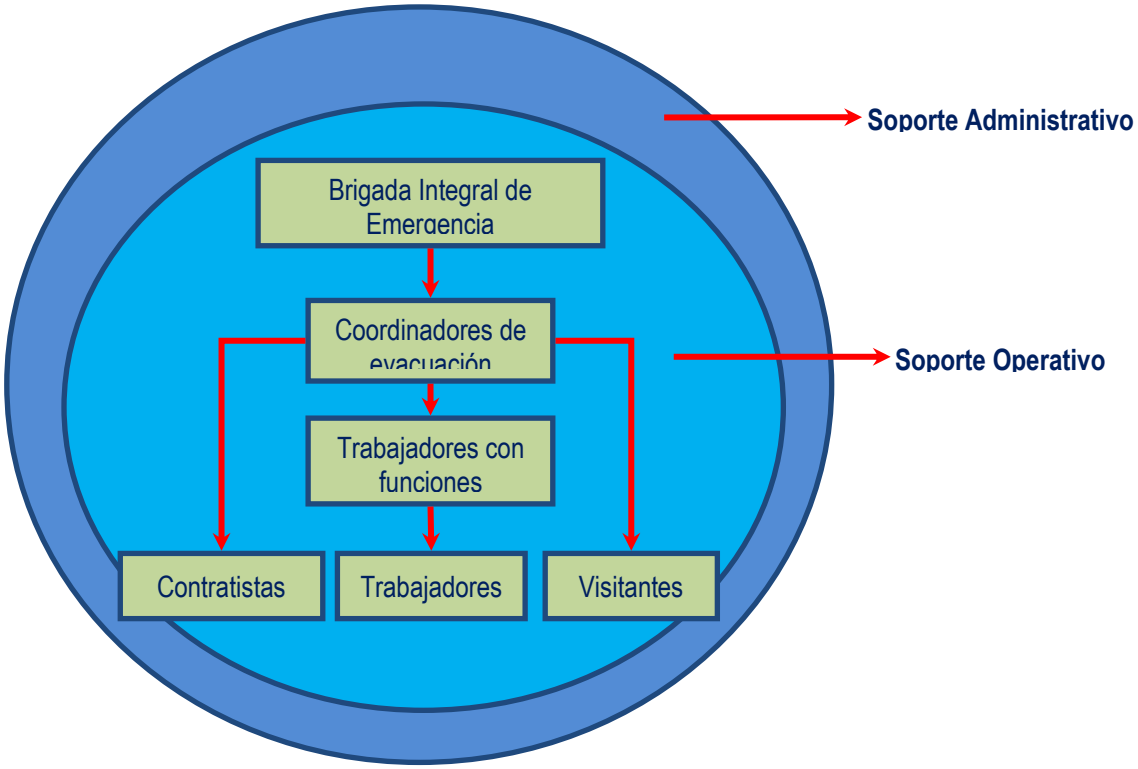

11.2 Esquema de Mando Durante las Emergencias

El esquema que se implementa en la empresa involucra y compromete a todas las partes interesadas, incluyendo la Gerencia, trabajadores, Contratistas y Visitantes, garantizando de esta manera una acción eficaz y coordinada ante una situación de emergencia.

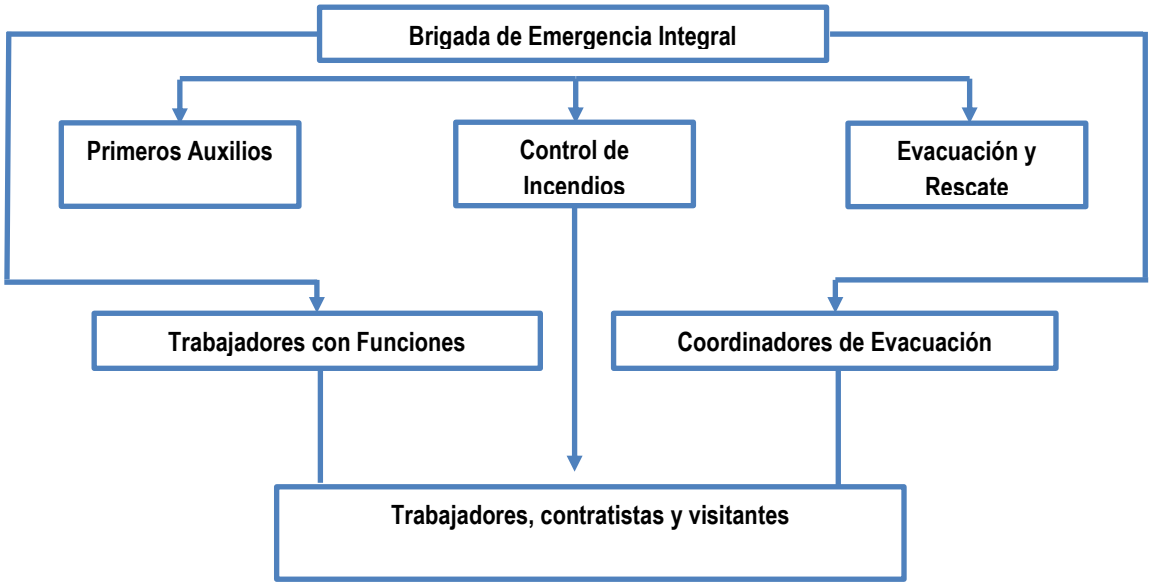

11.3 Soporte Administrativo: Brigada De Emergencias

La brigada de Emergencias está conformada por la Gerencia quienes se encargan de crear, planear y administrar el presente documento.

Funciones de la brigada de Emergencias

Antes de la Emergencia

- Dar soporte y solidez a la estructura orgánica del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencias, asumiendo el liderazgo y responsabilidad desde el más alto nivel jerárquico.
- Crear políticas, procedimientos, programas y actividades propias del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencias en fases de pre-planteamiento, entrenamiento y situaciones de emergencias.
- Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo y control del plan para atención de emergencias, velando porque se realice por lo menos un simulacro anual del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante

Emergencias y Contingencias, con la participación de todos los niveles de la empresa.

- Decidir la información que debe suministrar, la coordinación de prensa a los medios de comunicación pública en caso de emergencias.
- Aprobar los lineamientos por los cuales se rige la brigada de emergencia sea reglamento o políticas.
- Establecer y avalar los objetivos del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y su alcance.
- Recopilar la información histórica de la empresa en cuanto a realización de simulacros.
- Elaborar y revisar el análisis de vulnerabilidad.
- Recopilar la documentación necesaria para establecer los diferentes planes.
- Determinar cuáles son los parámetros para la selección de los brigadistas.
- Realizar reuniones periódicas para mantener actualizado el PPPRAE y garantizar el mantenimiento del mismo.
- Tener actas de todas las reuniones realizadas por el Comité de Emergencias.
- Evaluar los procesos de atención de las emergencias para retroalimentar las acciones de planificación.

Durante la Emergencia

- Evaluar las condiciones naturaleza y magnitud de la emergencia.
- Distribuir los recursos físicos y humanos para la atención oportuna de la emergencia.
- Establecer contactos con los Grupos de Apoyo Interno y Externo (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Tránsito).
- Tomar decisiones en cuanto a evacuación total o parcial de la empresa.
- Coordinar las acciones operativas en la atención de emergencias.
- Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia.
- Coordinar el traslado de los heridos a los centros de asistencia médica.

Después de la Emergencia


- Evaluar las diferentes actividades desarrolladas, después de una emergencia o de un simulacro.
- Elaborar y presentar el informe del evento ocurrido.

- Determinar el grado de alerta en el que se debe permanecer mientras se vuelve a la normalidad.
- Coordinar la reiniciación de labores
- Retroalimentar cada uno de los elementos del PPPRAE.

11.3.1 Soporte Operativo: Brigada de Emergencias

Es el grupo de trabajadores capacitados y entrenados para prevenir y controlar los eventos que pueden generar pérdidas económicas y humanas en la empresa.

Para efectos del funcionamiento de la brigada de emergencias en la empresa, se ha establecido la siguiente conformación, con la claridad, que su capacitación y entrenamiento es enfocada desde la perspectiva integral de emergencias, en la cual todos los integrantes deben recibir transversalmente los mismos conocimientos de los tres componentes, en coherencia con el principio del Sistema comando de Incidentes de "*organización modular*":

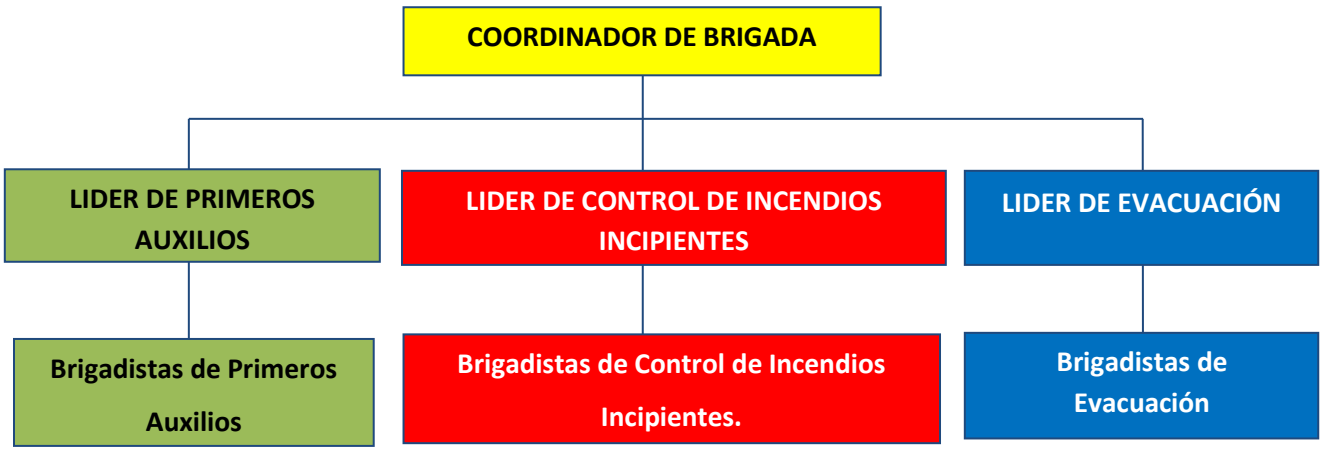

11.3.2 Funciones generales de la brigada de emergencias

GRUPO DE CONTROL DE INCENDIOS INCIPIENTES		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
Inspeccionar periódicamente todas las áreas de la empresa.	Ubicar el área afectada	Inspeccionar el área afectada

GRUPO DE CONTROL DE INCENDIOS INCIPIENTES		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
Asistir a las capacitaciones	Evaluar el área afectada	Mantener y reponer equipos y elementos de protección personal utilizados.
Realizar prácticas para mantenerse actualizado	Realizar control del evento	Evaluar la empresa.
Entrenar permanentemente	Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición	Ajustar el procedimiento
Mantener un buen estado físico	Apoyar grupos de Primeros Auxilios y Evacuación	

GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
Revisar e inventariar los equipos para atención de lesionados.	Ubicar el área del evento	Evaluar la reacción y respuesta
Revisar periódicamente el manual de primeros auxilios	Utilizar elementos necesarios para bioseguridad	Corregir procedimientos
Asistir a capacitaciones y entrenamientos	Evaluar el área y número de pacientes a atender.	Mantener y reponer equipos y elementos de protección personal utilizados.
Entrenar permanentemente	Limitar riesgos para el auxiliador y paciente	
Mantener un buen estado físico.	Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna	
	Atender a los pacientes de acuerdo con recomendaciones del médico y/o profesional de la salud.	
	Transportar al centro de asistencia los pacientes en forma rápida y segura	

GRUPO DE EVACUACIÓN		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
Conocer y dominar los planos, así como toda la empresa.	Informar a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar.	Permanecer con los evacuados en el punto de reunión final
Conocer vías de evacuación y punto de	Recordar al personal a evacuar los procedimientos.	Verificar el área de trabajo cuando se autorice el

GRUPO DE EVACUACIÓN		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
reunión final		reingreso
Conocer procedimientos para evacuación	Dirigir la evacuación	Dirigir el reingreso del personal del área asignada
Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones	Controlar brotes de pánico y/o histeria	Evaluar y ajustar los procedimientos con el director de evacuaciones
Discutir y practicar procedimientos	Evitar que los ocupantes se devuelvan	Ajustar plan de evacuación
	Ayudar u ordenar la ayuda para el personal con limitaciones	
	Verificar el listado del personal asignado y comunicar al coordinador de la brigada y comandante del incidente.	

12 PLAN DE EVACUACIÓN

El Plan de Evacuación de la empresa son el conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que todas las personas presentes en la empresa y que en un momento dado estén inmersas en una de las amenazas o riesgos descritos en el análisis de vulnerabilidad u otros, sean manifestados o materializados, protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento hasta lugares de menos riesgo.

El plan de evacuación de la empresa está:

- Escrito para que permanezca.
- Aprobado para que se institucionalice.
- Publicado para que todos lo conozcan.
- Enviado a todos los trabajadores para ser puesto en práctica y saber cómo actuar frente a una emergencia.
- Publicado en la plataforma que utilizar la empresa para que esté al alcance de todos los trabajadores.

12.1 Objetivos

- Desarrollar una rápida detección, un rápido y adecuado reporte de cualquier

tipo de amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las personas.

- Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que permita dar a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal de la empresa, la necesidad de desalojar las instalaciones.
- Garantizar que los ocupantes de las instalaciones se logren poner a salvo de cualquier amenaza que pueda poner en peligro su integridad personal. Esta acción de ponerse a salvo debe hacerse de manera rápida, organizada y tangible.
- Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación, en los sitios de reunión, del número de personas evacuadas de la empresa, y si todos los ocupantes lograron salir de ella, en su defecto poder tener un registro de personas desaparecidas o afectadas por el siniestro.
- Prestar Primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, que lo requieran.
- Intentar un control inmediato, provisional y adecuado de la emergencia INCIPIENTE, siempre y cuando esto no represente peligro para la integridad de las personas.
- Mantener un adecuado reporte informativo a trabajadores y comunidad en general acerca de la situación ocurrida y personas afectadas.
- Dar a conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

12.2 Alarmas

Actualmente la empresa no posee un sistema de alarma general, se utiliza un pito y el timbre de las instalaciones, por ahora se prevé como plan la utilización del sonido de silbatos que dará la voz de alerta, como se presenta a continuación:

- Dos silbatos (continuos, prolongados): Situación de emergencia, situación de alerta para las personas, estar atentos a las instrucciones de la brigada.
- Tres silbatos (prolongados): Preparación y alerta para evacuar, apagar los equipos, recoger las llaves y documentos personales.
- Sonido constante e intermitente: Evacuación inmediata.

12.3 Responsable de activar la Alarma

Según el tipo de emergencias y sus posibles consecuencias, la empresa define como el responsable de activar la alarma al líder de la brigada y los vigilantes con

los que cuenta la empresa, los cuales se encuentran cerca a la activación de la alarma manual.

Si es el caso de utilizar la opción del silbato el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo apoyara junto con los vigilantes y policías.

La Brigada de emergencias, estudiaran según el caso, la necesidad de evacuar o no. En caso de activación del sistema contra incendios y que se supere la capacidad de respuesta, la evacuación será inmediata.

12.4 Frecuencia de Instrucción

Para el personal nuevo, se realizará en el proceso de inducción y para el personal antiguo se realizarán capacitaciones por grupos en sus puestos de trabajo, de manera periódica, mínimo dos veces al año.

Periódicamente el personal antiguo tendrá una sesión teórica práctica, sin salir del área, la cual será dirigida por el responsable SST, brigadistas, apoyo de la ARL o quien tenga UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 y responsabilidades en el tema.

12.5 Fases del Proceso de Alarma

12.5.1 Primera Fase: Detección de la Emergencia

Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que se origina la emergencia hasta cuando alguien la reconoce y comprende:

- La clase y origen del Peligro, Riesgo o Amenaza según el análisis de vulnerabilidad.
- El día y la hora: una situación de emergencia en las instalaciones puede presentarse más comúnmente en horas laborables, aunque también podría ocurrir en horas en que la edificación se encuentre sola.

12.5.2 Segunda Fase: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde el instante en que el peligro se detecta hasta que se activa y se mantiene sonando la alarma de evacuación. En lo posible, todo el

personal debe tener los conocimientos básicos para identificar los diferentes riesgos o amenazas o en su defecto, conocer la ubicación de las personas que tengan esta capacidad, ellas serán responsables de dar la voz de alarma.

12.5.3 Tercera Fase: Preparación de la Evacuación

Es el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de evacuar (se da el accionamiento de la alarma) hasta que empieza a salir el personal.

En este proceso en lo posible se debe:

- Verificar por parte de la brigada y/o jefes, quiénes y/o cuantas personas están en las instalaciones.
- Apagar los equipos con los cuales se está trabajando por parte de cada usuario de equipo.
- Interrumpir el fluido eléctrico de los equipos por parte de cada usuario de equipo.
- Cerrar las puertas sin seguro por parte del personal de seguridad, brigadista designado o última persona que se crea es la que sale.
- Proteger valores, cuando sea posible.
- Recordar las vías de evacuación y el lugar de la reunión final por parte de los brigadistas.

12.5.4 Cuarta Fase: Salida del Personal

Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que sale la primera persona de las instalaciones hasta el momento en que sale la última. El tiempo dependerá de:

- Distancia por recorrer.
- Número de personas por evacuar.
- Capacidad de las vías

12.6 Procedimiento General para Evacuar las Instalaciones

Luego de dar la señal de alarma se da el desarrollo de los procedimientos tendientes a evacuar el personal y todos los visitantes y de ser posible el control de la situación que la origina.

Las siguientes son las actividades que deberán llevarse a cabo luego de la detección de la emergencia y activación de la alarma, teniendo en cuenta la magnitud del evento:

- Comunicarse con el comandante de incidente y/o Brigada de Emergencias e informar del tipo de evento y el sitio en que se está presentando y quede alerta a recibir las instrucciones pertinentes. Esto lo hace quien lo detecta.
- El Coordinador de la Brigada o brigadista, una vez informado del sitio, se desplaza hasta allí para evaluar la magnitud del peligro, controlar la situación y reportar al comandante de Incidente, en casos extremos, quien decidirá si es necesario evacuar parcial o totalmente.
- En el caso de evacuación general se dará aviso por medio del director de Emergencias o a quien este designe, para que se confirme la activación del sistema de alarma y todo el personal realiza el desplazamiento hacia el sitio de reunión final.
- El comandante de incidente debe comunicarse con el oficial de enlace o personal designado, para dar la orden de iniciar si es necesaria la comunicación con los organismos de socorro correspondientes (Bomberos, Cruz Roja, Policía, etc.) y debe mantener despejadas las líneas telefónicas.
- Los demás Coordinadores de Evacuación inician el proceso de preparación para la salida en cada una de sus áreas y esperan la confirmación de la orden de evacuación para desplazarse junto con el personal.
- El resto del personal suspende sus actividades, inicia el proceso de preparación para la salida y espera la orden de su respectivo coordinador para iniciar la evacuación.
- Al ser confirmada la evacuación, se desplazan por la ruta establecida hacia el punto de reunión acordado y permanecen en el lugar hasta nueva orden.
- Una vez en el punto de reunión, cada coordinador de evacuación efectúa el recuento de las personas a su cargo y lo informa al comandante de Incidente.
- Cuando sea controlada la emergencia y se considere seguro el regreso a las instalaciones, el comandante de Incidente lo comunica al personal en el punto de reunión final.

  NOTA: los anteriores procedimientos, se podrán desarrollan de manera alterna, de manera consecuente o no ser desarrollados todos según el tipo de evento y magnitud del mismo.

12.7 Procedimiento para Coordinadores de Evacuación

Los coordinadores evacuación son las personas a las cuales la empresa les ha asignado labores de coordinar y apoyar la evacuación de un área en particular. Al igual que el comandante del Incidente, los Coordinadores de Evacuación también tienen su suplente para garantizar la ejecución del plan en todo momento.

Estos Coordinadores se dan a conocer a toda los trabajadores o contratistas para que, en el momento de la evacuación, se tenga un mejor control y disciplina del evento.

12.7.1 Funciones y Responsabilidades de los Coordinadores de Evacuación

Antes de la emergencia:

- Verificar periódicamente y notificar al comandante de Incidente, los parámetros que condicionan la evacuación de su área.
- Instruir periódicamente al personal de su área sobre los procedimientos de evacuación.
- Mantener actualizada la lista de personal en su área de responsabilidad asignada.

Durante la emergencia:

- Verificar (según lo establecido y hasta donde le sea posible) la veracidad de la alarma.
- Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento de cada área.
- Verificar la lista de personas presentes en el área.
- Indicar a todos, la salida y recordarles la ruta principal y alterna a utilizar.
- Recordar el sitio de reunión final.
- Verificar que el área quede evacuada completamente.
- Evitar el regreso de personas después que se ha comenzado a salir.
- Verificar la lista de personas en el sitio de reunión final.
- Reportar al brigadista encargado.

Después de la emergencia:

- Entregar al comandante de incidente un reporte sobre el resultado del

funcionamiento del plan obtenido en su área de responsabilidad.

- Volver a la normalidad a la mayor brevedad posible.

12.8 Punto de Encuentro

Con el objetivo de garantizar salvaguardar la vida y seguridad del personal evacuado, este deberá ser reunido en una zona segura y alejada lo más y mejor posible del lugar de la emergencia y en un espacio que no implique riesgo para quienes evacuaron y allí se reúnen.

Igualmente se deberá realizar en dicho lugar un conteo del personal evacuado por áreas y según condiciones o estado de salud de los mismos, esto por parte del jefe de área y el encargado o coordinador de evacuación correspondiente.

Los puntos de reunión final establecidos para la empresa:

PUNTO	PERSONAL
Uno	Ubicado afuera de las instalaciones por el ingreso principal.

Los puntos de encuentro serán señalizados y se tendrá la cinta de cierre para las avenidas y las calles, actividad que realizaran los brigadistas antes de evacuar el personal.

12.9 Evacuación de Heridos

En caso de presentarse algún lesionado durante la emergencia o durante el proceso de evacuación, este deberá ser trasladado al sitio de reunión final y de ser necesario, el Coordinador de la Brigada de Emergencia ordenará su traslado a las Instituciones asistenciales establecidas.

A su vez todos los recursos que haya en existencia para la atención de lesionados deben llegar al ACV (Área de Concentración de Víctimas), tales como camillas, botiquines, inmovilizadores, personal de salud, brigadistas de primeros auxilios, etc.

Esta instalación del sistema comando de incidentes, debe ser establecida cerca al punto de encuentro asignado, pero a la espalda de las personas evacuadas con el fin de no generar traumatismos en las personas. Además, esta instalación debe

estar ubicada cerca de vías de acceso para la remisión de lesionados en ambulancia, cuando se requiera.

12.10 Reconteo de Personal

Ya en el punto de encuentro, entre el jefe y el coordinador de evacuación correspondiente, deberán confirmar la cantidad de personas que no lograron evacuar. Para ello las personas se deberán formar por áreas de trabajo, verificando si algún compañero no se encuentre presente, al encontrar alguien faltante se deberá conseguir la mayor información sobre su última ubicación conocida para dar el reporte a los organismos en conjunto con los datos de emergencia (contacto de emergencia, RH, patologías, medicamentos, alergias, EPS, ARL y fobias).

12.11 Protección de Documentos de Interés

Cada responsable de proceso o cargo que considere manejar documentos de interés o alta importancia, en el momento de ser activada la alarma, si estos los tiene cerca, salga con ellos a la mano. En caso de no poderlos sacar, se debe tener en cuenta que por seguridad deben quedarían bajo llave en cada puesto de trabajo. En el momento en que suene la alarma y se inicie el proceso de preparación para la salida, se debe proceder a colocar los documentos a proteger en el lugar destinado o ser llevados por la persona responsable.

12.12 Restablecimiento de Actividades

Luego de los eventos que se planeen como simulacros, la orden de reingreso se efectuará al concluir el proceso de reconteo del personal. Esta orden de reingreso será dada exclusivamente por el director del Comando de Emergencias o la máxima autoridad de la empresa en ese momento.

Ya para casos de eventos con evacuación por emergencias reales, como sismo, incendio o estallido de artefacto explosivo, se deberá esperar las indicaciones de las autoridades competentes, y por ningún motivo se debe reingresar a las instalaciones si no se puede comprobar que es seguro hacerlo por parte de personal de rescate competente.

13 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO

Una vez que se identifique que algún trabajador tiene sospecha o confirmación de la infección, los pasos que seguiremos serán usar mascarilla y cumplir aislamiento en su casa de manera inmediata hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita su retorno de manera presencial, adicionalmente se realizarán las siguientes acciones:

13.1 Casos positivos y sospechosos

13.1.1 Reporte de casos

Ante cada caso de un trabajador con resultado positivo para COVID-19 se reportará el caso a la Secretaría de Salud del municipio y se realizará un cerco epidemiológico identificando cuales trabajadores tuvieron contacto estrecho en los últimos 14 días para que estos también consulten en su EPS.

- Se informará a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento.
- Se orientará y acompañará a cada trabajador con síntomas para que consulte en su EPS.
- Permanecerá en su casa cada trabajador confirmado o sospechoso durante 14 días mientras no tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese periodo.
- Si se confirma un caso para un rol de riesgo se diligenciará el Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS.
- Los casos sospechosos y confirmados, tendrán seguimiento diario telefónico por el respectivo líder.
- Cada trabajador confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad, entregará las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir las condiciones de reincorporación y la realización de evaluación ocupacional post incapacidad.

14 PLANES OPERATIVOS

Teniendo en cuenta el análisis de vulnerabilidad de la empresa y la determinación del nivel de Riesgo se elabora una guía básica la atención de emergencias y los Procedimientos Operativos Normalizados para actuar frente a las amenazas con mayor relevancia.

Procedimientos Operativos Normalizados

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 ha determinado los siguientes PON, Planes Operativos Normalizados, los cuales, son el conjunto de actividades y e instructivos que desarrollarán las diferentes partes de la empresa y que son tendientes a conservar la vida y la seguridad de las personas en el evento de materializarse una amenaza, es decir la ocurrencia de una emergencia. Los procedimientos Operativos Normalizados se elaboraron teniendo en cuenta el análisis de vulnerabilidad y determinación del nivel de riesgo de la empresa.

Estos PON son:

14.1 Instrucciones de Convivencia con una persona de alto riesgo


La empresa realizará una validación inicial para asegurarse de que los trabajadores que conviven con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, cumplan las siguientes medidas.

1. Mantener la distancia al menos de un metro.
2. Utilizar tapabocas en las instalaciones, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo.
3. Aumentar la ventilación de las instalaciones.
4. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
5. Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de Luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles. juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales los trabajadores tienen contacto constante y directo.
6. La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv).
7. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de las instalaciones o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse,


teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.

8. Lavar con regularidad las toallas, etc.


14.2 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Movimiento Sísmico

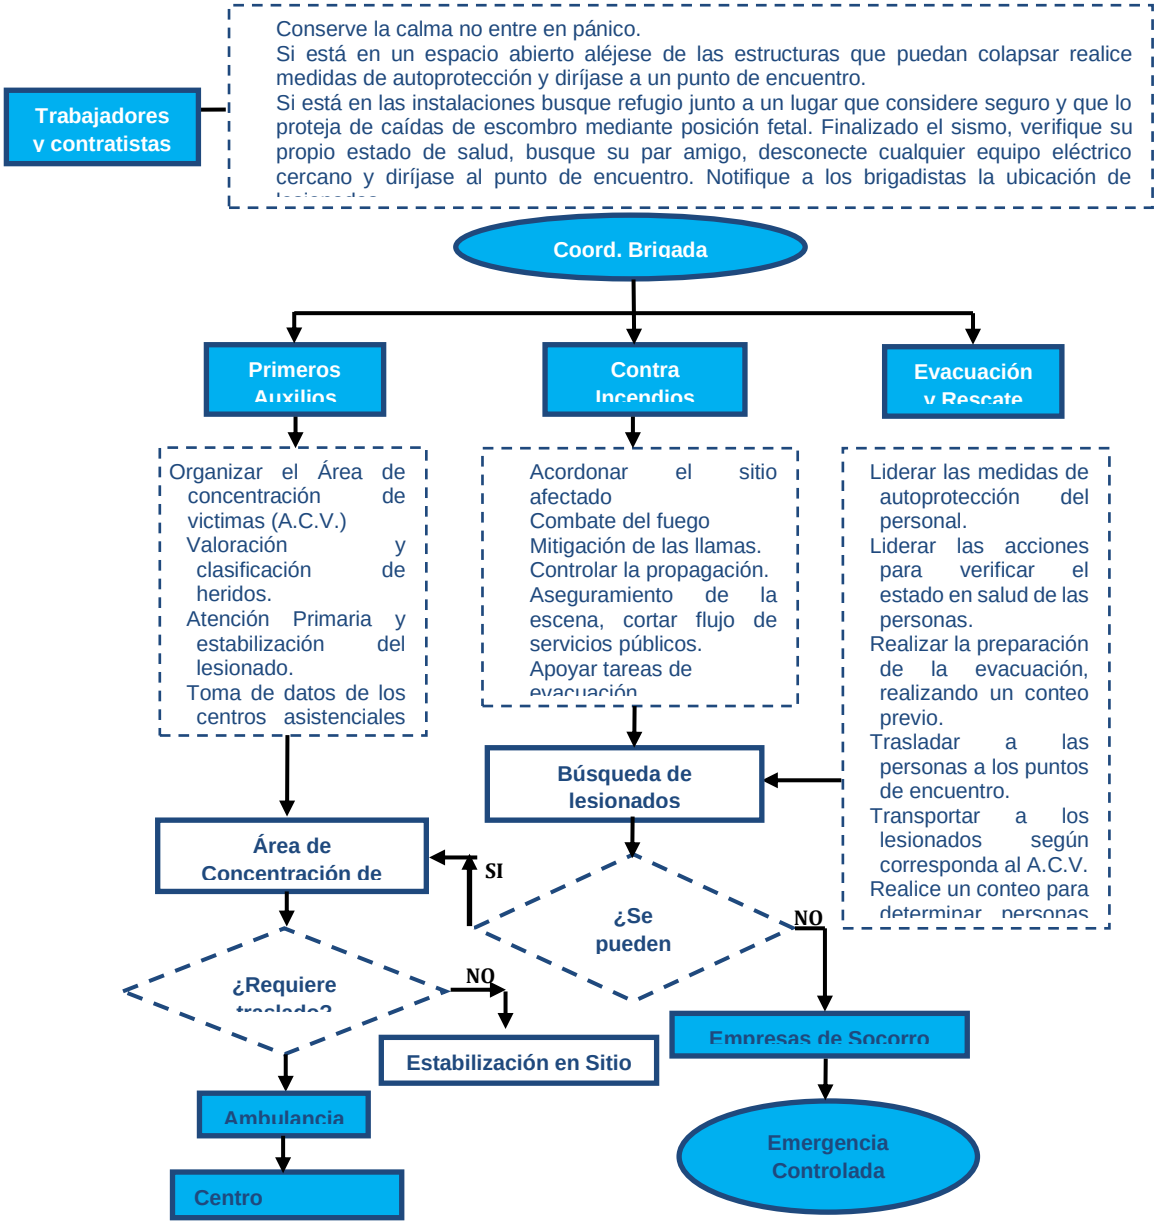


14.3 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Incendio

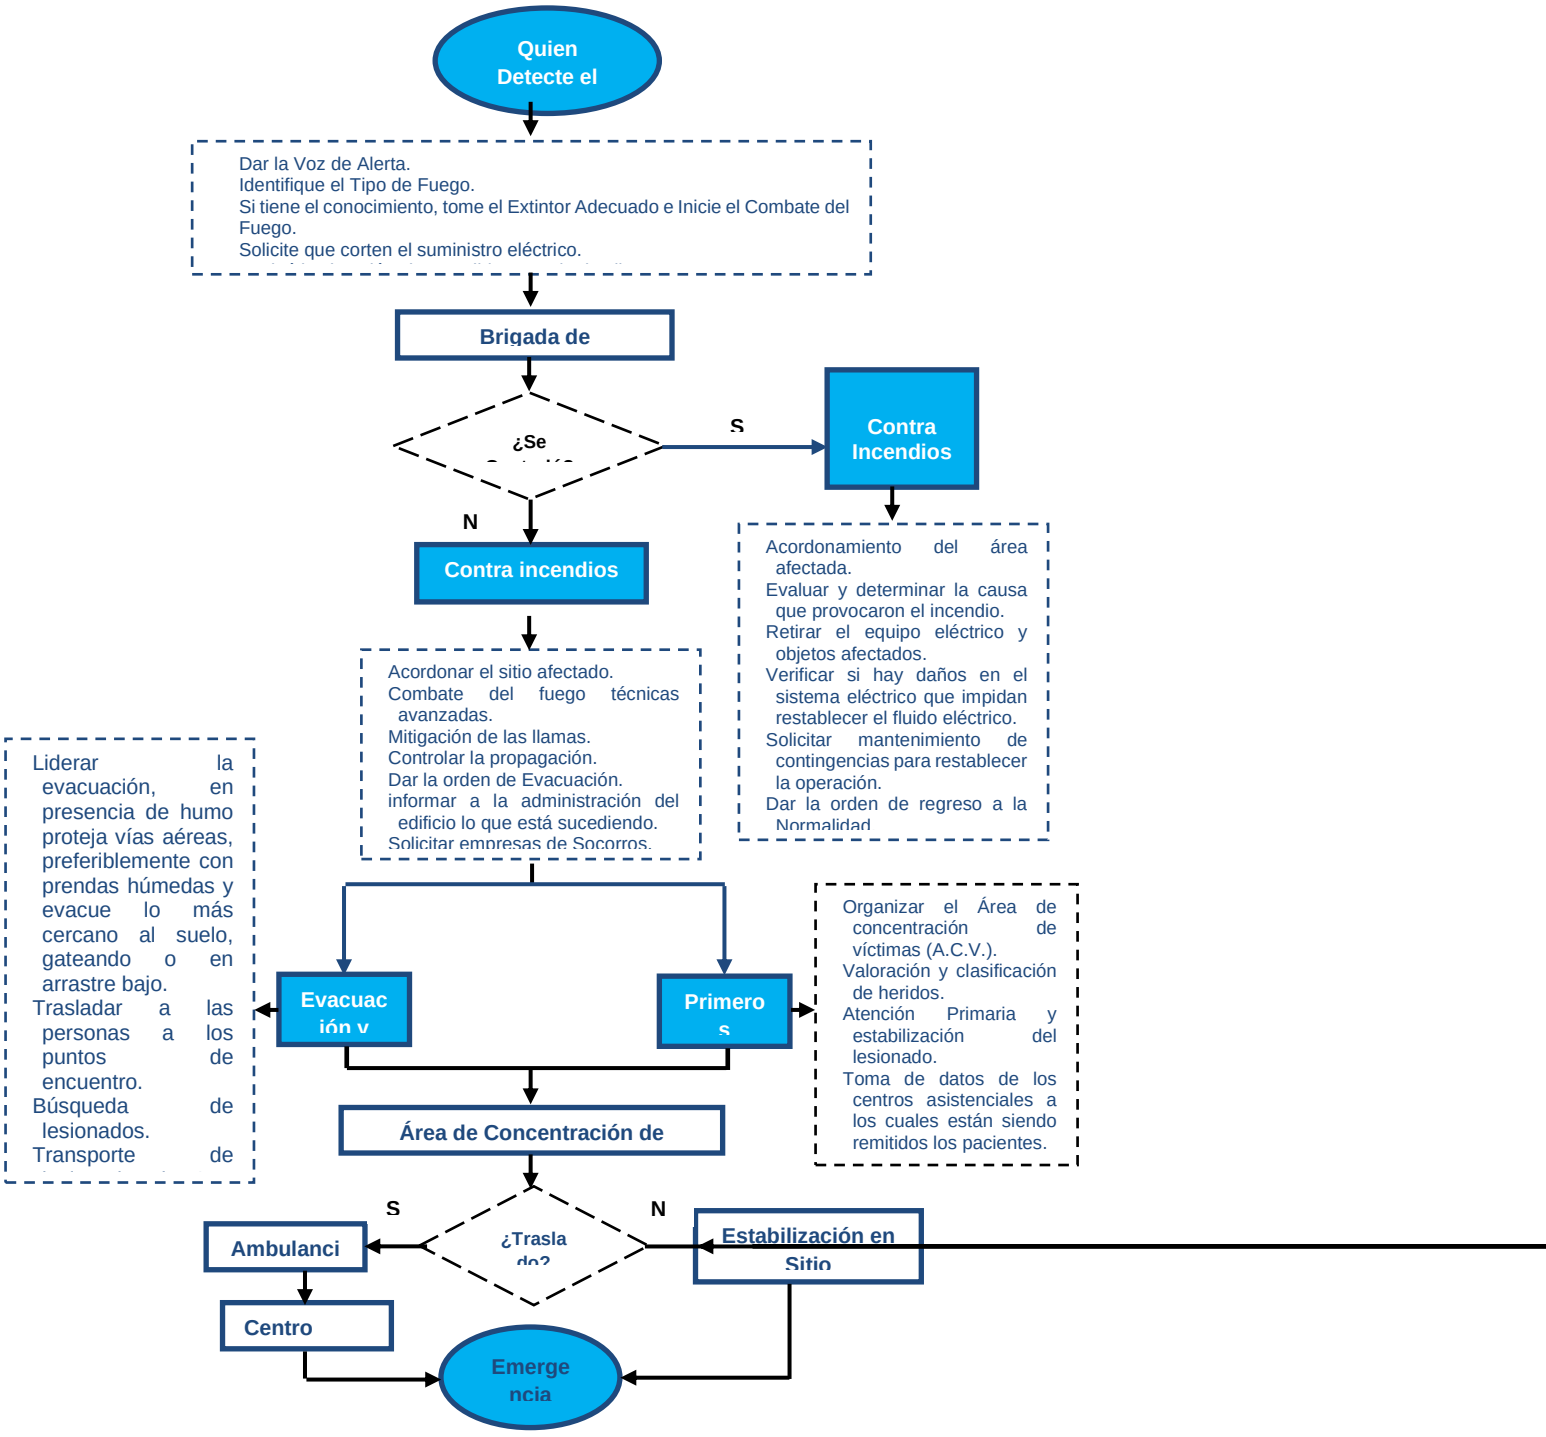

14.4 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Explosión

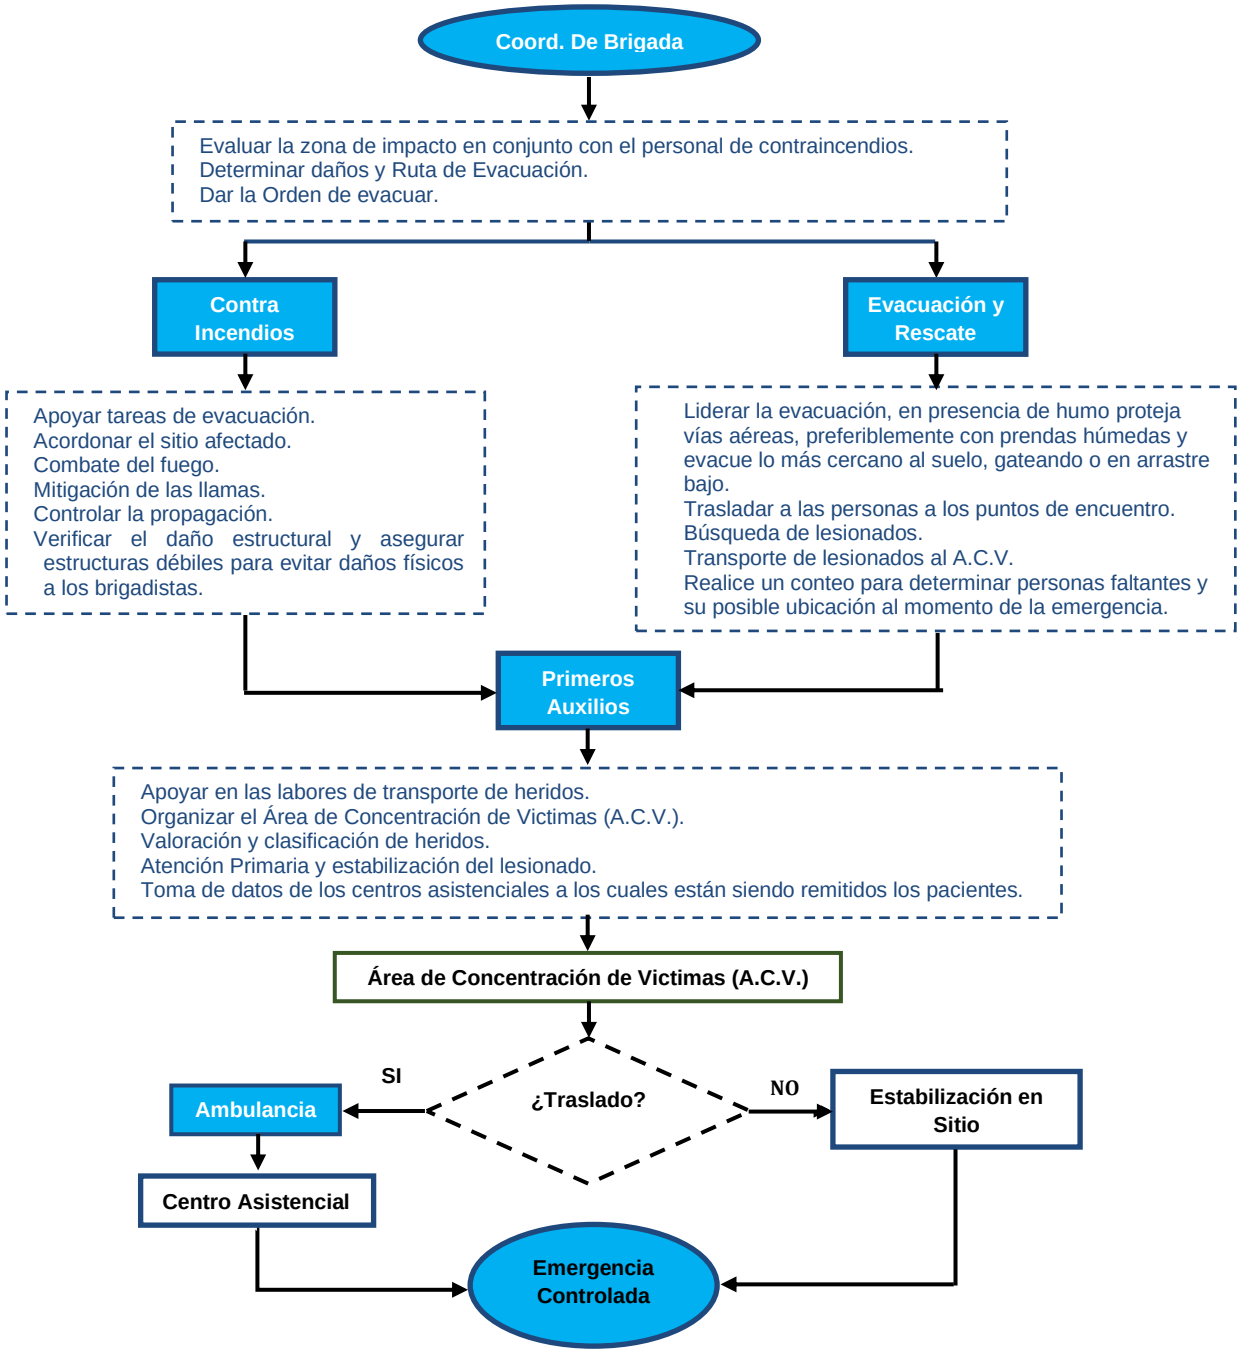

14.5 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Evacuación

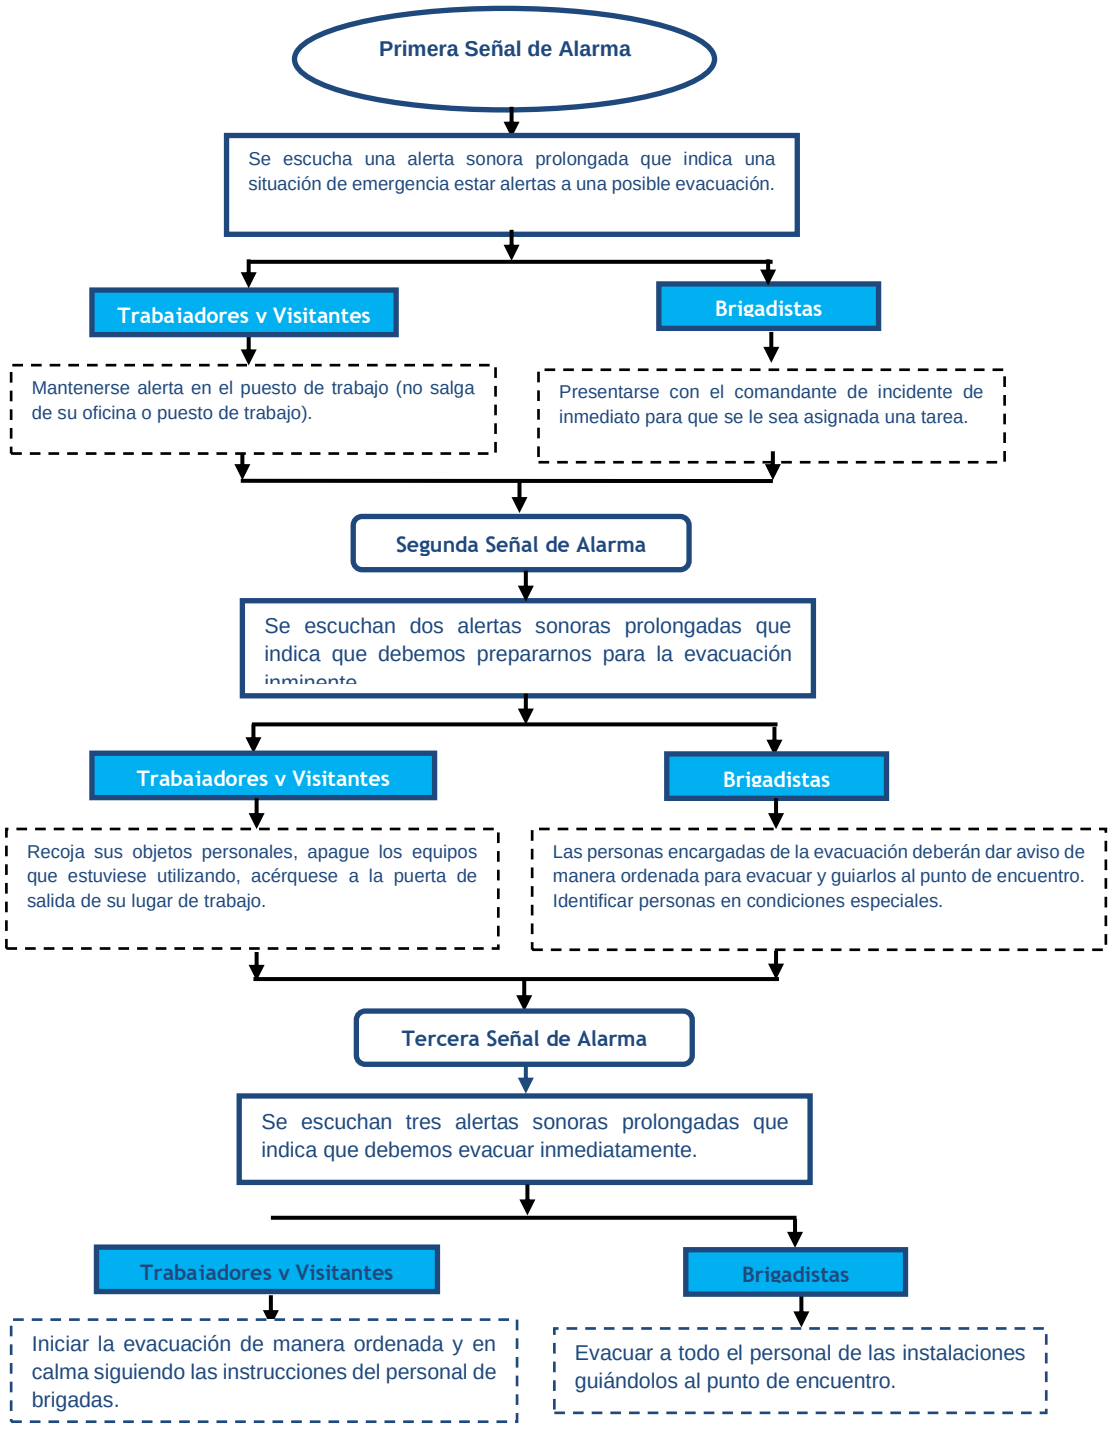

14.6 Otros PON Complementarios

Procedimiento General Operativo en Caso de Emergencia

Las acciones a desarrollar en el ejercicio del control de emergencias, obedecen a un esquema general donde cada uno de los participantes tiene funciones generales cualquiera que sea el escenario de la emergencia y particulares de acuerdo a la naturaleza de la misma:

EMERGENCIA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos generales estándar en caso presentarse una Emergencia**
PÚBLICO EN GENERAL	EN EL CASO EN QUE SE DECLARE UNA EMERGENCIA DENTRO DEL AREA EN EL QUE USTED SE ENCUENTRA, USTED DEBE: ☞ Interrumpir inmediatamente las actividades que realiza ☞ Mantenga la Calma ☞ No grite ☞ No corra precipitadamente ☞ No generar pánico ☞ Identificar al personal de brigadistas ☞ Atender indicaciones de los trabajadores ☞ Atender Indicaciones de las brigadas y de los cuerpos de socorro
DIRECCIÓN DE EMERGENCIA	☞ Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de emergencias. ☞ Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de la Brigada. ☞ Contactar los organismos de apoyo externo ☞ Dar aviso a ARL, EPS, según la situación.

EMERGENCIA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos generales estándar en caso presentarse una Emergencia**
	☞ Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. ☞ Ser el único vocero de la empresa ☞ Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución. ☞ Velar por la imagen de la empresa, comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. ☞ Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias
BRIGADA DE EMERGENCIAS	**JEFE DE BRIGADA:** ☞ Mantiene contacto con el director de Emergencias, informa respecto a daños en estructuras, presencia de víctimas y riesgos potenciales. ☞ Activa brigada de emergencias. ☞ Determina acciones de control básicas. ☞ Prepara el personal para acciones de evacuación de acuerdo a instrucciones del director de Emergencias. ☞ Solicita activación del Pla de Prevención de Emergencias en caso de necesidad y del Plan de Ayuda mutua. ☞ Evalúa la necesidad de acudir a cuerpos de socorro (Bomberos, Cruz Roja) o a las brigadas de otros sectores, solicita la asignación de esos recursos y los que considere necesarios. ☞ Evalúa la necesidad de usar los otros recursos de la empresa. **COORDINADORES DE EVACUACION:** ☞ Lideran evacuación de los operarios por área. ☞ Adelanta plan de evacuación.

EMERGENCIA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos generales estándar en caso presentarse una Emergencia**
	☞ Protege vías de escape. ☞ Identifica Punto de Reunión. ☞ Verifica cumplimiento de normas básicas de evacuación. ☞ Repite consignas de evacuación en forma clara. ☞ Orienta a las personas en la ruta de escape. ☞ Evita pánico. ☞ Vigila Instalaciones. ☞ Realizan el conteo de personal y reportan al director de Emergencias el número de personas que lograron salir. **GRUPO PREVENCIÓN DE INCENDIOS:** ☞ Actúan en combate de conatos de incendio. ☞ Determinan la clase de fuego. ☞ Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de conato de incendio. ☞ Colaboran al cuerpo de bomberos. ☞ Aíslan área del conato. ☞ Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y equipos. ☞ Apoya acciones de evacuación. **GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:** ☞ Determinan existencia de víctimas. ☞ Aseguran el área y controlan peligros inmediatos. ☞ Adelantan clasificación y valoración de víctimas. ☞ Prestan primeros auxilios de acuerdo a valoración de víctimas. ☞ Preparan a las víctimas para evacuación. ☞ Evacúan víctimas de acuerdo al PAEMED (Plan de Emergencias Médicas).

EMERGENCIA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos generales estándar en caso presentarse una Emergencia**
	☞ Apoya acciones de búsqueda y rescate. **GRUPO DE BUSQUEDA Y RESCATE** ☞ Adelantan búsqueda y localización de víctimas. ☞ Aseguran área de acción y acceden al lugar. ☞ Clasifican las víctimas por su situación. ☞ Contactan y extraen paciente. ☞ Apoya acciones de primeros auxilios.

En caso de EVACUACIÓN DE LESIONADOS se deben adelantar las acciones consignadas en los procedimientos específicos y además tener en cuenta las siguientes acciones:

EVACUACION DE LESIONADOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de lesionados de las instalaciones de la empresa**
PERSONAL EN GENERAL	**SI EXISTEN LESIONADOS EN LA EMPRESA QUE DEBAN SER EVACUADOS:** ☞ Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico y contagiarlo a los demás. ☞ Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar decisiones correctas. ☞ Demuestre seguridad y confianza en lo que hace y dice. ☞ Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de emergencias. ☞ Evalúe continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de que la situación que originó las lesiones pueda agravarse. ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS CUERPOS DE AYUDA

EVACUACION DE LESIONADOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de lesionados de las instalaciones de la empresa**
DIRECCIÓN DE EMERGENCIA	☞ Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de emergencias. ☞ Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de la Brigada. ☞ Contactar los organismos de apoyo externo ☞ Dar aviso a ARL, EPS, según la situación. ☞ Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. ☞ Ser el único vocero de la compañía. ☞ Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución. ☞ Velar por la imagen de la empresa, comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. ☞ Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias
BRIGADA DE EMERGENCIAS	**JEFE DE BRIGADA:** ☞ Lidera acciones de primeros auxilios y si es el caso de búsqueda y rescate ☞ Apoya al COPASST y al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación del Accidente de Trabajo (AT) **BRIGADA DE EMERGENCIAS:**

EVACUACION DE LESIONADOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de lesionados de las instalaciones de la empresa**
	☞ Adelantan procedimientos de contingencia de acuerdo al flujo gramas y protocolos establecidos para cada caso y adelantan acciones de primeros auxilios
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** ☞ Apoya en el traslado de paciente ☞ Adelanta investigación del AT. ☞ Hace seguimiento de la evolución del paciente y su caso. **COMITÉ PARITARIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST):** ☞ Apoyan al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo en el análisis, investigación y conclusiones del accidente ☞ Hacen seguimiento a las recomendaciones emanadas para controlar el riesgo.

En CASO DE EMERGENCIA AMBIENTAL, se deben seguir los siguientes pasos:

EMERGENCIA AMBIENTAL – FUGAS Y DERRAMES QUIMICOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de FUGA Y/O DERRAMES PRODUCTOS QUÍMICOS en los sitios de trabajo o sus alrededores.**
PÚBLICO EN GENERAL	**SI USTED SE VE INVOLUCRADO EN DERRAME Y/O FUGAS DE PRODUCTO, DEBE:** ☞ Mantener la calma. ☞ Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla. ☞ Notificar al responsable Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de supervisores o brigadistas, para la activación del COE.

EMERGENCIA AMBIENTAL – FUGAS Y DERRAMES QUIMICOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de FUGA Y/O DERRAMES PRODUCTOS QUÍMICOS en los sitios de trabajo o sus alrededores.**
	☞ Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos y maquinaria y suspenda el suministro de producto si en su área existen y está capacitado para hacerlo. ☞ Si no tiene capacitación y entrenamiento para el control de fugas y/o derrames retírese inmediatamente del lugar e informe. ☞ En caso de evacuación no debe devolverse y debe cerrar sin seguro cada puerta. ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL COORDINADOR DE EVACUACIÓN, DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS Y/O DE GRUPOS DE APOYO.
DIRECCIÓN DE EMERGENCIA	☞ Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de emergencias. ☞ Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de la Brigada. ☞ Contactar los organismos de apoyo externo ☞ Dar aviso a ARL, EPS, según la situación. ☞ Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. ☞ Ser el único vocero de la empresa. ☞ Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución. ☞ Velar por la imagen de la empresa, comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. ☞ Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias

EMERGENCIA AMBIENTAL – FUGAS Y DERRAMES QUIMICOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de FUGA Y/O DERRAMES PRODUCTOS QUÍMICOS en los sitios de trabajo o sus alrededores.**
GRUPO MIPE (Grupo de Control de Derrames y Fugas)	☞ Notificar a su jefe inmediato, el a su vez lo hará al responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (por radio o teléfono celular) para la activación del COE. ☞ Si tiene los EPP (Elementos de Protección Personal) que corresponden al grupo de aspersión, bombas y/o pesaje de productos químicos, acordone el área y evacue el personal del área. ☞ Reúna al grupo de aspersión con sus respectivos EPP y pongan en marcha el procedimiento para contención de derrames. ☞ Tomar el control del evento de acuerdo a las hojas de MSDS del producto en fuga o derrame, en caso contrario aléjese del área, espere la llegada de los grupos de apoyo y siga sus instrucciones. ☞ Tenga en cuenta la toxicidad, velocidad de propagación y demás características de los productos a manejar y permita la ventilación del área afectada. ☞ Si se ven involucradas personas con síntomas de intoxicación, proceder a retirarlas del área e iniciar el proceso de descontaminación y atención de la emergencia (Brigadistas)
BRIGADA DE EMERGENCIAS	**JEFE DE BRIGADA:** ☞ Determina acciones específicas con el grupo de Primeros Auxilios en caso que se presenten personas afectadas por el suceso.

En caso de AMENAZA TERRORISTA se deben adelantar las acciones consignadas en los procedimientos específicos y además las siguientes acciones:

AMENAZA TERRORISTA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de detectar Amenaza Terrorista por vía telefónica u otro medio.**
PÚBLICO EN GENERAL	**SI USTED RECIBE UNA COMUNICACIÓN QUE INFORME DE ACCIONES TERRORISTAS, DEBE:** ☞ Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar rumores. ☞ Notificar inmediatamente al responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ☞ Intente mantener contacto con la persona que hace la amenaza y obtener la información que pueda orientarle sobre: ☞ Naturaleza de la acción (Bomba, carro-bomba, atentado a trabajadores, ocupación armada, etc.). ☞ Ocurrencia de la acción (lugar, hora, como es, cuantas hay, etc) ☞ Naturaleza del actor (Grupo guerrillero, delincuencia común, usuarios de la Compañía, empleados o ex empleados, etc.). ☞ Si la amenaza es escrita, debe conservarla y leerla cuando la reporte a la Coordinación de Gestión Humana. ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE EMERGENCIA	☞ Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de emergencias. ☞ Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de la Brigada. ☞ Contactar los organismos de apoyo externo ☞ Dar aviso a ARL, EPS, según la situación. ☞ Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. ☞ Ser el único vocero de la empresa. ☞ Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución.

AMENAZA TERRORISTA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de detectar Amenaza Terrorista por vía telefónica u otro medio.**
	☞ Velar por la imagen de la empresa comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. ☞ Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias
BRIGADA DE EMERGENCIAS	**JEFE DE BRIGADA:** ☞ Acopia información respecto a la existencia, ubicación, cantidad, forma etc., de elementos sospechosos o posibles artefactos explosivos ☞ Informa al director de emergencias y/o al director de Seguridad y/o al director de Apoyos. **COORDINADORES DE EVACUACION:** ☞ Lideran los procesos de evacuación. **OTROS GRUPOS:** ☞ Funciones propias del grupo en caso de requerirse. ☞ Acciones de apoyo mutuo intergrupal según plan. ☞ Acciones de búsqueda de artefactos, según criterio de jefe de Brigada.

En caso de ACCIÓN TERRORISTA se deben adelantar las acciones consignadas en los procedimientos específicos y además las siguientes acciones:

ACCION TERRORISTA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de ser víctima o verse involucrado en acciones terroristas**
PÚBLICO EN GENERAL	**SI USTED ES VICTIMA O SE VE INVOLUCRADO EN ACCIONES TERRORISTAS, DEBE:** ☞ Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar acciones desesperadas de parte de los autores del hecho. ☞ Evitar la manipulación de cualquier objeto sospechoso. ☞ Notificar si le es posible a la responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ACCION TERRORISTA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de ser víctima o verse involucrado en acciones terroristas**
	☞ Deshacerse si es posible, de los documentos que lo vinculen como trabajar de la empresa. ☞ Obedecer las órdenes del personal que está adelantando la acción armada; no contrariarles. ☞ Estar atento a la presencia de otros sujetos que puedan pertenecer al grupo que adelanta la acción. ☞ Prepararse para cubrirse en caso de acción armada por parte de las autoridades. ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
DIRECCIÓN DE EMERGENCIA	☞ Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de prevención y respuesta ante emergencias. ☞ Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de la Brigada. ☞ Contactar los organismos de apoyo externo ☞ Dar aviso a ARL, EPS, según la situación. ☞ Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. ☞ Ser el único vocero de la empresa. ☞ Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución. ☞ Velar por la imagen de la empresa, comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. ☞ Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias.
BRIGADA DE	**JEFE DE BRIGADA:**

ACCION TERRORISTA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de ser víctima o verse involucrado en acciones terroristas**
EMERGENCIAS	☞ Permanece alerta a la evolución de las negociaciones si las hubiese y espera instrucciones del director de Emergencias y/o el director de Seguridad **BRIGADA:** ☞ Permanece alerta a las instrucciones del jefe de Brigada

En caso de INTOXICACION ALIMENTARIA se deben adelantar las acciones consignadas en los procedimientos específicos y además las siguientes acciones:

INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar en caso de INTOXICACION POR ALIMENTOS**
PÚBLICO EN GENERAL	En Caso de presentar síntomas de Intoxicación alimentaria debe: ☞ Reporte a su jefe inmediato para ser valorado y ser remitido a la IPS en caso de ser necesario.
BRIGADA DE EMERGENCIAS	**JEFE DE BRIGADA:** Copiar información respecto a la ocurrencia de una intoxicación masiva del personal, informa a Seguridad y Salud en el Trabajo. **GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS.** ☞ Estabiliza a los afectados por la intoxicación alimentaria. ☞ Clasifica los pacientes de acuerdo a su gravedad.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	☞ Coordina con las IPS adscritas la atención de los pacientes. ☞ Hace seguimiento a los pacientes remitidos a cada una de las IPS. ☞ Inicia proceso de investigación de las causas que generaron el evento.

15 PLAN DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN

La divulgación del Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias debe ser planeadas y desarrollada en primer lugar por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien determina las estrategias para su divulgación contando con el apoyo

del Comité de Emergencias desde el punto de vista técnico y con la Gerencia de la empresa desde el punto de vista de Compromiso Gerencial.

El trabajador designado como Oficial de Información Pública (comunicaciones) deberá participar activamente en el diseño de las estrategias para tal fin. El sistema de divulgación se desarrollará permanentemente a través de capacitaciones, folletos, afiches, medios electrónicos, audiovisuales o cualquier otro medio que se tenga disponible al interior de la empresa.

15.1 Divulgación Del Plan De Emergencias

Se realizará con las personas de: Brigadas de Emergencias, Coordinadores de Evacuación, Grupos de Apoyo Interno, COPASST, SST, apoyo de la ARL.

Procedimientos Operativos Normalizados para los trabajadores en general que no participan en el control administrativo u operativo de la emergencia y para visitantes frecuentes.

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 deberá siempre evidenciar las actividades de capacitación y formación mediante registros firmados por quienes reciban las capacitaciones y/o divulgaciones del Plan.

16 CONTACTOS DE EMERGENCIA Y APOYO

LISTA DE APOYO	TELÉFONO
ARL AXA COLPATRIA	#247

EMPRESAES DE EMERGENCIAS	TELÉFONOS
Numero Único de Seguridad y Emergencias -NUSE-	123
Cuerpo Oficial Bomberos	195
Defensa Civil	144
Cruz Roja	132
Policía Metropolitana	112
Ambulancias	132 - 144

EMPRESAES DE EMERGENCIAS	TELÉFONOS
Gas Natural	164
Energía Eléctrica	115

Nota: Estos números son publicados en lugares visibles de la empresa

17 SIMULACROS

Son eventos que le permiten a UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 practicar sus procedimientos de actuación ante una posible emergencia y así saber de manera acertada, cómo actuar en caso de una emergencia real, siguiendo un plan previamente establecido con una serie de procedimientos de seguridad y protección.

Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta de la empresa y le permite evaluar y retroalimentar sus planes.

Es importante que todos los trabajadores, directa e indirecta, contratistas y visitantes, puedan prever una actuación rápida y eficaz para salvaguardar la integridad y salud de las personas, y minimizar los posibles daños a las instalaciones y al medio ambiente.

17.1 Objetivos

- Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente.
- Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del plan existente.
- Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de la empresa, teniendo en cuenta el inventario de recursos humanos y recursos técnicos disponibles.
- Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación y complementar su entrenamiento.
- Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia.
- Promover la difusión del plan entre los trabajadores y prepararlos para afrontar una situación de emergencia.
- Identificar las instituciones que pueden acudir a la empresa, a brindar su apoyo en situaciones de emergencia.

17.2 Clasificación de los Simulacros

Los simulacros que se planean desarrollar en la empresa se clasifican en dos grupos:

- Simulacros avisados o programados: Cuando todas las personas presentes en la empresa conocen la hora, fecha y lugar de la realización del simulacro.
- Simulacros sorpresivos o no programados: cuando las personas de la empresa no han sido informadas de la actividad. La empresa No desarrolla simulacros sorpresivos sin haber realizado otros simulacros con anterioridad.
- Existen también simulacros de reconocimiento, parciales y totales.

Para realizar un simulacro en la empresa, se tienen en cuenta las siguientes tres fases:

- De planeación de la actividad.
- De ejecución.
- De evaluación.

17.3 Planeación de la actividad

- La actividad que se va a realizar (de acuerdo con la priorización de los riesgos).
- Los recursos humanos y recursos técnicos disponibles para la ejecución de la actividad.
- Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los lesionados ficticios, los brigadistas, el personal administrativo necesario y los observadores.
- El área seleccionada, las rutas de evacuación, los obstáculos, las escaleras, las puertas de salida, los sistemas de alarma y comunicación, las áreas de concentración de los evacuados y las posibles áreas de expansión.
- La empresa de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el sistema de remisión, de comunicación y de transporte de lesionados.
- El sistema de información a familiares de las posibles víctimas.
- El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro.

17.4 Ejecución de la actividad

Es la fase en la que se requiere la mayor atención y seriedad de parte de las personas que participan. Se sugiere dividir esta actividad en varias partes:

- Reunión del comité organizador para realizar los últimos ajustes a la actividad, repasar los pasos por seguir y detectar inconvenientes o imprevistos.
- Preparación de los trabajadores que van a representar lesionados ficticios.
- Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia.
- Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades.
- Declaración de la alarma por la persona o personas designadas.
- Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en situaciones de emergencia.
- Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la situación de riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo planeado y con los recursos disponibles
- Definición de la evacuación y del tipo de evacuación: total o parcial. Orden de evacuación, designación del lugar de concentración de los evacuados e iniciación de la evacuación.
- Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad predeterminadas.
- Instalación del centro de atención a los lesionados.
- Clasificación de los lesionados y definición de remisiones a instituciones hospitalarias, si es el caso.
- Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal fin.
- Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la evaluación de la actividad.

17.5 Evaluación de la actividad

Esta fase es especialmente importante para sacar conclusiones que sirvan de base para realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos en toda la actividad.

- Pre diseñar formatos de evaluación para ser diligenciados por cada participante: lesionados, observadores, personal de atención a evacuados, etc.
- Tener en cuenta el número de personas que realizaron el simulacro y número de personas que no evacuaron, para realizar posteriormente un seguimiento y control sobre las mismas.
- Analizar el comportamiento que las personas tienen durante el simulacro.
- Establecer si las rutas de evacuación funcionaron como estaba previsto y qué fallas se presentaron.
- Evaluar el tiempo de la evacuación y si fue óptimo o no, de acuerdo con lo planeado.
- Recopilar el material, analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes, que serán anexadas al Plan.
- Publicar y difundir los resultados del simulacro entre todos los trabajadores, no sólo señalando los errores, sino resaltando el acierto.

17.6 Seguimiento y control

Se recomienda realizar los siguientes pasos con el fin de cerrar el ciclo de mejora continua:

- Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación sobre la eficacia de las medidas de control implementadas.
- Mantener un registro actualizado con la información de todo el proceso.
- Hacer seguimiento y divulgar periódicamente los indicadores de gestión definidos.

UNIÓN TEMPROAL CORREDORES VERDES 2025**,** establecerá un plan de acción, con responsable y fecha de cumplimiento. El plan de acción lo realizará la empresa, dando cumplimiento a las recomendaciones determinadas en el análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad respectivos, con la implementación de acciones correctivas y preventivas.

18 EL PLAN DE EMERGENCIA MÉDICO (PAEMED)

18.1 Objetivo

Suministrar una herramienta básica de reacción ante una Emergencia Médica, para asegurar una atención adecuada, oportuna e inmediata a cualquier persona enferma o lesionada.

18.2 Clasificación

De acuerdo con la severidad, se pueden clasificar las lesiones en: leve (color Verde), moderada (Amarilla) y severa (Roja)

LEVE (VERDE)

Pueden considerarse los siguientes casos:

- Heridas que solo comprometen piel, de extensión mínima.
- Golpes con inflamación y dolor leve, sin alteración de movimiento. Quemaduras Grado I (solo enrojecimiento de la piel), de extensión mínima.
- Estados de salud por enfermedad repentina.
- En general en estos casos los síntomas no comprometen el estado general del paciente.

Atención: Por Brigadista, remisión a Centro Médico según red asistencial ARL o centro más cercano. **Nivel I** o, se solicitará la atención por parte de emergencias del 123.

MODERADA: (AMARILLA)

Ejemplos:

- Heridas con sangrado moderado, el paciente no presenta signos de shock (Palidez, sudoración, mareo, desorientación, desmayo)
- Fracturas óseas cerradas.
- Trauma en cráneo sin deformidad ósea, ni pérdida de conciencia, paciente hablando de forma coordinada (sabe su nombre, que le paso, en donde está, etc.).
- Quemaduras de Segundo Grado (II), en las cuales hay formación de ampolla y no comprometa grandes extensiones.

- Estados de salud por enfermedad repentina.

Atención: Estabilización por Brigadista o por parte de: Emergencias del 123 - se remitirá a Centros de atención Médica de **II Nivel**.

SEVERAS: (ROJO)

Ejemplos:

- Hemorragias severas (sangrado abundante, paciente en shock).
- Amputaciones.
- Politraumatismo (lesión que compromete varias áreas del cuerpo y/o diferentes órganos).
- Sospecha de Trauma abdominal cerrado con ruptura de víscera (dolor abdominal severo, paciente en shock)
- Quemaduras GIII (compromete piel, músculo, el paciente no manifiesta dolor).
- Quemaduras G II extensas o que comprometen articulaciones.
- Fracturas abiertas.
- Sospecha de infarto (dolor en región precordial que se irradia a extremidades superiores, espalda, palidez, sudoración, angustia)
- Trauma cráneo encefálico con cualquiera de los siguientes signos: pérdida de conciencia, vómito, salida de sangre por oídos, persona desorientada, hablando incoherentemente, se observa deformidad en cráneo, herida abierta que compromete hueso.
- Trauma raquimedular (alteración de movimiento, sensibilidad en extremidades)
- Estados de asfixia (secundarios a inhalación de vapores, inmersión, ahogamiento, electrocución)

Atención: Estabilización por Brigadista o por parte de: Emergencias– remitir lo más pronto posible a Centro Asistencial.

Transporte: Ambulancias de ARL o Área Protegida

18.3 Responsabilidades y Funciones

El Plan de Emergencia Médico (PAEMED), es responsabilidad de todas las personas que laboran en un área de trabajo, pero es importante establecer responsabilidades y funciones específicas que repercutan en una mayor agilidad y efectividad del Plan.

18.4 Coordinación General del PAEMED

- Evalúa vulnerabilidad y recursos existentes permanentemente en las instalaciones, y Oficinas.
- Genera y actualiza según necesidades el Plan de Emergencia (PAEMED).
- Supervisa y asesora la conformación y funcionamiento de los Planes de Emergencia (PAEMED), en cada centro de trabajo.
- Divulga el Plan de Emergencia Médica y aclara dudas sobre el mismo.
- Identifica necesidades de Capacitación y coordina la programación de estas.
- Apoya a la Brigada de Primeros Auxilios.
- Recibe la información para orientar sobre acciones a seguir en caso de Emergencia.
- Apoya la coordinación de servicios con Instituciones de Salud.
- Participa en Simulacros para evaluar la viabilidad y efectividad del Plan.
- Verifica y audita el servicio (interno y externo) proporcionado en caso de emergencia.
- Revisa la actividad de convenios de EPS y ARL con las Instituciones de Salud, para mantener vigente el PAEMED.
- Coordina convenios necesarios con ARL POSITIVA
- Hace visitas de reconocimiento a Instituciones nuevas, que sean consideradas como alternativa de atención, para incluirlas en el Plan de Emergencia.
- Estudia posibilidades de convenios con empresas de apoyo, para el PAEMED

18.5 Directores, subdirectores o Jefe de Área

- Conocer el PAEMED, la organización local del mismo y las actividades de preparación.
- Supervisa la organización Local del PAEMED.
- Esta actualizado sobre las modificaciones que se hagan al Plan.

- Tiene la capacidad de intervenir directamente en caso de activación del PAEMED, haciendo el enlace con el Plan de Contingencia.
- Apoya desde el punto de vista logístico al coordinador local del PAEMED.
- Colabora en la divulgación general del Plan de Emergencia Médica (capacitaciones, simulacros, etc.)
- Participa en la evaluación del evento y la activación del PAEMED.
- Participa en la formación o selección de la Brigada de Emergencias y motiva a la misma para que sea activa.

18.6 Brigada De Emergencias (Primeros Auxilios)

La empresa actualmente cuenta con una Brigada Integral, la cual es un apoyo fundamental en el Plan de Emergencias, se identificará con con brazalete y tendrá escrito “BRIGADISTA” según corresponda.

Las funciones de esta Brigada se pueden clasificar de acuerdo a las etapas relacionadas con la Emergencia así:

Etapa Preventiva: (antes del evento)

- Conoce y divulga el Plan de Emergencias Médicas.
- Se capacita periódicamente (temas que se deben programar: actitud ante una emergencia, manejo del Botiquín, Signos Vitales, Reanimación Cardio Pulmonar, Curaciones, Hemorragias y heridas, Quemaduras, Fracturas, Inmovilización y transporte, tipos de incendios y control, evacuación, entre otros).
- Está pendiente de las actualizaciones de los mapas con la ubicación de Botiquines, camillas y equipos para emergencias.
- Apoya en la dotación de Botiquines y control del manejo (registros)
- Procura el mantenimiento de la dotación para una mejor atención (Camillas, equipos, sistemas etc.)
- Se comunica periódicamente con el Coordinador general del PAEMED, para sugerir actividades y simulacros.

Etapa Operativa (en el evento)

- Activa y responde a la alarma de manera Rápida, tranquila y segura.

- Se identifica como Brigadista ante el paciente y las demás personas.
- Aplica permanentemente las normas de bioseguridad.
- Alista y transporta el equipo, para atención (según) el evento.
- Atiende los lesionados, aplicando los conocimientos adquiridos durante su capacitación mientras llega la enfermera o el médico de Área Protegida
- Clasifica los lesionados de acuerdo a la severidad de la lesión (Triage) y colabora en la remisión, a (EPS – ARL)
- Apoya al coordinador del PAEMED.
- Colabora con la ayuda externa, de ser necesario.

Etapa Evaluativa

- Informa para la reposición del material y equipo utilizado.
- Participa en la evaluación local del evento (elaboración de informe)

18.7 Grupo de Seguridad Física

- Colabora con el ingreso y salida del grupo de atención.
- Apoya al Médico o a la Brigada de Primeros Auxilios.
- Mantiene despejada el área de curiosos y las vías de acceso a la empresa.
- Si el área del siniestro es considerada de riesgo, coordina con la policía o las Fuerzas Militares el aseguramiento de la zona, para facilitar y autorizar los desplazamientos.

18.8 Personal General de la empresa

- Conocer el PAEMED
- En caso de estar en una Emergencia, avisar rápidamente al jefe inmediato para activar el PAEMED.
- Identificar al Brigadista más cercano e informarle del siniestro.
- Identificar los sistemas de alarmas y su funcionamiento.
- Conocer la ubicación de los Botiquines, camillas y equipos para emergencia.
- Colaborar con las Brigadas, siguiendo las instrucciones de manera ordenada, sin interferir o retardando la acción.

- Si no tiene capacitación adecuada para atender al lesionado prestando un primer auxilio, espere al Brigadista.

18.9 Área de Triage

Es el lugar destinado para la clasificación y atención de heridos, para esto se ha destinado.

Bienestar Institucional – Auditorios.

18.10 Rutas de Desplazamiento Interno

Las rutas de desplazamiento interno serán, las mismas de evacuación las cuales estarán señalizadas y despejadas, también se identificarán en el plano de evacuación.

18.11 Rutas de Desplazamiento Externo

Son las rutas utilizadas para trasladar a los lesionados hasta los centros asistenciales identificados en la Red Asistencial. Por rutas principales y alternas, como información de apoyo, teniendo en cuanta la movilidad que actualmente presenta la ciudad.

19 EVALUACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

- Mínimo una vez al año se reunirán la alta dirección, donde deberán evaluar, revisar y ajustar actualizaciones, independientemente que se haya presentado emergencias o no.
- Extraordinariamente o con presencia de un evento, se harán los ajustes necesarios que sean exigidos por una situación específica dada.
- El responsable SST y/o Coordinador de la brigada de emergencias, dará a conocer los resultados de evaluaciones, cambios y/o ajustes que se realicen, ante toda la empresa.
- La brigada de emergencias se deberá reunir por lo menos una vez cada semestre para establecer acciones de seguimiento al plan y sus componentes de tal manera que se puedan generar acciones de mejora.

Estas reuniones quedarán establecidas en un acta con lo hablado, lo acordado, responsables, recursos y fechas.

FECHA DE MODIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ
04 de diciembre de 2025	Se crea el documento	Lina Marcela Lozada Pimentel / inspectora HSEQ

ANEXO 13. SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE PLANES (PLAN DE TRABAJO SST).

UT Corredores Verdes 2025	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Código: SST-PL-01**
		Versión: 01
	PLAN DE TRABAJO ANUAL	**Fecha: 22/08/2025**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	**2/01/2026**

Convenciones:	SST: Seguridad y Salud en el Trabajo; SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo F: Recursos Financieros, T: Recursos Técnicos y H: Recursos Humanos.	PROGRAMADO: P	CANCELADO: C	EJECUTADO: E

OBJETIVO DEL SG-SST	Prevenir y mitigar los incidentes, accidentes y aparición de enfermedades laborales, a través de la gestión de los peligros y riesgos mediante el establecimiento de una metodología adecuada para la identificación de peligros y valoración de los riesgos que permita priorizar y establecer controles. Evitar la ocurrencia de eventos que puedan afectar a las personas, equipos e instalaciones de la empresa, mediante la aplicación de actividades en promoción y prevención, así como en el establecimiento de procedimientos, programas, protocolos, planes y demás lineamientos necesarios para la seguridad y salud en el trabajo.
ALCANCE	1. PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN: COPASST SST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 4. PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.
METAS	Cumplir con el mantenimiento del SG-SST, Diseño, Documentacion y Actualización; para la vigencia 2026. Planificación de actividades para el año 2026 en la que se incluye entre otras la definición de la matriz legal y presupuesto.

GENERALIDADES DEL PLAN DE TRABAJO	1. Marque con una X según corresponda en las casillas de los recursos si para ejecutar dicha actividad requiere un recurso F: financiero, asignación que tambien se realiza en la designación presupuestal de la empresa, en el cual se contempla las inversiones económicas de los aspectos descritos en el presente plan de trabajo y otros que la empresa identifica para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; Recurso T: Técnico: Contemplan aspectos de inversión en equipos utilizados y su mantenimiento, en el marco de la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. y el Recurso H: Humano: Contemplan aspectos de implementación, documentación, investigación de accidentes y enfermedades laborales, inspección a lugares y puestos de trabajo, capacitación en temas de SST y las demás funciones directas en la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual pueden estar relacionadas las siguientes personas: * COPASST * Miembros del Comité de Convivencia Laboral. * Miembros de la Brigada de emergencia. * Administradora de Riesgos Laborales (ARL). Los recursos seran solicitados de acuerdo a las funciones y competencias de cada trabajador al interior de la empresa. 2. El seguimiento y verificación del cumplimiento del plan de trabajo anual se realizara de forma semestral, con participación del COPASST; el registro del seguimiento quedará en actas de reunion del COPASST, informes de avances (gestión y/o rendición de cuentas), revisión por la dirección, auditorias y/o actas de reunion del asesor externo.

ACTIVIDADES	RECURSOS			RESPONSABLES EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	PLAN DE TRABAJO AÑO 2026			
	F	T	H			ENERO			
						1	2	3	4
Revision y asignación de acta responsable del SG-SST.	X	X	X	Representante Legal	Asignación de responsabilidades, disponibilidad de recursos y validación del cumplimiento del perfil del profesional.		P E		
Establecer Plan de Trabajo para la vigencia.	X	X	X	Representante Legal -Asesor externo	Realizar el proceso para la disponibilidad presupuestal para la vigencia 2026 de los recursos necesarios para el mantenimiento del SG-SST	P E			
Revisión y actualización de la información documentada, incluyendo planes, programas, manuales y demás documentos necesarios para la implementación del SG-SST.	X	X	X	Representante Legal -Asesor externo	Dar inicio a la revisón de la ducumentacion acorde a la empresa.	P E	P E	P E	P E
Apoyar en la definición y asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG-SST	X	X	X	Representante Legal -Asesor externo	Realizar el proceso para la disponibilidad presupuestal para la vigencia 2026 de los recursos necesarios para la implementación del SG-SST				p E
Validación del estado de afiliaciones sin importar la forma de vinculación		X	X	Asesor externo	Descargar reporte mensual de afiliados (Dependientes e Independientes)				P E
Validación, actualización y seguimiento de la matriz de requisitos legales		X	X	Representante Legal -Asesor externo	Validcaión de la matriz legal conforme a la normatividad vigente y aplicabe de la empresa.				
Aplicación de encuesta para elaboración informe del perfil socio demográfico y morbilidad sentida para trabajadores	X	X	X	Asesor externo	Aplicación a todos los trabajadores de la encuesta de perfil sociodemografico				
Revisión y actualización de politicas de acuerdo a la necesidad que se evidencie.	X	X	X	Representante Legal -Asesor externo	Actualizar las politicas de la empresa con relación al SG-SST realizar su publicación y divulgación				P E
Revisión y actualización de Objetivos del SG-SST de acuerdo a la necesidad que se evidencie.	X	X	X	Representante Legal -Asesor externo	Revisión de los objetivos con relacion al SG-SST				P E

Gestionar la convocatoria y conformación del comité de convivencia laboral.		X	X	Responsable del SG-SST	Conformar el comité de convivencia laboral de acuerdo a la normatividad legal vigente			P E	

Gestionar la convocatoria y conformación del comité paritario de segruidad y saluid en el trabajo.		X	X	Responsable del SG-SST	Conformar el comité paritario de segruidad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad legal vigente			**P**	
								E	

OBJETIVO DEL SG-SST	Evitar la ocurrencia de eventos que puedan afectar a las personas, equipos e instalaciones de la empresa mediante la aplicación de actividades en promoción y prevención, así como en el establecimiento de procedimientos, programas, protocolos, planes y demás lineamientos necesarios para la seguridad y salud en el trabajo. Promover la seguridad y salud en el trabajo en la empresa a través de la ejecución de actividades en medicina preventiva que permita adquirir hábitos y estilos de vida saludable que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.
ALCANCE	PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROCEDIMIENTO DE REPORTE, INVESTIGACION Y ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD PROCEDIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PREVENCIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
METAS	Cumplir con las inspecciones programadas en el programa de inspecciones y adelantar las acciones resultado de estas. Realizar el 100% de las investigaciones de los accidentes o incidentes que se presenten, igualmente analizar, hacer seguimiento y gestión de las enfermedades laborales que se lleguen a detectar y hacer seguimiento a los trabajadores que tienen restricciones. Controlando la accidentalidad a cero. Realizar los mantenimientos necesarios para la operatividad de los procesos y la seguridad de los trabajadores. Desarrollar las actividades enfocadas a la promoción y prevención Promover en los trabajadores el Autocuidado Promover el ambiente sano y la convivencia laboral.
GENERALIDADES DEL PLAN DE TRABAJO	Para el cumplimiento de este objetivo se tendran en cuenta las generalidades establecidas para el objetivo anterior, igualmente se contará con el apoyo del COPASST para la ejecución de estas. Los examenes ocupacionales son aplicados al personal vinculado directamente a la empresa cuando ingresa por primera vez, de forma bianual se aplicaran examenes de periodicos.

ACTIVIDADES	**RECURSOS**			**RESPONSABLES EJECUCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**PLAN DE TRABAJO AÑO 2026**			
	F	**T**	**H**			**ENERO**			
						1	2	3	4
Inspecciones de condiciones de seguridad		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST SST	Se deben ejecutar las inspecciones conforme el programa de inspección con participación del COPASST SST y/o Responsable del SG-SST				**P**
									E
Inspecciones lista de chequeo inspecciones a extintores y botiquin		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST SST	Se deben ejecutar las inspecciones conforme el programa de inspección con			**P**	

Inspecciones lista de chequeo inspecciones a extintores y botiquín		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST SST	participación del COPASST SST y/o Responsable del SG-SST			E	
Inspeccion a Vehículos y/o volquetas		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST SST	Se deben ejecutar las inspecciones conforme el programa de inspección con			P	

Inspección a vehículos y/o volquetas		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST SST	participación del COPASST SST y/o Responsable del SG-SST			E	
Investigación de Accidentes en caso de reporte		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST SST	Realizar la investigación de los accidentes cuando estos eventos ocurran.				P
									E
Apoyo en la gestión para exámenes ocupacionales y validación de resultados.	X	X	X	Representante Legal	Se aplicaran los examenes que se evidencien en el profesiograma				P
									E
Analisis y seguimiento de casos ingresados en manual de rehabilitación: Restricciones, recomendaciones y reubicación		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST SST	Analisis y seguimiento de casos con restricciones, rreubicación de personal		P		
							E		
Socialización de los resultados de condiciones de salud de acuerdo a los resultados de examanes ocupacionales		X	X	Responsable del SG-SST	Cuando se tengan los resultados de los examenes se deben compartir con los trabajadores y hacer seguimiento a estos para la toma de acciones hacer seguimiento a las recomendaciones medicas (control de tension arterial, peso				P
									E
Apoyo en el proceso de entrega de dotación y de elementos de protección personal.	X	X	X	Representante Legal	La empresa entrega la dotación conforme la normatividad				P
									E

OBJETIVO DEL SG-SST	Fortalecer, promover, comunicar y sensibilizar los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, manteniendo comunicación constante y veraz con los trabajadores, contratista, comunidad y demás partes interesadas de la empresa.
ALCANCE	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN:COPASST Y COVILA PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN
METAS	Realizar las CAPACITACIONES con participación de los trabajadores de la empresa, incluyento contratistas. Ejecutar la Inducción y Reinducción Lograr la toma de conciencia por parte de los trabajadores a través de la ejecución de las actividades.
GENERALIDADES DEL PLAN DE TRABAJO	Para el cumplimiento de este objetivo se tendran en cuenta las generalidades establecidas para el objetivo anterior, igualmente se contará con el apoyo del COPASST para la ejecución de estas.

ACTIVIDADES	**RECURSOS**			**RESPONSABLES EJECUCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**PLAN DE TRABAJO AÑO 2026**			
	F	**T**	**H**			**ENERO**			
						1	2	3	4

Realizar inducción o reinducción de SST y evaluación de eficacia de la inducción	X	X	X	Responsable del SG-SST	Se debe incluir en la inducción o reinducción los peligros a los que se expone el trabajador. Se desarrollara uno para el primer trimestre y se seguiran ejecutando de acuerdo a la necesidad.				**P**
									E

COPASST Y COVILA: Socialización en funciones y responsabilidades	X	X	X	COPASST SST- responsable del SG-SST	capacitación al COPASST SST / COVILA con respecto a las funciones y responsabilidades			P	
								E	
Importancia del Uso Correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP)	X	X	X	COPASST SST- responsable del SG-SST	Sensibilizar al personal sobre la importancia del uso permanente y adecuado de los EPP (guantes, botas, casco, gafas, chaleco reflectivo, protector solar), como medida fundamental para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.		P		
							E		
PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOMECANICO Orientar en la prevención de eventos que pueden ocurrir respecto a las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la manipulación de cargas y la realización de fuerzas importantes con el fin de prevenir incidentes, accidentes o eventos de enfermedad laboral.	X	X	X	Responsable del SG-SST	Capacitar a los trabajadores en técnicas seguras para el levantamiento, transporte y manipulación manual de cargas (tierra, herramientas, residuos vegetales), con el fin de prevenir lesiones musculoesqueléticas, lumbalgias y sobreesfuerzos durante el desarrollo de las labores.			P	
								E	
Capacitación en Socialización del Protocolo de Bioseguridad	X	X	X	COPASST SST- responsable del SG-SST	Dar a conocer y reforzar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad e higiene personal, orientados a la prevención de enfermedades transmisibles, garantizando ambientes de trabajo seguros			P	
								E	
IMPORTANCIA DEL USO Y CUIDADO DE LOS EPP	X	X	X	COPASST SST- responsable del SG-SST	*Capacitación en uso, cuidado, mantinimiento y almacenamiento de los EPP´s		P		
							E		

	ENERO
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**26**
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	**26**
CUMPLIMIENTO MES A MES	**100%**
CUMPLIMIENTO ANUAL	**TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

ELABORÓ		**APROBÓ**
LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL		**EDISON RAMIRO CASTRO HERNÁNDEZ**
INSPECTORA HSEQ		REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 14. LISTADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA.

ADMINISTRATIVOS

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	DIRECCION	CORREO	CELULAR	EPS	AFP	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	LUIS FERNANDO SUAREZ DELGADO	13719287	Residente de obra	CALLE 11 AN 5 108 BARRIO EL BOSQUE NAPOLES	lfsuadel@hotmail.com	3115105923	Sanitas	protección	1423500	24/12/2025	
2	José Alexander Salazar Goyeneche	13928770	Profesional Ambiental	Avenida 8 # 9-185 MZ D Casa D4 Conjunto Pinares	aleksalaz@hotmail.com	3112813737	Nueva EPS	Colpensiones	1423500	24/12/2025	
3	JESUS ALBEIRO GUTIERREZ PEÑARANDA	13195283	Tecnologo agropecuari	CALLE 29 15 40 VISTA HERMOSA VILLAROSARIO	jalbeiro55@hotmail.com	3133960831	Sanitas	Colpensiones	1423500	24/12/2025	
4	ANGELA GIOCONDA JAIMES CORONADO	1096952550	Director de Obra	Conjunto Sanara House CASA H185- Cúcuta	angelajaimes88@gmail.com	3145353086	Nueva EPS	Porvenir	1423500	24/12/2025	
5	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL	1096249395	Inpsector HSEQ	CALLE 25 Nª 11-40 BELLAVISTA	linamark12@hotmail.com	3158849134	Nueva EPS	Porvenir	1423500	24/12/2025	
6	CASTRO HERNANDEZ EDINSON RAMIRO	1090379197	REPRESENTANTE LEGA	Casa G4 conjunto venetto club house	Edcas06@gmail.com	3022716357	Nueva EPS	Colpensiones	1423500	20/12/2025	
7	Ariana Prhistley Hernandez Bohorquez	1090461423	ARQUITECTA	calle 1n #16e-02 conjunto parque real	Arianahboho@gmail.com	3102955002	Nueva EPS	Porvenir	1423500	29/12/2025	

OPERATIVOS

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	DIRECCION	CORREO	CELULAR	EPS	AFP	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	JARDINERO	Manzana e lote 20 nora puyana chinácota	juanmfernandez850@gmail.com	3224069402	Nueva EPS	Colpensiones	1423500	29/12/2025	
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	JARDINERO	Fca Monteverde KM 3 vda mansanares, Chinácota N de S	alanrea95@gmail.com	3143851338	Sanitas	Porvenir	1423500	29/12/2025	
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	JARDINERO	kdx 13 vda san isidro Cucuta	juanmigar275@gmail.com	3224679274	Sanitas	protección	1423500	29/12/2025	
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	JARDINERO	BARRIO NOHORA PUYANA MANZANA A CASA 7-CHINACOTA	miguelhumbertotoloza@gmail.com	3148896649	Nueva EPS	Porvenir	1423500	30/12/2025	
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	JARDINERO	manzana f casa 8 barrio 4 julio chinacota	freddybenitez903@gmail.com	3208336066	Nueva EPS	Porvenir	1423500	30/12/2025	
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	JARDINERO	cra 8 # 4an-10 Chinacota	luiskarloz1991@gmail.com	3169660898	Nueva EPS	Porvenir	1423500	30/12/2025	
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	JARDINERO	Crra 10 #14-27 La Palmita Villa Rosario	Samueljosemartinezgonzales@gm	3124946568	Nueva EPS	Proteccion	1750905	5/01/2026	
8	WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN	1127595181	JARDINERO	Crra 10 #14-27 La Palmita Villa Rosario	Wilmerpalacin.55@gmail.com	3112955940	Nueva EPS	Porvenir	1750905	5/01/2026	27/01/2026
9	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	JARDINERO	barrio 4 de julio manzana M Chinacota	Danaty950@hotmail.com	3224635357	Coosalud	Porvenir	1750905	5/01/2026	
10	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6914058	JARDINERO	Crra 10 #14-27 La Palmita Villa Rosario	Villalbafreddy@gmail.com	3171730511	Coosalud	Proteccion	1750905	5/01/2026	
11	LUIS JOSE GARRIDO RIVAS	PPT 5330612	JARDINERO	Carrera 13 8.87 barrio gramalote VR	luisgarridorivas.2024@gmail.com	3212732089	Nueva EPS	Porvenir	1750905	23/01/2026	
12	WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO	1092342880	JARDINERO	calle 11 #10-43 B. El Paramo VR	wilmertorres205@gmail.com	3232116996	Nueva EPS	Porvenir	1750905	23/01/2026	
13	JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCOURT	1092386993	JARDINERO	Carrera 13 8.87 barrio gramalote VR	usecheyunior54@gmail.com	3214223259	Nueva EPS	Porvenir	1750905	23/01/2026	

ANEXO 15. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA (ASISTENCIA).

UT Corredores Verdes 2025

CONTROL DIARIO PERSONAL DE OBRA

Control de asistencia: 05 de Enero al 11 de Enero 2026

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090176835	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN	1127595151	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6914058	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11										
12										
13										
14										
15										

ALAN LÓPEZ

ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ

CC. 1090177446

AYUDANTE ENCARGADO DE LA ASISTENCIA

UT Corredores Verdes
2025

CONTROL DIARIO PERSONAL DE OBRA

Control de asistencia: 12 de Enero al 18 de Enero 2026

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	Ayudante	FESTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	Ayudante		✓	✓	✓	✓	✓	
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	Ayudante		✓	✓	✓	✓	✓	
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176580	Ayudante		✓	✓	✓	✓	✓	
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	Ayudante		✓	✓	✓	✓	✓	
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	Ayudante		✓	✓	✓	✓	✓	
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	Ayudante		✓	✓	✓	✓	✓	
8	WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN	1127595181	Ayudante		✓	✓	✓	✓	✓	
9	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	Ayudante		✓	✓	✓	✓	✓	
10	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6814058	Ayudante		✓	✓	✓	✓	✓	
11										
12										
13										
14										
15										

ALAN 1090

ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ
CC. 1090177446
AYUDANTE ENCARGADO DE LA ASISTENCIA

UT Corredores Verdes 2025

CONTROL DIARIO PERSONAL DE OBRA

Control de asistencia: 19 de Enero al 25 de Enero 2026

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN	1127595181	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6914058	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	LUIS JOSE GARRIDO RIVAS	PPT 5330612	Ayudante					✓	✓	
12	WILNER ALEXANDER TORRES	1092542850	Ayudante					✓	✓	
13	JUNIOR ALEXANDER USECHE	1092386993	Ayudante					✓	✓	
14										
15										

ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ
CC. 1090177446
AYUDANTE ENCARGADO DE LA ASISTENCIA

UT Corredores Verdes
2025

CONTROL DIARIO PERSONAL DE OBRA

Control de asistencia: 26 de Enero al 01 de Febrero 2026

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN	1127595181	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6914058	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	LUIS JOSE GALLO RIVAS	PPT 5330612	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	WILNER ALEXANDER TORRES	1092342880	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	JUNIOR ALEXANDER USECHE	1092386913	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14										
15										

ALAN LOPEZ

ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ

CC. 1090177446

AYUDANTE ENCARGADO DE LA ASISTENCIA

ANEXO 16. EXÁMENES DE INGRESO.

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 29/12/2025 HORA 10:37:58 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ

PPT : 7143344 **DE** BOGOTA

CARGO JARDINERO

DIRECCION CALLE 13 #17-41 BARRIO EL PARAMO V/R

TELEFONO 3124946568 **EDAD** 28 **GENERO** M **RH** ---

A.F.P. OTRO **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

REMITIDO A PYP : SI; ENTREGA DE REMISIÓN A PYP : SI

RECOMENDACIONES : HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS. PAUSAS ACTIVAS Y COMPENSADORAS. CAPACITACION SOBRE RIESGO BIOMECANICO, FISICO, PSICOSOCIAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECANICO), PARA LABORES EN SUPERFICIE. USO DE EPP CON BASE EN EL RIESGO, CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HSI ESTABLECIDOS EN LA EMPRESA Y BIOSEGURIDAD CON BASE EN LINEMIENTOS DEL SG.SST DE LA EMPRESA. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

INGRESA AL SVE Cardiovascular Psicosocial

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

JEAN CARLOS CLARO PORTILLO
C.C. 1093779746
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 1093779746 - LICENCIA S.O.3368

SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ
PPT : 7143344

71433442912 2025

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 29/12/2025 HORA 10:34:33 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN

CC : 1127595181 **DE** BOGOTA

CARGO JARDINERO

DIRECCION VILLA DEL ROSARIO LA PALMITA

TELEFONO 3112955940 **EDAD** 28 **GENERO** M **RH** O+

A.F.P. OTRO **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, CAPACITAR EN RIESGOS LABORALES Y PREVENCION, DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICOS SEGUN LOS RIESGOS DEL CARGO, MANTENER CORRECTA HIGIENE POSTURAL, CAPACITAR EN ADECUADO MANEJO DE CARGAS Y PAUTAS DE ERGONOMIA Y BIOMECANICA, CUMPLIR LAS NORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, PAUSAS ACTIVAS Y COMPENSADORAS.

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANDRES DAVID RAMIREZ BECERRA
C.C. 1090426889
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 1090426889 - LICENCIA S.O.2800

WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN
CC : 1127595181

*1127595181291220

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 29/12/2025 HORA 10:16:20 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE ISMAEL MEJIA CAICEDO

CC : 88001405 **DE** CHINACOTA

CARGO JARDINERO

DIRECCION MANZANA L CASA 2 BARRIO CUATRO DE JULIO CHINACOTA

TELEFONO 3224635357 **EDAD** 56 **GENERO** M **RH** A+

A.F.P. OTRO **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** COOSALUD

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, CAPACITAR EN RIESGOS LABORALES Y PREVENCION, DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICOS SEGUN LOS RIESGOS DEL CARGO, MANTENER CORRECTA HIGIENE POSTURAL, CAPACITAR EN ADECUADO MANEJO DE CARGAS Y PAUTAS DE ERGONOMIA Y BIOMECANICA, CUMPLIR LAS NORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, PAUSAS ACTIVAS Y COMPENSADORAS.

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANDRES DAVID RAMIREZ BECERRA
C.C. 1090426889
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 1090426889 - LICENCIA S.O.2800

ISMAEL MEJIA CAICEDO
CC : 88001405

*880014052912 2025

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 29/12/2025 HORA 10:41:32 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE FREDDY JESUS VILLALBA MATA

PPT : 6914058 **DE** BOGOTA D.C

CARGO JARDINERO

DIRECCION CONDOMINIO LA PALMITA-V/R

TELEFONO 3171730511 **EDAD** 19 **GENERO** M **RH** NI

A.F.P. OTRO **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** OTRO

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO CON LOS RIESGOS DEL CARGO, MANTENER CORRECTA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, CUMPLIR NORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGUIR DIRECTRICES DEL SG- SST DE LA EMPRESA, PAUSAS ACTIVAS Y COMPENSADORAS, MANEJO MEDICO-NUTRICIONAL/RCV EN LA EPS, PROMOVER HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE.

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

RAFAEL IGNACIO RAGUA GUERRERO
C.C. 13352247
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 13352247 - LICENCIA S.O.5128

FREDDY JESUS VILLALBA MATA
PPT : 6914058

69140582912 2025

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 17/01/2026 HORA 10:02:38 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE LUIS JOSE GARRIDO RIVAS

PPT : 5330612 **DE** BOGOTA

CARGO JARDINERO

DIRECCION LUIS JOSE GARRIDO RIVAS

TELEFONO 3212732089 **EDAD** 30 **GENERO** M **RH** ---

A.F.P. OTRO **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** OTRO

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, CAPACITACION SOBRE TRABAJO SEGURO, RIESGO BIOMECANICO Y PSICOLABORAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANGELA MARIA BARRIOS ROJAS
C.C. 1090374591
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 3376 - LICENCIA S.O.005238

LUIS JOSE GARRIDO RIVAS
PPT : 5330612

5330612712026

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 16/01/2026 HORA 11:29:12 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO

CC : 1092342880 **DE** VILLA ROSARIO

CARGO JARDINERO

DIRECCION CALLE 11 # 10-43 BARRIO EL PARAMO - V/R

TELEFONO 3232116996 **EDAD** 36 **GENERO** M **RH** A+

A.F.P. PORVENIR **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : SE SUGIERE: HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS. PAUSAS ACTIVAS Y COMPENSADORAS. CAPACITACION SOBRE RIESGO BIOMECANICO, FISICO, PSICOSOCIAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECANICO), PARA LABORES EN SUPERFICIE. USO DE EPP CON BASE EN EL RIESGO, CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HSI ESTABLECIDOS EN LA EMPRESA Y BIOSEGURIDAD CON BASE EN LINEMIENTOS DEL SG.SST DE LA EMPRESA. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

FEDERICO MIGUEL MARQUEZ H.
C.C. 8724372
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 6998 - LICENCIA S.O.1832

WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO
CC : 1092342880

*1092342880161202

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 16/01/2026 HORA 11:14:44 — **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCOURT

CC : 1092386993 **DE** VILLA DEL ROSARIO

CARGO JARDINERO

DIRECCION CARRERA 13 8 87 BARRIO GRAMLOTE

TELEFONO 3214223259 **EDAD** 27 **GENERO** M **RH** O+

A.F.P. OTRO **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : HIGIENE POSTURAL. PAUSAS ACTIVAS Y COMPENSADORAS. CAPACITACION SOBRE RIESGO BIOMECANICO, FISICO Y TRABAJO SEGURO APLICACION DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS EN LA EMPRESA EN EL SG-SST. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

JEAN CARLOS CLARO PORTILLO
C.C. 1093779746
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 1093779746 - LICENCIA S.O.3368

JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCOURT
CC : 1092386993

*1092386993161202

ANEXO 17. CERTIFICADO EPS

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 19/01/2026, el empleador UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 identificado con NIT número 902018300 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9805020	19/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1127595181	WILMERAUGUSTO CARRUYO PALACIN	1750905	JARDINERO	2026-01-05

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 23/01/2026, el empleador UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 identificado con NIT número 902018300 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9843140	23/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	5330612	LUISJOSE GARRIDO RIVAS	1750905	AYUDANTE AGRICOLA	2026-01-23

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 23 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 19/01/2026, el empleador UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 identificado con NIT número 902018300 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9804989	19/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	7143344	SAMUELJOSE MARTINEZ GONZALEZ	1750905	JARDINERO	2026-01-05

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia										
Tipo Ident.	**Número de Ident.**	**Nombres**	**Apellidos**	**Fecha de Afiliación**	**Departamento**	**Ciudad**	**Dirección**	**Teléfono**	**Regimen**	**Estado**
CC	88001405	ISMAEL	MEJIA CAICEDO	10/08/2021 12:00:00 a. m.	NORTE DE SANTANDER	CHINACOTA	CL 5 # 4 - 3	6106101	Contributivo	Activo

Informacion del Aportante				
NIT/CC	**Razon Social**	**Estado**	**Rango Cotizante**	**Fecha Vinculacion**
902018300	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	N		05/01/2026

La anterior certificación se expide y firma, a los 14 días del mes de Enero de 2026, a solicitud del interesado y es válida hasta los 14 días del mes de Febrero de 2026

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 23/01/2026, el empleador UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 identificado con NIT número 902018300 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9843157	23/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1092342880	WILMERALEXANDER TORRES GALINDO	1750905	AYUDANTE AGRICOLA	2026-01-23

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 23 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 23/01/2026, el empleador UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 identificado con NIT número 902018300 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9843165	23/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1092386993	JUNIORALEXANDER USECHE BETANCOURT	1750905	AYUDANTE AGRICOLA	2026-01-23

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 23 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia										
Tipo Ident.	**Número de Ident.**	**Nombres**	**Apellidos**	**Fecha de Afiliación**	**Departamento**	**Ciudad**	**Dirección**	**Teléfono**	**Regimen**	**Estado**
PT	6914058	FREDDY JESUS	VILLALBA MATA	1/11/2024 12:00:00 a. m.	VALLE	SANTIAGO DE CALI	CL 5 # 5 - 7		Contributivo	Activo

Informacion del Aportante				
NIT/CC	**Razon Social**	**Estado**	**Rango Cotizante**	**Fecha Vinculacion**
902018300	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	N		05/01/2026

La anterior certificación se expide y firma, a los 14 días del mes de Enero de 2026, a solicitud del interesado y es válida hasta los 14 días del mes de Febrero de 2026

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

ANEXO 18. CERTIFICADO AFP.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ISMAEL MEJIA CAICEDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **88.001.405**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 7 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.092.342.880**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Enero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCOURT, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.092.386.993**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Enero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Protección
Pensiones y Cesantías
NIT: 800138188

Pensión obligatoria

Datos básicos

Información general

Número de Solicitud	Lugar de solicitud	Campaña	Foco de gestión
1001569272	COL, ANTIOQUIA, MEDELLÍN	SIN CAMPAÑA	*****

Fecha de solicitud	Tipo de afiliación	Traslado AFP - Pensión familiar	AFP administradora anterior
21-01-2026	Vinculación inicial	*****	*****

Traslado de Régimen - Pensión familiar	Régimen administrador anterior	Administradora hacia la cual se solicita el traslado
*****	*****	*****

Información personal

Tipo de documento	Número documento de identidad	Nacionalidad	Lugar de expedición
PERMISO PROTECCION TEMPORAL	6914058	VENEZUELA	COL, BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ

Fecha de expedición	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
03-02-2023	FREDDY	JESUS	VILLALBA	MATA

Fecha de nacimiento	Lugar de nacimiento	Género
15-06-2006	VEN, CARACAS, CARACAS	MASCULINO

Lugar de residencia	Dirección de residencia
COL, NORTE DE SANTANDER, CÚCUTA	Otros BARRIO LA PALMITA

Correo electrónico	Autorizo el envío de correspondencia y notificaciones al correo electrónico	Autorizo el envío de información a:
villabafreddy@gmail.com	Si	*****

Teléfono celular	Autorizo el envío de información al celular	Teléfono fijo	Ciudad del teléfono
3171730511	Si	*****	*****

Dirección de oficina	Lugar de ubicación de la oficina
*****	*****

Beneficiarios

Beneficiarios
No

Apellidos y Nombres	Sexo	Número identificación	Tipo identificación	Fecha nacimiento	Código parentesco
*****	*****	*****	*****	*****	*****

*** Códigos parentesco: 01 Cónyuge 02 Compañero permanente 03 Padres 04 Hijo 05 Hijo inváido 06 Hermano invalído.**

Los beneficiarios relacionados serán válidados de acuerdo a las normas legales vigentes.

Datos laborales

Protección
Pensiones y Cesantías
NIT: 800138188

Pensión obligatoria

Datos laborales

Tipo de afiliado

Tipo de afiliado	Ha cotizado más de 150 semanas en	Cuál(es)
Dependiente	*****	*****

Trabajador dependiente/asociado

Tipo identificación empleador	CTA/EAT	Número identificación empleador (Sin dígito de verificación)	Nombre o razón social
NIT		902,018,300	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Ciudad empleador	Dirección correspondencia empleador
COL, NORTE DE SANTANDER, CÚCUTA	Otros MZ 41 LT 3 BRR CLARET

Correo electrónico empleador	Teléfono fijo	Teléfono celular
corredoresverdes2025@gmail.com	2726357	3022726357

Ocupación o cargo actual	Salario integral	Salario mensual	Fecha ingreso empresa
OTROS	No	$ 2,000,000	09-01-2026

Es PEP o tiene familiar PEP (Persona expuesta públicamente)	Clasificación PEP
No	*****

Representante Comercial

Tipo identificación	Identificación	Nombre
CC	1090467060	Julieth Calderon

Tratamiento de datos

VOLUNTAD DE SELECCIÓN Y AFILIACIÓN

Hago constar que la selección del Régimen de ahorro individual con solidaridad lo he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a PROTECCIÓN S.A para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.
El afiliado tiene el derecho a retractarse de su decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la que se le informe de la validación de la afiliación o del traslado por parte de la administradora seleccionada.

DECLARACIONES DEL TITULAR

a. Declaro que toda la información suministrada por mí a PROTECCIÓN es verdadera.
b. Conozco los derechos y las condiciones aplicables para el tratamiento de datos personales, acorde con la política de tratamiento de datos personales de PROTECCIÓN y su aviso de privacidad que se encuentran publicadas en la página web www, protección.com.
c. He sido informado acerca de la no obligatoriedad de las respuestas a las preguntas que me sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles, tales como origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos o sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes

OBLIGACIONES LAVADO DE ACTIVOS

Tratamiento de datos

1. Me obligo con PROTECCIÓN a actualizar mi información como mínimo una vez al año, a suministrar los documentos exigidos por la ley en el momento que estos sean solicitados para el control de lavados de activos y a indicar la procedencia de los depósitos.

TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES

En los términos de la ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013 (compilado en el decreto único reglamentario 1074 de 2015), no estás obligado a autorizar el tratamiento de aquella información considerada como sensible (Ejemplo: religión, filiación política, origen étnico, afiliación sindical, orientación sexual, entre otros). No obstante, debes saber que PROTECCIÓN en cumplimiento de disposiciones normativas emanadas del sistema de seguridad social (Ley 100 de 1993) y por instrucciones de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, está obligada a realizar tratamiento sobre este tipo de datos (Ejemplo: Historia clínica, datos de beneficiarios menores de edad, datos biométricos para validación de identidad, grabación de imágenes en oficinas de servicio) única y exclusivamente para la materialización de los siguientes propósitos y/o finalidades:
- Para validar y verificar tu identidad en transacciones incluyendo cuando sea requerido, la consulta y reproducción de datos sensibles tales como la huella digital, imágenes, videos o voz, entre otros.
- Para monitorear las condiciones de seguridad en las oficinas de servicio mediante sistemas de videovigilancia.
- Para garantizar la prestación de los servicios relacionados con: el reconocimiento de incapacidades médicas, reconocimiento de la pensión de sobreviviente para los beneficiarios menores de edad y el reconocimiento de la pensión de invalidez para aquellas personas que han sufrido una pérdida de la capacidad laboral.

AUTORIZACIÓN DE RECOLECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES

1.Autorizo a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A. en adelante PROTECCIÓN y a todas aquellas entidades del sistema general de seguridad social, Asofondos y a quienes en el futuro ostenten los derechos de los aquí autorizados, a realizar el tratamiento de mis datos personales, actividades que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión, transferencia y supresión, para los finen enunciados en la política de tratamiento de datos personales de PROTECCIÓN, documento que he leído y me fue suministrado con la afiliación.

2.Autorizo a PROTECCIÓN para que comparta mi información personal con terceros con quienes haya celebrado alianzas y/o con proveedores con el propósito de cumplir con el objeto social, prestar adecuadamente el servicio, gestionar riesgos, atender reclamos y realizar gestión comercial, conforme a la normatividad vigente. Si quieres conocer con quiénes compartimos tu información, puedes acceder al siguiente enlace: https://www.proteccion.com/contenidos/persona/cesantias/ley-proteccion-datos-personales
si

3.Autorizo a PROTECCIÓN para enviar información de uso comercial o publicitaria relacionada con nuestros productos, servicios, eventos o alianzas, a través de medios físicos o virtuales registrados.
si

Información de firma con apoderado

¿Firma con apoderado?
No

Tipo de documento	Número documento de identidad	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido
*****	*****	*****	*****	*****

Segundo Apellido
*****

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.127.595.181**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 7 de Enero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El (La) Señor(a) **LUIS JOSE GARRIDO RIVAS**, identificado(a) con Permiso de Proteccion Temporal **5.330.612**, se encuentra afiliado(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR con VINCULACION INICIAL** desde el 10 de febrero de 2023.

La presente certificación se expide el 02 de febrero de 2026.

Cordialmente,

Gerente de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Protección
Pensiones y Cesantías
NIT: 800138188

Pensión obligatoria

Datos básicos

Información general

Número de Solicitud	Lugar de solicitud	Campaña	Foco de gestión
1001569261	COL, ANTIOQUIA, MEDELLÍN	SIN CAMPAÑA	*****

Fecha de solicitud	Tipo de afiliación	Traslado AFP - Pensión familiar	AFP administradora anterior
21-01-2026	Vinculación inicial	*****	*****

Traslado de Régimen - Pensión familiar	Régimen administrador anterior	Administradora hacia la cual se solicita el traslado
*****	*****	*****

Información personal

Tipo de documento	Número documento de identidad	Nacionalidad	Lugar de expedición
PERMISO PROTECCION TEMPORAL	7143344	VENEZUELA	COL, BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ

Fecha de expedición	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
08-06-2023	SAMUEL	JOSE	MARTINEZ	GONZALEZ

Fecha de nacimiento	Lugar de nacimiento	Género
16-09-1997	VEN, CARACAS, CARACAS	MASCULINO

Lugar de residencia	Dirección de residencia
COL, NORTE DE SANTANDER, CÚCUTA	Otros BARRIO LA PALMITA

Correo electrónico	Autorizo el envío de correspondencia y notificaciones al correo electrónico	Autorizo el envío de información a:
samueljosemartinezgonzales@gmail.com	Si	*****

Teléfono celular	Autorizo el envío de información al celular	Teléfono fijo	Ciudad del teléfono
3124946568	Si	*****	*****

Dirección de oficina	Lugar de ubicación de la oficina
*****	*****

Beneficiarios

Beneficiarios
No

Apellidos y Nombres	Sexo	Número identificación	Tipo identificación	Fecha nacimiento	Código parentesco
*****	*****	*****	*****	*****	*****

*** Códigos parentesco: 01 Cónyuge 02 Compañero permanente 03 Padres 04 Hijo 05 Hijo inváido 06 Hermano invalído.**

Los beneficiarios relacionados serán válidados de acuerdo a las normas legales vigentes.

Datos laborales

Datos laborales

Tipo de afiliado

Tipo de afiliado	Ha cotizado más de 150 semanas en	Cuál(es)
Dependiente	*****	*****

Trabajador dependiente/asociado

Tipo identificación empleador	CTA/EAT	Número identificación empleador (Sin dígito de verificación)	Nombre o razón social
NIT		902,018,300	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Ciudad empleador	Dirección correspondencia empleador
COL, NORTE DE SANTANDER, CÚCUTA	Otros MZ 41 LT 3 BRR CLARET

Correo electrónico empleador	Teléfono fijo	Teléfono celular
CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM	2726357	3022726357

Ocupación o cargo actual	Salario integral	Salario mensual	Fecha ingreso empresa
OTROS	No	$ 2,000,000	09-01-2026

Es PEP o tiene familiar PEP (Persona expuesta públicamente)	Clasificación PEP
No	*****

Representante Comercial

Tipo identificación	Identificación	Nombre
CC	1090467060	Julieth Calderon

Tratamiento de datos

VOLUNTAD DE SELECCIÓN Y AFILIACIÓN

Hago constar que la selección del Régimen de ahorro individual con solidaridad lo he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a PROTECCIÓN S.A para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.
El afiliado tiene el derecho a retractarse de su decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la que se le informe de la validación de la afiliación o del traslado por parte de la administradora seleccionada.

DECLARACIONES DEL TITULAR

a. Declaro que toda la información suministrada por mí a PROTECCIÓN es verdadera.
b. Conozco los derechos y las condiciones aplicables para el tratamiento de datos personales, acorde con la política de tratamiento de datos personales de PROTECCIÓN y su aviso de privacidad que se encuentran publicadas en la página web www, protección.com.
c. He sido informado acerca de la no obligatoriedad de las respuestas a las preguntas que me sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles, tales como origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos o sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes

OBLIGACIONES LAVADO DE ACTIVOS

Tratamiento de datos

1. Me obligo con PROTECCIÓN a actualizar mi información como mínimo una vez al año, a suministrar los documentos exigidos por la ley en el momento que estos sean solicitados para el control de lavados de activos y a indicar la procedencia de los depósitos.

TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES

En los términos de la ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013 (compilado en el decreto único reglamentario 1074 de 2015), no estás obligado a autorizar el tratamiento de aquella información considerada como sensible (Ejemplo: religión, filiación política, origen étnico, afiliación sindical, orientación sexual, entre otros). No obstante, debes saber que PROTECCIÓN en cumplimiento de disposiciones normativas emanadas del sistema de seguridad social (Ley 100 de 1993) y por instrucciones de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, está obligada a realizar tratamiento sobre este tipo de datos (Ejemplo: Historia clínica, datos de beneficiarios menores de edad, datos biométricos para validación de identidad, grabación de imágenes en oficinas de servicio) única y exclusivamente para la materialización de los siguientes propósitos y/o finalidades:
- Para validar y verificar tu identidad en transacciones incluyendo cuando sea requerido, la consulta y reproducción de datos sensibles tales como la huella digital, imágenes, videos o voz, entre otros.
- Para monitorear las condiciones de seguridad en las oficinas de servicio mediante sistemas de videovigilancia.
- Para garantizar la prestación de los servicios relacionados con: el reconocimiento de incapacidades médicas, reconocimiento de la pensión de sobreviviente para los beneficiarios menores de edad y el reconocimiento de la pensión de invalidez para aquellas personas que han sufrido una pérdida de la capacidad laboral.

AUTORIZACIÓN DE RECOLECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES

1.Autorizo a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A. en adelante PROTECCIÓN y a todas aquellas entidades del sistema general de seguridad social, Asofondos y a quienes en el futuro ostenten los derechos de los aquí autorizados, a realizar el tratamiento de mis datos personales, actividades que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión, transferencia y supresión, para los finen enunciados en la política de tratamiento de datos personales de PROTECCIÓN, documento que he leído y me fue suministrado con la afiliación.

2.Autorizo a PROTECCIÓN para que comparta mi información personal con terceros con quienes haya celebrado alianzas y/o con proveedores con el propósito de cumplir con el objeto social, prestar adecuadamente el servicio, gestionar riesgos, atender reclamos y realizar gestión comercial, conforme a la normatividad vigente. Si quieres conocer con quiénes compartimos tu información, puedes acceder al siguiente enlace: https://www.proteccion.com/contenidos/persona/cesantias/ley-proteccion-datos-personales
si

3.Autorizo a PROTECCIÓN para enviar información de uso comercial o publicitaria relacionada con nuestros productos, servicios, eventos o alianzas, a través de medios físicos o virtuales registrados.
si

Información de firma con apoderado

¿Firma con apoderado?
No

Tipo de documento	Número documento de identidad	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido
*****	*****	*****	*****	*****

Segundo Apellido
*****

ANEXO 19. CERTIFICADO ARL.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1127595181
Nombre:	WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN
Fecha Ingreso:	05/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	04/01/2026 07:41:11 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	5330612
Nombre:	LUIS JOSE GARRIDO RIVAS
Fecha Ingreso:	23/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	22/01/2026 05:10:49 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	7143344
Nombre:	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Fecha Ingreso:	05/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	04/01/2026 07:35:55 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	88001405
Nombre:	ISMAEL MEJIA CAICEDO
Fecha Ingreso:	05/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	04/01/2026 07:46:40 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1092342880
Nombre:	WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO
Fecha Ingreso:	23/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	22/01/2026 04:59:49 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1092386993
Nombre:	JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCOURTH
Fecha Ingreso:	23/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	22/01/2026 05:05:27 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	6914058
Nombre:	FREDDY JESUS VILLALBA MATA
Fecha Ingreso:	05/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	04/01/2026 07:52:22 p. m.

ANEXO 20. EXÁMENES DE RETIRO

UT Corredores Verdes 2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-FO-18
		VERSION: 01
	ORDEN DE SERVICIOS	FECHA: 29-11-2025

FECHA: 27 de enero de 2026

Señores:
IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
Calle 21° # 0B-75 Barrio EL ROSAL - **5469755 -3042479156 - 3172352910**

Por medio de la presente se autoriza al siguiente personal, para la realización de los Exámenes Médicos Laborales.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
WILMER AUGUSTO CARRUYO PALACIN	1127595181	JARDINERO

TIPO DE EXAMEN:

Ingreso		Periodico		Retiro	X	Post-Incapacidad	
Valoracion Médica		Cambio de oficio					

MARCAR CON UNA X EN LOS CUADROS

Examen Médico	X	Optometría		Audiometría		Espirometría	
RX Columna		Rx Tórax		Psicología		Coordinación Motriz	
EXÁMENES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: Examen Médico, optometria, audiometria, glicemia, colesterol, triglicéridos		**EXÁMENES PARA ESPACIOS CONFINADOS** Examen Médico, Optometría Audiometría glicemia, Colesterol, triglicéridos Espirometría Psicología		**EXÁMENES PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS:** K.O.H uñas Frotis de garganta Coprologico		Hemoclasificación	
						Cuadro hemático	
						Perfil Lipidico completo	
						Curso Teórico práctico	
						Curso de manipulacion de alimentos - virtual	
						Valoracion con Fisioterapeuta	
EKG > 40 años		sustancias Psicoactivas Cocaina - Marihuana		Pool de drogas		Vacunacion: Cual?	

NOTAL: Preséntese con cedula original, no llevar acompañante, usar tapabocas, presentarse con las historias clinicas; se atendará por orden llegada hora de inicio desde las 06:00 a.m.

HORARIOLABORAL

Lunes - Viernes	Sábados
06:00 a.m. -12:00 m	06:00 a.m. -12:00 m
02:00 p.m.- 05:00 p.m	

Wilmer Carruyo

FIRMA

ANEXO 21. PLANILLA DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET	3022726357	CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36227624	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.913.800	5.500	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
20	36227624	2026-02-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13195283	GUTIERREZ PEÑARANDA JESUS ALBEIRO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
2	CC 13719287	SUAREZ DELGADO LUIS FERNANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
3	CC 13928770	SALAZAR GOYENECHE JOSE ALEXANDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
4	CC 88001405	MEJIA CAICEDO ISMAEL	1.750.905	F	X															0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.517.451	242.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.517.451	60.700	COMFAORIENTE-CCF36	1.517.451	60.700	1.517.451	15.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	380.100	S	2024001
5	CC 1005066478	FERNANDEZ JAUREGUI JUAN MANUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
6	CC 1090174911	BENITEZ CARVAJAL FREDDY ALONSO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
7	CC 1090175835	CAÑAS PEÑARANDA LUIS CARLOS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
8	CC 1090176560	DIAZ TOLOZA MIGUEL HUMBERTO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
9	CC 1090177446	LOPEZ RAMIREZ ALAN KENNY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
10	CC 1090379197	CASTRO HERNANDEZ EDISON RAMIRO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAORIENTE-CCF36	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	626.100	S	2024001
11	CC 1090461423	HERNANDEZ BOHORQUEZ ARIANA PRHISTLEY	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAORIENTE-CCF36	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	626.100	S	2024001
12	CC 1092342880	TORRES GALINDO WILMER ALEXANDER	1.750.905	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	466.908	74.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	466.908	18.700	COMFAORIENTE-CCF36	466.908	18.700	466.908	4.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	117.100	S	2024001
13	CC 1092386993	USECHE BETANCOURT JUNIOR ALEXANDER	1.750.905	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	466.908	74.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	466.908	18.700	COMFAORIENTE-CCF36	466.908	18.700	466.908	4.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	117.100	S	2024001
14	CC 1093144012	GARAVITO RAMIREZ JUAN MIGUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
15	CC 1096249395	LOZADA PIMENTEL LINA MARCELA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
16	CC 1096952550	JAIMES CORONADO ANGELA GIOCONDA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
17	CC 1127595181	CARRUYO PALACIN WILMER AUGUSTO	1.750.905	F	X	X														0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.342.361	214.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.342.361	53.700	COMFAORIENTE-CCF36	1.403.156	56.200	1.342.361	14.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	338.800	S	2024001
18	PT 5330612	GARRIDO RIVAS LUIS JOSE	1.750.905	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	466.908	74.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	466.908	18.700	COMFAORIENTE-CCF36	466.908	18.700	466.908	4.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	117.100	S	2024001
19	PT 6914058	VILLALBA MATA FREDDY JESUS	1.750.905	F	X															0			26	26	26	26	PROTECCION -230201	1.517.451	242.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.517.451	60.700	COMFAORIENTE-CCF36	1.517.451	60.700	1.517.451	15.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	380.100	S	2024001
20	PT 7143344	MARTINEZ GONZALEZ SAMUEL JOSE	1.750.905	F	X															0			26	26	26	26	PROTECCION -230201	1.517.451	242.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.517.451	60.700	COMFAORIENTE-CCF36	1.517.451	60.700	1.517.451	15.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	380.100	S	2024001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET		3022726357			CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36227624	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.913.800	5.500	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	36227624	2026-02-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
31.555.393	31.555.393	31.555.393	31.616.188	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				20	5.049.800	0	3.300	0	5.053.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.240.600	0	800	0	1.241.400
PORVENIR	230301	800224808	8	12	2.763.200	0	1.800	0	2.765.000
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.046.000	0	700	0	1.046.700
EPS(Administradoras: 4)				20	1.263.000	0	1.000	0	1.264.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	622.900	0	400	0	623.300
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	121.400	0	100	0	121.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	168.200	0	200	0	168.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	350.500	0	300	0	350.800
ARP(Administradoras: 1)				20	330.000	0	300	0	330.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	20	330.000	0	300	0	330.300
CCF(Administradoras: 1)				20	1.265.500	0	900	0	1.266.400
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	20	1.265.500	0	900	0	1.266.400
Gran Total					7.908.300	0	5.500	0	7.913.800

7. Formato de informe de interventoria del periodo del acta MPA-01-F-07 INFORME DE INTERVENTORÍA v4 y formato MPA-01-F28 V2 con sus respectivos anexos.

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INTERVENTORÍA
01/01/2026 al 01/31/2026

PROYECTO:

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

Actualmente el estado de embellecimiento de la gran mayoría de zonas verdes de diferentes e importantes espacios públicos de la ciudad presentan deterioro por falta de mantenimiento e intervención, lo que ha ocasionado perdida de cubertura vegetal producto del crecimiento descontrolado de malezas y falta de riego y mantenimiento en las zonas verdes, lo que genera una percepción negativa de los habitantes del sector y a su vez que disminuya el sentido de pertenencia del ciudadano en referencia al cuidado de sus espacios públicos.

Conforme a lo anterior se puede inferir que la causa principal de apatía del ciudadano por su entorno natural en el sentido del disfrute y goce del paisaje urbano público, está ligado al descuido que estos espacios públicos presentan por la falta de mantenimiento y deterioro, así que para lograr desarrollar el fortalecimiento de la identidad ciudadana y el cuidado de las zonas públicas como elemento importante del tejido urbano, se debe asegurar la recuperación progresiva de las zonas verdes de los hitos de importancia de nuestra ciudad como es el caso de sus redomas, avenidas principales, parques, plazas, plazoletas y demás espacio público del municipio de San José de Cúcuta, por medio de actividades de recuperación y mantenimiento que permita su sostenibilidad y conservación.

Este proyecto, se enfoca exclusivamente en las zonas verdes constitutivas de los corredores verdes, puntos estratégicos como las redomas de la Avenida Libertadores en la ciudad de Cúcuta. La intervención busca mejorar de manera significativa el aspecto verde de esta importante arteria vial. Se priorizarán tramos y puntos específicos de la Avenida Libertadores basados en un diagnóstico detallado que considerará el nivel de deterioro actual de dichas zonas verdes, el potencial de impacto visual y ambiental, y la coherencia con el entorno urbano inmediato. la La intervención se alinea con el objeto general que es el de promover la conservación y el mejoramiento ambiental de la ciudad, enfocándose en este caso en la infraestructura verde urbana de la Avenida Libertadores. Aunque existen proyectos de la Alcaldía para la mejora general del sector del Malecón, esta iniciativa se concentra específicamente desde redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas a esta redoma (separadores de la avenida Liberadores hasta el retorno de Circuspop calle 9 con Avenida Libertadores), (redomas del parque CORPONOR y

parque de ingenieros), (jardineras desde Calle 15 con Avenida Liberadores hasta el puente Elías M. Soto). Adicional (jardineras desde parque pamplonita CENS hasta 50 metros hacia parque Rodizzio) y los (laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías zona de parqueo) buscando una sinergia y complementariedad con otras intervenciones que puedan estar en curso o planificadas para la zona.

Es crucial que la intervención en estos elementos específicos (corredores verdes, redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas a esta redoma (separadores de la avenida Liberadores hasta el retorno de Circuspop calle 9 con Avenida Libertadores), (redomas del parque CORPONOR y parque de ingenieros), (jardineras desde Calle 15 con Avenida Liberadores hasta el puente Elías M. Soto). Adicional (jardineras desde parque pamplonita CENS hasta 50 metros hacia parque Rodizzio) y los (laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías zona de parqueo) se conciba como una actuación integral que contribuya a la continuidad ecológica y estética de la avenida. La selección de los puntos de intervención dentro de estos elementos priorizará aquellos que maximicen el impacto positivo en el paisaje urbano y la calidad ambiental la Avenida Libertadores.

Conforme a lo anterior, entre el Municipio de San José de Cúcuta y CORPONOR, celebraron Convenio Interadministrativo N° 00005321 de 24 de octubre de 2025, el cual tiene por objeto: 2025MA-33 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE MANTENIMINETO INTEGRAL DE ZONAS VERDES EN EL ESPACIO PÚBLICO", EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.

1.2 ALCANCES DEL

PROYECTO FASE 1:

DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN: Esta fase inicial es la base analítica del proyecto. Su objetivo es comprender a fondo las problemáticas existentes para asegurar que las intervenciones sean pertinentes y efectivas.

Análisis del Estado Actual: Se evalúan las condiciones de las zonas verdes esta iniciativa se concentra específicamente desde la redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas a esta redoma (separadores de la avenida Liberadores hasta el retorno de Circuspop calle 9 con Avenida Libertadores), (redomas del parque CORPONOR y parque de ingenieros), (jardineras desde Calle 15 con Avenida Liberadores hasta el puente Elías M. Soto). Adicional (jardineras desde parque pamplonita CENS hasta 50 metros hacia parque Rodizzio) y los (laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías zona de parqueo). Identificación de puntos críticos:

- Cobertura Vegetal: Se documenta el grado de deterioro de la vegetación, identificando áreas con césped ralo, plantas en mal estado y suelos compactados o pobres en nutrientes
- Residuos Sólidos: Se mapean los focos de acumulación de basura y se analiza la dinámica que genera esta contaminación.
- Mantenimiento: Se evalúan las fallas en las rutinas de mantenimiento actuales, identificando la falta de riego, poda técnica y limpieza continua.
- Arbolado Existente: Se realiza un inventario de los árboles actuales para determinar cuáles requieren podas fitosanitarias o de formación y cuáles, por su estado o riesgo, deben ser erradicados, siempre con la debida autorización ambiental.
- Planteamiento de la alternativa de intervención.
- Actividad que resulta del diagnóstico y se definen lugares, acciones y actividades a desarrollar.

FASE 2:

DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL: El objetivo de esta fase es el inicio de las labores de campo después de aprobado el diseño y plan de mantenimiento como es: preparar el terreno, dejando las áreas de intervención completamente limpias y listas para la nueva siembra. Corresponde a los preliminares y podas del presupuesto.

- Limpieza General y Deshierbe: Se realiza el retiro manual de toda la maleza. vegetación no deseada, basura y escombros de las áreas a intervenir.
- Excavación y Nivelación: Se ejecuta la excavación manual para remover la capa de tierra superficial compactada y no apta, preparando el terreno para recibir el nuevo sustrato
- Poda: Se interviene el arbolado existente según el diagnóstico. Se realizan podas técnicas a árboles de porte mediano y se erradican árboles de porte alto que representan un riesgo o impiden el nuevo diseño. (con base en el diagnóstico)
- Retiro de Material Sobrante: Todo el material orgánico e inorgánico resultante de esta fase se recolecta y se prepara para su transporte y disposición final.

FASE 3:

ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE: Esta es la fase central de la intervención física, donde se materializa el nuevo diseño paisajístico.

- Mejora del Suelo: Se suministra e instala una capa de abono preparado, creando un sustrato fértil y adecuado para el desarrollo de la nueva vegetación.

- Siembra de Material Vegetal: Se realiza la siembra planificada de todas las especies ornamentales, distribuidas estratégicamente según el diseño, basados en el diagnóstico.

- Instalación de Elementos Decorativos y Duros.

- Se instala material triturado como base decorativa en zonas específicas.
- Se colocan piedra bola para crear texturas y proteger ciertas áreas
- Instalación de Vallas Informativas: Se instalan 2 letreros de obra (1m x 1.20m) con la información del proyecto y los logos de la Alcaldía y la Corporación.

FASE 4:

MANTENIMIENTO (FASE DE CONSOLIDACIÓN - 6 MESES): Esta fase es crucial para asegurar el correcto establecimiento de la vegetación y la sostenibilidad inicial del proyecto.

- Riego Programado: Se garantiza el suministro de agua constante a todo el componente verde recién sembrado y con una proyección de mantenimiento mínimo de seis (6) meses una vez finalizado el convenio asegurando la supervivencia durante la etapa de adaptación implementando un sistema de riego por aspersión
- Limpieza Continua: Se realizan labores periódicas de limpieza de zonas verdes y de áreas duras (con piedra), retirando hojas secas y cualquier residuo.
- Nutrición y Control Fitosanitario: Se aplican fertilizantes de zonas verdes para fortalecer las plantas y se realizan fumigaciones preventivas o correctivas si se detecta presencia de plagas.
- Poda y Jardinería: Se realizan podas de formación a los arbustos y se mantiene el plateo de los árboles para asegurar un crecimiento saludable y estético.
- Retiro de Residuos: Se recolectan y transportan todos los residuos generados durante las labores de mantenimiento.

FASE 5:

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO: El objetivo de esta fase es asegurar que la inversión perdure en el tiempo, fomentando corresponsabilidad ciudadana y creando mecanismos de sostenibilidad.

- Campaña de Cultura Ciudadana:
- Objetivo: Promover la concientización y el fortalecimiento de capacidades en temas ambientales a través de la gestión social participativa, la educación y la comunicación, mediante un proceso de capacitación dirigido a un mínimo de 2.500 personas, con el fin de impulsar prácticas sostenibles y responsables en la comunidad, fomentando la apropiación del espacio por parte de la comunidad y promover comportamientos cívicos como la correcta disposición de basuras y el cuidado de las zonas verdes.

- Acciones: Implementación de un equipo de gestores ambientales terreno, instalación de señalética pedagógica y organización de eventos Página 18 Corponor ESTUDIO PREVIO MPA-01-F-01, versión 9, 29/01/2025 comunitarios para generar un vínculo positivo con el espacio recuperado.

.

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Área de mantenimiento (área intervenida previamente por la Alcaldía de San José de Cúcuta), Área de Intervención: Se concentra desde la redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas a esta redoma (separadores de la avenida Libertadores hasta el retorno de Circuspop calle 9 con Avenida Libertadores), (redomas del parque CORPONOR y parque de ingenieros), (jardineras desde Calle 15 con Avenida Libertadores hasta el puente Elías M. Soto). Adicional (jardineras desde parque pamplonita CENS hasta 50 metros hacia parque Rodizzio) y los (laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías zona de parqueo

La siguiente imagen plantea el área total de intervención:



.

Imagen. 1 Localización de intervención del proyecto

1.4 POBLACIÓN BENEFICIADA

Directos: Residentes de las comunas colindantes (Comunas 1 y 2), deportistas y peatones que utilizan el corredor del Malecón y la Av. Libertadores para recreación, deporte y esparcimiento diario**.**

Indirectos (Población Flotante): Conductores, pasajeros y turistas que transitan por esta arteria vial principal, quienes se benefician de la mejora en la seguridad vial, la reducción del estrés visual y la regulación térmica del entorno.

Sector Comercial: Comerciantes y empresarios del sector servicios, hoteles y restaurantes ubicados sobre el corredor, beneficiados por la valorización del paisaje urbano y el aumento de la afluencia de clientes.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. LIC 731-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN
TIPO DE CONTRATO	OBRA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1405 del 19 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
OBJETO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

	(1,559,614,622.00), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (1,559,614,622.00), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	9 MESES
PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	9 MESES
FECHA DE INICIO	12/24/2025
FECHA DE MODIFICACIÓN No. 1.	01/20/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	9/24/2026

2.2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSOS DE MÉRITO
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1406 19 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES.
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA al Contrato de Obra resultante de la Licitación Pública N° LIC731-2025, cuyo objeto es: ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.

VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($109.194.451), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
VALOR ADICIONAL	N/A

VALOR TOTAL CONTRATADO	CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($109.194.451), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	10 MESES
FECHA DE INICIO	12/24/2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	10/24/2026

2.3 PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es de NUEVE (9) meses que corresponde a 270 días calendario para el contrato de obra para el contrato de interventoría DIEZ (10) meses que corresponde a 300 días.

2.4 RELACIÓN DE PÓLIZAS

2.4.1 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS INICIALES
2.4.1.1 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA LIC 731-2025			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-44-101488408
FECHA DE EXPEDICION:	23/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	24/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	19/12/2025	19/01/2027	155,961,462.20
PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2025	19/09/2029	155,961,462.20
CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2025	19/01/2027	155,961,462.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA		2 Años a partir de acta de recibo final	467,884,386.60

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-40-101268130
FECHA DE EXPEDICION:	23/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	24/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00

2.4.1.2 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CMA 765-2025			
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460 47 994000094073
FECHA DE EXPEDICION:	19/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	19/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	19/12/2025	19/02/2027	10,919,445.10
PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2025	19/10/2029	5,459,722.55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	19/10/2026	19/10/2031	10,919,445.10

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460 74 994000009265
FECHA DE EXPEDICION:		**FECHA DE APROBACION:**	
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/12/2025	19/10/2026	284,700,000.00

Anexo *En el infome 1*.

2.4.2 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS POR ACTA DE INICIO

2.4.2.1 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA LIC 731-2025			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-44-101488408
FECHA DE EXPEDICION:	26/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	26/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	24/12/2025	24/01/2027	155,961,462.20
PRESTACIONES SOCIALES	24/12/2025	24/09/2029	155,961,462.20
CALIDAD DEL SERVICIO	24/12/2025	24/01/2027	155,961,462.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/09/2026	24/09/2028	467,884,386.60

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-40-101268130
FECHA DE EXPEDICION:	26/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	26/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/12/2025	24/09/2025	284,700,000.00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	24/12/2025	24/09/2025	284,700,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/12/2025	24/09/2025	284,700,000.00

2.4.2.2 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460 47 994000094073
FECHA DE EXPEDICION:	26/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	26/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	24/12/2025	24/02/2027	10,919,445.10
PRESTACIONES SOCIALES	24/12/2025	24/10/2029	5,459,722.55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/10/2026	24/10/2031	10,919,445.10

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460 74 994000009265
FECHA DE EXPEDICION:	26/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	26/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/12/2025	24/10/2026	284,700,000.00

Anexo *En el informe 1.*

2.5 SEGUIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL PROYECTO

Las actividades de cantidades de obra a desarrollar vigentes según el modificatorio No. 1:

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						**MODIFICACION O ADICIÓN N/A**			**TOTAL CONTRATADO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**
1	**DIAGNOSTICO**				$ -			$ -	-	$ -
1,1	Analisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00
1,2	Identificacion de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				$ -			$ -		$ -
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00
2,2	Excavacion y nivelacion	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- .00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00
NP 2.5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	0.00	$ 11,242.00		(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**									
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y organico)	m3	1,680.00	$ 117,873.00	$ 198,026,640.00	(-)	(1,126.0)	$ (132,720,834.00)	554.0	$ 65,305,806.00
3,2	**siembra de material vegetal**									

3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	2,120.00	$ 33,942.00	$ 71,957,040.00	(-)	(1,820.00)	$ (61,774,440.00)	300.00	$ 10,182,600.00
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	1,918.00	$ 41,798.00	$ 80,168,564.00	(-)	(1,818.00)	$ (75,988,764.00)	100.00	$ 4,179,800.00
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	620.00	$ 46,798.00	$ 29,014,760.00	(-)	(520.00)	$ (24,334,960.00)	100.00	$ 4,679,800.00
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	125.00	$ 66,974.00	$ 8,371,750.00	(-)	(125.00)	$ (8,371,750.00)	- .00	$ -
3,2,5	Suministro de material vegetal especiel Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	247.00	$ 86,974.00	$ 21,482,578.00	(-)	(247.00)	$ (21,482,578.00)	- .00	$ -
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	420.00	$ 26,974.00	$ 11,329,080.00	(-)	(320.00)	$ (8,631,680.00)	100.00	$ 2,697,400.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1,500.00	$ 16,090.00	$ 24,135,000.00	(-)	(1,400.00)	$ (22,526,000.00)	100.00	$ 1,609,000.00
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2,500.00	$ 11,090.00	$ 27,725,000.00	(-)	(2,400.00)	$ (26,616,000.00)	100.00	$ 1,109,000.00
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	1,000.00	$ 12,737.00	$ 12,737,000.00	(-)	(900)	$ (11,463,300.00)	100	$ 1,273,700.00
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1,820.00	$ 14,090.00	$ 25,643,800.00	(-)	(1,620.00)	$ (22,825,800.00)	200.00	$ 2,818,000.00
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	85.00	$ 64,778.00	$ 5,506,130.00	(-)	(85.00)	$ (5,506,130.00)	- .00	$ -
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00		- .00	$ -	20.00	$ 401,800.00
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00		- .00	$ -	80.00	$ 1,607,200.00
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	6,250.00	$ 17,290.00	$ 108,062,500.00	(-)	(5,250.00)	$ (90,772,500.00)	1,000.00	$ 17,290,000.00
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En	Und	0.00	$ 426,984.00	$ -	(+)	80.00	$ 34,158,720.00	80.00	$ 34,158,720.00

	bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50									
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	0.00	$ 390,942.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,275,360.00	80.00	$ 31,275,360.00
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	0.00	$ 535,942.00	$ -	(+)	14.00	$ 7,503,188.00	14.00	$ 7,503,188.00
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	0.00	$ 410,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 20,547,100.00	50.00	$ 20,547,100.00
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	35.00	$ 13,566,315.00	35.00	$ 13,566,315.00
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	36.00	$ 19,353,924.00	36.00	$ 19,353,924.00
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	9.00	$ 4,838,481.00	9.00	$ 4,838,481.00
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,008,720.00	80.00	$ 31,008,720.00
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 422,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 33,808,720.00	80.00	$ 33,808,720.00
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	0.00	$ 389,275.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,142,000.00	80.00	$ 31,142,000.00
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	0.00	$ 61,825.00	$ -	(+)	300.00	$ 18,547,500.00	300.00	$ 18,547,500.00
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 61,942.00	$ -	(+)	150.00	$ 9,291,300.00	150.00	$ 9,291,300.00
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 62,442.00	$ -	(+)	200.00	$ 12,488,400.00	200.00	$ 12,488,400.00

NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	180.00	$ 10,819,620.00	180.00	$ 10,819,620.00
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 6,010,900.00	100.00	$ 6,010,900.00
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	0.00	$ 26,442.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,442,000.00	1,000.00	$ 26,442,000.00
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	400.00	$ 21,643,600.00	400.00	$ 21,643,600.00
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	0.00	$ 26,775.00	$ -	(+)	250.00	$ 6,693,750.00	250.00	$ 6,693,750.00
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	250.00	$ 13,527,250.00	250.00	$ 13,527,250.00
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	500.00	$ 27,054,500.00	500.00	$ 27,054,500.00
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	235.00	$ 12,715,615.00	235.00	$ 12,715,615.00
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	0.00	$ 57,442.00	$ -	(+)	60.00	$ 3,446,520.00	60.00	$ 3,446,520.00
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,609.00	$ -	(+)	500.00	$ 13,304,500.00	500.00	$ 13,304,500.00
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 27,942.00	$ -	(+)	22.00	$ 614,724.00	22.00	$ 614,724.00
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,109,000.00	1,000.00	$ 26,109,000.00
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 2,610,900.00	100.00	$ 2,610,900.00
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa	Und	0.00	$ 55,275.00	$ -	(+)	20.00	$ 1,105,500.00	20.00	$ 1,105,500.00

	de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm									
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	0.00	$ 54,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 2,747,100.00	50.00	$ 2,747,100.00
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	900.00	$ 15,885,000.00	900.00	$ 15,885,000.00
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	250.00	$ 4,412,500.00	250.00	$ 4,412,500.00
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**									
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00		- .00	$ -	285.92	$ 32,272,271.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	203.00	$ 128,873.00	$ 26,161,219.00	(-)	(103.00)	$ (13,273,919.00)	100.00	$ 12,887,300.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**				$ -		- .00	$ -		$ -
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00		- .00	$ -	1,075.12	$ 43,157,326.00
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**				$ -		- .00	$ -		$ -
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00
COSTO DIRECTO					**$ 1,189,274,532.00**			**$ -**		**$ 1,189,274,532.00**
ADMINISTRACIÓN				22%	$261,640,397.00			0		$261,640,397.00
IMPREVISTOS				2%	$23,785,491.00			0		$23,785,491.00
UTILIDADES				6%	$71,356,472.00			0		$71,356,472.00
IVA sobre utilidad				19%	$13,557,730.00			0		$13,557,730.00
COSTO INDIRECTO					**$ 370,340,090.00**			**$ -**		**$ 370,340,090.00**
VALOR TOTAL OBRA					**$ 1,559,614,622.00**			**$ -**		**$ 1,559,614,622.00**
PORCENTAJE DE AVANCE OBRA										

INTERVENTORIA		**$ 91,760,043.00**				**$ 91,760,043.00**
IVA Interventoria	19%	$ 17,434,408.17		$ -		$ 17,434,408.17
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO		**$ 109,194,451.00**		**$ -**		**$ 109,194,451.00**

Anexo. *Acta de modificación No. 1*

2.5.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCIÓN	***FECHA***
***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.* CMA 765-2025**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	19/12/2025
ACTA DE INICIO	24/12/2025

2.5.2 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

DESCRIPCIÓN	***FECHA***
COMITE DE OBRA O INTERVENTORIA N°1	06/01/2025
COMITE DE OBRA O INTERVENTORIA N°2	13/01/2025
COMITE DE OBRA O INTERVENTORIA N°3	19/01/2025

Anexo. *Acta de comite N°1*

Anexo. *Acta de comite N°2*

Anexo. *Acta de comite N°3*

3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Con relación al plazo contractual, han transcurrido treinta y ocho (38) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.

Cumplimiento de los tiempos de ejecución: 14.07 %

4 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

Al corte del presente informe, la obra presenta un estado de retraso respecto al cronograma vigente. Mientras que la meta establecida en la planificación inicial era de un 22,63%, el equipo de obra ha presentado un avance físico real del 20,30%, teniendo un retraso a su programación del 2,33%.

.

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,14%	4,60%	-2,33%
Durante el periodo	22,49%	15,70%	
Acumulado actual	22,63%	20,30%	



Imagen. Gráfico de avance de contrato

5 AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato de obra e interventoría es 20.30 % del valor total contratado. Del avance de ejecución del proyecto es de 20.30 %.

***Ver Anexo No. 1**. (Balance físico – financiero de obra e interventoría)*

6 CONDICIONES CLIMÁTICAS Y/O ORDEN PÚBLICO

El comportamiento climático estuvo marcado por la influencia de días cálidos, que favorecen condiciones mayormente secas y cielos con nubosidad parcial que favorecen la ejecución de actividades.

7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS OBRA E INTERVENTORÍA

2.1 Limpieza general y deshierbe

Consiste en la remoción y retiro manual de toda la vegetación no deseada, especies herbáceas (malezas) extraídas desde la raíz, así como la disposición de residuos sólidos, escombros y cualquier elemento exógeno que interfiera con el área de intervención proyectada.

- Procedimiento: Se ejecutará una limpieza integral y manual del terreno para remover basura, escombros y vegetación no deseada desde la raíz. La intervención se realizará con estricto cuidado para preservar exclusivamente los árboles y especies vegetales designados para conservación según el diagnóstico técnico y el diseño paisajístico.

- Criterios de Aceptación: La superficie quedará totalmente despejada hasta el nivel del suelo mineral. No se admitirá la presencia de residuos orgánicos, restos radiculares ni materiales ajenos que afecten la uniformidad del área o las labores posteriores de obra.

2.2 Excavación y nivelación

Esta labor comprende los movimientos de tierra puntuales y localizados necesarios para adecuar el terreno a las especificaciones del diseño paisajístico. El procedimiento se centra en la excavación técnica realizada exclusivamente en los puntos de siembra de cada especie, garantizando que cada hoyo cuente con la profundidad y dimensiones precisas para el soporte vegetal sin alterar innecesariamente la estructura del suelo circundante.

NP 2,5 Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación.

Esta labor consiste en el aprovechamiento del material extraído durante las excavaciones de obra para el relleno y la nivelación de las áreas de intervención. El proceso incluye el extendido, la eliminación de elementos sobredimensionados y la conformación del material, ajustándolo a las pendientes y niveles topográficos establecidos en el diseño paisajístico.

El propósito fundamental de esta intervención es estabilizar y uniformar la superficie del terreno mediante una estrategia de compensación de volúmenes, eliminando la necesidad de importar rellenos externos y optimizando el manejo de sobrantes en sitio.

3,1 Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)

Esta actividad comprende el suministro, preparación e incorporación de una mezcla técnica compuesta por suelo seleccionado, arena y materia orgánica en las áreas destinadas a la siembra. El proceso se ejecuta de manera focalizada mediante la integración manual de estos componentes con la tierra del sitio, asegurando una distribución homogénea que optimice la estructura física y la composición química del sustrato en la zona radicular de cada especie.

3,2,1 Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Veranera, entregados en bolsa de 1 kg (números 26 y 35) con una altura establecida entre los 8 y 15 cm. El proceso técnico integra la selección de plantas con óptimo estado fitosanitario, su transporte protegido y la instalación definitiva en campo.

3,2,2 Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Agave, los cuales se entregan en bolsa de 1 kg (números 26 y 35) con una altura establecida entre los 20 y 30 cm. El proceso operativo abarca la selección de especímenes con vigor, su transporte adecuado al sitio de intervención y la instalación definitiva en las áreas designadas.

NP 3,2,17 Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Palma Bismarckia, entregados en bolsa de 40 kg (número 90) con una altura de 2,00 metros. El proceso técnico abarca la selección de individuos con óptimo vigor fitosanitario, su transporte especializado hasta el sitio de obra para proteger el follaje y el estípite, y la instalación definitiva.

NP 3,2,20 Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Palma Real, entregados en bolsa de 30 kg (número 80) con una altura establecida entre los 2.00 y 3.00 metros. El proceso operativo incluye la selección de individuos con estípites sanos y vigorosos, su transporte protegido para evitar daños mecánicos en las frondas y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,21 Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Palma Botella, entregados en bolsa de 30 kg (número 80) con una altura establecida entre los 2.00 y 3.00 metros. El proceso técnico incluye la selección de individuos con el estípite bulboso característico en óptimo estado, su transporte especializado para proteger la integridad de la palma y la instalación definitiva en sitio.

NP 3,2,23 Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Palma Manila, entregados en presentaciones de bolsa de 30 kg (números 60 a 80) y con una altura total entre los 2.00 y 2.50 metros. El proceso operativo abarca la verificación fitosanitaria de cada individuo, su traslado protegido al área de intervención y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,24 Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Palma Rubelina, entregados en bolsa de 30 kg (números 50 a 70) con una altura total entre 1.00 y 1.50 metros. El procedimiento técnico incluye la selección de individuos con follaje denso y sano, su transporte protegido para evitar daños en las frondas y la

instalación definitiva en sitio.

NP 3,2,25 Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Cordyline, entregados en bolsa de 3 kg (números 35 y 40) con una longitud establecida entre los 0.70 y 1.00 metros. El proceso técnico integra la selección de plantas con follaje vigoroso y coloración característica, su transporte protegido al sitio de obra y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,27 Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Canción de la India, entregados en bolsa de 6 kg (número 40) con una establecida entre los 20 y 40 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con follaje variegado y vigoroso, su transporte protegido para evitar el maltrato de las hojas y la instalación definitiva en el área de intervención.

NP 3,2,28 Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Cheflera Variegada, entregados en bolsa de 8 kg (números 40 y 60) con una longitud establecida entre los 20 y 40 cm. El procedimiento operativo incluye la selección de plantas con óptima ramificación y coloración foliar, su traslado protegido al sitio de obra y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,34 Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Philodendron Selloum, entregados en bolsa de 6 kg (números 35 y 40) con una longitud establecida entre los 70 y 80 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con hojas lobuladas de aspecto vigoroso, su transporte especializado para proteger la integridad de sus grandes frondas y la instalación definitiva en sitio.

NP 3,2,35 Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Pandanus Variegado, entregados en bolsa de 10 kg (números 40 y 60) con una longitud establecida entre los 70 y 80 cm. El procedimiento incluye la selección de plantas con su característico follaje cintiforme y variegación definida, su transporte protegido para evitar lesiones en las hojas y la instalación definitiva en el terreno.

NP 3,2,36 Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Veranera Tallo Alto, entregados en bolsa de 10 kg (números 60 y 80) con una longitud

establecida entre los 30 y 70 cm. El proceso técnico incluye la selección de individuos con un eje principal leñoso y definido, su transporte protegido para preservar la estructura del tallo y el follaje, y la instalación definitiva en sitio.

NP 3,2,39 Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Flor del Llano, entregados en bolsa de 3 kg (número 26) con una longitud establecida entre los 20 y 40 cm. El proceso operativo incluye la selección de individuos con tallos vigorosos y follaje sano, su transporte protegido para evitar el maltrato de sus brotes y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,42 Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Árbol Carbonero, entregados en bolsa de 10 kg (número 60) con una longitud establecida entre los 20 y 40 cm. El procedimiento técnico incluye la selección de individuos con una estructura de ramas equilibrada y follaje plumoso en óptimo estado, su transporte protegido al sitio de obra y la instalación definitiva en campo, asegurando la excavación de un hoyo de siembra proporcional al peso de la bolsa y la consolidación del cepellón con suelo mejorado para favorecer su anclaje.

NP Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Árbol Oití, entregados en bolsa de 10 kg (número 60) con una longitud establecida entre los 20 y 40 cm. El proceso técnico incluye la selección de individuos con fuste recto y follaje denso característico, su transporte protegido para evitar el estrés hídrico o daños mecánicos, y la instalación definitiva en sitio.

NP 3,2,45 Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de especies Rastreras, entregados en bolsa de 1 kg (número 14) con una longitud establecida entre los 10 y 20 cm. El procedimiento operativo incluye la selección de plantas con guías vigorosas y brotes sanos, su transporte protegido para evitar el maltrato del follaje rastrero y la instalación definitiva en campo.

3,3,4 Instalación de vallas informativas

Esta actividad comprende el suministro e instalación técnica de vallas informativas destinadas a la identificación y señalización del proyecto.

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas en el presente periodo:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	V/R. PARCIAL

2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	2895,52	$ 1.352,00	$ 3.914.743,00
2,2	Excavación y nivelación	m3	98,76	$ 60.100,00	$ 5.935.596,00
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	2895,52	$ 11.242,00	$ 32.551.436,00
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	98,76	$ 117.873,00	$ 11.641.373,00
3,2	**siembra de material vegetal**				
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	153	$ 33.942,00	$ 5.193.126,00
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	100	$ 41.798,00	$ 4.179.800,00
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	14	$ 535.942,00	$ 7.503.188,00
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	36	$ 537.609,00	$ 19.353.924,00
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	9	$ 537.609,00	$ 4.838.481,00
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	10	$ 422.609,00	$ 4.226.090,00
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80	$ 389.275,00	$ 31.142.000,00
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	221	$ 61.825,00	$ 13.663.325,00
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	55	$ 62.442,00	$ 3.434.310,00
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100	$ 60.109,00	$ 6.010.900,00

NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	85	$ 54.109,00	$ 4.599.265,00
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	259	$ 54.109,00	$ 14.014.231,00
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	32	$ 54.109,00	$ 1.731.488,00
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	38	$ 57.442,00	$ 2.182.796,00
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	50	$ 26.109,00	$ 1.305.450,00
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	5	$ 129.942,00	$ 649.710,00
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	19	$ 129.942,00	$ 2.468.898,00
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	60	$ 17.650,00	$ 1.059.000,00
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**				
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2	$ 2.538.200,00	$ 5.076.400,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 186.675.530,00
ADMINISTRACION 22%					$ 41.068.616,60
IMPREVISTOS 2%					$ 3.733.510,60
UTILIDAD 6%					$ 11.200.531,80
IVA 19%					$ 2.128.101,04
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 58.130.760,00
COSTO TOTAL OBRA					$ 244.806.290,00
INTERVENTORIA					$ 21.737.698,00
TOTAL PROYECTO					$ 266.543.988,00

Ver Anexo del informe de obra - *Anexo No. 4. (Memorias de cálculo de cantidades de obra desarrolladas en el periodo del informe)*

Ver Anexo No. 02. (*Registro fotográfico de interventoría del avance del proyecto del periodo del informe presentado y condiciones climáticas*).

7.1 ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS (CONTRAMUESTRA)

Se informa que, de acuerdo con el presupuesto oficial del proyecto y los alcances contratados, **no se tiene contemplada la ejecución de ensayos de laboratorio** por parte de la interventoría.

En consecuencia, el control de calidad realizado durante este periodo por la Interventoría se basó en:

- **Inspección Visual:** Verificación directa en campo de los procesos constructivos.
- **Fichas Técnicas:** Revisión de la calidad de los materiales e insumos suministrados por los proveedores.
- **Certificados de Calidad:** Validación de los documentos de origen de los materiales utilizados.

Se certifica que, mediante estos mecanismos de control, las actividades ejecutadas cumplen con las normas técnicas y las especificaciones requeridas para la naturaleza del proyecto

7.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el presente periodo de corte 01/01/2026 al 01/31/2026, la Interventoría realizó el seguimiento al componente humano del Contratista de Obra, constatando que se mantuvo el personal administrativo y operativo ofertado en un **100 %**. No hubo novedades de cambio presentadas.

De igual manera, esta Interventoría informa que dio cumplimiento estricto a su propuesta técnica, garantizando la permanencia del personal profesional y de apoyo necesario para el correcto control y vigilancia del contrato, sin que se presentaron ausencias que afectaran la supervisión técnica, administrativa o financiera del proyecto

7.3 PERMISOS GESTIONADOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se certifica que el Contratista de Obra ha dado cumplimiento a la entrega de los documentos exigidos en el pliego de condiciones y el contrato. Especial atención se ha dado a los requerimientos de la supervisión de **Corponor**, logrando la aprobación en el informe N°1 del Plan de Manejo Ambiental, plan de calidad , plan de seguridad y salud en el trabajo del presente periodo a

Esta Interventoría ha verificado que cada documento cumpla con la normativa técnica vigente, asegurando que la ejecución del proyecto cuente con el blindaje jurídico y ambiental necesario para evitar sanciones o suspensiones."

7.4 INFORMES EJECUTIVOS DE ACCIONES MENSUALES DE LOS ASESORES ESPECIALISTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con la estructura organizacional definida en la propuesta técnica del Contrato de Interventoría, se informa que el equipo de trabajo está conformado exclusivamente por el personal base descrito en la sección de "Personal de Interventoría".

Toda vez que la propuesta aprobada **no contempla la vinculación de asesores o especialistas externos**, no se generan informes individuales de especialidades durante el presente periodo de corte. Las actividades de control técnico, administrativo, financiero y ambiental han sido asumidas y reportadas integralmente por el Director, Residente de Interventoría, profesional ambiental de interventoría y inspector HSEQ quienes garantizan el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

7.5 ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS

7.5.1 ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El avance físico – financiero del contrato de obra en la suscripción del acta parcial de obra No. 1 es 4.60 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $71,766,772.00, para un valor total a cobrar de $ **$71,766,772.00** del valor total contratado de $1,559,614,622.

El avance físico – financiero del contrato de obra en la suscripción del acta parcial de obra No. 2 es 15.70 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 2 por valor de $244,806,290, para un valor total a cobrar de **$244,806,290** del valor total contratado de $1,559,614,622.00.

El avance físico – financiero del contrato de obra en la suscripción acumulada de las actas parciales es 20.30 % del valor total contratado.

Saldo por pagar $1,243,041,560, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

7.5.2 ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El avance físico – financiero del contrato de interventoría en la suscripción del acta parcial de obra No. 1 es 4.50 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $ 4,908,512.00, para un valor total a cobrar de $ **4,908,512.00** del valor total contratado de $ 109,194,451.00

El avance físico – financiero del contrato de interventoría en la suscripción del acta parcial de obra No. 2 es 19.91 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 2 por valor de $ 21,737,698.00, para un valor total a cobrar de $ **21,737,698.00** del valor total contratado de $ 109,194,451.00

Saldo por pagar $82,548,241.00, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

El saldo a cobrar durante el presente periodo, esta dado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO DE UTILIZACIÓN (meses)	OCUPACIÓN	COSTO / MES	F.M.	COSTO PERSONAL / MES
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	1,0	50%	$ 3.558.750	2,160	$ 3.971.565
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	1,0	100%	$ 2.135.250	2,160	$ 4.765.878
PROFESIONAL AMBIENTAL	1	1,0	50%	$ 2.135.250	2,160	$ 2.382.939
TECNÓLOGO FORESTAL Y/O AGROFORESTAL Y/O AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL	1	1,0	100%	$ 1.708.200	2,160	$ 3.812.702
INSPECTOR HSEQ	1	1,0	50%	$ 2.135.250	2,160	$ 2.382.939
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 17.316.023**

2. COSTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN	OCUPACIÓN	UNIDAD	TIEMPO (meses)	CANTIDAD	VALOR	VALOR / MES
PÓLIZAS Y LEGACLIZACION DE CONTRATO		GLB				$ 434.283,00
EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, OTROS		MES	1,0		$ 500.000,00	$ 516.667,00
SUBTOTAL COSTOS GENERALES						**$ 950.950**

COSTO BÁSICO: COSTO DE PERSONAL (1) + COSTOS GENERALES (2)	**$ 18.266.973**
VALOR IVA (19%)	**$ 3.470.725**
VALOR TOTAL PROPUESTA	**$ 21.737.698**

Ver Anexo No. 3 *(Relación de pagos obra e interventoría)*

8 VERIFICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL

Se informa que, durante el presente periodo de corte de ejecución, **no se realizaron visitas presenciales** por parte de los miembros del Comité Veedor ni de representantes de la Junta de Acción Comunal a las instalaciones de la obra o a la oficina técnica.

Sin embargo, es importante precisar lo siguiente:

- **Canales Abiertos:** Se mantienen los canales de comunicación dispuestos por el Contratista y la Interventoría para atender cualquier requerimiento de la comunidad.
- **Soportes:** En el evento en que se realicen dichas visitas en periodos futuros, las constancias, actas de vecindad o registros de asistencia serán anexados debidamente en el **Informe de Ejecución del Contratista de Obra**, previa validación de esta Interventoría.

A la fecha del presente informe, no se han radicado inquietudes o solicitudes por parte de la comunidad que requieran el desplazamiento del comité veedor al sitio de los trabajos.

9 VERIFICACIÓN CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DE HSEQ DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría realizó el seguimiento, control y auditoría constante a los criterios de cumplimiento del Contratista de Obra en materia de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** y **Manejo Ambiental**.

Se certifica que el contratista cumplió con los estándares exigidos para obras públicas. Los soportes documentales (registros fotográficos, planillas, certificados y listas de chequeo) que avalan este seguimiento se encuentran relacionados y **anexados en el informe de ejecución del contratista de obra** que hace parte integral del presente reporte.

Anexo MPA-01-F-25 - Versión 3 *(Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2). (Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2).*

9.4 LISTADO DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal:

CARGO	Nombre	Cédula
Director de Interventoría	Freddy Alexili Villan Valencia	88226106
Residente de Interventoría	Nelson David Acevedo Torres	1090490104
Profesional ambiental de interventoría	Adriana Teresa Monsalve Perez	1098783455
Inspector de obra de interventoría	Karin Farley Bermon Rolon	1093779618
Inspector HSQ	Luis Carlos Ortega Amaya	1094268644

Anexo. *Control diario del personal de interventoría (Asistencia)*

9.4.1 LISTADO DE PERSONAL INGRESADO

Listado del personal ingresado en orden alfabético del personal técnico y administrativo

NOMBRE	CEDULA
Adriana Teresa Monsalve Perez	1098783455

Freddy Alexili Villan Valencia	88226106
Karin Farley Bermon Rolon	1093779618
Luis Carlos Ortega Amaya	1094268644
Nelson David Acevedo Torres	1090490104

9.4.1.1 EXAMENES DE INGRESO

En el presente informe no se realizó ingreso de personal de interventoría.

9.5 AFILIACION DEL PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Debido a que no se registraron ingresos de personal en el presente periodo, no se adjuntan las certificaciones de afiliación a salud, pensión y ARL del equipo técnico y administrativo.

9.2.1 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

No se relaciona al no presentar ingreso de personal, en el periodo del presente informe.

9.2.2 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

No se relaciona al no presentar ingreso de personal, en el periodo del presente informe.

9.2.3 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – ARL

No se relaciona al no presentar ingreso de personal, en el periodo del presente informe.

9.3 LISTADO DE PERSONAL RETIRADO

En cumplimiento de los protocolos de seguimiento administrativo, se informa que durante el presente periodo de ejecución **no se presentaron retiros de personal** por de la Interventoría.

Por lo tanto, no se genera el listado de personal retirado en orden alfabético para este reporte. Se mantiene la planta de personal reportada al inicio del periodo, garantizando la continuidad y estabilidad en el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del proyecto.

9.3.2 EXÁMENES DE RETIRO

En cumplimiento de los protocolos de seguimiento administrativo, se informa que durante el presente periodo de ejecución **no se presentaron retiros de personal** por parte de la Interventoría.

9.4 PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA Y REVISIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se presentan copias de las planillas de pago al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal de obra y administrativo vinculado en el periodo del informe del contrato de interventoría. Y revisión de los pagos realizados por el contratista de obra. ***Anexo*** *(planillas de pago al sistema de seguridad social)*

9.5 CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Se informa que, para el presente periodo de ejecución, **no se requiere** el seguimiento a la aplicación del protocolo de bioseguridad.

Lo anterior obedece a las disposiciones normativas vigentes y a que las condiciones actuales del proyecto no exigen la implementación de medidas excepcionales de bioseguridad adicionales a las establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) ordinario.

9.6 SEGUIMIENTO DE PLANES (SOCIOAMBIENTAL, CALIDAD, EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN)

En su calidad de organismo de control, la Interventoría realizó la revisión y el seguimiento exhaustivo a la aplicación de los planes de gestión por parte del contratista de obra durante el periodo reportado. Se constató el cumplimiento de los siguientes instrumentos:

- **Plan de Gestión Ambiental:** Verificación de medidas de mitigación y protección de recursos naturales bajo los estándares de **Corponor**.
- **Plan de Gestión del Riesgo:** Monitoreo de los puntos críticos identificados para prevenir incidentes técnicos o sociales.
- **Plan de Señalización:** Supervisión de la demarcación de seguridad para el personal y el tránsito en el área de influencia.
- **Plan de Emergencia:** Validación de la capacidad de respuesta y disponibilidad de recursos de primeros auxilios y contra incendios.
- **Plan de Calidad:** Control de procesos constructivos y cumplimiento de especificaciones técnicas.

Se certifica que la aplicación de estos planes fue satisfactoria. Los soportes documentales, registros de inspección y evidencias de campo que avalan este seguimiento se encuentran relacionados y **anexados en el informe de ejecución del contratista de obra**, los cuales fueron validados por esta Interventoría

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL INTER VERDES

ANEXOS

Anexo. Actas suscritas en el periodo del informe (Comités, suspensión y reinicio)

Ver Anexo No. 1. *BALANCE FISICO FINANCIERO OBRA - INTERVENTORIA* **Ver**

Anexo No. 2. *REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA*. **Ver**

Anexo No. 3. *ESTADO FINANCIERO OBRA E INTERVENTORIA*

Anexo *MPA-01-F-25 - Versión 3 (Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2). Para las actividades realizadas por el coordinador de HSEQ de Interventoría; la revisión y aprobación de las actividades e inspecciones realizadas por el contratista de obra.*

Anexo. *Control diario del personal de interventoría (Asistencia)*

Anexo *(planillas de pago al sistema de seguridad social)*

Anexo. Actas suscritas en el periodo del informe (Comités, suspensión y reinicio)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 01

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 6 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Interventor LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

Señalización del proyecto en trabajos vía pública.

Solicitud de Modificatorio contractual.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

Se da inicio a la reunión a las 8 am en las instalaciones de la subdirección de Corponor, para revisión de las actividades contractuales de la ejecución del proyecto ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

1. Tema: Señalización del proyecto

La Interventoría resalta la importancia de la intervención y señalización necesaria durante la ejecución del proyecto, indicando que esta debe implementarse conforme a los manuales vigentes, los cuales deben ser revisados detalladamente para garantizar su correcta complementación, cumplimiento y aplicación en todas las etapas de la obra.

2. Tema: Solicitud de modificatorio contractual

El Contratista de Obra manifiesta la necesidad de realizar un modificatorio contractual, sustentado en las situaciones técnicas que han surgido durante el desarrollo del proyecto, específicamente en lo relacionado con el diseño paisajístico.

Se expone que, producto del análisis técnico contratado y de las condiciones reales de ejecución, se evidencia la necesidad de realizar ajustes al alcance contractual, lo cual conlleva a la formulación de un modificatorio que contemple modificaciones en cantidades de obra, posibles ítems no previstos.

La Interventoría informa que, para efectos de la Revisión formal del modificatorio, el Contratista deberá entregar la siguiente documentación completa:

- Sábana o presupuesto ajustado, donde se evidencien claramente:
    - Cantidades contractuales que aumentan
    - Cantidades contractuales que disminuyen
    - Inclusión de ítems no previstos
- Memorias de cantidades de obra, debidamente enlazadas con el presupuesto.
- Informe técnico de justificación del balance presupuestal del contratista de obra.
- Justificación técnica, administrativa y financiera de la interventoría.
- APU’s (Análisis de Precios Unitarios).
- Cotizaciones.
- Estudio de mercado.

- Especificaciones técnicas.

La Interventoría aclara que únicamente con la entrega completa de la documentación anteriormente relacionada se procederá a la revisión, emisión de recibido y posterior evaluación del modificatorio.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. El contratista deberá realizar la revisión integral de los manuales técnicos de señalización aplicables al proyecto y determinar la necesidad de implementar
2. El contratista deberá estructurar y presentar el paquete completo de documentos requeridos para la solicitud de modificatorio.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 02

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 13 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Interventor LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

Seguimiento a señalización del proyecto

Socialización del Modificatorio.

Compromisos y conclusiones

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento a la señalización del proyecto conforme al Manual de Señalización de la Alcaldía

El contratista de obra informa que se realizó nuevamente la revisión integral del manual de señalización, con el fin de verificar la correcta implementación de la señalización requerida para la ejecución del proyecto, en concordancia con los lineamientos del Manual de Señalización de la Alcaldía.

Como resultado de dicha revisión del Manual de Señalización de la Alcaldía, se dejan consignados como parte adicional de señalización integral del proceso de señalización los siguientes lineamientos operativos:

1. Instalación de colombinas delimitantes cada 3 a 5 metros, conectadas entre sí con cinta de peligro, para la delimitación continua de las áreas de trabajo.

2. Señalización permanente de excavaciones que perduren de un día para otro y que sean mayores a 50 centímetros, mediante avisos preventivos luminosos.

3. Delimitación de trabajos sobre la vía con colombinas y cinta de peligro, complementando con conos en actividades de cargue y descargue de material.

4. Organización, señalización y control de herramientas, productos químicos y materiales, garantizando rotulación y fichas de seguridad para productos químicos.

5. Implementación de medidas de almacenaje y disposición final temporal, mediante el cubrimiento con lona de materiales como arena, triturado, abono y desechos vegetales, con el fin de prevenir la dispersión de material particulado.

Se deja constancia de que todas las acciones descritas hacen parte de un sistema integrado de señalización y control de riesgos, el cual se encuentra en implementación y fortalecimiento continuo, y será aplicado de manera estricta conforme a las condiciones operativas de la obra.

2. Excavaciones en el área de intervención.

En el marco del seguimiento al avance y ejecución del proyecto, se realiza un análisis técnico de las actividades en campo, evidenciándose que en las áreas iniciales de ejecución se realizó una excavación aproximadamente de **10 cm.**

Asimismo, se identificaron sectores específicos donde, de acuerdo con el estado del terreno, no es adecuado realizar las excavaciones planificadas. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de ejecutar trabajos previos de nivelación y conformación en las áreas aledañas a la zona de trabajo. esto, con el fin de garantizar que el terreno no presente problemas de erosión o inestabilidad, considerando las condiciones actuales del mismo.

2. Socialización del modificatorio.

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

Se realiza la **socialización del modificatorio N 01** que se proyecta presentar, el cual tiene como finalidad realizar los ajustes técnicos, requeridos conforme a las condiciones identificadas durante la ejecución del proyecto.

El interventor solicita al contratista realizar los ajustes pertinentes para su revisión y aprobación.

Por otra parte el contratista informa que el modificatorio será estructurado y entregado formalmente el 17 de enero de 2025. Asimismo se establece que el contenido definitivo será presentado y concertado con la entidad en el siguiente comité de obra.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. Mantener la señalización adecuada, para las actividades que requieran durante la ejecución del proyecto.

2. El interventor deberá presentar el modificatorio definitivo con justificación jurídica técnica para aprobación por parte de la entidad.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

ACTA DE COMITÉ No. 03

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 19 enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Intervento LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

Aclaración referente al aumento de cantidad estipulado en el ítem 2,1.

Necesidad de disminución de cantidad en los ítems: 2,2 - 2,4 – 3,1 – 3,2,1 – 3,2,2 – 3,2,3 – 3,2,6 – 3,2,7 – 3,2,8 – 3,2,9 – 3,2,10 – 3,2,14 – 3,3,2

Aclaración de eliminación de ítems: 3,2,4 – 3,2,5 – 3,2,11

Necesidad de crear ítems no previstos: NP 2,5 – NP 3,2,15 – NP 3,2,16 – NP 3,2,17 – NP 3,2,18 – NP 3,2,19 – NP 3,2,20 – NP 3,2,21 – NP 3,2,22 – NP 3,2,23 – NP 3,2,24 – NP 3,2,25 – NP 3,2,26 – NP 3,2,27 – NP 3,2,28 – NP 3,2,29 – NP 3,2,30 – NP 3,2,31 – NP 3,2,32 – NP 3,2,33 – NP 3,2,34 – NP 3,2,35 – NP 3,2,36 – NP 3,2,37 – NP 3,2,38 – NP 3,2,39 – NP 3,2,40 – NP 3,2,41 – NP 3,2,42 – NP 3,2,43 – NP 3,2,44 – NP 3,2,45 – NP 3,2,46

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 8 am en las instalaciones de la subdirección de Corponor, la subdirectora de Planeación y Fronteras de Corponor para revisión justificación del modificatorio N°1 del proyecto; ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

En relación con el ítem **2,1 (Limpieza general y deshierbe)**, se informa que, tras realizar el barrido inicial y la identificación de las zonas de intervención durante la fase de ejecución, se procedió a efectuar un levantamiento topográfico detallado.

Como resultado de este proceso técnico y de la posterior elaboración de las memorias de cálculo, se determinó una diferencia en el área total de intervención. Dicho levantamiento permitió constatar un incremento en las cantidades proyectadas originalmente, debido a la precisión en la delimitación de las áreas reales a intervenir en el terreno.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- 00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00

En lo que respecta al ítem **2.2 (Excavación y nivelación)**, de acuerdo con el seguimiento del avance y la ejecución del proyecto, se realizó un análisis técnico de la actividad en campo. Se evidenció que en las áreas iniciales de ejecución, donde se efectuó una excavación aproximada de 10 cm, el terreno presentaba en algunos sectores un talud pronunciado, cuya intervención generó procesos erosivos e inestabilidad del suelo.

A partir de los resultados obtenidos en las ejecuciones anteriores, se determinó que no es procedente realizar excavaciones masivas en las áreas restantes. En su lugar, se propone ejecutar únicamente excavaciones localizadas en los lados de siembra, con el fin de minimizar los impactos erosivos y garantizar la estabilidad del terreno.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- 00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00

Adicionalmente, con el objetivo de lograr la nivelación del terreno y mejorar las condiciones del suelo existente, en las áreas restantes del proyecto se realizará una conformación y nivelación del terreno.

Esta intervención consiste en retirar el material sobrante de los puntos más elevados para utilizarlo en las zonas que requieren relleno y nivelación. De esta manera, se optimiza el uso del material disponible y se mejora la eficiencia en la ejecución de la obra.

Bajo este criterio de aprovechamiento de recursos y eficiencia técnica, se establece la creación del ítem **NP 2.5 (Conformación, relleno y nivelación con material de excavación)**, lo cual permite una adecuación del terreno técnicamente viable para el proyecto.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2.1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00
2.2	Excavación y nivelación	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00
2.3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- 00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00
2.4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00
NP 2.5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion	m2	0.00	$ 11,242.00	$ -	(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00

En cuanto al ítem **2.4 (Retiro de material sobrante)**, se informa una reducción en las cantidades ejecutadas. Esto se debe a que el material obtenido de las excavaciones será reutilizado dentro del mismo proyecto para las labores de conformación y nivelación del terreno.

Al aprovechar este material en el sitio de la obra, se reduce la necesidad de retirarlo y disponerlo fuera del proyecto, lo que disminuye el volumen de material sobrante que inicialmente se tenía previsto retirar.

Continuando con el diseño paisajístico, tras una revisión detallada del diseño del proyecto, se determinó que las especificaciones técnicas de las especies contempladas originalmente en los **ítems 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.11** resultaban insuficientes en términos de escala, y dimensiones para el impacto urbano proyectado.

Se identificó que dichas especies, suministradas en presentaciones de **bolsa de 1 kg** y con alturas limitadas (oscilando entre los 30 cm y 60 cm), no proporcionaban la volumetría necesaria para garantizar la percepción que se quiere lograr el en el proyecto. La instalación de plantas de estas dimensiones reducidas nos limitaba la armonía y el impacto visual deseado en la ciudad.

Con el propósito de consolidar un entorno funcional y de impacto con el entorno urbano, se ha decidido suprimir los ítems mencionados e integrar los **ítems NP 3.2.22, NP 3.2.23 y NP 3.2.24**. y adicionar nuevas referencias presentan una tamaño superior, con suministros en **bolsa de 30 kg o superior** y alturas que alcanzan rangos de hasta **1.00 m y 2.50 m**, asegurando así la calidad estética y la consolidación del paisaje desde el momento de su plantación.

ITEM	DESCRIPCION	ITEM	DESCRIPCION
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m

Según los objetivos de impacto urbano y paisajístico del proyecto, se ha realizado un diagnóstico integral de las áreas de intervención. Considerando las condiciones bioclimáticas de la región, caracterizada por zonas áridas, se determinó la necesidad de incorporar especies vegetales idóneas que garanticen la sostenibilidad y supervivencia en el entorno.

Como resultado de este análisis técnico, se formaliza la inclusión de los nuevos ítems: **NP 3,2,15 – NP 3,2,16 – NP 3,2,17 – NP 3,2,18 – NP 3,2,19 – NP 3,2,20 – NP 3,2,21 – NP 3,2,25 – NP 3,2,26 – NP 3,2,27 – NP 3,2,28 – NP 3,2,29 – NP 3,2,30 – NP 3,2,31 – NP 3,2,32 – NP 3,2,33 – NP 3,2,34 – NP 3,2,35 – NP 3,2,36 – NP 3,2,37 – NP 3,2,38 – NP 3,2,39 – NP 3,2,40 – NP 3,2,41 – NP 3,2,42 – NP 3,2,43 – NP 3,2,44 – NP 3,2,45 – NP 3,2,46.** Estas especies han sido seleccionadas por su alta resistencia y adaptabilidad climática.

NP 3.2.15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 50 y 60, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	0.00	$ 426,984.00	$ -	(+)	80.00	$ 34,158,720.00	80.00	$ 34,158,720.00
NP 3.2.16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	0.00	$ 990,942.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,275,360.00	80.00	$ 31,275,360.00
NP 3.2.17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 90, con una altura Con altura de 2.00 m	Und	0.00	$ 535,942.00	$ -	(+)	14.00	$ 7,503,188.00	14.00	$ 7,503,188.00
NP 3.2.18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	0.00	$ 410,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 20,547,100.00	50.00	$ 20,547,100.00
NP 3.2.19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg	Und	0.00	$ 387,930.00	$ -	(+)	35.00	$ 13,576,515.00	35.00	$ 13,576,515.00
NP 3.2.20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 90, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	36.00	$ 19,353,924.00	36.00	$ 19,353,924.00
NP 3.2.21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 60, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	9.00	$ 4,838,481.00	9.00	$ 4,838,481.00
NP 3.2.22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0.80 a 1.00 m	Und	0.00	$ 367,609.00	$ -	(+)	86.00	$ 31,008,720.00	86.00	$ 31,008,720.00

NP 3.2.23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 x 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 422,699.00	$ -	(+)	80.00	$ 33,808,720.00	80.00	$ 33,808,720.00
NP 3.2.24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROEBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	0.00	$ 389,275.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,142,000.00	80.00	$ 31,142,000.00
NP 3.2.25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE: En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	0.00	$ 61,825.00	$ -	(+)	300.00	$ 18,547,500.00	300.00	$ 18,547,500.00
NP 3.2.26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 30 y 40 cm	Und	0.00	$ 61,042.00	$ -	(+)	150.00	$ 9,291,300.00	150.00	$ 9,291,300.00
NP 3.2.27	Suministro de material vegetal especie GANCHO DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 62,442.00	$ -	(+)	200.00	$ 12,488,400.00	200.00	$ 12,488,400.00
NP 3.2.28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 6 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	180.00	$ 10,819,620.00	180.00	$ 10,819,620.00
NP 3.2.29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 6,010,900.00	100.00	$ 6,010,900.00
NP 3.2.30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 25 de largo entre 20 y 30 cm	Und	0.00	$ 29,442.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 29,442,000.00	1,000.00	$ 29,442,000.00
NP 3.2.31	Suministro de material vegetal especie ABANICAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	400.00	$ 21,643,600.00	400.00	$ 21,643,600.00
NP 3.2.32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 25, de largo entre 20 cm	Und	0.00	$ 26,775.00	$ -	(+)	250.00	$ 6,693,750.00	250.00	$ 6,693,750.00
NP 3.2.33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	250.00	$ 13,527,250.00	250.00	$ 13,527,250.00
NP 3.2.34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 30 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	500.00	$ 27,054,500.00	500.00	$ 27,054,500.00
NP 3.2.35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	235.00	$ 12,715,615.00	235.00	$ 12,715,615.00
NP 3.2.36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	0.00	$ 57,442.00	$ -	(+)	60.00	$ 3,446,520.00	60.00	$ 3,446,520.00
NP 3.2.37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 25 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,809.00	$ -	(+)	500.00	$ 13,404,500.00	500.00	$ 13,404,500.00
NP 3.2.38	Suministro de material vegetal especie LILIACEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 27,942.00	$ -	(+)	22.00	$ 614,724.00	22.00	$ 614,724.00
NP 3.2.39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 25 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,109,000.00	1,000.00	$ 26,109,000.00
NP 3.2.40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 25 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 2,610,900.00	100.00	$ 2,610,900.00
NP 3.2.41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 55,275.00	$ -	(+)	20.00	$ 1,105,500.00	20.00	$ 1,105,500.00
NP 3.2.42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00
NP 3.2.43	Suministro de material vegetal especie ARBOL CITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00
NP 3.2.44	Suministro de material vegetal especie LIOPA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	0.00	$ 54,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 2,747,100.00	50.00	$ 2,747,100.00
NP 3.2.45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 16, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	900.00	$ 15,885,000.00	900.00	$ 15,885,000.00
NP 3.2.46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 15 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	250.00	$ 4,412,500.00	250.00	$ 4,412,500.00

En consecuencia, y con el fin de optimizar el diseño y mantener el equilibrio presupuestal de la intervención, se ha procedido a realizar una reducción proporcional en las cantidades de los siguientes ítems existentes: **3,2,1 – 3,2,2 – 3,2,3 – 3,2,6 – 3,2,7 – 3,2,8 – 3,2,9 – 3,2,10 – 3,2,14**

3.2	siembra de material vegetal										
3.2.1	Suministro de material vegetal especie Vetiveria: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	2,120.00	$ 33,942.00	$ 71,937,040.00	(-)	(1,820.00)	$ (61,774,440.00)	300.00	$ 10,162,600.00
3.2.2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 50 cm	Und	1,918.00	$ 41,796.00	$ 80,168,664.00	(-)	(1,818.00)	$ (75,988,764.00)	100.00	$ 4,179,900.00
3.2.3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	620.00	$ 46,799.00	$ 29,014,760.00	(-)	(520.00)	$ (24,334,080.00)	100.00	$ 4,679,900.00
3.2.4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm, durante el desarrollo del contrato	Und	125.00	$ 66,974.00	$ 8,371,750.00	(-)	(125.00)	$ (8,371,750.00)	- .00	$ -
3.2.5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	247.00	$ 86,974.00	$ 21,482,578.00	(-)	(247.00)	$ (21,482,578.00)	- .00	$ -
3.2.6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 45 cm	Und	420.00	$ 26,974.00	$ 11,329,080.00	(-)	(320.00)	$ (8,631,680.00)	100.00	$ 2,697,400.00
3.2.7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1,500.00	$ 16,086.00	$ 24,129,000.00	(-)	(1,400.00)	$ (22,526,000.00)	100.00	$ 1,608,600.00
3.2.8	Suministro de material vegetal especie cera blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 20 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2,500.00	$ 11,090.00	$ 27,725,000.00	H	(2,400.00)	$ (26,616,000.00)	100.00	$ 1,109,000.00
3.2.9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 12 cm	Und	1,000.00	$ 12,737.00	$ 12,737,000.00	H	(900.00)	$ (11,463,300.00)	100.00	$ 1,273,700.00
3.2.10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1,820.00	$ 14,090.00	$ 25,643,800.00	H	(1,620.00)	$ (22,825,800.00)	200.00	$ 2,818,000.00
3.2.11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	65.00	$ 84,778.00	$ 5,508,130.00	H	(65.00)	$ (5,508,130.00)	- .00	$ -
3.2.12	Suministro de material vegetal especie Uvago: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00		- .00	$ -	20.00	$ 401,800.00
3.2.13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00		- .00	$ -	80.00	$ 1,607,200.00
3.2.14	Suministro e instalación de Grama mani forrajero	m2	6,280.00	$ 17,290.00	$ 108,581,200.00	H	(5,280.00)	$ (90,772,800.00)	1,000.00	$ 17,290,000.00

En relación con el ítem **3.1 (Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico))**, se ha constatado durante la fase de ejecución que la aplicación del material de enmienda se realizará de manera focalizada, limitándose exclusivamente a las áreas y hoyos de siembra donde se instalará cada espécimen vegetal.

respecto a lo anterior se ha generado una disminución proporcional en la cantidad ejecutada de este ítem respecto a la proyección inicial del proyecto.

3	ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE									
3.1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	1,680.00	$ 117,873.00	$ 198,026,640.00	(-)	(1,125.96)	$ (132,720,834.00)	554.0	$ 65,305,806.00

En lo referente al ítem 3,3,2 (Suministro e instalación de piedra bola), tras un análisis detallado del diseño paisajístico final y los criterios estéticos del proyecto, se ha determinado una modificación en el uso decorativos.

Se concluye que se priorizará el uso de material triturado por sobre la piedra bola. En consecuencia, se procede a realizar una reducción en las cantidades ejecutadas de este ítem, ajustando el volumen de suministro a los requerimientos actuales de la propuesta paisajística.

3,3	INSTALACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS									
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00		- 00	$ -	285.92	$ 32,272,271.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	203.00	$ 128,873.00	$ 26,161,219.00		(103.00)	$ (13,273,919.0	100.00	$ 12,887,300.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- 00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- 00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00

Tras el análisis del modificatorio del proyecto, la **Interventoría** ha verificado que los ajustes propuestos, correspondientes al balance de cantidades y a la inclusión de ítems no previstos, no alteran el alcance financiero establecido inicialmente

Así mismo, se ha constatado que la solicitud de balance no requiere la adición de recursos financieros, ya que el contrato mantiene su equilibrio económico a la fecha del presente informe. Una vez elaborado y revisado el balance detallado, la **Interventoría** evidencia que la compensación entre ítems garantiza la ejecución total de las obras proyectadas sin incrementar el valor contractual vigente, asegurando así la eficiencia administrativa y presupuestal de la intervención.

Por las anteriores consideraciones expresadas la presente interventoría considera que la modificación de mayores y menores cantidades es conveniente para el proyecto.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

Ver Anexo No. 1. *BALANCE FISICO FINANCIERO OBRA - INTERVENTORIA*

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN N/A			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
1	**DIAGNOSTICO**				$ -			$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -			$ -	
1,1	Analisis del estado actual	Und	1.00	$9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00	0.30	$ 2,819,451.00		$ -		$ -	0.30	$ 2,819,451.00	**30%**	0.70	$ 6,578,718.00	**70%**
1,2	Identificacion de puntos criticos	Und	1.00	$2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00	0.30	$ 655,269.00		$ -		$ -	0.30	$ 655,269.00	**30%**	0.70	$ 1,528,960.00	**70%**
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00	0.30	$ 640,583.00		$ -		$ -	0.30	$ 640,583.00	**30%**	0.70	$ 1,494,693.00	**70%**
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	16,800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00	3,328.21	$ 4,499,740.00	2,895.52	$ 3,914,743.00		$ -	6,223.73	$ 8,414,483.00	**29%**	15,065.49	$ 20,368,542.00	**71%**
2,2	Excavacion y nivelacion	m3	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00	(-)	(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00	332.84	$ 20,003,684.00	98.76	$ 5,935,596.00		$ -	431.60	$ 25,939,280.00	**72%**	168.40	$ 10,120,720.00	**28%**
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- .00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 33,510,000.00	**100%**
2,4	Retiro de material sobrante	m3	1,700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00	649.03	$ 26,106,583.00		$ -		$ -	649.03	$ 26,106,583.00	**75%**	211.21	$ 8,495,767.00	**25%**
NP 2.5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	0.00	$ 11,242.00		(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00	**34%**	5,655.74	$ 63,581,829.00	**66%**
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**											$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y organico)	m3	1,680.00	$ 117,873.00	$ 198,026,640.00	(-)	(1,126.0)	$ (132,720,834.00)	554.0	$ 65,305,806.00		$ -	98.76	$ 11,641,373.00		$ -	98.76	$ 11,641,373.00	**18%**	455.27	$ 53,664,433.00	**82%**
3,2	**siembra de material vegetal**											$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	2,120.00	$ 33,942.00	$ 71,957,040.00	(-)	(1,820.00)	$ (61,774,440.00)	300.00	$ 10,182,600.00		$ -	153.00	$ 5,193,126.00		$ -	153.00	$ 5,193,126.00	**51%**	147.00	$ 4,989,474.00	**49%**
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	1,918.00	$ 41,798.00	$ 80,168,564.00	(-)	(1,818.00)	$ (75,988,764.00)	100.00	$ 4,179,800.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00	**100%**	-	$ -	
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	620.00	$ 46,798.00	$ 29,014,760.00	(-)	(520.00)	$ (24,334,960.00)	100.00	$ 4,679,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 4,679,800.00	**100%**
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	125.00	$ 66,974.00	$ 8,371,750.00	(-)	(125.00)	$ (8,371,750.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,5	Suministro de material vegetal especiel Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	247.00	$ 86,974.00	$ 21,482,578.00	(-)	(247.00)	$ (21,482,578.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	420.00	$ 26,974.00	$ 11,329,080.00	(-)	(320.00)	$ (8,631,680.00)	100.00	$ 2,697,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 2,697,400.00	**100%**
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1,500.00	$ 16,090.00	$ 24,135,000.00	(-)	(1,400.00)	$ (22,526,000.00)	100.00	$ 1,609,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,609,000.00	**100%**
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2,500.00	$ 11,090.00	$ 27,725,000.00	(-)	(2,400.00)	$ (26,616,000.00)	100.00	$ 1,109,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,109,000.00	**100%**

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN N/A			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	1,000.00	$ 12,737.00	$ 12,737,000.00	(-)	(900)	$ (11,463,300.00)	100	$ 1,273,700.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,273,700.00	100%
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1,820.00	$ 14,090.00	$ 25,643,800.00	(-)	(1,620.00)	$ (22,825,800.00)	200.00	$ 2,818,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		200.00	$ 2,818,000.00	100%
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	85.00	$ 64,778.00	$ 5,506,130.00	(-)	(85.00)	$ (5,506,130.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00		- .00	$ -	20.00	$ 401,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 401,800.00	100%
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00		- .00	$ -	80.00	$ 1,607,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 1,607,200.00	100%
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	6,250.00	$ 17,290.00	$ 108,062,500.00	(-)	(5,250.00)	$ (90,772,500.00)	1,000.00	$ 17,290,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,000.00	$ 17,290,000.00	100%
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	0.00	$ 426,984.00	$ -	(+)	80.00	$ 34,158,720.00	80.00	$ 34,158,720.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 34,158,720.00	100%
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	0.00	$ 390,942.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,275,360.00	80.00	$ 31,275,360.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 31,275,360.00	100%
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	0.00	$ 535,942.00	$ -	(+)	14.00	$ 7,503,188.00	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00		-	$ -	
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	0.00	$ 410,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 20,547,100.00	50.00	$ 20,547,100.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 20,547,100.00	100%
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	35.00	$ 13,566,315.00	35.00	$ 13,566,315.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		35.00	$ 13,566,315.00	100%
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	36.00	$ 19,353,924.00	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00		-	$ -	
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	9.00	$ 4,838,481.00	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00		-	$ -	

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN N/A			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,008,720.00	80.00	$ 31,008,720.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 31,008,720.00	**100%**
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 422,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 33,808,720.00	80.00	$ 33,808,720.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00		70.00	$ 29,582,630.00	**88%**
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	0.00	$ 389,275.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,142,000.00	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00		-	$ -	
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	0.00	$ 61,825.00	$ -	(+)	300.00	$ 18,547,500.00	300.00	$ 18,547,500.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00		79.00	$ 4,884,175.00	**26%**
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 61,942.00	$ -	(+)	150.00	$ 9,291,300.00	150.00	$ 9,291,300.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		150.00	$ 9,291,300.00	**100%**
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 62,442.00	$ -	(+)	200.00	$ 12,488,400.00	200.00	$ 12,488,400.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00		145.00	$ 9,054,090.00	**73%**
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	180.00	$ 10,819,620.00	180.00	$ 10,819,620.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00		80.00	$ 4,808,720.00	**44%**
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 6,010,900.00	100.00	$ 6,010,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 6,010,900.00	**100%**
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	0.00	$ 26,442.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,442,000.00	1,000.00	$ 26,442,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,000.00	$ 26,442,000.00	**100%**
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	400.00	$ 21,643,600.00	400.00	$ 21,643,600.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00		315.00	$ 17,044,335.00	**79%**
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	0.00	$ 26,775.00	$ -	(+)	250.00	$ 6,693,750.00	250.00	$ 6,693,750.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 6,693,750.00	**100%**
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	250.00	$ 13,527,250.00	250.00	$ 13,527,250.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 13,527,250.00	**100%**
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	500.00	$ 27,054,500.00	500.00	$ 27,054,500.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00		241.00	$ 13,040,269.00	**48%**

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN N/A			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	235.00	$ 12,715,615.00	235.00	$ 12,715,615.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00		203.00	$ 10,984,127.00	**86%**
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	0.00	$ 57,442.00	$ -	(+)	60.00	$ 3,446,520.00	60.00	$ 3,446,520.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00		22.00	$ 1,263,724.00	**37%**
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,609.00	$ -	(+)	500.00	$ 13,304,500.00	500.00	$ 13,304,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		500.00	$ 13,304,500.00	**100%**
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 27,942.00	$ -	(+)	22.00	$ 614,724.00	22.00	$ 614,724.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		22.00	$ 614,724.00	**100%**
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,109,000.00	1,000.00	$ 26,109,000.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00		950.00	$ 24,803,550.00	**95%**
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 2,610,900.00	100.00	$ 2,610,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 2,610,900.00	**100%**
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 55,275.00	$ -	(+)	20.00	$ 1,105,500.00	20.00	$ 1,105,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 1,105,500.00	**100%**
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00		$ -	5.00	$ 649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00		32.00	$ 4,158,144.00	**86%**
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00		18.00	$ 2,338,956.00	**49%**
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	0.00	$ 54,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 2,747,100.00	50.00	$ 2,747,100.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 2,747,100.00	**100%**
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	900.00	$ 15,885,000.00	900.00	$ 15,885,000.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00		840.00	$ 14,826,000.00	**93%**
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	250.00	$ 4,412,500.00	250.00	$ 4,412,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 4,412,500.00	**100%**
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**											$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00		- .00	$ -	285.92	$ 32,272,271.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		285.92	$ 32,272,271.00	**100%**
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	203.00	$ 128,873.00	$ 26,161,219.00	(-)	(103.00)	$ (13,273,919.00)	100.00	$ 12,887,300.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 12,887,300.00	**100%**

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN N/A			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		2.00	$ 4,180,400.00	100%
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00	100%	-	$ -	
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		672.00	$ 52,080,000.00	100%
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		47,600.00	$ 64,355,200.00	100%
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		15,400.00	$ 86,886,800.00	100%
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		11,000.00	$ 32,395,000.00	100%
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00		- .00	$ -	1,075.12	$ 43,157,326.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,075.12	$ 43,157,326.00	100%
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		2,500.00	$ 27,735,000.00	100%
COSTO DIRECTO					**$ 1,189,274,532.00**			**$ -**		**$ 1,189,274,532.00**		**$ 54,725,310.00**		**$186,675,530.00**		**$ -**		**$ 241,400,840.00**			**$ 947,873,692.00**	
ADMINISTRACIÓN				22%	$261,640,397.00			0		$261,640,397.00		12039568.2		41068616.6		0		53108184.8			208532212.2	
IMPREVISTOS				2%	$23,785,491.00			0		$23,785,491.00		1094506.2		3733510.6		0		4828016.8			18957473.84	
UTILIDADES				6%	$71,356,472.00			0		$71,356,472.00		3283518.6		11200531.8		0		14484050.4			56872421.52	
IVA sobre utilidad				19%	$13,557,730.00			0		$13,557,730.00		623868.534		2128101.042		0		2751969.576			10805760.09	
COSTO INDIRECTO					**$ 370,340,090.00**			**$ -**		**$ 370,340,090.00**		**$ 17,041,462.00**		**$ 58,130,760.00**		**$ -**		**$ 75,172,222.00**			**$ 295,167,868.00**	
VALOR TOTAL OBRA					**$ 1,559,614,622.00**			**$ -**		**$ 1,559,614,622.00**		**$ 71,766,772.00**		**$244,806,290.00**		**$ -**		**$ 316,573,062.00**			**$1,243,041,560.00**	
PORCENTAJE DE AVANCE OBRA												**4.60%**		**15.70%**		**0.00%**		**20.30%**			**79.70%**	

INTERVENTORIA					**$ 91,760,043.00**					**$ 91,760,043.00**		**$ 4,124,800.00**		**$ 18,266,973.00**				**$ 22,391,773.00**			**$ 69,368,270.00**	
IVA Interventoria				19%	$ 17,434,408.17			$ -		$ 17,434,408.17		$ 783,712.00		$ 3,470,724.87		$ -		$ 4,254,436.87			$ 13,179,971.30	
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO					**$ 109,194,451.00**			**$ -**		**$ 109,194,451.00**		**$ 4,908,512.00**		**$ 21,737,698.00**		**$ -**		**$ 26,646,210.00**			**$ 82,548,241.00**	
PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA												**4.50%**		**19.91%**		**0.00%**		**24.40%**			**75.60%**	

TOTAL PROYECTO :	$ 1,668,809,073.00	$ -	$ 1,668,809,073.00	$ 76,675,284.00	$ 266,543,988.00	$ -	$ 343,219,272.00	$ 1,325,589,801.00
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (%) :				4.59%	15.97%	$ -	20.57%	79.43%

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suarez Delgado
RESIDENTE DE OBRA

Nelson David Acevedo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Angela Gioconda Jaimes Coronado
DIRECTOR DE OBRA

Freddy Alexili Villan Valencia
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Ver *Anexo No. 2.* *REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA*.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**DESDE**	**01/01/2026**
			HASTA	**01/31/2026**



Se realiza el deshierve en area del puente de guadua



Se realiza la limpieza y deshierbe en el area circundante de monumento arnulfo briceño



Se mantiene las actividades de limpieza y deshierve



Continua la actividad de limpieza y deshierve

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**2,2**	**Excavacion y nivelacion**	**DESDE**	**1/1/2026**
			HASTA	**01/31/2026**



Se llevan acabado actividades de excavacion y nivelacion en los puntos de siembra



Se mantienen las actividades de excavacion y nivelacion en los puntos de siembra



Continuan las actividades de excavacion y nivelacion en los puntos de siembra



Se evidencia el metodo de excavacion y nivelacion en los puntos de siembra

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 2.5**	**Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.**	**DESDE**	**1/1/2026**
			HASTA	**01/31/2026**



Conformacion, relleno y nivelacion con material de excavacion



Conformacion, relleno y nivelacion con material de excavacion



Conformacion, relleno y nivelacion con material de excavacion



Conformacion, relleno y nivelacion con material de excavacion

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y organico)**	**DESDE**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Se lleva acabo la palicacion del material de enmienda en las zonas de siembra



Se lleva acabo la palicacion del material de enmienda en las zonas de siembra

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**3,2,1**	**Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm**	**DESDE**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de veranera



Suministro e instalacion de veranera



Suministro e instalacion de veranera



Suministro e instalacion de veranera

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**3,2,2**	**Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm**	**DESDE**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Agave



Suministro e instalacion de Agave



Suministro e instalacion de Agave



Suministro e instalacion de Agave

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,17**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2.00 m**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Palma Bismarckia



Suministro e instalacion de Palma Bismarckia



Suministro e instalacion de Palma Bismarckia



Suministro e instalacion de Palma Bismarckia

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,20**	**Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Palma Real



Suministro e instalacion de Palma Real



Suministro e instalacion de Palma Real



Suministro e instalacion de Palma Real

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,21**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Palma Botella



Suministro e instalacion de Palma Botella



Suministro e instalacion de Palma Botella



Suministro e instalacion de Palma Botella

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,23**	**Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Palma Manila



Suministro e instalacion de Palma Manila



Suministro e instalacion de Palma Manila



Suministro e instalacion de Palma Manila

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,24**	**Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Palma Roubelina



Suministro e instalacion de Palma Roubelina



Suministro e instalacion de Palma Roubelina



Suministro e instalacion de Palma Roubelina

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,25**	**Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Cordyline



Suministro e instalacion de Cordyline



Suministro e instalacion de Cordyline



Suministro e instalacion de Cordyline

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,27**	**Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion Cancion de la India



Suministro e instalacion Cancion de la India



Suministro e instalacion Cancion de la India



Suministro e instalacion Cancion de la India

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,28**	**Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Cheflera Variagada



Suministro e instalacion de Cheflera Variagada



Suministro e instalacion de Cheflera Variagada



Suministro e instalacion de Cheflera Variagada

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,31**	**Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Amancay



Suministro e instalacion de Amancay



Suministro e instalacion de Amancay



Suministro e instalacion de Amancay

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,34**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Philodendro selloum



Suministro e instalacion de Philodendro selloum



Suministro e instalacion de Philodendro selloum



Suministro e instalacion de Philodendro selloum

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,35**	**Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Pandanus Variegado



Suministro e instalacion de Pandanus Variegado



Suministro e instalacion de Pandanus Variegado



Suministro e instalacion de Pandanus Variegado

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,36**	**Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Veranera Tallo Alto



Suministro e instalacion de Veranera Tallo Alto



Suministro e instalacion de Veranera Tallo Alto



Suministro e instalacion de Veranera Tallo Alto

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,39**	**Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Flor del Llano



Suministro e instalacion de Flor del Llano



Suministro e instalacion de Flor del Llano



Suministro e instalacion de Flor del Llano

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,42**	**Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Arbol carbonero



Suministro e instalacion de Arbol carbonero



Suministro e instalacion de Arbol carbonero



Suministro e instalacion de Arbol carbonero

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,43**	**Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalacion de Arbol Oiti



Suministro e instalacion de Arbol Oiti



Suministro e instalacion de Arbol Oiti



Suministro e instalacion de Arbol Oiti

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,45**	**Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm**	**DESDE :**	**1/1/2026**
			HASTA :	**01/31/2026**



Suministro e instalcion de Plantas rastreras



Suministro e instalcion de Plantas rastreras



Suministro e instalcion de Plantas rastreras



Suministro e instalcion de Plantas rastreras

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

01/01/2026 AL 01/31/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**3,3,4**	**Instalación de vallas informativas**	**DESDE:**	**1/1/2026**
			HASTA:	**01/31/2026**



Instalacion de vallas informativas



Instalacion de vallas informativas

Ver *Anexo No. 3.* *ESTADO FINANCIERO OBRA E INTERVENTORIA*

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN Fecha			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
1	**DIAGNOSTICO**				$ -			$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -			$ -	
1,1	Analisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00	0.30	$ 2,819,451.00		$ -		$ -	0.30	$ 2,819,451.00	30%	0.70	$ 6,578,718.00	70%
1,2	Identificacion de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00	0.30	$ 655,269.00		$ -		$ -	0.30	$ 655,269.00	30%	0.70	$ 1,528,960.00	70%
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00	0.30	$ 640,583.00		$ -		$ -	0.30	$ 640,583.00	30%	0.70	$ 1,494,693.00	70%
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	16800.00	$ 1,352.00	$ 22,713,600.00	(+)	4,489.22	$ 6,069,425.00	21,289.22	$ 28,783,025.00	3,328.21	$ 4,499,740.00	2,895.52	$ 3,914,743.00		$ -	6,223.73	$ 8,414,483.00	29%	15,065.49	$ 20,368,542.00	71%
2,2	Excavacion y nivelacion	m2	840.00	$ 60,100.00	$ 50,484,000.00		(240.00)	$ (14,424,000.00)	600.00	$ 36,060,000.00	332.84	$ 20,003,684.00	98.76	$ 5,935,596.00		$ -	431.60	$ 25,939,280.00	72%	168.40	$ 10,120,720.00	28%
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00		- .00	$ -	50.00	$ 33,510,000.00	- .00	$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 33,510,000.00	100%
2,4	Retiro de material sobrante	m3	1700.00	$ 40,224.00	$ 68,380,800.00	(-)	(839.76)	$ (33,778,450.00)	860.24	$ 34,602,350.00	649.03	$ 26,106,583.00		$ -		$ -	649.03	$ 26,106,583.00	75%	211.21	$ 8,495,767.00	25%
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	0.00	$ 11,242.00		(+)	8,551.26	$ 96,133,265.00	8,551.26	$ 96,133,265.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00	34%	5,655.74	$ 63,581,829.00	66%
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y organico)	m3	1680.00	$ 117,873.00	$ 198,026,640.00	(-)	(1,126.0)	$ (132,720,834.00)	554.0	$ 65,305,806.00		$ -	98.76	$ 11,641,373.00		$ -	98.76	$ 11,641,373.00	18%	455.27	$ 53,664,433.00	82%
3,2	**siembra de material vegetal**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	2120.00	$ 33,942.00	$ 71,957,040.00	(-)	(1,820.00)	$ (61,774,440.00)	300.00	$ 10,182,600.00		$ -	153.00	$ 5,193,126.00		$ -	153.00	$ 5,193,126.00	51%	147.00	$ 4,989,474.00	49%
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	1918.00	$ 41,798.00	$ 80,168,564.00	(-)	(1,818.00)	$ (75,988,764.00)	100.00	$ 4,179,800.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00	100%	-	$ -	
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	620.00	$ 46,798.00	$ 29,014,760.00	(-)	(520.00)	$ (24,334,960.00)	100.00	$ 4,679,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 4,679,800.00	100%
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	125.00	$ 66,974.00	$ 8,371,750.00	(-)	(125.00)	$ (8,371,750.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,5	Suministro de material vegetal especiel Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	247.00	$ 86,974.00	$ 21,482,578.00	(-)	(247.00)	$ (21,482,578.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	420.00	$ 26,974.00	$ 11,329,080.00	(-)	(320.00)	$ (8,631,680.00)	100.00	$ 2,697,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 2,697,400.00	100%
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	1500.00	$ 16,090.00	$ 24,135,000.00	(-)	(1,400.00)	$ (22,526,000.00)	100.00	$ 1,609,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,609,000.00	100%
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	2500.00	$ 11,090.00	$ 27,725,000.00	(-)	(2,400.00)	$ (26,616,000.00)	100.00	$ 1,109,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,109,000.00	100%

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN Fecha			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	1000.00	$ 12,737.00	$ 12,737,000.00	(-)	(900)	$ (11,463,300.00)	100	$ 1,273,700.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 1,273,700.00	**100%**
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	1820.00	$ 14,090.00	$ 25,643,800.00	(-)	(1,620.00)	$ (22,825,800.00)	200.00	$ 2,818,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		200.00	$ 2,818,000.00	**100%**
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	85.00	$ 64,778.00	$ 5,506,130.00	(-)	(85.00)	$ (5,506,130.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00		- .00	$ -	20.00	$ 401,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 401,800.00	**100%**
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00		- .00	$ -	80.00	$ 1,607,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 1,607,200.00	**100%**
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	6250.00	$ 17,290.00	$ 108,062,500.00	(-)	(5,250.00)	$ (90,772,500.00)	1,000.00	$ 17,290,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,000.00	$ 17,290,000.00	**100%**
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	0.00	$ 426,984.00	$ -	(+)	80.00	$ 34,158,720.00	80.00	$ 34,158,720.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 34,158,720.00	**100%**
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	0.00	$ 390,942.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,275,360.00	80.00	$ 31,275,360.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 31,275,360.00	**100%**
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	0.00	$ 535,942.00	$ -	(+)	14.00	$ 7,503,188.00	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	0.00	$ 410,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 20,547,100.00	50.00	$ 20,547,100.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 20,547,100.00	**100%**
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	35.00	$ 13,566,315.00	35.00	$ 13,566,315.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		35.00	$ 13,566,315.00	**100%**
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	36.00	$ 19,353,924.00	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	0.00	$ 537,609.00	$ -	(+)	9.00	$ 4,838,481.00	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00	**100%**	-	$ -	

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN Fecha			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	0.00	$ 387,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,008,720.00	80.00	$ 31,008,720.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		80.00	$ 31,008,720.00	**100%**
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	0.00	$ 422,609.00	$ -	(+)	80.00	$ 33,808,720.00	80.00	$ 33,808,720.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00	**13%**	70.00	$ 29,582,630.00	**88%**
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	0.00	$ 389,275.00	$ -	(+)	80.00	$ 31,142,000.00	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	0.00	$ 61,825.00	$ -	(+)	300.00	$ 18,547,500.00	300.00	$ 18,547,500.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00	**74%**	79.00	$ 4,884,175.00	**26%**
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 61,942.00	$ -	(+)	150.00	$ 9,291,300.00	150.00	$ 9,291,300.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		150.00	$ 9,291,300.00	**100%**
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 62,442.00	$ -	(+)	200.00	$ 12,488,400.00	200.00	$ 12,488,400.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00	**28%**	145.00	$ 9,054,090.00	**73%**
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	180.00	$ 10,819,620.00	180.00	$ 10,819,620.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00	**56%**	80.00	$ 4,808,720.00	**44%**
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 60,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 6,010,900.00	100.00	$ 6,010,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 6,010,900.00	**100%**
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	0.00	$ 26,442.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,442,000.00	1,000.00	$ 26,442,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,000.00	$ 26,442,000.00	**100%**
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	400.00	$ 21,643,600.00	400.00	$ 21,643,600.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00	**21%**	315.00	$ 17,044,335.00	**79%**
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	0.00	$ 26,775.00	$ -	(+)	250.00	$ 6,693,750.00	250.00	$ 6,693,750.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 6,693,750.00	**100%**
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	250.00	$ 13,527,250.00	250.00	$ 13,527,250.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 13,527,250.00	**100%**
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	500.00	$ 27,054,500.00	500.00	$ 27,054,500.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00	**52%**	241.00	$ 13,040,269.00	**48%**

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN Fecha			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	0.00	$ 54,109.00	$ -	(+)	235.00	$ 12,715,615.00	235.00	$ 12,715,615.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00	14%	203.00	$ 10,984,127.00	86%
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	0.00	$ 57,442.00	$ -	(+)	60.00	$ 3,446,520.00	60.00	$ 3,446,520.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00	63%	22.00	$ 1,263,724.00	37%
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,609.00	$ -	(+)	500.00	$ 13,304,500.00	500.00	$ 13,304,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		500.00	$ 13,304,500.00	100%
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 27,942.00	$ -	(+)	22.00	$ 614,724.00	22.00	$ 614,724.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		22.00	$ 614,724.00	100%
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	1,000.00	$ 26,109,000.00	1,000.00	$ 26,109,000.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00	5%	950.00	$ 24,803,550.00	95%
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 26,109.00	$ -	(+)	100.00	$ 2,610,900.00	100.00	$ 2,610,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 2,610,900.00	100%
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 55,275.00	$ -	(+)	20.00	$ 1,105,500.00	20.00	$ 1,105,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 1,105,500.00	100%
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00		$ -	5.00	$ 649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00	14%	32.00	$ 4,158,144.00	86%
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	0.00	$ 129,942.00	$ -	(+)	37.00	$ 4,807,854.00	37.00	$ 4,807,854.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00	51%	18.00	$ 2,338,956.00	49%
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	0.00	$ 54,942.00	$ -	(+)	50.00	$ 2,747,100.00	50.00	$ 2,747,100.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 2,747,100.00	100%
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	900.00	$ 15,885,000.00	900.00	$ 15,885,000.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00	7%	840.00	$ 14,826,000.00	93%
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	0.00	$ 17,650.00	$ -	(+)	250.00	$ 4,412,500.00	250.00	$ 4,412,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		250.00	$ 4,412,500.00	100%
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN Fecha			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00		- .00	$ -	285.92	$ 32,272,271.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		285.92	$ 32,272,271.00	100%
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	203.00	$ 128,873.00	$ 26,161,219.00	(-)	(103.00)	$ (13,273,919.00)	100.00	$ 12,887,300.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 12,887,300.00	100%
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		2.00	$ 4,180,400.00	100%
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00	100%	-	$ -	
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		672.00	$ 52,080,000.00	100%
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		47,600.00	$ 64,355,200.00	100%
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		15,400.00	$ 86,886,800.00	100%
4,4	Poda y jardinería	m2	11000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		11,000.00	$ 32,395,000.00	100%
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00		- .00	$ -	1,075.12	$ 43,157,326.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,075.12	$ 43,157,326.00	100%
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		2,500.00	$ 27,735,000.00	100%
COSTO DIRECTO					**$ 1,189,274,532.00**			**$ -**		**$1,189,274,532.00**		**$ 54,725,310.00**		**$ 186,675,530.00**		**$ -**		**$ 241,400,840.00**			**$ 947,873,692.00**	
ADMINISTRACIÓN				22%	$ 261,640,397.00			0		$ 261,640,397.00		$ 12,039,568.20		41068616.6		0		$ 53,108,184.80			$ 208,532,212.24	
IMPREVISTOS				2%	$ 23,785,491.00			0		$ 23,785,491.00		$ 1,094,506.20		3733510.6		0		$ 4,828,016.80			$ 18,957,473.84	
UTILIDADES				6%	$ 71,356,472.00			0		$ 71,356,472.00		$ 3,283,518.60		11200531.8		0		$ 14,484,050.40			$ 56,872,421.52	
IVA sobre utilidad				19%	$ 13,557,730.00			0		$ 13,557,730.00		$ 623,868.53		2128101.042		0		$ 2,751,969.58			$ 10,805,760.09	
COSTO INDIRECTO					**$ 370,340,090.00**			**$ -**		**$ 370,340,090.00**		**$ 17,041,462.00**		**$ 58,130,760.00**		**$ -**		**$ 75,172,222.00**			**$ 295,167,868.00**	
VALOR TOTAL OBRA					**$ 1,559,614,622.00**			**$ -**		**$1,559,614,622.00**		**$ 71,766,772.00**		**$ 244,806,290.00**		**$ -**		**$ 316,573,062.00**			**$1,243,041,560.00**	
PORCENTAJE DE AVANCE OBRA											**4.60%**		**15.70%**		**0.00%**		**20.30%**			**79.70%**		

INTERVENTORIA					**$ 91,760,043.00**					**$ 91,760,043.00**		**$ 4,124,800.00**		**$ 18,266,973.00**				**$ 22,391,773.00**			**$ 69,368,270.00**	
IVA Interventoria				19%	$ 17,434,408.17			$ -		$ 17,434,408.17		$ 783,712.00		$ 3,470,724.87		$ -		$ 4,254,436.87			$ 13,179,971.30	
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO					**$ 109,194,451.00**			**$ -**		**$ 109,194,451.00**		**$ 4,908,512.00**		**$ 21,737,698.00**		**$ -**		**$ 26,646,210.00**			**$ 82,548,241.00**	
PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA											**4.50%**		**19.91%**		**0.00%**		**24.40%**			**75.60%**		

TOTAL PROYECTO :	$ 1,668,809,073.00	$ -	$ 1,668,809,073.00	$ 76,675,284.00	$ 266,543,988.00	$ -	$ 343,219,272.00	$ 1,325,589,801.00
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (%) :				4.59%	15.97%	$ -	20.57%	79.43%

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Suarez Delgado	**Nelson David Acevedo Torres**	**Angela Gioconda Jaimes Coronado**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Valor inicial del contrato	**$**	**1,559,614,622.00**
Valor Adicional del contrato	**$**	**-**

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	01/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	01/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION O ADICIÓN Fecha			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 **/**/**** - **/**/****		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
Valor Total del contrato		**$**			**1,559,614,622.00**																	

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones
						Desde	Hasta			
1	$ 71,766,772.00	$71,766,772.00	$ 1,487,847,850.00	4.60%	4.60%	12/24/2025	12/31/2025	12/31/2025		
2	$ 244,806,290.00	$ 316,573,062.00	$ 1,243,041,560.00	15.70%	20.30%	01/01/2026	01/31/2026	02/10/2026		
	$ -									

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE ITERVENTORIA

Valor inicial del contrato	**$**	**109,194,451.00**
Valor Adicional del contrato	**$**	**-**
Valor Total del contrato	**$**	**109,194,451.00**

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones
						Desde	Hasta			
1	$ 4,908,512.00	$ 4,908,512.00	$ 104,285,939.00	4.50%	4.50%	12/24/2025	12/31/2025	12/31/2025		
2	$ 21,737,698.00	$26,646,210.00	$ 82,548,241.00	19.91%	24.40%	01/01/2026	01/31/2026	02/10/2026		

Luis Fernando Suarez Delgado
RESIDENTE DE OBRA

Nelson David Acevedo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Angela Gioconda Jaimes Coronado
DIRECTOR DE OBRA

Freddy Alexili Villan Valencia
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo *MPA-01-F-25 - Versión 3 (Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

LISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-25, versión 4, 08/07/2024

Mensualmente se verificará el estado de cumplimiento de los criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en las obras públicas ejecutadas por la Corporación.

CONTRATO N° Y FECHA	CONTRATO DE OBRA No. LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
CONTRATISTA	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
INTERVENTOR	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES
SUPERVISOR	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR

	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
No.	**Variable de control**	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**VERIFICACIÓN**				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	**Registro de verificación**			
							C	N/C	N/A	
1	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**									
1.1	Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.	* Todo el personal de la obra debe estar afiliado al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. * El empleador realizará oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social. (Nota: Los primeros 5 días de cada mes)	Antes y durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Planillas de afiliación al Sistema de Seguridad Social y Planilla de pagos mensuales de la seguridad social.	**30-Jan-25**	**X**			Afiliado a la ARL, EPS, AFP y CCF todo el personal
1.2	Inducción a los trabajadores	Conocimiento del PLAN DE CONTROL DE	Al ingreso del personal	Residente de Obra e	Acta de induccion	**30-Jan-25**	**X**			Personal de la obra con inducción general
1.3	Entrega de EPP y capacitación	* Todo el personal de la obra debe estar dotado	Al ingreso y durante la	Residente de Obra e	Planilla de entrega de EPP /	**30-Jan-25**	**X**			Entrega de EPP y socialización en la
1.4	Exámenes de ingreso y retiro	Todo el personal de la obra antes de su ingreso se le realizará Examen de ingreso y al retirarse se le realizará Examen de retiro.	Al ingreso y al retiro de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Exámenes de ingreso y Exámenes de retiro.	**30-Jan-25**	**X**			Todo el personal de ingreso cuenta con el examen medico ocupacional, se presenta un retiro y se soporta con orden de examen medico de retiro
1.5	Reporte e investigación de Accidente de trabajo	Reportar el accidente o incidente inmediatamente suceda al jefe inmediato. Investigar la causa real y las condiciones en que se dio. Nota: La ARL solo reconoce los accidentes que se reporten dentro de las 48 horas siguientes.	Al momento de ocurrir un Accidente de trabajo ó Incidente de trabajo.	Residente de Obra e interventoría	Reporte ante la ARL del Accidente de trabajo y Registro de la investigación del accidente sea a la ARL ó propio de la empresa.	**30-Jan-25**	**X**			A la fecha no ha ocurrido ningun accidente
1.6	Reporte e investigación de Incidente de trabajo					**30-Jan-25**	**X**			A la fecha no ha ocurrido ningun accidente
1.7	Demarcación y señalización de áreas de trabajo	Informar a las personas en general y en especial a los usuarios de las áreas existentes. Una adecuada señalización permitirá disminuir el riesgo de accidentes,	Al inicio y durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Capacitación al personal de la obra y Registro fotográfico.	**30-Jan-25**	**X**			Se les socializa al personal la importancia del uso de las colombinas, conos y señalización en la obra.
2	**PLAN DE EMERGENCIA**									
2.1	Capacitación plan de	Todo el personal debe tener conocimiento de	En la inducción al personal	Ingeniero Residente	Registro de capacitación	**30-Jan-25**	X			En la inducción se socializa como actuar

LISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-25, versión 4, 08/07/2024

Mensualmente se verificará el estado de cumplimiento de los criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en las obras públicas ejecutadas por la Corporación.

CONTRATO N° Y FECHA	CONTRATO DE OBRA No. LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
CONTRATISTA	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
INTERVENTOR	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES
SUPERVISOR	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR

	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
No.	**Variable de control**	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**VERIFICACIÓN**				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	**Registro de verificación**			
							C	N/C	N/A	
2.2	Ocurrencia de un evento	Diligenciar informe de reporte.	Cuando ocurra el evento.	Residente de Obra	Informe con VoBo de interventoría	**30-Jan-25**	**X**			a la fecha no ha ocurrido ningun evento
3	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**POLITRAUMATISMO, GOLPES, CONTUSIONES, CAÍDA DE OBJETOS, ACCIDENTES .**								
3.1	Uso de los elementos de	* Todo el personal de la obra debe portar	Al ingreso del personal y	Residente de Obra e	Planilla entrega de dotación	**30-Jan-25**	X			Se hace entrega de los EPP
3.2	Autocuidado	Capacitación en higiene postural y manejo de	Al ingreso del personal y	Residente de Obra e	Registro de capacitación y	**30-Jan-25**	X			Se socializa en la inducción y se realiza
4	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN DURANTE OPERACIONES (POLVO POR SOLDADURAS, CORTE DE LADRILLO , CORTE CERÁMICA , DEMOLICIÓN, PARTICULAS DE**								
4.1	Uso obligatorio del tapabocas, y protección visual.	Todo el personal que realice actividades donde se genere dispersión de partículas, debe usar debidamente el tapabocas y la protección visual.	Permanente	Residente de Obra e interventoría	Registro de capacitación del uso de los EPP y Registro fotográfico.	**30-Jan-25**	**X**			Se hace entrega de gafas y tapabocas
4.2	Riego de agua sobre superficies polvorientas.	Las superficies con exceso de polvo se le debe hacer riego de agua.	Durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Registro fotográfico.				X	
5	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**RIESGO DE ACCIDENTE POR ALMACENAMIENTO INADECUADO Y POR FALTA DE ORDEN Y ASEO.**								
5.1	Almacenamiento inadecuado	Disponer adecuadamente los materiales en	Durante la ejecución de la	Residente de Obra e	Capacitación al almacenista				**X**	
5.2	Orden y aseo en la obra	Mantener limpio y ordenada la obra.	Periódicamente	Residente de Obra e interventoría	Anotación en la bitácora / Registro fotográfico.	**30-Jan-25**	**X**			Socialización del orden y aseo en la obra, se entrega y hace uso de señalizacion de orden y aseo
6	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**RIESGO ERGONÓMICO POR POSTURAS INADECUADAS Y MANEJO DE CARGAS.**								
6.1	Manejo de buenas posturas y	* Aplicar la información dada en la	Durante la ejecución de la	Residente de Obra e	Capacitación al personal de	**30-Jan-25**	**X**			Se socializa en la inducción y se realiza
7	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**RIESGO DE TRABAJO EN ALTURA.**								
7.1	Trabajo Seguro en Alturas	* Desarrollar un procedimiento seguro para las	Durante la ejecución de la	Residente de Obra e	Capacitación al personal de				**X**	
7.2	Capacitación y entrenamiento	Todo Trabajador o Supervisor que está	Antes, durante la actividad	Residente de Obra e	Certificados del personal de				**X**	
8	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CON GRADO DE PELIGROSIDAD**								

LISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-25, versión 4, 08/07/2024

Mensualmente se verificará el estado de cumplimiento de los criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en las obras públicas ejecutadas por la Corporación.

CONTRATO N° Y FECHA	CONTRATO DE OBRA No. LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
CONTRATISTA	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
INTERVENTOR	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES
SUPERVISOR	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR

	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
No.	**Variable de control**	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**VERIFICACIÓN**				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	**Registro de verificación**			
							C	N/C	N/A	
8.1	Manejo adecuado de sustancias químicas	* Obligatoriedad en uso de los elementos de protección personal requerido * Adecuado rotulado de elementos químicos y almacenamiento de acuerdo a su peligrosidad. * Las fichas de seguridad de las sustancias deben estar publicadas en sitios visibles. * La disposición final de las sustancias peligrosas debe efectuarse de acuerdo lo dispuesto por la Entidad competente. Nota: cuando aplica	Antes, durante y al finalizar el uso de los productos.	Residente de Obra e interventoría o personal calificado	Fichas de seguridad, Registro fotográfico.				**X**	
	MANEJO AMBIENTAL									
9	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS POR LA EXPOSICIÓN AL RUIDO**								
9.1	Criterios de valoración del	Según la legislación colombiana los valores	Cuando Aplique	Residente de obra/	Reporte de Decibeles				**X**	
9.2	Normatividad relacionada con	*Proteger a los trabajadores contra los riesgos	*Señalización *Formato de	Residente de obra/	Registro fotográfico y				**X**	
10	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE AGUAS SERVIDAS.**								
10.1	Disposición adecuada de las aguas que se generen	Aguas Residuales en Zona Urbana: Disponerla adecuadamente en el alcantarillado Municipal. Aguas Residuales en Zona Rural: Si no se cuenta con alcantarillado, enviarlo a un campo de infiltración alejado de cuerpos de agua.	Semanalmente durante la ejecución de la obra.	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico.				**X**	
10.2	Disposición adecuada de las aguas que se generen por el lavado de la herramienta, maquinaria y equipo	Enviarlo a un campo de infiltración alejado de cuerpos de agua, y el sedimento será tratado como escombro.	Cuando aplique	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico.				**X**	
11	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE RESIDUOS COMUNES, RESIDUOS DE COMIDA, EMPAQUES.**								

LISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-25, versión 4, 08/07/2024

Mensualmente se verificará el estado de cumplimiento de los criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en las obras públicas ejecutadas por la Corporación.

CONTRATO N° Y FECHA	CONTRATO DE OBRA No. LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
CONTRATISTA	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
INTERVENTOR	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES
SUPERVISOR	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR

	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
No.	**Variable de control**	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**VERIFICACIÓN**				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	**Registro de verificación**			
							C	N/C	N/A	
11.1	Separación de residuos	Realizar separación de residuos generados y disponerlos adecuadamente dentro de recipientes debidamente marcados, identificando el tipo de residuo almacenado en cada uno de ellos.	Permanente	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico				**X**	
11.2	Almacenamiento de residuos	Almacenar temporalmente los residuos generados en un lugar adecuado para ello: señalizado, demarcado, bajo cubierta, sobre estibas y con condiciones adecuadas de ventilación	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico				**X**	
11.3	Disposición final	En zona rural, transportarlo a la zona urbana;	Cada que se generen	Residente de obra/	Registro fotográfico				**X**	
12	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS.**								
12.1	Separación de residuos	Realizar separación de residuos especiales y/o	Cada que se generen	Residente de obra/	Registro fotográfico / Hojas				**X**	
12.2	Almacenamiento de residuos	Almacenar temporalmente los residuos	Cada que se generen	Residente de obra/	Registro fotográfico				**X**	
12.3	Disposición final	Entrega a la empresa avalada para la recepción	Cada que se generen	Residente de obra/	Certificado de entrega de				**X**	
13	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE MOVIMIENTO DE TIERRA O ESCOMBROS.**								
13.1	Disposición final de residuos y	Cargue: Al momento del cargue del material se	Cada que se deposite	Ingeniero Residente	Registro fotográfico y					
14	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**USO DE AGREGADOS PÉTREOS**								
14.1	Material utilizado	Utilizar material sólo de sitios autorizados.	Antes de iniciar la extracción del material.	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Licencia ambiental y/o titulo minero de donde se extraen los materiales (Cuando aplique, dependiendo del impacto)					
15	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**USO DE AGUA**								
15.1	Uso adecuado del agua	Hacer sensibilización del uso adecuado del	En la inducción al personal y	Ingeniero Residente	Registro de capacitación y					
16	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS**								
16.1	Capacitación plan de	Todo el personal debe tener conocimiento de	Cuando aplica (En las	Ingeniero Residente	Registro de capacitación				X	
17	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR COMBUSTIÓN DE MOTORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO**								

LISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-25, versión 4, 08/07/2024

Mensualmente se verificará el estado de cumplimiento de los criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en las obras públicas ejecutadas por la Corporación.

CONTRATO N° Y FECHA	CONTRATO DE OBRA No. LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
CONTRATISTA	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
INTERVENTOR	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES
SUPERVISOR	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR

	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
No.	**Variable de control**	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**VERIFICACIÓN**				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	**Registro de verificación**			
							C	N/C	N/A	
17.1	Mantenimiento de maquinaria y equipo	Que los equipos trabajen de manera aceptable y cuente con los registros de mantenimiento periódicos según su uso	Cada que se requiera	Residente de obra/ Interventoría	Anotación en la bitácora		**X**			
