CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No 2025223

OBJETO
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA
DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
NIT. 800.100.532-8

CONTRATISTA
LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DESERVICIOS PÚBLICOS
NIT. 900.540.707-1

1- INTRODUCCIÓN

El proyecto denominado "**Optimización del Sistema de Alcantarillado en Zonas Urbanas del Municipio de Ansermanuevo, Departamento del Valle del Cauca"** corresponde a una intervención de infraestructura sanitaria orientada al mejoramiento de las condiciones hidráulicas, operativas y funcionales del sistema de alcantarillado existente en el área urbana del municipio. Dicho proyecto cuenta con una inversión total de $372.946.066, destinado a la ejecución de actividades constructivas, suministro de materiales, mano de obra y demás costos directos e indirectos asociados al desarrollo de la obra.

La ejecución física del proyecto tuvo una duración total de cincuenta y dos (52) días calendario, iniciando actividades el 10 de diciembre de 2025 y finalizando el 30 de enero de 2026, de conformidad con el cronograma aprobado contractualmente. Durante este periodo se desarrollaron las labores técnicas y operativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos, garantizando la adecuación y optimización de los tramos intervenidos del sistema de alcantarillado, en concordancia con las especificaciones técnicas, normativas vigentes y lineamientos establecidos en el contrato de obra.

El presente informe tiene como finalidad documentar y analizar los aspectos más relevantes de la ejecución del proyecto, correspondientes al periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026. En él se describen las actividades ejecutadas, el avance físico de la obra, el cumplimiento del cronograma, así como las obligaciones contractuales asumidas por el contratista, evaluando su desarrollo conforme a los términos contractuales, los criterios técnicos aplicables y las condiciones reales encontradas en campo.

Así mismo, el informe constituye un insumo técnico para la verificación del cumplimiento de los alcances del proyecto, permitiendo evidenciar el desempeño del contratista en la ejecución de las obras, la adecuada utilización de los recursos asignados y la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado, contribuyendo a la trazabilidad, transparencia y control del proceso constructivo.

2- LOCALIZACIÓN

La ejecución del proyecto denominado **"Optimización del Sistema de Alcantarillado en Zonas Urbanas del Municipio de Ansermanuevo, Departamento del Valle del Cauca"** se desarrolla en dos (2) frentes de intervención claramente definidos, los cuales fueron establecidos con base en criterios técnicos, operativos y de priorización de necesidades del sistema de alcantarillado sanitario existente por parte del ente contratante. Dichas intervenciones se localizan en sectores estratégicos del área urbana del municipio, seleccionados en función de su condición hidráulica, estado estructural de la infraestructura instalada y nivel de afectación a la prestación del servicio, En los apartados siguientes se realizará la descripción técnica individual de cada intervención.

1- Calle 2 Entre Calle 1ª y Carrea 4, barrio La Ceiba – Municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca

2- Carrera 2ª Entre Calle 8 y Calle 10, barrio La Inmaculada - Municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca

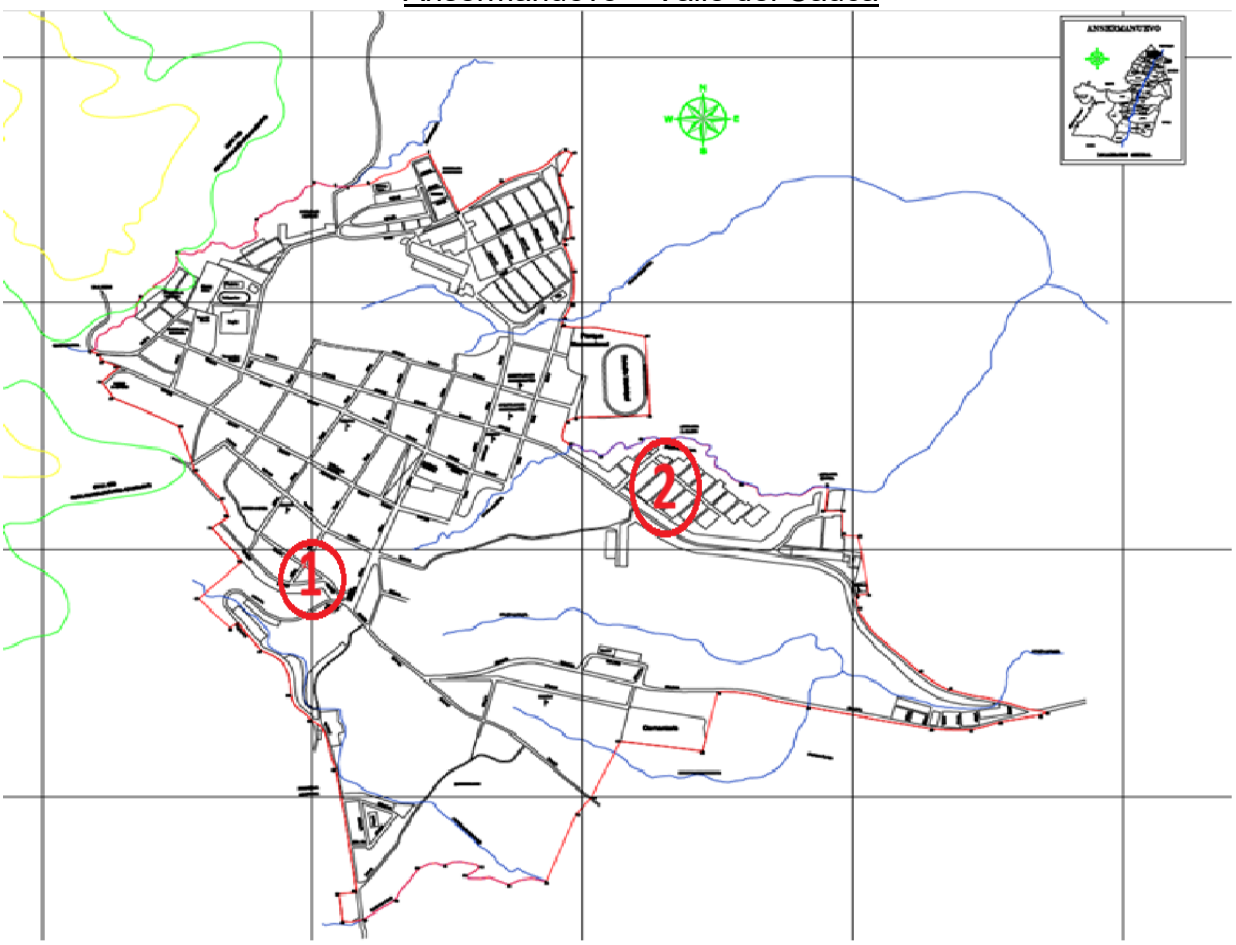

3- ACTIVIDADES Y CANTIDADES CONTRATADAS

2- Carrera 2ª Entre Calle 8 y Calle 10, barrio La Inmaculada - Municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca						
Ítem	APU	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo total
1.1	010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	133,41	$ 2.258,00	$ 301.239,78
1.2	082011	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	M2	65,00	$ 26.652,00	$ 1.732.380,00
1.3	100402	DEMOL.ANDEN-SARDINEL	M2	11,00	$ 10.247,00	$ 112.717,00
1.4	100634	EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)	M3	125,40	$ 5.309,00	$ 665.748,60
1.5	080107	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	380,00	$ 26.555,00	$ 10.090.900,00
1.6	010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	135,00	$ 10.544,00	$ 1.423.440,00
1.7	010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	135,00	$ 13.533,00	$ 1.826.955,00
1.8	010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	4,00	$ 293.213,00	$ 1.172.852,00
1.9	100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	453,15	$ 28.955,00	$ 13.120.958,25
1.10	110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	13,50	$ 91.503,00	$ 1.235.290,50
1.11	020711	TUBERIA PVC NOVAFORT 20"	ML	135,00	$ 488.366,00	$ 65.929.410,00
1.12	110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	ML	114,00	$ 66.845,00	$ 7.620.330,00
1.13	110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]"	UND	6,00	$ 62.444,00	$ 374.664,00
1.14	110649	SILLA YEE NOVAF 500X160MM	UND	40,00	$ 687.135,00	$ 27.485.400,00
1.15	110622	ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT"	UND	40,00	$ 58.024,00	$ 2.320.960,00
1.16	020433	SUMIDERO DOBLE TIPO B	UND	4,00	$ 978.341,00	$ 3.913.364,00
1.17	010207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	293,00	$ 78.692,00	$ 23.056.756,00
1.18	083203	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradación SGB-50, clase B)	M3	62,70	$ 114.732,00	$ 7.193.696,40
1.19	083301	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradación BG 38, clase A)	M3	62,70	$ 125.818,00	$ 7.888.788,60
1.20	010212	CONFORM.COMPACT. SUBRASANTE CBR=95	M2	209,00	$ 7.036,00	$ 1.470.524,00

1.21	020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.	UND	1,00	$ 2.618.193,00	$ 2.618.193,00
1.23	020440	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY. TAPA	UND	1,00	$ 819.603,00	$ 819.603,00
1.24	020419	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO	UND	12,00	$ 246.041,00	$ 2.952.492,00
1.25	010303	PAV.CONCR.MR=38 MEZCLA IN SITU E=0.15, INC. JUNTA -BAKE	M3	9,15	$ 610.330,00	$ 5.584.519,50
1.27	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	350,00	$ 5.668,00	$ 1.983.800,00
1.29	100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	176,00	$ 12.028,00	$ 2.116.928,00
1.30	330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	30,00	$ 16.688,00	$ 500.640,00
1.31	330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	4,00	$ 152.708,00	$ 610.832,00
1.32	100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	80,00	$ 86.881,00	$ 6.950.480,00
1- Calle 2 Entre Calle 1ª y Carrea 4, barrio La Ceiba – Municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca						
1.1	010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	21,00	$ 2.258,00	$ 47.418,00
1.2	082011	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	M2	84,00	$ 26.652,00	$ 2.238.768,00
1.4	100634	EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)	M3	168,00	$ 5.309,00	$ 891.912,00
1.5	080107	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	84,00	$ 26.555,00	$ 2.230.620,00
1.6	010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	15,00	$ 10.544,00	$ 158.160,00
1.7	010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	15,00	$ 13.533,00	$ 202.995,00
1.8	010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	2,00	$ 293.213,00	$ 586.426,00
1.9	100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	265,60	$ 28.955,00	$ 7.690.448,00
1.10	110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	1,35	$ 91.503,00	$ 123.529,05
1.11	020708	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	ML	18,00	$ 174.799,00	$ 3.146.382,00
1.12	110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	ML	30,00	$ 66.845,00	$ 2.005.350,00
1.13	110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]"	UND	10,00	$ 62.444,00	$ 624.440,00
1.14	110650	SILLA YEE NOVAF 315X160MM	UND	10,00	$ 265.750,00	$ 2.657.500,00

1.15	110622	ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT"	UND	10,00	$ 58.024,00	$ 580.240,00
1.17	010207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	201,60	$ 78.692,00	$ 15.864.307,20
1.18	083203	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradación SGB-50, clase B)	M3	25,20	$ 114.732,00	$ 2.891.246,40
1.19	083301	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradación BG 38, clase A)	M3	25,20	$ 125.818,00	$ 3.170.613,60
1.20	010212	CONFORM.COMPACT. SUBRASANTE CBR=95	M2	84,00	$ 7.036,00	$ 591.024,00
1.21	020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.	UND	2,00	$ 2.618.193,00	$ 5.236.386,00
1.23	020440	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY. TAPA	UND	2,00	$ 819.603,00	$ 1.639.206,00
1.24	020430	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	4,00	$ 182.330,00	$ 729.320,00
1.25	010303	PAV.CONCR.MR=38 MEZCLA IN SITU E=0.15, INC. JUNTA -BAKE	M3	12,60	$ 610.330,00	$ 7.690.158,00
1.27	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	200,00	$ 5.668,00	$ 1.133.600,00
1.29	100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	50,00	$ 12.028,00	$ 601.400,00
1.30	330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	20,00	$ 16.688,00	$ 333.760,00
1.31	330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	4,00	$ 152.708,00	$ 610.832,00
1.32	100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	63,00	$ 86.881,00	$ 5.473.503,00
TOTAL, COSTO DIRECTOS						$ 272.223.406
					ADMISTRACIÓN 32,00%	$ 87.111.490
					UTILIDAD 5,00%	$ 13.611.170
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS						$ 100.722.660
TOTAL, PRESUPUESTO						**$ 372.946.066**

4- ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

OPTMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO - LA INMACULADA				ACTA FINAL	
Ítem	APU	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Costo total
1.1	010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	$ 2.258,00	140,00	$ 316.120,00
1.2	082011	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	$ 26.652,00	61,57	$ 1.641.030,27
1.3	100402	DEMOL.ANDEN-SARDINEL	$ 10.247,00	11,00	$ 112.717,00
1.4	100634	EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)	$ 5.309,00	120,51	$ 639.791,89
1.5	080107	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	$ 26.555,00	373,93	$ 9.929.578,37
1.6	010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	$ 10.544,00	140,00	$ 1.476.160,00
1.7	010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	$ 13.533,00	140,00	$ 1.894.620,00
1.8	010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	$ 293.213,00	0,00	$ -
1.9	100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	$ 28.955,00	415,91	$ 12.042.697,53
1.10	110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	$ 91.503,00	14,00	$ 1.281.042,00
1.11	020711	TUBERIA PVC NOVAFORT 20"	$ 488.366,00	140,00	$ 68.371.240,00
1.12	110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	$ 66.845,00	114,00	$ 7.620.330,00
1.13	110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]"	$ 62.444,00	6,00	$ 374.664,00
1.14	110649	SILLA YEE NOVAF 500X160MM	$ 687.135,00	40,00	$ 27.485.400,00
1.15	110622	ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT"	$ 58.024,00	40,00	$ 2.320.960,00
1.16	020433	SUMIDERO DOBLE TIPO B	$ 978.341,00	0,00	$ -
1.17	010207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	$ 78.692,00	306,04	$ 24.083.235,09
1.18	083203	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, clase B)	$ 114.732,00	58,43	$ 6.703.809,57
1.19	083301	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)	$ 125.818,00	58,43	$ 7.351.566,37
1.20	010212	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	$ 7.036,00	332,00	$ 2.335.952,00
1.21	020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.	$ 2.618.193,00	0,00	$ -
1.23	020440	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	$ 819.603,00	0,00	$ -
1.24	020419	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO	$ 246.041,00	12,00	$ 2.952.492,00
1.25	010303	PAV.CONCR.MR=38 MEZCLA IN SITU E=0.15,INC. JUNTA - BAKE	$ 610.330,00	12,31	$ 7.515.908,79
1.27	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	$ 5.668,00	100,00	$ 566.800,00
1.29	100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	$ 12.028,00	176,00	$ 2.116.928,00
1.30	330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	$ 16.688,00	15,00	$ 250.320,00
1.31	330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	$ 152.708,00	4,00	$ 610.832,00
1.32	100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	$ 86.881,00	80,00	$ 6.950.480,00
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO LA CEIBA				**ACTA FINAL**	
1.1	010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	$ 2.258,00	25,70	$ 58.030,60
1.2	082011	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	$ 26.652,00	95,09	$ 2.534.338,68
1.4	100634	EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)	$ 5.309,00	190,18	$ 1.009.665,62
1.5	080107	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	$ 26.555,00	95,09	$ 2.525.114,95
1.6	010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	$ 10.544,00	18,00	$ 189.792,00
1.7	010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	$ 13.533,00	18,00	$ 243.594,00
1.8	010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	$ 293.213,00	2,00	$ 586.426,00
1.9	100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	$ 28.955,00	300,53	$ 8.701.947,49
1.10	110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	$ 91.503,00	1,62	$ 148.234,86
1.11	020708	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	$ 174.799,00	18,00	$ 3.146.382,00
1.12	110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	$ 66.845,00	18,00	$ 1.203.210,00
1.13	110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]"	$ 62.444,00	6,00	$ 374.664,00
1.14	110650	SILLA YEE NOVAF 315X160MM	$ 265.750,00	6,00	$ 1.594.500,00
1.15	110622	ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT"	$ 58.024,00	6,00	$ 348.144,00
1.17	010207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	$ 78.692,00	228,22	$ 17.958.773,47

1.18	083203	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, clase B)	$	114.732,00	28,53	$ 3.272.959,76
1.19	083301	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)	$	125.818,00	28,53	$ 3.589.210,09
1.20	010212	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	$	7.036,00	95,09	$ 669.053,24
1.21	020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.	$	2.618.193,00	2,00	$ 5.236.386,00
1.23	020440	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	$	819.603,00	2,00	$ 1.639.206,00
1.24	020430	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	$	182.330,00	4,00	$ 729.320,00
1.25	010303	PAV.CONCR.MR=38 MEZCLA IN SITU E=0.15,INC. JUNTA - BAKE	$	610.330,00	14,26	$ 8.705.441,96
1.27	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	$	5.668,00	200,00	$ 1.133.600,00
1.29	100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	$	12.028,00	50,00	$ 601.400,00
1.30	330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	$	16.688,00	20,00	$ 333.760,00
1.31	330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	$	152.708,00	4,00	$ 610.832,00
1.32	100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	$	86.881,00	63,00	$ 5.473.503,00
		ITEMS COMPLEMENTARIOS				
I.C.1		CARCAMO CON REJILLA 4,25 MTS X 0,60 MTS	$	1.100.000,00	1,00	$ 1.100.000,00
I.C. 2		ADECUACION CAMARAS DE ALCANTARILLADO	$	390.310,31	4,00	$ 1.561.241,25
TOTAL COSTO DIRECTOS						**$ 272.223.405,84**
ADMISTRACIÓN				32,00%		$ 87.111.489,87
UTILIDAD				5,00%		$ 13.611.170,29
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 100.722.660,16**
TOTAL PRESUPUESTO						**$ 372.946.066,00**

5- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SAMCA-014-2025
CONTRATO No	2025223
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
OBJETO	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"
CONTRATISTA	LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 900.540.707-1
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS ($372.946.066,05) M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 DE ENERO DE 2026
POLIZAS DE AMPARO	Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento **52-40-101010679**
	Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal **52-44-101018788**

6- RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 372.946.066,05
VALOR PAGO ANTICIPO	$ 186.473.033,025
VALOR ACTA FINAL	$ 372.946.066
VALOR A AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$ 186.473.033,025
SALDO A DESEMBOLZAR DEL PAGO FINAL, POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	$ 186.473.032,975
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	$ 0,05

7. ACTA FINAL

OPTMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO - LA INMACULADA							MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		ACTA FINAL	
Ítem	APU	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo total	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo total
1.1	010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	133,41	$ 2.258,00	$ 301.239,78		$ -	6,59	$ 14.880,22	140,00	$ 316.120,00
1.2	082011	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	M2	65,00	$ 26.652,00	$ 1.732.380,00	3,43	$ 91.349,73		$ -	61,57	$ 1.641.030,27
1.3	100402	DEMOL.ANDEN-SARDINEL	M2	11,00	$ 10.247,00	$ 112.717,00	0,00	$ -		$ -	11,00	$ 112.717,00
1.4	100634	EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)	M3	125,40	$ 5.309,00	$ 665.748,60	4,89	$ 25.956,71		$ -	120,51	$ 639.791,89
1.5	080107	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	380,00	$ 26.555,00	$ 10.090.900,00	6,08	$ 161.321,63		$ -	373,93	$ 9.929.578,37
1.6	010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	135,00	$ 10.544,00	$ 1.423.440,00		$ -	5,00	$ 52.720,00	140,00	$ 1.476.160,00
1.7	010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	135,00	$ 13.533,00	$ 1.826.955,00		$ -	5,00	$ 67.665,00	140,00	$ 1.894.620,00
1.8	010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	4,00	$ 293.213,00	$ 1.172.852,00	4,00	$ 1.172.852,00		$ -	0,00	$ -
1.9	100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	453,15	$ 28.955,00	$ 13.120.958,25	37,24	$ 1.078.260,72		$ -	415,91	$ 12.042.697,53
1.10	110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	13,50	$ 91.503,00	$ 1.235.290,50		$ -	0,50	$ 45.751,50	14,00	$ 1.281.042,00
1.11	020711	TUBERIA PVC NOVAFORT 20"	ML	135,00	$ 488.366,00	$ 65.929.410,00		$ -	5,00	$ 2.441.830,00	140,00	$ 68.371.240,00
1.12	110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	ML	114,00	$ 66.845,00	$ 7.620.330,00	0,00	$ -	0,00	$ -	114,00	$ 7.620.330,00
1.13	110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]"	UND	6,00	$ 62.444,00	$ 374.664,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 374.664,00
1.14	110649	SILLA YEE NOVAF 500X160MM	UND	40,00	$ 687.135,00	$ 27.485.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 27.485.400,00
1.15	110622	ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT"	UND	40,00	$ 58.024,00	$ 2.320.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 2.320.960,00
1.16	020433	SUMIDERO DOBLE TIPO B	UND	4,00	$ 978.341,00	$ 3.913.364,00	4,00	$ 3.913.364,00		$ -	0,00	$ -
1.17	010207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	293,00	$ 78.692,00	$ 23.056.756,00		$ -	13,04	$ 1.026.479,09	306,04	$ 24.083.235,09
1.18	083203	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, clase B)	M3	62,70	$ 114.732,00	$ 7.193.696,40	4,27	$ 489.886,83		$ -	58,43	$ 6.703.809,57
1.19	083301	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)	M3	62,70	$ 125.818,00	$ 7.888.788,60	4,27	$ 537.222,23		$ -	58,43	$ 7.351.566,37
1.20	010212	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	209,00	$ 7.036,00	$ 1.470.524,00		$ -	123,00	$ 865.428,00	332,00	$ 2.335.952,00
1.21	020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.	UND	1,00	$ 2.618.193,00	$ 2.618.193,00	1,00	$ 2.618.193,00		$ -	0,00	$ -
1.23	020440	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	UND	1,00	$ 819.603,00	$ 819.603,00	1,00	$ 819.603,00		$ -	0,00	$ -
1.24	020419	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO	UND	12,00	$ 246.041,00	$ 2.952.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 2.952.492,00
1.25	010303	PAV.CONCR.MR=38 MEZCLA IN SITU E=0.15,INC. JUNTA - BAKE	M3	9,15	$ 610.330,00	$ 5.584.519,50		$ -	3,16	$ 1.931.389,29	12,31	$ 7.515.908,79
1.27	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	350,00	$ 5.668,00	$ 1.983.800,00	250,00	$ 1.417.000,00		$ -	100,00	$ 566.800,00
1.29	100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	176,00	$ 12.028,00	$ 2.116.928,00	0,00	$ -	0,00	$ -	176,00	$ 2.116.928,00
1.30	330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	30,00	$ 16.688,00	$ 500.640,00	15,00	$ 250.320,00		$ -	15,00	$ 250.320,00
1.31	330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	4,00	$ 152.708,00	$ 610.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 610.832,00
1.32	100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	80,00	$ 86.881,00	$ 6.950.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 6.950.480,00
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO LA CEIBA												
1.1	010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	21,00	$ 2.258,00	$ 47.418,00		$ -	4,70	$ 10.612,60	25,70	$ 58.030,60
1.2	082011	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	M2	84,00	$ 26.652,00	$ 2.238.768,00		$ -	11,09	$ 295.570,68	95,09	$ 2.534.338,68
1.4	100634	EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)	M3	168,00	$ 5.309,00	$ 891.912,00		$ -	22,18	$ 117.753,62	190,18	$ 1.009.665,62
1.5	080107	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	84,00	$ 26.555,00	$ 2.230.620,00		$ -	11,09	$ 294.494,95	95,09	$ 2.525.114,95
1.6	010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	15,00	$ 10.544,00	$ 158.160,00		$ -	3,00	$ 31.632,00	18,00	$ 189.792,00
1.7	010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	15,00	$ 13.533,00	$ 202.995,00		$ -	3,00	$ 40.599,00	18,00	$ 243.594,00
1.8	010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	2,00	$ 293.213,00	$ 586.426,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 586.426,00

1.9	100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	265,60	$ 28.955,00	$ 7.690.448,00		$ -	34,93	$ 1.011.499,49	300,53	$ 8.701.947,49
1.10	110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	1,35	$ 91.503,00	$ 123.529,05		$ -	0,27	$ 24.705,81	1,62	$ 148.234,86
1.11	020708	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	ML	18,00	$ 174.799,00	$ 3.146.382,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 3.146.382,00
1.12	110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	ML	30,00	$ 66.845,00	$ 2.005.350,00	12,00	$ 802.140,00		$ -	18,00	$ 1.203.210,00
1.13	110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]"	UND	10,00	$ 62.444,00	$ 624.440,00	4,00	$ 249.776,00		$ -	6,00	$ 374.664,00
1.14	110650	SILLA YEE NOVAF 315X160MM	UND	10,00	$ 265.750,00	$ 2.657.500,00	4,00	$ 1.063.000,00		$ -	6,00	$ 1.594.500,00
1.15	110622	ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT"	UND	10,00	$ 58.024,00	$ 580.240,00	4,00	$ 232.096,00		$ -	6,00	$ 348.144,00
1.17	010207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	201,60	$ 78.692,00	$ 15.864.307,20		$ -	26,62	$ 2.094.466,27	228,22	$ 17.958.773,47
1.18	083203	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, clase B)	M3	25,20	$ 114.732,00	$ 2.891.246,40		$ -	3,33	$ 381.713,36	28,53	$ 3.272.959,76
1.19	083301	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)	M3	25,20	$ 125.818,00	$ 3.170.613,60		$ -	3,33	$ 418.596,49	28,53	$ 3.589.210,09
1.20	010212	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	84,00	$ 7.036,00	$ 591.024,00		$ -	11,09	$ 78.029,24	95,09	$ 669.053,24
1.21	020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.	UND	2,00	$ 2.618.193,00	$ 5.236.386,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 5.236.386,00
1.23	020440	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	UND	2,00	$ 819.603,00	$ 1.639.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.639.206,00
1.24	020430	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	4,00	$ 182.330,00	$ 729.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 729.320,00
1.25	010303	PAV.CONCR.MR=38 MEZCLA IN SITU E=0.15,INC. JUNTA - BAKE	M3	12,60	$ 610.330,00	$ 7.690.158,00		$ -	1,66	$ 1.015.283,96	14,26	$ 8.705.441,96
1.27	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	200,00	$ 5.668,00	$ 1.133.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 1.133.600,00
1.29	100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	50,00	$ 12.028,00	$ 601.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 601.400,00
1.30	330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	20,00	$ 16.688,00	$ 333.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 333.760,00
1.31	330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	4,00	$ 152.708,00	$ 610.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 610.832,00
1.32	100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	63,00	$ 86.881,00	$ 5.473.503,00	0,00	$ -	0,00	$ -	63,00	$ 5.473.503,00
		ITEMS COMPLEMENTARIOS							0,00			
I.C.1		CARCAMO CON REJILLA 4,25 MTS X 0,60 MTS	UND		$ 1.100.000,00				1,00	$ 1.100.000,00	1,00	$ 1.100.000,00
I.C. 2		ADECUACION CAMARAS DE ALCANTARILLADO	UND		$ 390.310,31				4,00	$ 1.561.241,25	4,00	$ 1.561.241,25
TOTAL COSTO DIRECTOS						**$ 272.223.405,88**		**$ 14.922.341,85**		**$ 14.922.341,81**		**$ 272.223.405,84**
				ADMISTRACIÓN	32,00%	$ 87.111.489,88		$ 4.775.149,39		$ 4.775.149,38		$ 87.111.489,87
				UTILIDAD	5,00%	$ 13.611.170,29		$ 746.117,09		$ 746.117,09		$ 13.611.170,29
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 100.722.660,17**		**$ 5.521.266,47**		**$ 5.521.266,47**		**$ 100.722.660,16**
TOTAL PRESUPUESTO						**$ 372.946.066,05**		**$ 20.443.608,32**		**$ 20.443.608,28**		**$ 372.946.066,00**

8. ACTIVIDADES LEGALES INICIAL

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No 52-40-101010679

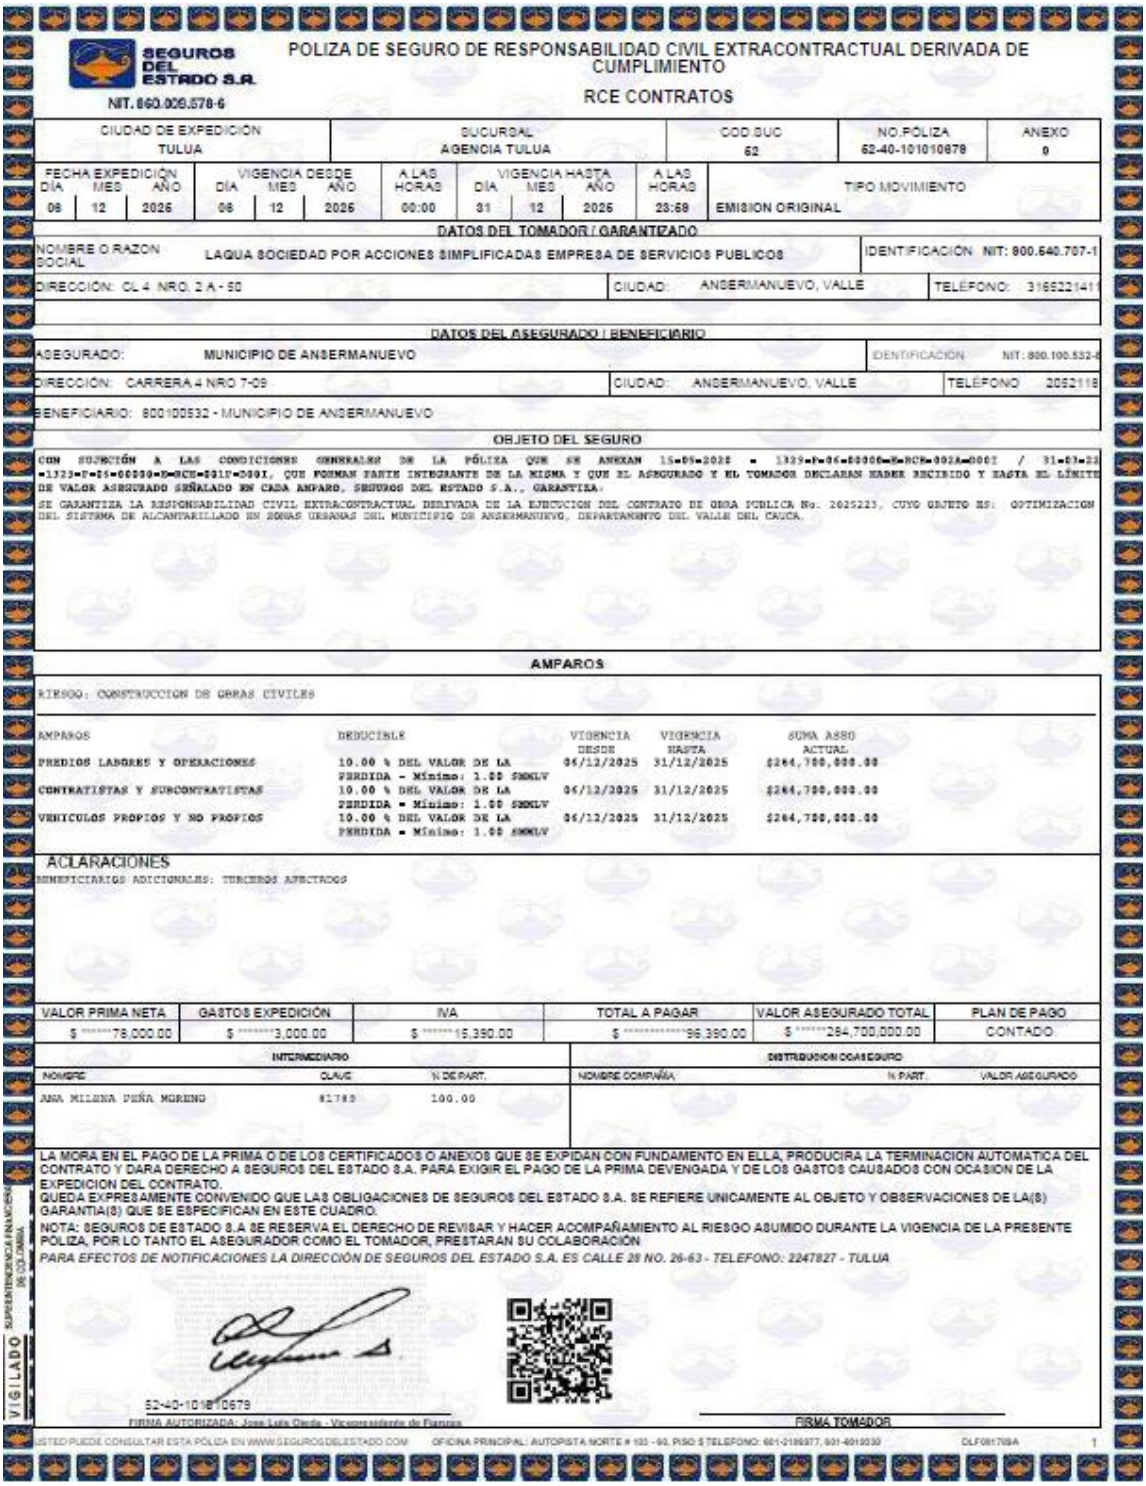

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO.POLIZA	ANEXO
TULUA	AGENCIA TULUA	62	52-40-101010679	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2026	06	12	2026	00:00	31	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS — IDENTIFICACION: NIT: 900.640.707-1
DIRECCION: CL 4 NRO. 2 A - 50 — CIUDAD: ANSERMANUEVO, VALLE — TELEFONO: 3166221411

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO — IDENTIFICACION: NIT: 800.100.532-6
DIRECCION: CARRERA 4 NRO 7-09 — CIUDAD: ANSERMANUEVO, VALLE — TELEFONO: 2052118
BENEFICIARIO: 800100532 - MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15=05=2025 - 1329=F=06=00006=B=RCE=002A=0001 / 31=03=22 =1323=F=05=00050=B=RCE=001F=0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2025223, CUYO OBJETO ES: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/12/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/12/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/12/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

ACLARACIONES

BENEFICIARIOS ADICIONALES: TERCEROS AFECTADOS

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****76,000.00	$ *****3,000.00	$ *****15,390.00	$ *********96,390.00	$ *****284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ANA MILENA PEÑA MORENO	81783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

52-40-101010679
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ceda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2189377, 601-4019030 — DLF0817084 — 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
TULUA	AGENCIA TULUA	52	52-40-101010679	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2025	06	12	2025	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 900.640.707-1

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELEFONO:
	CL 4 NRO. 2 A - 50		ANSERMANUEVO, VALLE	3165221411

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	NIT: 800.100.532-8

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CARRERA 4 NRO 7-09		ANSERMANUEVO, VALLE	2052118

BENEFICIARIO: 800100532 - MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	06/12/2025	31/12/2025	$264,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	06/12/2025	31/12/2025	$264,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	06/12/2025	31/12/2025	$264,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

52-40-101010679

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLF081709A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
TULUA	AGENCIA TULUA	52	52-40-101010679	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	12	2025	08	12	2025	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 900.640.707-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 4 NRO. 2 A - 50	ANSERMANUEVO, VALLE	3165221411

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.100.632-8
	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO
CARRERA 4 NRO 7-09	ANSERMANUEVO, VALLE	2052118

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****79,000.00	$ *****3,000.00	$ *****15,390.00	$ **********96,390.00	$ *****264,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA MILENA PEÑA MORENO	81783	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709996021167 (8020) 1101570105770 2 (3900) 0000960963 96 (96) 20260105

REFERENCIA PAGO: 1101570105770-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
TULUA	AGENCIA TULUA	52	52-40-101010679	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	06	12	2025	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 800.640.707-1
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 2 A - 50	CIUDAD: ANSERMANUEVO, VALLE	TELÉFONO: 3165221411

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.100.532-8
DIRECCIÓN: CARRERA 4 NRO 7-09	CIUDAD: ANSERMANUEVO, VALLE	TELÉFONO:	2052118

BENEFICIARIO: 800100532 - MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

52-40-101010679

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLF0617094

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No 52-44-101018788

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
TULUA	AGENCIA TULUA	52	52-44-101018788	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2025	06	12	2025	00:00	31	12	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 900.540.707-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 4 NRO. 2 A - 50	ANSERMANUEVO, VALLE	3165221411

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	NIT: 800.100.682-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 4 NRO 7-09	ANSERMANUEVO, VALLE	2052118

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUO10R, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2025223, CUYO OBJETO ES: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2025	30/04/2026	$37,256,606.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/12/2025	30/04/2026	$186,473,033.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/12/2025	31/12/2026	$18,647,303.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2025	31/12/2030	$74,563,213.20

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,572,759.00	$ ******20,000.00	$ *****302,624.00	$ *********1,895,383.00	$ ******317,004,156.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA MILENA PEÑA MORENO	81789	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

52-44-101018788

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TULUA	AGENCIA TULUA	52	52-44-101018788	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2025	06	12	2025	00:00	31	12	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 900.540.707-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 4 NRO. 2 A - 50	ANSERMANUEVO, VALLE	3165221411

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.100.532-8
	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 4 NRO 7-09	ANSERMANUEVO, VALLE	2052118

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Cafam | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,572,759.00	$ ******20,000.00	$ *****302,624.00	$ *********1,895,383.00	$ ******317,004,156.10	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ANA MILENA PEÑA MORENO	81789	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7703998023167(8020)1101570105769 4(3900)000001895383(96)20263206

REFERENCIA PAGO: 1101570105769-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

Calle 2 Entre Calle 1ª y Carrea 4, barrio La Ceiba – Municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca








CASE


CASE
PELIGRO NO PASE


CASE
PELIGRO NO PASE


PELIGRO NO PASE
PELIGRO NO PASE


CAT
4X4 TURBO
416C


CAT








CAT






























PAVCO
PAVCO






































































AREPAS
REY






AREPAS
CRISTO REY




AREPAS








CEL: 3228

1- <u>Carrera 2ª Entre Calle 8 y Calle 10, barrio La Inmaculada - Municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca</u>






CAT
MCZ48339






CAT
GEOLSA





















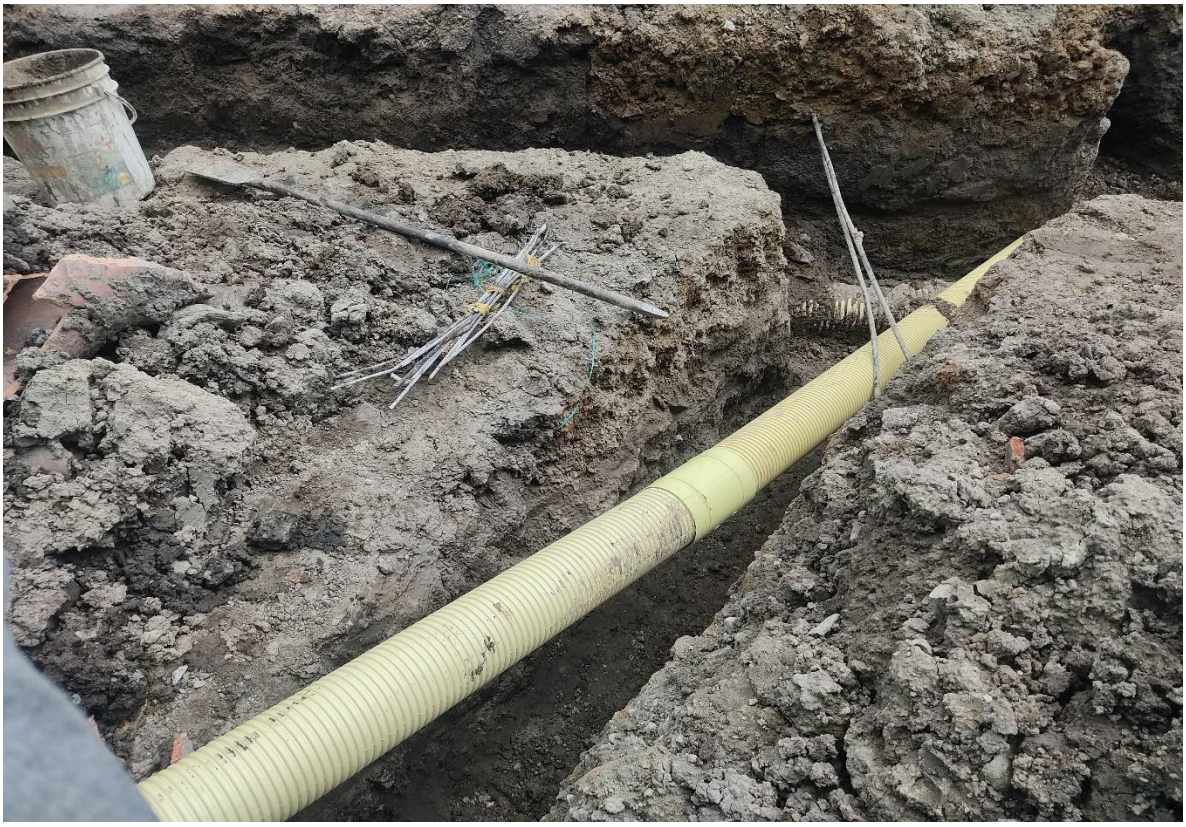




























416C
4X4 TURBO
DIESEL


CAT
MCY00339
GEMSA
416C








CATERPILLAR














HERRACRO












PAVCO































10- CONCLUSIÓN

El Contrato de Obra Pública No. **2025223**, cuyo objeto fue la **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, se ejecutó y culminó satisfactoriamente, dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, especificaciones técnicas, diseños hidráulicos aprobados, normas de construcción vigentes y lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones, garantizando la adecuada intervención, reposición, ampliación y optimización de redes de alcantarillado sanitario, estructuras de conexión, cámaras de inspección, acometidas domiciliarias y obras complementarias, asegurando la correcta capacidad hidráulica, hermeticidad, estabilidad estructural y funcionalidad del sistema intervenido; durante el desarrollo contractual se afrontaron situaciones adversas externas tales como la temporada decembrina, que incidió en la disponibilidad de mano de obra y en la logística de suministro, así como condiciones climáticas variables que afectaron temporalmente las actividades de excavación, instalación de tuberías y reposición de pavimentos, además de la carencia y limitaciones en el abastecimiento oportuno de materiales requeridos para la ejecución de rellenos, subbases y concretos, circunstancias que fueron gestionadas mediante la implementación de estrategias técnicas y administrativas consistentes en la reprogramación de actividades, optimización de frentes de trabajo, control riguroso de calidad de materiales alternativos autorizados y coordinación permanente con proveedores y supervisión, sin que ello comprometiera la calidad, estabilidad ni vida útil de las obras ejecutadas; en consecuencia, una vez realizadas las pruebas de estanqueidad, verificación de pendientes, revisión de conexiones, control de compactación y cumplimiento de especificaciones técnicas, y contando con el aval de la supervisión, se deja constancia de que el objeto contractual fue alcanzado en su totalidad, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones sanitarias, la reducción de riesgos de rebosamiento y el fortalecimiento de la infraestructura de saneamiento básico del municipio, quedando el sistema en condiciones técnicas óptimas para su operación, mantenimiento y sostenibilidad conforme a la normatividad aplicable.



LUZ PIEDAD CORREA OSORIO
C.C. No. 42.086.642 de Pereira Risaralda
Representante Legal
LAQUA S.A.S.E.S.P.
