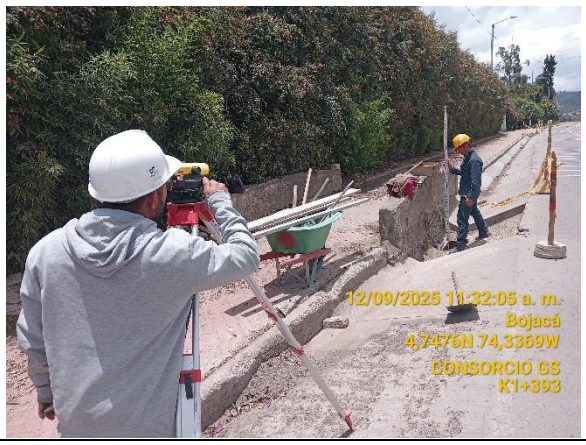
REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL No.6 DE INTERVENTORÍA

	
K1+885 – K1+898 CD – Chequeo topográfico de la capa de subbase y de la formaleta para fundir losas de cuneta.	K1+885 – K1+898 CD – Fundida de losas de cuneta, concreto 3500 PSI con fibra (V=2,03m3).
	
K3+424 – K3+456 CD – Instalación de formaleta para fundir cuneta en L.	K3+424 – K3+456 CD – Cunetas en L fundidas en concreto 3500 PSI con fibra (V=2,78 m³).
	
K3+426 – K3+492 CD – Fundida de losas intermedias en concreto 3500 PSI con fibra.	K3+426 – K3+492 CD – Cunetas en L fundidas en concreto 3500 PSI con fibra (V=5,47 m³).

	
K3+459 – K3+517 CD – Instalación de formaleta para losas intermedias de cuneta en L.	K3+459 – K3+517 CD – Fundida de losas de cuneta intermedias en L, concreto 3500 PSI con fibra (V=5,04 m³).
	
K1+888 – K1+895 CD – Fundida de losas intermedias de cuneta, concreto 3500 PSI con fibra.	K1+888 – K1+895 CD – Dos losas de cuneta fundidas, concreto 3500 PSI con fibra (V=1,35 m³).
	
K1+393 – K1+396 CD – Revisión de niveles en losa descole alcantarilla para ser fundida.	K1+393 – K1+396 CD – Losa de cuneta fundida, concreto 3500 PSI con fibra (V=0,51 m³).


	
K3+494 – K3+520 CD – Instalación de formaleta para losas de cuneta intermedias en L.	K3+494 – K3+520 CD – Losas de cunetas intermedias en L fundidas en concreto 3500 PSI con fibra (V=2,20 m³).
	
K1+067 – K0+071 CD – Organizan subbase granular para fundir losas de cuneta.	K1+067 – K0+071 CD – Losas de cuneta fundidas, concreto de 3500 PSI con fibra (2 losas, V=2,71 m³).
	
K0+975 – K1+013 CI – Instalación de formaleta para fundir losas en L.	K0+975 – K1+013 CI – Cunetas en L fundidas en concreto 3500 PSI con fibra (V=4,10 m³).

	
K3+504 – K3+505 CD – Placa de descole cunetas en L por fundir.	K3+520 – K3+521 CD – Fundida de losa final de cuneta (V=0,52 m³).
	
K3+517,50 – K3+520 CD – Fundida losa intermedia contra losa final de cuneta.	K3+520 – K3+521 CD – Fundida de losa final de cuneta (V=0,16 m³).
	
K0+950 – K0+960 CI – Excavación para entrada a predio.	K0+950 – K0+960 CI – Entrada a predio con material de subbase instalada, que por las lluvias se ha contaminado, no han realizado la fundida de esta entrada, la cual se encuentra liberada.

	
K0+960 – K1+010 CI – Instalación de formaleta para losas de cuneta en L.	K0+960 – K1+010 CI – Fundida de cunetas en L concreto 3500 PSI con fibra (V=5,20 m³).
	
K1+036 – K1+049 CI – Se libera instalación de subbase granular para continuar proceso constructivo, entrada a predio.	K0+950 – K0+960 CI – Entrada a predio, que por las lluvias se ha contaminado la subbase granular, no han realizado la fundida de esta entrada, la cual se encuentra liberada.
	
K0+963 – K1+040 CI – Instalan formaleta para losas de cuneta en L	K0+963 – K1+040 CI – Losas de cuneta en L Fundidas, concreto 3500 PSI con fibra (V=5,64 m³).

	
K0+240 – K0+280 CI – Corte de pavimento para inicio de excavación.	K0+240 – K0+280 CI – Compactación de la capa de subbase granular para construcción de cunetas en V.
	
K0+844 – K0+854 CD – Demolición de placa de concreto existente, entrada a predio Geoflora – Salitre.	K0+844 – K0+854 CD – Nivelación de la entrada a Geoflora - salitre con material de subbase granular.
	
Acopio – Cargue de material producto de excavaciones hacia escombrera, 2 viajes (32 m³ sueltos).	Acopio – Cargue de material producto de excavaciones hacia escombrera, 2 viajes (32 m³) sueltos).

	
K0+160 – K0+280 CI – Compactación de la subrasante para construcción de cuneta en V.	K0+160 – K0+280 CI – Liberación de subrasante para instalación de subbase granular, cuenta en V.
	
K0+160 – K0+280 CI – Instalación de subbase granular para construcción de cuneta en V.	K0+160 – K0+280 CI – Liberación de subbase granular para cuneta en V, para continuar proceso constructivo.
	
K1+015 – K1+081 CI – Instalación de formaleta para fundir losas de cuneta en L.	K1+015 – K1+081 CI – Fundida de losas intermedias de cuneta en L, concreto 3500 PSI con fibra (V=5,72 m^3).

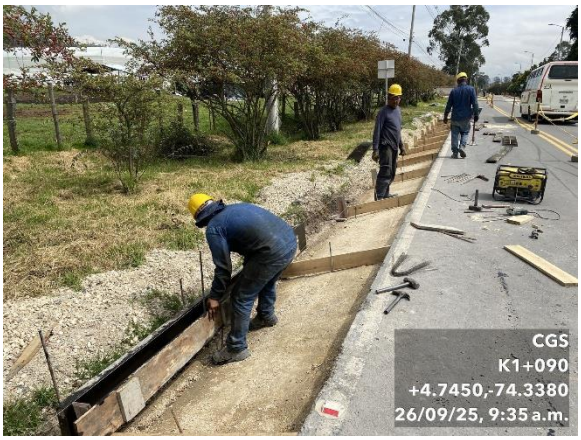	
K1+058 – K1+073 CI – Instalación de formaleta para fundir losas de cuneta en L.	K1+058 – K1+073 CI – Fundida de losas de cuneta en L, concreto 3500 PSI con fibra (V=5,82 m³).
	
K1+068 – K1+116 CI – Instalan Formaleta y organizan la capa de subbase granular para fundir losas de cuneta en L.	K1+068 – K1+116 CI – Fundida de losas intermedias de cuneta en L, concreto 3500 PSI con fibra (V=4,94 m³).
	
K0+290 – K0+360 CI – Excavación para construcción de cuneta en V.	K0+290 – K0+360 CI – Chequeo de niveles de la subrasante, se libera el sector para instalación de subbase granular.

	
K0+320 – K0+360 CI – Compactación de subbase granular, pendiente de liberación.	K0+320 – K0+360 CI – Subbsase granular para construcción de cuneta en V, no ha sido entregado este tramo.
	
K4+860 – Carril izquierdo – Punteo de pavimento para bacheo	K4+860 – Carril izquierdo – Punteo de pavimento ejecutado.
	
Acopio – Cargue de material producto de excavaciones hacia escombrera, 5 viajes (80 m³) sueltos).	Acopio – Cargue de material proveniente de la excavación hacia escombrera, 11 viajes (176 m³ sueltos).
