

ACTA DE VECINDAD INICIO

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO
14			PROYECTO: CONTRATO CO1.PCCNTR.8155097, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA
D	MM	AA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS
ACTA No:	1		PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

Firma Responsable predio/colegio
Nombre: RECTOR LEONEL UMAÑA
C.C. O NIT: 79638192

Firma Representante Social Contratista
Nombre: ANGELICA GORDILLO
C.C. O NIT. 52394442

Firma Representante Tecnico Contratista
Nombre: MARIA ISABEL GARZON FORERO
C.C. O NIT: 52890684

Firma Representante social de la Interventoría
Nombre
C.C O NIT

Firma Representante social de la Interventoría:
Nombre: CARLOS MAURICIO MONTENEGRO
CC o Nit: 1003811676

Cargo:
Nombre:
CC o Nit:

Cargo: GESTOR SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACION
Nombre: ROSAURA CORTINA
CC o Nit: 45489245

Cargo: GESTOR SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACIC
Nombre: CARLOS ADRIAN OCAMPO
C.C O NIT: 1060649482

ACTA DE VECINDAD ANEXO

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

FECHA		
1		
D	MM	AA
ACTA No:	1	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

PROYECTO: CONTRATO CO1.PCCNTR.8155097, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS

Entidad contratante: SECRETARIA DE EDUCACION **Interventora** PROBINTEC

Contratista ejecutor de la Obra: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 Localidad: PUENTE ARANDA Barrio: MUZU

7. ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO (Utilice este espacio para ampliar registro fotografico)





Ventanal de la fachada de colegio se encuentran en buen esta estado. Todos los vidrios de los ventanales se encuentran en buen estado,




Algunos bordillos de la ventana de la fachada se encuentran fisurados




En lo construccion colindante en el area de la ventana persiana hace falta en vidrio.





Se encuentra un tubo entre muros de la fachada y la construccion de la parte electrica hacia la areas a intervenir, este tubo viene desde la fachada del colegio hasta los muros prefabricados correspondientes a los salones. se encuentran cables de voz y datos a la vista y descolgados esta. estos cables son perteniciente a la resgistraduria, no se pueden quitar del area o pasar a otro lugar.





Se encuetra en la parte inferior de los muros humedad y en los andenes de acceso a los salones se presenta los marcos de las puertas con el cenmento levantado y en mal estado




En el area central y de acceso al colegio se encuentra el filo del escalon estropeado ya que por ese lugar bajan las motos o bicicletas que estacionan en el espacio freste al area a intervenir









ACTA DE VECINDAD ANEXO

FECHA		
1		
D	MM	AA
ACTA No:	1	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

PROYECTO: CONTRATO CO1.PCCNTR.8155097, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS







la construccion colindante al lugar donde se propone el shut de basuras se encuentra la porteria del colegio esta se encuentr en buenestado y un baño pequeño el cual tiene humedad en el techo sus muros y aparatos sanitarios estan en buen estado






Todas las puertas existente en el area a intervenir se encuantrar con la pintura mal gastada, con oxido y las cerraduras en malestado





El area donde posiblemete se ejecute la construccion del shut de basuras no cuenta con ningun tipo de redes hidraulicas o electricas. Este espacio aun se encuatra en en estudio y estamos a al espera del concepto tecnico de los especialistas y aprobacion por parte de interventoria, en la parte de exterior costado derecho se encuentran adoquines levantados y fisurados

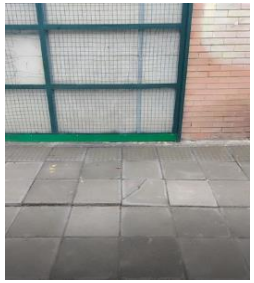

En el exterior del colegio costado izquierdo, se encuentra el piso con algunos adoquines levantados y fisurados al igual que el costado derecho, el anden se encuentra en muy mal estado ya que las raices del arbol levanto el piso, la reja de cerramiento del colegio se encuentra en algunas partes suelta la soldadura.

Responsables del Proyecto

Firma Responsable predio/colegio	Firma Representante Social Contratista	Firma Representante Tecnico Contratista	Firma Representante social de la Interventoría
Nombre: RECTOR LEONEL UMAÑA	Nombre: ANGELICA GORDILLO	Nombre: MARIA ISABEL GARZON FORERO	Nombre
C.C. O NIT: 79638192	C.C. O NIT. 52394442	C.C. O NIT: 52890684	C.C O NIT

ACTA DE VECINDAD ANEXO


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO
1			PROYECTO: CONTRATO CO1.PCCNTR.8155097, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS
D	MM	AA	
ACTA No:	1		

Nombre: CARLOS MAURICIO MONTENEGR	Nombre:	Nombre: ROSAURA CORTINA	Nombre: CARLOS ADRIAN OCAMPO
CC o Nit: 1003811676	CC o Nit:	CC o Nit: 45489245	C.C O NIT: 1060649482

ANEXO 2


1073246437 | Programacion Colegio Integrado de Fontibon - Sede A

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		06/11/2025	**27/02/2026**	98d
1	INICIO	06/11/2025	06/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**27/02/2026**	**98d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	06/11/2025	27/02/2026	98d
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de...	13/11/2025	14/11/2025	2d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**22/11/2025**	**31/01/2026**	**60d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORI...	22/11/2025	26/11/2025	3d
3.2	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	26/11/2025	01/12/2025	5d
3.3	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	30/01/2026	31/01/2026	2d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	15/01/2026	16/01/2026	2d
3.5	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	13/01/2026	14/01/2026	2d
3.6	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	15/01/2026	17/01/2026	3d
3.7	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16/01/2026	17/01/2026	2d
3.8	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	15/01/2026	17/01/2026	3d
3.9	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	28/01/2026	29/01/2026	2d
4	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**18/12/2025**	**16d**
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	01/12/2025	03/12/2025	3d
4.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	16/12/2025	18/12/2025	3d
5	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/12/2025**	**20/01/2026**	**34d**
5.1	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	12/12/2025	16/12/2025	4d
5.2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	22/12/2025	26/12/2025	5d
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	19/01/2026	20/01/2026	2d
6	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/12/2025**	**19/01/2026**	**40d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	04/12/2025	19/01/2026	40d
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	19/12/2025	22/12/2025	3d
7	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/01/2026**	**22/01/2026**	**2d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	21/01/2026	22/01/2026	2d
8	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**03/02/2026**	**16d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	27/01/2026	31/01/2026	5d
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	16/01/2026	03/02/2026	16d
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**16/02/2026**	**5d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	11/02/2026	13/02/2026	3d
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	14/02/2026	16/02/2026	2d
10	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**31/01/2026**	**04/02/2026**	**3d**
10.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	31/01/2026	04/02/2026	3d
11	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/02/2026**	**11/02/2026**	**7d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	04/02/2026	11/02/2026	7d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	07/02/2026	11/02/2026	3d
12	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/02/2026**	**19/02/2026**	**3d 6h**
12.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16/02/2026	18/02/2026	3d
12.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	16/02/2026	19/02/2026	3d 6h
12.3	ENTREGA DE ACABADOS AULA	19/02/2026	19/02/2026	
13	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/01/2026**	**28/01/2026**	**20d**
13.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	26/01/2026	27/01/2026	2d
13.2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	21/01/2026	22/01/2026	2d
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	23/01/2026	26/01/2026	3d
13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	06/01/2026	28/01/2026	20d
13.5	ENTREGA DE CUBIERTA	28/01/2026	28/01/2026	
14	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**27/02/2026**	**98d**
14.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	06/11/2025	27/02/2026	98d
14.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	20/01/2026	22/01/2026	3d
15	**NO PREVISTOS**	**15/11/2025**	**19/02/2026**	**82d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	09/02/2026	14/02/2026	5d 1h
15.2	DESMONTE Y RETIRO DE LEONES	21/11/2025	22/11/2025	2d
15.3	DESMONTE DE TAPAS DE SUPERBOARD DE LA CUBIERTA	03/01/2026	06/01/2026	2d
15.4	CORTE DE TEJA	09/01/2026	12/01/2026	3d
15.5	RECORRIDO DE CUBIERTA (INCLUYE SUJECION DE TEJAS Y RESANES A QUE HAYA LUGAR)	29/12/2025	01/01/2026	4d
15.6	APUNTALAMIENTO PARA MURO SEGÚN DISEÑO	15/11/2025	20/11/2025	5d
15.7	PINTURA DE REJA DE TECHO	23/01/2026	27/01/2026	4d
15.8	DESMONTE Y REINSTALACION DE REJA DE TECHO	09/01/2026	16/02/2026	33d
15.9	ENCORAZADO	26/01/2026	27/01/2026	2d
15.10	FIN	19/02/2026	19/02/2026	

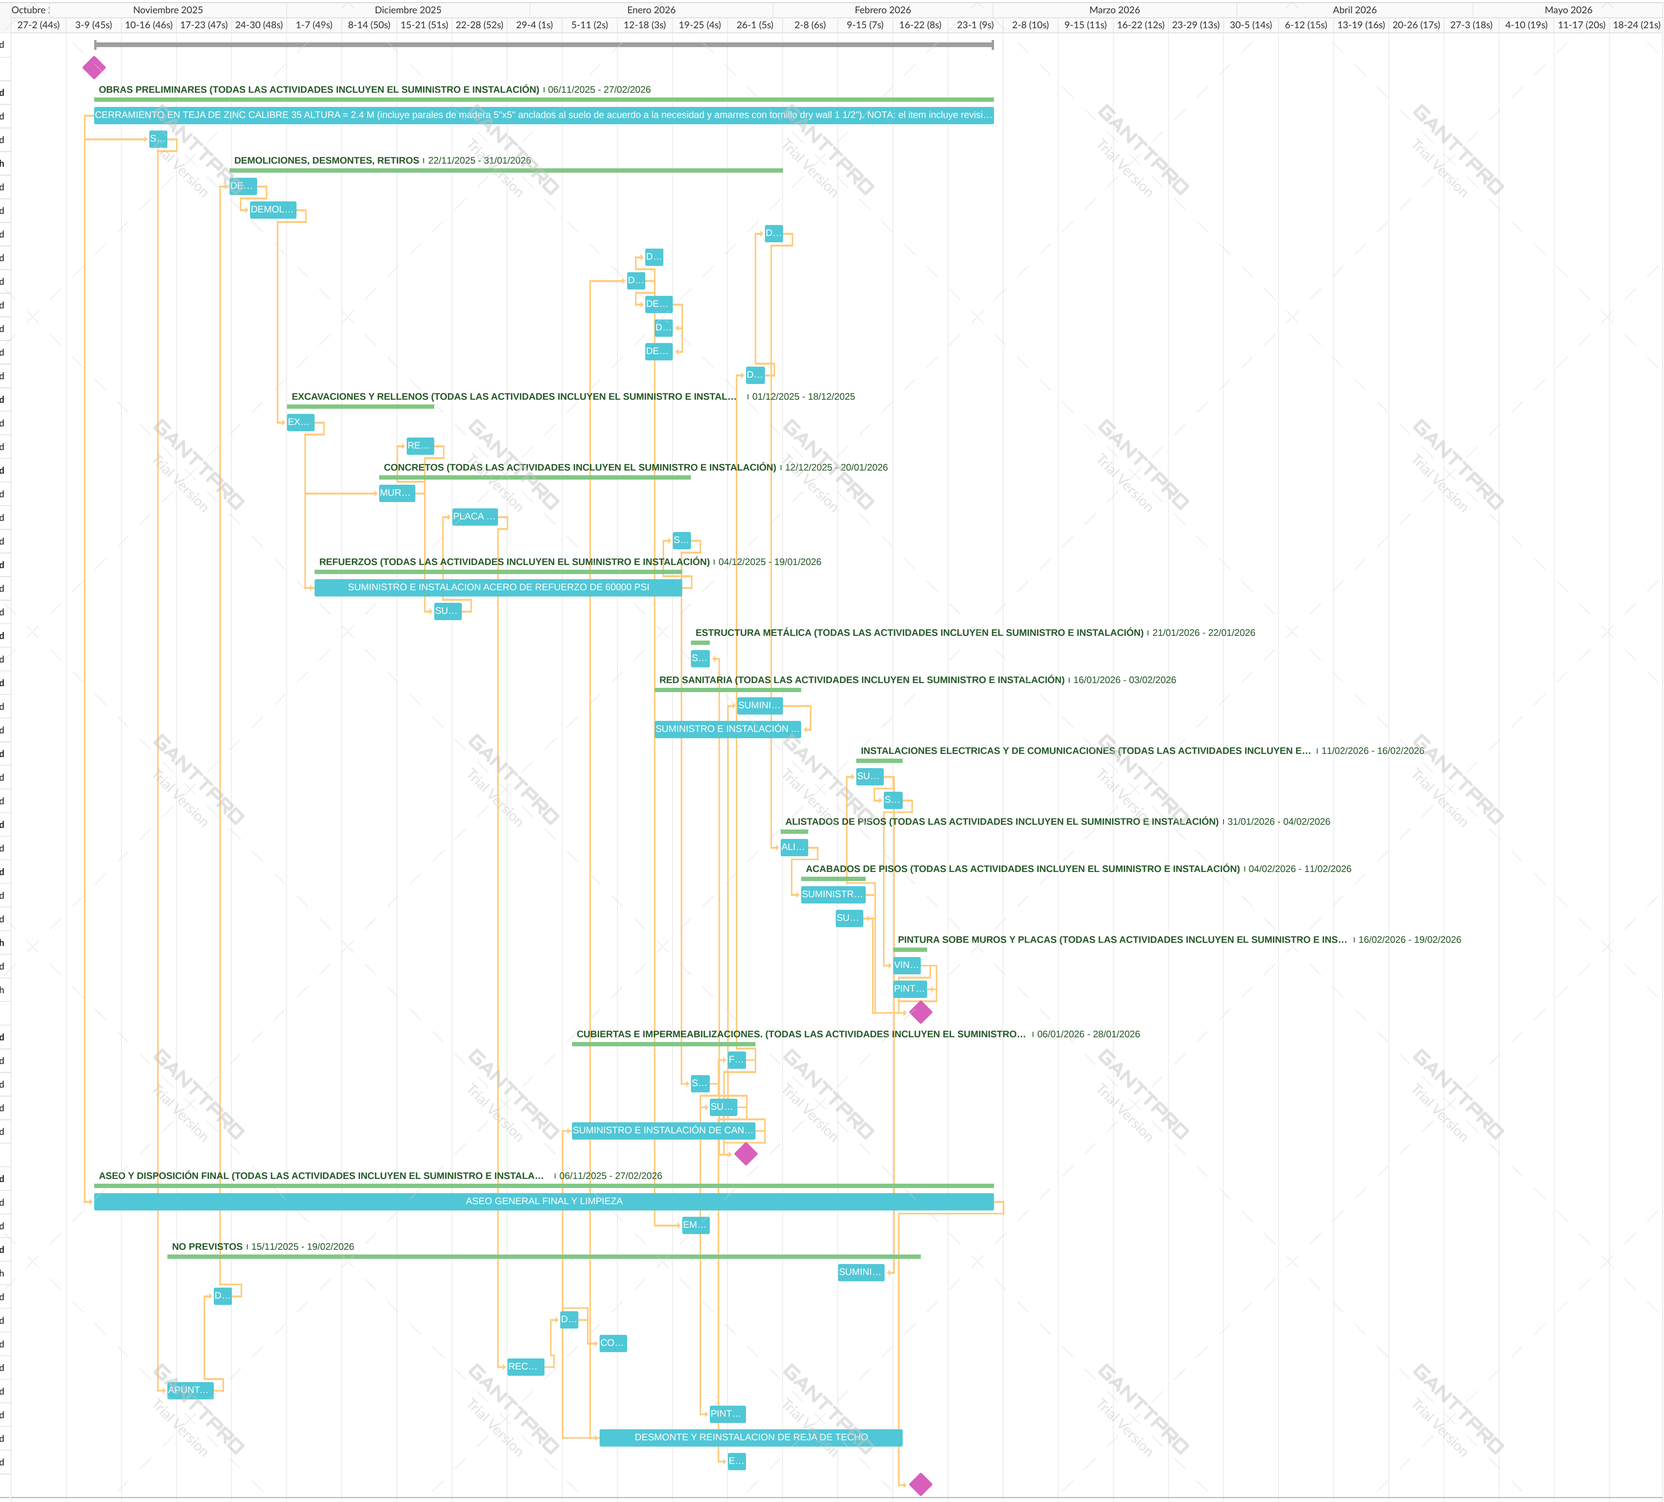

1073246437 | Programacion Colegio Antonio Van Uden - Sede C


	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		18/11/2025	**13/04/2026**	126d
1	INICIO	18/11/2025	18/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/11/2025**	**13/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	18/11/2025	13/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**20/11/2025**	**09/03/2026**	**94d**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ...	05/01/2026	08/01/2026	3d
3.2	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	03/01/2026	06/01/2026	2d
3.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	23/12/2025	25/12/2025	2d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	27/12/2025	30/12/2025	2d
3.5	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	23/12/2025	24/12/2025	2d
3.6	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS D...	06/12/2025	09/03/2026	80d
3.7	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	02/01/2026	03/01/2026	2d
3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE R...	08/01/2026	10/01/2026	2d
3.9	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	28/11/2025	26/12/2025	24d 2m
3.10	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	27/12/2025	31/12/2025	4d
3.11	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	24/11/2025	02/01/2026	35d
3.12	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	20/11/2025	25/12/2025	31d
3.13	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	24/11/2025	03/01/2026	36d
3.14	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	19/02/2026	20/02/2026	1d
3.15	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	29/12/2025	01/01/2026	3d
3.16	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RE...	08/01/2026	10/01/2026	2d
3.17	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE...	03/01/2026	06/01/2026	2d
3.18	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y ...	02/01/2026	09/01/2026	6d
4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/01/2026**	**07/04/2026**	**82d**
4.1	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPE...	02/01/2026	07/04/2026	82d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**20/01/2026**	**8d 7h**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	10/01/2026	13/01/2026	2d
5.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	17/01/2026	20/01/2026	2d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**22/01/2026**	**09/02/2026**	**15d**
6.1	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	03/02/2026	06/02/2026	3d
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	06/02/2026	09/02/2026	2d
6.3	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	31/01/2026	04/02/2026	3d
6.4	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	22/01/2026	26/01/2026	3d
7	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/01/2026**	**07/02/2026**	**16d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	29/01/2026	07/02/2026	8d
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	20/01/2026	22/01/2026	2d
8	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**26/03/2026**	**52d 58m**
8.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	24/01/2026	29/01/2026	4d
8.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	26/02/2026	26/03/2026	25d
9	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/01/2026**	**03/02/2026**	**4d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y T...	29/01/2026	03/02/2026	4d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**25/02/2026**	**37d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	13/01/2026	25/02/2026	37d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	13/02/2026	20/02/2026	6d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/01/2026	15/01/2026	2d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**15/01/2026**	**19/01/2026**	**3d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	15/01/2026	19/01/2026	3d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	15/01/2026	19/01/2026	3d
11.3	ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	17/01/2026	17/01/2026	
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**12/02/2026**	**28d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	07/02/2026	11/02/2026	3d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	07/02/2026	12/02/2026	4d
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	10/01/2026	15/01/2026	4d
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	10/01/2026	15/01/2026	4d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**13/02/2026**	**2d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	11/02/2026	13/02/2026	2d
14	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**20/01/2026**	**6d 7h**
14.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	13/01/2026	16/01/2026	3d
14.2	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZAD...	17/01/2026	20/01/2026	2d
15	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/03/2026**	**23/03/2026**	**1d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	21/03/2026	23/03/2026	1d
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/12/2025**	**20/03/2026**	**83d**
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	10/03/2026	11/03/2026	1d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	13/12/2025	20/03/2026	83d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	13/12/2025	20/03/2026	83d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	13/12/2025	19/03/2026	82d
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	26/12/2025	31/12/2025	4d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS ...	11/03/2026	13/03/2026	2d
17	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**06/03/2026**	**12d**
17.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	20/02/2026	24/02/2026	3d
17.2	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	02/03/2026	06/03/2026	4d
18	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**23/02/2026**	**12/03/2026**	**15d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	23/02/2026	03/03/2026	7d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	06/03/2026	09/03/2026	2d
18.3	WIN DE ALUMINIO	06/03/2026	12/03/2026	5d
18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	02/03/2026	05/03/2026	3d
19	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/03/2026**	**12/03/2026**	**5d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	06/03/2026	12/03/2026	5d
20	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/02/2026**	**16/03/2026**	**24d 2m**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	16/02/2026	26/02/2026	10d
20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	11/03/2026	16/03/2026	4d
21	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**26/02/2026**	**6d**
21.1	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	20/02/2026	26/02/2026	6d
22	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/03/2026**	**12/03/2026**	**4d**
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	07/03/2026	12/03/2026	4d
23	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/03/2026**	**27/03/2026**	**22d**
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	21/03/2026	23/03/2026	1d
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON F...	24/03/2026	26/03/2026	2d
23.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	26/03/2026	27/03/2026	1d
23.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	02/03/2026	04/03/2026	2d
24	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/03/2026**	**30/03/2026**	**3d**
24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXI...	26/03/2026	30/03/2026	3d
24.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	26/03/2026	30/03/2026	3d
25	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**14/03/2026**	**27d**
25.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	11/02/2026	18/02/2026	6d
25.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/03/2026	14/03/2026	3d
25.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	11/03/2026	14/03/2026	3d
25.4	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CER...	14/02/2026	18/02/2026	3d
26	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**03/04/2026**	**32d**
26.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	26/02/2026	03/04/2026	32d
26.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	27/02/2026	03/04/2026	31d
26.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	14/03/2026	18/03/2026	3d
26.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARI...	26/02/2026	01/04/2026	30d
26.5	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEM...	14/03/2026	19/03/2026	4d
26.6	ENTREGA DE PINTURA DE FACHADAS	28/03/2026	28/03/2026	
27	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/03/2026**	**17/03/2026**	**5d**
27.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ...	11/03/2026	17/03/2026	5d
28	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/03/2026**	**31/03/2026**	**2d**
28.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	28/03/2026	31/03/2026	2d
28.2	ENTREGA DE BAÑOS	31/03/2026	31/03/2026	
29	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**05/12/2025**	**21/03/2026**	**91d 7h 58m**
29.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	06/01/2026	21/03/2026	64d 2m
29.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	12/03/2026	14/03/2026	2d
29.3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	13/12/2025	05/03/2026	71d
29.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	06/12/2025	25/02/2026	69d
29.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	05/12/2025	08/12/2025	2d
29.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	02/01/2026	21/03/2026	68d
29.7	ENTREGA DE CUBIERTA	14/03/2026	14/03/2026	
30	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/11/2025**	**13/04/2026**	**126d**
30.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	18/11/2025	13/04/2026	126d
30.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	03/01/2026	08/01/2026	4d
31	**ITEM NO PREVISTOS**	**18/11/2025**	**01/04/2026**	**116d**
31.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	13/12/2025	04/03/2026	69d
31.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALI...	07/03/2026	12/03/2026	4d
31.3	DESMONTE DE LAMINAS DE SUPERBOARD Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE 8MM, INCLUYE MASILLA Y DEMAS EL...	26/02/2026	28/02/2026	3d
31.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLES DE SANITARIO 50CM	19/03/2026	23/03/2026	3d
31.5	DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	05/01/2026	06/01/2026	2d
31.6	DESMONTE DE INCRUSTACIONES INCLUYE RETIRO	03/01/2026	05/01/2026	1d
31.7	DESMONTE Y REINTALACION DE TANQUE DE AGUA	18/02/2026	18/03/2026	24d
31.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA , ACOPLE Y SIFÓN)	26/03/2026	27/03/2026	1d
31.9	DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION	18/11/2025	14/01/2026	50d
31.10	DESMONTE E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL EXISTENTE, (INCLUYE EL DESMONTE DE LA MALLA ESLABONADA Y DE LAS MA...	24/02/2026	01/04/2026	32d
31.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TI...	18/03/2026	19/03/2026	1d
31.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARG...	19/03/2026	23/03/2026	3d
31.13	ENCORAZADO	20/02/2026	24/02/2026	3d
31.14	FIN	31/03/2026	31/03/2026	

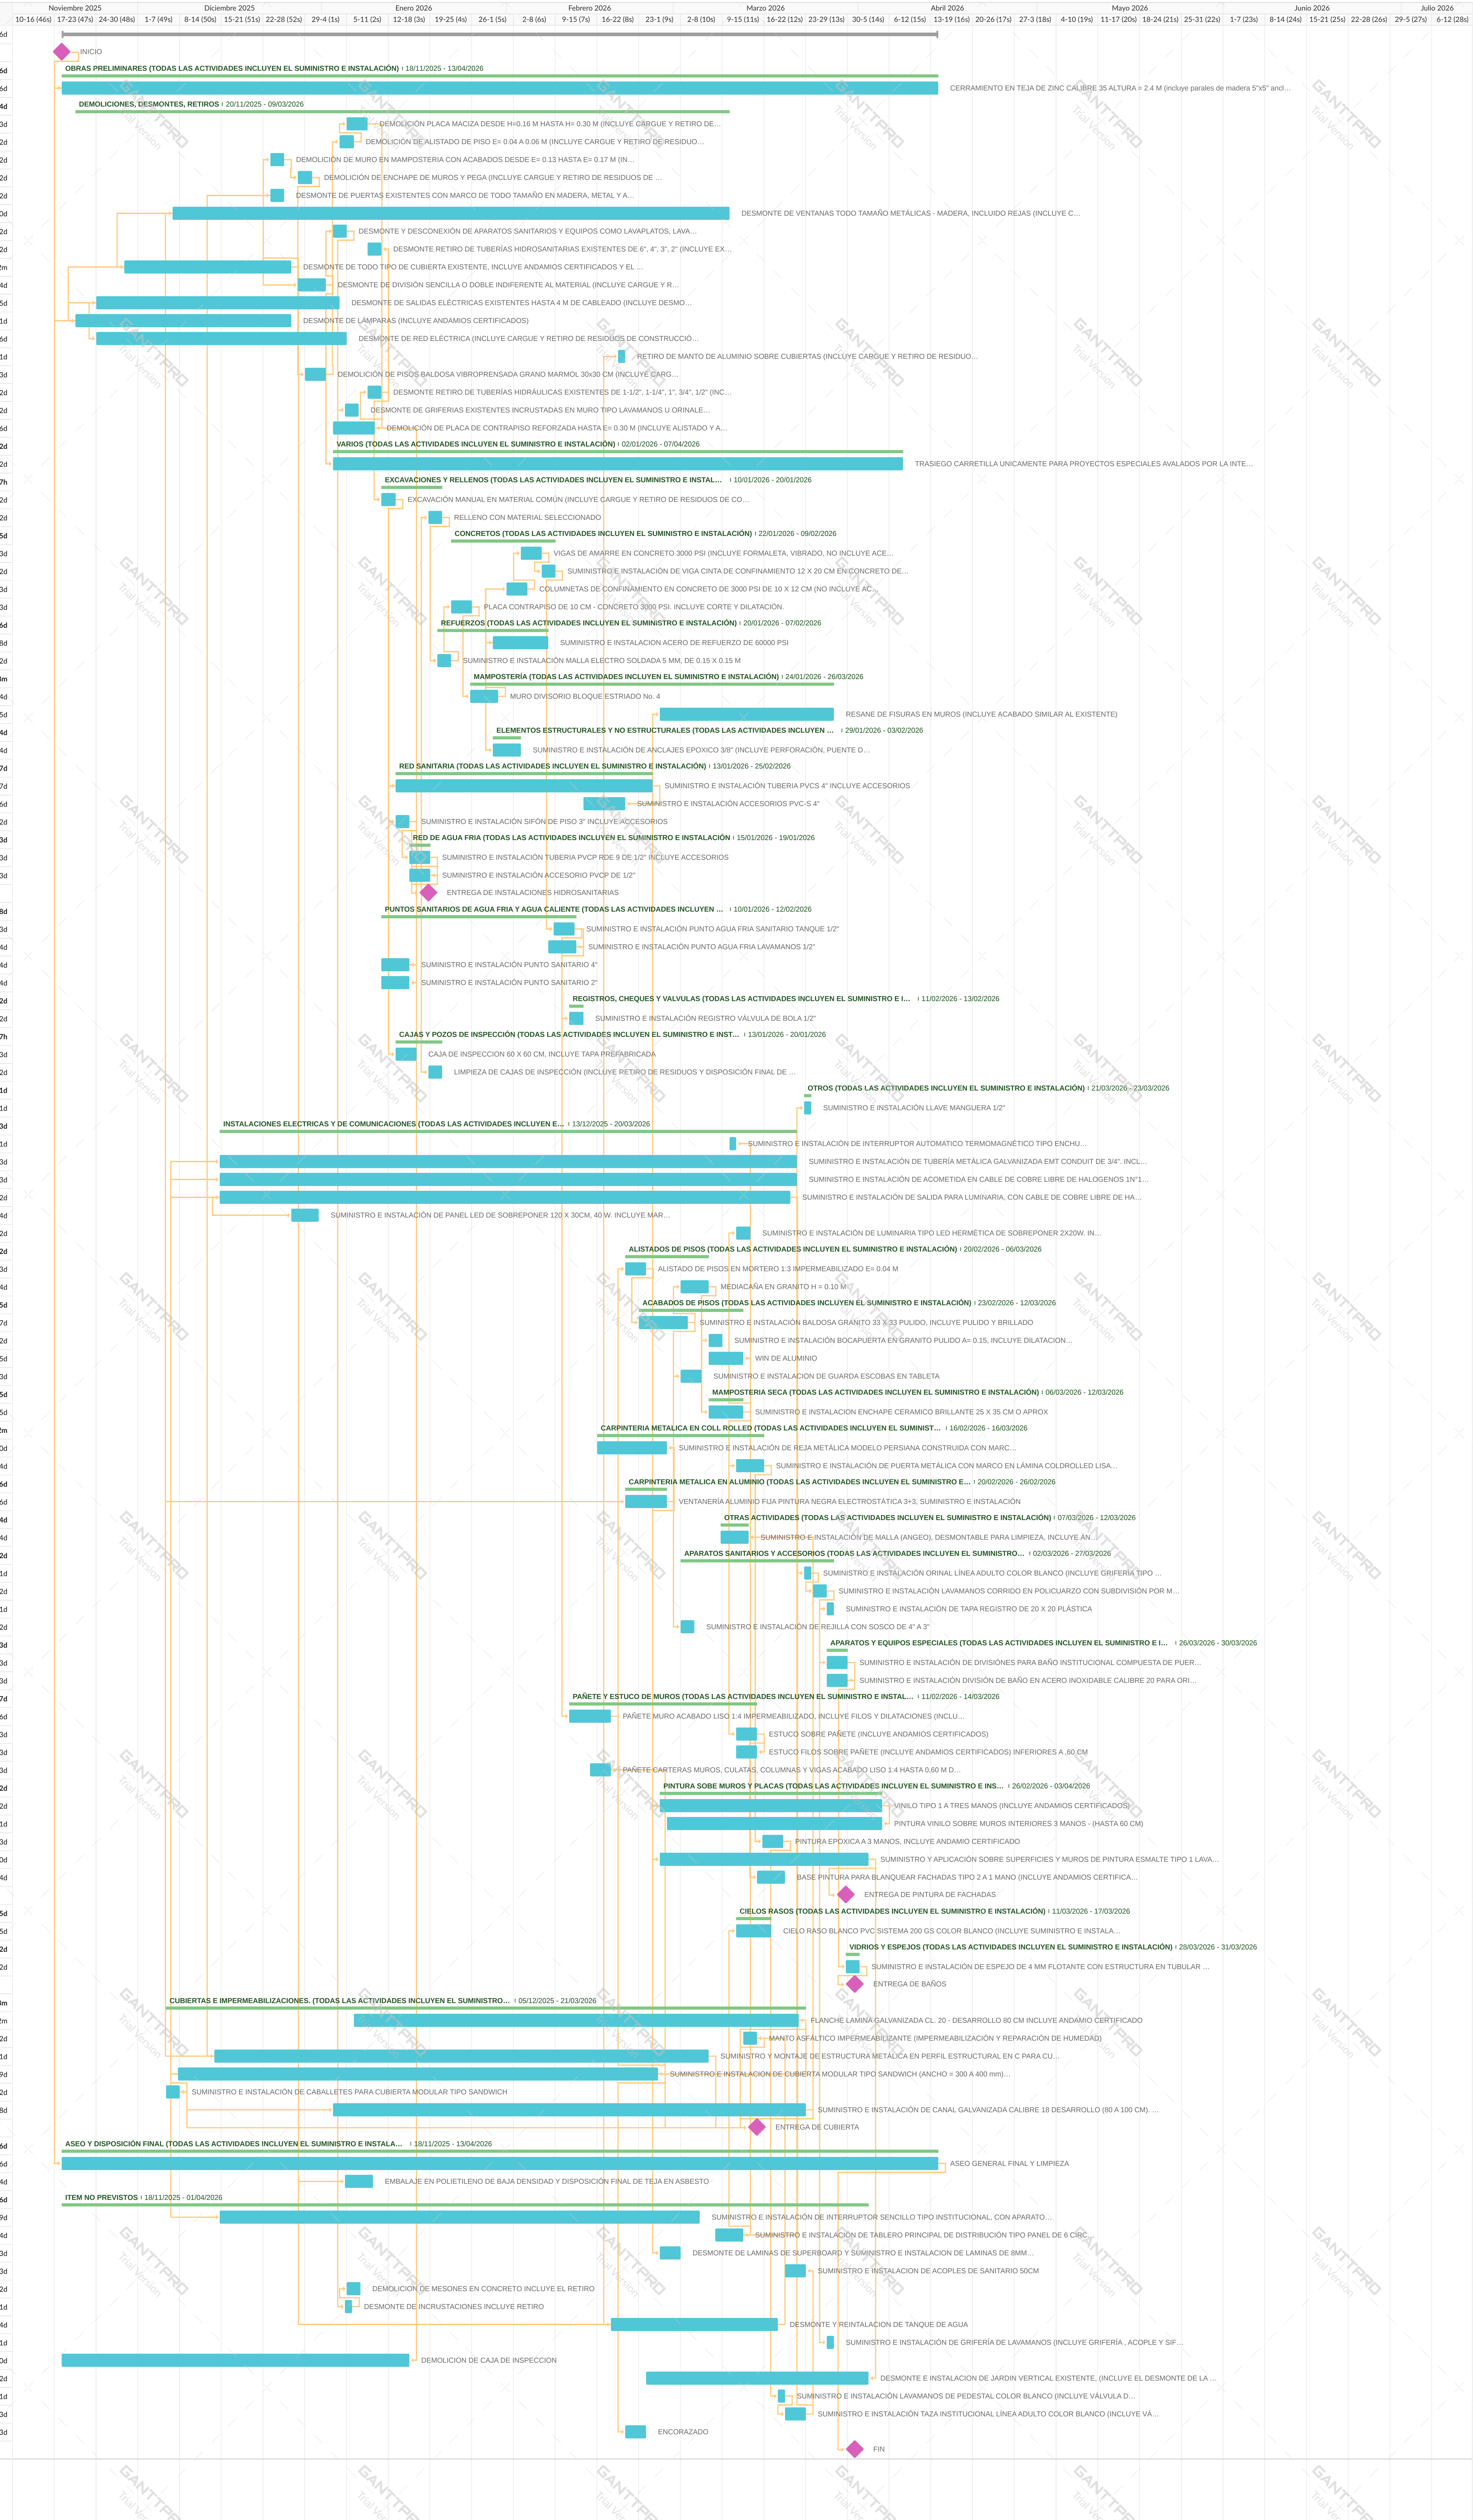

GANTTPRO Trial Version


1073246437 | Programacion Colegio Tecnico Internacional - Sede A

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		06/11/2025	**01/04/2026**	126d
1	INICIO	06/11/2025	06/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**01/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la neces...	06/11/2025	01/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**08/11/2025**	**19/02/2026**	**89d**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	06/12/2025	12/12/2025	5d
3.2	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	05/12/2025	06/12/2025	2d
3.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	20/11/2025	17/01/2026	51d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	24/11/2025	28/11/2025	5d
3.5	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	10/01/2026	14/01/2026	3d
3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	19/01/2026	20/01/2026	2d
3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS ...	15/01/2026	19/01/2026	4d
3.8	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	10/11/2025	11/11/2025	2d
3.9	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE R...	17/12/2025	18/12/2025	2d
3.10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	08/01/2026	10/01/2026	3d
3.11	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	08/11/2025	10/11/2025	2d
3.12	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.13	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.14	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.15	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	29/11/2025	02/12/2025	3d
3.16	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y R...	17/12/2025	18/12/2025	2d
3.17	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO D...	12/11/2025	13/11/2025	2d
3.18	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y ...	13/12/2025	17/12/2025	4d
4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**16/03/2026**	**75d**
4.1	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUP...	19/12/2025	16/03/2026	75d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**30/12/2025**	**9d 7h**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	19/12/2025	20/12/2025	2d
5.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	27/12/2025	30/12/2025	2d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**05/01/2026**	**20/01/2026**	**14d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	17/01/2026	20/01/2026	3d
6.2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	05/01/2026	07/01/2026	3d
7	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/01/2026**	**16/01/2026**	**12d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	15/01/2026	16/01/2026	2d
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	03/01/2026	05/01/2026	2d
8	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**26/01/2026**	**2d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	24/01/2026	26/01/2026	2d
9	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**25/03/2026**	**65d 7h**
9.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	19/01/2026	03/03/2026	37d 2h
9.2	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	08/01/2026	12/01/2026	4d
9.3	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	07/02/2026	25/03/2026	39d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**09/02/2026**	**45d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	20/12/2025	24/12/2025	3d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	06/02/2026	09/02/2026	3d
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	06/02/2026	09/02/2026	3d
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	19/12/2025	24/12/2025	5d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**24/12/2025**	**29/12/2025**	**5d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	24/12/2025	26/12/2025	3d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	26/12/2025	29/12/2025	3d
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**26/12/2025**	**6d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	23/12/2025	26/12/2025	4d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	23/12/2025	26/12/2025	4d
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	20/12/2025	24/12/2025	4d
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	20/12/2025	24/12/2025	4d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/12/2025**	**03/01/2026**	**5d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	29/12/2025	31/12/2025	3d
13.2	ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	03/01/2026	03/01/2026	
14	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**02/01/2026**	**6d 7h**
14.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	26/12/2025	27/12/2025	2d
14.2	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZA...	27/12/2025	02/01/2026	5d
15	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/01/2026**	**07/03/2026**	**54d 1h**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	07/03/2026	07/03/2026	1d
15.2	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	03/01/2026	05/01/2026	1d
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/01/2026**	**27/02/2026**	**35d**
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	19/02/2026	24/02/2026	5d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	19/02/2026	19/02/2026	1d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, ...	19/01/2026	22/01/2026	4d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS N...	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1...	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	04/02/2026	07/02/2026	4d
16.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS ...	24/02/2026	27/02/2026	4d
17	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/01/2026**	**07/02/2026**	**17d 7h**
17.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	19/01/2026	22/01/2026	4d
17.2	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	31/01/2026	07/02/2026	6d
18	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/01/2026**	**17/03/2026**	**43d 2h**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	07/02/2026	14/02/2026	7d
18.2	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRET...	14/02/2026	16/02/2026	2d
18.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC	13/03/2026	17/03/2026	3d
18.4	WIN DE ALUMINIO	26/01/2026	31/01/2026	6d
18.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	12/03/2026	17/03/2026	4d
18.6	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA MONA No 3 LAVADA. INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA H=10 CM Y ESPESOR=...	16/02/2026	17/02/2026	2d
19	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**23/01/2026**	**14/02/2026**	**19d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	23/01/2026	02/02/2026	9d
19.2	ENTREGA DE OBRA BLANCA	14/02/2026	14/02/2026	
20	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/03/2026**	**18/03/2026**	**11d**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	14/03/2026	18/03/2026	4d
20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	06/03/2026	07/03/2026	2d
21	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/02/2026**	**07/02/2026**	**2d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLER...	06/02/2026	07/02/2026	2d
22	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**09/03/2026**	**20d**
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	28/02/2026	03/03/2026	2d
22.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	28/02/2026	03/03/2026	3d
22.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON ...	03/03/2026	06/03/2026	4d
22.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	04/03/2026	06/03/2026	3d
22.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	07/03/2026	09/03/2026	2d
22.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	14/02/2026	17/02/2026	3d
23	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/03/2026**	**07/03/2026**	**5d**
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXI...	03/03/2026	05/03/2026	3d
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	03/03/2026	07/03/2026	5d
24	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**09/02/2026**	**23d 7h**
24.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	13/01/2026	19/01/2026	6d
24.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	22/01/2026	24/01/2026	3d
24.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	31/01/2026	09/02/2026	7d
25	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/02/2026**	**05/03/2026**	**22d 1h**
25.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	07/02/2026	16/02/2026	7d
25.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	07/02/2026	16/02/2026	7d
25.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	24/02/2026	27/02/2026	4d
25.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	28/02/2026	05/03/2026	5d
26	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/02/2026**	**24/02/2026**	**5d**
26.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ...	19/02/2026	24/02/2026	5d
27	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/03/2026**	**14/03/2026**	**3d**
27.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	12/03/2026	14/03/2026	3d
27.2	ENTREGA DE BAÑOS	14/03/2026	14/03/2026	
28	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/01/2026**	**06/02/2026**	**15d**
28.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTI...	20/01/2026	26/01/2026	6d
28.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	29/01/2026	02/02/2026	4d
28.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	02/02/2026	03/02/2026	2d
28.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICO...	04/02/2026	05/02/2026	2d
28.5	ENTREGA DE CUBIERTA	06/02/2026	06/02/2026	
29	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**01/04/2026**	**126d**
29.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	06/11/2025	01/04/2026	126d
29.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	17/01/2026	23/01/2026	6d
30	**NO PREVISTOS**	**12/11/2025**	**19/03/2026**	**109d**
30.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO EN PVC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	27/02/2026	09/03/2026	8d
30.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE ...	18/02/2026	24/02/2026	6d
30.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTICO PARA EL ALISTADO DEL PISO	07/03/2026	13/03/2026	5d
30.4	RETIRO DE MUEBLES DE MADERA INCLUYE SU PROTECCION	25/02/2026	27/02/2026	2d
30.5	DEMOLICION Y RETIRO DE MESONES O POCETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	14/11/2025	19/11/2025	5d
30.6	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	12/11/2025	12/11/2025	1d
30.7	DESMONTE Y RETIRO DE ESPEJOS	29/11/2025	03/12/2025	4d
30.8	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	02/12/2025	04/12/2025	3d
30.9	TAPAS DE INSPECCION PARA CIELO DE PVC INCLYE LA PERFORACION, EL MARCO Y LA TAPA EN PVC	19/02/2026	25/02/2026	6d
30.10	SUMINISTRO E INSTALCIONES DE ACOPLE SANITARIO DE 50CM	27/02/2026	03/03/2026	4d
30.11	DESMONTE Y RETIRO DE DOMO	10/01/2026	12/01/2026	1d
30.12	ESCARIFICACION DE MUROS	23/01/2026	31/01/2026	8d
30.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO DE SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (IN...	28/02/2026	02/03/2026	2d
30.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE BRIDA...	28/02/2026	03/03/2026	3d
30.15	VENTANERÍA CON PERSIANA EN ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	07/03/2026	14/03/2026	6d
30.16	ENCOROZADO	26/01/2026	28/01/2026	3d
30.17	PAÑETE LINEAL HASTA LOS .59 M	19/01/2026	22/01/2026	4d
30.18	FIN	19/03/2026	19/03/2026	

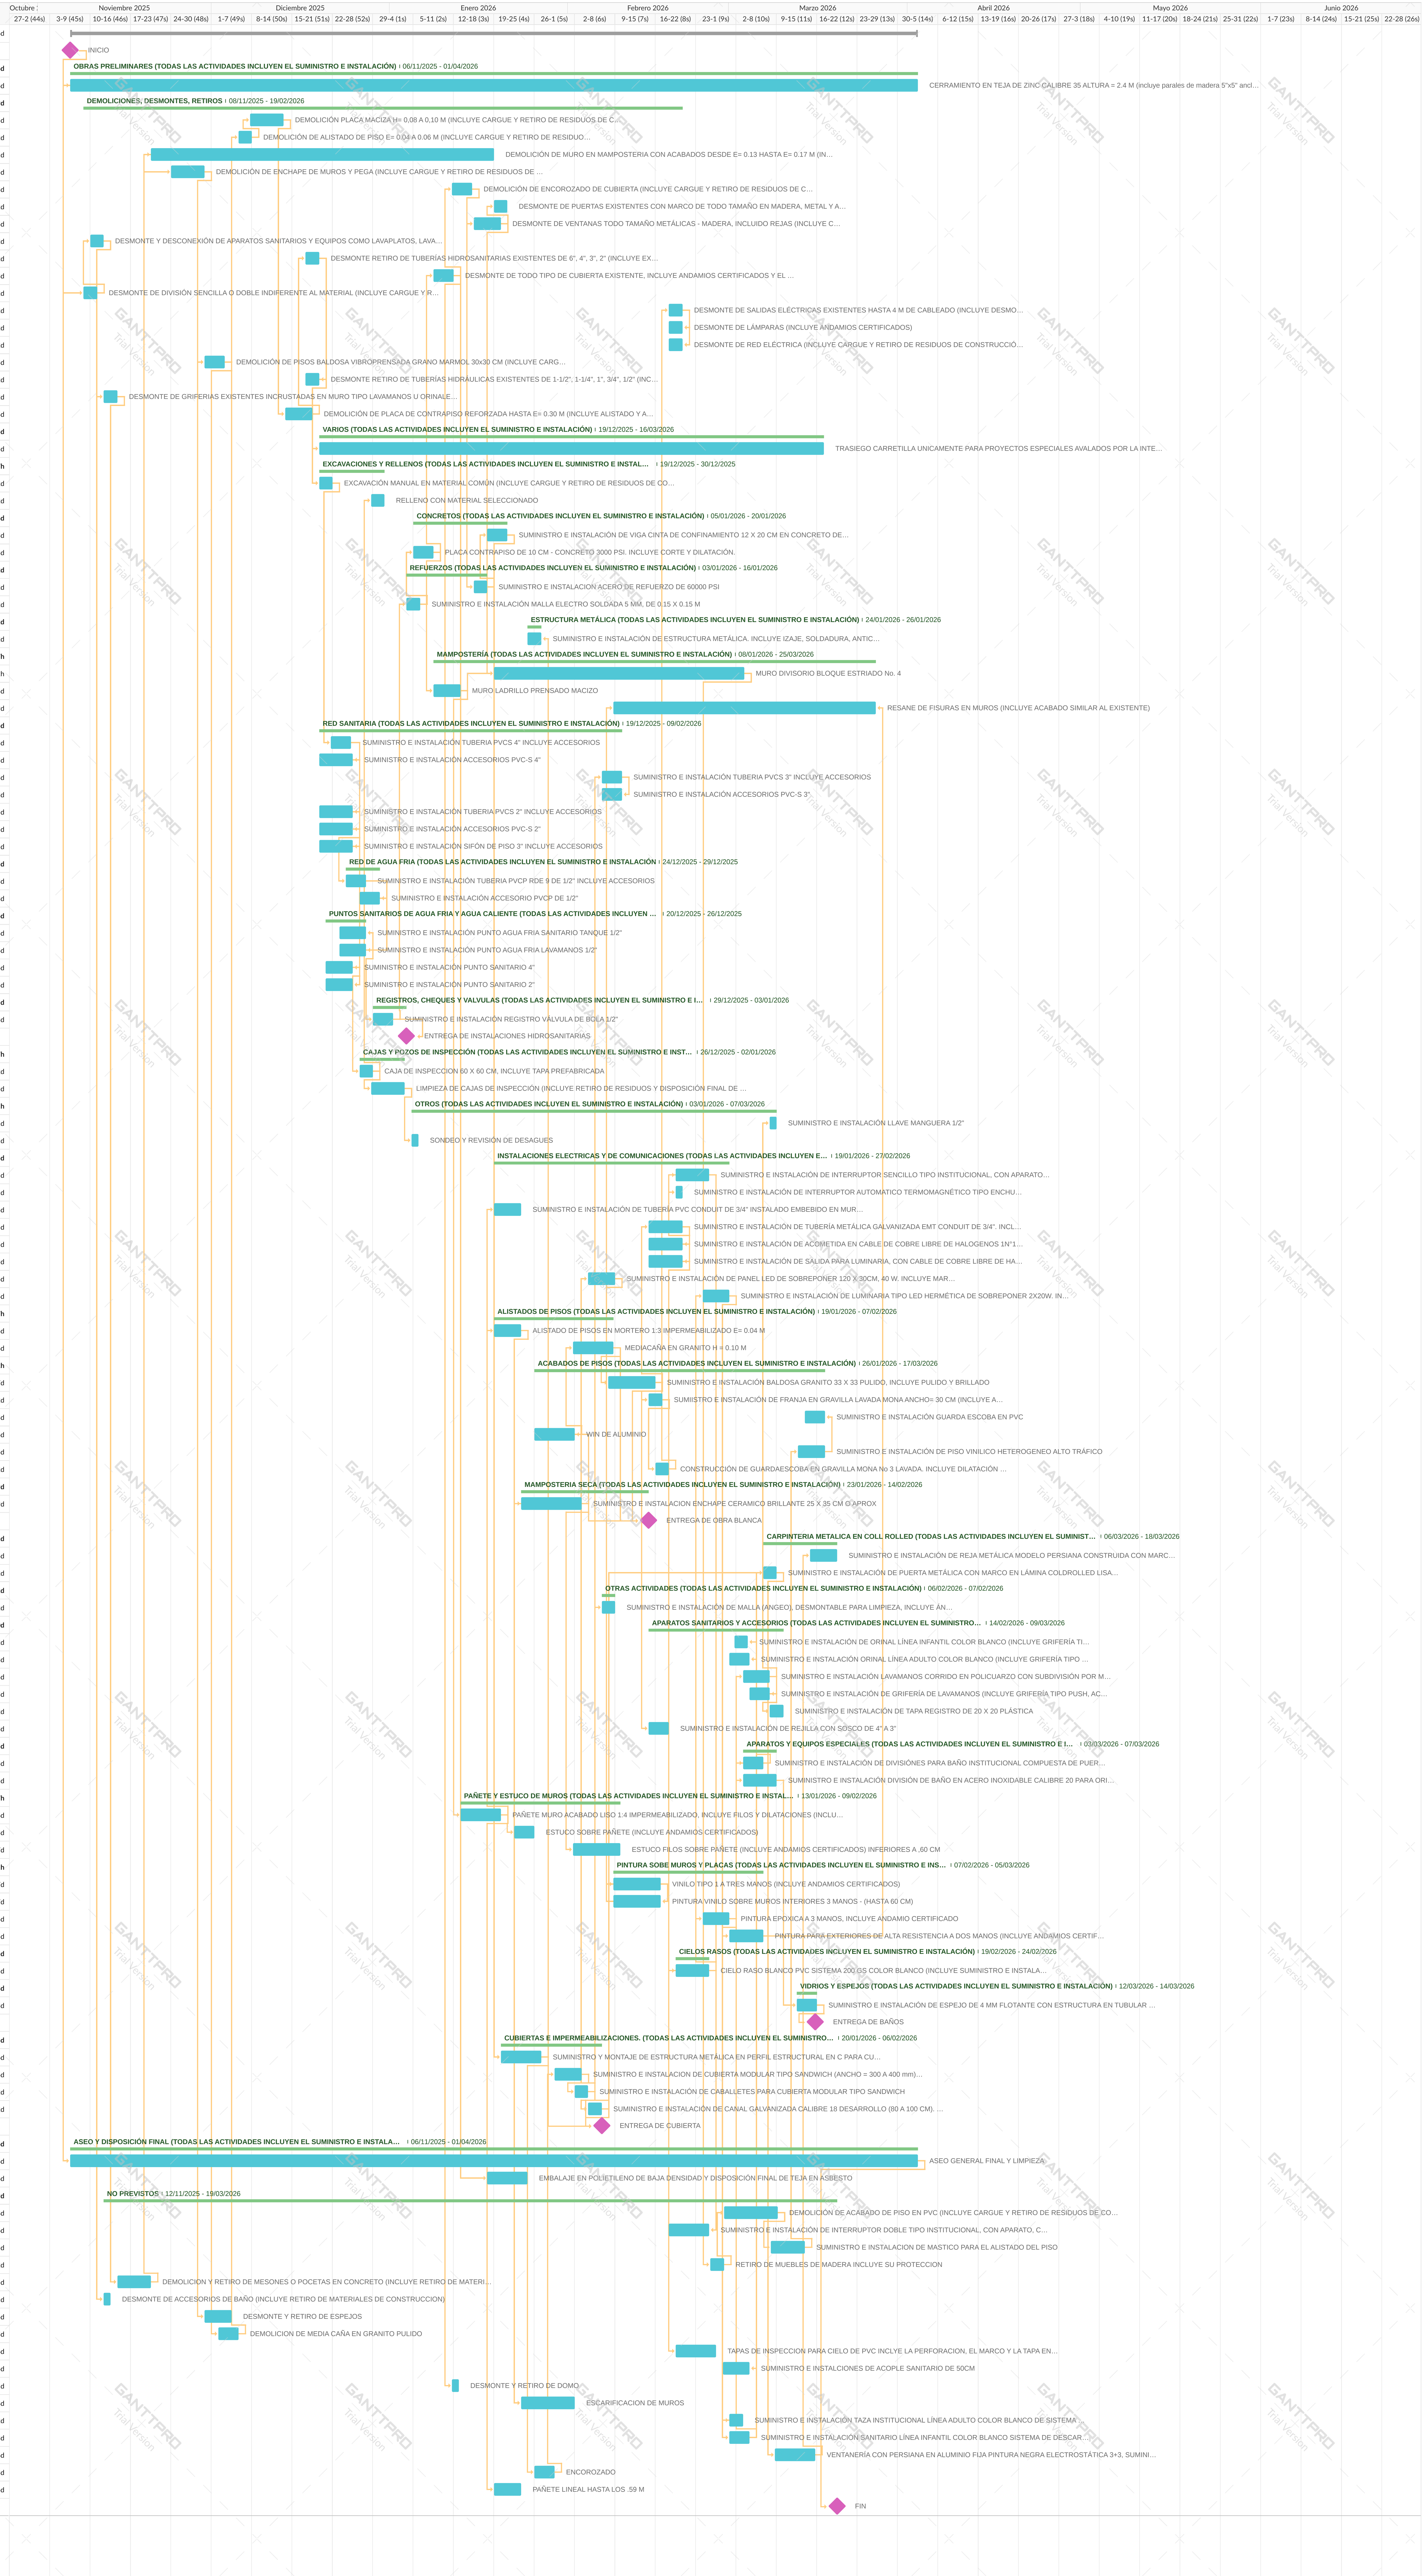


1073246437 | Programacion Colegio Republica de Venezuela - Sede B

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		24/11/2025	**18/04/2026**	126d
1	INICIO	24/11/2025	24/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/11/2025**	**18/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	24/11/2025	18/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**29/11/2025**	**28/01/2026**	**52d**
3.1	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	28/01/2026	28/01/2026	1d
3.2	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE ...	13/12/2025	17/12/2025	3d
3.3	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	29/11/2025	04/12/2025	5d
4	**MANTENIMIENTOS**	**17/12/2025**	**29/01/2026**	**38d**
4.1	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMON...	17/01/2026	29/01/2026	10d
4.2	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE M...	17/12/2025	19/12/2025	3d
4.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	16/01/2026	29/01/2026	12d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**19/02/2026**	**4d**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	14/02/2026	19/02/2026	4d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/02/2026**	**26/02/2026**	**4d**
6.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	21/02/2026	26/02/2026	4d
7	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**20/12/2025**	**1d**
7.1	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	20/12/2025	20/12/2025	1d
8	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/02/2026**	**21/02/2026**	**3d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	19/02/2026	21/02/2026	3d
9	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**27/03/2026**	**26d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABAD...	26/02/2026	27/03/2026	26d
10	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/01/2026**	**03/02/2026**	**5d**
10.1	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	29/01/2026	03/02/2026	5d
11	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/03/2026**	**06/04/2026**	**7d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	30/03/2026	03/04/2026	5d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	06/04/2026	06/04/2026	1d
12	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/02/2026**	**12/02/2026**	**1d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PAR...	12/02/2026	12/02/2026	1d
13	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**14/01/2026**	**21d**
13.1	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA...	27/12/2025	07/01/2026	10d
13.2	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE ...	08/01/2026	13/01/2026	5d
13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	20/12/2025	25/12/2025	5d
13.4	PINTURA DE CANCHA	14/01/2026	14/01/2026	
14	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/02/2026**	**12/02/2026**	**9d**
14.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	03/02/2026	06/02/2026	4d
14.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	04/02/2026	06/02/2026	3d
14.3	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	07/02/2026	12/02/2026	5d
14.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10/02/2026	11/02/2026	2d
14.5	ENTREGA DE PINTURA	12/02/2026	12/02/2026	
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**08/04/2026**	**2d**
15.1	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA...	07/04/2026	08/04/2026	2d
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/12/2025**	**08/04/2026**	**105d 1h**
16.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	08/04/2026	08/04/2026	1d
16.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	06/12/2025	13/12/2025	6d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	30/03/2026	04/04/2026	6d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS ...	25/03/2026	30/03/2026	5d
16.5	ENTREGA DE CUBIERTA	13/12/2025	13/12/2025	
16.6	ENTREGA PERGOLA	08/04/2026	08/04/2026	
17	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/11/2025**	**18/04/2026**	**126d**
17.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24/11/2025	18/04/2026	126d
18	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/02/2026**	**10/04/2026**	**50d**
18.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN	12/02/2026	10/04/2026	50d
19	**NO PREVISTOS**	**29/11/2025**	**09/04/2026**	**112d**
19.1	MANTENIMIENTO DE REJILLA DE CARCAMO (AJUSTE-ALINEACION-SOLDADURA)	14/01/2026	17/01/2026	4d
19.2	MANTENIMIENTO DE BAJANTE,	13/12/2025	16/12/2025	2d
19.3	DESMONTE Y REINSTALACION DE TANQUES DE AGUA	29/11/2025	01/12/2025	2d
19.4	DESMONTE Y REINSTALACION DE TUBERIA	01/12/2025	17/12/2025	15d
19.5	AUTONIVELANTE	04/12/2025	06/12/2025	3d
19.6	FIN	09/04/2026	09/04/2026	

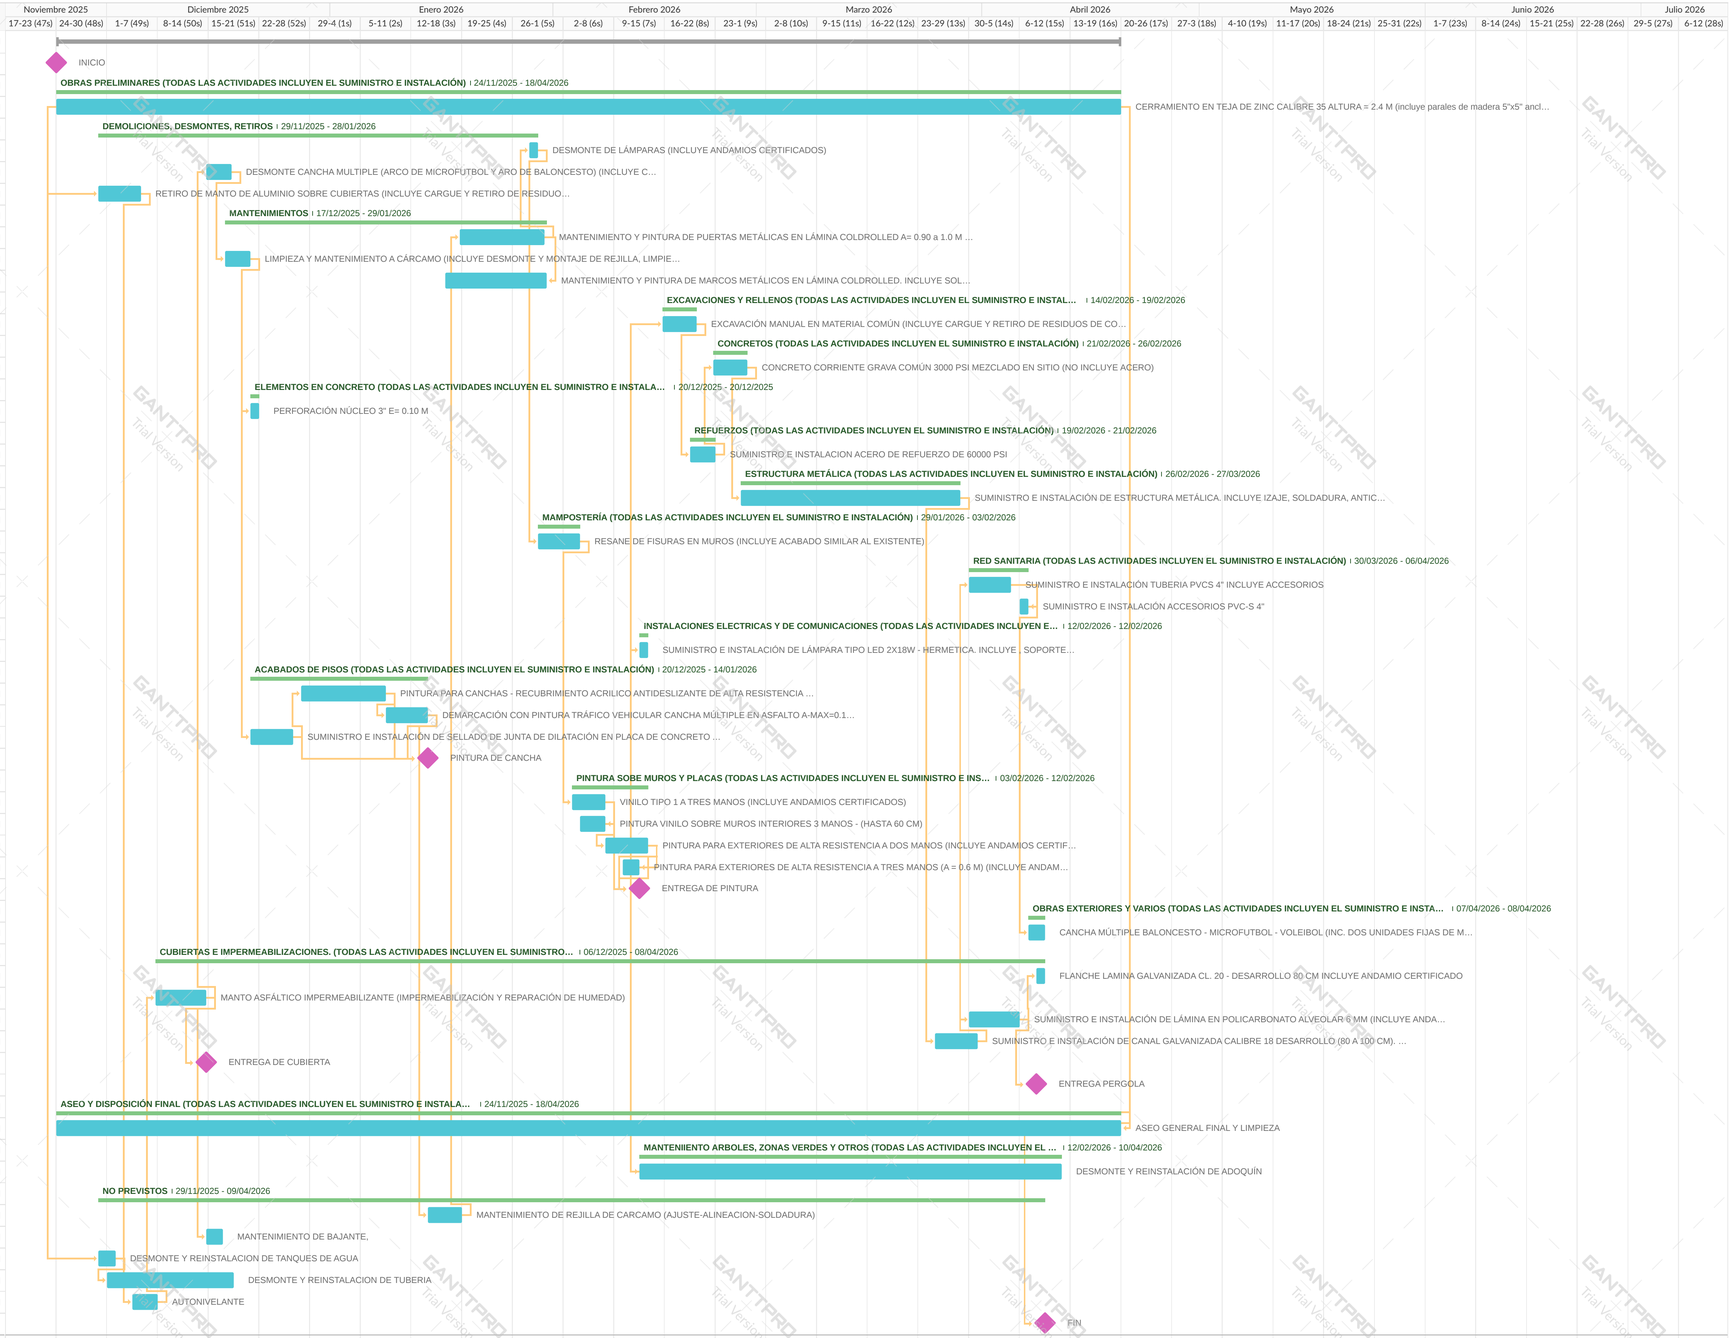


1073246437 | Programacion Colegio Marco Antonio Carreño - Sede B

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		01/12/2025	**25/04/2026**	126d
1	INICIO	01/12/2025	01/12/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/12/2025**	**24/04/2026**	**122d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la neces...	04/12/2025	24/04/2026	122d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**06/12/2025**	**13/03/2026**	**84d**
3.1	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	09/01/2026	15/01/2026	6d
3.2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	26/12/2025	08/01/2026	12d
3.3	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFIC...	06/12/2025	10/12/2025	4d
3.4	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	23/12/2025	23/12/2025	1d
3.5	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	18/12/2025	23/12/2025	5d
3.6	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/12/2025	18/12/2025	7d
3.7	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	17/12/2025	23/12/2025	6d
3.8	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	12/03/2026	13/03/2026	2d
3.9	FIN DESMONTE DE CUBIERTA	09/01/2026	09/01/2026	
4	**MANTENIMIENTOS**	**10/04/2026**	**16/04/2026**	**6d**
4.1	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMON...	10/04/2026	16/04/2026	6d
4.2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	10/04/2026	16/04/2026	6d
5	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**31/01/2026**	**06/02/2026**	**6d**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	31/01/2026	06/02/2026	6d
6	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/01/2026**	**30/01/2026**	**3d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	28/01/2026	30/01/2026	3d
7	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**19/02/2026**	**4d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	14/02/2026	19/02/2026	4d
8	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**13/04/2026**	**75d**
8.1	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	16/01/2026	24/01/2026	8d
8.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	09/04/2026	13/04/2026	4d
9	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**28/01/2026**	**4d**
9.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	24/01/2026	28/01/2026	4d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/03/2026**	**05/03/2026**	**4d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	02/03/2026	05/03/2026	4d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	03/03/2026	05/03/2026	3d
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/03/2026**	**09/04/2026**	**18d 7h**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	31/03/2026	01/04/2026	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS N...	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1...	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	04/04/2026	09/04/2026	4d
12	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**13/04/2026**	**115d**
12.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTU...	12/03/2026	18/03/2026	6d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO	11/04/2026	13/04/2026	2d
12.3	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO D...	01/12/2025	03/12/2025	3d
13	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/03/2026**	**16/04/2026**	**26d**
13.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	18/03/2026	19/03/2026	2d
13.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARI...	09/04/2026	16/04/2026	7d
13.3	FIN DE PINTURA	16/04/2026	16/04/2026	
14	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/02/2026**	**19/03/2026**	**35d 7h**
14.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	14/03/2026	19/03/2026	4d
14.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	14/03/2026	17/03/2026	3d
14.3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTI...	06/02/2026	20/02/2026	13d
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	02/03/2026	12/03/2026	10d
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	12/03/2026	14/03/2026	3d
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TO...	25/02/2026	02/03/2026	5d
14.7	FIN CUBIERTA	19/03/2026	19/03/2026	
15	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**25/04/2026**	**126d**
15.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	01/12/2025	25/04/2026	126d
15.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	15/01/2026	22/01/2026	7d
16	**NO PREVISTOS**	**02/12/2025**	**16/04/2026**	**116d 7h**
16.1	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO Y REINSTALACION	12/03/2026	17/03/2026	5d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	20/03/2026	27/03/2026	7d
16.3	PUERTA CON CHAPA PARA CERRAMIENTO	02/12/2025	03/12/2025	2d
16.4	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN SUPERBOARD	11/04/2026	16/04/2026	4d
16.5	PINTURA REJA CUBIERTA	23/02/2026	24/02/2026	2d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, BA...	28/03/2026	31/03/2026	3d
16.7	ENCORAZADO	19/02/2026	23/02/2026	4d
16.8	FIN	16/04/2026	16/04/2026	

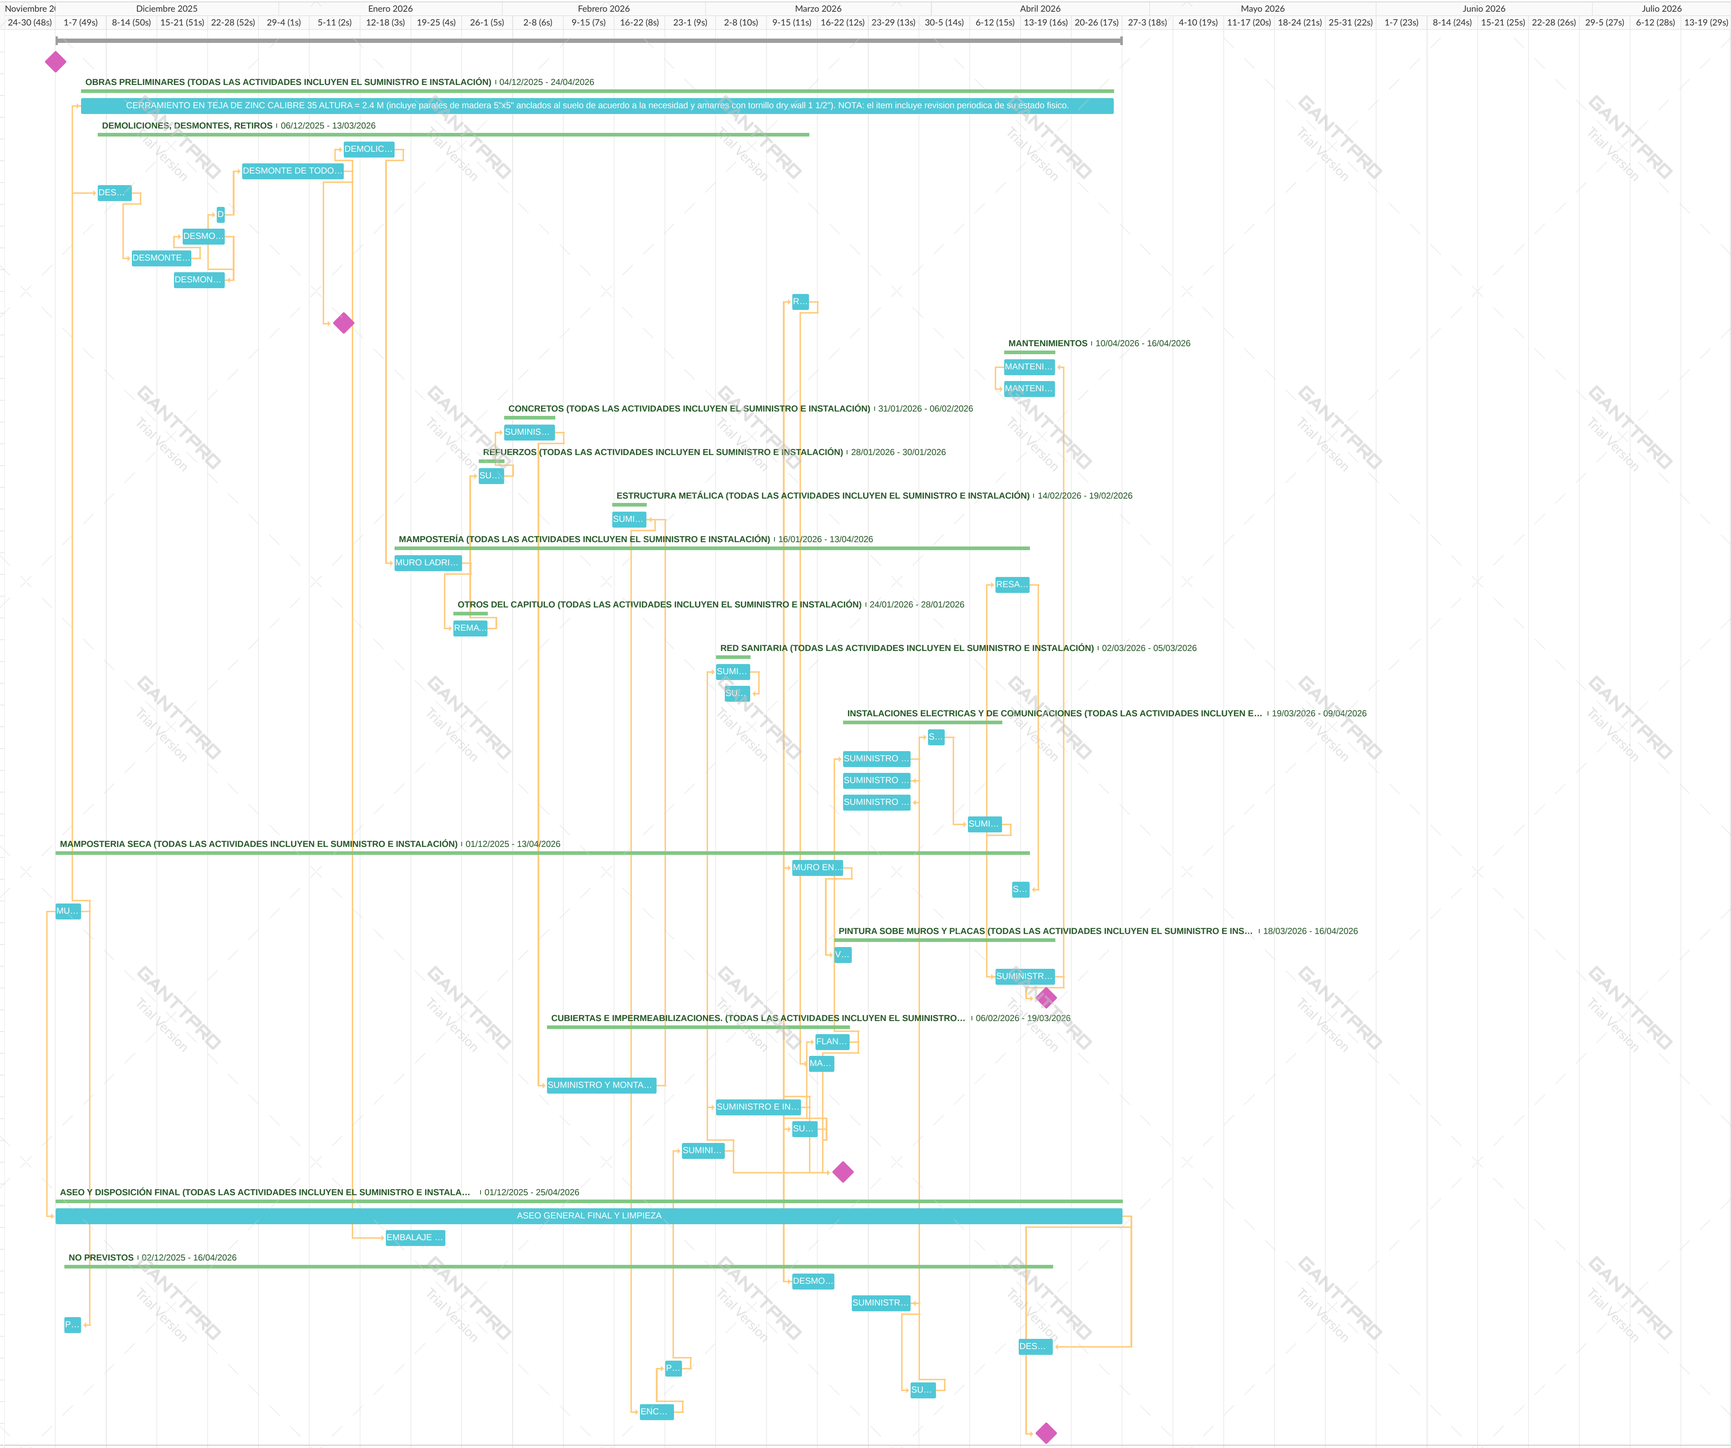


1073246437 | Programacion Colegio Julio Garavito Armero - Sede B

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		21/11/2025	**11/05/2026**	147d
1	INICIO	21/11/2025	21/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/11/2025**	**11/05/2026**	**147d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	21/11/2025	11/05/2026	147d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**22/11/2025**	**04/04/2026**	**114d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	06/03/2026	07/03/2026	2d
3.2	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	20/12/2025	22/12/2025	2d
3.3	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	22/11/2025	26/11/2025	3d
3.4	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS D...	26/11/2025	28/11/2025	3d
3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	04/04/2026	04/04/2026	1d
3.6	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	13/12/2025	20/12/2025	6d
3.7	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFIC...	29/11/2025	02/12/2025	3d
3.8	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	04/12/2025	05/12/2025	2d
3.9	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓ...	07/03/2026	10/03/2026	2d
3.10	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	09/12/2025	11/12/2025	3d
3.11	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	02/12/2025	03/12/2025	2d
3.12	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	09/12/2025	11/12/2025	3d
4	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/03/2026**	**05/03/2026**	**3d**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	03/03/2026	05/03/2026	3d
5	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/02/2026**	**03/03/2026**	**2d**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	28/02/2026	03/03/2026	2d
6	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/03/2026**	**20/03/2026**	**5d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	16/03/2026	20/03/2026	5d
7	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**22/04/2026**	**53d**
7.1	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	20/02/2026	27/02/2026	7d
7.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	20/04/2026	22/04/2026	3d
8	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**28/02/2026**	**3d**
8.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	26/02/2026	28/02/2026	3d
9	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/03/2026**	**01/04/2026**	**4d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	28/03/2026	01/04/2026	4d
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	28/03/2026	01/04/2026	4d
10	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**07/04/2026**	**1d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	07/04/2026	07/04/2026	1d
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**23/04/2026**	**14d 7h**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	18/04/2026	21/04/2026	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	18/04/2026	23/04/2026	4d
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 ...	22/04/2026	22/04/2026	1d
11.7	FIN ACTIVIDADES ELECTRICAS	23/04/2026	23/04/2026	
12	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/04/2026**	**09/04/2026**	**2d**
12.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	08/04/2026	09/04/2026	2d
13	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/04/2026**	**18/04/2026**	**5d**
13.1	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRET...	16/04/2026	18/04/2026	3d
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	14/04/2026	15/04/2026	2d
14	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/04/2026**	**14/04/2026**	**9d**
14.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	10/04/2026	14/04/2026	4d
14.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTU...	04/04/2026	09/04/2026	5d
15	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/03/2026**	**27/03/2026**	**13d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	13/03/2026	18/03/2026	5d
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	18/03/2026	23/03/2026	5d
15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE...	24/03/2026	27/03/2026	4d
16	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/04/2026**	**21/04/2026**	**11d 7h**
16.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	08/04/2026	17/04/2026	9d
16.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/04/2026	21/04/2026	8d
16.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	16/04/2026	20/04/2026	4d
17	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**09/04/2026**	**27/04/2026**	**16d**
17.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	09/04/2026	10/04/2026	2d
17.2	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	18/04/2026	20/04/2026	1d
17.3	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	23/04/2026	27/04/2026	4d
17.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	23/04/2026	27/04/2026	4d
18	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/03/2026**	**21/04/2026**	**37d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	21/04/2026	21/04/2026	1d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	10/03/2026	12/03/2026	3d
19	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/03/2026**	**11/04/2026**	**28d**
19.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	10/03/2026	21/03/2026	11d
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	25/03/2026	04/04/2026	10d
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	07/04/2026	10/04/2026	4d
19.4	FIN DE CUBIERTA	11/04/2026	11/04/2026	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/11/2025**	**11/05/2026**	**147d**
20.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	21/11/2025	11/05/2026	147d
20.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	29/12/2025	02/01/2026	5d
21	**NO PREVISTOS**	**06/12/2025**	**27/04/2026**	**121d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, BAR...	15/04/2026	18/04/2026	4d
21.2	ESCARIFICIACION	04/04/2026	07/04/2026	2d
21.3	DESMONTE DE REJA DE TECHO	12/12/2025	13/12/2025	2d
21.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	04/04/2026	16/04/2026	10d
21.5	SUMINISTRO E INSTALCIONES DE ACOPLE SANITARIO DE 50CM	20/04/2026	20/04/2026	1d
21.6	DEMOLICION DE MUROS DE SUPERBOARD INCLUYE EL RETIRO	06/12/2025	08/12/2025	2d
21.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA DE .80X2.10 INCLUYE CHAPA	09/04/2026	10/04/2026	2d
21.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TI...	21/04/2026	21/04/2026	1d
21.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL , BRIDA DE ...	20/04/2026	20/04/2026	1d
21.10	ENCOROZADO	21/03/2026	24/03/2026	3d
21.11	PAÑETE LINEAL .HASTA 59 M	27/02/2026	05/03/2026	6d
21.12	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA CON PERSIANA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	05/03/2026	10/03/2026	5d
21.13	ENTREGA DE BAÑO	22/04/2026	22/04/2026	
21.14	FIN	27/04/2026	27/04/2026	

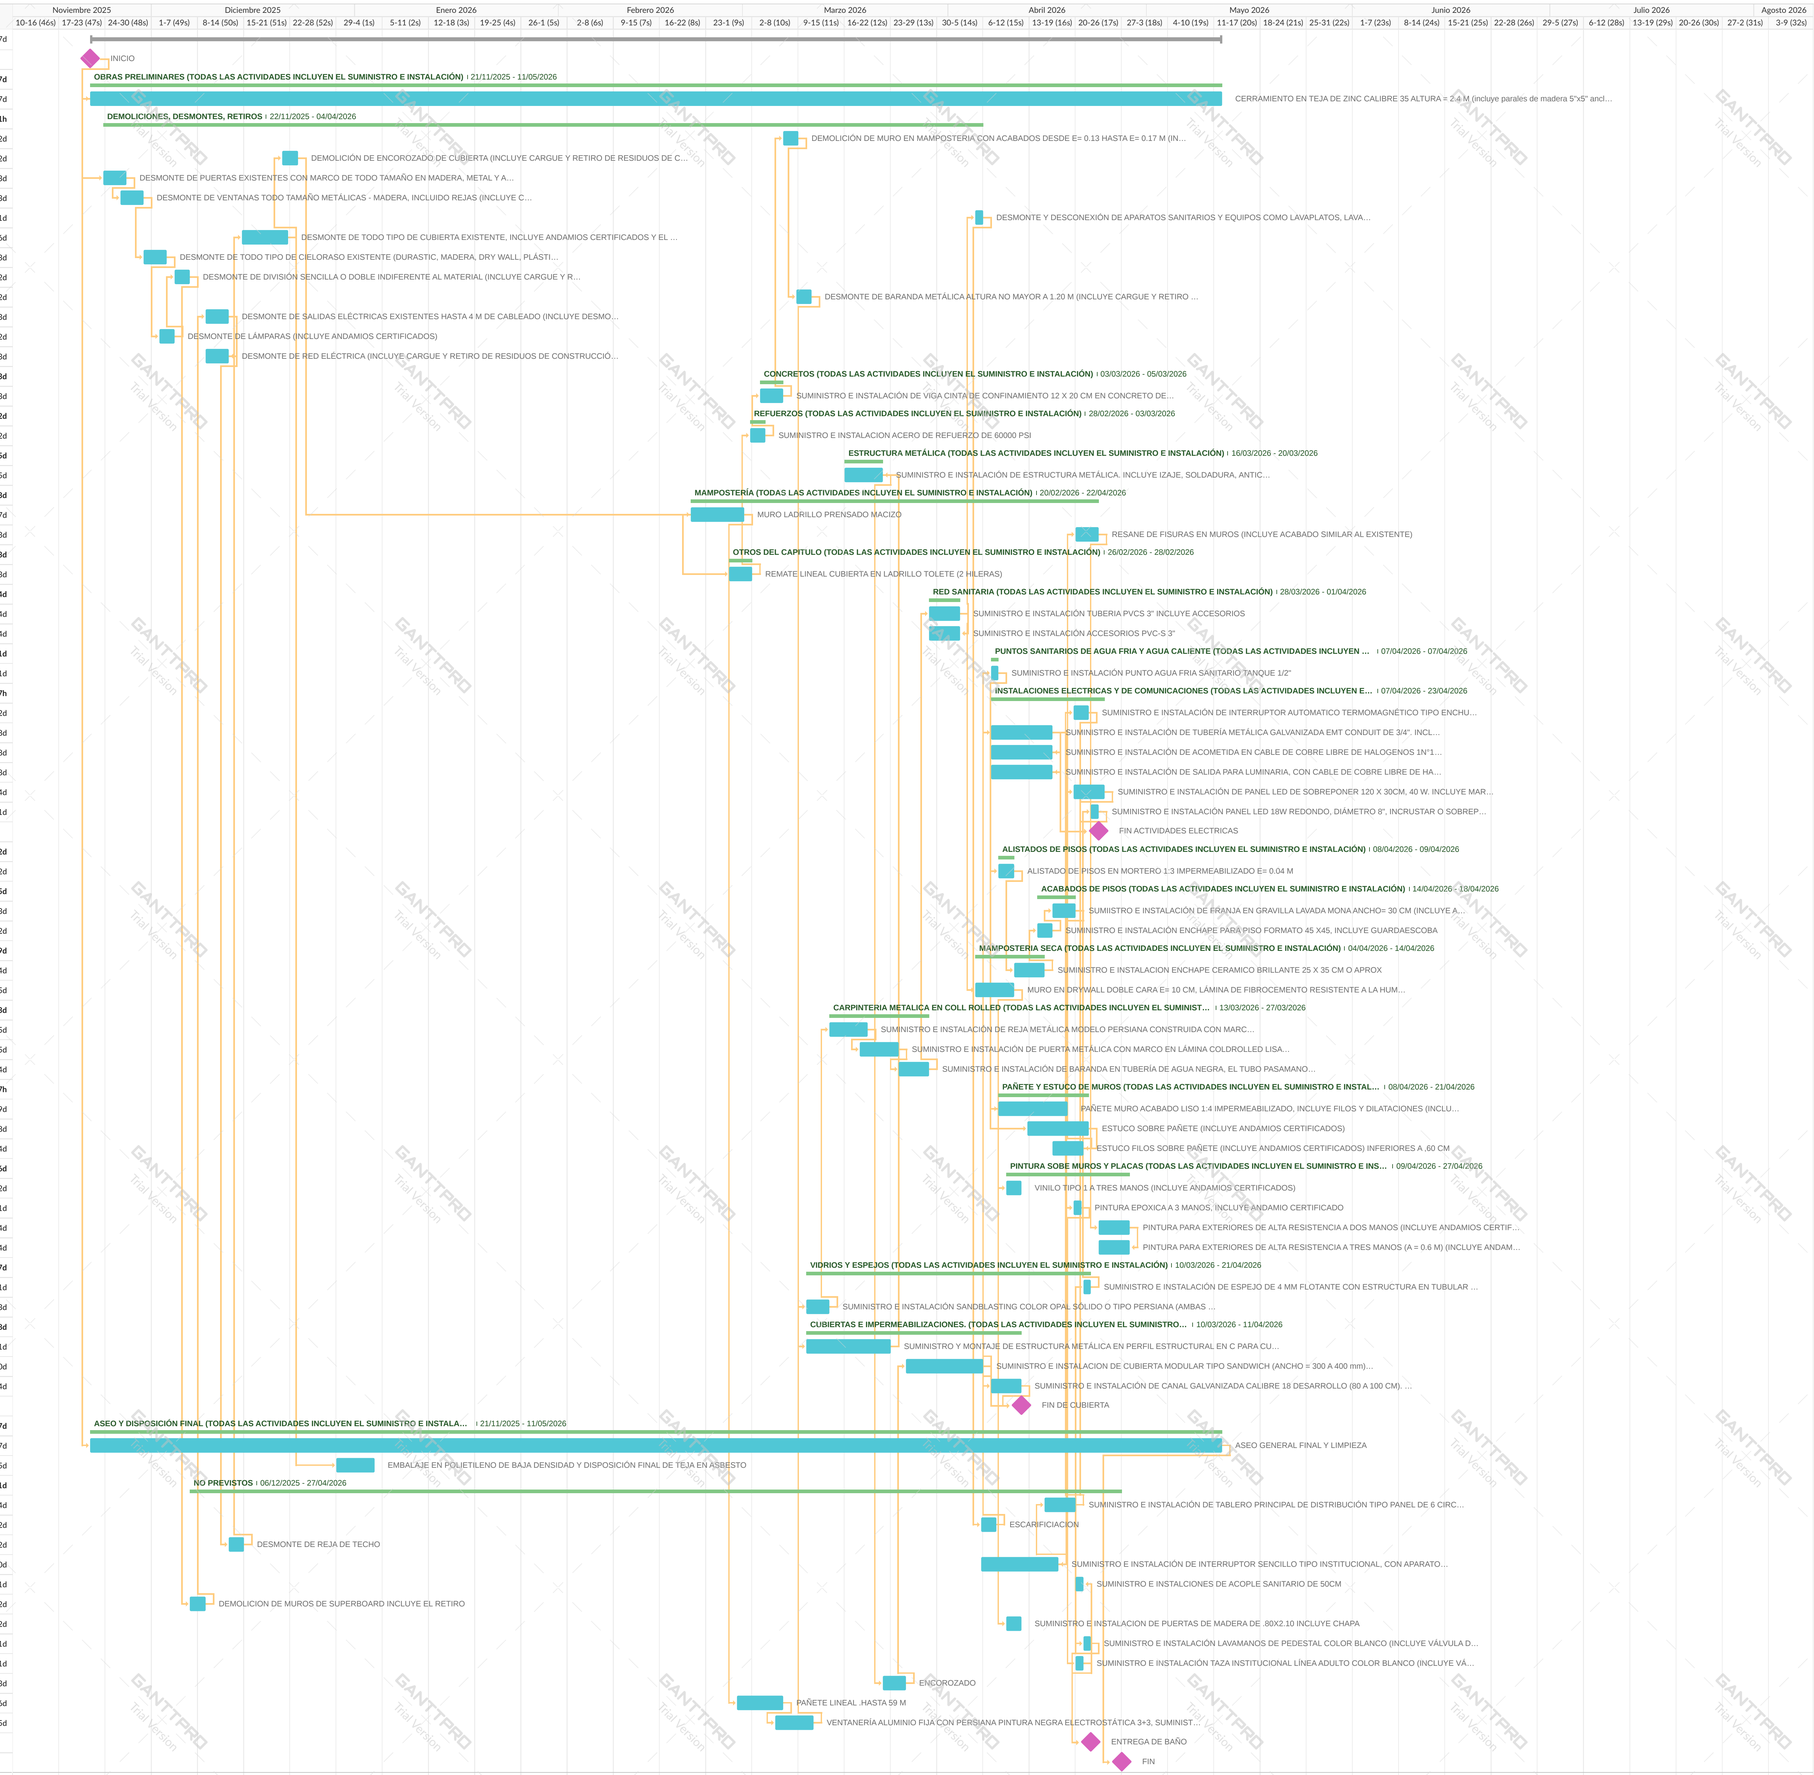

1073246437 | Programacion Colegio Cultura Popular - Sede C

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		13/11/2025	**24/01/2026**	63d
1	INICIO	13/11/2025	13/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/11/2025**	**24/01/2026**	**63d**
2.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplaz...	09/12/2025	09/12/2025	1d
2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	13/11/2025	24/01/2026	63d
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de i...	14/11/2025	14/11/2025	1d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**15/11/2025**	**11/12/2025**	**22d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ...	11/12/2025	11/12/2025	1d
3.2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA M...	18/11/2025	19/11/2025	2d
3.3	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FIN...	03/12/2025	03/12/2025	1d
3.4	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	02/12/2025	02/12/2025	1d
3.5	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAM...	01/12/2025	02/12/2025	2d
3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CAR...	15/11/2025	17/11/2025	1d
4	**MANTENIMIENTOS**	**16/01/2026**	**21/01/2026**	**5d**
4.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, ...	16/01/2026	21/01/2026	5d
4.2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	17/01/2026	20/01/2026	3d
5	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/12/2025**	**10/12/2025**	**1d**
5.1	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, C...	10/12/2025	10/12/2025	1d
6	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/12/2025**	**12/12/2025**	**1d**
6.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	12/12/2025	12/12/2025	1d
7	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/12/2025**	**18/12/2025**	**4d**
7.1	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJE...	16/12/2025	17/12/2025	2d
7.2	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	16/12/2025	18/12/2025	3d
7.3	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ...	15/12/2025	15/12/2025	1d
8	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/12/2025**	**15/12/2025**	**1d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	15/12/2025	15/12/2025	1d
9	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**22/12/2025**	**3d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABAD...	19/12/2025	22/12/2025	3d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/12/2025**	**29/12/2025**	**14d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	27/12/2025	29/12/2025	2d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	27/12/2025	29/12/2025	2d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	13/12/2025	15/12/2025	2d
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**13/12/2025**	**15/12/2025**	**2d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	13/12/2025	15/12/2025	2d
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/12/2025**	**30/12/2025**	**2d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	29/12/2025	30/12/2025	2d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/12/2025**	**30/12/2025**	**1d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	30/12/2025	30/12/2025	1d
14	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17/01/2026**	**17/01/2026**	**1d**
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	17/01/2026	17/01/2026	1d
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**21/01/2026**	**12d**
15.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) ...	08/01/2026	10/01/2026	3d
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	17/01/2026	20/01/2026	3d
15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	10/01/2026	19/01/2026	8d
15.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG ...	10/01/2026	14/01/2026	4d
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	10/01/2026	14/01/2026	4d
15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NEC...	17/01/2026	21/01/2026	4d
15.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PAR...	20/01/2026	20/01/2026	1d
16	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**09/01/2026**	**13d**
16.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	29/12/2025	30/12/2025	2d
16.2	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	26/12/2025	27/12/2025	2d
16.3	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	05/01/2026	09/01/2026	5d
17	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/12/2025**	**19/01/2026**	**34d**
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	02/01/2026	09/01/2026	7d
17.2	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	16/01/2026	19/01/2026	3d
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	10/01/2026	15/01/2026	5d
17.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PAR...	11/12/2025	13/12/2025	3d
18	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**05/01/2026**	**9d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	02/01/2026	05/01/2026	3d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA ...	26/12/2025	29/12/2025	3d
19	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**12/01/2026**	**2d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISA...	10/01/2026	12/01/2026	2d
19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON...	10/01/2026	12/01/2026	2d
20	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/12/2025**	**30/12/2025**	**1d**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	30/12/2025	30/12/2025	1d
21	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**16/01/2026**	**1d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	16/01/2026	16/01/2026	1d
21.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	16/01/2026	16/01/2026	1d
22	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**08/01/2026**	**17d 7h**
22.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	19/12/2025	24/12/2025	5d
22.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	19/12/2025	24/12/2025	5d
22.3	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	03/01/2026	08/01/2026	4d
22.4	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	03/01/2026	08/01/2026	4d
22.5	ENTREGA DE OBRA GRIS	08/01/2026	08/01/2026	
23	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**21/01/2026**	**12d**
23.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	20/01/2026	3d
23.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	17/01/2026	20/01/2026	3d
23.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	20/01/2026	20/01/2026	1d
23.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	21/01/2026	4d
23.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	21/01/2026	4d
23.6	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEM...	08/01/2026	09/01/2026	2d
23.7	ENTREGA DE OBRA BLANCA	21/01/2026	21/01/2026	
24	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/01/2026**	**16/01/2026**	**2d**
24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASIL...	15/01/2026	16/01/2026	2d
25	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**22/12/2025**	**21/01/2026**	**27d**
25.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	27/12/2025	27/12/2025	1d
25.2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFI...	16/01/2026	21/01/2026	5d
25.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	22/12/2025	24/12/2025	3d
25.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS ...	27/12/2025	30/12/2025	2d
25.5	ENTREGA DE CUBIERTA	21/01/2026	21/01/2026	
26	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/11/2025**	**24/01/2026**	**63d**
26.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	13/11/2025	24/01/2026	63d
26.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	15/01/2026	15/01/2026	1d
27	**NO PREVISTOS**	**14/11/2025**	**22/01/2026**	**59d**
27.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS PUERTA, BARRAJES DE NEU...	15/01/2026	16/01/2026	2d
27.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE...	10/01/2026	14/01/2026	4d
27.3	DESMONTE Y REINTALACION DE REJA DE CERRAMIENTO	10/12/2025	21/01/2026	36d 2h
27.4	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO	14/11/2025	14/11/2025	1d
27.5	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO	10/12/2025	10/12/2025	1d
27.6	CHAPA DE SEGURIDAD	13/01/2026	13/01/2026	1d
27.7	PUERTA DE REJA EN LA MALLA DE CERRAMIENTO	15/11/2025	15/11/2025	1d
27.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE GALLINERO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	13/12/2025	19/12/2025	5d
27.9	FIN	22/01/2026	22/01/2026	

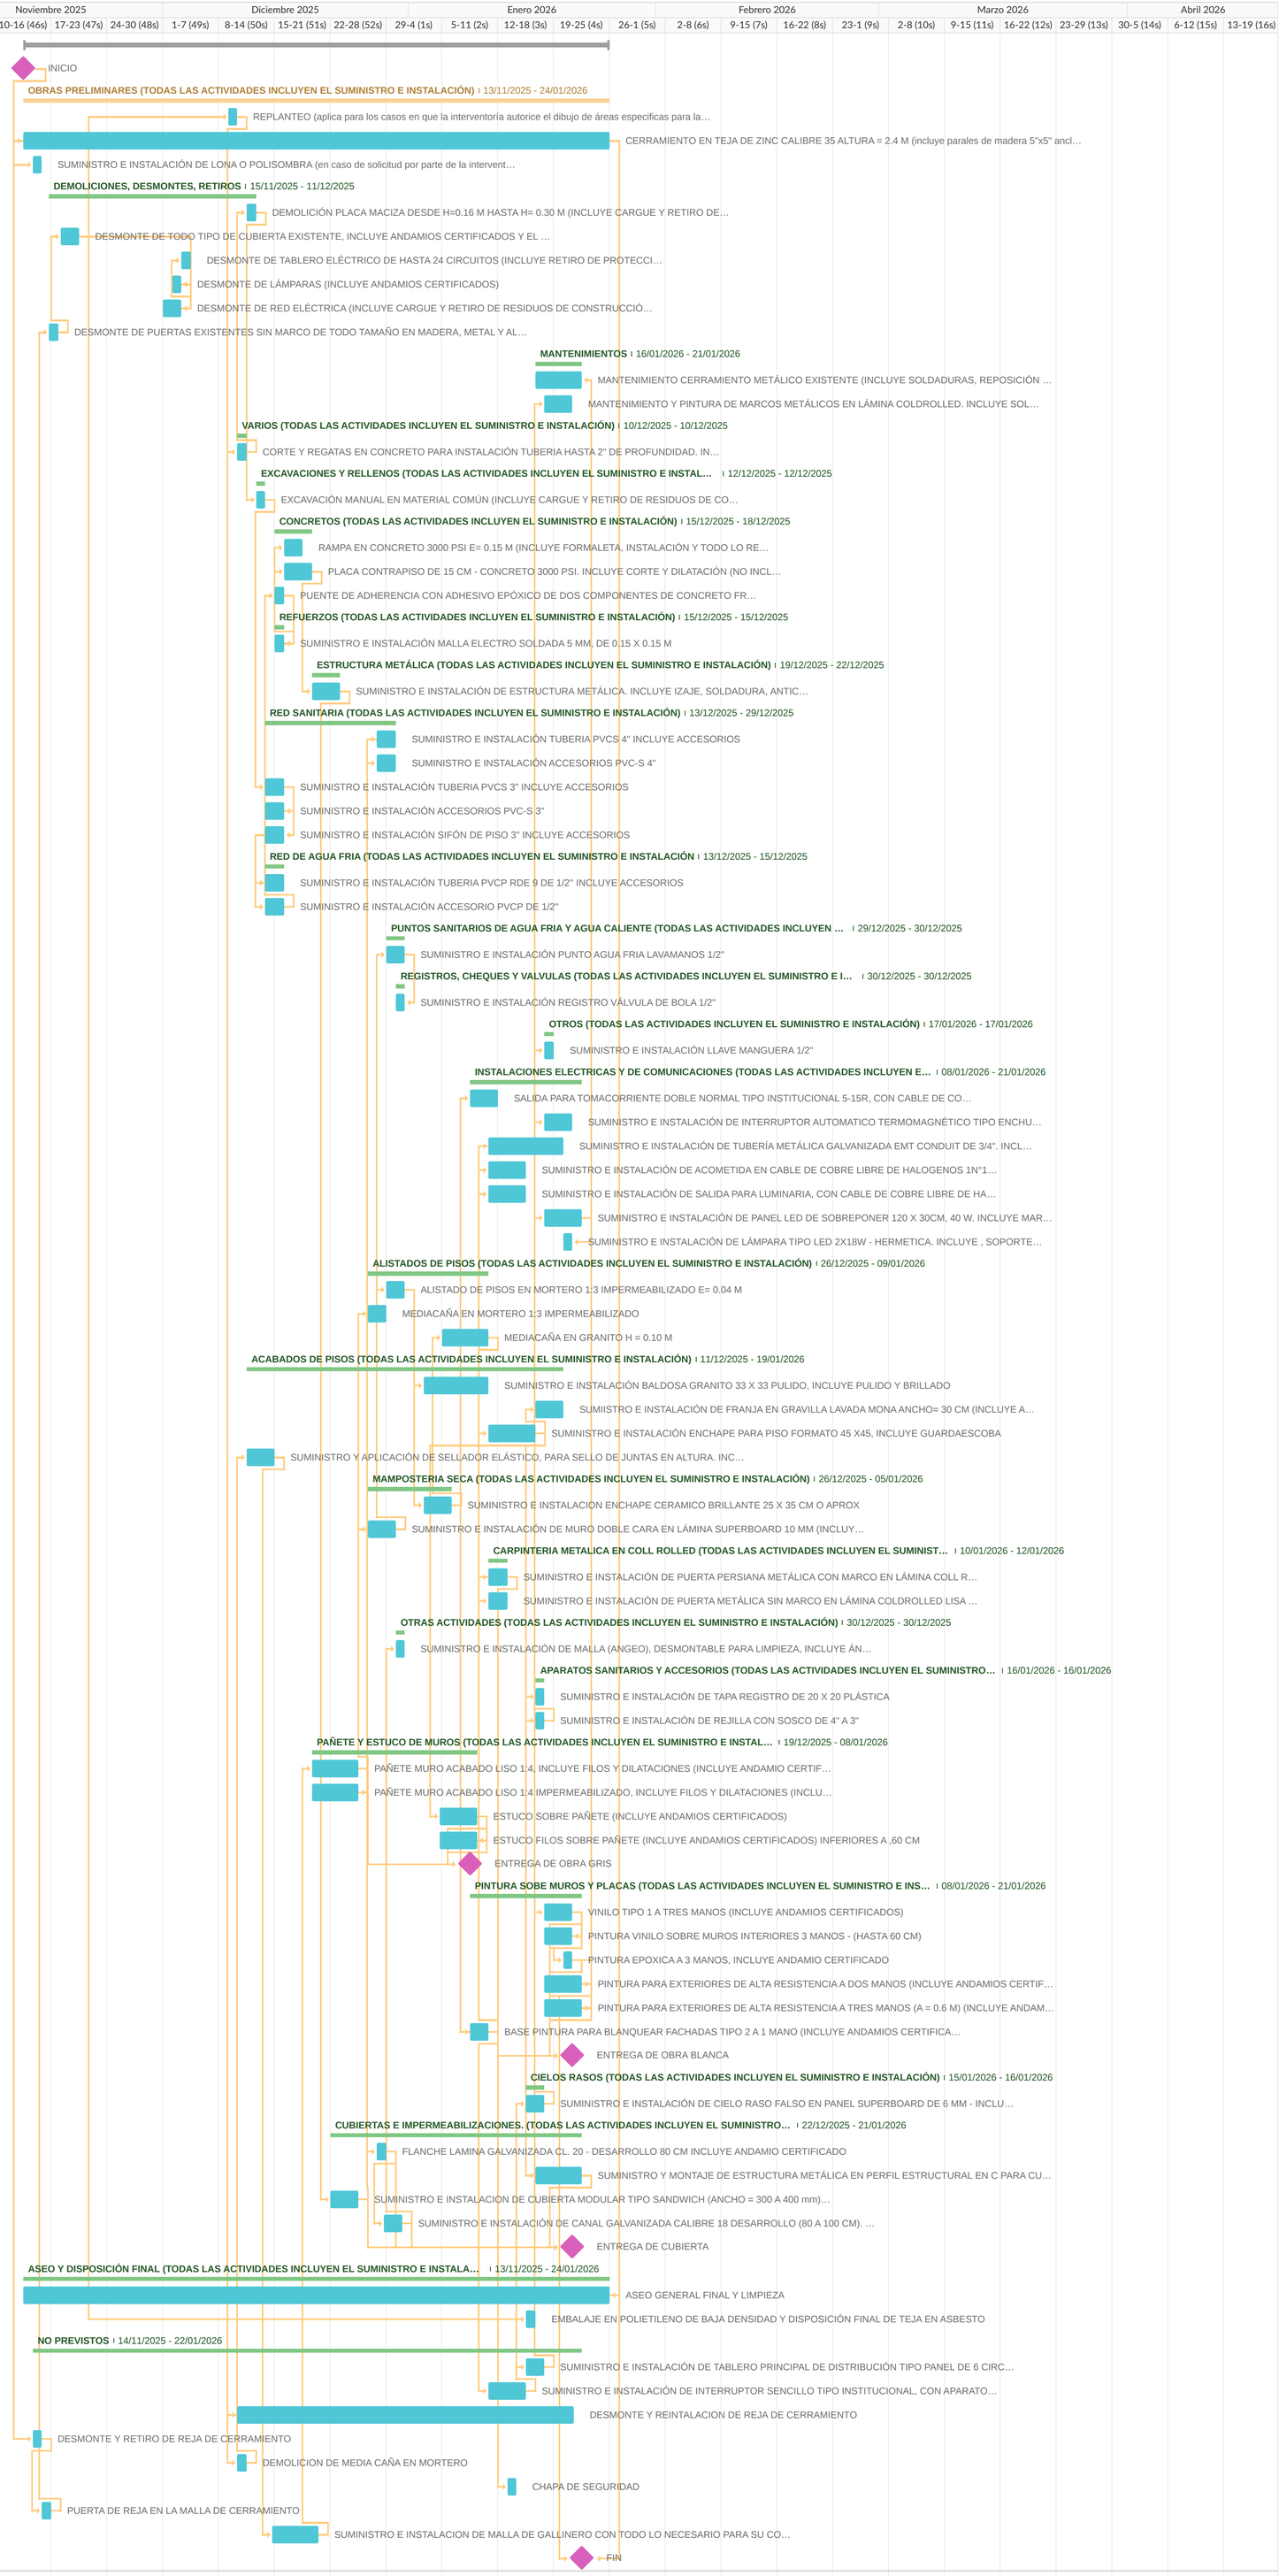

ANEXO 3

Contrato CO 1 PCCNTR 6155097.

Objeto. Adelantar obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Física de la Secretaría de Educación del Distrito. Así como la Ejecución de obras menores, que permiten a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, o garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en las sedes administrativas.

Interventoría: Provintec.

Contratista: Consorcio el Milagroso 2025
Nit 901973427-4.

Colegio Integrado de Fontibón.

Andrea Garzón
Residente Obra

Natalia María La Rotta
Residente de interventoría

7 Nov 025. Se inician actividades en el Colegio con el siguiente personal: ——
Darwin Nuñez. 1004912227 ——
Oswaldo Chapaco 79323582 ——
Se comienza labores en el area de la casona con el cerramiento. ——
Se realizan las capacitaciones al personal
Se comienzan labores a los 9am
llega material a obra 1:22 de la tarde
Madera Bolleca - Mixto - Cemento - teja de Zinc - Ponchillos - Durmientes ——
- Se realiza una verificación de las Areas del A intervenir y en el aula del Cil. se encuentra ocupado y realizan mención la interventoria que se desocupara el 18 de Nov. - Se deja la observación de la Canaleta el Rack y los cables que estan en el aula deben ser protegidos por la entidad ya que no se puede hacer la protección de esa canaleta y el Rack ya que son elementos sensibles y en el alcance no se encuentra y Por el cambio de la cubierta no se puede garantizar la proteccion.
Durante el dia hasta las 3:30pm Realizo un dia Soleado y a las 4pm Comienzo a llover se finalizan trabajos a las 4pm

Residente de interventoria: ——
Residente obra

8 Nov 025. Se inician actividades a las 7:00 am
se labora con dos personas Continuan con las actividades del Cerramiento ——
Darwin Nuñez 1004912227 ——
Oswaldo Chapaco 79323582 ——
El dia se encuentra Soleado - ——
Se finalizan actividades a las 12:30 pm.

Residente obra

7 Nov 025 Se inician actividades a las 7am.
10 Nov 025 Se Continuan las actividades de Cerramiento del Area del jardin. de la Casina.
Se labora Con 2 personas
Darwin Nunez 10049122-7
Alexander Salinas 79065545
Llueve sobre las 2pm. pero Se Continuan actividades. Se finalizan actividades a las 5pm.
Residente de interventoria.

11 Nov 025. Se inician actividades a las 7am.
Se Continuan actividades en el Cerramiento del jardin de la Casina.
Se labora Con 2 personas
Darwin. Nunez 10049122-7.
Alexander Salinas 79065545
Se Paran en los trabajos a espera de la teja para Continuar Con el Cerramiento
Se Cortan las hojas de la palmera que dan hacia el parqueadero ya que el almacenista informo que no habia problema
No llega la teja durante el dia. No se realizan mas actividades. Se retira el personal a las 5pm.
Residente de interventoria
2. obra

12 Nov 025: Se inician actividades las 8am
Personal en obra.
Darwin Nunez 10049122-7
Alexander Salinas 79065545
Llega la teja. Zinc. a las 10:00 am.
Se Continua Con la instalacion de la teja del Cerramiento del area del jardin
Llega el baño a la obra. Se coloca cerca a la garita de entrada de Vigilancia Sobre el Costado de La Avenida. Con Autorizacion del Cordinador de La manana.

Se labora con herramienta menor. Se finalizan actividades a las 5 pm.
Nota: A la fecha no se sabe aun como se va hacer el muro de contencion.
13 Nov 03: Se inician labores a las 7am
Personal en obra Darwin Nuñez 1004911227
Alexander Salinas 79065545
Se continua con el cerramiento del jardin de la casa se deja la observacion que el almacenista solicita que se le deje acceso al lado del cerramiento. Se debe definir porque la directriz es que el personal no deberia ingresar a ese sitio por el riesgo que existe de colapso de los muros
Se labora con herramienta menor.
Nota: a la fecha aún no se ha definido como se debe realizar el muro de contencion

Residente de interventoria

• Residente de interventoria: Se realiza escalamiento sobre el tema del muro de contencion.
-Se traslada personal por que va llover.
-llueve intermitente durante todo el dia
-Por lo cual no se pueden continuar con los trabajos. -El personal se traslada a las 10am:
Nota: llegan a la obra los estribos y la linea de vida
Se inician labores a las 7am.
Personal en obra Darwin Nuñez 1004911225
Omar Noreña 1024490993
Se continuan con los labores del cerramiento
llegan 3 accesos de andamio Catalogado a la obra. y 10 Arnes

-Se terminan labores hasta las 5pm.

R. Es obra

15-Nov 025 No se labora ya que no hay Autorizacion Para trabajos en Altura y lo unico que se puede ejecutar ya que el Salon del Cram lo desocupan hasta el 18 Nov 025

R. Obra.

16 Nov 025 No se labora dia Festivo R. Obra

17 Nov 025 No se labora dia Festivo R. Obra.

18 Nov 025 No se labora ya que No hay autorizacion para trabajar en altura y el Salon del Cram aun esta ocupado.

Se realiza visita delos funcionarios del OTIC. los Cuales. Se les manifiesta Sobre el Cableado que esta extendido Sobre la rejilla y la canaleta y el rack que esta en el Salon. ellos manifiestan que Solo tienen que ver Con un cable. el cual recogeran. y el rack por solicitud del rector se desconectara hasta el 1 de Dic. que ya no esta en funcionamiento el Colegio y se esta pendiente que Se desconecten el Sensor de alarma para que no haya algun daños en el momento de la intervencion

R. OBRA

19 Nov 025 Se inician actividades a las 8am Se labora con 2 trabajadores.


Darwin Nuñez 1004912225

Erika Vanegas Vanegas 1024490993

Se continua con labores de Ceramiento.

Herramienta menor. Nota - Aun no han desenergizado el area del Cram por direccion de la entidad y por Solicitud del Colegio el Rack lo pueden desmontar hasta el 1 Dic en el cual se.

Quedan citan hacer actividades se. —
Finalizan actividades a las 5pm. —



20 Nov 025 Se inician labores a las 7am. —
Personal en obra Darwin Nuñez 1004912275
Cimar Vanegas 1027490993. —
Se realiza el pinado de parte del andamio pero aun no hay autorizacion de los trabajos en alturas. Se retira el personal por que no se pueden realizar actividades llueve sobre las 2:30 de la tarde. —



21 Nov 025 Se inician actividades a las 8am.
Personal en obra. Darwin Nuñez 1004912275
Cimar Vanegas 1027490993.
Se comienzan a realiza trabajos en altura en la cubierta de la cavina. Se realiza la revision se encuentran unas tejas partidas y quebradas y bastantes hojas. Se comienza a realizar limpieza llegan a la obra 3 tejas 3 caballetes Se suspenden actividades en altura a las 2:37 - Comienza a llover. —
En el salon del cavin se realiza una inspeccion del piso ya que quieren el piso de caucho y se encuentra una tapa de inspeccion la cual da a una caja de inspeccion de al parecer de aguas lluvias y se identifica que en parte del piso no se encuentra losa. Se revisa con la interventoria y se debe realizar la losa donde haga falta y pegar el enchape. dejar la tapa de la caja de inspeccion marcada en la baldosa. Se recomienda por parte del

estructural en la cubierta. del Rem colocar en perfil en c las Apoyos necesarias para la Cubierta y platina en las Cochas existentes apuntadas al muro. Se finalizan actividades a. las 5:00 se terminan actividades y continua llaviendo

22 Nov 025. Se inician actividades a las 8 am.
Personal a obra Darwin Nuñez 100491225
Elmar Venegas 1024190993
Se trabaja en la cubierta limpiando y asegurando teja - La teja y los caballetes que llegaron no sirven para la cubierta ya que es un tipo de teja distinto y no es Comercial - Clima. Soleado Se finalizan actividades a Rem.

22 Nov 025 Dia festivo No se labora
23 Nov 025. No se labora falta de personal
24 Nov 025 No se labora. falta de personal.
25 Nov 025 No se labora falta de pasaje
26 Nov 025 Se inician labores a las 7am.
Personal en obra 2 personas
Darwin Nuñez 100491225 - Elmar Venegas 1024190993
Se trabaja limpiando la cubierta de la Casona. Se Comienza con el corte de la teja de la Casona. Se labora con herramienta manual y Pulidora. Se finalizan actividades a las 5 pm. Se labora con. dia soleado y ocaso

27 Nov 025 Se inician labores a la 7am.
Personal en obra 2 personas
Darwin Nuñez 100491225
Elmar Venegas 1024190993
Se Continua con las trabajos de Cubierta - realizando te arco - el corte de la teja y se le Colocara manto donde presente fuga la teja ya que debido a que la teja no es

Powered by CamScanner

Carácol y la media del roblon ya no se consigue. Se finalizan actividades a las 5pm.
12 obra.

28 Nov 25 Se inician labores a las 7am.
Se labora con 2 personal
Darwin Nuñez 1004491225
Eimar Banega 1024490993
Se continua la demolición del piso del Cein cerca al tablero para no afectar el rack mientras el Ing. de DE. lo requieren. Se observa solo el alistado del piso y el enchape no se ha encontrado loza. Clima amanece lloviendo - y por lo cual tampoco se pueden hacer actividades en altura - Se labora con herramienta menor.
- Se finalizan actividades a las 5pm.
12 obra.

29 Nov 25 Se inician labores a las 7am.
Se labora con 2 personal
Darwin Nuñez 1004491225.
Eimar Banega 1024490993
Se continua con la demolición de la loza del cuarto del cein - y se comienza hacer la reparación de las tejas que presentan fisura a la cajona. Se finalizan actividades a las 12:30
12 obra.

30 Nov 25 Dia festivo no se labora

1 Dic 25 No se labora por falta personal se esta realizando contingencia para que no pare mas que el frente quede sin actividades

2 Dic 25 Se inician actividades a las 8am. Se continua con la demolición del piso del Cein - Se labora con dos personas que han sacado el rack. mas la soldadura y unos muebles se labora con 2 personas
Darwin Nuñez 1004491225

Email. Vanegas 1024490993

3-Dic-025 Se inician labores a las 7am.
Se labora con 2personas
Darwin Nuñez 1004912225
Elmar Vanegas 1024490993
Se Continua con la demolición del piso del Crim y excavando escombro del area de trabajo - Se labora sin herramienta menor.
Clima: Soleado - Se finalizan actividades a las 5pm.

4-Dic-025 - Se inician labores a las 7am.
Se labora con 3 personas
Darwin Nuñez 1004912225
Edwin Chaparro 1013679750
Elmar Vanegas 1024490993
Se Continua con la demolicion del piso del Salon del CRIM - Se labora con herramienta menor Uno de los trabajadores se retiro por enfermedad - Se verifican niveles y para salir a piso con el paso de acceso se toma que bajar una parte y el tubo que se encuentra en el area -/- el clima Soleado Se realiza la reparacion del tubo de 3 pulgadas no se pudo identificar si esta en uso o de que es - el tubo se dejara en las mismas condiciones que se encontraba los niveles del piso para poder fundir la losa, toca rellenar en unas partes y en otras quitarlas - Se finalizan actividades a las 5pm.

5 Dic-025 - Se inician actividades a las 7am.
Se labora con dos personas
Edison Chaparro Vanegas 1024490993
- Anderson Rojas 1011322747.
Se Continua con el Alistamiento del Ka Aula.

del Ceim. se termina de retirar escombro y llega 1m³ de recebo a la obra - Se realiza la nivelación del piso pero los Archivadores que se encuentran en el aula del Ceim no permiten terminar de nivelar. el piso se Comienza a dañar el piso del ande de la Cocina. Se finalizan actividades a las 5pm

R. Cobea

6 DIC 025. Se inician actividades a las 7:30am Se labora con dos personas
Edwin chaparro Vanegas 1024490993
Anderson Rojas 1011322747
Se continua con la demolición de la losa del Ande de la Cocina se finalizan actividades a las 12:30am.

R. COBEA

7 DIC 025 No se labora Dia festivo
8 DIC 025 No se labora Dia festivo
9 DIC 025 Se inician actividades a las 7:30am se labora con 1 persona
Anderson Rojas 1011322747.
Se Nivela piso en el salon del Ceim hasta donde los Archivadores lo permiten
Nota: En el Ande de la cocina se encuentra una Losa Recebo y otra Losa. Losa Recebo Losa
Se comienza la limpieza del Recebo. Se finalizan actividades a las 5pm

R. Cobea.

10. DIC 025 Se inician actividades a las 7:30 am
Se labora con dos personas
Edwin chaparro Vanegas 1024490993
Anderson Rojas 1011322747.
Se Continua con la nivelacion del Piso del Ceim. Sobre el medio dia Comienzan a retirar los Archivadores llega material a la

obra el Cemento- La Arena- y malla electrosoldada
Se realiza el traslado hasta Coca al Salon del
Ceim -Se retiran una seccion de andamio del Colegio
Se finalizan actividades a las 5pm.

11 Dic 025- Se inician actividades a las 7am
Se labora con 2 personas
Edison Chaparro Vanegas 1024490993
Anderson Rojas 1011322747
-Se comienza con la ~~demolicion~~ instalacion de la
malla en el Salon del Ceim y la limpieza de la
losa que se demolio se retira en viaje de
escombro- Se consulta a la interventoria Si se debe
demolo el otro pedo o se va fundir sobre la
que esta- quedamos a espera de la respuesta,
y lo mismo para definir si con la demolicion
de la losa interior se hace necesario quitar los
muros Se finalizan actividades a las 4pm
llega el trompo a obra-

12 Dic 025 Se inician actividades a las 7am
Se labora con 3 personas
Edison Chaparro Vanegas 1024490993
Anderson Rojas 1011322747.
YADEL Hadley Herrera Lanza 1024568120
Se comienza la fundida del piso del Salon de
Ceil. Se espera la respuesta de la interventoria
definir lo del orden del la Cortina y la
autorizacion del esquema de los apoyos del
mismo sector.
el clima es apoco
-Se comienza la fundida del Salon de Ceim.
Se labora hasta las 5pm.

13 Dic 025 Se inician actividades a las 7am
Se labora con 3 personas
Edison Chaparro Vanegas 1024490993
Anderson Rojas 1011322747

Yadeht Hadley Herrera Ibarra 1024568120
Se inician labores a las 7am. Se Continua Con la fundida de la losa de ceim se finalizan actividades a 8am - Se labora Con el trompo - y herramienta menor.

14-12-25 Dia Festivo - No se labora.

15-12-25 Se espera material - llega tarde por lo Cual no se labora - llega mixto y Cemento

16-12-25 Se inician actividades a las 7am.
Se labora Con dos personas
Edyon Chaparro Vanegas 1024490993
Anderson Rojas 1011322747
Se termina de fundir la losa del piso del Ceim. - Se labora Con el trompo y Herramienta menor - Se clima Nivelado

BITACORA Colegio Antonio Vinn. Nden

Objeto
Contrato de obra CO1-PCCNTR8155097

Adelantar obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas de la Secretaria de educacion del distrito. asi como la ejecucion de obras menores que permitan a traves de la atencion de emergencias y de necesidades fisicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestacion del servicio de la infraestructura fisica en los colegios distritales y las sedes Administrativas - lote 6

Contratista Consorcio el Milagro 2025
Nit 901.973.427-4

Interventoria: PROINTEC. SAS
Nit:

Residente Obra

18-11-025 Se inician actividades. Se labora con 2 personas.
José Colmenares Matias 79270265
Andres Felipe Ortiz
Llega material a la obra cenizas Rollizos Cemento mixto - tejas - Andamios
- Se comienza a labrar a las 8am.
Se comienza a realizar el cerramiento en baños y aulas
- Se labora con herramienta menor se finalizan actividades a las 5pm.

19-11-025 Se inician actividades a las 7am: Se Continua con el cerramiento del area del baño y de las Aulas - Biblioteca.
Se labora con 3 personas
José Colmenares Matias 79270265
Andres Felipe Ortiz
Pedro Felipe Buitrago Muñoz. 1033790393
Se comienza con la demolición del baño. Nota en los salones de biblioteca aún están retirando elementos - El clima el Soleado
Se demonta la Reja, lavamanos - sanitarios Ovalet Restos de divisiones - lamparas -
Se demuelen muros. Se finalizan actividades a las 5pm.

20-11-025 Se inician actividades a las 7am.
Se labora con 2 personas.
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393
Jose Osvaldo Chaparro Ariza. 79323502
Se Continua con la demolición del area de los baños. Desmontando aparatos y demoliendo muros. el clima Soleado
Se labora con herramienta menor. -
Llegan loras. a la obra. Se Continua con el retiro de escombros del area de

trabajo se finalizan actividades a las 5pm

21-11-025- Se inician labores a las 7am
Se labora con dos personal
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393
Jose Oswaldo Chaparro Roza 79323502
Se continua con las demoliciones del bano
Muros- enchapes - desmonte de puertas.
Nota- Aun no se han desocupado el area de los autos del bloque principal- y se es necesario desmontar ventanas para continuar con las otras actividades y poder mandar a fabricacion los numeros
Se labora con herramienta menor
En una reunion con la interventoria Director y el especialista estructural- manifiestan que se deben dejar confinados los muros del area del bano con una columneta de concreto segun planos y anclalo a la viga existente.
Se finalizan actividades a las 5pm
llueve en las horas de la tarde.

22-11-025 Se inician actividades a las 7am se labora con dos personas
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393
Jose Oswaldo Chaparro Roza 79323502
Se continua con las demoliciones del area de los baños y retirando el escombro del area de trabajo - Se labora con herramienta manual - clima soleado. Se finalizan actividades a las 12pm

23-11-025- Se. No se labora Dia festivo
