


4.4.3.10. SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)

Se realiza esta actividad para el suministro y aplicación de pintura epóxica base agua en tres (3) manos, sobre superficies y muros en carteras, culatas, columnas y vigas, desde 0,61 m hasta 1,30 m de altura, incluyendo el uso de andamios certificados y las herramientas e implementos necesarios para la aplicación y limpieza, en los baños del bloque A (1) pisos 1, 2 y 3; baños del bloque B (2) pisos 1 y 2; baños del bloque C (3) pisos 1, 2 y 3; ludoteca; y baño del comedor o aula múltiple; durante este periodo se ejecutó un área total de 226,94 m².

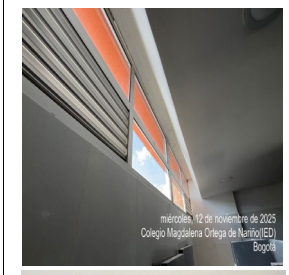





BAÑO BLOQUE A(1)- PISO 1

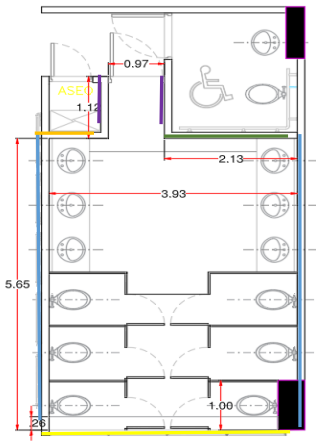

BAÑO BLOQUE A(1)- PISO 2




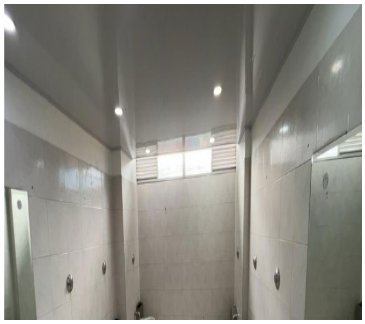


NOTA: LAS DIMENSIONES DEL ESQUEMA ESTAN METROS

BLOQUE A(1)- PISO 3






BAÑO BLOQUE B(2)- PISO 1




NOTA: LAS DIMENSIONES DEL ESQUEMA ESTAN METROS

BAÑO BLOQUE B(2)- PISO 2





BAÑO BLOQUE C(3)- PISO 1







NOTA: LAS DIMENSIONES DEL ESQUEMA ESTAN METROS

BAÑO BLOQUE C(3)- PISO 2






BAÑO BLOQUE C(3)- PISO 3






Ludoteca





BAÑO COMEDOR O AULA MULTIPLE





4.4.4. Institución Educativa Colegio Tecnico Jose de Caldas Sede C



Ilustración 7 Planta Ubicación Institución Educativa Colegio Tecnico Jose de Caldas Sede C.


4.4.4.1. DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).

Se realiza esta actividad para la demolición de alistado de piso con espesor entre 0,04 m y 0,06 m, incluyendo el cargue y retiro de los residuos de construcción a sitios debidamente autorizados, en el *shut* de basura y en el área de la puerta correspondiente; durante este periodo se ejecutó un área total de 3,13 m².




4.4.4.2. DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).

Se ejecuta la actividad de demolición de muros en mampostería con acabados, con espesores entre E = 0,13 m y E = 0,17 m, incluyendo el cargue y retiro de los residuos de construcción a sitios debidamente autorizados, en las áreas del *shut* de basura y puerta. Se aclara que el área total ejecutada de 15,05 m².

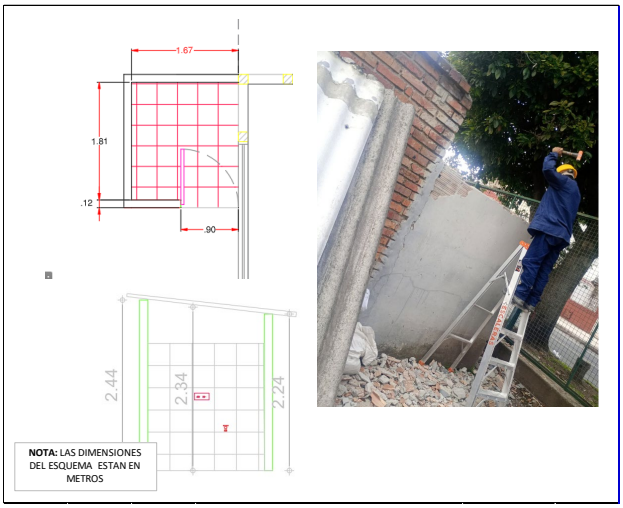

4.4.4.3. DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).

Se ejecuta la actividad de demolición de enchape de muros y pega, incluyendo el cargue y retiro de los residuos de construcción a sitios debidamente autorizados, en las áreas del *shut* de basura y puerta; durante este periodo se ejecutó un área total de 10,73 m².

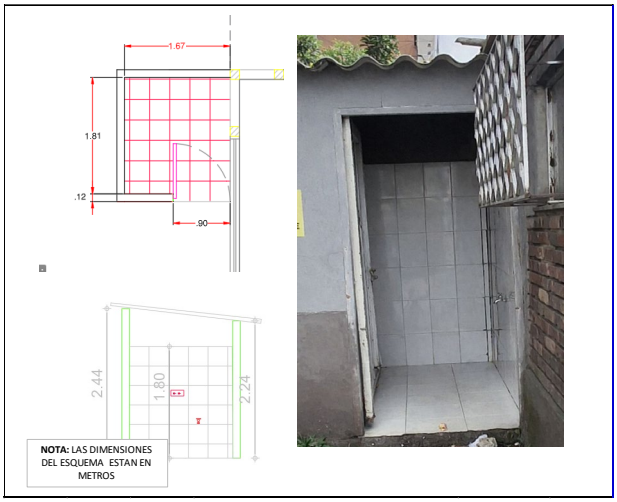

4.4.4.4. DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).

Se ejecuta esta actividad contempla la construcción del cerramiento perimetral preliminar para aislar las obras a realizar en la zona de Cárcamo y en la zona de los salones, del resto de la institución y el punto de acopio, durante este periodo se ejecutó 120.90metros lineales.




4.4.4.5. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

Se ejecuta la actividad de desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluyendo andamios certificados, el desmonte de la estructura metálica o de madera, amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes, así como el cargue y retiro de los residuos de construcción a sitios debidamente autorizados, en el área del shut de basuras; durante este periodo se ejecutó un área total de 4,66 m².




4.4.4.6. DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

Se ejecuta la actividad de desmonte de salidas eléctricas existentes hasta 4 m de cableado, incluyendo el desmonte de tuberías, cableado y aparatos, así como el retiro de los residuos de construcción a sitios debidamente autorizados, en el *shut* de basura; durante este periodo se ejecutó un total de 2 unidades.

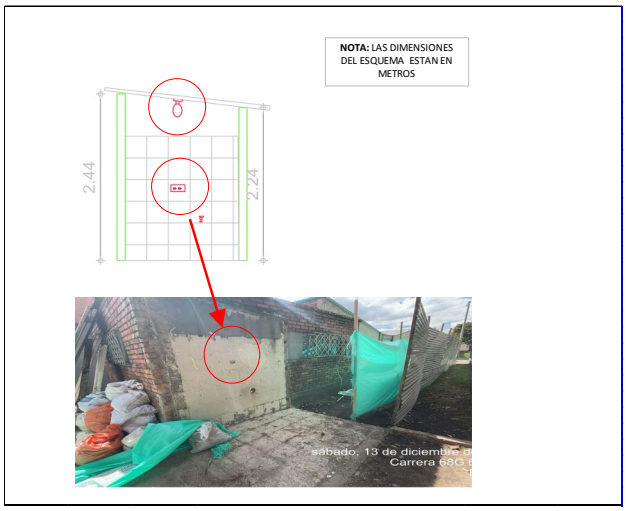


4.4.4.7. DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

Se ejecuta la actividad de demolición de pisos en baldosa vibroprensada grano mármol de 30 × 30 cm, incluyendo el cargue y retiro de los residuos de construcción a sitios debidamente autorizados, en el *shut* de basura y en el área de la puerta; durante este periodo se ejecutó un área total de 3,13 m².

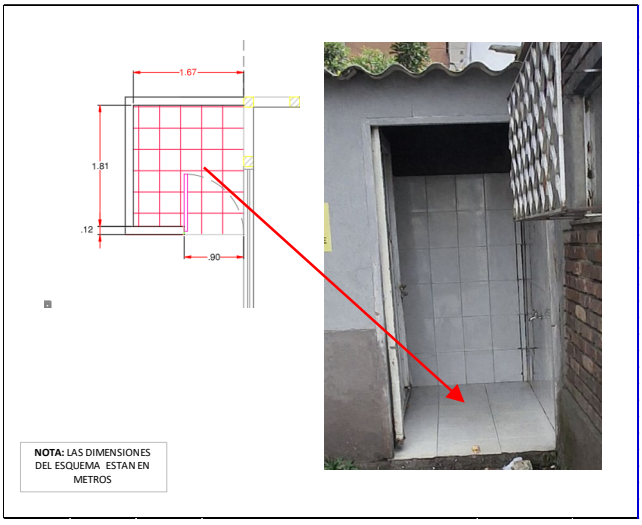

4.4.4.8. DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)

Se ejecuta la actividad de desmonte de griferías existentes incrustadas en muro, tipo lavamanos o urinarios corridos, incluyendo el retiro de las mismas, en el shut de basura; durante este periodo se ejecutó un total de 1 unidad.

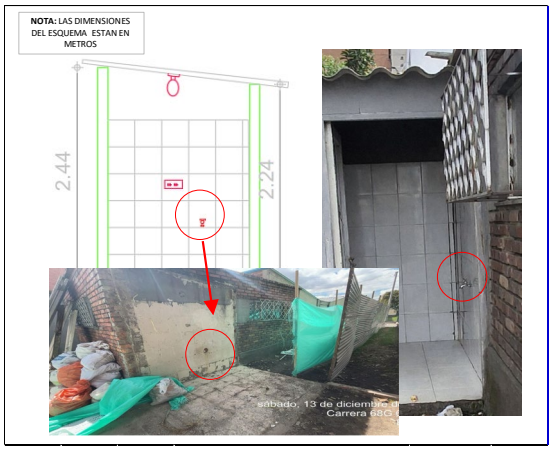

4.4.4.9. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)

Se ejecuta la actividad de mantenimiento de cerramiento metálico existente, incluyendo soldaduras, reposición de elementos en mal estado, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte de acabado, en los cerramientos Oriente, Occidente y Sur; durante este periodo se ejecutó un total de 263,02 m².




4.4.4.10. SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS

Se ejecuta la actividad de sondeo de unidades sanitarias, incluyendo el desmonte y montaje de aparatos, en los baños de los pisos 1.




4.4.4.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"

Se ejecuta la actividad de suministro e instalación de divisiones para baño institucional, compuestas por puertas y paneles en acero inoxidable tipo 304 antiácido, calibre 20, con entamborado de 1”, en las áreas correspondientes; durante este periodo se ejecutó un área total de 1,71 m².

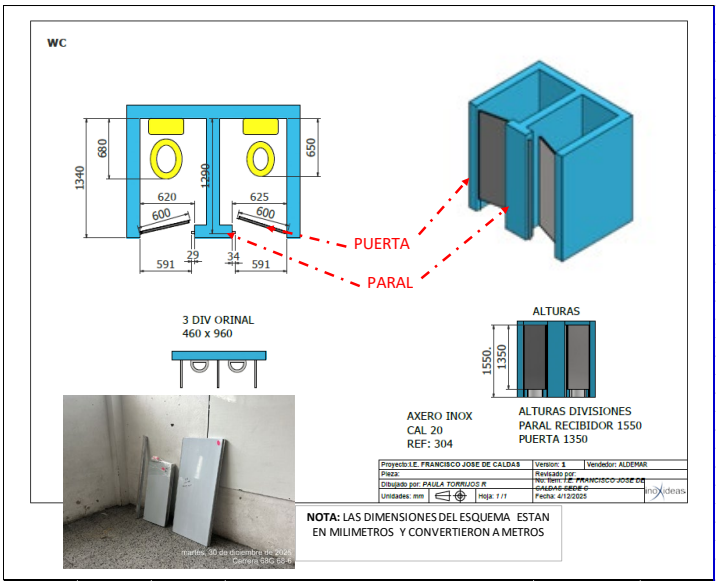

4.4.4.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL

Se ejecuta la actividad de suministro e instalación de división para baño en acero inoxidable, calibre **20**, destinada para orinal, en los baños de hombres de los pisos 1, 2 y 3; durante este periodo se ejecutó un área total de 1,32 m².

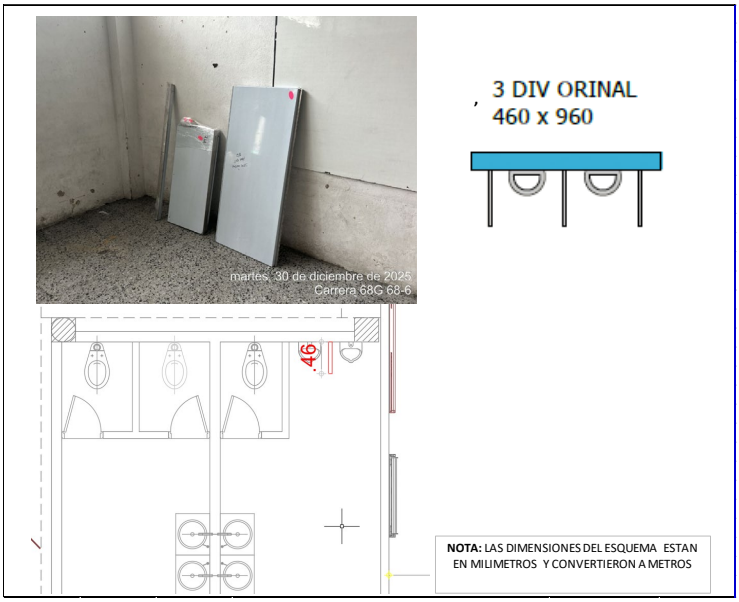

4.4.5. Institución Educativa Colegio Rodolfo Llinás sede B:


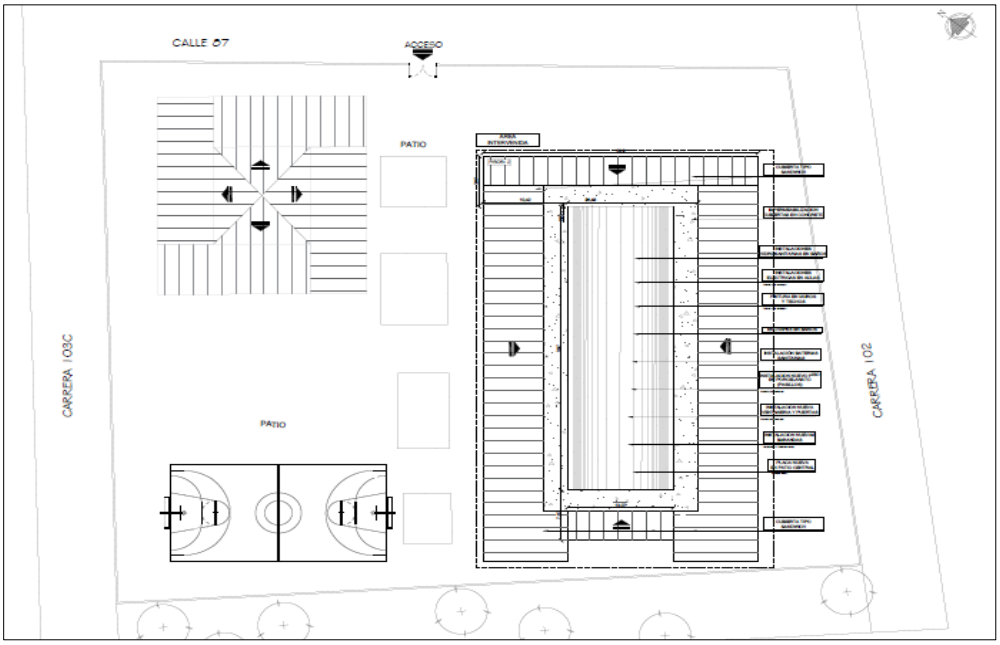


Ilustración 8 Planta Ubicación Institución Educativa Colegio Rodolfo Llinas Sede B.


4.4.5.1. CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).

Se ejecuta la actividad de instalación de cerramiento en lona, incluyendo parales de madera de 5" × 5" anclados al suelo según la necesidad y amarres con alambre negro No. 18, con una altura de 2 m, para la ampliación de cerramiento destinada al acopio de materiales; durante este periodo se ejecutó una longitud total de 12 m.

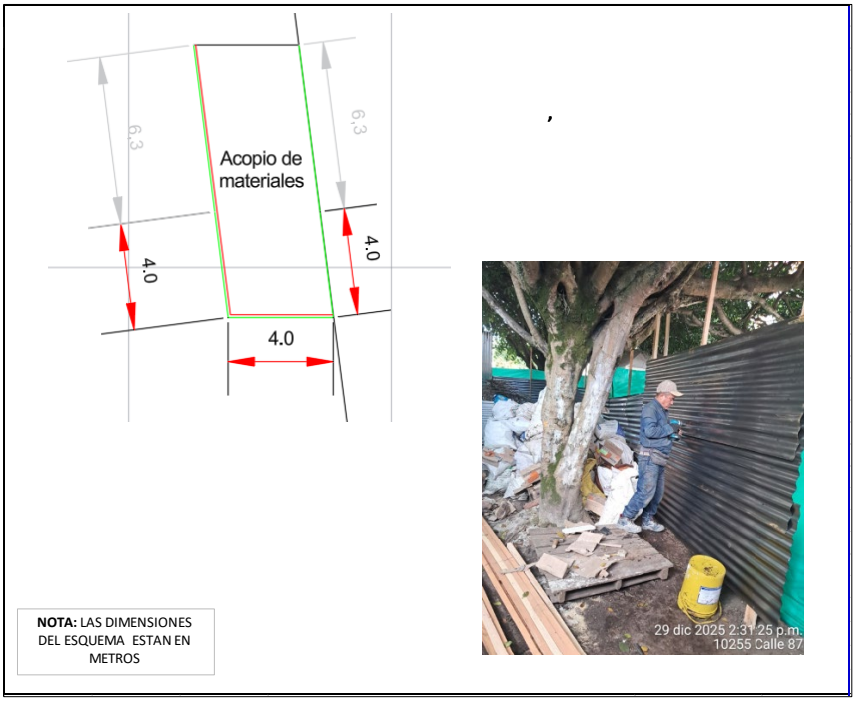


4.4.5.2. <u>CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").</u>

Se ejecuta la actividad de instalación de cerramiento en teja de zinc calibre 35, con altura de 2,4 m, incluyendo parales de madera de 5" × 5" anclados al suelo según la necesidad y amarres con tornillo drywall de 1 ½", en los cerramientos Carcamo Oriente faltante, Norte, Carcamo Sur, jardín Sur y Oriente; durante este periodo se ejecutó una longitud total de 78,02 m.

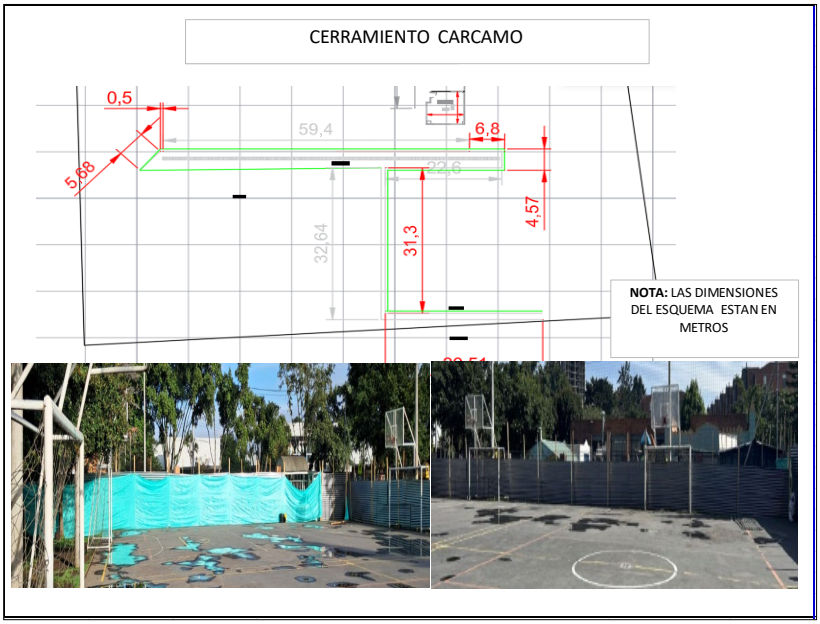


4.4.5.3. <u>DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)</u>

Se ejecuta la actividad de demolición de placa maciza, con espesor entre 0,08 m y 0,10 m, incluyendo el cargue y retiro de los residuos de construcción a sitios debidamente autorizados, en la placa del carcamo; durante este periodo se ejecutó un área total de 39,12 m².

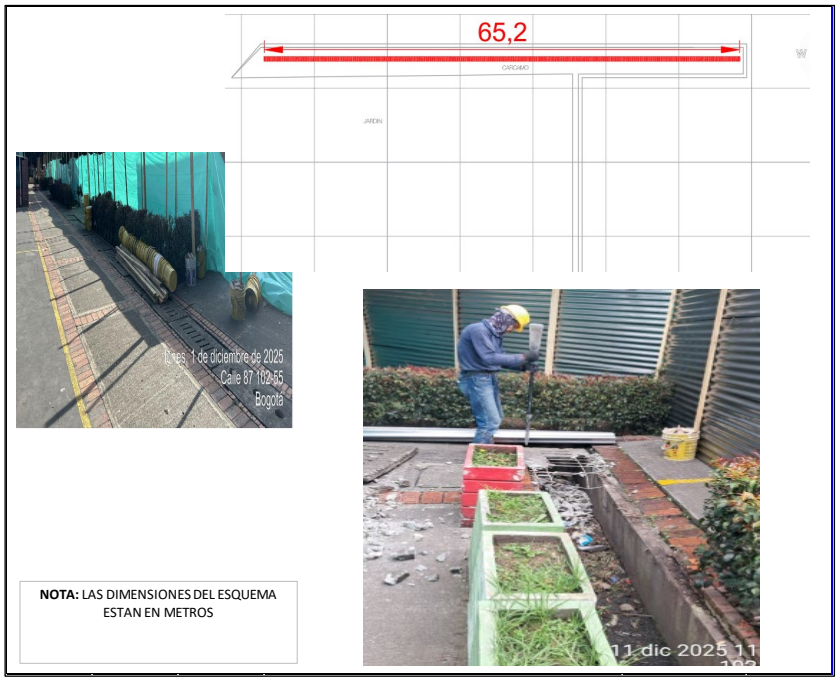


4.4.5.4. DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

Se ejecuta la actividad de demolición de alistado de piso con espesor entre 0,04 m y 0,06 m, incluyendo el cargue y retiro de los residuos de construcción a sitios debidamente autorizados, en el área del *carcamo*; durante este periodo se ejecutó un área total de 31,30 m².

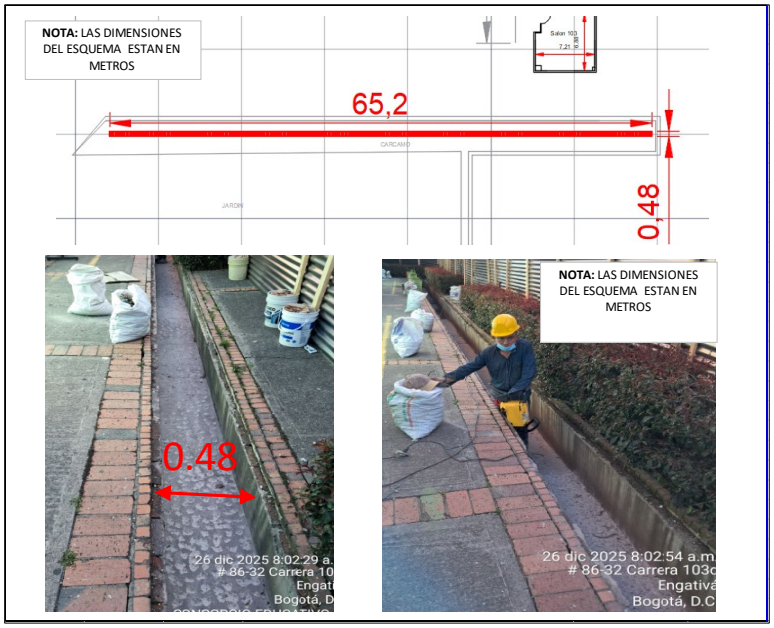


4.4.5.5. DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)

Se ejecuta la actividad de demolición de pañete lineal en columnas y vigas existentes, de ancho menor a 0,50 m (por las 4 caras), incluyendo el cargue y retiro de los residuos de construcción a sitios debidamente autorizados y el uso de andamios certificados, en el área del carcamo; durante este periodo se ejecutó un total de 131,60 ml.

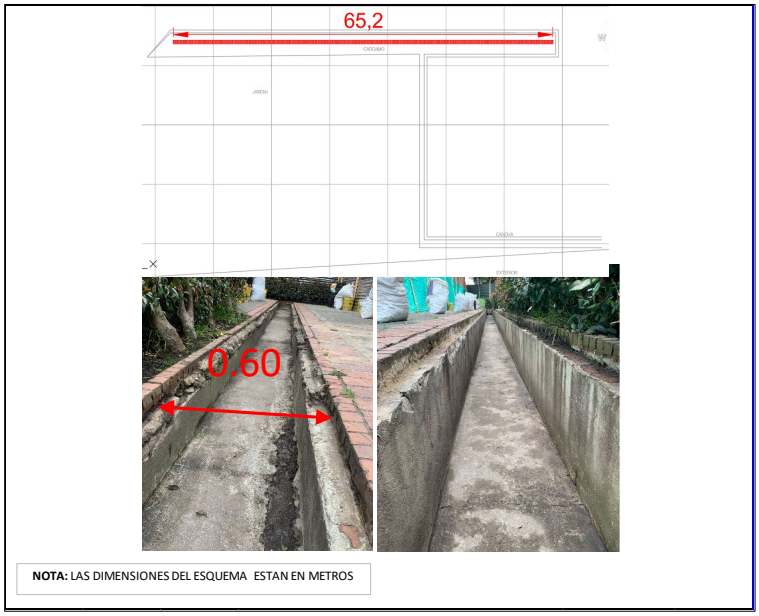

4.4.5.6. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)

Se ejecuta la actividad de mantenimiento de cerramiento metálico existente, incluyendo soldaduras, reposición de elementos en mal estado, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte de acabado, en el cerramiento perimetral del jardín, cerramiento de la cancha y vía, puerta del cerramiento de la cancha; durante este periodo se ejecutó un área total de 99,58 m².

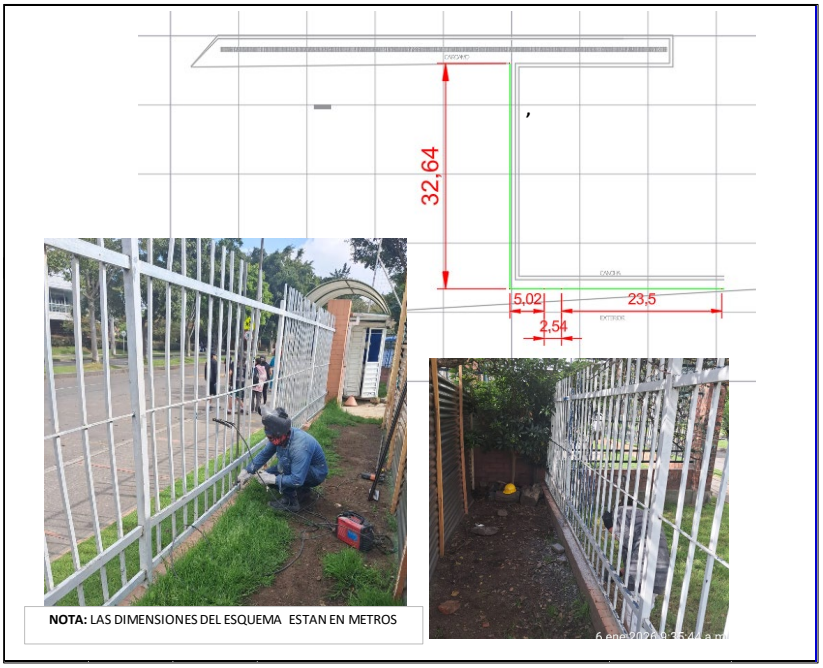

4.4.5.7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)

Se ejecuta la actividad de limpieza y mantenimiento a cárcamo, incluyendo el desmonte y montaje de rejilla, limpieza, retiro y disposición de material sobrante, así como resane de grietas y bordes, en el área del carcamo; durante este periodo se ejecutó una longitud total de 65,20 m.




4.4.5.8. TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS

Se ejecuta la actividad de trasiego con carretilla, únicamente para proyectos especiales avalados por la interventoría, a una distancia superior a 20 metros, incluyendo el movimiento de placa desmontada, alistado y vibroprensado de los salones 101, 102 y 103, así como material para placa de piso en el *carcamo* en concreto; durante este periodo se ejecutó un total de 23,95 m³.




4.4.5.9. CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

Se ejecuta la actividad de corte en concreto con pulidora, con espesor entre **2 y 5** cm, incluyendo el cargue y retiro de los residuos de construcción a sitios debidamente autorizados, en el área del *carcamo*; durante este periodo se ejecutó un total de 16,80 m.

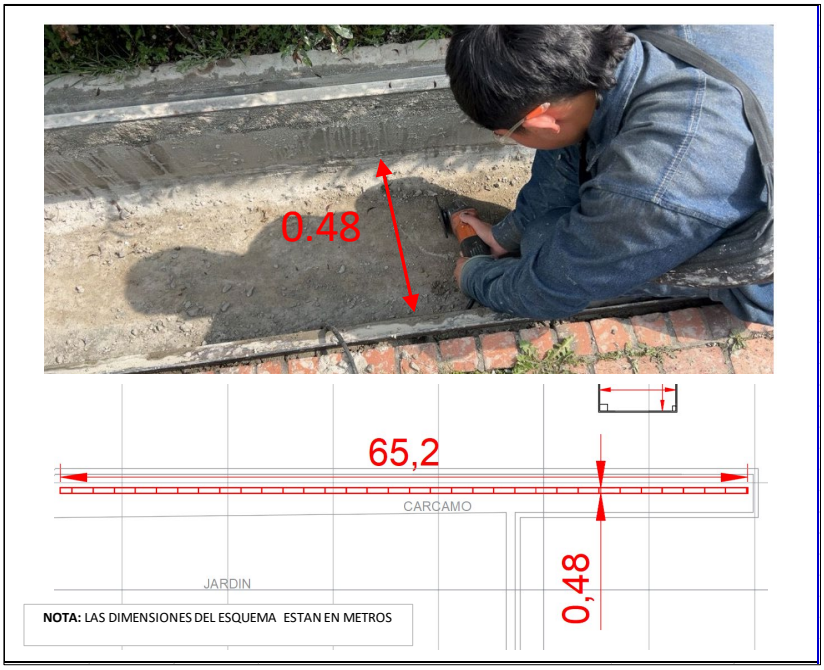


4.4.5.10. PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.

Se ejecuta la actividad de construcción de placa de contrapiso de 10 cm de espesor, en concreto de 3.000 PSI, incluyendo corte y dilatación, en el área del carcamo; durante este periodo se ejecutó un área total de 31,30 m².

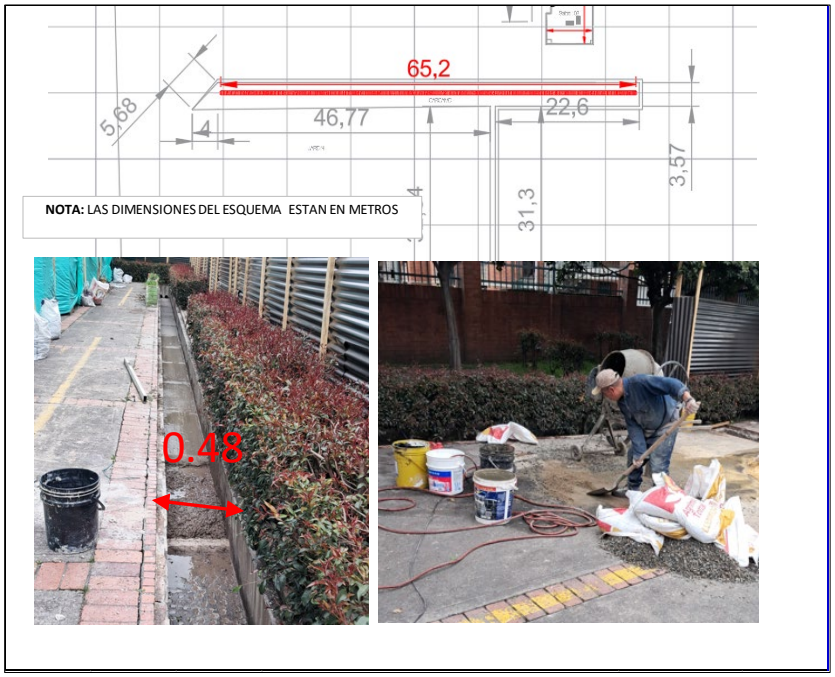

4.4.5.11. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04

Se ejecuta la actividad de alistado de pisos en mortero con proporción 1:3 y espesor de 0,04 m, en los salones 110, 101 y 102; durante este periodo se ejecutó un área total de 138,02 m².

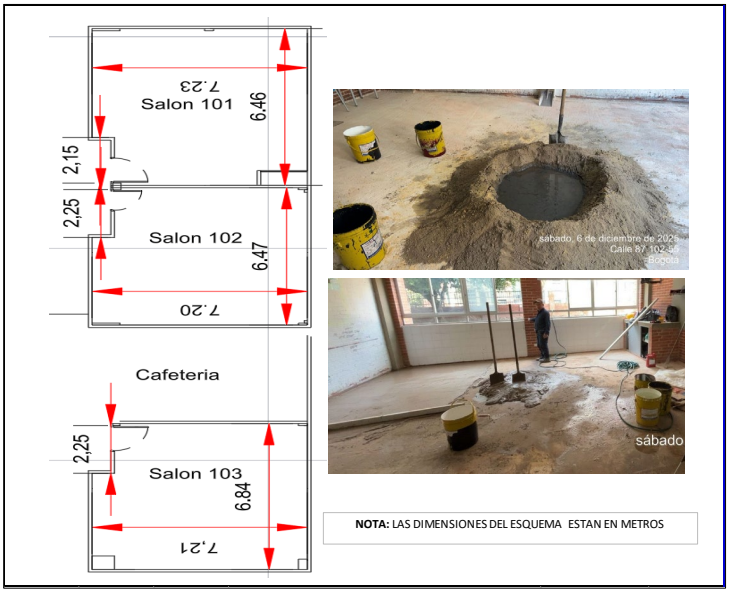


4.4.5.12. MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

Se ejecuta la actividad de construcción de mediacaña en mortero con proporción 1:3, impermeabilizado, en el área del carcamo; durante este periodo se ejecutó una longitud total de 131,36 m.




4.4.5.13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO

Se ejecuta la actividad de suministro e instalación de baldosa de granito 33 × 33 cm, incluyendo pulido y brillado, en los salones 110, 101 y 102; durante este periodo se ejecutó un área total de 138,02 m².

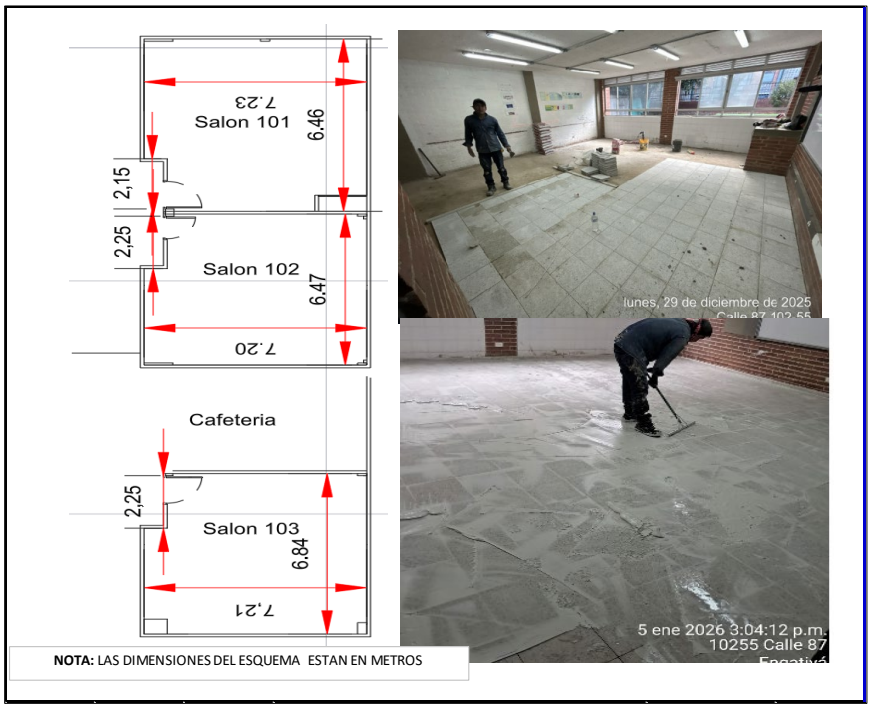

4.4.5.14. ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

Se ejecuta la actividad de aseo general final y limpieza en los salones 110, 101 y 102; durante este periodo se ejecutó un área total de 138,02 m²

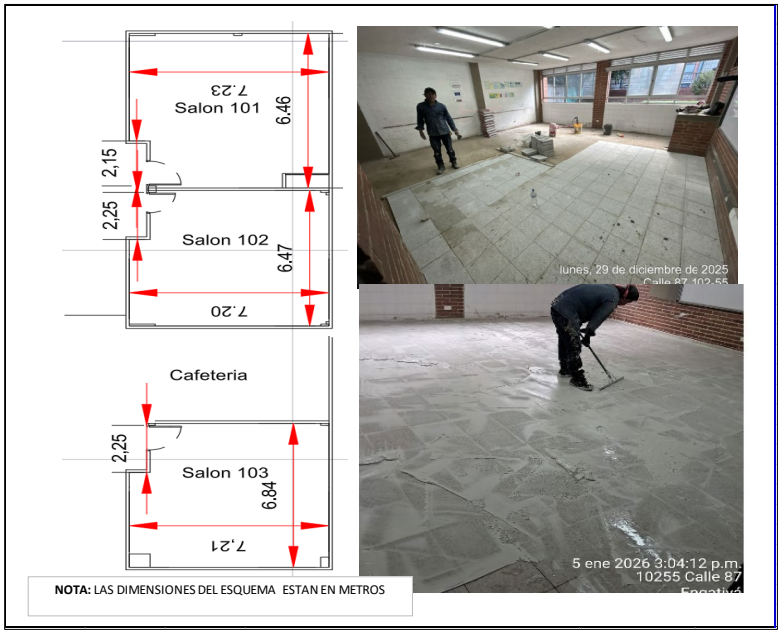

4.4.6. Institución Educativa Colegio Tabora Sede A.


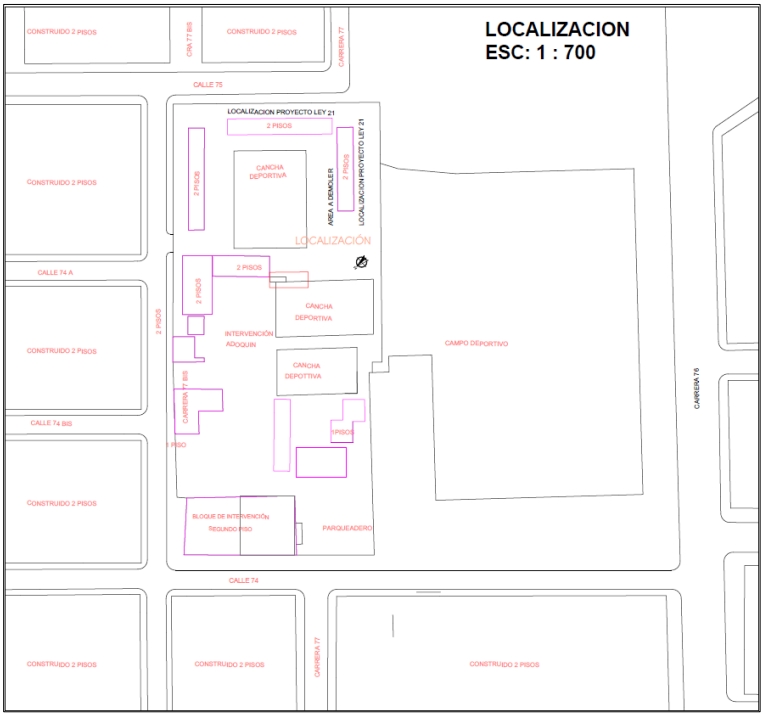


Ilustración 8 Planta Ubicación Institución Educativa Colegio Tabora sede A.


4.4.6.1. <u>REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)</u>

Se ejecutó la actividad de replanteo, aplicable en los casos en que la interventoría autorizó el dibujo de áreas específicas para la distribución y el esquema constructivo, con el fin de construir una nueva área de adoquín y bancas con cubierta en policarbonato y su respectiva estructura, en el área denominada Zona Verde – Área Recreativa; durante este periodo se ejecutó un área total de 150,93 m².

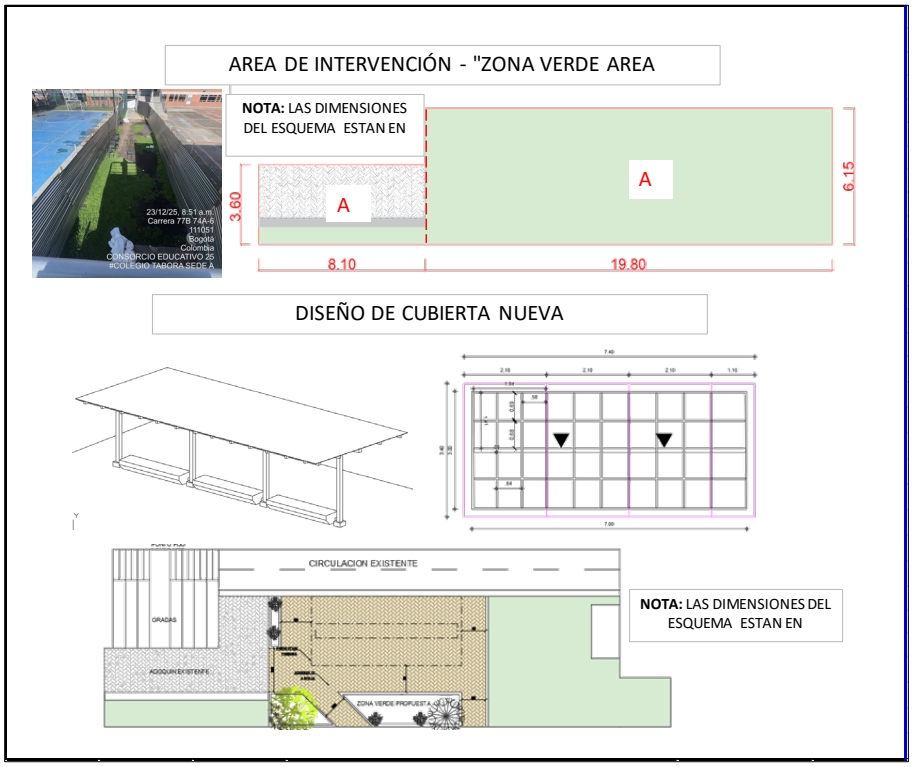


4.4.6.2. <u>CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.</u>

Se ejecutó la actividad de cerramiento en lona, que incluyó parales de madera de 5" × 5" anclados al suelo de acuerdo con la necesidad del área y amarres con alambre negro N.º 18, con una altura de cerramiento de 2,00 m; el ítem contempló la revisión periódica de su estado físico. La actividad se desarrolló en las áreas de Punto Fijo y Zona Verde, ejecutándose durante este periodo un total de 84,85 m.

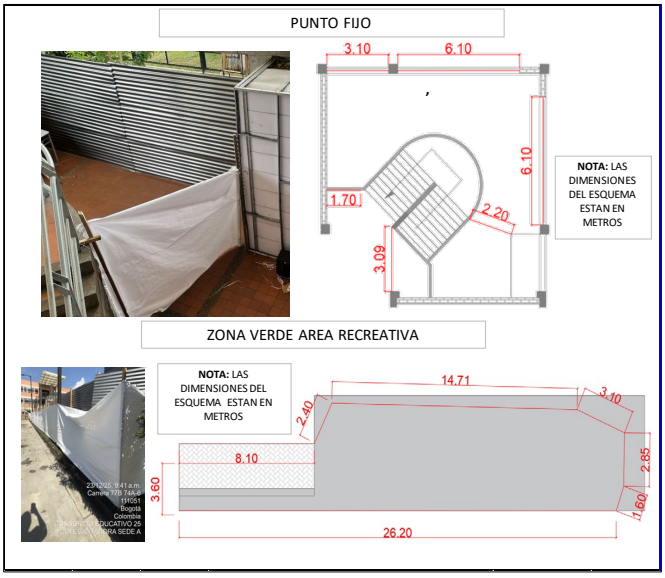

4.4.6.3. <u>CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.</u>

Se ejecutó la actividad de cerramiento en teja de zinc calibre 35, con una altura de 2,40 m, que incluyó parales de madera de 5" × 5" anclados al suelo de acuerdo con la necesidad del área y amarres con tornillo drywall de 1 1/2"; el ítem contempló la revisión periódica de su estado físico. La actividad se desarrolló en las áreas de Punto Fijo y Zona Verde, ejecutándose durante este periodo un total de 79,05 m.

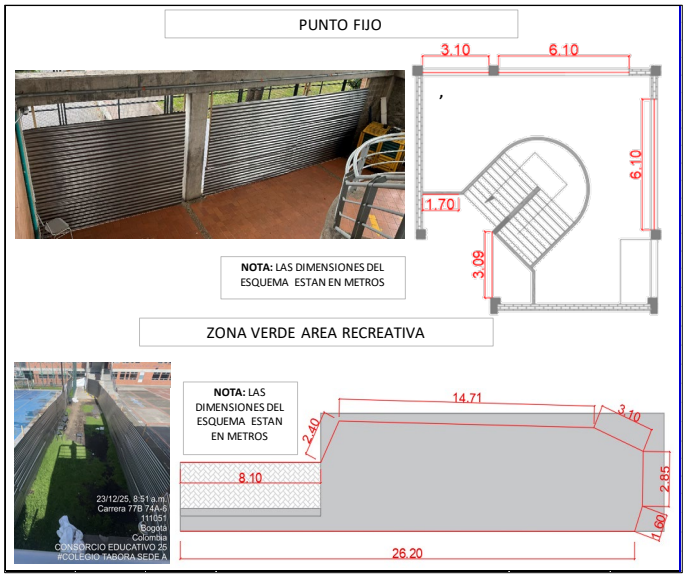

4.4.6.4. DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)


Se ejecutó la actividad de demolición de enchape de muros y pega, que incluyó el cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados, en los WC Baños Mujeres Piso 2, WC Baños Mujeres Piso 1, WC Baños Hombres Piso 2 y WC Baños Hombres Piso 1; durante este periodo se ejecutó un área total de 4,00 m².



4.4.6.5. DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

Se ejecutó la actividad de desmonte de puertas existentes con marco de todo tamaño en madera, metal y aluminio metálicas, incluyendo el cargue, transporte y disposición final de los residuos de construcción en sitios autorizados. Las labores se realizaron en los WC Baños Mujeres Piso 2, WC Baños Mujeres Piso 1, WC Baños Hombres Piso 1 y WC Baños Hombres Piso 2, alcanzando un área total de 18,67 m² durante el periodo reportado.




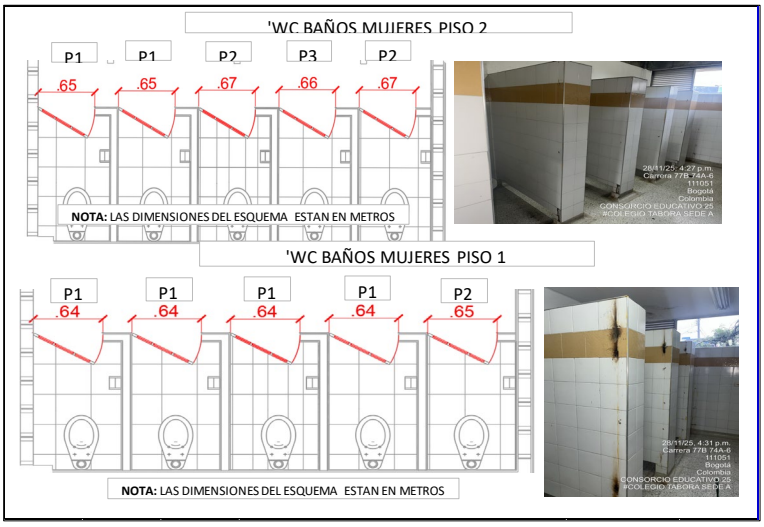

4.4.6.6. <u>DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)</u>

Se ejecutó la actividad de desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluyendo el uso de andamios certificados y el retiro de la estructura metálica o de madera, amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, así como instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes, garantizando el cargue, transporte y disposición final de los residuos de construcción en sitios autorizados. Cabe señalar que no se desinstaló la estructura principal de la cubierta, motivo por el cual se

aplicó un descuento del 10% sobre las cantidades ejecutadas, obteniendo un área total de 63,06 m² durante el periodo reportado.

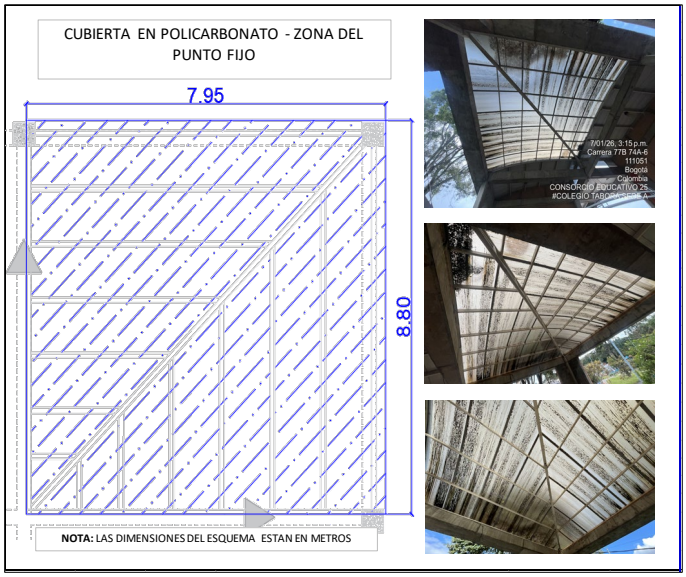

4.4.6.7. DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

Se ejecutó la actividad de desmonte de bancas existentes, incluyendo la demolición de sus bases en concreto, así como el cargue, transporte y disposición final de los residuos de construcción en sitios autorizados. Las labores se realizaron en el área de zona verde, alcanzando un total de 13 unidades durante el periodo reportado.



4.4.6.8. DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

Se ejecutó la actividad de desmonte de lámparas, utilizando andamios certificados para garantizar la seguridad en la operación. Las labores se realizaron en los WC Baños Mujeres Piso 2, WC Baños Mujeres Piso 1, WC Baños Hombres Piso 2 y WC Baños Hombres Piso 1, alcanzando un total de 10 unidades durante el periodo reportado.



4.4.6.9. TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS

Se ejecutó la actividad de trasiego en carretilla, únicamente aplicada a proyectos especiales avalados por la interventoría, para distancias superiores a 20 metros. En este caso, se realizó el transporte del policarbonato retirado desde el punto fijo, incluyendo su traslado hasta el sitio de disposición correspondiente. Durante el periodo reportado se ejecutó un volumen total de 0,42 m³.




4.4.6.10. PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)

Se ejecutó la actividad de pulida de mesones en granito existentes, incluyendo el tratamiento del frontal con ancho menor a 0,75 m, garantizando un acabado uniforme y de calidad. Las labores se realizaron en los WC Baños Mujeres Piso 1 y Piso 2, así como en los WC Baños Hombres Piso 1 y Piso 2, alcanzando un total de 18,15 m durante el periodo reportado.




4.4.6.11. SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS

Se ejecutó la actividad de sondeo de unidades sanitarias, la cual incluyó el desmonte y posterior montaje de los aparatos para garantizar su correcto funcionamiento. Las labores se realizaron en los WC Baños Hombres Piso 1 y Piso 2, así como en los WC Baños Mujeres Piso 1 y Piso 2, alcanzando un total de 40 unidades durante el periodo reportado.

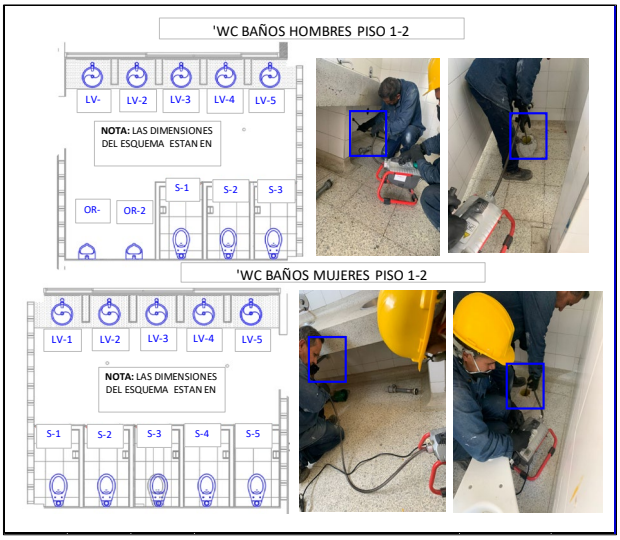


4.4.6.12. SONDEO Y RVISIÓN DE DESAGUES

Se ejecutó la actividad de sondeo y revisión de desagües, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las redes sanitarias. Las labores se realizaron en los WC Baños Hombres Piso 1 y Piso 2, así como en los WC Baños Mujeres Piso 1 y Piso 2, alcanzando un total de 56 m durante el periodo reportado.

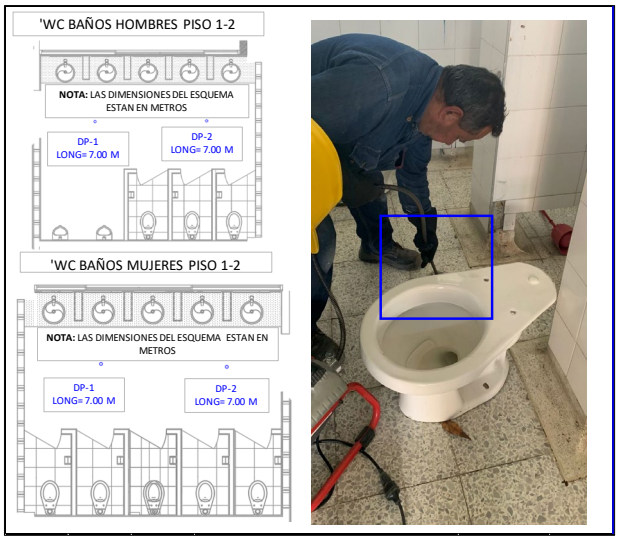


4.4.6.13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

Se ejecutó la actividad de suministro e instalación de lámparas tipo LED 2x18W herméticas, incluyendo soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación, así como el uso de andamios certificados para garantizar la seguridad en la operación. Las labores se realizaron en los WC Baños Hombres y Mujeres de los pisos 1 y 2, alcanzando un total de 10 unidades durante el periodo reportado.

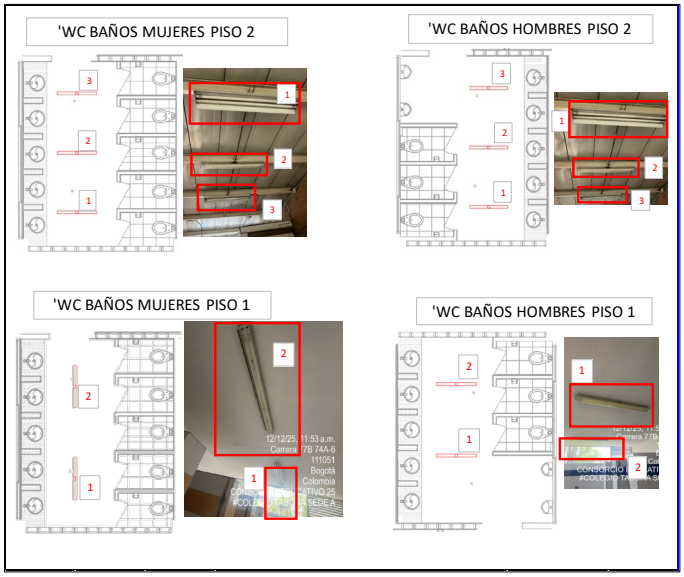

4.4.6.14. DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES

Se ejecutó la actividad de destronque, pulida y sellada de pisos en granito existentes, incluyendo el resane de empalmes a guarda escoba y media caña (curvo y recto) existentes, garantizando un acabado uniforme y de calidad. Las labores se realizaron en la batería de baños de hombres y mujeres de los pisos 1 y 2, alcanzando un área total de 82,08 m² durante el periodo reportado.

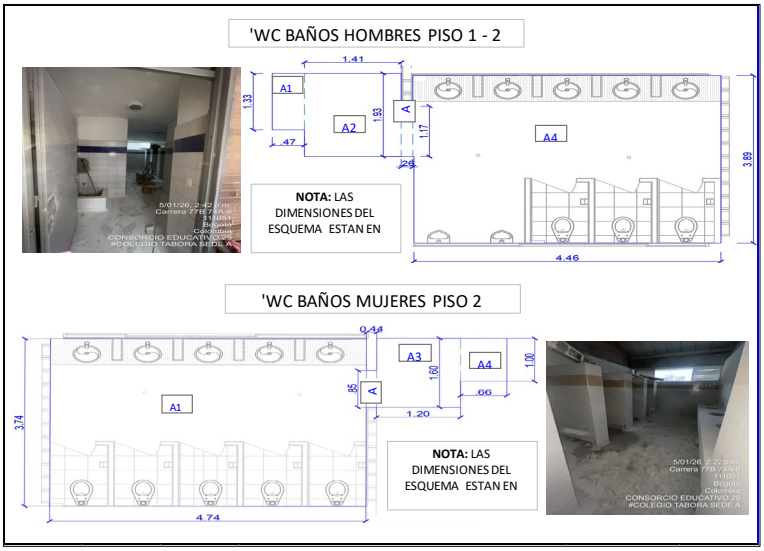




4.4.6.15. SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX


Se ejecutó la actividad de suministro e instalación de enchape cerámico brillante de dimensiones aproximadas 25 x 35 cm, garantizando la correcta colocación y acabado conforme a las especificaciones técnicas. Las labores se realizaron en los baños de hombres y mujeres de los pisos 1 y 2, alcanzando un área total de 4,00 m² durante el periodo reportado.



4.4.6.16. <u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"</u>

Se ejecutó la actividad de suministro e instalación de divisiones para baño institucional, compuestas por puertas y paneles en acero inoxidable tipo 304 antiácido, calibre 20, entamborado de 1", garantizando resistencia, durabilidad y acabado conforme a las especificaciones técnicas. Las labores se realizaron en los baños de hombres y mujeres de los pisos 1 y 2, alcanzando un área total de 20,06 m² durante el periodo reportado.

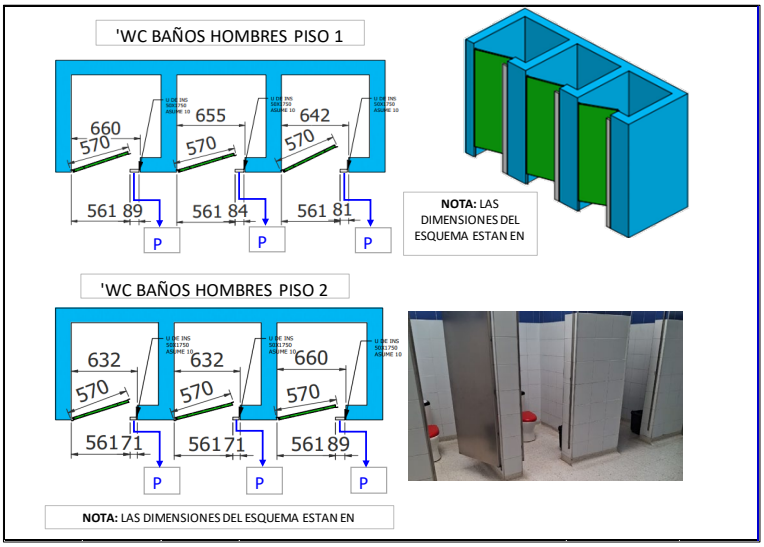

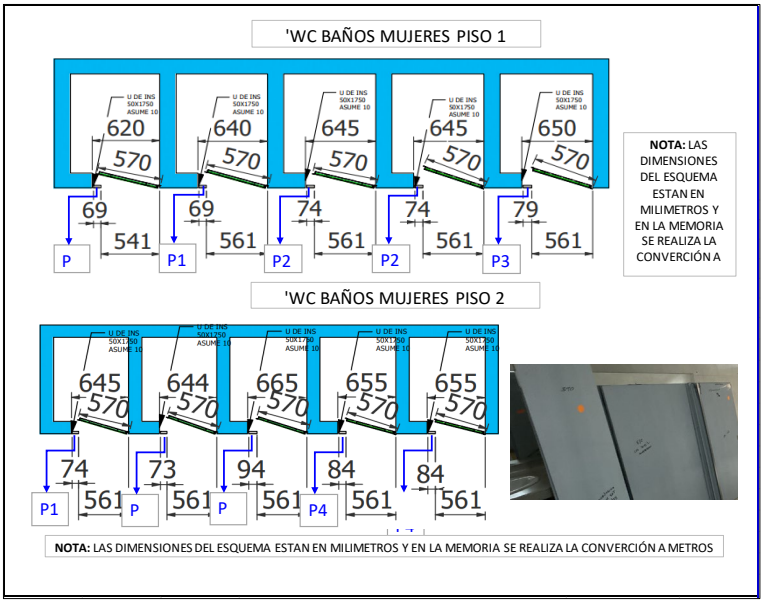


4.4.6.17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL

Se ejecutó la actividad de suministro e instalación de división de baño en acero inoxidable calibre 20 para orinal, garantizando resistencia, durabilidad y acabado conforme a las especificaciones técnicas. Las labores se realizaron en los baños de hombres de los pisos 1 y 2, alcanzando un área total de 1,10 m² durante el periodo reportado.



4.4.6.18. SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

Se ejecutó la actividad de suministro y aplicación de esmalte en la totalidad del elemento estructural a dos manos, incluyendo cerchas, vigas, columnas y estructura metálica de cubierta, entre otros, abarcando todas sus caras, aristas y vértices hasta un desarrollo de 1,20 m. La actividad contempló el uso de andamios certificados para garantizar la seguridad en la operación. Las labores se realizaron en el área del punto fijo, alcanzando un total de 108,18 m² durante el periodo reportado.

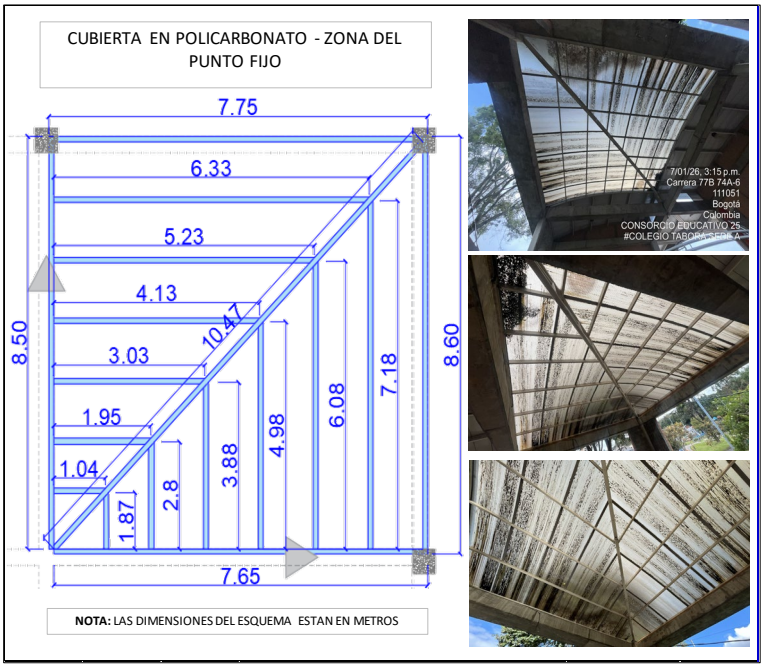


4.4.6.19. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)


Se ejecutó la actividad de suministro e instalación de lámina en policarbonato alveolar de 6 mm, incluyendo el uso de andamios certificados para garantizar la seguridad en la operación. Las labores se realizaron en el área del punto fijo, alcanzando un total de 69,96 m² durante el periodo reportado.



4.4.6.20. ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

Se ejecutó la actividad de aseo general final y limpieza, garantizando la adecuada presentación y condiciones de higiene en las superficies intervenidas. Las labores se realizaron en el piso de los baños de hombres y mujeres de los pisos 1 y 2, alcanzando un área total de 82,08 m² durante el periodo reportado.

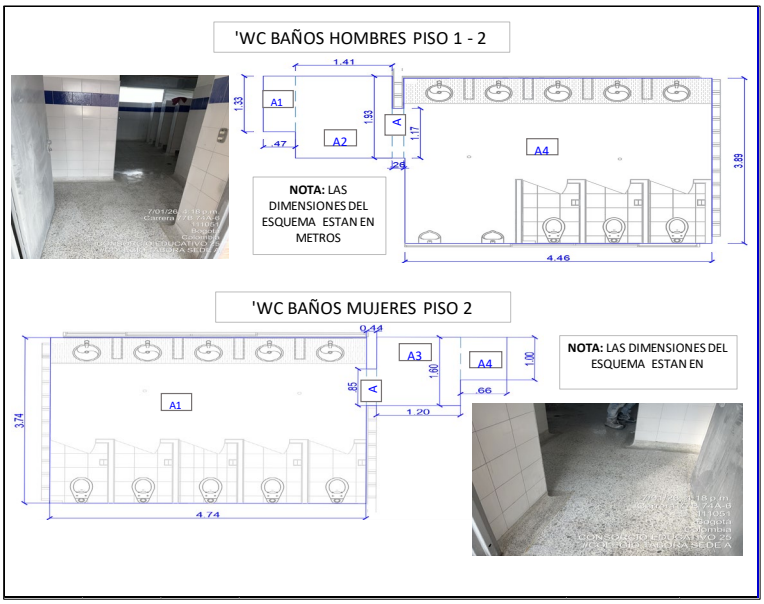

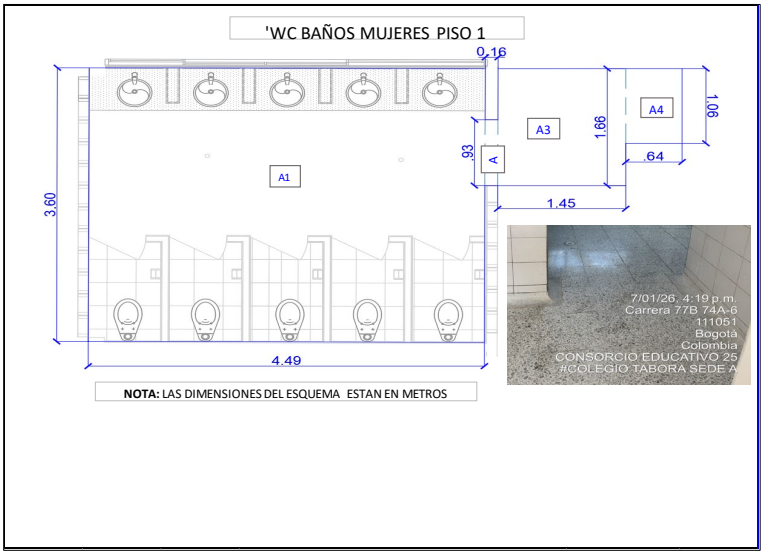

4.4.7. Institución Educativa Colegio Jorge Gaitan Cortes

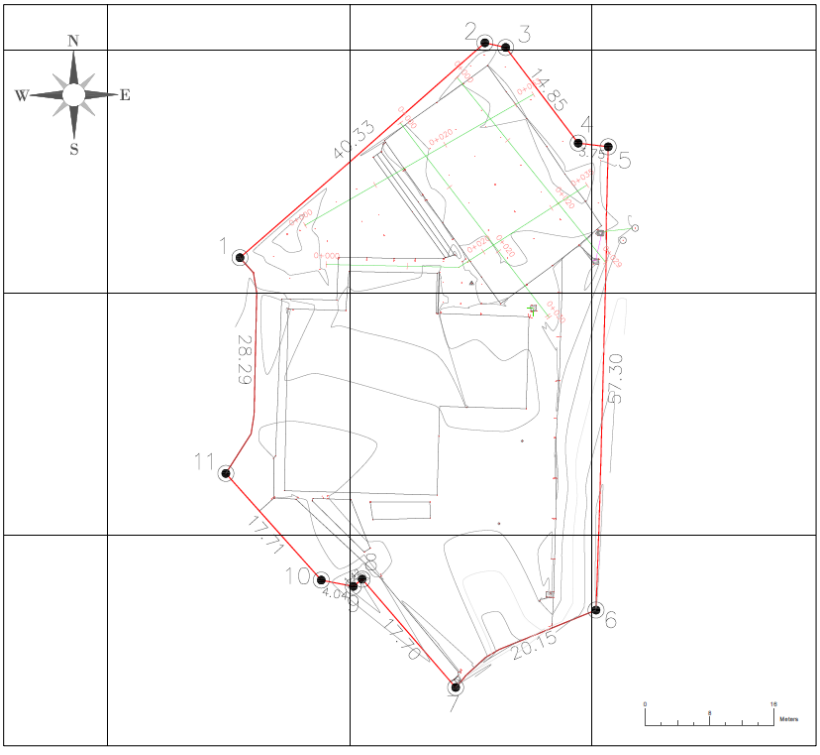


Ilustración 9 Planta Ubicación Institución Educativa Colegio Jorge Gaitan Cortes
