

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROYECTO DE ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA BATALLON JMC**	**72.73 días?**	**mar 20/08/24**	**mié 20/11/24**
2		INICIO	0 días	mar 20/08/24	mar 20/08/24
3		**DEMOLICIÓN Y DESMONTES**	**13 días?**	**mar 20/08/24**	**jue 5/09/24**
4		Demolición y desmonte de cielo raso	9 días	sáb 24/08/24	jue 5/09/24
5		Desmonte de luminarias existentes	8 días	mar 20/08/24	jue 29/08/24
6		Desmonte de puertas, marcos y fijos en vidrio	2 días	mar 20/08/24	jue 22/08/24
7		Demolición de tarimas y escalones en concreto y mamposteria	7 días	mar 20/08/24	mié 28/08/24
8		Desmonte de unidades sanitarias	3 días	mar 20/08/24	vie 23/08/24
9		Desmonte de espejos	1 día?	mar 20/08/24	mié 21/08/24
10		Demolición de enchapes tipo ceramico en muros de baños	2 días	vie 23/08/24	lun 26/08/24
11		Demolición de enchapes tipo ceramico en pisos de baños	3 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24
12		Realización de regatas para instalación de tubería desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación	2 días	lun 26/08/24	mié 28/08/24
13		**EJECUCIÓN Y SUMINISTROS**	**70 días?**	**jue 22/08/24**	**mié 20/11/24**
14		Nivelado y alistado de piso, en concreto de 3000psi de hasta 10cm de espesor	3 días	mié 28/08/24	sáb 31/08/24
15		Mantenimiento, limpieza pintura y reinstalación de puertas	5 días	jue 22/08/24	mié 28/08/24
16		Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, afirmado y pañetado pór ambas caras con mortero	3 días	lun 2/09/24	jue 5/09/24

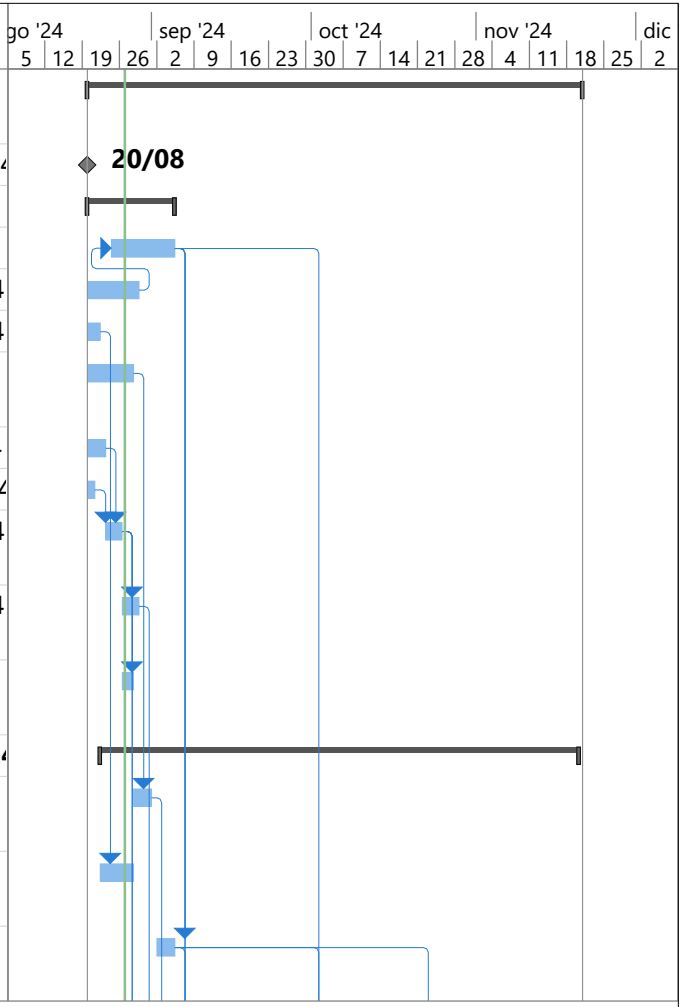

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
17		Columneta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12	2 días	jue 5/09/24	sáb 7/09/24
18		Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12m	3 días	sáb 7/09/24	mié 11/09/24
19		Pañete lineal de hasta 20cm de muros en mampostería 1:3	2 días	mié 11/09/24	vie 13/09/24
20		Suministro e instalación de estuco plástico sobre pañete de mortero en muros de mampostería 3	4 días	sáb 14/09/24	jue 19/09/24
21		Muro en lámina de yeso-cartón de e:12 cm	37 días	jue 5/09/24	mar 22/10/24
22		Remate de vanos y filos en muro de mampostería, se debe dejar el afinado listo para la instalación del marco de puertas	2 días	sáb 14/09/24	mar 17/09/24
23		Suministro e instalación de cielo raso en lamina de yeso-cartón	30 días	mié 2/10/24	sáb 9/11/24
24		Refuerzo y conformado de vanos de cielorraso en perfil T 32mm X 24mm color blanco	8 días	mar 15/10/24	vie 25/10/24
25		Suministro e instalación de tapas de inspección para cielorraso de 60 x 60 cm en lamina de fibrocemento de 8mm	4 días	sáb 9/11/24	jue 14/11/24
26		Refuerzo y conformado de vanos en estructura metalica coldrolled tubo rectangular 90x50mm	2 días	vie 27/09/24	lun 30/09/24
27		Suministro e instalación de espejo	1 día?	lun 2/09/24	mar 3/09/24
28		Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	22 días	mié 23/10/24	mié 20/11/24

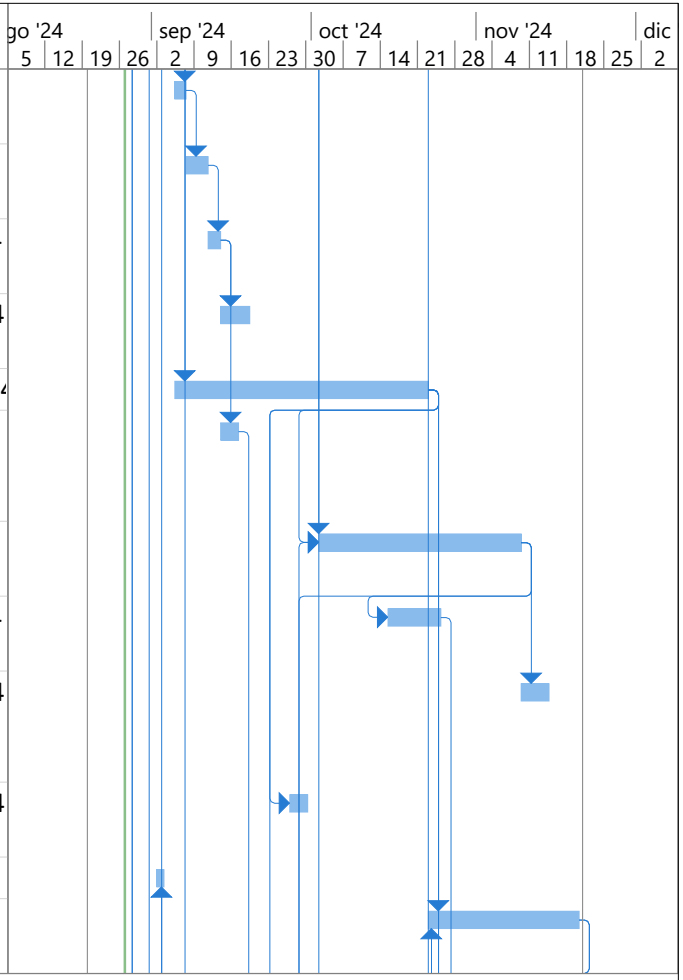

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
29		Pintura interior en cieloraso, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	15 días	mié 2/10/24	lun 21/10/24
30		Suministro e instalación enchape de pared en baldosa ceramica blanca formato 60x60cm	5 días	lun 26/08/24	sáb 31/08/24
31		Suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de muros en enchape	3 días	lun 2/09/24	jue 5/09/24
32		Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm	5 días	jue 5/09/24	mié 11/09/24
33		Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato negro liso sin textura con altura de	4 días	mar 17/09/24	sáb 21/09/24
34		Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria	2 días	mié 11/09/24	vie 13/09/24
35		Suministro e instalación lavamanos monocontrol de porcelana sanitaria, color blanco, de sobreponer en mesón	2 días	sáb 14/09/24	mar 17/09/24
36		Suministro e instalación mesón de lavamanos en materíal petreo	2 días	mié 11/09/24	vie 13/09/24
37		Suministro e instalación orinal linea institucional	2 días	lun 2/09/24	mié 4/09/24
38		Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable	2 días	lun 2/09/24	mié 4/09/24
39		Suministro e instalación de dispensador de jabón de empotrar en acero inoxidable	2 días	lun 2/09/24	mié 4/09/24
40		Suministro e instalación de división en acero inoxidable 304 acabado cepillado o similar	4 días	mié 11/09/24	mar 17/09/24
41		Poceta en mampostería maciza, tipo tolete común, de 60cm x 60 cm de base x 75cm de altura	2 días	mié 11/09/24	vie 13/09/24

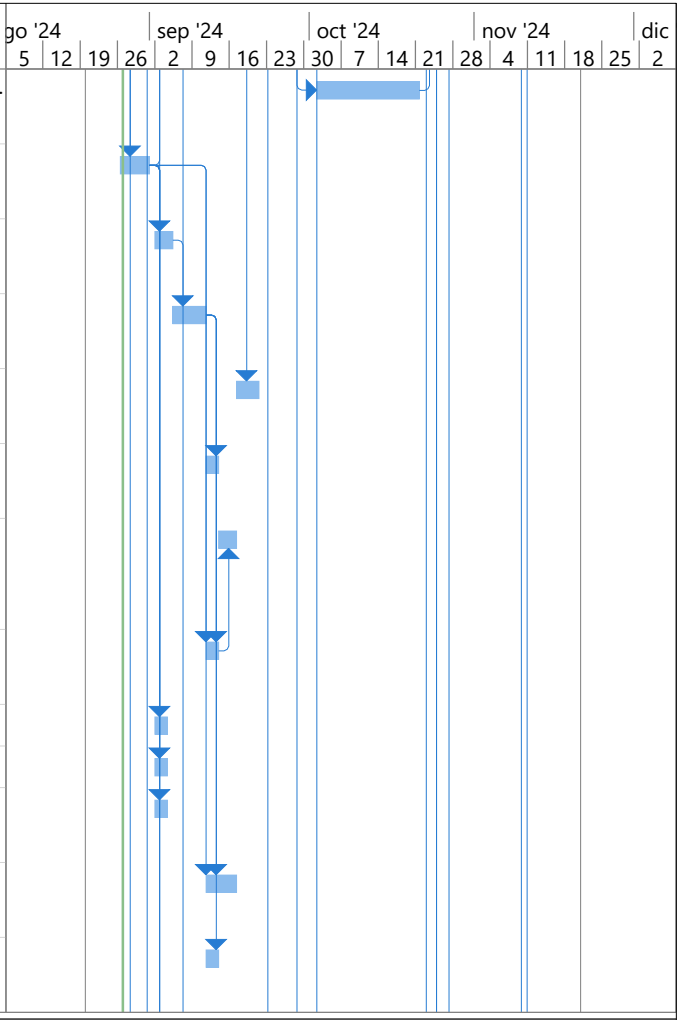

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
42		Regatas en mampostería y derivación de punto hidraulico hasta 3m	4 días	lun 26/08/24	vie 30/08/24
43		Excavación, regatas en concreto y derivación a punto sanitario hasta 3m	4 días	jue 29/08/24	mié 4/09/24
44		Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 4+4	18 días	vie 27/09/24	sáb 19/10/24
45		Suministro e instalación de puertas en vidrio laminado 4+4	7 días	sáb 19/10/24	mar 29/10/24
46		Suministro e instalación poyo, en mampostería maciza tipo tolete, ancho de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de concreto, incluye cortes en la cerámica, mortero de pega y pañete 1:3	20 días	lun 2/09/24	jue 26/09/24
47		Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada, enchape en tríplex 6mm okume	10 días	mié 23/10/24	lun 4/11/24
48		Gabinete en lámina de aglomerado 18mm tipo RH con acabado fenólico	2 días	lun 2/09/24	mié 4/09/24
49		Suministro e instalación de puerta en lámina de dimensiones 1 x 2,30 m en calibre 16	5 días	mié 23/10/24	mar 29/10/24
50		**ELECTRICO**	**54.27 días**	**jue 5/09/24**	**mié 13/11/2**
51		suministro e instalación de luminaria tipo panel led cuadrada de 60x60 cm	15 días	vie 25/10/24	mié 13/11/24
52		Mantenimiento correctivo y preventivo del transformador aéreo de 112,5kVA, incluye cambio de aceite dieléctrico	4 días	mié 2/10/24	lun 7/10/24

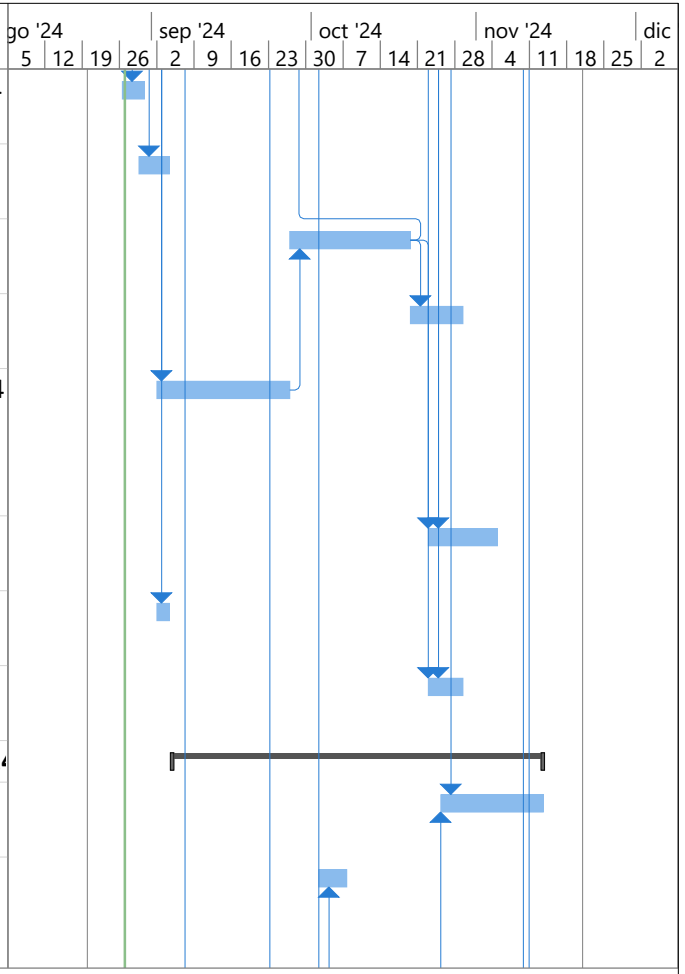

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53		Suministro e instalación de acometida eléctrica en cables 3#1/0F+ 1#2/0N	10 días	mié 2/10/24	mar 15/10/24
54		Suministro e instalación de tubería de 3 PVC/IMC subterránea o aérea según la necesidad con sus respectivos accesorios	5 días	jue 5/09/24	mié 11/09/24
55		Suministro e instalación de cajas de inspección en cumplimiento normativo en cemento bloque de concreto con tapa y manija	2 días	jue 5/09/24	sáb 7/09/24
56		Suministro e instalación de tablero tipo cofre de dimensiones mínimas 80cm x 70cm x 40cm co barrajes de cobre de 250A	4 días	vie 27/09/24	mié 2/10/24
57		Suministro e instalación de totalizador 3x150A graduable	2 días	mié 2/10/24	vie 4/10/24
58		Suministro e instalación de totalizador 3x75A grad	2 días	mié 2/10/24	vie 4/10/24
59		Suministro e instalación de totalizador 3x40A fijo	2 días	mié 2/10/24	vie 4/10/24
60		Suministro e instalación de llave de bypass tetrapolar de mínimo 160A	2 días	mié 2/10/24	vie 4/10/24
61		Suministro e instalación de DPS mínimo de clase II (20/40kA)	3 días	sáb 5/10/24	mié 9/10/24
62		Suministro e instalación de tablero eléctrico de 18 circuitos sin espacio para totalizador	3 días	mié 2/10/24	sáb 5/10/24
63		Suministro e instalación de tablero eléctrico de 42 circuitos sin espacio para totalizador	2 días	mié 2/10/24	vie 4/10/24
64		Suministro e instalación de salida eléctrica bifásica L5-20 208V/220V para equipo de aire	2 días	jue 10/10/24	sáb 12/10/24

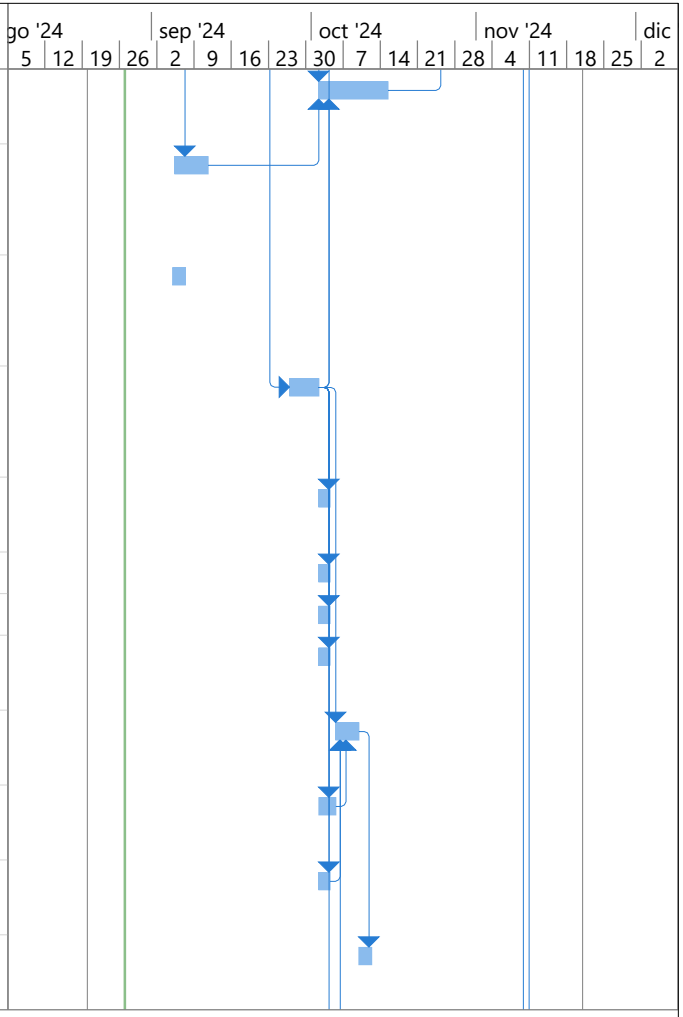

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
65		Sistema de puesta a tierra compuesto por tres (3) varillas de cobre de 2,4m cooperwell Cu/Fe	2 días	mié 2/10/24	vie 4/10/24
66		**DOTACIONES Y ASEO**	**4 días**	**mié 13/11/2**	**mar 19/11/2**
67		Pedestal para banderas	2 días	mié 13/11/2	vie 15/11/24
68		Suministro e instalación de señalización en acrílico	1 día	vie 15/11/24	sáb 16/11/24
69		Aseo fin de obra	3 días	jue 14/11/24	mar 19/11/2
70		FIN OBRA	0 días	mié 20/11/2	mié 20/11/2

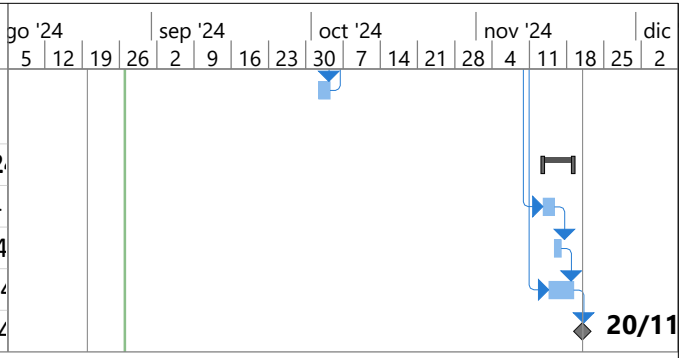


Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

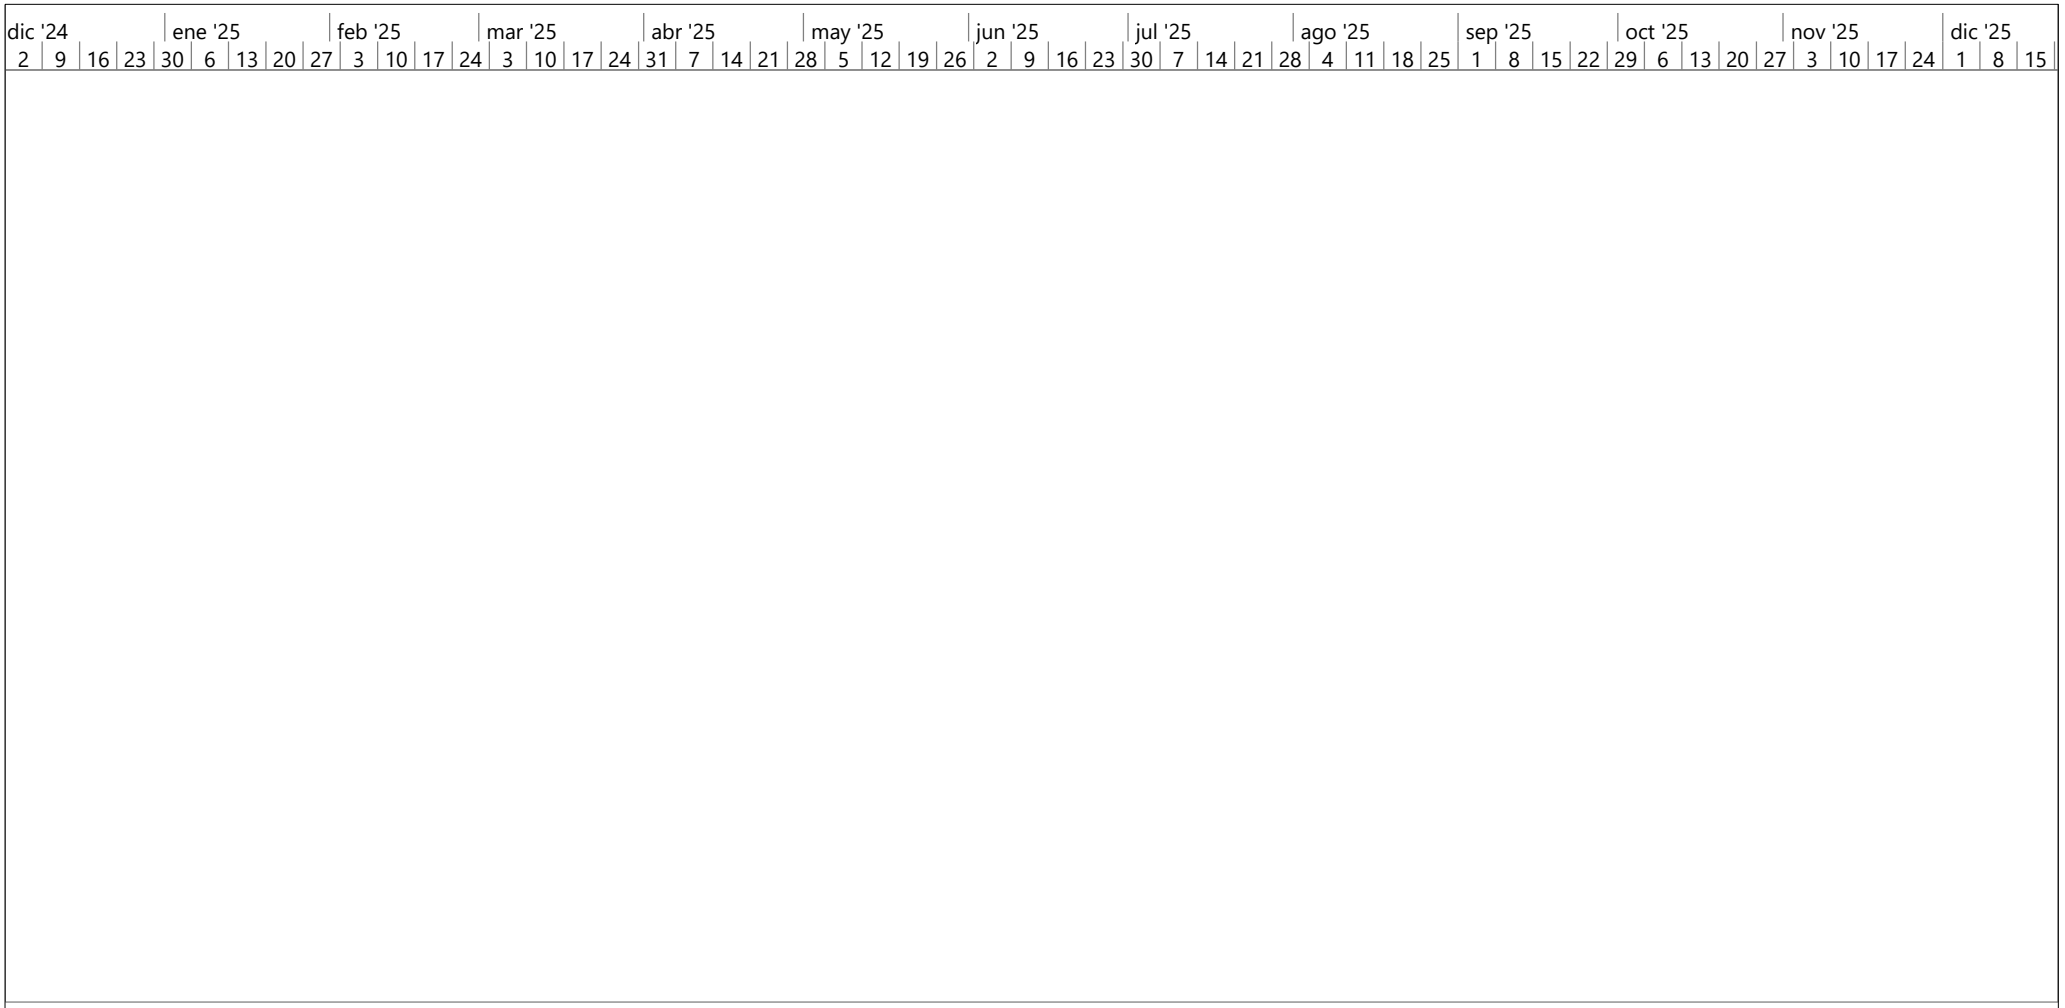


Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

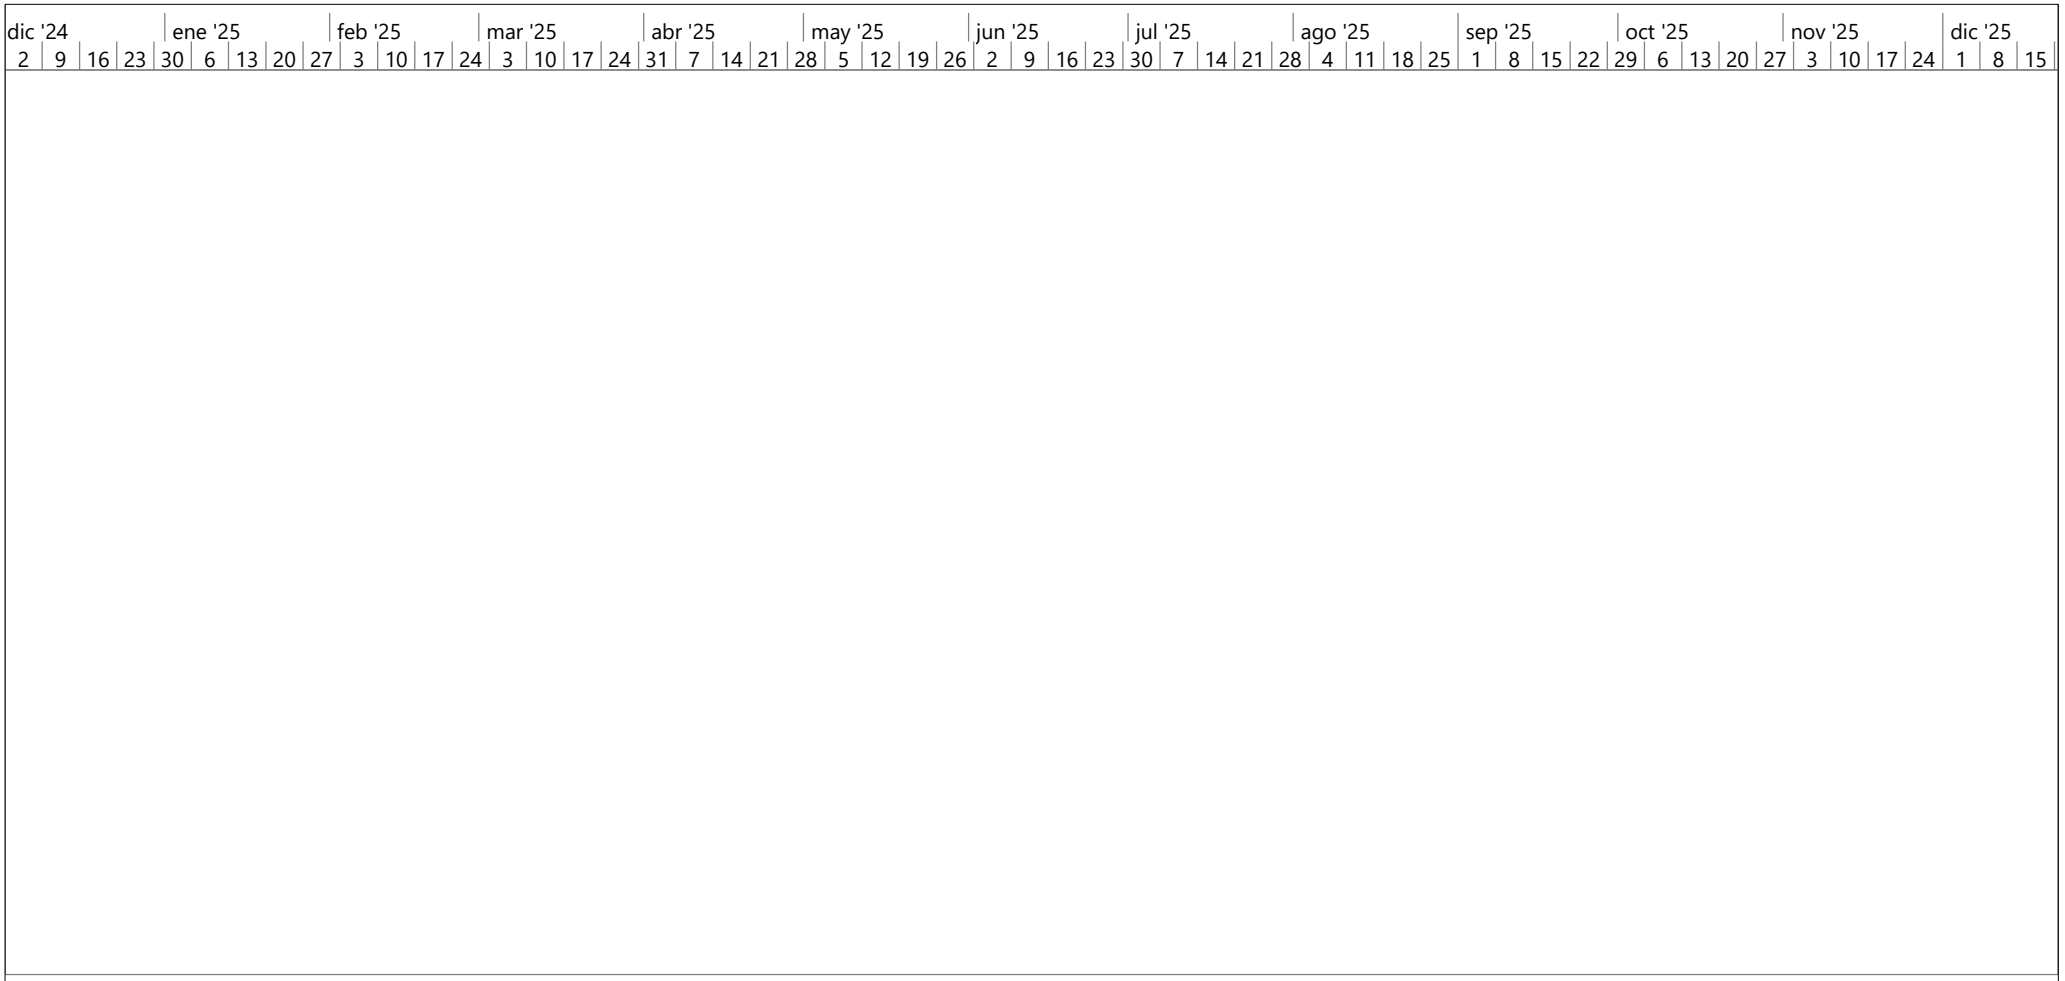


Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

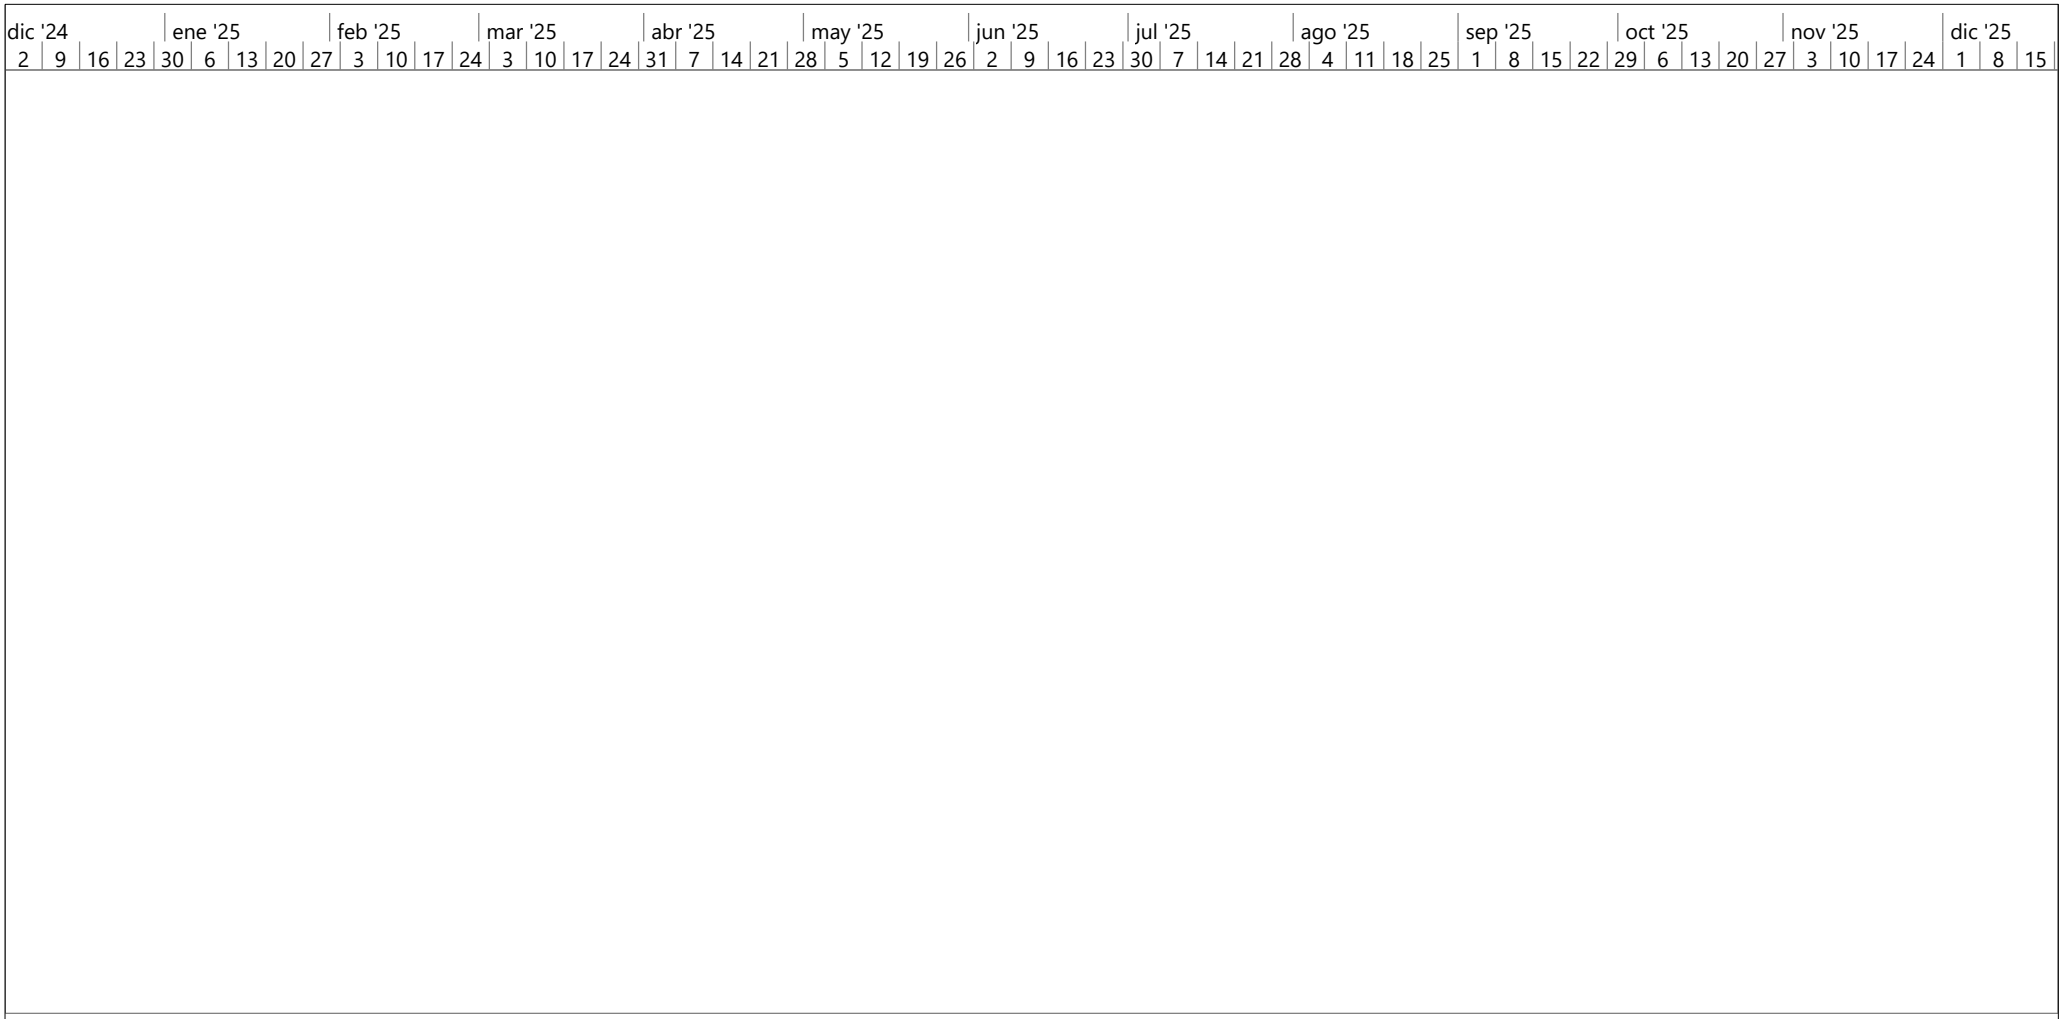


Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

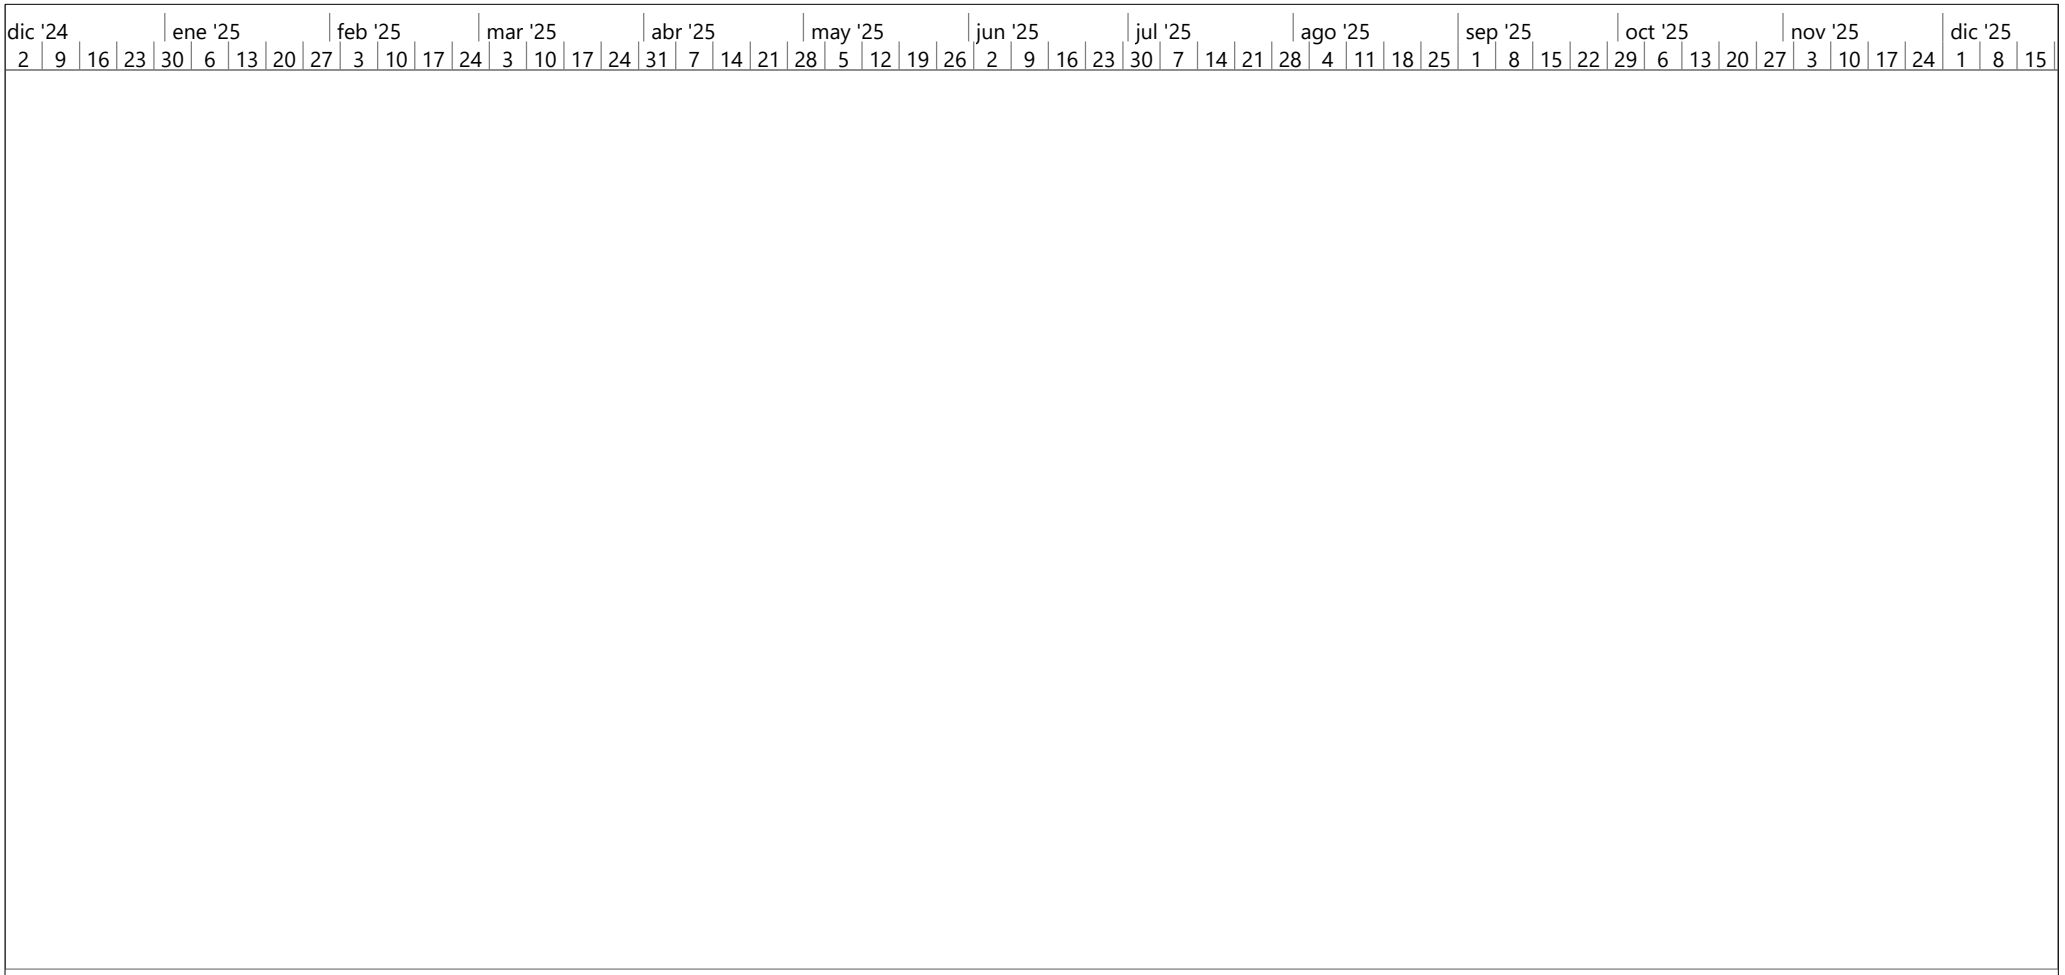


Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

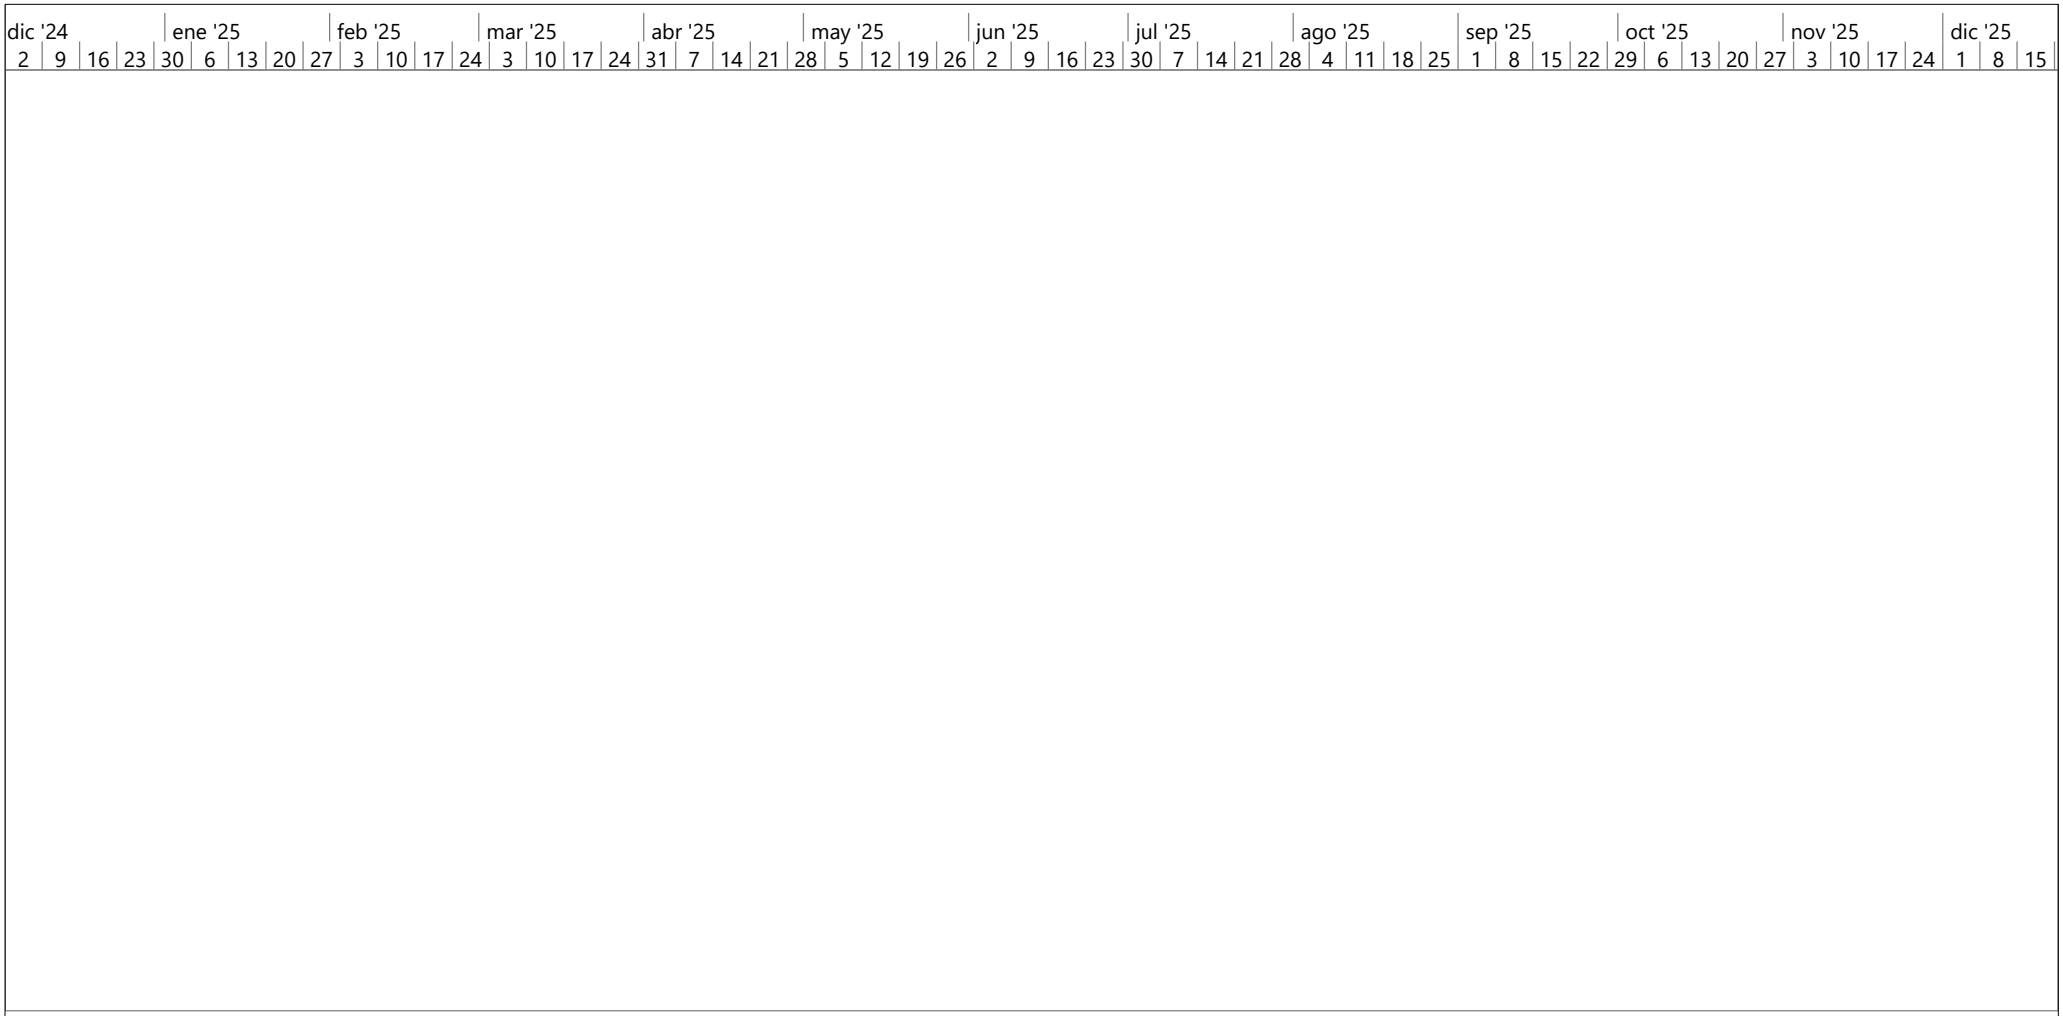

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



0/11

Liliana Patricia Gandara Correa
C.C 22.868,437

Proyecto: PROGRAMACION CO
Fecha: mar 27/08/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
