


LOCALIZACIÓN DEL CORREDOR EN EL CONTEXTO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL



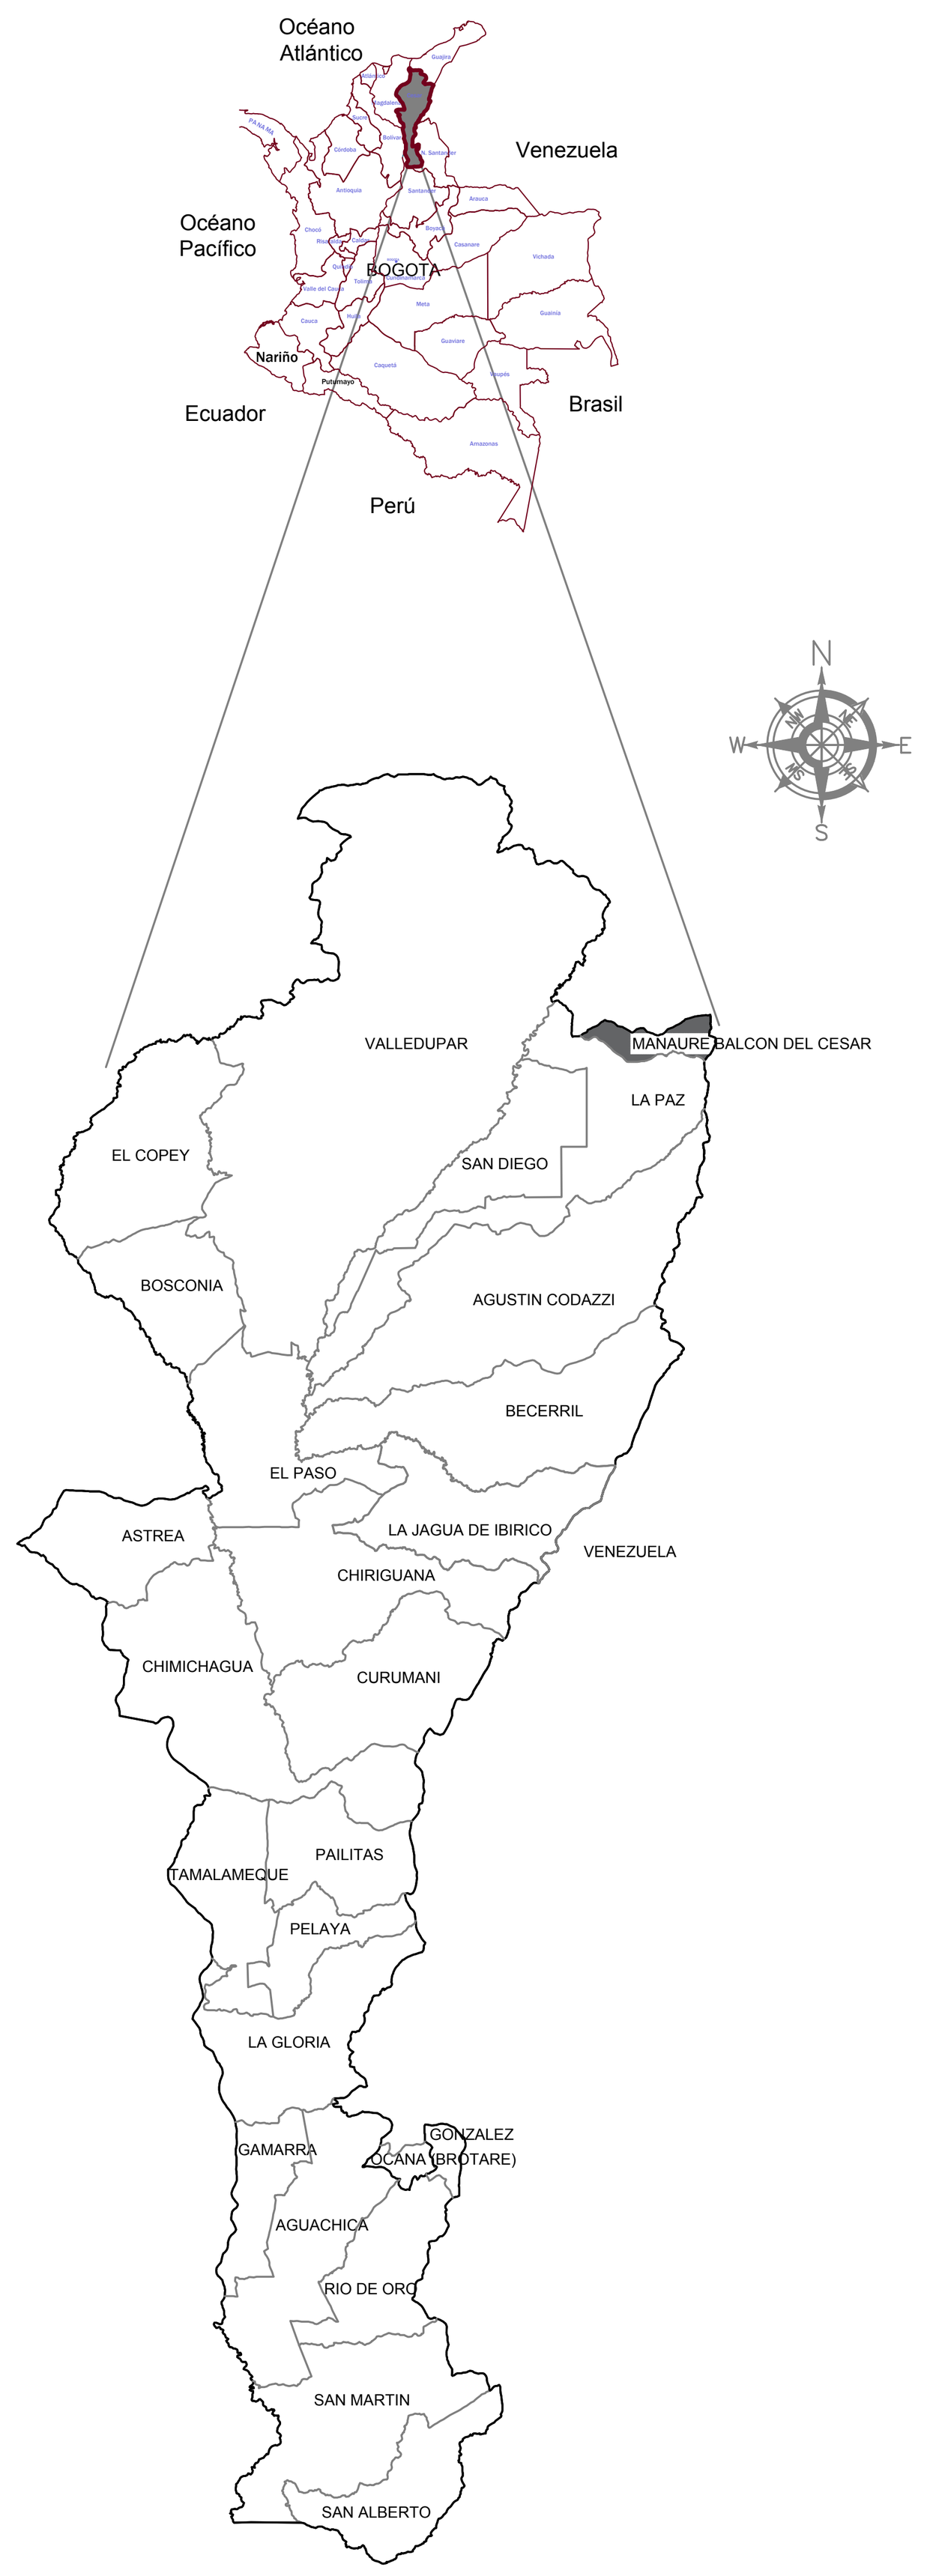

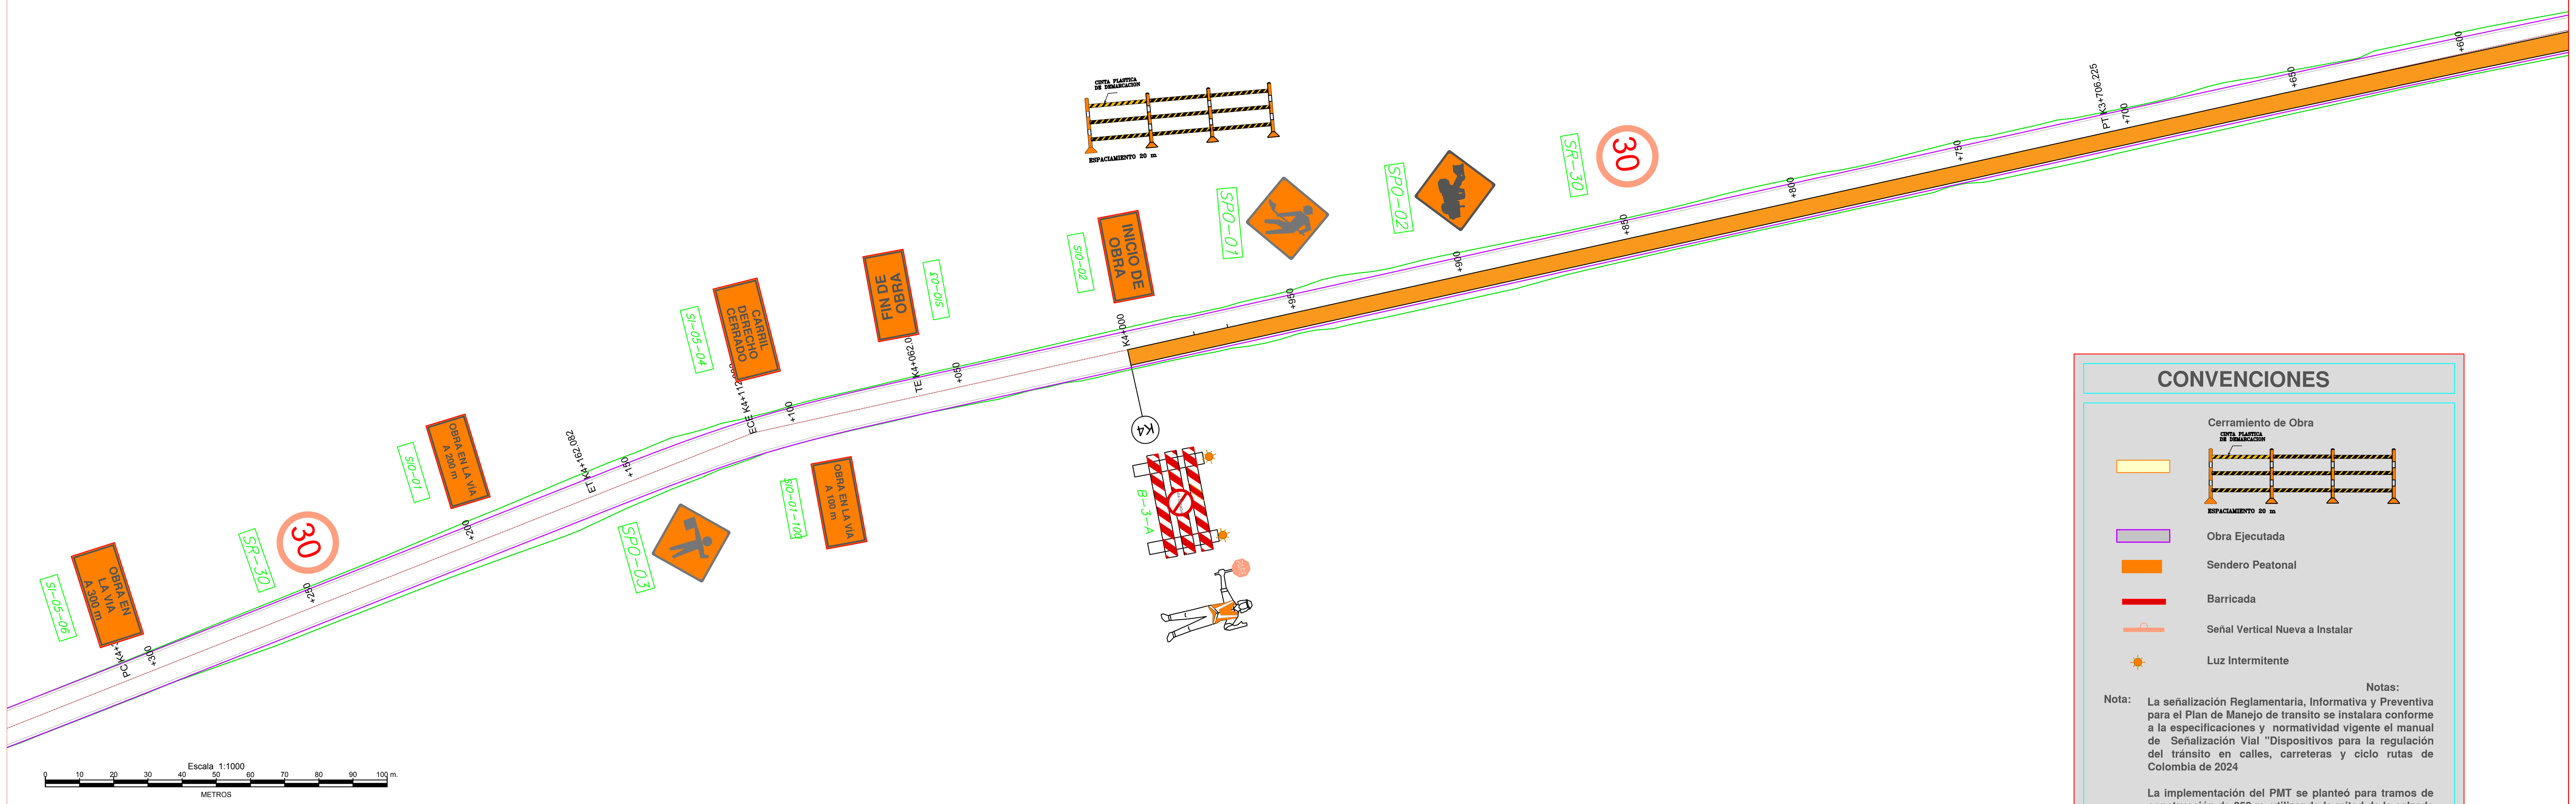

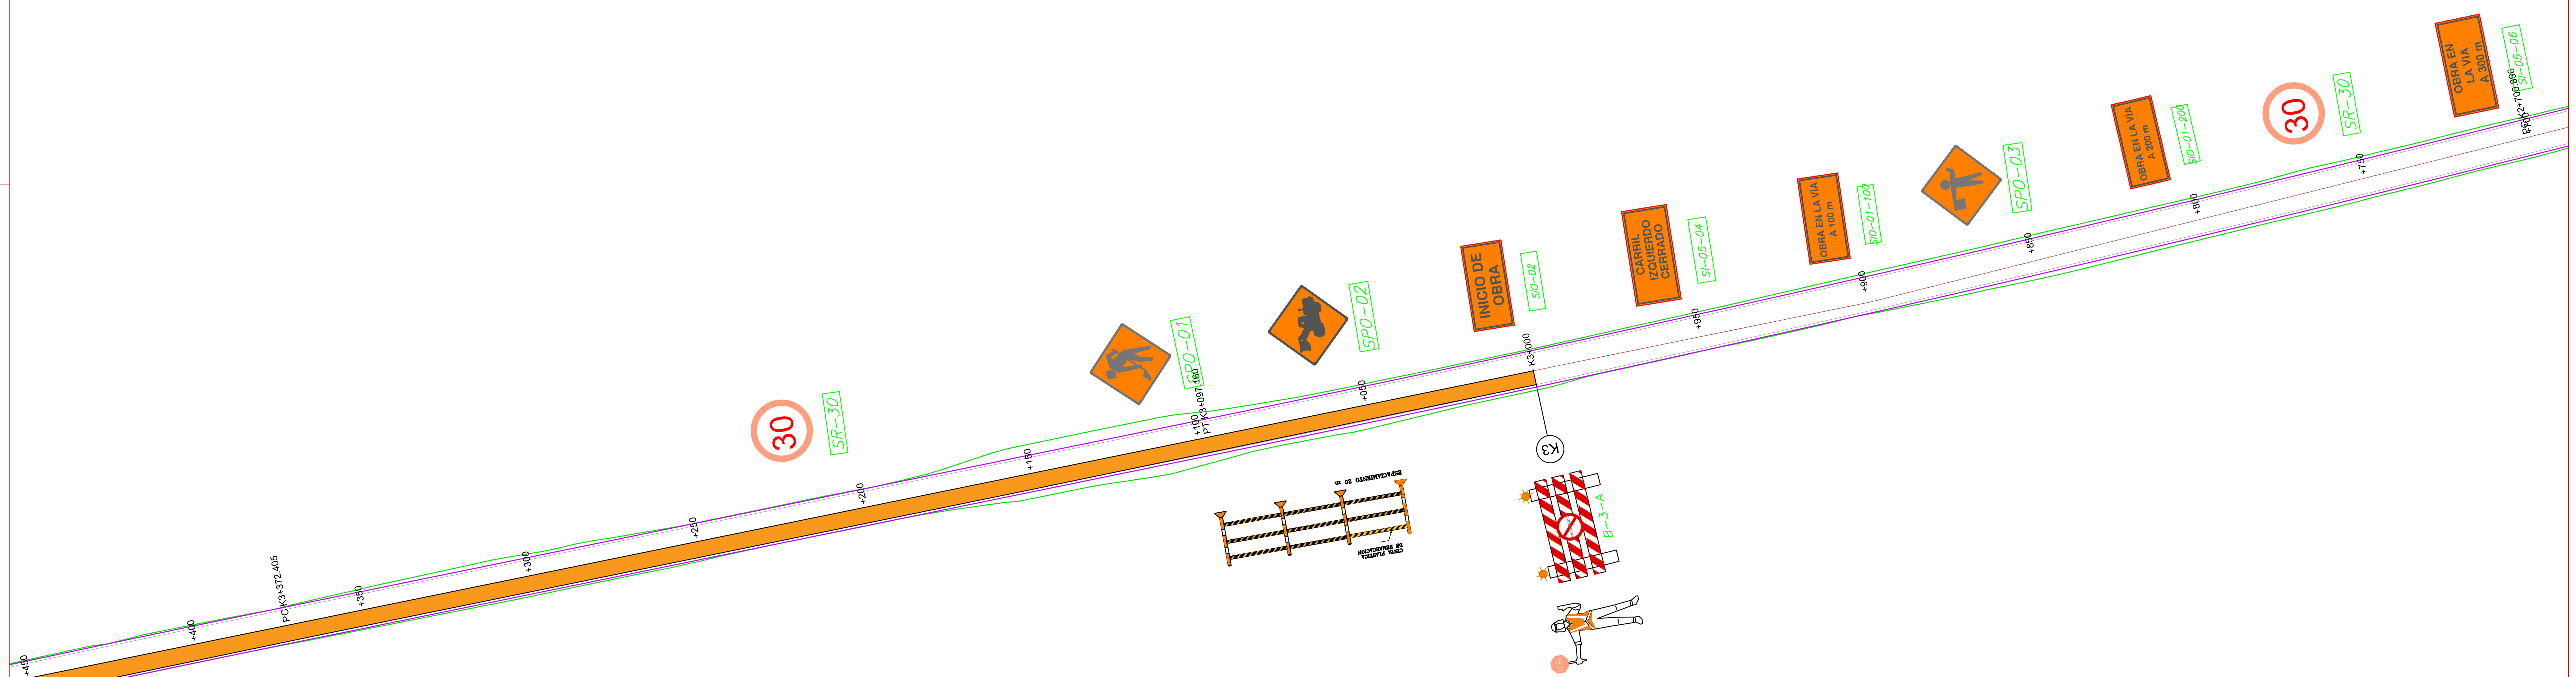

CONVENCIONES

Cerramiento de Obra (CINTA PLASTICA DE DEMARCACION – ESPACIAMIENTO 20 m)

Obra Ejecutada

Sendero Peatonal

Barricada

Señal Vertical Nueva a Instalar

Luz Intermitente

Notas:

Nota: La señalización Reglamentaria, Informativa y Preventiva para el Plan de Manejo de transito se instalara conforme a la especificaciones y normatividad vigente el manual de Señalización Vial "Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia de 2024

La implementación del PMT se planteó para tramos de construcción de 250 m, utilizando la mitad de la calzada para ejecución de obras y mitad de calzada para el transito bidireccional de vehículos, teniendo reguladores de tránsito en los inicios y finales de obra.

Las señales verticales se deben construir sobre plataformas trasladables (No enteradas), dado la dinámica de construcción de este tipo de proyectos lineales

CONTRATANTE	DISEÑO / REVISÓ	INTERVENTORIA:	REVISIONES	PROYECTO:	CONTIENE:	ESCALA / FECHA	PLANCHA / CÓDIGO / ARCHIVO
ALCALDÍA DE MANAURE JUAN CARLOS ARAUJO OROZCO Alcalde	DISEÑO: LUIS ALEJANDRO OSIO CHURIO CC.1065621145 REVISÓ: LUIS ALEJANDRO OSIO CHURIO CC.1065621145		No. 0 – VERSION INICIAL – FECHA OCT-2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TIERRA GRATA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, CESAR	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO FRENTE DE TRABAJO 1	ESCALA: H: 1:1000 V: 1:100 FECHA: JULIO DE 2025	PLANCHA: 1 DE 1 CÓDIGO: PMT_01 ARCHIVO: Plano PMT Tierra Grata.dwg
