Bogotá D.C., 11 de febrero de 2026

Bogotá, Colombia **ANM-INT-002**
Señores
Agencia Nacional de Minería
Supervisión de contrato
Octavio Serrano Suarez
Ciudad

ASUNTO: AVAL PRORROGA CTO OBRA ANM-839-2025 Y SOLICITUD PRORROGA CTO ANM-844-2025

Respetados señores ANM,

En mi calidad de Representante Legal de ENEVAL SAS, actuando como interventoría del Contrato de Obra No. ANM-839-2025, cuyo objeto es la adecuación y mantenimiento de las Estaciones de Seguridad y Salvamiento Minero, me permito presentar el aval a la solicitud de prórroga remitida por el contratista CONSORCIO VENTURA GROUP mediante el oficio CVG-ANM-002-2026 y teniendo en cuenta las razones expuestas por el contratista:

Dadas algunas circunstancias que impedían el normal desarrollo de las actividades del contrato de obra en el mes de diciembre, de común acuerdo entre las partes, este contrato en mención fue suspendido desde el 12 de diciembre de 2025 hasta el 15 de febrero de 2026, previsto reiniciar el 16 de febrero de 2026.

Es importante mencionar que la suspensión se originó, entre otros aspectos, por las dificultades logísticas propias de las festividades de fin e inicio de año, comprendidas entre los meses de diciembre y enero, periodo durante el cual se presentaba una alta complejidad en la adquisición y transporte de materiales de obra, así como en la disponibilidad del personal operativo y profesional requerido para la ejecución de las actividades. Dicha situación, a la fecha, ya ha sido superada.

No obstante, dadas las circunstancias contractuales, administrativas y técnicas que se presentaron desde el inicio del contrato y luego del plazo remanente que se cuenta a partir del reinicio de este previsto para el 16 de febrero de 2026, este plazo remanente del contrato, es decir, hasta el 19 de febrero de 2026, se constituye como insuficiente ya que las actividades relacionadas con la ejecución de las obras requirieren de cuarenta y cinco (45) días calendario de acuerdo al cronograma y a la oferta presentada ante la entidad, plazo del cual únicamente se han ejecutado siete (7) días a partir del acta de inicio desde la fecha del acta de inicio del 05 de diciembre de 2025. Por lo anterior, se establece que se hace necesario prorrogar el contrato de obra por los treinta y cuatro (34) días para el cumplimiento integral y exitoso del contrato.

Otro aspecto a tener en cuenta es que durante el desarrollo de los diagnósticos técnicos y la elaboración de los presupuestos preliminares, se evidenció la necesidad real de intervención en cada una de las sedes, las cuales comprenden algunas actividades que no se encontraban inicialmente contempladas dentro del presupuesto contractual, razón por la cual resulta necesario evaluar su inclusión como ítems no previstos, con el fin de atender las necesidades reales de cada sede y garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, por lo que el plazo adicional solicitado cubriría los aspectos que entran a formar parte para una idónea inclusión de los ítems o actividades no previstas antes mencionados.

Finalmente, manifestamos que la presente solicitud se presenta dentro del período de suspensión contractual, teniendo en cuenta que, a la fecha prevista para la reanudación del contrato posterior a la suspensión, únicamente restan cuatro (4) días hábiles del plazo vigente. En consecuencia, se hace necesario ajustar el término de ejecución para garantizar la correcta y oportuna culminación de las actividades contractuales.

Dado lo anterior, solicitamos respetuosamente se trámite la PRÓRROGA No. 1 del plazo contractual por el término correspondiente al tiempo pendiente de ejecución, el cual comprende treinta y cuatro (34) días, contados a partir del 20 de febrero de 2026 hasta el 25 de marzo de 2026, sin modificación del valor inicialmente pactado, con el fin de garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.

Por último, se informa que la prórroga solicitada no requiere de adición de recursos.

RECOMENDACIÓN Y SOLICITUD

Considerando que el contrato se encuentra suspendido hasta el 15 de febrero de 2026 y que el plazo vigente vence el 19 de febrero, esta Interventoría avala y solicita formalmente la prorroga No. 1 por un término de treinta y cuatro (34) días calendario, contados a partir del 20 de febrero de 2026, fijando como nueva fecha de terminación el 25 de marzo de 2026.

Es importante resaltar que esta prórroga no implica una modificación en el valor inicialmente pactado, asegurando la culminación oportuna de los trabajos bajo los principios de eficiencia y calidad.

Adicionalmente, considerando que las actividades de seguimiento y control deben ser permanentes hasta el recibo a satisfacción de las obras, y teniendo en cuenta que la ejecución del contrato de obra No. ANM-839-2025 se extenderá hasta el 25 de marzo de 2026 , solicitamos formalmente a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM la prórroga del contrato de interventoría No. ANM-844-2025 por el mismo periodo de tiempo desde el 20 de febrero de 2026, fijando como nueva fecha de terminación el 25 de marzo de 2026.
Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar el acompañamiento técnico, administrativo y legal durante los treinta y cuatro (34) días calendario de ampliación del plazo de ejecución de la obra, asegurando así la correcta culminación de los trabajos y las intervenciones, del contrato de obra. Al igual que el contrato de obra la prórroga de interventoría no requiere adición de recursos.
Agradeciendo su atención para con nuestra firma y dispuesto a aclararle personalmente e inmediatamente cualquier inquietud al particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Sebastian Rios Garcia
Representante Legal ENEVAL SAS
Contratista de Interventoria

Bogotá D.C., febrero 10 de 2026 CVG-ANM-003-2026

PARA: SEBASTIAN RIOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL.
ENEVAL SAS
Nit. 901.435.513-2
INTERVENTORÍA

DE: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN. REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO VENTURA GROUP
Nit. 902.005.706-6
CONTRATISTA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. ANM-839-2025 OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO DE LA ANM LÍNEA PAA 300008725.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA NO. ANM-839-2025

Respetuoso saludo,

De acuerdo con las obligaciones enmarcadas en el Contrato de Obra No. ANM-839-2025, suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM y el CONSORCIO VENTURA GROUP, cuyo objeto es "REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO DE LA ANM – Línea PAA 300008725" y teniendo en cuenta que se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión del contrato en mención y que estamos listos para reiniciar actividades a partir del 16 de febrero de 2026, nos permitimos solicitar formalmente la PRÓRROGA del plazo contractual, con base en las consideraciones técnicas y administrativas que se exponen a continuación:

Dadas algunas circunstancias que impedían el normal desarrollo de las actividades del contrato de obra en el mes de diciembre, de común acuerdo entre las partes, este contrato en mención fue suspendido desde el 12 de diciembre de 2025 hasta el 15 de febrero de 2026, previsto reiniciar el 16 de febrero de 2026.

Es importante mencionar que la suspensión se originó, entre otros aspectos, por las dificultades logísticas propias de las festividades de fin e inicio de año, comprendidas entre los meses de diciembre y enero, periodo durante el cual se presentaba una alta complejidad en la adquisición y transporte de materiales de obra, así como en la disponibilidad del personal operativo y profesional requerido para la ejecución de las actividades. Dicha situación, a la fecha, ya ha sido superada

No obstante, dadas las circunstancias contractuales, administrativas y técnicas que se presentaron desde el inicio del contrato y luego del plazo remanente que se cuenta a partir del reinicio de este previsto para el 16 de febrero de 2026, este plazo remanente del contrato, es decir, hasta el 19 de febrero de 2026, se constituye como insuficiente ya que las actividades relacionadas con la ejecución de las obras requirieren de cuarenta y cinco (45) días calendario de acuerdo al cronograma y a la oferta presentada ante la entidad, plazo del cual únicamente se han ejecutado siete (7) días a partir del acta de inicio desde la fecha del acta de inicio del 05 de diciembre de 2025. Por lo anterior, se establece que se hace necesario prorrogar el contrato de obra por los treinta y cuatro (34) días para el cumplimiento integral y exitoso del contrato.

Otro aspecto a tener en cuenta es que durante el desarrollo de los diagnósticos técnicos y la elaboración de los presupuestos preliminares, se evidenció la necesidad real de intervención en cada una de las sedes, las cuales comprenden algunas actividades que no se encontraban inicialmente contempladas dentro del presupuesto contractual, razón por la cual resulta necesario evaluar su inclusión como ítems no previstos, con el fin de atender las necesidades reales de cada sede y garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, por lo que el plazo adicional solicitado cubriría los aspectos que entran a formar parte para una idónea inclusión de los ítems o actividades no previstas antes mencionados.

Finalmente, manifestamos que la presente solicitud se presenta dentro del período de suspensión contractual, teniendo en cuenta que, a la fecha prevista para la reanudación del contrato posterior a la suspensión, únicamente restan cuatro (4) días hábiles del plazo vigente. En consecuencia, se hace necesario ajustar el término de ejecución para garantizar la correcta y oportuna culminación de las actividades contractuales.

Dado lo anterior, solicitamos respetuosamente se trámite la PRÓRROGA No. 1 del plazo contractual por el término correspondiente al tiempo pendiente de ejecución, el cual comprende treinta y cuatro (34) días, contados a partir del 20 de febrero de 2026 hasta el 25 de marzo de 2026, sin modificación del valor inicialmente pactado, con el fin de garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.

Por último, se informa que la prórroga solicitada no requiere de adición de recursos.

Agradecemos su atención y quedamos atentos ante cualquier requerimiento adicional,

Cordialmente,



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA GROUP
Contratista.


PROGRAMACIÓN JAMUNDI

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1						
2		**MADERA**				
3		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ALEMANAS DE DIENTE SENCILLO EN MADERA ROLLIZA INMUNIZADA, Ø=20 CMS; LONGITUD MAXIMA PALANCA:2,50 M. LONGITUG MAXIMA CAPIZ:1.80	13 días	lun 9/03/26	mié 25/03/26	
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLA BURRA INMUNIZADA Y CEPILLADA AMBAS CARAS (TABLA 2,50 M X 3/4" X 0,2 M)	13 días	lun 9/03/26	mié 25/03/26	
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE LONGITUD 1.20 M. Y Ø=10CM, PARTIDA EN DOS PARA FORRO	13 días	lun 9/03/26	mié 25/03/26	
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE Ø=15CM	13 días	lun 9/03/26	mié 25/03/26	
7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE Ø=20 CM	13 días	lun 9/03/26	mié 25/03/26	
8		DESMONTE DE MADERA ROLLIZA (Incluye retiro y disposición final)	13 días	lun 9/03/26	mié 25/03/26	
9		DESMONTE DE MADERA TABLA BURRA (Incluye retiro y disposición final)	13 días	lun 9/03/26	mié 25/03/26	
10		**CARPINTERIA METALICA**				
11		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	
12		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA				
13		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	
14		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADU				
15		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADU	3 días	lun 2/03/26	mié 4/03/26	
16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILL	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	
17		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUER	5 días	lun 2/03/26	vie 6/03/26	
18		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENT	4 días	lun 2/03/26	jue 5/03/26	
19		**RED ELECTRICA E ILUMINACION**				
20		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINAR	4 días	jue 26/02/26	mar 3/03/26	
21		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINAR	2 días	jue 26/02/26	vie 27/02/26	
22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA	10 días	jue 26/02/26	mié 11/03/26	
23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA	10 días	jue 26/02/26	mié 11/03/26	
24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CC	2 días	mar 3/03/26	mié 4/03/26	
25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CC	2 días	mar 3/03/26	mié 4/03/26	
26		**RED HIDROSANITARIA**				
27		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PAI	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	
28		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	
29		**ACABADOS**				
30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA	20 días	sáb 21/02/26	jue 19/03/26	
31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA	20 días	sáb 21/02/26	jue 19/03/26	
32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE I	20 días	mié 18/02/26	mar 17/03/26	
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PISOS				
34		**IMPERMEABILIZACION**				
35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO A	5 días	sáb 28/02/26	jue 5/03/26	
36		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERME	10 días	jue 26/02/26	mié 11/03/26	
37		LIMPIEZA DE CUBIERTAS	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26	
38		LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26	
39		**SISTEMAS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VII**				
40		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS	2 días	lun 23/03/26	mar 24/03/26	
41		SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE	2 días	lun 23/03/26	mar 24/03/26	
42		**SEÑALIZACION**				
43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZA	3 días	vie 20/03/26	mar 24/03/26	



Proyecto: PROGRAMACION JA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

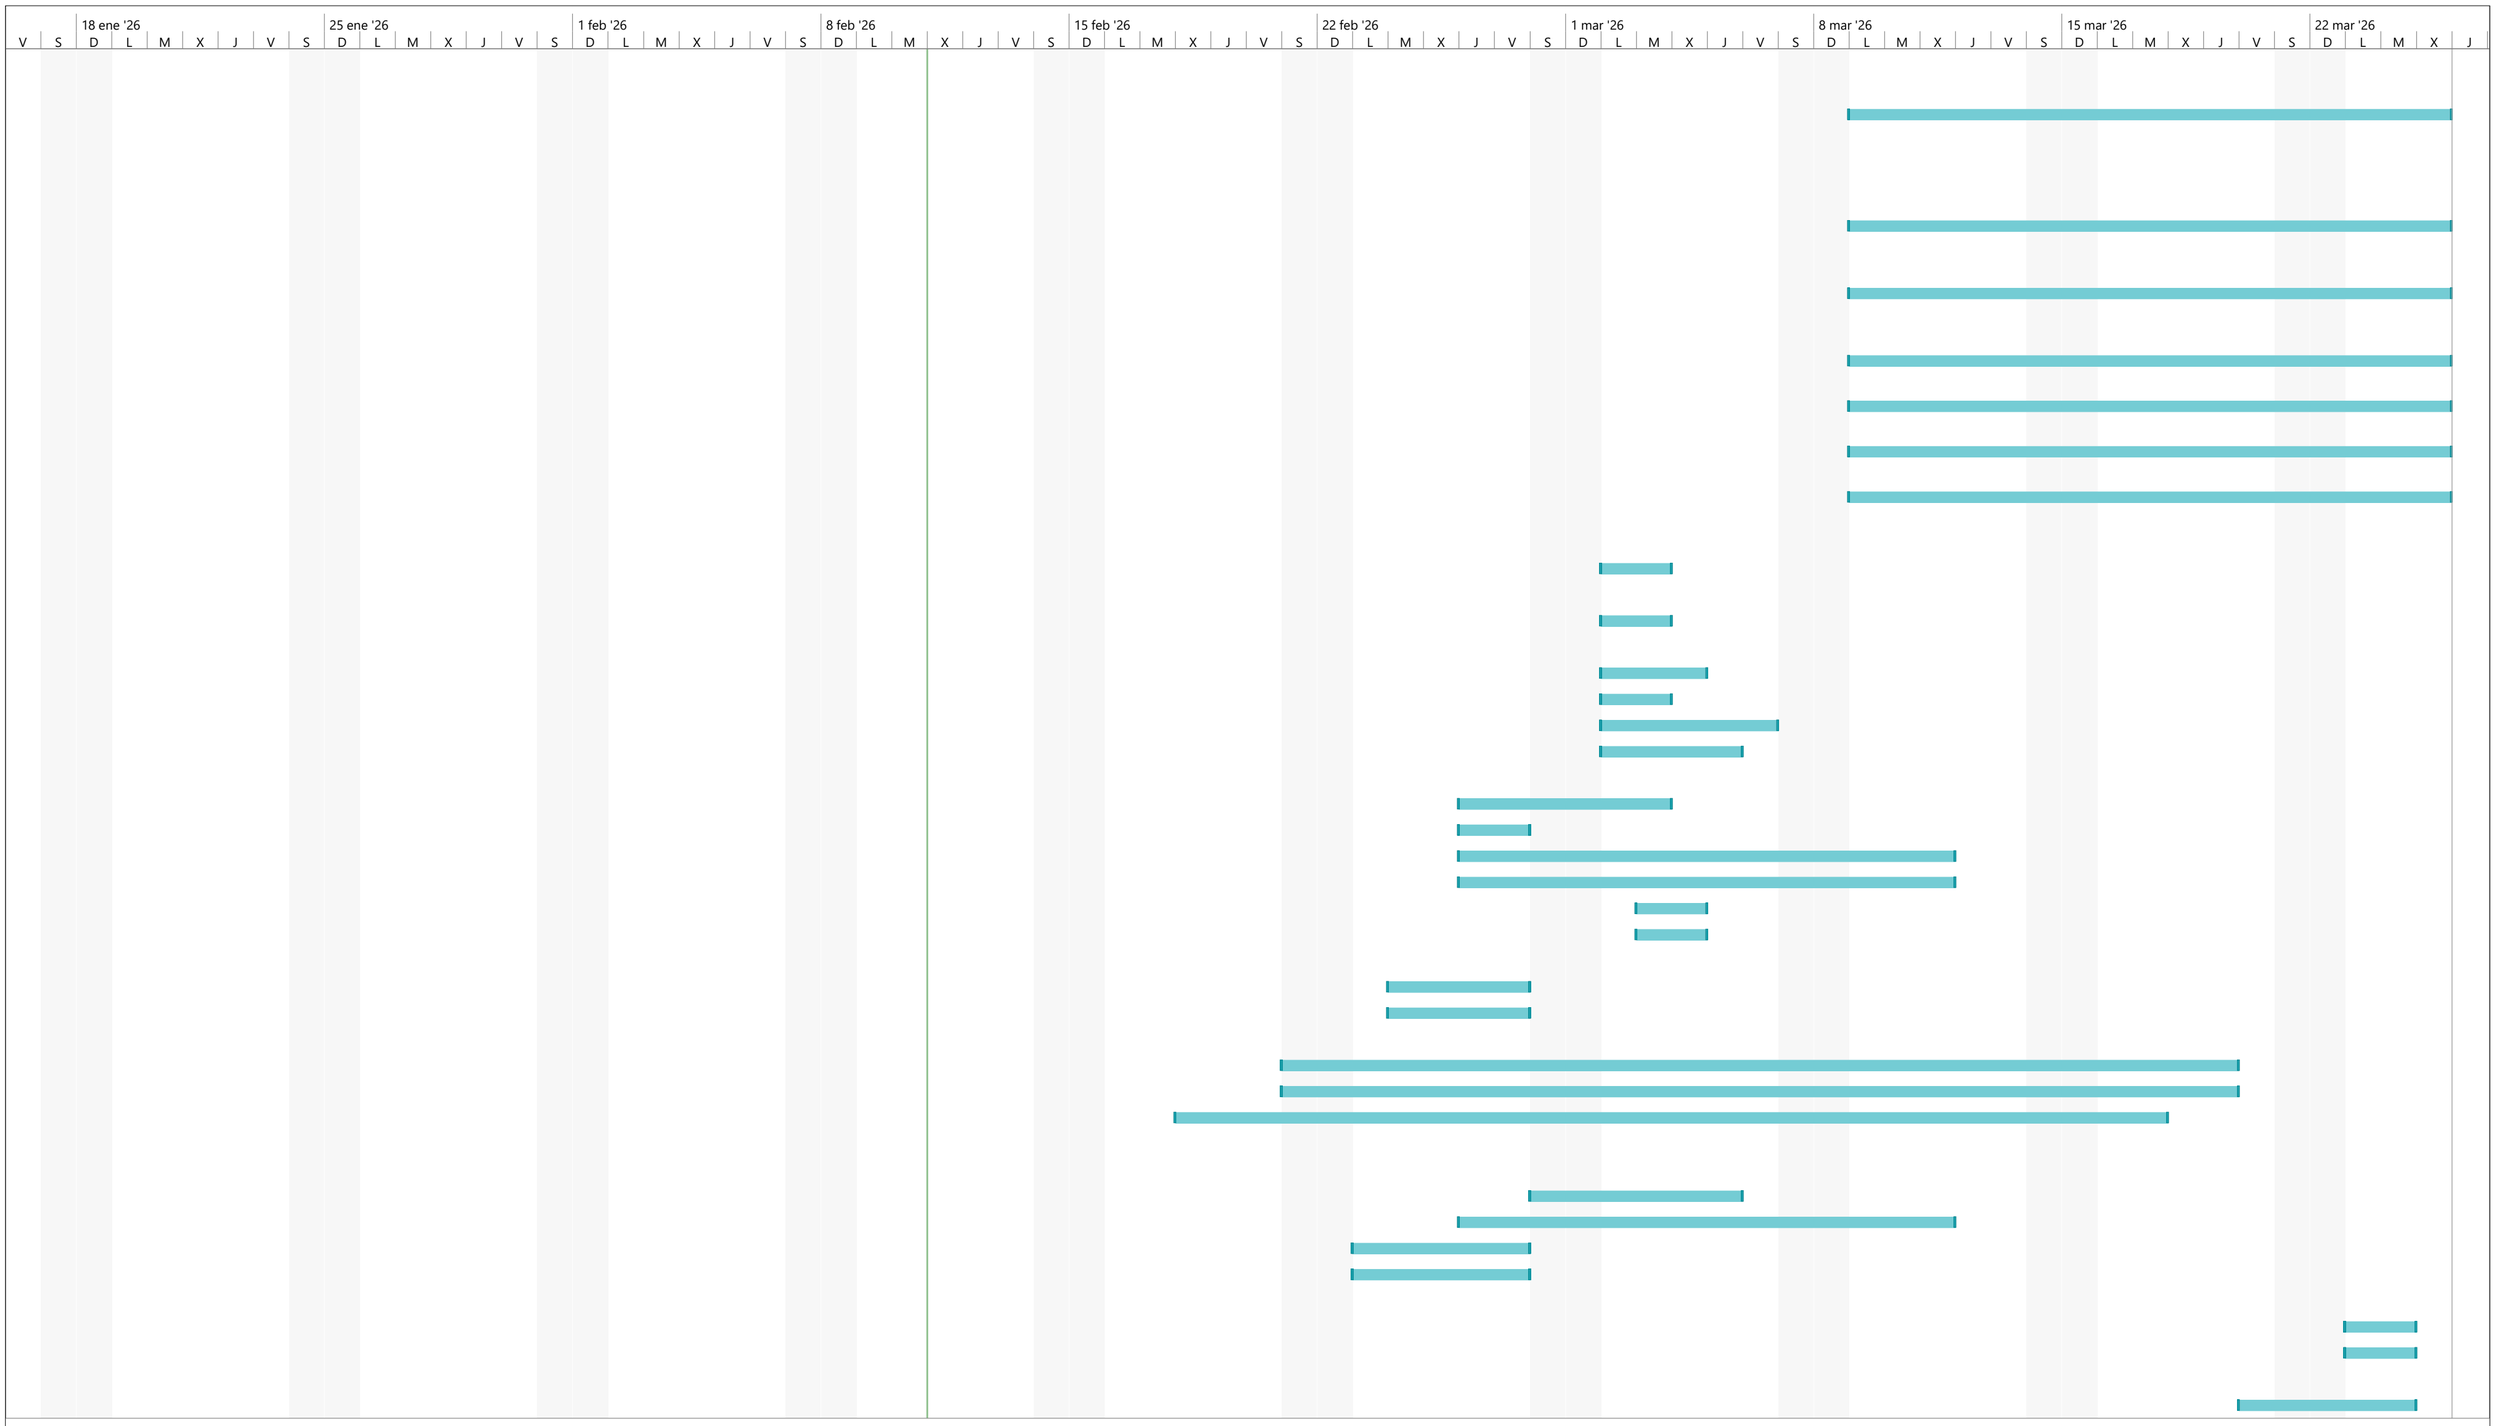


Proyecto: PROGRAMACION JA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


PROGRAMACIÓN NOBSA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1						
2		**MADERA**				
3		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ALEMANAS DE DIENTE SENCILLO EN MADERA ROLLIZA INMUNIZADA, Ø=20 CMS; LONGITUD MAXIMA PALANCA:2,50 M. LONGITUG MAXIMA CAPIZ:1,80	8 días	lun 9/03/26	mié 18/03/26	
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLA BURRA INMUNIZADA Y CEPILLADA AMBAS CARAS (TABLA 2,50 M X	8 días	lun 9/03/26	mié 18/03/26	
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE LONGITUD 1.20 M. Y Ø=10CM, PARTIDA EN DOS PARA FORRO	8 días	lun 9/03/26	mié 18/03/26	
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE Ø=15CM	8 días	lun 9/03/26	mié 18/03/26	
7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE Ø=20 CM	8 días	lun 9/03/26	mié 18/03/26	
8		DESMONTE DE MADERA ROLLIZA (Incluye retiro y disposición final)	8 días	lun 2/03/26	mié 11/03/26	
9		DESMONTE DE MADERA TABLA BURRA (Incluye retiro y disposición final)	8 días	lun 2/03/26	mié 11/03/26	
10		**CARPINTERIA METALICA**				
11		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, CON PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE RESANE Y ACABADOS	3 días	mié 18/03/26	vie 20/03/26	
12		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ANTIPANICO (BARRA ANTIPANICO SENCILLA CON MANIJA	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	
13		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA SOBRE PONER 105 50MM DERECHA O IZQUIERDA	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	
14		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA MANIJA ALCOBA	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLAS DE TECHO EN ACERO GALVANIZADO EN 3 MM 0,74 X 0,95	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	
16		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS (INCLUYE REPUESTOS Y PINTURA)	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	
17		**RED ELECTRICA E ILUMINACION**				
18		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA EXTERIORES DE APLIQUE TIPO TORTUGA DE 12W	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	
19		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W DE 1.20 M	5 días	lun 2/03/26	vie 6/03/26	
20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	7 días	lun 2/03/26	mar 10/03/26	
21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB). INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	7 días	lun 2/03/26	mar 10/03/26	
22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTES INDUSTRIALES BIFASICA	3 días	lun 2/03/26	mié 4/03/26	
23		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES PLASTICOS CERTIFICADO (INCLUYE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA Y EXTRACCION DE LODOS)	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26	
24		SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	4 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26	
25		**ACABADOS**				
26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 INTERIOR TRES (3) MANOS SOBRE ACABADO, INCLUYE RESANE	10 días	mié 18/02/26	mar 3/03/26	
27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 PARA ESCALERA DE CARACOL INTERIOR TRES (3) MANOS	10 días	mié 18/02/26	mar 3/03/26	
28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO DE CUBIERTA EXTERIOR (e= 2,3 CM)	10 días	lun 16/02/26	vie 27/02/26	
29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PISOS BASE DE AIRE FRESCO EN TABLETA EN ARCILLA	10 días	mar 17/02/26	lun 2/03/26	
30		**IMPERMEABILIZACION**				
31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	20 días	lun 23/02/26	vie 20/03/26	
32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA	20 días	vie 20/02/26	jue 19/03/26	
33		LIMPIEZA DE CUBIERTAS	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/2	
34		LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	3 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26	
35		**SISTEMAS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA**				
36		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS CERTIFICADOS	2 días	lun 23/03/26	mar 24/03/26	
37		SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA CERTIFICADA PARA ESCALERA EXTERIOR	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	
38		**SEÑALIZACION**				
39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA REFLECTIVA, DE ACUERDO	2 días	lun 23/03/26	mar 24/03/26	

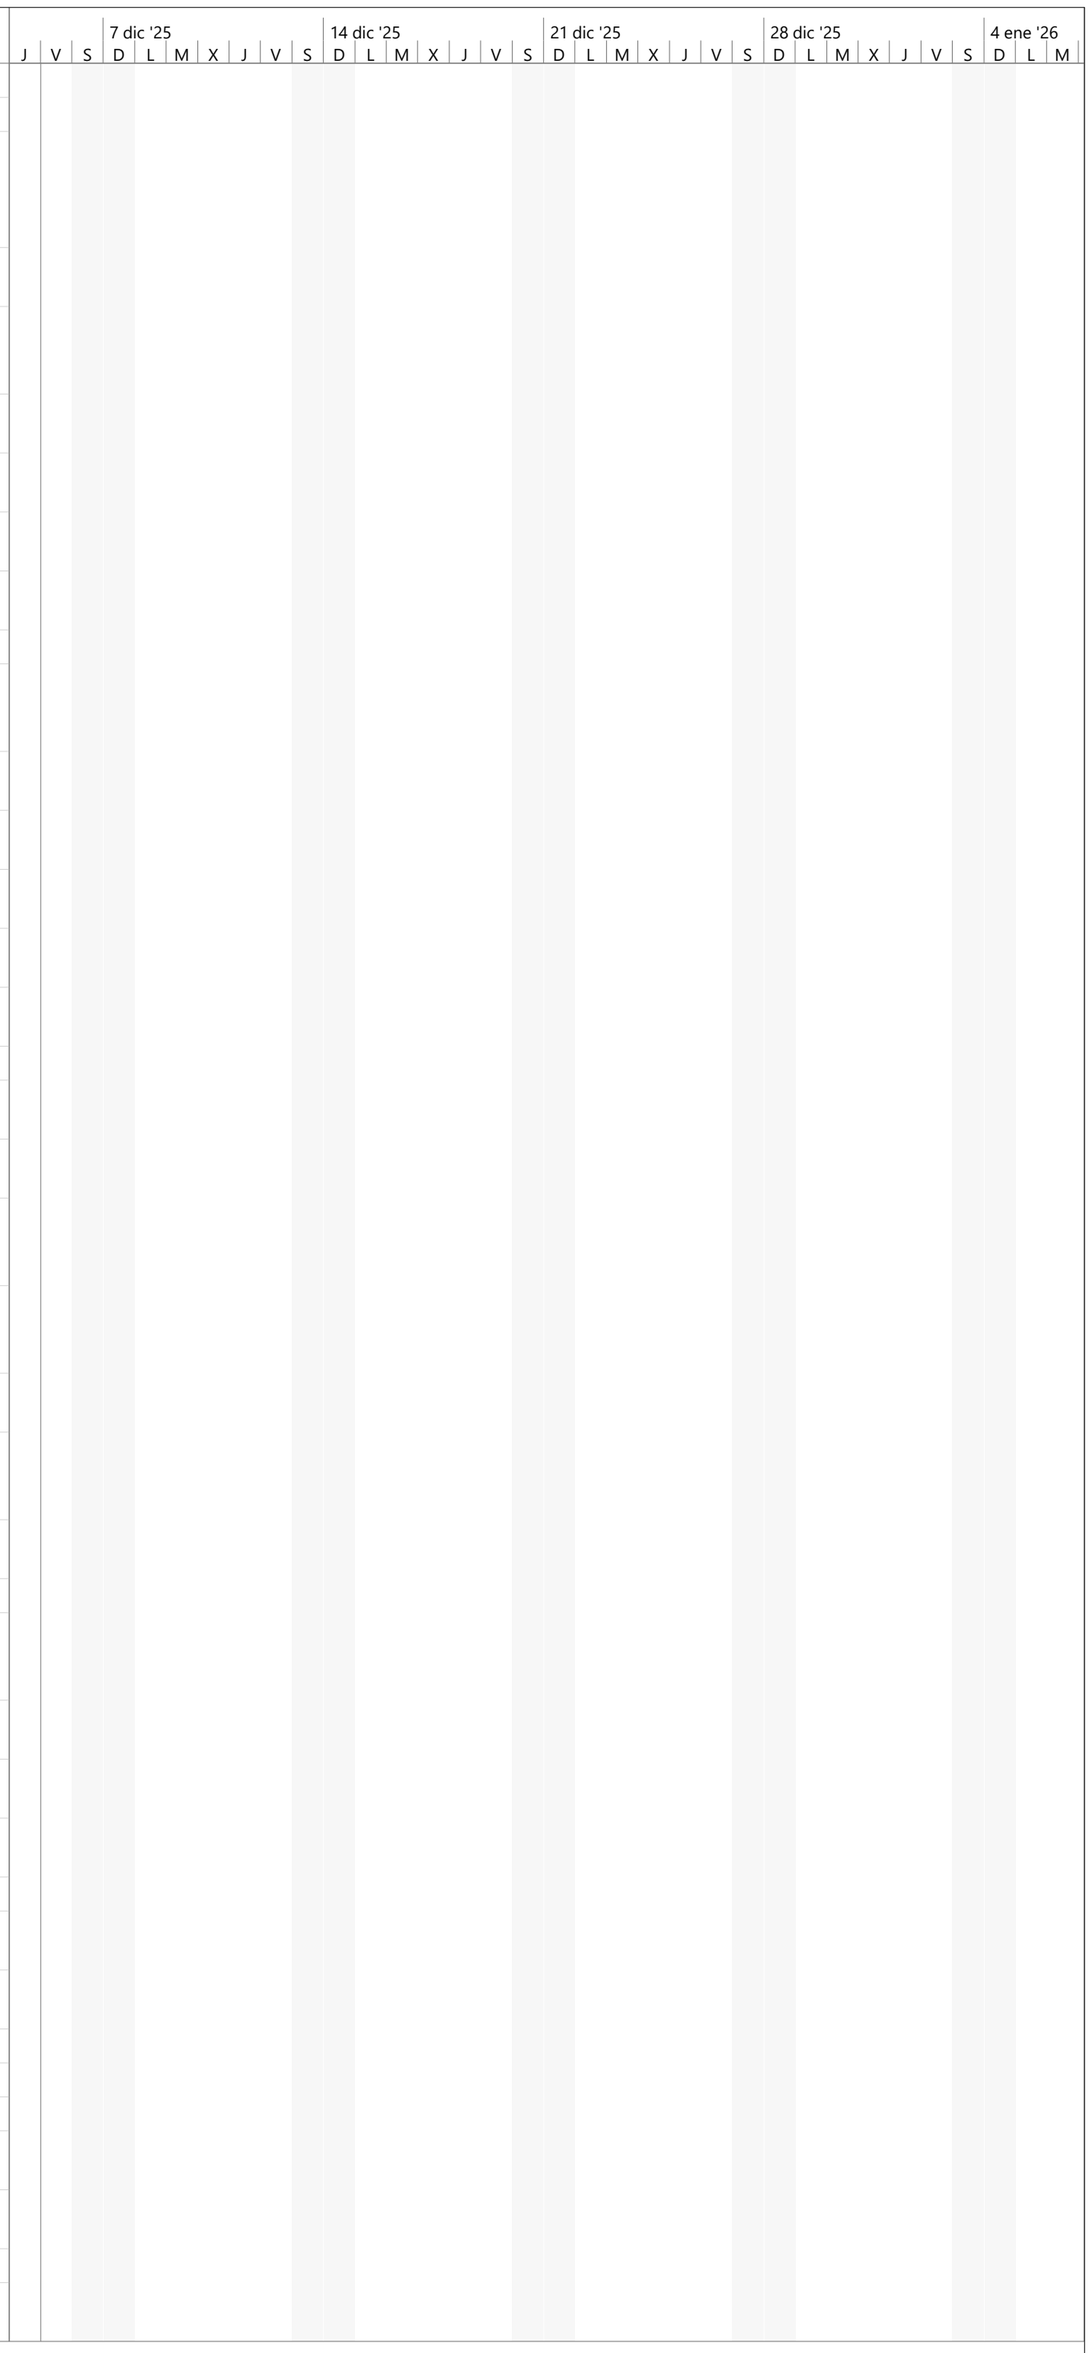

Proyecto: PROGRAMACION NO
Fecha: mié 11/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

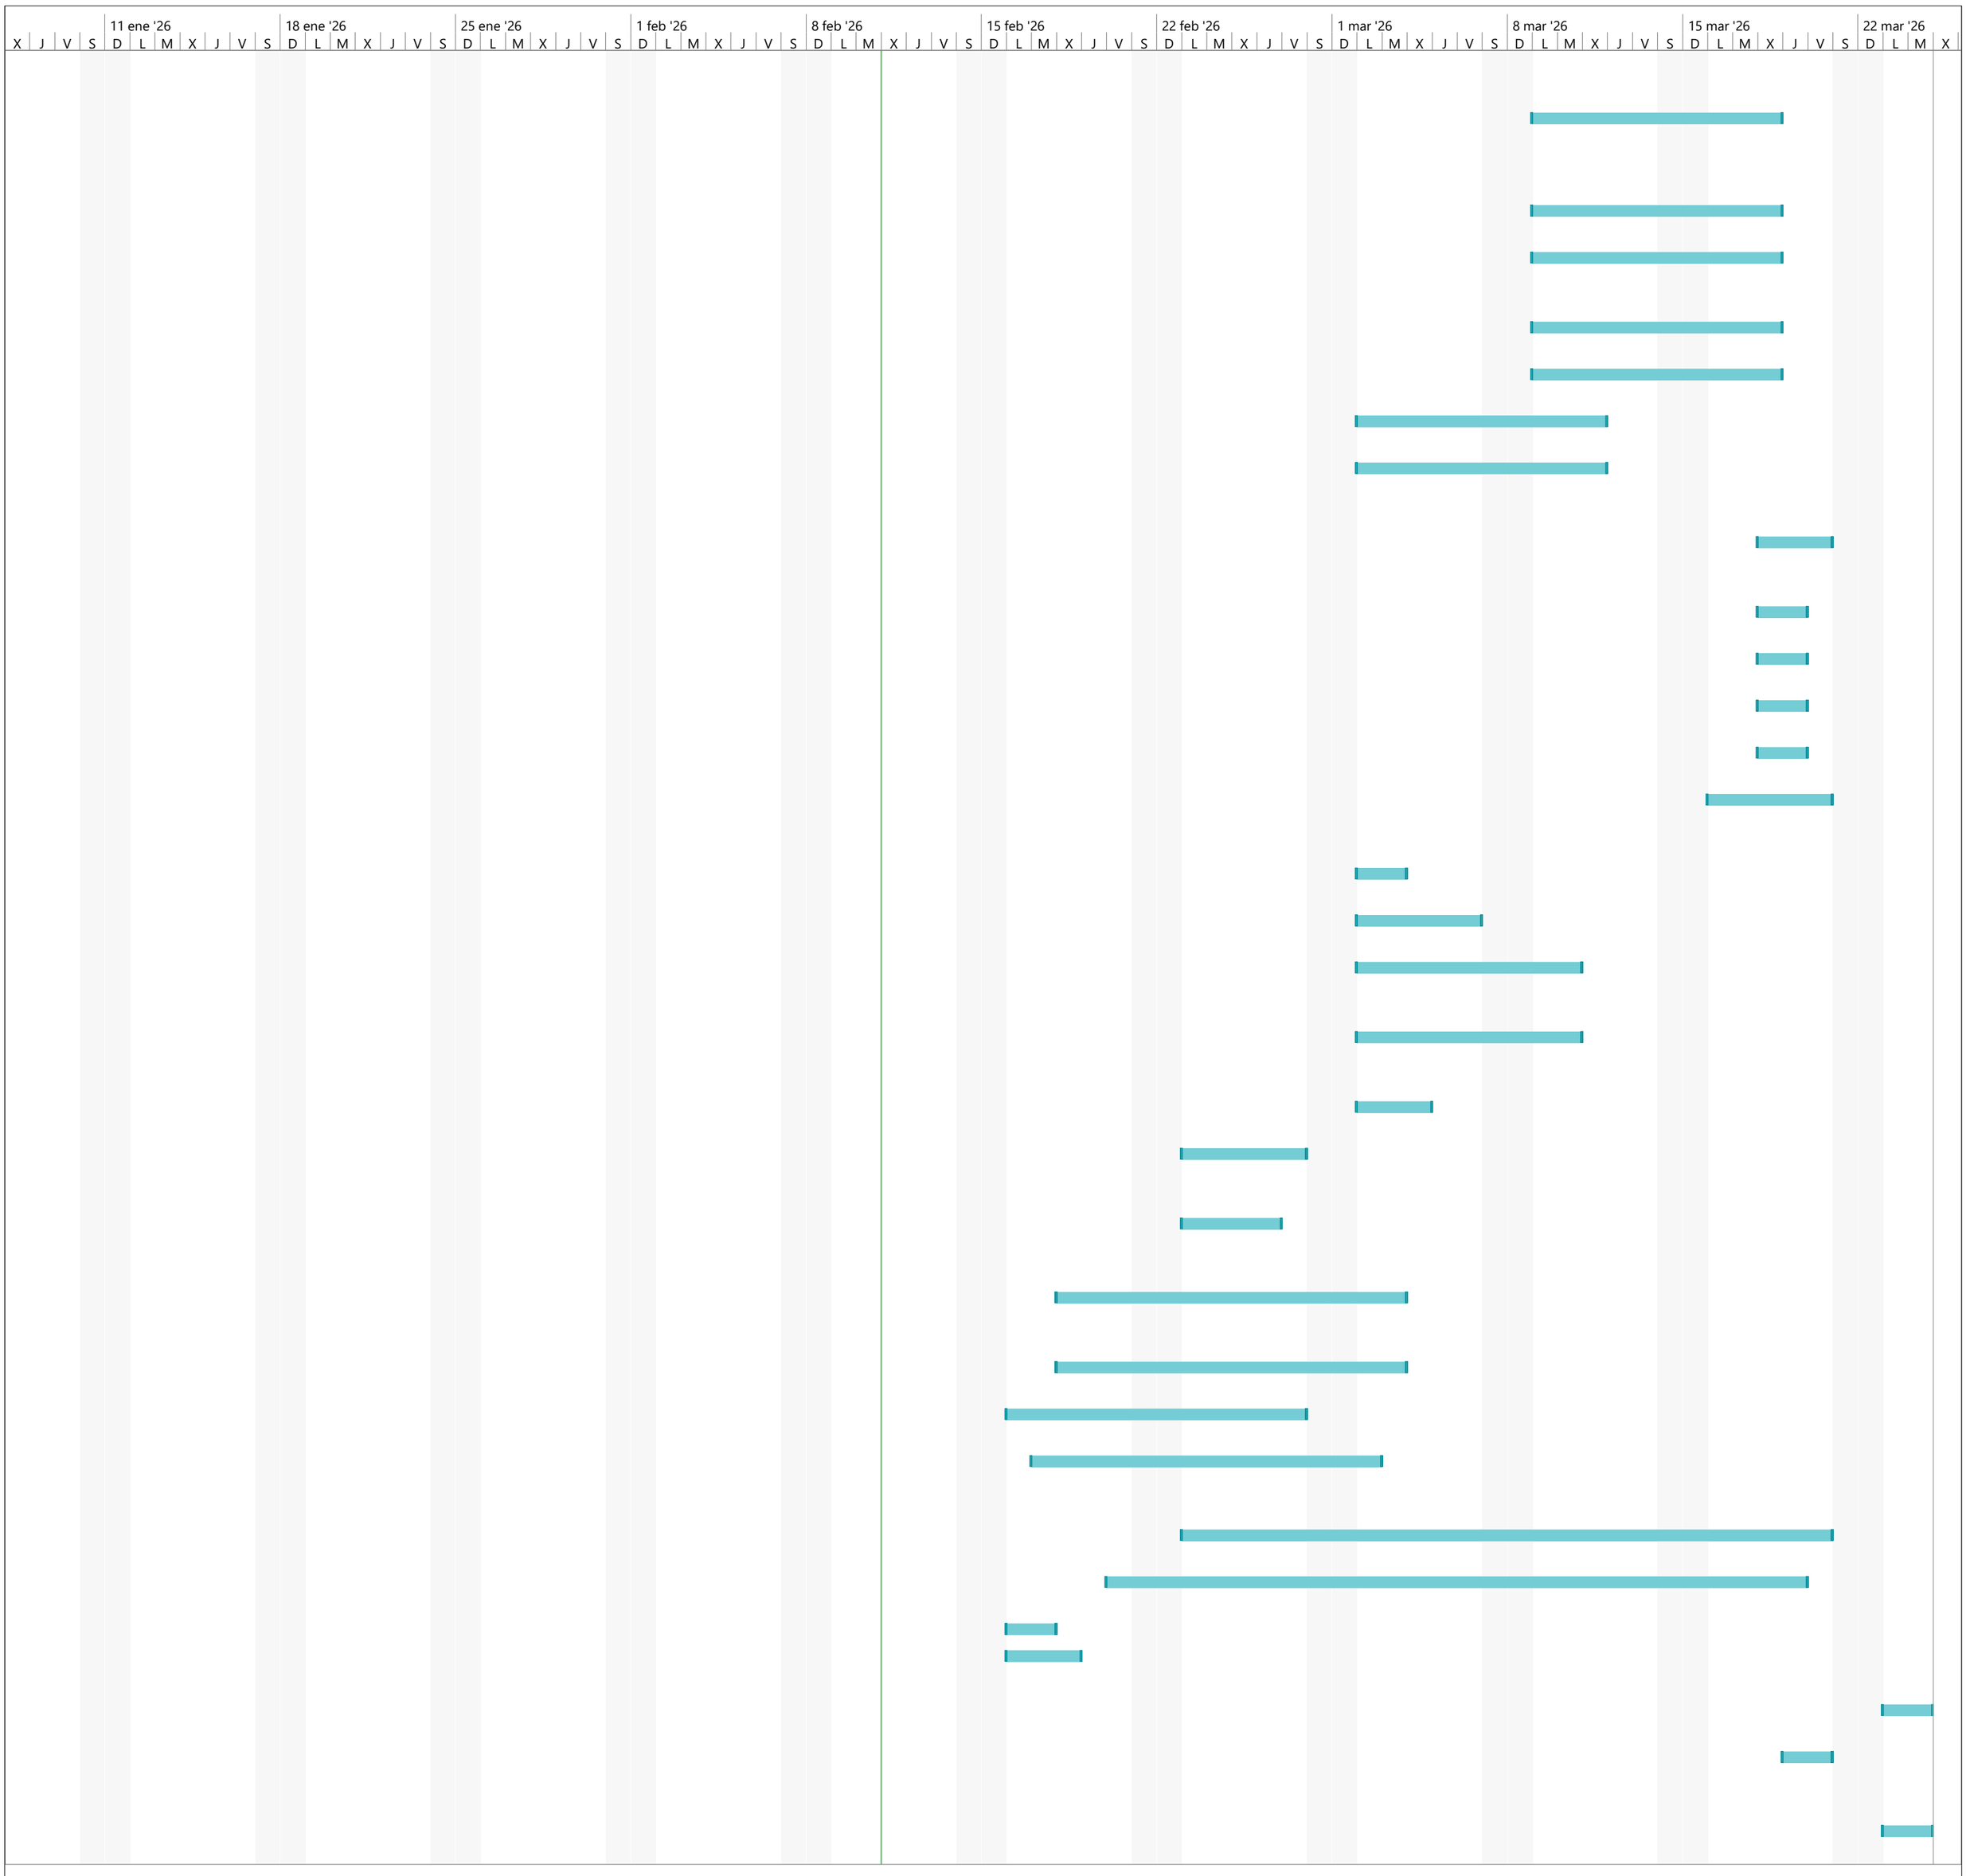


Proyecto: PROGRAMACION NO
Fecha: mié 11/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


PROGRAMACIÓN EL ZULIA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1				
2		**MADERA**		
3		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ALEMANAS DE DIENTE SENCILLO EN MADERA ROLLIZA INMUNIZADA, Ø=20 CMS; LONGITUD MAXIMA PALANCA:2,50 M. LONGITUG MAXIMA CAPIZ:1,80	13 días	lun 9/03/26
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLA BURRA INMUNIZADA Y CEPILLADA AMBAS CARAS (TABLA 2,50 M X 3/4" X 0,2 M.)	13 días	lun 9/03/26
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE LONGITUD 1.20 M. Y Ø=10CM, PARTIDA EN DOS PARA FORRO	13 días	lun 9/03/26
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE Ø=15CM	13 días	lun 9/03/26
7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE Ø=20 CM	13 días	lun 9/03/26
8		DESMONTE DE MADERA ROLLIZA (Incluye retiro y disposición final)	3 días	lun 2/03/26
9		DESMONTE DE MADERA TABLA BURRA (Incluye retiro y disposición final)	3 días	lun 2/03/26
10		**CARPINTERIA METALICA**		
11		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO CON DOBLE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM POLARIZADOS, INCLUYE RESANE Y ACABADOS.		
12		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM, INCLUYE RESANE Y ACABADOS.		
13		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, CON PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE RESANE Y ACABADOS	3 días	mié 18/03/26
14		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ANTIPANICO (BARRA ANTIPANICO SENCILLA CON [illegible])	2 días	mié 18/03/26
15		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA SOBRE PONER 105 50MM DERECHA O IZQUIERDA	2 días	mié 18/03/26
16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLAS DE TECHO EN ACERO GALVANIZADO EN 3 MM 0,74 X 0,95	2 días	mié 18/03/26
17				
18		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS (INCLUYE REPUESTOS Y PINTURA)	5 días	lun 16/03/26
19		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANAS (INCLUYE REPUESTOS Y PINTURA)	5 días	lun 16/03/26
20		**RED ELECTRICA E ILUMINACION**		
21		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA EXTERIORES DE APLIQUE TIPO TORTUGA DE 12W	2 días	lun 2/03/26
22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTES INDUSTRIALES BIFASICA	3 días	lun 2/03/26
23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTES INDUSTRIALES CON LUZ PILOTO	3 días	lun 2/03/26
24		**RED HIDROSANITARIA**		
25		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA SUMINISTRO DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	4 días	lun 23/02/26
26		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES PLASTICOS CERTIFICADO (INCLUYE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA Y EXTRACCION DE LODOS)	5 días	lun 23/02/26
27		SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	4 días	lun 23/02/26
28		**ACABADOS**		
29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 INTERIOR TRES (3) MANOS SOBRE ACABADO, INCLUYE RESANE	10 días	mié 18/02/26
30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 PARA ESCALERA DE CARACOL INTERIOR TRES (3) MANOS	10 días	mié 18/02/26
31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO DE CUBIERTA EXTERIOR (e= 2,3 CM)	10 días	lun 16/02/26
32		**IMPERMEABILIZACION**		
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	20 días	lun 23/02/26
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA	20 días	vie 20/02/26
35		LIMPIEZA DE CUBIERTAS	2 días	lun 16/02/26
36		LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	3 días	lun 16/02/26
37		**SISTEMAS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA**		
38		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS CERTIFICADOS	2 días	lun 23/03/26
39		SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA CERTIFICADA PARA ESCALERA EXTERIOR	2 días	jue 19/03/26
40		**SEÑALIZACION**		
41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA REFLECTIVA, DE ACUERDO A NORMAS	2 días	lun 23/03/26

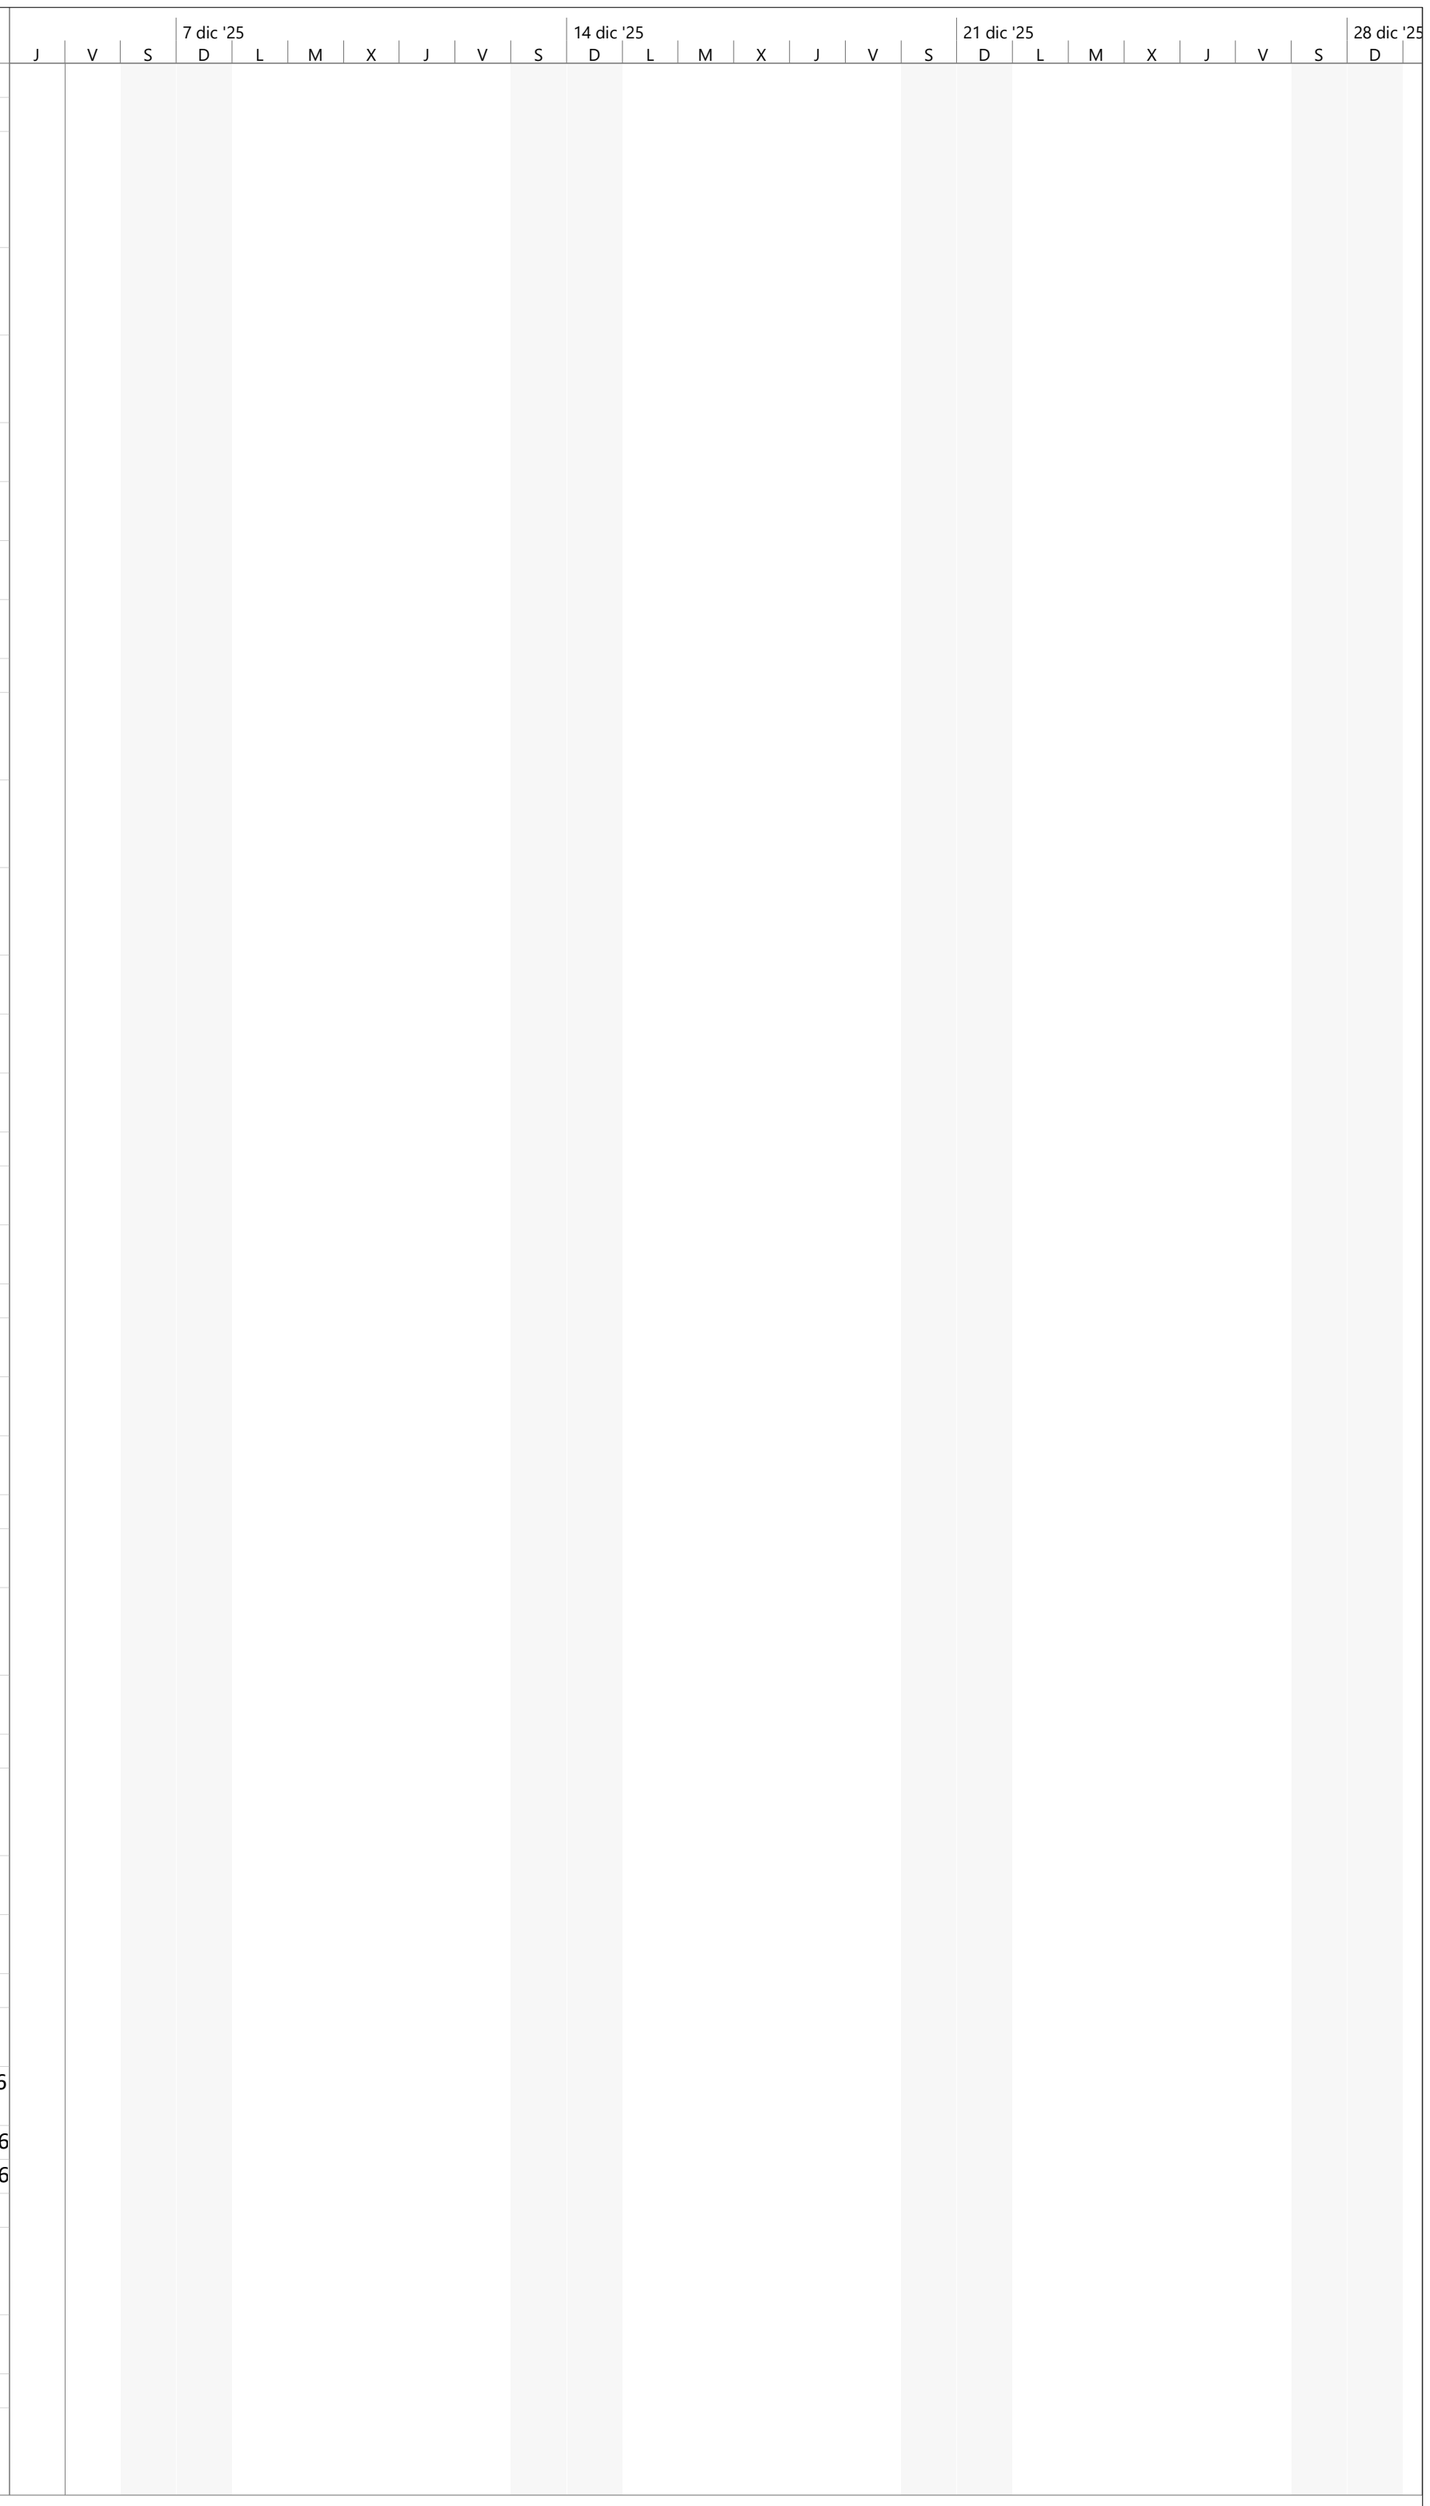

Proyecto: PROGRAMACION ZU
Fecha: mié 11/02/26


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

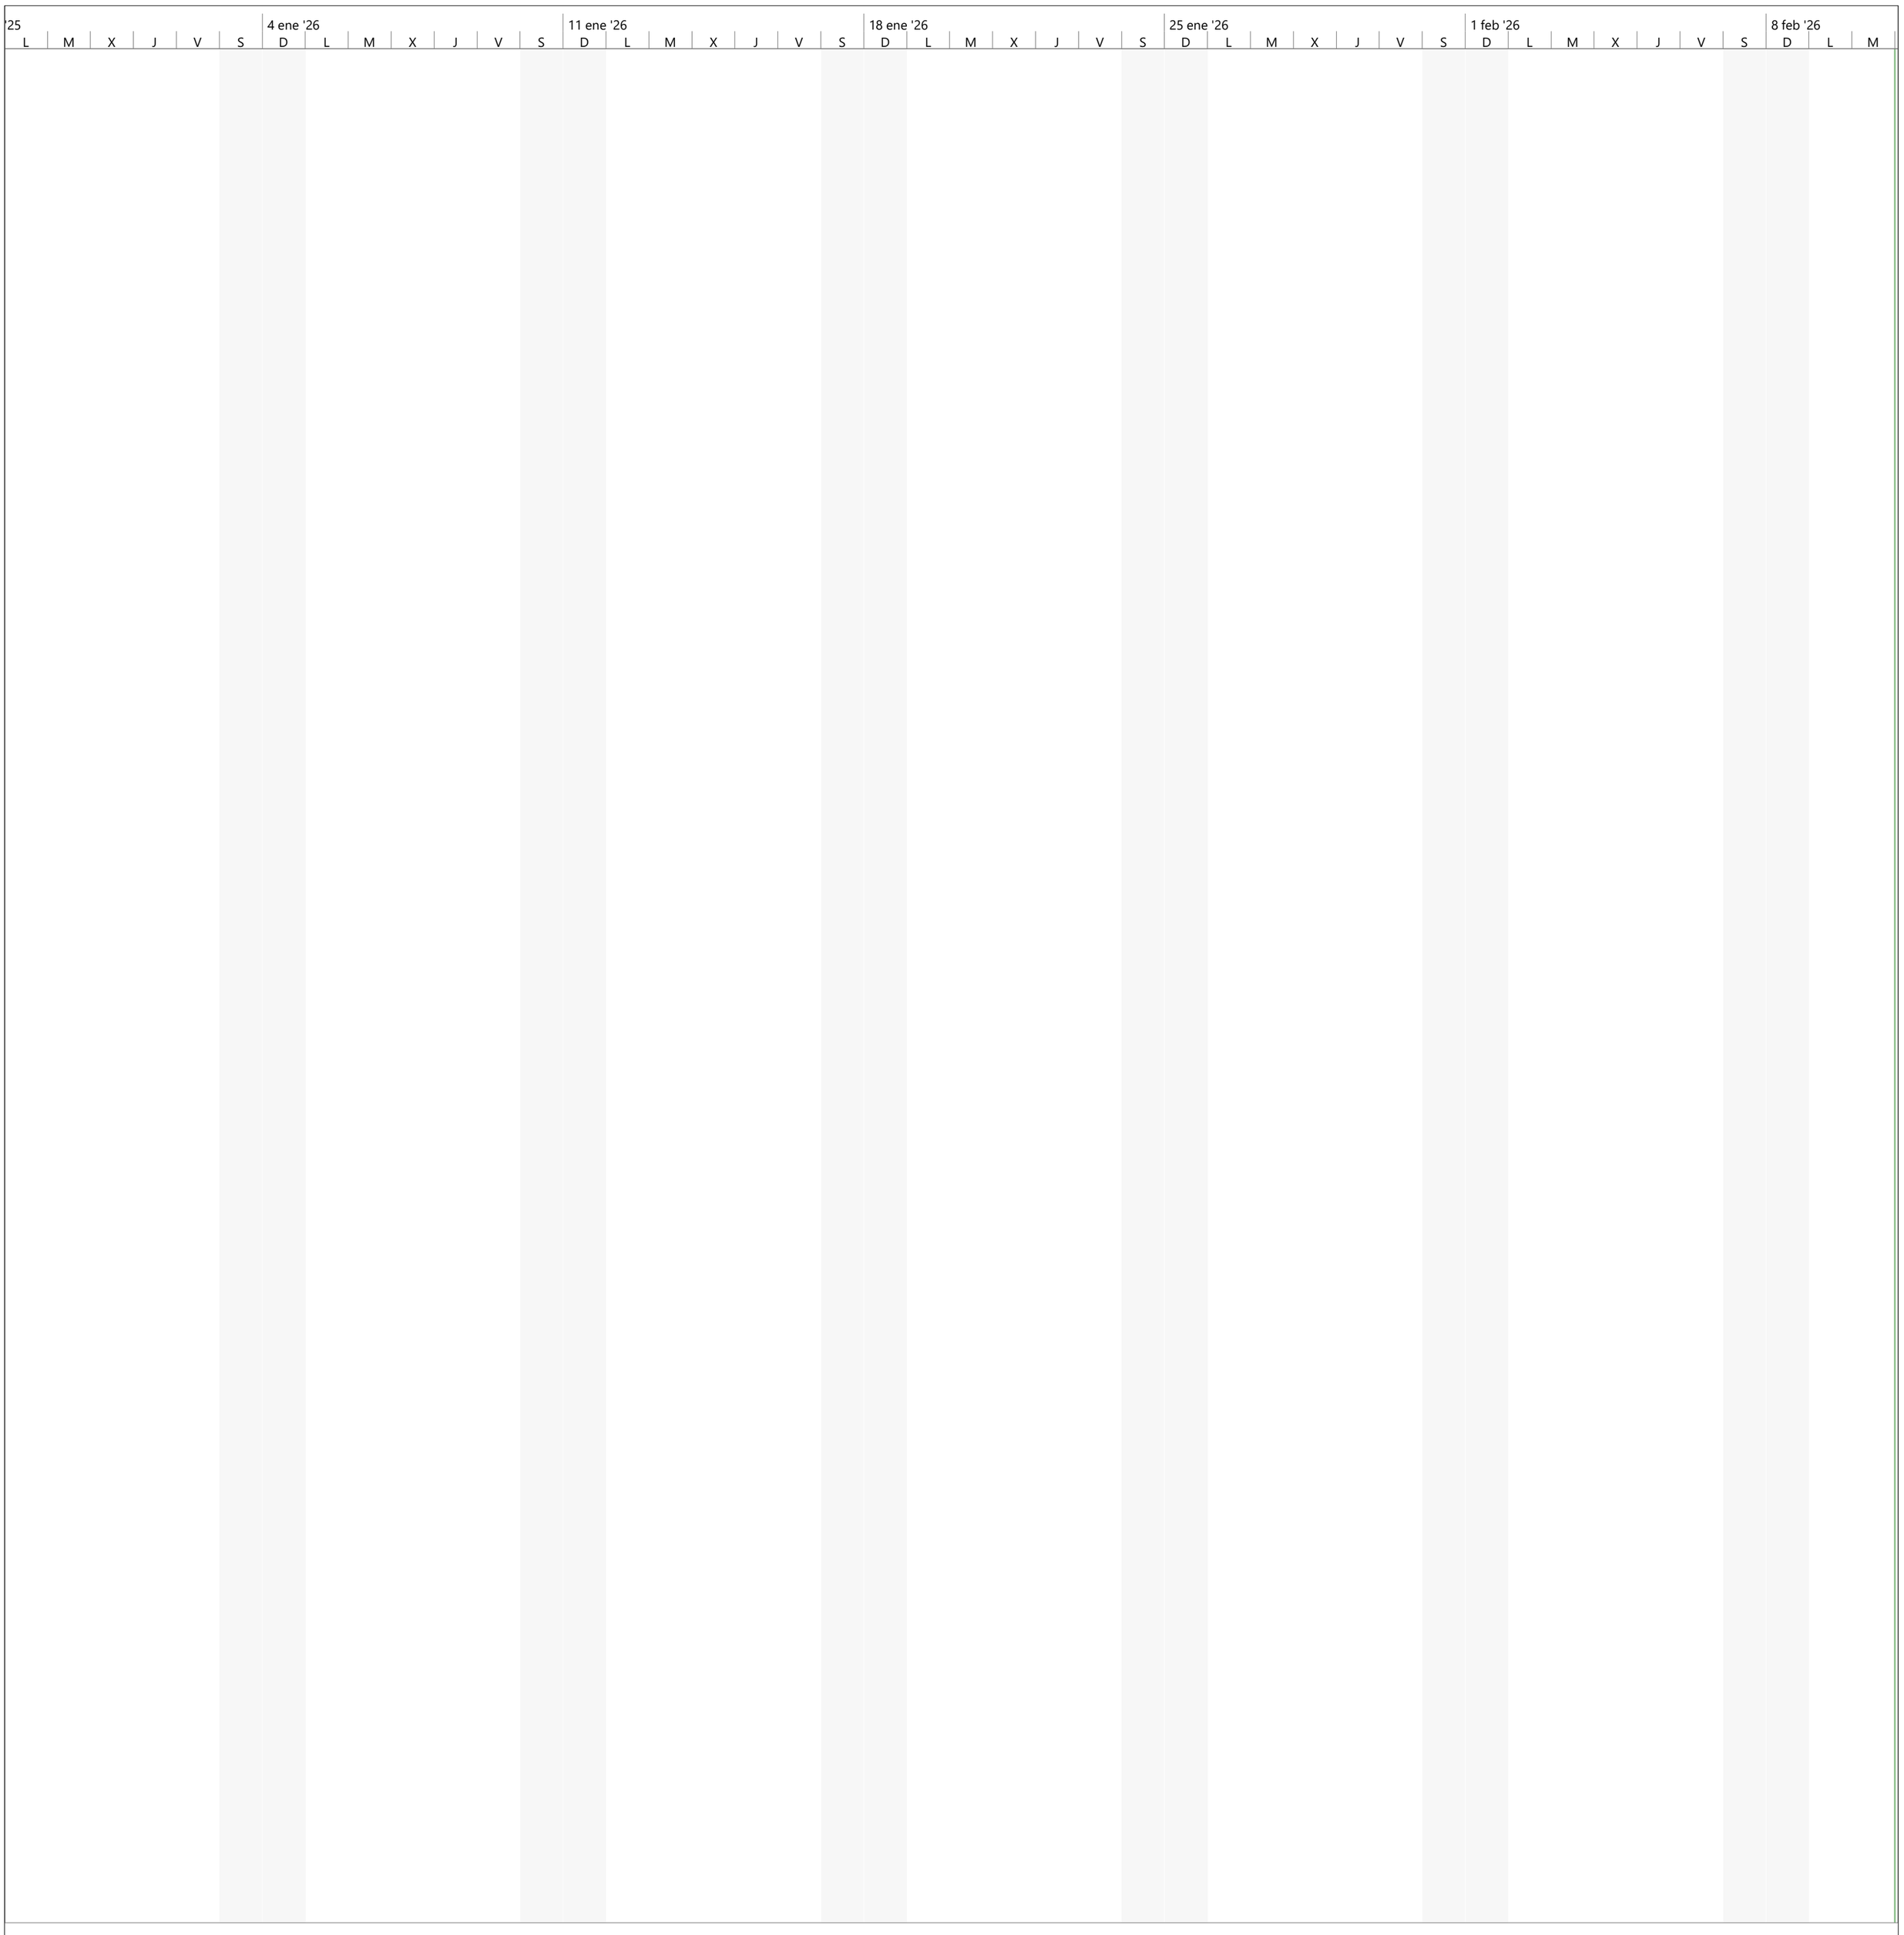

Proyecto: PROGRAMACION ZU
Fecha: mié 11/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

X J V S 15 feb '26 D L M X J V S 22 feb '26 D L M X J V S 1 mar '26 D L M X J V S 8 mar '26 D L M X J V S 15 mar '26 D L M X J V S 22 mar '26 D L M X J

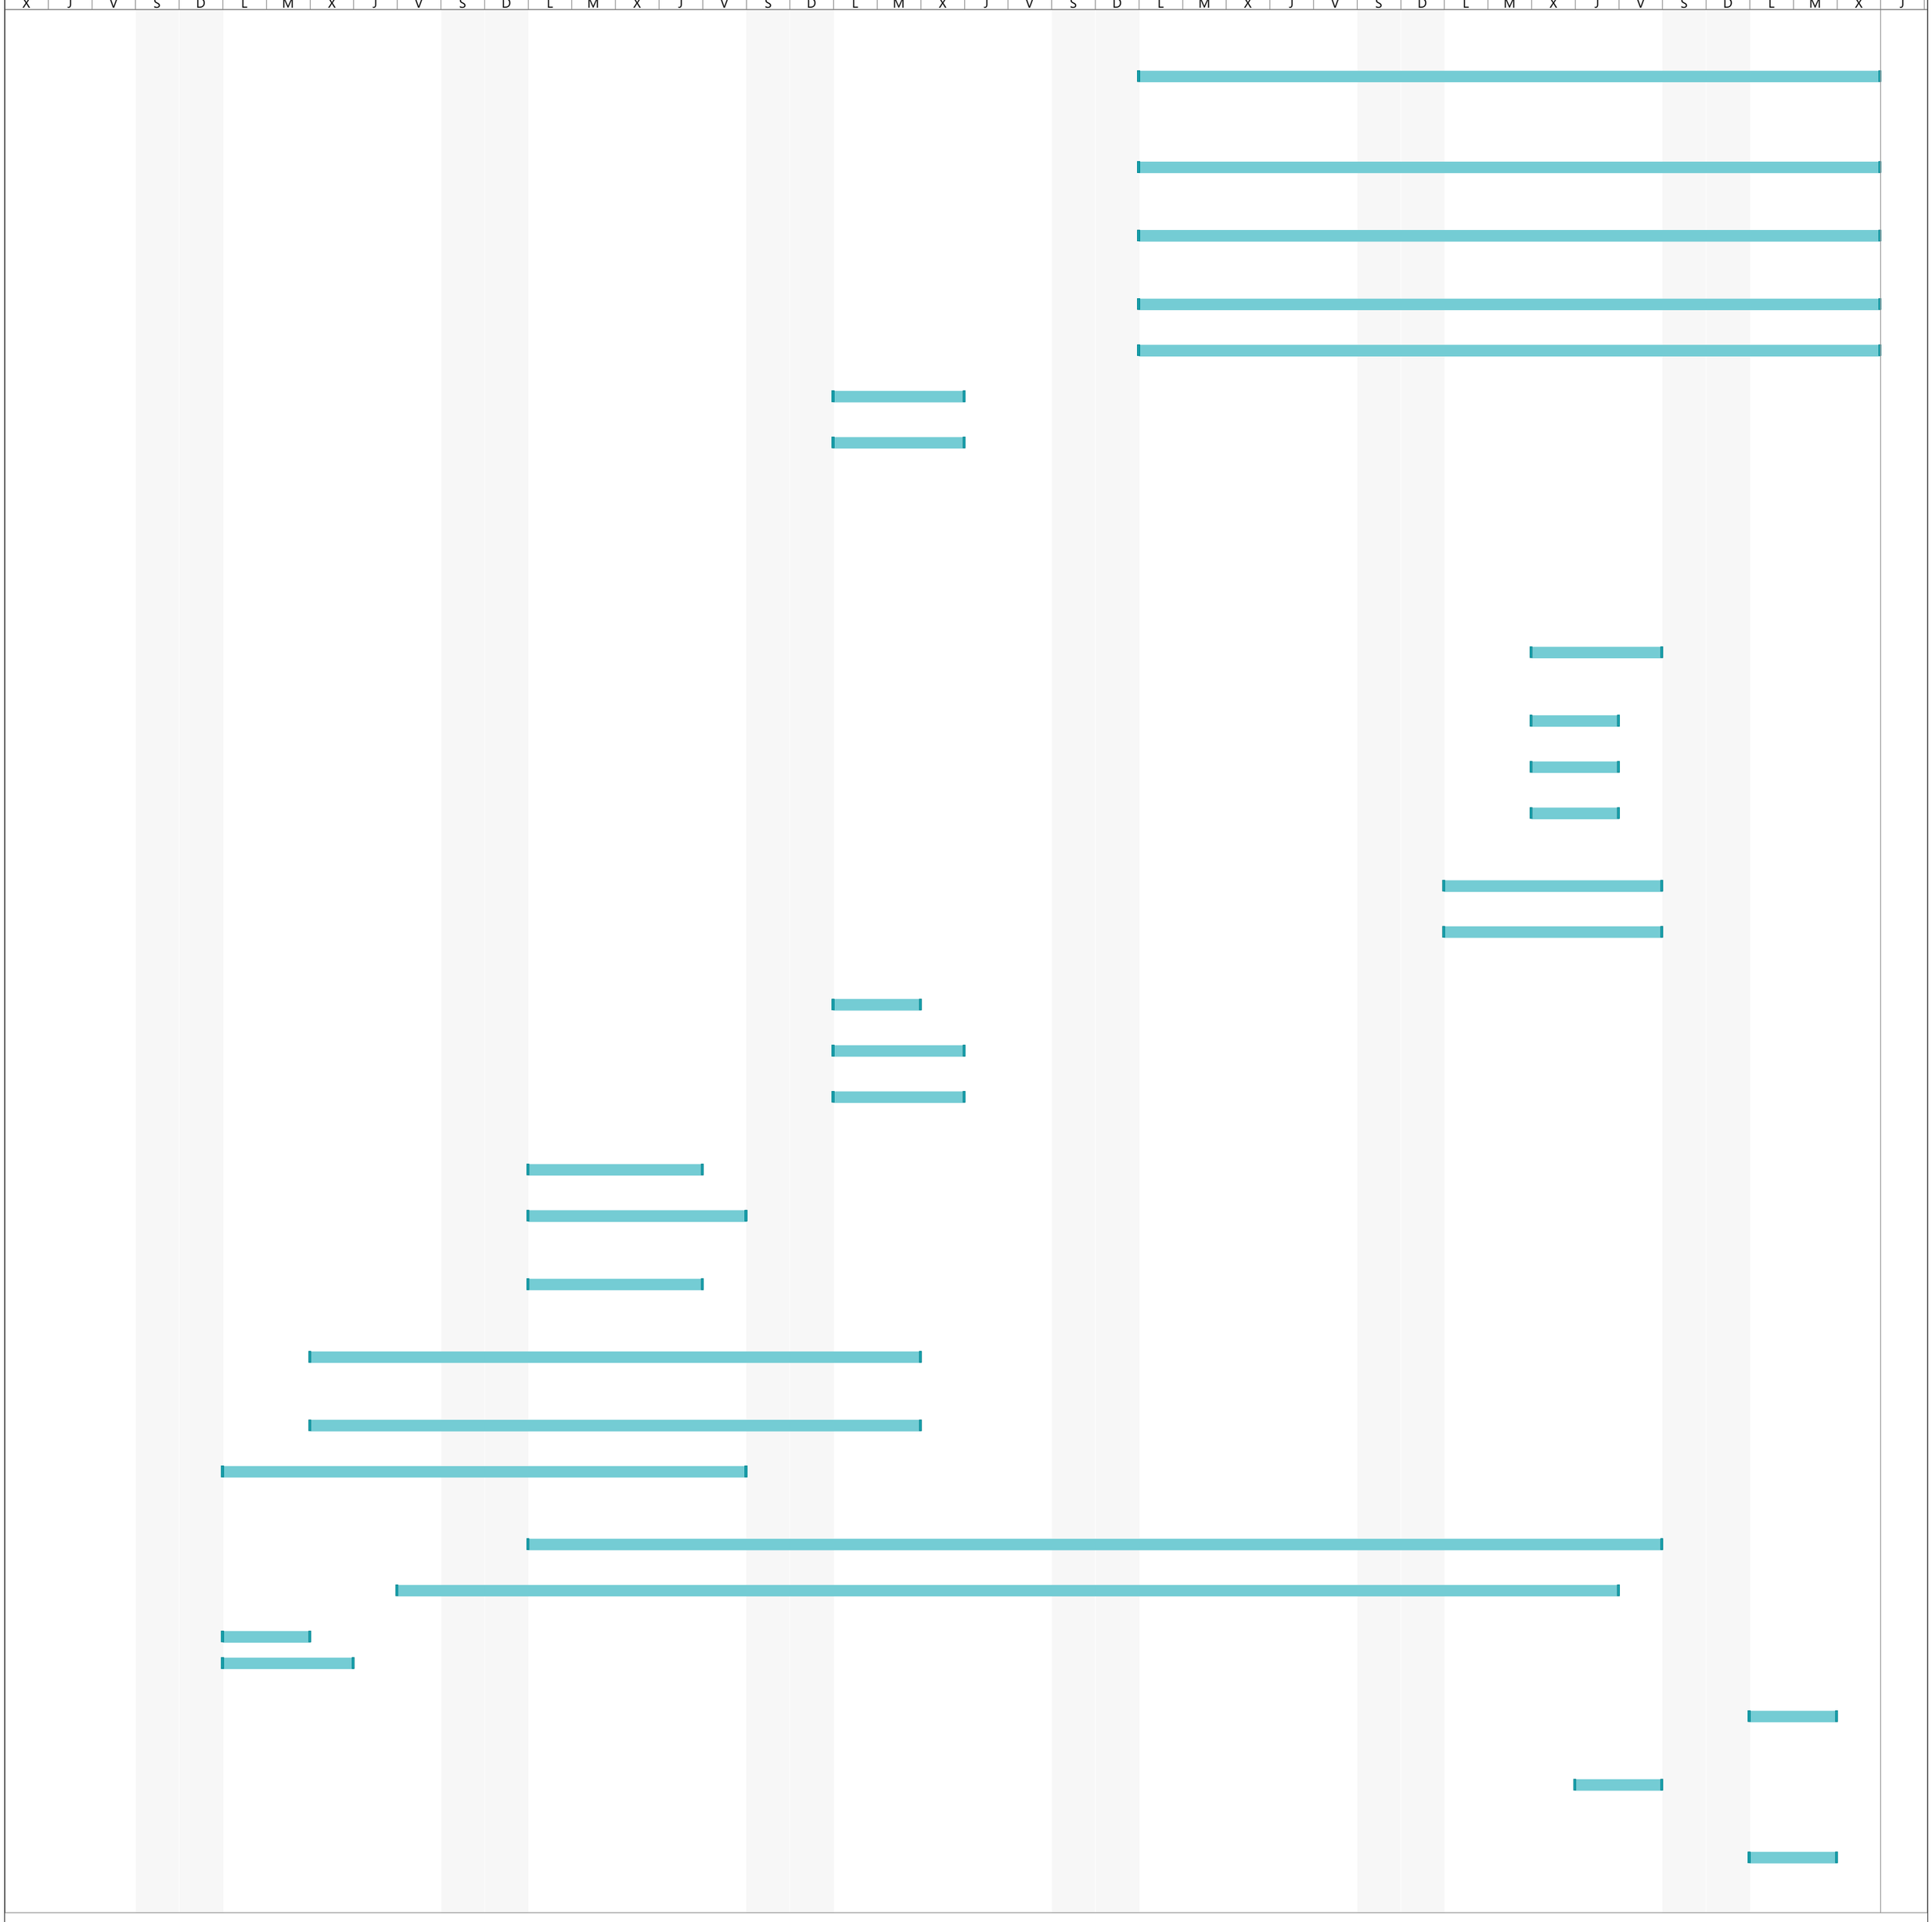

Proyecto: PROGRAMACION ZU
Fecha: mié 11/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
