Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal #43 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

septiembre 8, 2025 al septiembre 14, 2025

1. Datos Generales

PARQUE	Código:	Localidad:	VARIOS
VARIOS		Barrio:	VARIOS

2. Contrato de Obra

Objeto: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES

Contratista: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

COP No. 4060-2024

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2		F.T.	
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25	4 MESES	19-nov-25						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	Acta 7	Acta 8
Costo Directo	9.383.224.371,00	$ 539.089.886,00	$ 549.058.683,00	$ 824.555.879,00	$ 851.656.972,00	$ 1.855.230.270,00	$ 1.084.756.119,00	$ 1.031.214.773,00	$ 685.459.697,00
A.I.U. (36,49%)	3.423.938.573,00	$ 191.323.001,00	$ 202.789.519,00	$ 311.503.340,00	$ 318.480.635,00	$ 684.914.886,00	$ 384.979.947,00	$ 365.978.123,00	$ 254.567.201,00
Sub Total	12.807.162.944,00	$ 730.412.887,00	$ 751.848.202,00	$ 1.136.059.219,00	$ 1.173.220.846,00	$ 2.545.178.952,00	$ 1.469.736.066,00	$ 1.397.192.896,00	$ 940.026.898,00
GASTOS REEMBOLSABLES/ COMPLEMENTARIOS	93.186.863,00								
Total Inicial	12.900.349.807,00								
Adición No.	2.924.350.500,00								
Total Final	15.824.700.307,00								
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	3.753.289.748,00	$ 188.665.649,00	$ 122.821.127,00	$ 223.438.152,00	$ 352.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ 366.591.205,00	$ 366.591.205,00	$ 366.591.205,00
Total	3.753.289.748,00	$ 541.747.238,00	$ 629.027.075,00	$ 912.621.067,00	$ 821.220.846,00	$ 1.145.178.952,00	$ 1.103.144.861,00	$ 1.030.601.691,00	$ 573.435.693,00
Acumulado		$ 730.412.887,00	$ 1.482.261.089,00	$ 2.618.320.308,00	$ 3.791.541.154,00	$ 6.336.720.106,00	$ 7.806.456.172,00	$ 9.203.649.068,00	$ 10.143.675.966,00
oferta	11.382.700.156								

3. Contrato de Interventoría

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

CI No. 4080-2024

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.		F.T.	
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25	120	19-nov-25						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10
Valor Contrato:	1.770.680.532,00	$ 27.833.700,00	$ 105.987.269,00	$ 212.368.629,00	$ 148.501.719,00	$ 180.477.731,00	$ 188.836.760,00	$ 276.700.338,00	$ 177.626.336,00	$ 158.249.442,00	$ 155.743.248,00
Iva (19%)	336.429.301,00	$ 5.288.403,00	$ 20.137.581,00	$ 40.350.040,00	$ 28.215.327,00	$ 34.290.769,00	$ 35.878.984,00	$ 52.573.402,00	$ 33.749.004,00	$ 30.067.394,00	$ 29.591.217,00
Sub Total	2.107.109.833,00	$ 33.122.103,00	$ 126.124.850,00	$ 252.718.669,00	$ 176.717.046,00	$ 214.768.500,00	$ 224.715.744,00	$ 329.273.740,00	$ 211.375.340,00	$ 188.316.836,00	$ 185.334.465,00
Adicion:	-										
Total Final	2.107.109.833,00										
Retegarantia:											
TOTAL	2.107.109.833,00										
Acumulado	2.107.109.833,00	$ 33.122.103,00	$ 159.246.953,00	$ 411.965.622,00	$ 588.682.668,00	$ 803.451.168,00	$ 1.028.166.912,00	$ 1.357.440.652,00	$ 1.568.815.992,00	$ 1.757.132.828,00	$ 1.942.467.293,00

Programación. (N/A) El Contratista no ha entregado todavia la programación de obra para su respectiva revisión y aprobación.

Semanal No.43	Fecha de corte:	septiembre 14, 2025

4.

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4060-2024	$ 15.824.700.307,00	$ 12.631.670.469,35	$ 11.055.346.000,00		
	TOTAL	programado general	79,82%	69,86%	-9,96%	El pasado 18 de julio de 2025 se suscribe la modificación No.1 al contrato de obra pública No. 4060 de 2024, mediante el cual se prorrogó el plazo del contrato por un término de 4 meses, con nueva fecha de finalización para el 19 de noviembre de 2025. En ese sentido, se cuenta con programación aprobada para el periodo de prórroga mediante el radicado 20252100239762 del 16 de junio de 2025. En el transcurso del periodo, se evidencia un atraso en la ejecución de actividades del 9,96 %

5

Fecha Inicial:	20-nov-24	6. Pendientes:
Fecha de Terminación Inicial:	19-jul-25	
Adición de tiempo en (meses):	4 MESES	
Fecha de Terminación Final:	19-nov-25	Observaciones:


7. Licencias:

Construcción:	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público		N/A


8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	CODENSA	EAAB	OTROS	
DAMA	N/A	Informe 50%	Informe 75%	Informe 100%

9.	PAC 2025		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		OBSERVACIONES:
			$ 723.397.000	$ 1.093.978.554	$ 1.445.486.168	$ 1.749.156.608	$ 1.943.571.868		Los valores plasmados son Costo total con AIU
			JUN	JUL	AGOS				
			$ 2.290.717.637	$ 2.364.006.991	$ 1.290.034.981				

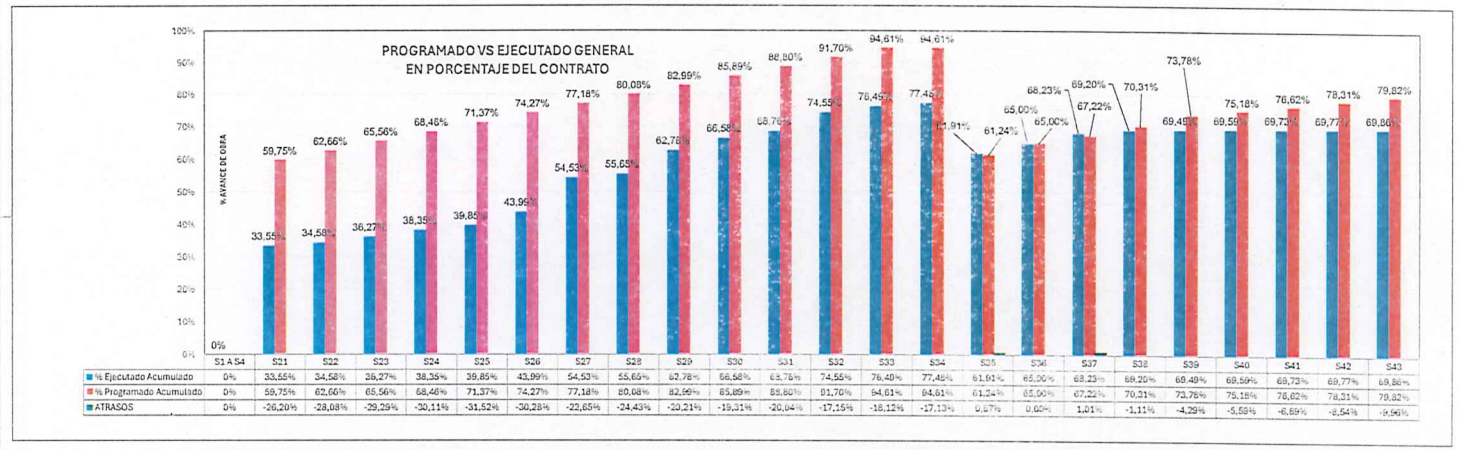

	S1 A S4	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43
% Ejecutado Acumulado	0%	33,55%	34,58%	36,27%	38,35%	39,85%	43,99%	54,53%	55,65%	62,78%	66,58%	68,76%	74,55%	76,48%	77,45%	61,91%	65,00%	68,23%	69,20%	69,49%	69,59%	69,73%	69,77%	69,86%
% Programado Acumulado	0%	59,75%	62,66%	65,56%	68,46%	71,37%	74,27%	77,18%	80,08%	82,99%	85,89%	88,80%	91,70%	94,61%	94,61%	61,24%	65,00%	67,22%	70,31%	73,78%	75,18%	76,62%	78,31%	79,82%
ATRASOS	0%	-26,20%	-28,08%	-29,29%	-30,11%	-31,52%	-30,28%	-22,65%	-24,43%	-20,21%	-19,31%	-20,04%	-17,15%	-18,12%	-17,13%	0,67%	0,00%	1,01%	-1,11%	-4,29%	-5,59%	-6,89%	-8,54%	-9,96%

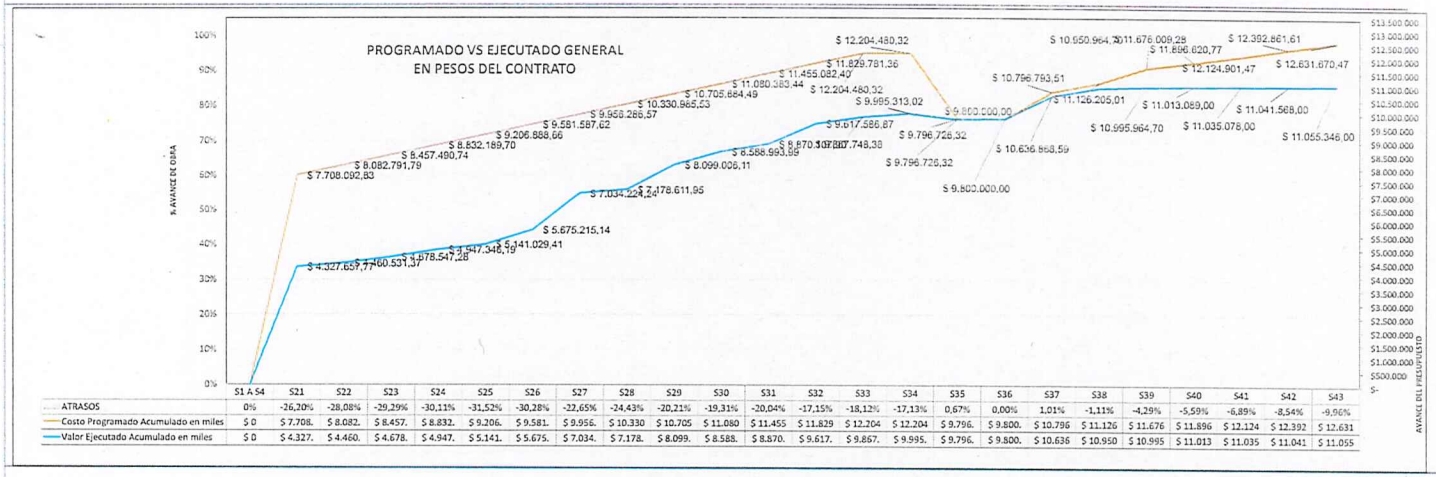

	S1 A S4	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43
ATRASOS	0%	-26,20%	-28,08%	-29,29%	-30,11%	-31,52%	-30,28%	-22,65%	-24,43%	-20,21%	-19,31%	-20,04%	-17,15%	-18,12%	-17,13%	0,67%	0,00%	1,01%	-1,11%	-4,29%	-5,59%	-6,89%	-8,54%	-9,96%
Costo Programado Acumulado en miles	$ 0	$ 7.708.	$ 8.082.	$ 8.457.	$ 8.832.	$ 9.206.	$ 9.581.	$ 9.956.	$ 10.330	$ 10.705	$ 11.080	$ 11.455	$ 11.829	$ 12.204	$ 12.204	$ 9.796.	$ 9.800.	$ 10.796	$ 11.126	$ 11.676	$ 11.896	$ 12.124	$ 12.392	$ 12.631
Valor Ejecutado Acumulado en miles	$ 0	$ 4.327.	$ 4.460.	$ 4.678.	$ 4.947.	$ 5.141.	$ 5.675.	$ 7.034.	$ 7.178.	$ 8.099.	$ 8.588.	$ 8.870.	$ 9.617.	$ 9.867.	$ 9.995.	$ 9.796.	$ 9.800.	$ 10.636	$ 10.950	$ 10.995	$ 11.013	$ 11.035	$ 11.041	$ 11.055

10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

De igual manera, las situaciones de orden técnico que se presentaron en el periodo correspondiente al informe semanal fueron los siguientes:

N.	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
1	Programaciones y presupuestos	Está programada una Mesa de Trabajo para el día 17 de septimbre con el fin de realizar ajustes al balance y revisión de presupuestos.
2	Inicio de actividades en los parque ya priorizados y viabilizados por la entidad además de culminación de las obras de emergencias.	Se le ha solicitado de manera urgente al Contratista rematar los parques que no han terminado e iniciar aquellos que según cronograma, deberian haber empezado y no hay ejecución de labores.
3	Desviación marcada entre el programado y el ejecutado	A la fecha no se evidencian desviaciones que puedan generar alerta.

11.	OBSERVACIONES POR PARQUES:
INFORME SEMANAL TÉCNICO DEL 8 de Septiembre al 14 de Septiembre de 2025	
SEGUIMIENTO TÉCNICO: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:	

PARQUE QUIROGA	Queda pendiente la aplicación de sintético hasta que la carpeta asfáltica cumpla su ciclo de curado.
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cerramiento lateral eslabonado y contra impacto de cancha f8 con lijado y aplicacion de anticorrosivo, queda pendiente seriado, compactación de capa filtrante en pista de trote para poder instalar piso caucho, y queda pendiente instalacion de acrílico, banner e instalación de paneles solares de modulo sanitario.
PARQUE LA TIMIZA	Se avanza con reinstalación de adoquín en el sendero peatonal quedando pendiente la instalación de la baranda, en el muro de piedra no se realiza avance de ninguna actividad, pendiente la llegada de la malla Fortinet para poder demoler la mampostería
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con el desmonte de piso caucho y bordillo prefabricado en pista de trote y retiro de piso caucho a sitio autorizado, Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cancha F8, con lijado y aplicación de anticorrosivo.
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se termina en la demarcación de la pista BMX, se avanza con el mantenimiento de los grecorromanos quedando pendiente dos grecorromanos por mantenimiento, se termina con mantenimiento de la baranda en pista BMX
PARQUE ZONA FRANCA	Se realiza cerramiento de zona infantil y se avanza con desmonte de piso caucho en zona infantil
PARQUE MILENTA TEJAR	El contratista realiza el suministro de bordillo A-10 y subbase granular reciclad
PARQUE ALFONSO LÓPEZ	Se inicia con el mantenimiento de lijado del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE EL RECREO	Se avanza con el mantenimiento de máquinas grecorromanas, quedando pendiente la instalación de piezas que fueron llevadas a taller
PARQUE FLORENCIA 1er Sector	Se iniciaron actividades : Lijada de parales y malla eslabonada; inicio aplicación de anticorrosivo.
PARQUE OLAYA	No se avanza con ninguna actividad en el urbanismo de zona de modulo sanitario y camerino por falta de material y personal de obra, se avanza en la construcción del PMU
PARQUE VICTORIA NORTE	El Contratista continúa con la aplicación de anticorrosivo y pintura para los módulos de mallas eslabonadas del cerramiento. Se inicia la instalación de los nuevos módulos metálicos con malla eslabonada, en reemplazo de aquellos que están deteriorados.
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Continúa la lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en la tubería de la parte superior del cerramiento de la cancha sintética. El Contratista continúa con la aplicación de anticorrosivo y pintura para los módulos de mallas eslabonadas del cerramiento. Se inicia la instalación de los nuevos módulos metálicos con malla eslabonada, en reemplazo de aquellos que están deteriorados.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Pendiente atornillar 2 tablas de PVC en el piso del módulo de baños. Se recomienda efectuar el cambio de estas tablas, ya que las actuales están bastante arqueadas, con mucha curvatura. En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados No han llegado a la obra el juego de cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.

UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	Durante el periodo, no se evidencia personal disponible en este frente de trabajo y por lo tanto, no se realizaron actividades durante el periodo. El carpintero metálico realizo visuita para efectuar toma de medidas de las puertas a instalar. Los trabajos a realizar son los siguientes: En la Tienda de Doña Rosa: Suministro e instalación de la puerta principal del negocio. Al interior del Módulo de los baños Tienda de Doña Rosa : Suministro e instalación de las puertas en acero inoxidable para los baños de mujeres y hombres. En los baños de softbol .- Tienda de la Sra Yolanda Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). Intervención Pista de Patinaje: El día lunes 8 de septiembre de 2025, el Contratista inició actividades en la pista de la pista de Patinaje. Aseo y limpieza del área; apertura de dilataciones y el inicio de sellado de fisuras.
PALACIO DE LOS DEPORTES	Se realizaon algunos trabajos en el Coliseo. Está pendiente la resellada y pulida de mesón en granito jaspe ubicado en la cocineta de Servicios Generales.
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	Se espera por parte del Contratista realizar la subsanación referente a la aplicación de soldadura que se aplicó a la estructura metalica del invernadero (calidad). Se le solicita al contratista presentar la prueba de tintas para la soldadura aplicada a la estructura metálica. Pendiente instalar exteriormente el plástico para el invernadero Se continuó con la instalación de franjas de caucho EDPM en Zonas 2 3 4 y 5 Pendiente terminar la instalación de caucho EDPM en las Zonas 1 y 6 Pendiente instalar el rodadero en Zona de Juegos Infantiles.
PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	Se aprueba en Comité de Obra instalar cuña en madera y reforzar con chapetas metálicas la estructura en madera compuesta por columna y viga en la parte superior de la cubierta ubicada en el costado sur occidental.

Correspondencia Enviada por la interventoría durante el período:

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-641 al Contratista, el día 08 de septiembre de 2025 con el asunto, Observaciones informe Calidad N° 9 V.1

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-642 al Contratista, el día 08 de septiembre de 2025 con el asunto, Observaciones informe SST N°10

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-643 al Contratista, el día 09 de septiembre de 2025 con el asunto, Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-375-25 Observaciones informe técnico mensual No. 10

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-644 al Contratista, el día 10 de septiembre de 2025 con el asunto, Aprobación Informe Calidad N° 8 V.3

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-645 al Contratista, el día 10 de septiembre de 2025 con el asunto, Aprobación Informe Calidad N° 9 V.2

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-646 al Contratista, el día 10 de septiembre de 2025 con el asunto, Solcitud presentacion prueba de tintas

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-647 al IDRD, el día 08 de septiembre de 2025 con el asunto, Remisión informe semanal No. 41

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-648 al Contratiosta, el día 10 de septiembre del 2025 con el asunto, Requerimiento SST

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-649 al Contratista el día 11 de septiembre del 2025 con el asunto, REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PARQUE PIJAOS Y PALERMO SUR

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-650 al IDRD, el día 12 de septiembre del 2025 con el asunto, Remisión informes mensuales de obra - Mes 8

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-651 al IDRD, el día 12 de septiembre del 2025 con el asunto,Remisión informes mensuales de obra - Mes 9

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-652 al IDRD, el día 12 de septiembre del 2025 con el asunto, Remisión actas de puesta en servicio

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-653 al IDRD, el día 12 de septiembre del 2025 con el asunto, Remisión acta de retiro de mobiliario - Parque Country

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-654 al IDRD, el día 12 de septiembre del 2025 con el asunto, Remisión hoja de vida inspector de obra

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-655 al Contratista, el día 12 de septiembre del 2025 con el asunto, requerimiento inicio de obra etapa de la adicion

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-656 al Contratista, el día 12 de septiembre del 2025 con el asunto, requerimiento terminacion de obras contractuales

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-657 al IDRD, el día 12 de septiembre del 2025 con el asunto, Remisión informes de inspección ascesores CEFE

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-658 al IDRD, el día 12 de septiembre del 2025 con el asunto, Remisión comprobante de pago rendimientos financieros mes de junio de 2025

Se envio comunicado IDRD-4080-G2-2024-659 al IDRD, el día 12 de septiembre del 2025 con el asunto, Remisión comprobante de pago rendimientos financieros mes de julio de 2025

INFORME SEMANAL ELÉCTRICO

SEGUIMIENTO TÉCNICO ELÉCTRICO:

Durante el periodo, se atendió la emergencia en el Parque Servitá realizando el cambio de un contactor que estaba en mal estado.

INFORME SEMANAL CALIDAD

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN CALIDAD:

Se realiza la solicitud de la documentación de salida no conforme correspondiente al no pago de parafiscales de algunos trabajadores
Se recibe informe N 10 el cual no cumple con los requisitos mínimos por lo cual se envían observaciones al contratista por medio del oficio 638
Se atienden las observaciones emitidas al informe N° 8 del contratista por lo cual se emite concepto de aprobación por medio del oficio 644
Se atienden las observaciones emitidas al informe N° 9 del contratista por lo cual se emite concepto de aprobación por medio del oficio 644
Se reitera al contratista la necesidad de presentar el listado semanal de materiales ingresados por frente de obra
No se presenta por parte del contratista la solicitud de establecer los frentes de obra objeto de auditoría

INFORME SEMANAL SST Y AMBIENTAL

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST:

El día 08-09-2025 mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-642 se remiten observaciones al informe SST N°10, el cual aún no es subsanado por el contratista.
Se revisa y se valida documentación para el ingreso de personal del subcontratista JHC.
El día 10-09-2025 mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-648 se remitieron observaciones del componente SST relacionados con orden y aseo y uso correcto del pendón informativo.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL:
Durante el periodo de reporte se revisa el informe ambiental diez (10) en su versión uno (1) entregado por el contratista, a partir de lo cual se envía observaciones relacionadas con la certificación de cantidades de materiales suministrados y solicitudes de certificaciones del mes de agosto. Así mismo se requiere al contratista la entrega de la trazabilidad RCD correspondiente a los meses de junio, julio y agosto, la cual está pendiente debido a que no se cuenta con los certificados de disposición de grano de caucho gestionado con Tracol.

INFORME SEMANAL SOCIAL

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL:
09 sept: Asistencia del área técnica a reunión de inicio de Milenta Tejar en la cual se conto con la asistencia de comunidad, área social y técnica del contratista e IDRD. 10 sept: Se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.

MANEJO DEL ANTICIPO:

8 de septiembre a 14 de septiembre de 2025

No se realizan actividades correspondientes al anticipo, los recursos se encuentran desembolsados

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Parque Alfonso López
Inicio actividades de cerramiento perimetral de la cancha sintetica








Parque Alfonso López
Inicio actividades de cerramiento perimetral de la cancha sintetica

Parque Timiza
Señalización de acopios

CEFE San Cristóbal
Reporte de emergencia union con fuga




Parque Florencia 1er Sector
Lijada de parales y demás elementos metálicos del cerramiento



Parque Florencia 1er Sector
Instalación de la valla informativa




Parque Florencia 1er Sector
Aplicación de anticorrosivo




Parque Florencia 1er Sector
Aplicación de anticorrosivo en elementos metálicos del cerramiento





Parque Florencia 1er Sector
Retiro de la maleza existente perimetral a la viga del cerramiento







Parque Florencia 1er Sector
Estado inicial en perimetro del cerramiento




Parque Florencia - Los Tronquitos
Estado inicial -antes de intervención







Parque Florencia - Los Tronquitos
Estado inicial -antes de intervención- deterioro de encamisado de parales y de la malla eslabonada en la parte superior de algunos módulos









Parque La Esperanza
Desmonte piso caucho en zona de juegos infantiles

Parque Olaya
Zona de modulos de servicio

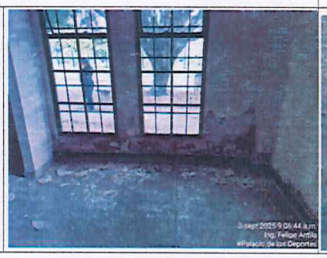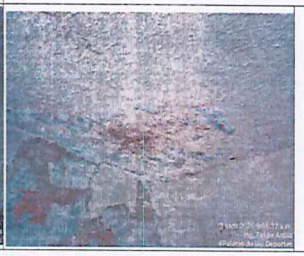


Palacio de los Deportes
Coliseo- Salón 6
Retiro de pintura existente en muros y en cieloraso, preparación para aplicar nueva mano de pintura



Parque Timiza
Fundida viga de cimentación para baranda del sendero junto al lago



Parque Porvenir
Desmonte y acopio de piso caucho de la pista de trote

Parque Refous
Deterioro de la malla eslabonada



Parque Refous
Aplicación de anticorrosivo en elementos metálicos del cerramiento



Unidad Deportiva El Salitre -UDS
Área del Patinódromo
Limpieza de la superficie



Unidad Deportiva El Salitre -UDS
Área del Patinódromo
Aplicación de la primera capa base sello



Unidad Deportiva El Salitre -UDS
Área del Patinódromo
Materiales utilizados para sello de la capa base



Unidad Deportiva El Salitre -UDS
Área del Patinódromo
Aplicación de la primera capa base sello







Unidad Deportiva El Salitre -UDS
Área del Patinódromo
Aplicación de la segunda capa

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G2-2024-668

Bogotá D. C., 23 de septiembre de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100420072 Código Web: V5)YBz
FECHA:23-09-2025 16:01:27 FOLIOS: 11
RADICADOR: DOLLY ALEJANDRA MESA MORENO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 43
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 40 correspondiente al periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (10) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A
