ACTA DE DESARROLLO CURRICULAR 11-02-2026			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión de Análisis Técnico para Empalme Constructivo Cuneta y Bordillo – Articulación SENA Centro de la Construcción, Contratista Cinta Huella y Gobernación del Valle del Cauca – Formación Continua Especializada vigencia 2026			
CIUDAD Y FECHA:	Cali, 11 de febrero de 2026	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 5:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	**Centro de la construcción** / Ambiente salón instructores, Virtual Teams, cafetería y biblioteca	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Calle 34 # 17b - 23, Valle del Cauca/CC	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

- Análisis técnico del empalme constructivo entre cuneta, bordillo y cinta huella.
- Revisión del alcance contractual del contratista encargado de la construcción de cinta huella.
- Participación del SENA Centro de la Construcción en la ejecución de cuneta y bordillo como proceso formativo con aprendices.
- Identificación de riesgos técnicos y dudas constructivas (bombeo lateral, ausencia de estudios específicos, diferencias entre cinta huella y placa huella).
- Definición de acciones para garantizar respaldo técnico y formativo institucional.
- Planificación de fichas de aprendizaje y organización académica 2026.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1.- Realizar un análisis técnico preliminar sobre el empalme constructivo entre la cuneta, el bordillo y la cinta huella, con el fin de garantizar que el proceso formativo adelantado por el SENA no afecte la obra ejecutada por el contratista.

2.- Revisar las condiciones actuales del proyecto adelantado por la Gobernación del Valle del Cauca, aclarando que esta no asistió a la reunión debido a cruce con otra actividad previamente programada.

3.- Analizar las responsabilidades institucionales, teniendo en cuenta que:

La Gobernación adelanta la construcción de cinta huella y placa huella en distintos municipios.

El contratista ejecuta la cinta huella conforme al contrato inicial, el cual no contempla bordillo y está sujeto a pólizas y especificaciones ya definidas.

El SENA Centro de la Construcción, dentro de su proceso de formación con aprendices, tiene proyectada la construcción de cuneta y bordillo como producto pedagógico.

4.- Identificar inquietudes técnicas manifestadas por el contratista, tales como el bombeo hacia un costado, la falta de estudios específicos complementarios y la necesidad de analizar cada caso de manera independiente según las condiciones particulares de cada tramo intervenido.
5.- Planificar las fichas de aprendizaje y la organización académica por parte del Coordinador Juan Miguel y el equipo de instructores, garantizando que las actividades formativas cuenten con respaldo técnico y jurídico institucional.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


La reunión se desarrolló de manera virtual, encontrándose el equipo del SENA reunido físicamente en el Centro de la Construcción. Se dio apertura por parte del Coordinador Juan Miguel, quien contextualizó la necesidad de realizar este análisis previo antes de cualquier intervención formativa en campo.
Se dejó constancia de la inasistencia de la Gobernación del Valle del Cauca por cruce de agenda. No obstante, se avanzó en el análisis técnico interno.
Durante la sesión se abordó el proceso constructivo propuesto por el equipo del SENA para la ejecución de cuneta y bordillo, enfatizando que la participación institucional debe garantizar:
No afectar estructural ni funcionalmente la cinta huella ya construida.
No generar conflictos contractuales al contratista, quien ejecuta bajo condiciones y pólizas que no contemplan bordillo dentro del alcance inicial.
Cumplir con criterios técnicos de drenaje, pendientes y confinamiento lateral.
El contratista manifestó dudas relacionadas con el bombeo hacia un costado de la vía y la posible alteración del comportamiento hidráulico. Asimismo, se señaló la ausencia de estudios específicos complementarios para algunos tramos, razón por la cual se concluyó que cada intervención deberá analizarse de manera independiente.
Se reiteró que la Gobernación adelanta tanto cinta huella como placa huella, lo que implica diferencias técnicas que deben ser consideradas antes de definir cualquier detalle constructivo de cuneta y bordillo.
El equipo de instructores manifestó la necesidad de contar con garantías institucionales claras por parte del SENA antes de iniciar actividades prácticas con aprendices, asegurando que el proceso formativo esté debidamente soportado técnica y administrativamente.
Finalmente, se abordó el estado de las formaciones del año anterior y el Coordinador indicó la importancia de analizar las gestiones pertinentes que permitan dar inicio oportuno a las actividades de formación 2026.

CONCLUSIONES

Se acordó programar una reunión presencial con los tres entes involucrados (SENA Centro de la Construcción, Gobernación del Valle del Cauca y Contratista), con el fin de unificar criterios técnicos y definir responsabilidades claras antes de cualquier intervención.

- Previo a dicha reunión, se realizarán encuentros internos del equipo SENA con sus superiores para consolidar una postura técnica e institucional.
- Se determinó que el análisis del empalme cuneta–bordillo–cinta huella deberá realizarse por tramos específicos, considerando condiciones particulares de diseño, drenaje y alcance contractual.
- Se estableció que ninguna actividad formativa en campo iniciará hasta contar con claridad técnica, jurídica y administrativa que garantice la protección institucional y la calidad de la obra.
- El Coordinador Juan Gabriel y su equipo continuaron en el Centro de la Construcción con actividades de planificación académica y estructuración de fichas de aprendizaje, orientadas a articular el componente formativo con los lineamientos técnicos que se definan en la próxima reunión interinstitucional.

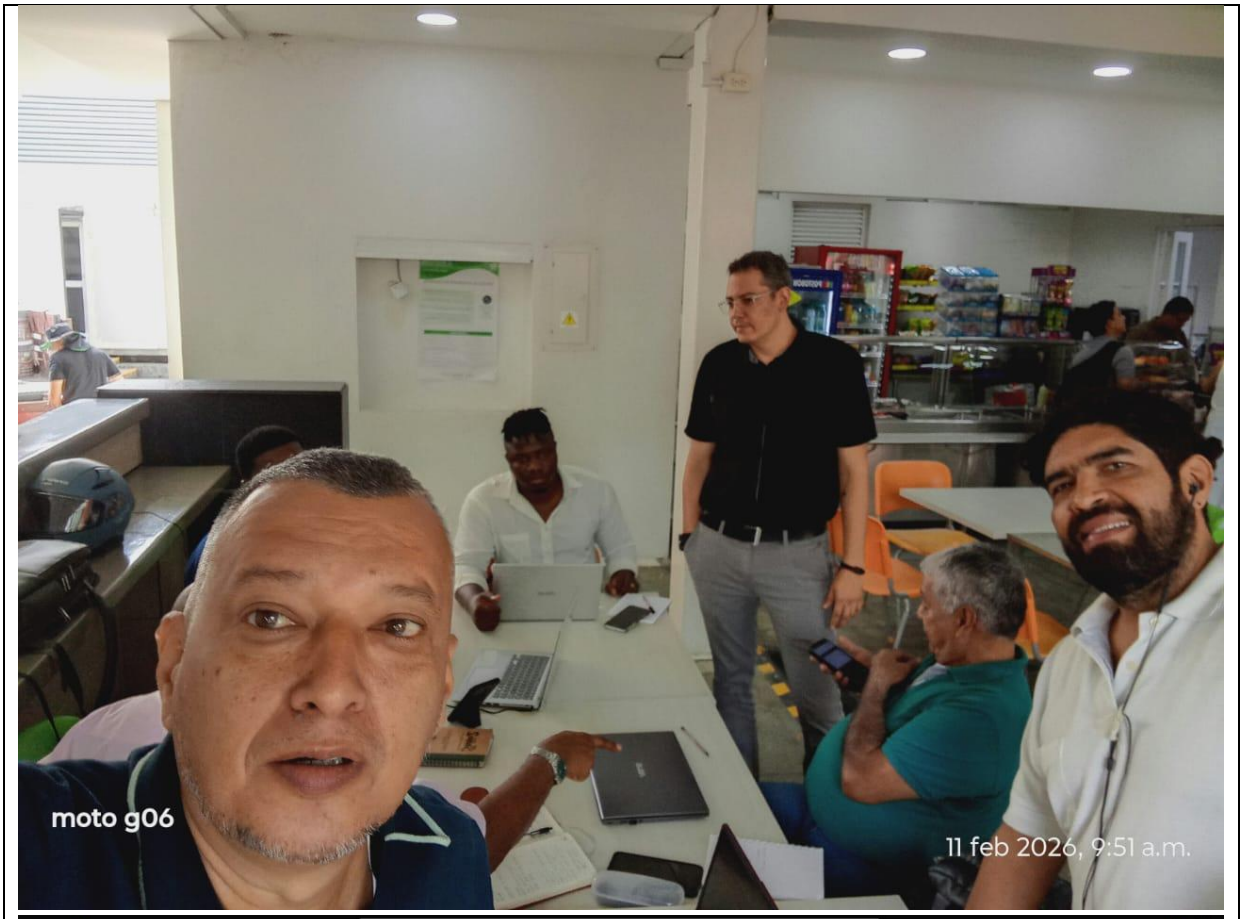
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**

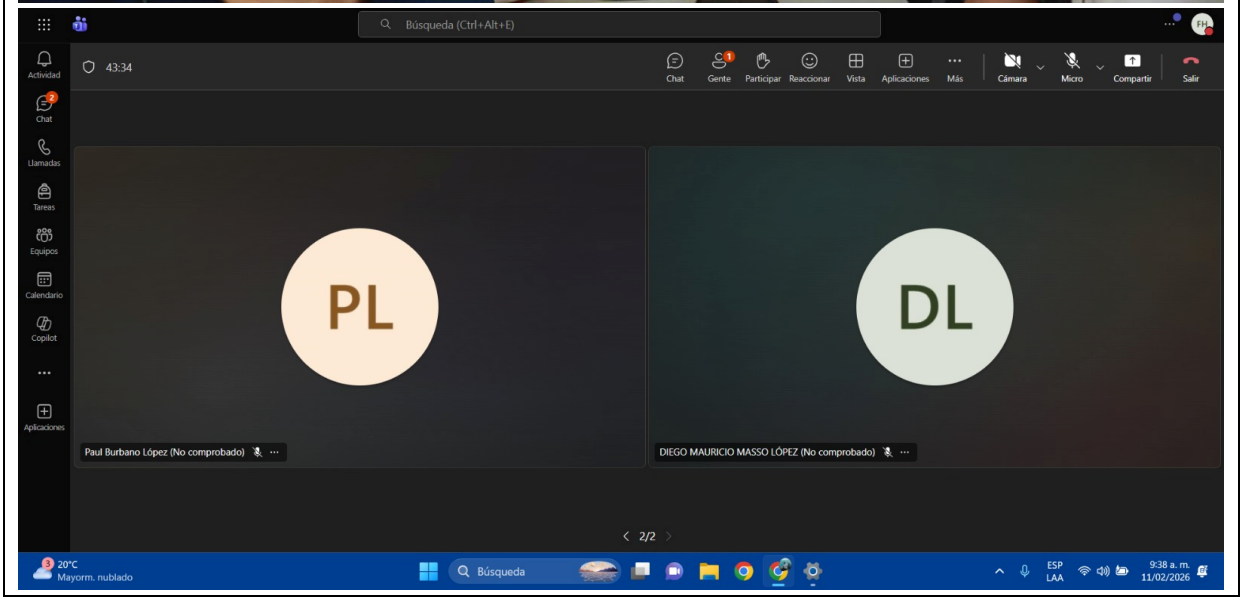
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Luis González	Formación Continua Especializada Placa Huella	SI	N/A	
Darío Bohórquez	Formación Continua Especializada Placa Huella	SI	N/A	
Fredy Hurtado	Formación Continua Especializada Placa Huella	SI	N/A	
Jorge López	Formación Continua Especializada Placa Huella	SI	N/A	
María García	Formación Continua Especializada Placa Huella	SI	N/A	

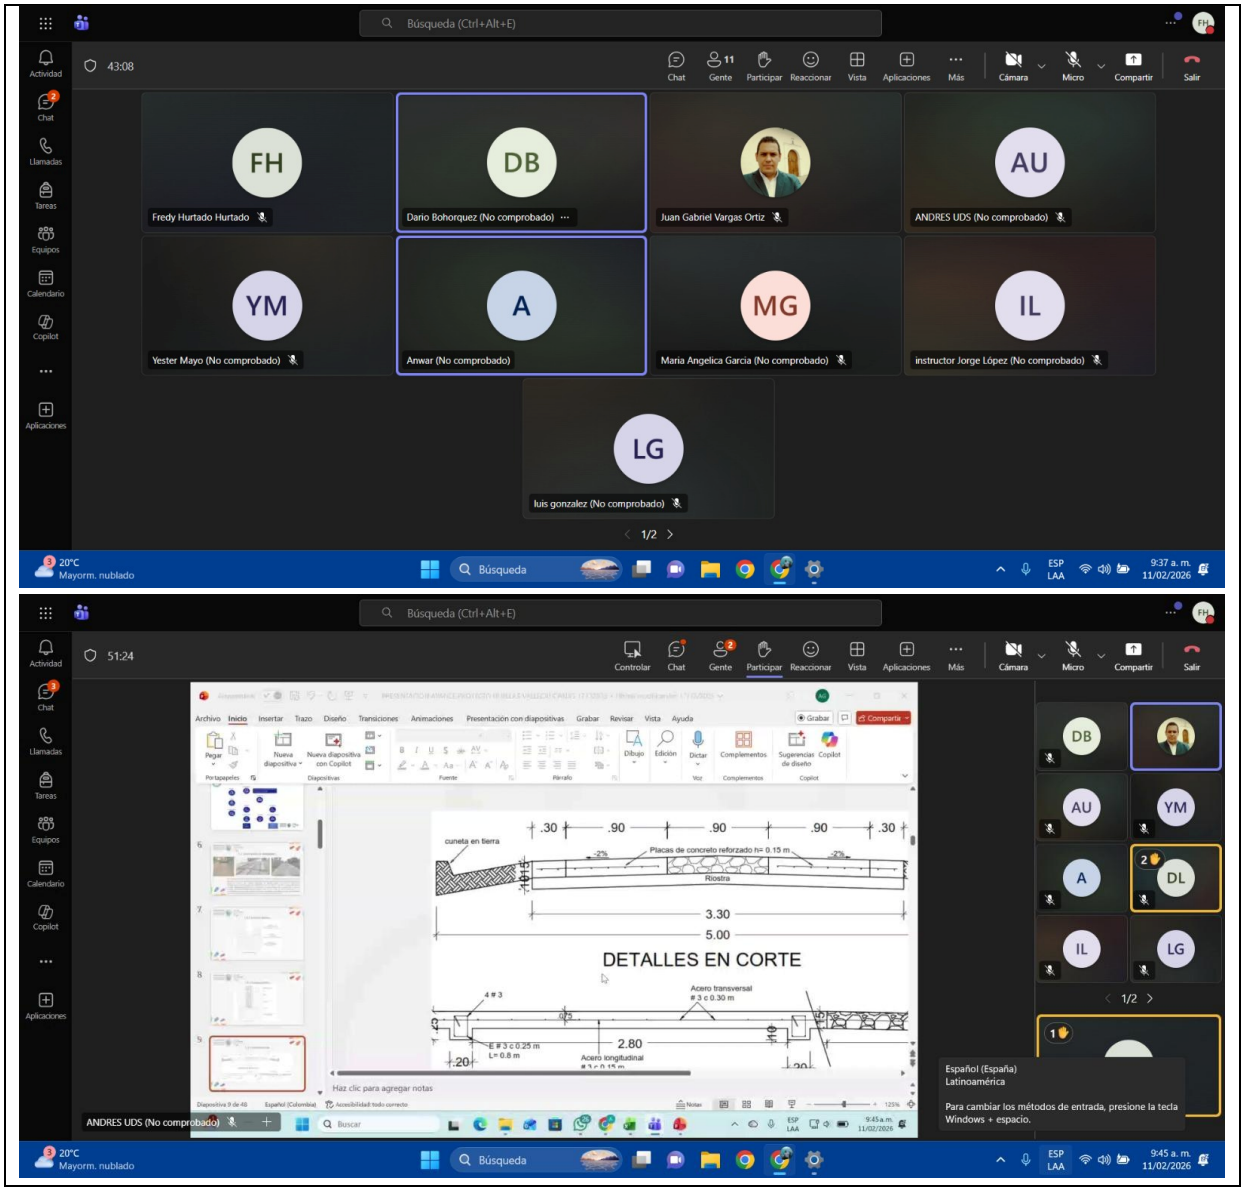
Paul Burbano	Formación Continua Especializada Placa Huella	SI	N/A	
Julieta Salazar	Formación Continua Especializada Placa Huella	SI	N/A	
Alexander Mena	Formación Continua Especializada Placa Huella	SI	N/A	
Diego Masso	Formación Continua Especializada Placa Huella	SI	N/A	
Yester Mayo	Formación Continua Especializada Placa Huella	SI	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

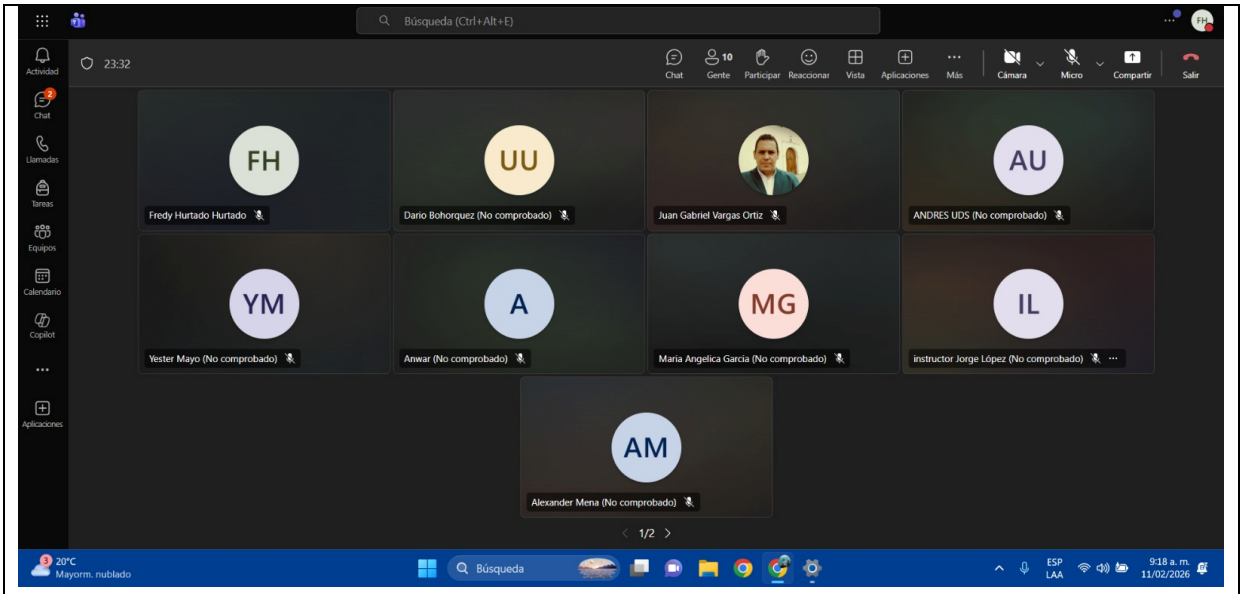
ANEXOS


moto g06
11 feb 2026, 9:51 a.m.


Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
43:34
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Actividad
Chat
Llamadas
Tareas
Equipos
Calendario
Copilot
Aplicaciones
PL
DL
Paul Burbano López (No comprobado)
DIEGO MAURICIO MASSO LÓPEZ (No comprobado)
2/2
20°C
Mayorm. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
9:38 a. m.
11/02/2026


Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
43:08
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
FH
Fredy Hurtado Hurtado
DB
Dario Bohorquez (No comprobado)
Juan Gabriel Vargas Ortiz
AU
ANDRES UDS (No comprobado)
YM
Yester Mayo (No comprobado)
A
Anwar (No comprobado)
MG
Maria Angelica Garcia (No comprobado)
IL
instructor Jorge López (No comprobado)
LG
luis gonzalez (No comprobado)
1/2
20°C
Mayorm. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
9:37 a. m.
11/02/2026
51:24
Controlar
DETALLES EN CORTE
cuneta en tierra
Placas de concreto reforzado h= 0.15 m
Riostra
3.30
5.00
Acero transversal
Acero longitudinal
2.80
Haz clic para agregar notas
DL
Español (España)
Latinoamérica
Para cambiar los métodos de entrada, presione la tecla Windows + espacio.
9:45 a. m.
11/02/2026


11 feb 2026 9:37:04
3,4413N 76,5071W
34-115 Carrera 18
Comuna 8
Cali
Valle del Cauca
SENA CC reunión virtual gobernación
Carrera 15
Centro Comercial Santiago Plaza
KINGPAPA Nueva Floresta
Calle 33
Calle 34
Carrera 18
Calle 39
Autopista Sur
Calle 36a
EL RODEO
Google


Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
23:32
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Actividad
Chat
Llamadas
Tareas
Equipos
Calendario
Copilot
Aplicaciones
FH
Fredy Hurtado Hurtado
UU
Dario Bohorquez (No comprobado)
Juan Gabriel Vargas Ortiz
AU
ANDRES UDS (No comprobado)
YM
Yester Mayo (No comprobado)
A
Anwar (No comprobado)
MG
Maria Angelica Garcia (No comprobado)
IL
instructor Jorge López (No comprobado)
AM
Alexander Mena (No comprobado)
1/2
20°C
Mayorm. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
9:18 a. m.
11/02/2026
