Infra Ing Sloan

ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Infraestructura

epa Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos

Solicitud del octavo DESEMBOLSO de recursos – "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001"

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

GPT- 064

Armenia, febrero de 2026

Secretaria de Infraestructura Municipal
Luz Helena Dor
043
17 FEB 2026
RECIBIDO

Ingeniera
ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES
Supervisora Convenio 2025-002
Subsecretaria de Infraestructura
Alcaldía de Armenia

Asunto: Solicitud del **OCTAVO** DESEMBOLSO de recursos – "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001"

Cordial saludo,

En calidad de supervisora del Convenio Interadministrativo No. 2025-001 suscrito entre Empresas Públicas de Armenia ESP y la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Armenia (Convenio No. 2025-002), me permito solicitar de manera respetuosa el pago correspondiente al DESEMBOLSO **No. 8** del convenio mencionado en el asunto, soportado en el avance físico y financiero derivado de la ejecución de los Contratos de Obra **No. 017 y 021 de 2025** e Interventoría de obra **No. 004 y 016 de 2025,** los cuales han sido desarrollados conforme a lo establecido contractualmente y verificado mediante los procesos de seguimiento y supervisión técnica.

No. 017 de 2025, **(OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUESCUN LOZANO por un valor inicial de **$2,214,445,514.00** presenta un avance físico del **70%**.

No. 016 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ por un valor inicial de **$ 242,550,556.51** y que presenta un avance físico del **70%.**

No. 021 de 2025, **(OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO, suscrito con el contratista CONSORCIO NARIÑO CONFORMADO POR LUIS ALFONSO TEJADA VALENCIA 50% Y VERTICES INGENIERÍA SAS 50%, por un valor inicial de **$ 1,758,013,587.71** y presenta un avance físico del **79%.**

No. 004 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE

ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista CONSORCIO INT ZANJON R.L José Moises Beltrán Hernández por un valor inicial de **$ 191,013,326.00** y que presenta un avance físico del **79%**.

El valor conjunto de las actas parciales asciende a la suma de **$ 1,331,365,992.31** discriminado así:

DESEMBOLSO	No. 8	Contratos de Obra No.
CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	$ 941,437,670.51	O- 017 de 2025 (Acta parcial 2)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	$ 90,420,493.73	CO- 016 de 2025 (Acta parcial 2)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CUIDAD DE ARMENIA QUINDIO.	$ 264,817,533.46	O- 021 de 2025 (Acta parcial 2)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CUIDAD DE ARMENIA QUINDIO"	$ 34,690,294.61	CO- 004 de 2025 (Acta parcial 2)
DESEMBOLSO # 8	**$ 1,331,365,992.31**	**TOTAL**

Cuadros de descripción de los contratos de obra:

Campo	Detalle
Modalidad de Contratación	Invitación publica - contratación régimen especial
No. Proceso	INVITACION PUBLICA 005-2025
Tipo de Contrato	Contrato de obra
No. del contrato	**No. 017 de 2025**
Contratista	MARCO JULIO SUESCUN LOZANO
Valor Inicial del Contrato	$ 2.214.445.514
Forma de pago	CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo con el avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoría y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación una vez cumplido la entrega y aprobación con el visto bueno del interventor y/o supervisor de la totalidad de actividades requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifesté que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados respectivamente y que se encuentra a paz y salva por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato.
Plazo inicial del contrato	CINCO (5) MESES
Fecha de inicio	5/11/2025
Fecha de terminación inicial	4/04/2026
Interventor	CONSORCIO INT ZANJON R.L JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ

Campo	Detalle
Modalidad de Contratación	Invitación Detallada
No. Proceso	**O- 021 de 2025**
Tipo de Contrato	Contrato Obra
No. del contrato	No. 021 de 2025
Contratista	CONSORCIO NARIÑO CONFORMADO POR LUIS ALFONSO TEJADA VALENCIA 50% Y VERTICES INGENIERÍA SAS 50%,
Valor Inicial del Contrato	$ 1.758.013.587,71
Forma de pago	El 100% del valor total del contrato, se pagará mediante actas parciales de obra ejecutada, incluida el acta final, suscritas con el visto bueno del supervisor (que correspondan a una realización inferior a un mes), de acuerdo con las cantidades aceptadas por la interventoría, supervisión, y el certificado de recibido a satisfacción de las mismas, Previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionales establecidos a tal fin. A dichas actas se realizará una retención en garantía del 10% del valor que se reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionalmente establecidos, hasta el fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y o contratistas, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactado, respectivamente, y que se encuentra paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta recibo satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedé pendiente por amortizar del anticipo, si lo hubiere
Plazo inicial del contrato	CINCO (5) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de inicio	14/10/2025
Fecha de terminación inicial	31/12/2025
Prorroga 1	1 MES
Prorroga 2	2 MES
Fecha de terminación con prorroga	31/03/2026
Interventor	JOSE MOISES HERNANDEZ BELTRAN

Cuadros de descripción de los contratos de interventoría:

Campo	Detalle
Modalidad de Contratación	contratación régimen especial
No. Proceso	**CO-004 de 2025**
Tipo de Contrato	Contrato de Consultoría
No. del contrato	No. 004 de 2025
Contratista	CONSORCIO INT ZANJON R.L JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ
Valor Inicial del Contrato	$ 191.013.326.00
Forma de pago	CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo al avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoría y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación.
Plazo inicial del contrato	SEIS (6) MESES SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha de inicio	14/10/2025
Fecha de terminación inicial	31/12/2025
Prorroga 1	1 MES
Prorroga 2	2 MES
Fecha de terminación con prorroga	31/03/2026
Interventor	CARLOS ANDRES TABARES VELASQUEZ

Campo	Detalle
Modalidad de Contratación	Invitación Simplificada
No. Proceso	CO-016-2025
Tipo de Contrato	Contrato de interventoría
No. del contrato	**No. 016 de 2025**
Contratista	CONSORCIO INT ZANJÓN R.L JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ
Valor Inicial del Contrato	$ 242.550.556,51
Forma de pago	CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo con el avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoría y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. Para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación.
Plazo inicial del contrato	SEIS (6) MESES
Fecha de inicio	5/11/2025
Fecha de terminación inicial	4/05/2026

Se adjuntan los respectivos documentos de soporte para este **OCTAVO** cobro del convenio, entre ellos: informes de supervisión, actas parciales debidamente suscritas, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácoras de obra, informes de ejecución financiera, soportes de seguridad social del personal, y demás documentos requeridos conforme a la normatividad vigente.

Agradezco su gestión para adelantar el trámite de pago correspondiente, garantizando la continuidad operativa y contractual de los proyectos contemplados en el marco del convenio interadministrativo.

Atentamente,

MONIKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO
Subgerente Tecnica
Supervisora convenio interadministrativo 2025-001
Empresas Públicas de Armenia ESP
Anexos:
1 CD – Soportes - (Contratos de Obra No. 017 y 021 de 2025 e Interventoría de obra No. 004 y 016 de 2025)
Proyectó: Kevin Alexis Gómez Ituyan – Ingeniero Civil Contratista – Subgerencia Técnica

CUENTA DE COBRO

CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 57.990.241.092)
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 58,024,392,744.37)
PARTES	MUNICIPIO DE ARMENIA NIT No 890000464-3 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P NIT No 890000439-9

MUNICIPIO DE ARMENIA NIT No 890.000.464-3

DEBE A:

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P NIT No 890.000.439-9

LA SUMA DE:

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE

($ 1,331,365,992.31)

POR CONCEPTO DE:

Desembolso establecido en la cláusula tercera, POR PARTE DEL MUNICIPIO Y EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P: CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 58,024,392,744.37)

Dado el avance de obra demostrado se solicita desembolso de acuerdo a la cláusula Tercera por valor de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 1,331,365,992.31)

Los recursos solicitados pueden ser desembolsados en la cuenta bancaria que a continuación se describe y sobre la cual se anexa certificación: CUENTA CORRIENTE NO. 0560136669992887 DEL BANCO DAVIVIENDA

MONIKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO
Subgerente Tecnica
Supervisora convenio interadministrativo 2025-001
Empresas Públicas de Armenia E.S.P

Proyectó: Kevin Alexis Gómez Ituyan / Ingeniero Civil Contratista - Subgerencia Técnica

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA

CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	890000439-9
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)	ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DE ARMENIA
FORMA DE PAGO	POR PARTE DEL MUNICIPIO: Dichos recursos serán desembolsados durante la vigencia 2025 y vigencia 2026, proporcionalmente a los avances de obra demostrados por EPA, según informe, registro fotográfico y evidencias presentadas y demás documentos solicitados por el Supervisor del convenio. POR PARTE DE EPA: Respecto a los recursos en dinero aportados por EPA ESP, éstos serán desembolsados conforme a los informes de avance de obra. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que las Empresas Públicas de Armenia — EPA ESP acredite toda la documentación de soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en el presente convenio. Respecto de los recursos en dinero aportados por la EPA, estos serán desembolsados, conforme a los informes de avance de obra.

MUNICIPIO DE ARMENIA	$	54,757,865,057.00
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EPA) EN DINERO	$	1,762,210,725.00
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (ESPECIE)	$	1,470,165,310.00
VALOR INICIAL CONTRATO TOTAL	$	57,990,241,092.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO POR EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EPA) EN DINERO	$	34,151,652.37
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION	$	58,024,392,744.37
VALOR ANTICIPO		N/A

VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	663,707,297.01
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$	1,330,032,426.52
VALOR ACTA PARCIAL No. 3	$	1,420,308,845.84
VALOR ACTA PARCIAL No. 4	$	1,462,029,244.29
VALOR ACTA PARCIAL No. 5	$	1,061,002,668.80
VALOR ACTA PARCIAL No. 6	$	10,057,492,974.77
VALOR ACTA PARCIAL No. 7	$	5,535,145,617.21
VALOR ACTA PARCIAL No. 8	$	1,331,365,992.31

VALOR A CANCELAR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE

SALDO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001	$	35,163,307,677.62

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	1965 DEL 13 FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	4366 DEL 8 MAYO DE 2025

PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA
CONTRATISTA

GERENTE
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA
CONTRATISTA

ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES
SUPERVISOR

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE ARMENIA

Contrato No.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001		
Objeto	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA		
Valor total	**$ 58,024,392,744.37** DETERMINADOS ASÍ: $ 54.757.865.057 MUNICIPIO 2025 $ 1.762.210.725 (APORTE) EN DINERO EPA $ 1.470.165.310 (ESPECIE) EPA $ 34.151.652,37 (APORTE) EN DINERO EPA	**Reg. Presupuestal No.**	4366 DEL 8 MAYO DE 2025
Contratista	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP		
Supervisor	ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES – SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
Fecha de Inicio	26 MAYO de 2025		
Fecha de terminación	25 de MAYO de 2026		
Plazo de Ejecución	El plazo para la ejecución de este convenio interadministrativo específico será de 12 meses, contados a partir de la configuración en la plataforma SECOP II.		
Forma de Pago	El valor estimado del convenio es de CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($58.024.392.744,37), que serán aportados así: a) POR PARTE DEL MUNICIPIO: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($54.757.865.057,00) b) POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA – EPA ESP: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($3.266.527.687,37),representados de la siguiente manera: 1. En especie: Un valor de MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($1.470.165.310), representados en la elaboración de los estudios y diseños. aportados en dinero. 2. En dinero: Un valor de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($1.796.362.377.37) representados en el CDP No 202500369, 202500627, 202501919.. Los recursos antes descritos serán desembolsados de la siguiente manera: Dichos recursos serán administrados en virtud del presente convenio por EPA ESP como ejecutora del mismo, y serán transferidos así: POR PARTE DEL MUNICIPIO: Dichos recursos serán desembolsados durante la vigencia 2025 y vigencia 2026, proporcionalmente a los avances de obra demostrados por EPA, según informe, registro fotográfico y evidencias presentadas y demás documentos solicitados por el Supervisor del convenio. POR PARTE DE EPA: Respecto a los recursos en dinero aportados por EPA ESP, éstos serán desembolsados conforme a los informes de avance de obra. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que las Empresas Públicas de Armenia – EPA ESP acredite toda la documentación soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en el presente convenio. Respecto de los recursos en dinero aportados por la EPA, estos serán desembolsados, conforme a los informes de avance de obra.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	02	12

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente **Acta Parcial No. 8** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 1 de enero del 2026 al 12 de febrero del 2026

Actividades Desarrolladas	1. Adelantar la fase precontractual y contractual para la ejecución de los contratos de obra derivados del presente convenio interadministrativo, acorde con su Manual de Contratación. Para el presente convenio se presenta resumen de los procesos precontractuales para la ejecución de la obra, en donde se presentan los siguientes documentos: • Estudios previos con fecha de publicación (junio de 2025). • Acta de inicio Epa adelanto las fases de publicación, adjudicación y ejecución de obras de los siguientes contratos de obra: **No. 017 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUESCUN LOZANO por un valor inicial de $2,214,445,514.00 presenta un avance físico del **70%.** (*Se entrega documentación en el desembolso numero 7)* **No. 016 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ por un valor inicial de $ 242,550,556.51 y que presenta un avance físico del **70%.** (*Se entrega documentación en el desembolso numero 7)* **No. 021 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO, suscrito con el contratista Consorcio Nariño R.L Luis Alfonso Tejada Valencia, por un valor inicial de $ 1,758,013,587.71 y presenta un avance físico del **79%.** (*Se entrega documentación en el desembolso numero 6)* **No. 004 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO". Suscrito con el contratista José Moisés Beltrán Hernández por un valor inicial de $ 191,013,326.00 y que presenta un avance físico del **79%.** (*Se entrega documentación en el desembolso numero 6)* 2. Celebrar contratos de obra e interventoría a que haya lugar, para la ejecución de las obras pactadas, con cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, así como con su sujeción al Manual de Contratación de EPA ESP. Epa adelanto la contratación y actas de inicio de los siguientes contratos de obra: **No. 017 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUESCUN LOZANO por un valor inicial de $2,214,445,514.00 presenta un avance físico del **70%.** **No. 016 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ por un valor inicial de $ 242,550,556.51 y que presenta un avance físico del **70%.** **No. 021 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO, suscrito con el contratista Consorcio Nariño R.L Luis Alfonso Tejada Valencia, por un valor inicial de $ 1,758,013,587.71 y presenta un avance físico del **79%.** **No. 004 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO". Suscrito con el contratista José Moisés Beltrán Hernández por un valor inicial de $ 191,013,326.00 y que presenta un avance físico del **79%.** 3. Realizar la supervisión de los contratos derivados, así como iniciar los trámites por incumplimiento contractual e imposición de multas contractuales a que haya lugar, en el marco de los contratos celebrados. EPA cuenta con personal capacitado para realizar la supervisión y la interventoría de los contratos de obra que se especifican en las actas de inicio. Así mismo, la secretaría de Infraestructura del municipio de Armenia

hace un seguimiento de los progresos de obra en el lugar.

No. 017 de 2025, (OBRA) tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUESCUN LOZANO por un valor inicial de $2,214,445,514.00 presenta un avance físico del **70%**.

No. 016 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ por un valor inicial de $ 242,550,556.51 y que presenta un avance físico del **70%.**

No. 021 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO, suscrito con el contratista Consorcio Nariño R.L Luis Alfonso Tejada Valencia, por un valor inicial de $ 1,758,013,587.71 y presenta un avance físico del **79%.**

No. 004 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO". Suscrito con el contratista José Moisés Beltrán Hernández por un valor inicial de $ 191,013,326.00 y que presenta un avance físico del **79%.**

4. Verificar los pagos realizados y que los mismos se adelanten en cumplimiento de las disposiciones contractuales y legales vigentes, confirmando por demás que se trate de pagos legalmente soportados, previo el pago de la seguridad social en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables.

La verificación de las planillas de pago de los contratistas se hace mediante la supervisión e interventoría asignados por EPA. Así mismo EPA elabora y presenta las actas parciales de los pagos efectuados a cada una de las obras e interventorías que se detallan a continuación.

No. 017 de 2025, (OBRA) tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUESCUN LOZANO por un valor inicial de $2,214,445,514.00 presenta un avance físico del **70%**.

No. 016 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ por un valor inicial de $ 242,550,556.51 y que presenta un avance físico del **70%.**

No. 021 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO, suscrito con el contratista Consorcio Nariño R.L Luis Alfonso Tejada Valencia, por un valor inicial de $ 1,758,013,587.71 y presenta un avance físico del **79%.**

No. 004 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO". Suscrito con el contratista José Moisés Beltrán Hernández por un valor inicial de $ 191,013,326.00 y que presenta un avance físico del **79%.**

5. Realizar la vigilancia sobre el equilibrio económico contractual de los contratos derivados, así como del presente convenio, y adelantar las advertencias y requerimientos a que haya lugar para mantener el mismo tanto en el convenio interadministrativo como en los contratos derivados del mismo.

Empresas Públicas de Armenia ***EPA*** entrega actas de pago (soportes), realizados a cada una de las obras contratadas.

Se anexan actas parciales de las obras contratadas del periodo informado.

6. Entregar las obras contratadas debidamente terminadas, respetando en todo caso los precios acordados en el marco del presente convenio interadministrativo especifico.

En relación con la presente cuenta de cobro, se informa que las obras de alcantarillado del convenio se

	encuentran actualmente en fase de ejecución o en su etapa final, y demás procesos que están por iniciar o por desarrollándose conforme a los plazos contractuales y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio. 7. Garantizar la estabilidad de las obras contratadas, durante el periodo de 5 años contados a partir del acta de recibido a satisfacción de las obras, a través de las garantías exigidas a los contratistas derivados. Empresas Públicas de Armenia ***EPA*** como garantía, suministra las pólizas correspondientes a cada una de las obras contratadas al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001. Las cuales reposan dentro de los anexos allegados en esta cuenta, de forma física y corresponden a cada acta parcial. 8. Las demás derivadas de a naturaleza del presente contrato interadministrativo La secretaria de Infraestructura del municipio realiza visitas periódicas de supervisión para verificar el progreso y las dificultades de las obras. Asimismo, la Secretaria de Infraestructura solicita a Empresas Públicas de Armenia EPA que entregue informes sobre el avance de las obras. Además, convoca a comités técnicos de trabajo para dialogar y coordinar la adecuada ejecución de las obras.
Evidencias de la ejecución del contrato	Empresas Públicas de Armenia ***EPA*** suministra los contratos de obra celebrados, sus correspondientes actas de inicio, actas parciales y demás obligaciones que garantizan el cumplimiento de las actividades. **No. 017 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUESCUN LOZANO por un valor inicial de $2,214,445,514.00 presenta un avance físico del **70%.** **No. 016 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ por un valor inicial de $ 242,550,556.51 y que presenta un avance físico del **70%.** **No. 021 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO, suscrito con el contratista Consorcio Nariño R.L Luis Alfonso Tejada Valencia, por un valor inicial de $ 1,758,013,587.71 y presenta un avance físico del **79%.** **No. 004 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO". Suscrito con el contratista José Moisés Beltrán Hernández por un valor inicial de $ 191,013,326.00 y que presenta un avance físico del **79%.**
ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$ 58,024,392,744.37 **DETERMINADOS ASI:** MUNICIPIO DE ARMENIA $ 54,757,865,057.00 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EN DINERO EPA) $ 1,762,210,725.00 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (ESPECIE) $ 1,470,165,310.00 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EN DINERO EPA ADICIÓN) $ 34,151,652.37
Anticipo (Si lo hay)	NO APLICA
Valor Acta No 1	**$ 663,707,297.01**
Valor Acta No 2	**$ 1.330.032.426.52**
Valor Acta No 3	**$ 1,420,308,845.84**
Valor Acta No 4	**$ 1,462,029,244.29**
Valor Acta No 5	**$ 1,061,002,668.80**
Valor Acta No 6	**$ 10,057,492,974.77**
Valor Acta No 7	**$ 5,535,145,617.21**
Valor Acta No 8	**$ 1,331,365,992.31**
Valor a pagar en la presente Acta No. 8	**$ 1,331,365,992.31**
Saldo (Valor pendiente para pago) aportes del Municipio	**$ 35,163,307,677.62**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (____) NO (_____) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		**Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios**	
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)			
Entidad en donde se realiza el pago.		**Valor total del aporte**	
Recibo No.		**Salud**	
Periodo cotizado	**De:**	**Pensión**	
	Hasta:	**ARP**	

ANEXOS:	*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social	X
Copias planillas de aporte	
Otros	

OBSERVACIONES: NINGUNA

Firma		
Nombre	PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA GERENTE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA CONTRATISTA	ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES SUPERVISOR SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DE ARMENIA
	LA EPA ESP	MUNICIPIO DE ARMENIA

	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL Secretaria de Hacienda Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal	Código: R-SH-PGF-001 Fecha: 20/12/2024 Versión: 003 Página 1 de 1

Número de Consecutivo: DJ-PJU-SUB-0195

Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO

Fecha: Mayo 08 de 2025

Con la presente solicito registro presupuestal así:

Beneficiario: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. – EPA E.S.P.

C.C o Nit.: 890.000.439-9

Nombre Clasificación central de productos: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

Código: 10601-2.3.2.02.02.005.4003040.074.54253-192

Valor: $46.797.757.685,49

N° del Contrato: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2025 - 002

N° Disponibilidad: 1965

Plazo de Ejecución: DOCE (12) MESES

Programación del PAC:

Mes	Programación $
JUNIO	$6.685.393.955,oo
JULIO	$6.685.393.955,oo
AGOSTO	$6.685.393.955,oo
SEPTIEMBRE	$6.685.393.955,oo
OCTUBRE	$6.685.393.955,oo
NOVIEMBRE	$6.685.393.955,oo
DICIEMBRE	$6.685.393.955,49

Vigencia Futura: SI _X___ NO __ __ N° de Acuerdo: Acuerdo No. 336 de Enero 27 de 2025

Objeto de la Solicitud:

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA. VIGENCIA 2025-2026.

Beatriz Lorena Londoño Rodríguez

BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRÍGUEZ
Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico

Fecha: 09/05/25 8:30

Proyectó: Wendy Paola Escobar Rúan, Auxiliar Administrativa D.A.J.
Elaboró. Wendy Paola Escobar Rúan, Auxiliar Administrativa D.A.J
Revisó: Beatriz Lorena Londoño Rodríguez, Subdirectora D.A.J.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro.

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 4366

Fecha de Compromiso: 8 de mayo de 2025

Beneficiario EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA **Nit:** 890000439 -9

No. C.D.P. 1965 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 13 de febrero de 2025

Tipo de Compromiso Transferencia de recursos

Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-0195 **Fecha:** 8/05/2025 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: Aunar esfuerzos institucionales para la reposición y construcción de alcantarillados y colectores para la descontaminación en diferentes barnos de cada ciudad de Armenia. Vigencia ftura 2025 - 2026

Cto.Utilidad SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

IMPÚTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversion		
Recurso Propio-Destinación Especifica		
CREDITO INTERNO		
601 - 2.3 2.02 02 005 4003040 074 - 192	Adquisición de servicios de apoyo financiero para adelantar proyectos de agua potable y saneamiento básico en el Municipio de Armenia	$ 46.797.757.685,49
Clasificadores		
-54253	46 797 757 685,49	
	Total Compromiso	$46.797.757.685,49

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Junio	$6.685.393.955,00
Julio	6.685.393.955,00
Agosto	6.685.393.955,00
Septiembre	6.685.393.955,00
Octubre	6.685.393.955,00
Noviembre	6.685.393.955,00
Diciembre	6.685.393.955,49
Valor Total	$46.797.757.685,49

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 4366

NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro.

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON
Lider de presupuesto

Elaboró

Revisó

Elaboró: SCOLONIAM

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Empresas Públicas De Armenia
la empresa de todos

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA, E.S.P

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

YO PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.377.493, en mi condición de gerente general de Empresas Publicas de armenia Identificada con Nit 890.000.439-9.

Por medio de la presente, me permito certificar, de acuerdo con lo señalado en el ARTICULO 50 LEY 789 de 2002,modificado por el artículo 9 de la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,que durante los últimos seis (6) meses calendario, se encuentra a PAZ y SALVO, por todo concepto de pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales de todos los empleados de Empresas Publicas de Armenia E.S.P. y de contratación de aprendices del servicio Nacional de aprendizaje SENA.

Se deja constancia a los 19 días del mes de Enero de 2026.

Atentamente,

PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA
Gerente General
Empresas Publicas de Armenia

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-890000439 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	133.800	0	133.800
Período salud:	2026-01	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	35952780 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	A	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-01-13	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
Transacción:	860000000000007015								
				GRAN TOTAL					$ 133.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	230201	800229739	PROTECCION	128	0	54.564.200	0	54.564.200
Período salud:	2026-01	230301	800224808	PORVENIR	162	0	66.641.700	0	66.641.700
Planilla Nro.:	35955052 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	2.338.600	0	2.338.600
Clase de aportante:	A	25-14	900336004	COLPENSIONES	289	0	180.892.600	0	180.892.600
Fecha transacción:	2026-01-13	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	0	326.000	0	326.000
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	67	0	6.390.300	0	6.390.300
Transacción:	860000000000007015	EPS005	800251440	SANITAS	103	0	14.423.900	0	14.423.900
		EPS010	800088702	EPS SURA	190	0	32.331.400	0	32.331.400
		EPS017	830003564	FAMISANAR	6	0	521.300	0	521.300
		EPS018	805001157	SOS-EPS	66	0	6.924.400	0	6.924.400
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	137	0	16.203.200	0	16.203.200
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	0	1.093.200	0	1.093.200
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	5	0	407.200	0	407.200
		MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	0	68.700	0	68.700
		14-23	860011153	POSITIVA	590	0	33.986.100	0	33.986.100
		CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	683	0	75.868.600	0	75.868.600
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	2	0	447.200	0	447.200
		PAICBF	899999239	ICBF	2	0	670.800	0	670.800
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 494.099.400

PLANILLAS

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

ASOPAGOS s.a.

REPORTE DE PAGO DISCRIMINADO POR ENTIDAD ADMINISTRADORA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	SUCURSAL	DIGITO DE VERFICACIÓN	CLASE DE APORTANTES	PERIODO DE CONSULTA
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP	NI 890000439	0	9	Aportante con 200 o mas cotizantes	2025-11

DATOS DE PLANILLA

NÚMERO DE PLANILLA	TIPO PLANILLA	PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	FECHA LIMITE DE PAGO
35602462	E	2025-11	2025-12	2025-12-10

PAGOS POR ADMINISTRADORA

SUBSISTEMA	NIT ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	CANTIDAD COTIZANTES	TOTAL SOLIDARIDAD	TOTAL SUBSISTENCIA	TOTAL PAGO
PENSION	800227940	231001	COLFONDOS	4	$ 40.800	$ 40.800	$ 2.255.200
PENSION	900336004	25-14	COLPENSIONES	286	$ 2.036.800	$ 2.036.800	$ 178.539.900
PENSION	800224808	230301	PORVENIR	158	$ 380.900	$ 380.900	$ 63.880.500
PENSION	800229739	230201	PROTECCION	129	$ 290.700	$ 290.700	$ 52.853.800
SALUD	901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 82.300
SALUD	830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 326.000
SALUD	900935126	ESSC62	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	5	$ 0	$ 0	$ 448.000
SALUD	830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA	7	$ 0	$ 0	$ 551.800
SALUD	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	104	$ 0	$ 0	$ 14.511.100
SALUD	805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE	66	$ 0	$ 0	$ 6.676.500
SALUD	800088702	EPS010	EPS SURA	188	$ 0	$ 0	$ 30.333.500
SALUD	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	141	$ 0	$ 0	$ 16.169.700
SALUD	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	14	$ 0	$ 0	$ 1.031.400
SALUD	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	62	$ 0	$ 0	$ 5.599.200
RIESGOS	860011153	14-23	POSITIVA	589	$ 0	$ 0	$ 32.994.200
CCF	890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	581	$ 0	$ 0	$ 71.649.000
SENA	899999034	PASENA	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 320.800
ICBF	899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 481.200
				TOTAL GENERAL:	$ 2.749.200	$ 2.749.200	$ 478.704.100

TOTALES POR SUBSISTEMA

SUBSISTEMA	VALOR PAGADO
PENSION	$ 297.529.400
SALUD	$ 75.729.500
RIESGOS	$ 32.994.200
CCF	$ 71.649.000
SENA	$ 320.800
ICBF	$ 481.200

ASOPAGOS s.a.

REPORTE DE PAGO DISCRIMINADO POR ENTIDAD ADMINISTRADORA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	SUCURSAL	DIGITO DE VERFICACIÓN	CLASE DE APORTANTES	PERIODO DE CONSULTA
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP	NI 890000439	0	9	Aportante con 200 o mas cotizantes	2025-12

DATOS DE PLANILLA

NÚMERO DE PLANILLA	TIPO PLANILLA	PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	FECHA LIMITE DE PAGO
35955052	E	2025-12	2026-01	2026-01-13

PAGOS POR ADMINISTRADORA

SUBSISTEMA	NIT ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	CANTIDAD COTIZANTES	TOTAL SOLIDARIDAD	TOTAL SUBSISTENCIA	TOTAL PAGO
PENSION	800227940	231001	COLFONDOS	4	$ 40.800	$ 40.800	$ 2.338.600
PENSION	900336004	25-14	COLPENSIONES	289	$ 2.024.600	$ 2.024.600	$ 180.892.600
PENSION	800224808	230301	PORVENIR	162	$ 377.600	$ 377.600	$ 66.641.700
PENSION	800229739	230201	PROTECCION	128	$ 311.200	$ 311.200	$ 54.564.200
SALUD	901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 68.700
SALUD	830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 326.000
SALUD	900935126	ESSC62	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	5	$ 0	$ 0	$ 407.200
SALUD	830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA	6	$ 0	$ 0	$ 521.300
SALUD	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	103	$ 0	$ 0	$ 14.423.900
SALUD	805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE	66	$ 0	$ 0	$ 6.924.400
SALUD	800088702	EPS010	EPS SURA	190	$ 0	$ 0	$ 32.331.400
SALUD	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	137	$ 0	$ 0	$ 16.203.200
SALUD	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	14	$ 0	$ 0	$ 1.093.200
SALUD	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	67	$ 0	$ 0	$ 6.390.300
RIESGOS	860011153	14-23	POSITIVA	590	$ 0	$ 0	$ 33.986.100
CCF	890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	583	$ 0	$ 0	$ 75.868.600
SENA	899999034	PASENA	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 447.200
ICBF	899999239	PAICBF	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 670.800
				TOTAL GENERAL:	$ 2.754.200	$ 2.754.200	$ 494.099.400

TOTALES POR SUBSISTEMA

SUBSISTEMA	VALOR PAGADO
PENSION	$ 304.437.100
SALUD	$ 78.689.600
RIESGOS	$ 33.986.100
CCF	$ 75.868.600
SENA	$ 447.200
ICBF	$ 670.800

ASOPAGOS s.a.

REPORTE DE PAGO DISCRIMINADO POR ENTIDAD ADMINISTRADORA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	SUCURSAL	DIGITO DE VERFICACIÓN	CLASE DE APORTANTES	PERIODO DE CONSULTA
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP	NI 890000439	0	9	Aportante con 200 o mas cotizantes	2026-01

DATOS DE PLANILLA

NÚMERO DE PLANILLA	TIPO PLANILLA	PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	FECHA LIMITE DE PAGO
36250551	E	2026-01	2026-02	2026-02-10

PAGOS POR ADMINISTRADORA

SUBSISTEMA	NIT ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	CANTIDAD COTIZANTES	TOTAL SOLIDARIDAD	TOTAL SUBSISTENCIA	TOTAL PAGO
PENSION	800227940	231001	COLFONDOS	4	$ 40.800	$ 40.800	$ 2.408.500
PENSION	900336004	25-14	COLPENSIONES	289	$ 1.494.000	$ 1.494.000	$ 187.650.100
PENSION	800224808	230301	PORVENIR	164	$ 309.600	$ 309.600	$ 72.232.900
PENSION	800229739	230201	PROTECCION	127	$ 290.700	$ 290.700	$ 56.757.000
SALUD	901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 91.800
SALUD	830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 326.000
SALUD	900935126	ESSC62	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	6	$ 0	$ 0	$ 378.100
SALUD	830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA	6	$ 0	$ 0	$ 526.900
SALUD	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	105	$ 0	$ 0	$ 15.428.000
SALUD	805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE	66	$ 0	$ 0	$ 7.366.900
SALUD	800088702	EPS010	EPS SURA	191	$ 0	$ 0	$ 34.108.100
SALUD	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	134	$ 0	$ 0	$ 16.590.400
SALUD	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	13	$ 0	$ 0	$ 1.108.800
SALUD	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	69	$ 0	$ 0	$ 7.018.100
RIESGOS	860011153	14-23	POSITIVA	592	$ 0	$ 0	$ 36.673.000
CCF	890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	583	$ 0	$ 0	$ 76.103.800
SENA	899999034	PASENA	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 546.900
ICBF	899999239	PAICBF	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 820.200
				TOTAL GENERAL:	$ 2.135.100	$ 2.135.100	$ 516.135.500

TOTALES POR SUBSISTEMA

SUBSISTEMA	VALOR PAGADO
PENSION	$ 319.048.500
SALUD	$ 82.943.100
RIESGOS	$ 36.673.000
CCF	$ 76.103.800
SENA	$ 546.900
ICBF	$ 820.200

DOCUMENTOS GERENTE

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.377.493**

RODRIGUEZ OSPINA

APELLIDOS

PAULO CESAR

NOMBRES

Paulo Cesar Rodriguez Ospina

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1978**

ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-SEP-1996 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2600100-00257163-M-0004377493-20100924 0024070881A 1 35366302

Nit: 890000464-3
Despacho del Alcalde

DECRETO No. 0787 de 2024

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO"

El alcalde de Armenia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 315 numeral 3º de la Constitución Política, artículo 29º literal d numeral 2º de la Ley 1551 de 2012, artículo 25º de la Ley 909 de 2004, artículo 2.2.5.1.2 del Decreto 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, dispone:

"Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley."

Que el artículo 315 ibidem, contempla las atribuciones de los alcaldes, entre las que se encuentra:

"(...) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (...)"

Que el artículo 29 literal d numeral 2º de la Ley 1551 de 2012, dispone:

" (...) d) En relación con la Administración Municipal:

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (...)"

Que, en relación con los tipos de cargos, funciones y nominador, los artículos 5º, 12, y 25º de la Ley 909 de 2004 disponen:

Artículo 5º. "Los empleos públicos son de carrera administrativa, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley."

Artículo 12º. "Los empleos de libre nombramiento y remoción son aquellos cuyas funciones no pueden ser desempeñadas por personas vinculadas a la carrera administrativa, por requerirse para su ejercicio la confianza personal y la discrecionalidad del nominador." Artículo 25: "El nombramiento y remoción de los empleos de libre nombramiento y remoción será decidido por el nominador respectivo, de acuerdo con las normas legales aplicables."

Artículo 25: "El nombramiento y remoción de los empleos de libre nombramiento y remoción será decidido por el nominador respectivo, de acuerdo con las normas legales aplicables."

Que la normativa nacional, otorga cierta discrecionalidad a los ejecutivos municipales, para nombrar en los cargos de libre nombramiento y remoción, lo que garantiza la eficiencia y eficacia de la función pública, al designar profesionales con idoneidad y experiencia para la cartera requerida, lo anterior, e armonía con los lineamientos de la Sentencia C-450 de 1995 de la Corte Constitucional.

Nit: 890000464-3
Despacho del Alcalde

DECRETO No. 0787 de 2024

Que el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, dispone lo relativo a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, cuyas características les permiten gozar de Personería jurídica, Autonomía administrativa y financiera, y Capital independiente.

Que en este mismo contexto, los gerentes de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden territorial son funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción del Alcalde Municipal.

Que mediante el Decreto No. 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, se dispuso en el artículo 2.2.5.1.2 la facultad con que cuenta el alcalde para realizar nombramientos, cuyo contenido reza:

"Facultad para nombrar en la Rama Ejecutiva del orden Territorial. Corresponde a los gobernadores y alcaldes nombrar a:

1. Empleados bajo su dependencia

2. Presidentes, directores o gerentes de las entidades del sector central y descentralizado

(...)."

Que según se dispone en el Acuerdo No. 013 de octubre 8 de 2007, Por medio del cual se aprueban los Estatutos de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., a voces del artículo 1º, la prestadora de servicios es una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, y conforme al artículo 26, la administración y la representación legal estarán cargo del Gerente General, quien será de libre nombramiento y remoción, correspondiendo su nombrarniento al señor alcalde del Municipio de Armenia.

Que el artículo 26 del Acuerdo 013 de octubre 8 de 2007, establece que el Gerente será funcionario de Libre Nombramiento del Alcalde Municipal, y el encargado de la presentación legal de EPA ESP.

Que los requisitos para el cargo de gerente de EPA ESP están contemplados en el artículo 27 del Acuerdo 013 de octubre 8 de 2007, los cuales contrastados con los documentos y calidades acreditadas por Paulo César Rodríguez Ospina, se entienden cumplidos.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 648 de 2017 que contempla la figura del encargo, la gerencia general de Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. fue provista de titular como a través del Decreto No. 046 del 04 de enero de 2024, designación efectuada a la Ingeniera Civil María Isabel López Martínez, situación administrativa cuyo término finaliza en la fecha, esto es, el día cuatro (04) de julio de 2024 y, por lo tanto, el cargo debe surtirse de manera definitiva.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el artículo 26 del Acuerdo No. 013 de 2007, y artículo 1º del Acuerdo No. 08 de 2012, Por medio del cual se modifican los Estatutos de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., la Ley 1437 de 2011, los artículos 2.2.5.1.4.y 2.2.5.1.5 del Decreto 648 de 2017 y demás normas concordantes, el Departamento Administrativo Jurídico de Armenia, Quindío, llevó a cabo la verificación de formación, experiencia y competencias requeridas para el cargo de Gerente General de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., certificando que el Abogado Paulo Cesar Rodríguez Ospina, acreditó los requisitos exigidos, establecidos en el Acuerdo No. 08 del 22 de marzo de 2012 *"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ESTATUTOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP"*.

Con fundamento en lo expuesto este Despacho,

Nit: 890000464-3
Despacho del Alcalde

DECRETO No. 0787 de 2024

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: NOMBRAR como Gerente General de Empresas Públicas de Armenia ESP al Abogado PAULO CESAR RODRÍGUEZ OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.377.493 expedida en Armenia, Quindío, quien prestará sus servicios a partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los documentos exigidos en la normativa vigente, para tales efectos.

ARTICULO SEGUNDO: La asignación salarial mensual corresponde a la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($14.579.659)

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el contenido el presente acto administrativo al doctor PAULO CÉSAR RODRÍGUEZ OSPINA, a la ingeniera MARIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ quien cesa en el encargo, a la dependencia de Talento Humano de EPA ESP y a los integrantes de la Junta Directiva.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.

Dado en Armenia a los 04 días del mes de julio de 2024.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

JAMES PADILLA GARCÍA
Alcalde

Proyectó: Ricardo Mora Obando – Abogado Contratista – D.A.J
Revisó: Lina María Parra Sepúlveda -Directora - D. A. J
Vo Bo. Lina María Mesa Moncada - Asesora – Despacho
Vo. Bo. Despacho

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA POSESIÓN No. 215

GERENTE GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ES.P.
CARGO

05 de julio de 2024
FECHA

Se presentó ante el despacho del señor Alcalde del Municipio de Armenia el Abogado Paulo Cesar Rodríguez Ospina, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.377.493 expedida en Armenia, Quindío), con el fin de tomar posesión en el cargo de nivel Directivo, denominado Gerente General de Empresas Públicas De Armenia E.S.P para el que fue nombrado a través de Decreto No. 787 del 04 de julio de 2024.

Presentó los siguientes documentos:
Formato único de hoja de vida de la función pública.
Formato de declaración juramentada de bienes y rentas y registro de conflictos de interés.
Fotocopia cédula de ciudadanía.
Fotocopia libreta militar.
Actas de grado
Diplomas
Fotocopia de certificados laborales y de estudio.
Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación)
Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la República).
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de medidas correctivas
Certificado de ingresos
Aptitud médica
Certificado de afiliación a seguridad social (salud, pensión y cesantías)

El posesionado manifiesta bajo juramento no tener impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.

Acto seguido se le recibió juramento, el posesionado prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone.

El Posesionado manifiesta bajo juramento no tener conocimiento de procesos pendientes de carácter alimentario o que cumplirá con sus obligaciones de familia. (Artículo 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017).

Se adhiere y se anula estampilla pro hospital por valor de $291.594.

Se firma para constancia la presente diligencia.

JAMES PADILLA GARCÍA
Alcalde

EL POSESIONADO

Proyectó: Ricardo Mora Obando – Abogado Contratista – D.A.J.
Revisó: Lina María Parra Sepúlveda – Directora D.A.J
Vo.Bo. Lina María Mesa – Asesora – Despacho Alcalde

RUT

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 0 0 0 4 3 9	9	Impuestos y Aduanas de Armenia	1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 CL 17 ED CAM P 5

42. Correo electrónico contabilidad@epa.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 3 0 0 0 1	6 0 6 7 4 1 1 7 8 0	3 1 6 2 8 3 5 3 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 6 0 0	1 9 9 9 0 5 2 0	3 7 0 0	1 9 9 9 0 5 2 0	3 8 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 1 4 1 5 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOLANO OROZCO JULIAN ENRIQUE

985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 23-01-2026 03:53:52PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 0 0 0 4 3 9	9	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 2
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	0 3
72. Número	4 3	7 8 7
73. Fecha	1 9 6 2 1 2 1 5	2 0 2 4 0 7 0 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	0 1
76. Fecha de registro		2 0 2 4 0 7 0 4
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 3	6 3
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1

Vigencia

80. Desde	1 9 6 2 1 2 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Servicios Públicos 4

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 3	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 0 0 0 4 3 9	9	Impuestos y Aduanas de Armenia	1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 5 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanl 1 3	4 3 7 7 4 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	OSPINA	PAULO	CESAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) **000014118468576 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 0 0 0 4 3 9	9	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 5 5 8 5 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PADILLA	GARCIA	JAMES	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 1 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 7 7 0 0 7 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SEPULVEDA	LOPEZ	JULIAN	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 3 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 1 4 7 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GAVIRIA	BERMUDEZ	JUAN	NICOLAS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 3 2 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 5 2 0 4 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CALDERON	RAMIREZ	LUIS	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 3 0 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 5 0 0 0 1 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	DUQUE	RAFAEL	ORLANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 1 0 1 9	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 0 0 0 0 4 3 9	9	Impuestos y Aduanas de Armenia	1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 5 2 9 0 1 6		1 9 1 0 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RIOS	GIRALDO	JORGE	HERNAN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 8 2 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Infraestructura

epa Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos

ACTAS DE PAGO CONTRATOS

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

Documento Controlado
Código: DJSG-R-008
Versión: *10*
Fecha de Emisión: *24-06-14*
Pagina: 1/1

Acta Parcial

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.

Contrato No.	CONTRATO DE CONSULTORIA No 016 de 2025								
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ,CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ZANJON HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA - QUINDIO								
Valor Contrato	Inicial	$ 242.550.556,51	CDP No.	01-902-202501552	RPC No.	01-903-202501981			
	Adicional	N/A	CDP No.	N/A	RPC No.	N/A			
Contratista	CONSORCIO INT ZANJON R. L JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ				Fecha Acta Parcial	AA	MM	DD	
Supervisor y/o Interventor	JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO					26	2	2	

En la ciudad de Armenia, Quindio, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No. 2 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Fecha de Inicio	AA	MM	DD	Plazo de Ejecución	Prorroga
	25	11	5	SEIS (6) MESES	N/A

Estado de Cuenta

Valor Contrato	$ 242.550.556,51
Anticipo (Si lo hay)	
Valor Acta No 1	$ 43.449.630,14
Valor Acta No 2	$ 90.420.493,73
Valor a pagar en la presente Acta No. 2	$ 81.378.444,36
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 108.680.432,64

Entidad Bancaria del Contratista	DAVIVIENDA	Cuenta	Ahorros No.	0550136600227435
			Corriente No.	N/A

Calificación / Criterios	1	2	3	4	5
Calidad					X
Cumplimiento					X
Atención al cliente Interno y Externo					X
Salud y Seguridad en el Trabajo					X
Gestion Ambiental					X

Aportes al Sistema de Seguridad Social			AA	MM	DD
Numero de la Planilla	9498738337	Desde	26	1	1
		Hasta	26	2	2
Salud $	$ 218.900,00				
Pensión $	$ 0,00				
ARL $	$ 121.900,00				

ANEXOS:		
	Discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)	N/A
	Informe de actividades contractuales (Otro tipo de Contratos)	X

Firma			
Nombre	CONSORCIO INT ZANJON R.L. JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ	JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO Gestor Tratamineto Aguas Residuales	
	Contratista	*Supervisor y/o Interventor*	*Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General*

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

Documento Controlado
Código: DJSG-R-008
Versión: 10
Fecha de Emisión: 24-06-14
Pagina: 1/1

Acta Parcial

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No 017 de 2025								
Objeto	CONSTRUCCION DEL COLECTOR ZANJON HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA - QUINDIO								
Valor Contrato	Inicial	$ 2.214.445.514,00	CDP No.	01-902-202501551	RPC No.	01-903-202501791			
	Adicional	N/A	CDP No.	N/A	RPC No.	N/A			
Contratista	MARCO JULIO SUESCUN LOZANO				Fecha Acta Parcial	AA	MM	DD	
Supervisor y/o Interventor	CONSORCIO INT ZANJON R . L JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ					26	2	2	

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No. 1 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Fecha de Inicio	AA	MM	DD	Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES	Prorroga	N/A
	25	11	5				

Estado de Cuenta

Valor Contrato	$ 2.214.445.514,00
Anticipo (Si lo hay)	
Valor Acta No 1	$ 584.422.689,77
Valor Acta No 2	$ 941.437.670,51
Valor a pagar on la presente Acta No. 2	$ 847.293.903,46
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 688.585.153,72

Entidad Bancaria del Contratista	DAVIVIENDA	Cuenta	Ahorros No.	0550136600136206
			Corriente No.	N/A

Calificación / Criterios	1	2	3	4	5
Calidad					X
Cumplimiento					X
Atención al cliente Interno y Externo					X
Salud y Seguridad en el Trabajo					X
Gestion Ambiental					X

Aportes al Sistema de Seguridad Social			AA	MM	DD
Numero de la Planilla	36222995	Desde	26	1	1
		Hasta	26	2	2
Salud $	$ 232.000,00				
Pensión $	$ 297.000,00				
ARL $	$ 129.200,00				

ANEXOS:		
	Discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)	X
	Informe de actividades contractuales (Otro tipo de Contratos)	X

Firma			
Nombre	MARCO JULIO SUESCUN LOZANO	CONSORCIO INT ZANJON R.L. JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ	
	Contratista	*Supervisor y/o Interventor*	*Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General*

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

		Documento Controlado
epa	**Acta Parcial**	Código: DJSG-R-008
		Versión: *10*
		Fecha de Emisión: *24-06-14*
		Pagina: 1/1

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.

Contrato No.	Contrato de Obra N°021 de 2025								
Objeto	Reposicion parcial del alcantarillado del barrio Antonio Nariño de la ciudad de Armenia Quindío								
Valor Contrato	**Inicial**	$ 1,758,013,587.71	**CDP No.**	902-202501514	**RPC No.**	01-903202501859			
	Adicional	N/A	**CDP No.**	N/A	**RPC No.**	N/A			
Contratista	Luis Alfonso Tejada R.L Consorcio Nariño				**Fecha Acta Parcial**	**AA**	**MM**	**DD**	
Supervisor y/o Interventor	Jose Moises Beltran Hernandez Interventor externo					25	12	30	

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No. 2 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Fecha de Inicio	**AA**	**MM**	**DD**	**Plazo de Ejecución**	Cinco (5) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2025	**Prorroga**	N/A
	25	10	14				

Estado de Cuenta

Valor Contrato	$ 1,758,013,587.71
Anticipo (Si lo hay)	$ 0.00
Valor Acta No 1	$ 966,931,624.68
Valor Acta No 2	$ 264,817,533.46
Valor a pagar en la presente Acta No. 2	$ 264,817,533.46
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 526,264,429.57

Entidad Bancaria del Contratista	CAJA SOCIAL	**Cuenta**	**Ahorros No.**	24149763459
			Corriente No.	

Criterios \ **Calificación**	1	2	3	4	5
Calidad					X
Cumplimiento					X
Atención al cliente Interno y Externo					X
Salud y Seguridad en el Trabajo					X
Gestion Ambiental					X

Aportes al Sistema de Seguridad Social			**AA**	**MM**	**DD**
Numero de la Planilla	9495944600 - 9495991948	**Desde**	25	12	1
		Hasta	25	12	31
Salud $	$ 305,800.00				
Pensión $	$ 738,500.00				
ARL $	$ 256,900.00				

ANEXOS:	**Discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)**	X
	Informe de actividades contractuales (Otro tipo de Contratos)	

Firma			
Nombre	Luis Alfonso Tejada R.L Consorcio Nariño	Jose Moises Beltran Hernandez Interventor externo	
	Contratista	***Supervisor y/o Interventor***	***Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General***

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

		Documento Controlado
epa	**Acta Parcial**	Código: DJSG-R-008
		Versión: *10*
		Fecha de Emisión: *24-06-14*
		Pagina: 1/1

Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.

Contrato No.	**004 de 2025**								
Objeto	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO"**								
Valor Contrato	**Inicial**	$191.013.326,00	**CDP No.**	01-902-202501515	**RPC No.**	01-903-202501677			
	Adicional	N/A	**CDP No.**	N/A	**RPC No.**	N/A			
Contratista	José Moisés Beltrán Hernández				**Fecha Acta Parcial**	**AA**	**MM**	**DD**	
Supervisor y/o Interventor	Carlos Andrés Tabares Velásquez					25	12	30	

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No. __02____ del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Fecha de Inicio	**AA**	**MM**	**DD**	**Plazo de Ejecución**	Seis (6) meses sin excede a 31 de diciembre	**Prorroga**	N/A
	25	10	14				

Estado de Cuenta	
Valor Contrato	$ 191,013,326.00
Anticipo (Si lo hay)	$ 0.00
Valor Acta No 1	$ 103,367,518.59
Valor Acta No 2	$ 34,690,294.61
Valor a pagar en la presente Acta No.	$ 34,690,294.61
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 52,955,512.79

Entidad Bancaria del Contratista	DAVIVIENDA	**Cuenta**	**Ahorros No.**	136700040464	
			Corriente No.		

Calificación / **Criterios**	1	2	3	4	5
Calidad					X
Cumplimiento					X
Atención al cliente Interno y Externo					X
Salud y Seguridad en el Trabajo					X
Gestion Ambiental					X

Aportes al Sistema de Seguridad Social			**AA**	**MM**	**DD**
Numero de la Planilla	9496037748	**Desde**	25	11	01
		Hasta	25	11	31
Salud $	$ 178,000.00				
Pensión $	N/A				
ARL $	$ 99,100.00				

ANEXOS:	**Discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)**	
	Informe de actividades contractuales (Otro tipo de Contratos)	X

Firma			19 DIC 2025
Nombre	José Moisés Beltrán Hernández	Carlos Andrés Tabares Velásquez	
	Contratista	*Supervisor y/o Interventor*	*Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General*

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

Armenia, enero de 2026

Doctor
PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA
Gerente General
Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P
Ciudad

Asunto: Solicitud de Prórroga al Contrato de **Obra No. 021 de 2025 "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO"**

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito remitir la solicitud realizada por el Consorcio Nariño R.L Luis Alfonso Tejada Valencia, contratista de obra, y avalada por el interventor, José Moisés Beltrán Hernández, en la cual expone la necesidad de realizar una segunda prórroga en el plazo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. **Contrato de obra No. 021 de 2025**.

   Objeto: Reposición parcial alcantarillado barrio Antonio Nariño de la ciudad de Armenia Quindío.
   Valor: $1.758.013.587,71
   Plazo de ejecución: Cinco (5) meses sin exceder diciembre 31 de 2025.
   Valor ejecutado a la fecha: $ 1.318.510.190,78
   Saldo pendiente: $ 439.503.396,93
   Valor a constituir como reserva: $ 439.503.396,93
   Porcentaje físico: 75%

JUSTIFICACIÓN:

La presente solicitud se fundamenta en circunstancias objetivas, documentadas y verificables que han impedido el cumplimiento del cronograma establecido, a pesar de los esfuerzos técnicos y administrativos realizados por el contratista y la interventoría. A continuación, se detallan exhaustivamente las razones que sustentan esta solicitud:

1. CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS Y SUS EFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Desde el inicio del contrato el 14 de octubre de 2025, y extendiéndose durante los meses de noviembre, diciembre de 2025 y enero de 2026, la región del Quindío ha experimentado un régimen de lluvias atípico y excepcionalmente intenso, superando los promedios históricos para la temporada. Estas condiciones meteorológicas adversas han generado los siguientes impactos directos en la ejecución de la obra:

Suspensión de actividades a cielo abierto: Las labores de excavación, movimiento de tierras, conformación de bases y sub-bases, y actividades de pavimentación han debido suspenderse en múltiples ocasiones debido a la imposibilidad de trabajar con los suelos en condiciones de saturación, lo cual compromete la calidad de los trabajos y las especificaciones técnicas del proyecto.

Inundaciones y encharcamientos en frentes de trabajo: Las precipitaciones han generado acumulación de agua en las áreas de trabajo, requiriendo tiempo adicional para el drenaje y secado de las zonas antes de poder reanudar las actividades constructivas.


Afectación en la compactación de materiales: Los niveles de humedad excesivos en el suelo han impedido alcanzar los grados de compactación requeridos según las especificaciones técnicas, obligando a esperar períodos de secado natural que han extendido significativamente los tiempos de ejecución.

Riesgos de seguridad laboral: Las condiciones de lluvia han incrementado los riesgos de accidentes laborales, haciendo necesaria la suspensión temporal de actividades en altura y en zonas con pendientes pronunciadas para salvaguardar la integridad del personal.


Es importante destacar que estas condiciones climáticas constituyen un caso fortuito o fuerza mayor que escapa completamente al control del contratista y que, conforme a la normatividad vigente, justifica plenamente la extensión del plazo contractual.





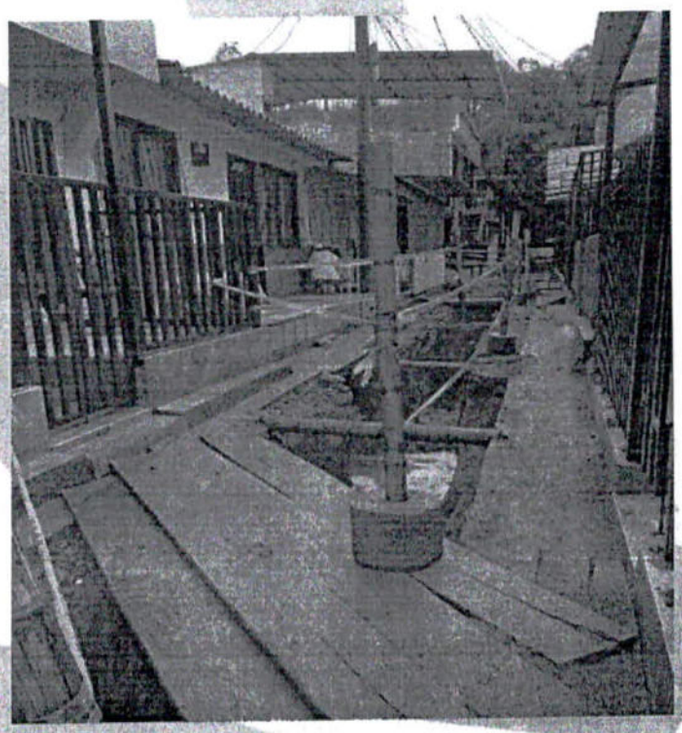



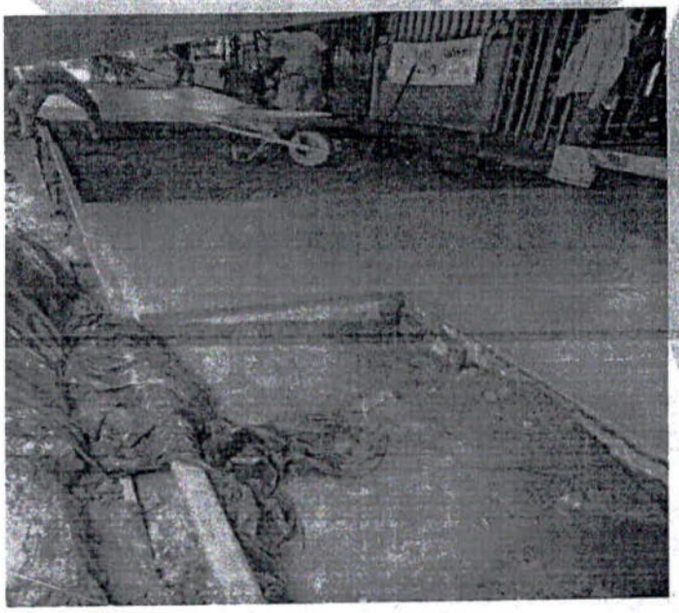





Informe Técnico Diario de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos (ITD). FUENTE: IDEAM

https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Informe-T%C3%A9cnico-Diario-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas,-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-(ITD) .

2. ESCASEZ CRÍTICA DE PERSONAL CALIFICADO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La ciudad de Armenia y el departamento del Quindío atraviesan actualmente un auge sin precedentes en la ejecución de proyectos de infraestructura, tanto del sector público como privado. Esta situación ha generado una competencia extraordinaria por la mano de obra disponible, creando las siguientes dificultades:

Insuficiencia de personal técnico especializado: La demanda de maestros de obra, oficiales, operadores de maquinaria pesada, soldadores certificados y personal con competencias técnicas específicas supera ampliamente la oferta disponible en la región. Esta escasez ha obligado a trabajar con equipos reducidos, afectando los rendimientos diarios proyectados.

Alta rotación de personal: La competencia entre contratistas por conseguir y retener personal calificado ha generado una rotación constante de trabajadores, lo que implica períodos de inducción, capacitación y adaptación que impactan negativamente en la productividad de la obra.

Necesidad de traer personal de otras regiones: Para suplir la deficiencia de mano de obra local, ha sido necesario gestionar la vinculación de personal proveniente de otros municipios y departamentos, proceso que requiere tiempo para el reclutamiento, traslado, alojamiento y organización logística, además de implicar sobrecostos que afectan la economía del contrato.

Dificultades en la conformación de cuadrillas completas: La imposibilidad de contar con cuadrillas completas y permanentes ha obligado a reorganizar constantemente los frentes

de trabajo, generando ineficiencias operativas y demoras en la ejecución de actividades interdependientes.

Esta situación del mercado laboral local constituye un factor externo e imprevisible al momento de la firma del contrato, que ha impactado objetivamente la capacidad de cumplir con el cronograma inicial.

2. DIFICULTADES CRÍTICAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA LLENOS Y RELLENOS.

Ha resultado muy difícil conseguir la tierra con las características adecuadas para usar como material de lleno en obra debido a que el régimen de lluvias intensas y persistentes ha afectado gravemente la disponibilidad de material ya que las lluvias a su vez generan las siguientes consecuencias.

Saturación de los bancos de material: Los yacimientos y canteras autorizadas para la extracción de material de préstamo presentan niveles de saturación hídrica que impiden su explotación adecuada. La presencia constante de agua en estos bancos hace que el material extraído contenga excesos de humedad que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para los llenos estructurales en obra.
Imposibilidad de acceso a zonas de extracción: Las vías de acceso a varios bancos de material se han visto afectadas por deslizamientos, derrumbes y deterioro del afirmado debido a las lluvias, imposibilitando o restringiendo severamente el ingreso de maquinaria pesada y vehículos de transporte.

Necesidad de procesos de secado artificial: El material que logra extraerse requiere de procesos de secado artificial o natural antes de poder ser transportado y utilizado en obra, lo cual implica tiempos adicionales significativos y afecta la continuidad de las actividades de relleno y conformación.

Reducción en la capacidad de producción de los proveedores: Los propietarios y operadores de bancos de material han tenido que reducir o suspender temporalmente sus operaciones debido a las condiciones climáticas, lo que ha generado desabastecimiento en el mercado local y listas de espera para el suministro.

Impacto en actividades de la ruta crítica: Los llenos y rellenos constituyen actividades críticas del proyecto que condicionan el avance de otras fases constructivas. Los retrasos en el suministro de material han generado un efecto dominó que ha paralizado temporalmente varios frentes de trabajo dependientes.

Contrato: OBRA No. 021 DE 2025
Objeto: REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO
Contratista: Consorcio Nariño R.L Luis Alfonso Tejada Valencia
Interventor: José Moisés Beltrán Hernández
Valor inicial: $ 1.758.013.587,71
Tiempo de ejecución inicial: Cinco (5) meses sin exceder 31-12-2025
Fecha de Inicio: 14-10-2025
Fecha de terminación inicial: 31-12-2025
Fecha de terminación con prórroga No. 1: 31 de enero de 2026
Prórroga No. 2 solicitada: Dos (2) meses

Fecha de Terminación con prórroga No. 2: 31 de marzo de 2026

Cordialmente,

CARLOS ANDRES TABARES VELASQUEZ
Gestor Planeación Técnica
Empresas Públicas de Armenia ESP

Anexos: Oficios y soportes del contratista e interventoría de solicitud de prórroga # 2

Armenia, enero de 2026

Doctor
PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA
Gerente General
Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P
Ciudad

Asunto: Solicitud de Prórroga al Contrato de **Consultoría No. 04 de 2025**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito remitir la solicitud realizada por el interventor José Moisés Beltrán Hernández, contratista del contrato de la referencia, en la cual expone la necesidad de realizar una prórroga # 2 a la consultoría en mención.

Lo anterior, teniendo en cuenta la solicitud del ingeniero José Luis Tejada Valencia, contratista RL del contrato de obra No. 021 de 2025, quien tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO, en donde informa que en la ejecución del contrato de obra se han presentado diversas situaciones como las siguientes:

Contrato de consultoría No. 04 de 2025.

Objeto: interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la reposición parcial alcantarillado barrio Antonio Nariño de la ciudad de Armenia Quindío.
Valor: $191.013.326
Plazo de ejecución: Seis (6) meses sin exceder diciembre 31 de 2025.
Valor ejecutado a la fecha: $151,778,476.92
Saldo pendiente: $39,234,849.08
Valor a constituir como reserva: $52,955,512.79
Porcentaje ejecutado financiero: 72.28%
Porcentaje físico: 75%.

JUSTIFICACIÓN:

La presente solicitud se fundamenta en circunstancias objetivas, documentadas y verificables que han impedido el cumplimiento del cronograma establecido, a pesar de los esfuerzos técnicos y administrativos realizados por el contratista y la interventoría. A continuación, se detallan exhaustivamente las razones que sustentan esta solicitud:

1. CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS Y SUS EFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Desde el inicio del contrato el 14 de octubre de 2025, y extendiéndose durante los meses de noviembre, diciembre de 2025 y enero de 2026, la región del Quindío ha experimentado un régimen de lluvias atípico y excepcionalmente intenso, superando los promedios históricos para la temporada. Estas condiciones meteorológicas adversas han generado los siguientes impactos directos en la ejecución de la obra:

Suspensión de actividades a cielo abierto: Las labores de excavación, movimiento de tierras, conformación de bases y sub-bases, y actividades de pavimentación han debido suspenderse en múltiples ocasiones debido a la imposibilidad de trabajar con los suelos en condiciones de saturación, lo cual compromete la calidad de los trabajos y las especificaciones técnicas del proyecto.

Inundaciones y encharcamientos en frentes de trabajo: Las precipitaciones han generado acumulación de agua en las áreas de trabajo, requiriendo tiempo adicional para el drenaje y secado de las zonas antes de poder reanudar las actividades constructivas.


Afectación en la compactación de materiales: Los niveles de humedad excesivos en el suelo han impedido alcanzar los grados de compactación requeridos según las especificaciones técnicas, obligando a esperar períodos de secado natural que han extendido significativamente los tiempos de ejecución.


Riesgos de seguridad laboral: Las condiciones de lluvia han incrementado los riesgos de accidentes laborales, haciendo necesaria la suspensión temporal de actividades en altura y en zonas con pendientes pronunciadas para salvaguardar la integridad del personal.


Es importante destacar que estas condiciones climáticas constituyen un caso fortuito o fuerza mayor que escapa completamente al control del contratista y que, conforme a la normatividad vigente, justifica plenamente la extensión del plazo contractual.







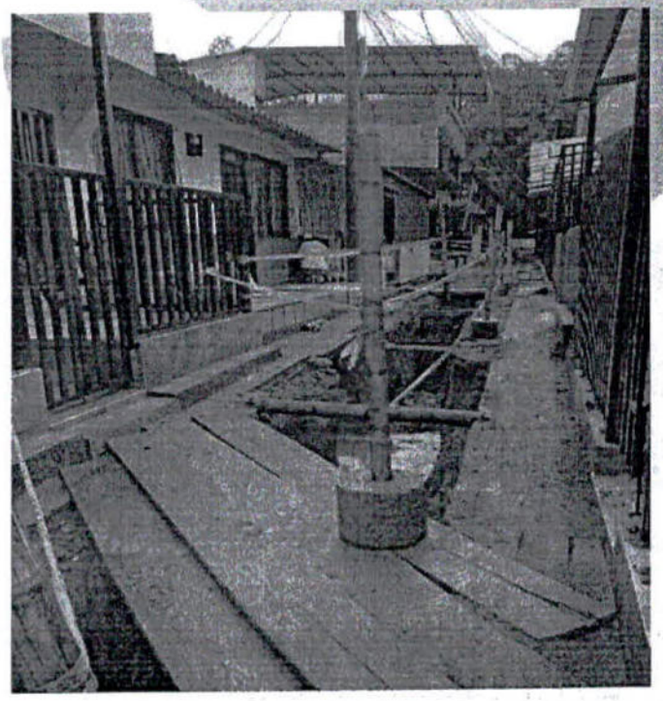

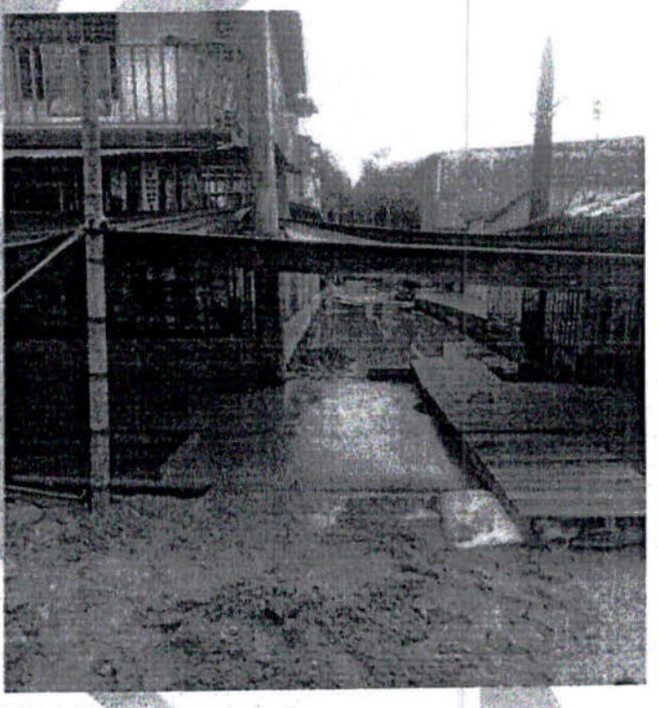

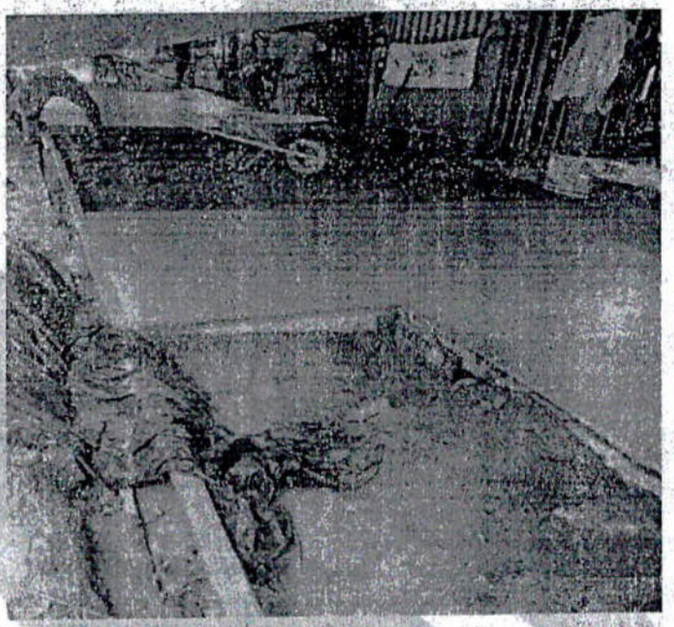

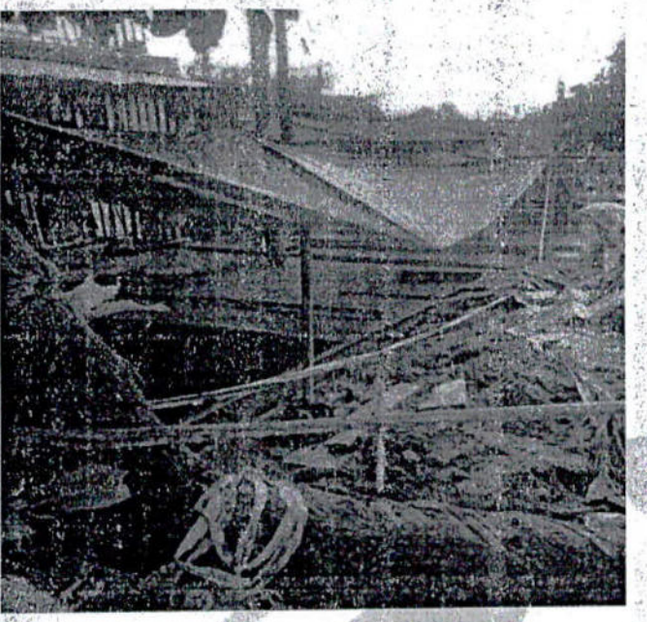

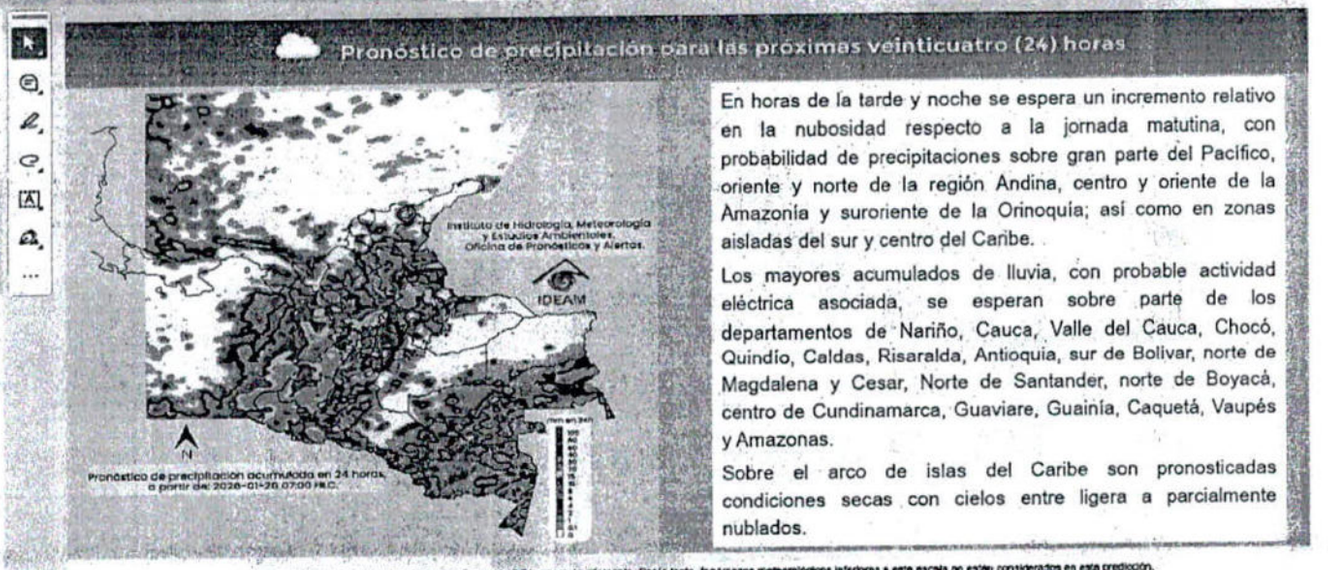

Informe Técnico Diario de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos (ITD).
FUENTE: IDEAM

https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Informe-T%C3%A9cnico-Diario-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas,-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-(ITD) .

2. ESCASEZ CRÍTICA DE PERSONAL CALIFICADO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La ciudad de Armenia y el departamento del Quindío atraviesan actualmente un auge sin precedentes en la ejecución de proyectos de infraestructura, tanto del sector público como privado. Esta situación ha generado una competencia extraordinaria por la mano de obra disponible, creando las siguientes dificultades:

Insuficiencia de personal técnico especializado: La demanda de maestros de obra, oficiales, operadores de maquinaria pesada, soldadores certificados y personal con competencias técnicas específicas supera ampliamente la oferta disponible en la región. Esta escasez ha obligado a trabajar con equipos reducidos, afectando los rendimientos diarios proyectados.

Alta rotación de personal: La competencia entre contratistas por conseguir y retener personal calificado ha generado una rotación constante de trabajadores, lo que implica períodos de inducción, capacitación y adaptación que impactan negativamente en la productividad de la obra.

Necesidad de traer personal de otras regiones: Para suplir la deficiencia de mano de obra local, ha sido necesario gestionar la vinculación de personal proveniente de otros municipios y departamentos, proceso que requiere tiempo para el reclutamiento, traslado, alojamiento y organización logística, además de implicar sobrecostos que afectan la economía del contrato.

Dificultades en la conformación de cuadrillas completas: La imposibilidad de contar con cuadrillas completas y permanentes ha obligado a reorganizar constantemente los frentes de trabajo, generando ineficiencias operativas y demoras en la ejecución de actividades interdependientes.

Esta situación del mercado laboral local constituye un factor externo e imprevisible al momento de la firma del contrato, que ha impactado objetivamente la capacidad de cumplir con el cronograma inicial.

3. DIFICULTADES CRÍTICAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA LLENOS Y RELLENOS.

Ha resultado muy difícil conseguir la tierra con las características adecuadas para usar como material de lleno en obra debido a que el régimen de lluvias intensas y persistentes ha afectado gravemente la disponibilidad de material ya que las lluvias a su vez generan las siguientes consecuencias.

Saturación de los bancos de material: Los yacimientos y canteras autorizadas para la extracción de material de préstamo presentan niveles de saturación hídrica que impiden su explotación adecuada. La presencia constante de agua en estos bancos hace que el material extraído contenga excesos de humedad que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para los llenos estructurales en obra.
Imposibilidad de acceso a zonas de extracción: Las vías de acceso a varios bancos de material se han visto afectadas por deslizamientos, derrumbes y deterioro del afirmado debido a las lluvias, imposibilitando o restringiendo severamente el ingreso de maquinaria pesada y vehículos de transporte.

Necesidad de procesos de secado artificial: El material que logra extraerse requiere de procesos de secado artificial o natural antes de poder ser transportado y utilizado en obra, lo cual implica tiempos adicionales significativos y afecta la continuidad de las actividades de relleno y conformación.

Reducción en la capacidad de producción de los proveedores: Los propietarios y operadores de bancos de material han tenido que reducir o suspender temporalmente sus operaciones debido a las condiciones climáticas, lo que ha generado desabastecimiento en el mercado local y listas de espera para el suministro.

Impacto en actividades de la ruta crítica: Los llenos y rellenos constituyen actividades críticas del proyecto que condicionan el avance de otras fases constructivas. Los retrasos en el suministro de material han generado un efecto dominó que ha paralizado temporalmente varios frentes de trabajo dependientes.

CONSIDERACIONES FINALES:

Las circunstancias descritas constituyen factores externos e imprevisibles que escapan al control del contratista y que han impedido objetivamente el cumplimiento del plazo contractual en las condiciones inicialmente pactadas. Es importante resaltar que durante la ejecución del contrato se han mantenido los más altos estándares de calidad y se ha trabajado con diligencia y buena fe para mitigar en la medida de lo posible los efectos de estas dificultades.

Con la prórroga solicitada de dos (2) meses, se garantiza la culminación satisfactoria del proyecto y la entrega de una obra que cumpla con todas las especificaciones técnicas y de calidad requeridas.

Agradecemos la atención prestada a esta solicitud y quedamos atentos a las observaciones o requerimientos adicionales que consideren pertinentes.

Por lo tanto, las condiciones del mencionado del Contrato de Interventoria No. 004 de 2025

Condiciones iniciales:
Interventor: José Moisés Beltrán Hernández
Valor inicial: $ 191.013.326
Plazo de ejecución inicial del contrato: Seis (6) meses sin exceder a 31-12-2025
Fecha de inicio: 10 de octubre de 2025
Fecha de terminación inicial: 31 de diciembre de 2025

Condiciones prórroga solicitada No. 1:
Prórroga solicitada: Tres (3) meses.
Prórroga aceptada: Un (1) mes
Fecha de terminación con prórroga No. 1: 31 de enero de 2026

Condiciones prórroga solicitada No. 2:
Prórroga solicitada: Dos (2) meses

Fecha de terminación con prórroga No.2: 31 de marzo de 2026

Cordialmente,

CARLOS ANDRES TABARES VELASQUEZ
Gestor Planeación Técnica
Empresas Públicas de Armenia ESP

Anexos: Oficios y soportes del contratista e interventoría de solicitud de prórroga # 2

epa	Bitácora de Obra Reporte Diario	Documento Controlado Código GIPTAP R 009 Versión 04 Fecha de Emisión 23 07 08 Pagina 1/1

Datos Generales del Contrato

Contrato No:	CONTRATO DE OBRA No 021 DE 2025		
Objeto:	"REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"		
Contratista:	LUIS ALFONSO TEJADA VALENCIA R.L CONSORCIO NARIÑO	Interventor y/o Supervisor:	JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ

Datos de Seguimiento a la Obra

Fecha del Reporte:	Sabado 20 Diciembre 2025	Día:	68	De:	

Estado del tiempo: Nublado lluvioso

Horas de lluvia (señale con una X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					X	X	X				X	X											

Cantidad de personal (No.)

				Especifique (Otros)
Director de Obra	2	Oficiales	3	• Almacenista
Ingeniero Residente	2	Ayudantes	4	• Secretaria
Maestro	2	Otros	2	
Inspector Seguridad Industrial	4			

Chequeo del Interventor de Afiliaciones de Seguridad Social del Personal en Obra — SI / — NO

Si se chequeo las Afiliaciones anexar planilla

Equipo Utilizado

				Especifique (Otros)
Rana		Vibrador		Herramienta menor.
Canguro		Mixer		
Mezcladora		Cortadora		

Chequeo acciones proyectadas en el Plan de Calidad

Eventos del Día

- Registro de Condiciones iniciales de obra.
- Control de Niveles
- Señalizacion de obra.
- Revisión general de camaras

Continúa — Si / — No

Firma		
Nombre		JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ
Cargo	Representante de la Obra	Auxiliar de Interventoria y/o Supervisión
Firma		
Nombre	LUIS ALFONSO TEJADA VALENCIA R.L CONSORCIO NARIÑO	ARQ CARLOS ANDRES TABARES VELASQUEZ GESTOR PLANEACION TECNICA EPA E.S.P
Cargo	Vo.Bo. Firma Contratista	Vo.Bo. Firma Interventor y/o Supervisor

Documento Controlado
Código GRTAR-R-009
Versión 04
Fecha de Emisión: 23-07-08
Pagina 2/2

epa

Bitácora de Obra
Reporte Diario

Eventos del Día

Continuación SI / NO

- Limpieza en obra
- Control de Seguridad
- Recorrido tecnico de obra.
- Durante el dia se han presentado lluvias lo que se representa atrasos en las actividades y en el cronograma.

Firma		
Nombre		JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ
Cargo	Representante de la Obra	Auxiliar de interventoría y/o Supervisión
Firma		
Nombre	LUIS ALFONSO TEJADA VALENCIA R.L CONSORCIO NARIÑO	ARQ CARLOS ANDRES TABARES VELASQUEZ GESTOR PLANEACION TECNICA EPA E.S.P
Cargo	Vo.Bo. Firma Contratista	Vo.Bo. Firma Interventor y/o Supervisor

Documento Controlado	
Código:	GRTAR-R-009
Versión:	04
Fecha de Emisión:	23-07-08
Pagina:	1/1

Bitácora de Obra
Reporte Diario

Datos Generales del Contrato			
Contrato No:	CONTRATO DE OBRA No 021 DE 2025		
Objeto:	"REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"		
Contratista:	LUIS ALFONSO TEJADA VALENCIA R.L CONSORCIO NARIÑO	Interventor y/o Supervisor:	JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ

Datos de Seguimiento a la Obra

Fecha del Reporte: Viernes 02 Enero 2026 | Día: 81 | De:

Estado del tiempo: Nublado lluvioso

Horas de lluvia (señale con una X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					X	X			X	X				X									

Cantidad de personal (No.)

				Especifique (Otros)
Director de Obra	1	Oficiales	3	• Almacenista.
Ingeniero Residente	2	Ayudantes	14	• secretaria.
Maestro	2	Otros	2	
Inspector Seguridad Industrial	4			

Chequeo del interventor de Afiliaciones de Seguridad Social del Personal en Obra | SI | / | No |

Si se chequeo las Afiliaciones anexar planilla

Equipo Utilizado

				Especifique (Otros)
Rana		Vibrador		Herramienta menor.
Canguro		Mixer		
Mezcladora		Cortadora		

Chequeo acciones proyectadas en el Plan de Calidad

Eventos del Dia

- Registro de condiciones iniciales de obra.
- Control de Niveles
- Señalización de obra.
- Excavaciones
- Instalacion de tuberia

Continúa | SI | / | No

Firma		JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ
Nombre		
Cargo	Representante de la Obra	Auxiliar de Interventoría y/o Supervisión
Firma		
Nombre	LUIS ALFONSO TEJADA VALENCIA R.L CONSORCIO NARIÑO	ARQ CARLOS ANDRES TABARES VELASQUEZ GESTOR PLANEACION TECNICA EPA E.S.P
Cargo	Vo.Bo. Firma Contratista	Vo.Bo. Firma Interventor y/o Supervisor

epa	Bitácora de Obra Reporte Diario	Documento Controlado Código GRTAR-R-009 Versión 04 Fecha de Emisión 23-07-08 Pagina 2/2

Eventos del Día

Continuación SI / NO

- Encamado en triturado
- Lleno Con material de sitio
- demolicion de Pavimento
- Control de Seguridad.
- Recorrido tecnico de obra.
- Durante el dia se han Presentado Fuertes lluvias esto presenta atrasos en nuestras labores y en el Cronograma.

Firma		
Nombre		JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ
Cargo	Representante de la Obra	Auxiliar de interventoria y/o Supervisión
Firma		
Nombre	LUIS ALFONSO TEJADA VALENCIA R.L CONSORCIO NARIÑO	ARQ CARLOS ANDRES TABARES VELASQUEZ GESTOR PLANEACION TECNICA EPA E.S.P
Cargo	Vo.Bo. Firma Contratista	Vo.Bo. Firma Interventor y/o Supervisor



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Para el municipio de Armenia: No. 2025-002
Para Empresas Públicas de Armenia: No. 2025-001
QUINTO INFORME DE SEGUIMIENTO

Empresas Públicas de Armenia ESP
Pablo Cesar Rodriguez Ospina
Gerente General

Monikandrea Rodriguez Gallego
Subgerente Tecnica
Supervisora convenio interadministrativo

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETO DEL CONVENIO 3
3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3
4. CONTEXTO TÉCNICO 4
5. IMPACTO ESPERADO 14
6. PROYECTOS QUE INTEGRAN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – MUNICIPIO DE ARMENIA Y EPA ESP. 14
7. DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE EJECUCIÓN DE OBRA. 16
8. EVIDENCIA DEL PROGRESO CONTRACTUAL DEL CONVENIO 19
9. ESTADO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS EN ESPECIE Y CONVENIO 23
10. TABLA DE PRESUPUESTO CON DESEMBOLSO DEL CONVENIO 45

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto exponer, mediante tablas y anexos, la organización de los proyectos priorizados en el marco del convenio interadministrativo, destacando aquellos sectores que, conforme a lo establecido en las actas de reunión, recibirán atención durante la fase inicial de ejecución. Este documento busca garantizar un inicio planificado, estratégico y coherente con los objetivos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), así como con las metas de mejoramiento de la infraestructura sanitaria del municipio de Armenia.

De igual manera, se han elaborado dos actas parciales correspondientes a las obras vinculadas al convenio, identificadas con los contratos de obra No. 006-2025 y No. 007-2025, en las cuales se describen las actividades ejecutadas, los avances alcanzados y los valores asociados. Dichas actas se presentan con el propósito de dejar constancia formal del desarrollo de las obras, facilitar los procesos de seguimiento institucional y contribuir al cierre técnico y administrativo de los proyectos.

2. OBJETO DEL CONVENIO

- **Objeto:** aunar esfuerzos institucionales para la reposición y construcción de alcantarillados y colectores para la descontaminación en diferentes barrios de la ciudad de Armenia

3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Para el municipio de Armenia: No. 2025-002
Para Empresas Públicas de Armenia: No. 2025-001
GENERALIDADES

- **Tipo de convenio:** Interadministrativo.
- **Plazo de ejecución:** 12 meses.

2025

- **Fecha informe 1:** 26/05/2025-25/06/2025
- **Fecha informe 2:** 26/06/2025-25/07/2025
- **Fecha informe 3:** 26/07/2025-25/08/2025

- **Fecha informe 4:** 26/08/2025-25/09/2025
- **Fecha informe 5:** 26/09/2025-25/10/2025
- **Fecha informe 6:** 26/10/2025-25/11/2025
- **Fecha informe 7:** 26/11/2025-25/12/2025

2026

- **Fecha informe 8:** 26/12/2025-25/01/2026
- **Valor total convenio:** $ 57.990.241.092
- **Valor aporte municipio de Armenia:** $ 54.757.865.057,00
- **Valor aporte en dinero de EPA ESP:** $ 1.762.210.725
- **Valor aporte en especie EPA ESP:** $ 1.470.165.310
- **valor adicional del contrato por empresas públicas de armenia (aporte EPA ESP) en dinero:** $ 34.151.652,37
- **Valor total convenio con adición:** $ 58.024.392.744,37

4. CONTEXTO TÉCNICO

Estas intervenciones tienen como objetivo cumplir las metas del PSMV, reduciendo la contaminación hídrica y mejorando la infraestructura sanitaria y la cobertura del alcantarillado. El convenio se financia con recursos del empréstito del Municipio de Armenia y aportes de Empresas Públicas de Armenia ESP, lo que agiliza la ejecución de las obras y favorece la calidad ambiental y la salud pública.

Actualmente, se encuentran en ejecución las siguientes obras e interventorías, cuyo detalle se presentará en un cuadro resumen. En este se consolidará no solo la relación de los proyectos, sino también las asignaciones de los supervisores de obra de cada contrato, el contratista encargado de la ejecución, la fecha de inicio de las obras, el código de asignación correspondiente, el estado actual de avance, entre otros aspectos técnicos y administrativos que permitirán llevar un control más claro y detallado del desarrollo de cada intervención. Dichas ejecuciones se enmarcan en el oficio remitido a la Secretaría de Infraestructura, para la puesta en marcha de estos proyectos. Identificado con los radicados GPT-484 del 22 de agosto de 2025, GPT-485 del 22 de agosto de 2025, 639 del 20 de octubre 2025, GPT- 689 del 7 de noviembre de 2025, GPT- 750 del 2 de diciembre de 2025.

TABLA DE ESTADO DE OBRA

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	# PROYECTOS
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	O-013-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 2,593,905,333.00	1
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	CO-003-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 284,372,422.98	
"REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA"	O-006-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 429,681,324.20	2
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)	O-009-2025	EN EJECUCION	$ 1,770,863,557.69	3

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	# PROYECTOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES	CO-008-2025	EN EJECUCION	$ 194,984,681.56	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	O-004-2025	EN EJECUCION	$ 1,915,476,065.39	4
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	CO-001-2025	EN EJECUCION	$ 209,137,163.41	
"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA".	O-007-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 1,136,000,050.84	5
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	CO-002-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 125,235,339.98	

epa Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 8**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	# PROYECTOS
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	O-005-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 552,607,071.18	6
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	O-008-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 647,060,915.00	7
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y9	O-020-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 307,323,487.81	8
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	O-012-2025	EN EJECUCION	$ 11,018,281,366.00	9
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR	CO-009-2025	EN EJECUCION	$ 1,213,719,744.00	

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	# PROYECTOS
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO	O-023-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 1,382,941,067.85	10
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"	CO-005-2025	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	$ 152,012,663.00	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	O-028-2025	EN EJECUCION	$ 1,826,930,496.76	11
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	CO-006-2025	EN EJECUCION	$ 198,857,493.27	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	O-022-2025	EN EJECUCION	$ 1,128,776,809.98	12

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	# PROYECTOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA"	CO-010-2025	EN EJECUCION	$ 121,568,976.46	
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	O-024-2025	EN EJECUCION	$ 1,082,428,467.75	13
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	CO-011-2025	EN EJECUCION	$ 119,126,361.90	
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA	O-006-2026	Adjudicado, en proceso de suscripción de acta de inicio	$ 721,974,052.74	14
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	O-021-2025	EN EJECUCION	$ 1,758,013,587.71	15
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO"	CO-004-2025	EN EJECUCION	$ 191,013,326.00	

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	# PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	O-018-2025	EN EJECUCION	$ 4,801,374,831.00	16
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	CO-012-2025	EN EJECUCION	$ 528,590,884.00	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	O-004-2026	Adjudicado, en proceso de suscripción de acta de inicio	$ 1,003,627,288.72	17
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	CO-017-2025	Adjudicado, en proceso de suscripción de acta de inicio	$ 109,025,940.00	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	O-040-2025	EN EJECUCION	$ 3,169,305,744.00	18

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	# PROYECTOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	CO-018-2025	EN EJECUCION	$ 348,741,601.00	
ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA	O-015-2025	EN EJECUCION	$ 3,057,299,865.15	19
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA"	CO-007-2025	EN EJECUCION	$ 331,013,240.00	
CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001	O-025-2025	EN EJECUCION	$ 1,117,110,954.72	20
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001"	CO-015-2025	EN EJECUCION	$ 126,179,078.58	

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	# PROYECTOS
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	O-027-2025	EN EJECUCION	$ 879,794,397.76	21
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE ARMENIA	CO-014-2025	EN EJECUCION	$ 96,573,223.77	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II	O-029-2025	Adjudicado, en proceso de suscripción de acta de inicio	$ 1,497,379,083.59	22
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II"	CO-002-2026	Adjudicado, en proceso de suscripción de acta de inicio	$ 162,782,072.75	
CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA	O-026-2025	EN EJECUCION	$ 2,256,786,866.64	23
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA"	CO-013-2025	EN EJECUCION	$ 245,423,576.58	

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR ADJUDICADO	# PROYECTOS
CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	O-017-2025	EN EJECUCION	$ 2,214,445,514.00	24
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	CO-016-2025	EN EJECUCION	$ 242,550,556.51	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	O-033-2025	EN EJECUCION	$ 3,247,759,976.95	25
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	CO-019-2025	EN EJECUCION	$ 285,968,599.89	
OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	O-031-2025	EN EJECUCION	$ 611,065,448.20	26

5. IMPACTO ESPERADO

La implementación de estos proyectos está alineada con los objetivos estratégicos del PSMV y tendrá los siguientes impactos:

- Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria urbana.
- Mejoramiento de la calidad ambiental en zonas intervenidas.
- Reducción significativa de los tiempos de ejecución originalmente estimados en el PSMV.
- Cumplimiento normativo con los estándares del RAS y otras disposiciones técnicas vigentes.
- Aumento de la cobertura y eficiencia en la prestación del servicio de alcantarillado.

6. PROYECTOS QUE INTEGRAN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – MUNICIPIO DE ARMENIA Y EPA ES: CUADRO DE AVANCE DE OBRA EN BASE A LAS ACTAS

No. 017 de 2025, (OBRA) tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUESCUN LOZANO por un valor inicial de $2,214,445,514.00 presenta un avance físico del 70%.

No. 016 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ por un valor inicial de $ 242,550,556.51 y que presenta un avance físico del 70%.

No. 021 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO, suscrito con el contratista Consorcio Nariño R.L Luis Alfonso Tejada Valencia, por un valor inicial de $ 1,758,013,587.71 y presenta un avance físico del 79%.

No. 004 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO". Suscrito con el

contratista José Moisés Beltrán Hernández por un valor inicial de $ 191,013,326.00 y que presenta un avance físico del 79%.

El valor conjunto de las actas parciales asciende a la suma de **$ 1,331,365,992.31** discriminado así:

TABLA RELACIONADAS AL DESEMBOLSO

DESEMBOLSO	No. 8	Contratos de Obra No.
CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	$ 941,437,670.51	O- 017 de 2025 (Acta parcial 2)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	$ 90,420,493.73	CO- 016 de 2025 (Acta parcial 2)
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CUIDAD DE ARMENIA QUINDIO.	$ 264,817,533.46	O- 021 de 2025 (Acta parcial 2)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CUIDAD DE ARMENIA QUINDIO"	$ 34,690,294.61	CO- 004 de 2025 (Acta parcial 2)
DESEMBOLSO # 8	$ 1,331,365,992.31	TOTAL

TABLA DE OBRAS RELACIONADAS AL DESEMBOLSO

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR TOTAL DE INVERSIÓN	VALOR ADJUDICADO	% Avance
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	O-021-2025	EN EJECUCIÓN	$ 1,759,104,654.00	$ 1,758,013,587.71	79%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL	CO-004-2025	EN EJECUCIÓN	$ 191,013,326.00	$ 191,013,326.00	79%

PROYECTO	OBRA	ESTADO	VALOR TOTAL DE INVERSIÓN	VALOR ADJUDICADO	% Avance
ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO"					
CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	O-017-2025	EN EJECUCION	$ 2,217,571,437.00	$ 2,214,445,514.00	70%
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	CO-016-2025	EN EJECUCION	$ 242,550,557.00	$ 242,550,556.51	70%

7. DESCRIPCIÓN DE OBRA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PARA EL ACTUAL DESEMBOLSO


La presente descripción, se desarrolla siguiendo el mismo orden establecido en la tabla anterior llamada TABLA DE OBRAS RELACIONADAS AL DESEMBOLSO, correspondiente al presente informe, con el fin de garantizar la coherencia entre la información registrada y el control del avance físico de cada proyecto. Esta estructura permite una adecuada verificación de los porcentajes de ejecución reportados, facilitando el seguimiento técnico y la trazabilidad del estado actual de las obras.

Descripción – Contrato de Obra No. 021 de 2025 e Interventoría No. CO-004 de 2025. REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO

La obra se encuentra **en ejecución**, desarrollándose conforme a las actividades previstas, lo cual se evidencia en el registro fotográfico anexo como parte del seguimiento realizado. La obra correspondiente al Contrato de Obra No. 021 de 2025, cuyo objeto es la "Reposición parcial del alcantarillado del barrio Antonio Nariño de la ciudad de Armenia – Quindío", tiene como finalidad renovar la infraestructura sanitaria existente mediante la sustitución de tuberías deterioradas, la construcción de nuevas cámaras de inspección, la instalación de accesorios hidráulicos y la reposición de pavimentos y estructuras asociadas.

Durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, se ejecutaron actividades preliminares, técnicas, operativas y de control necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, cumpliendo con las especificaciones del pliego, los planos aprobados, las fichas ambientales y el plan de calidad exigido por Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Las labores desarrolladas incluyeron la localización y replanteo de redes, corte y demolición de pavimentos existentes, excavaciones para la instalación de nuevas tuberías, suministro e implementación de tubería tipo doble pared en diferentes diámetros, construcción de cámaras de inspección, conformación de bases y cañuelas, reposición de pavimento en concreto MR-42 acelerado a 7 días, instalación de subbase granular, manejo de aguas, entibados y actividades complementarias relacionadas con la restitución del sistema de alcantarillado del sector.

El proyecto se ejecutó de manera continua con apoyo del personal técnico mínimo requerido, maquinaria, equipos y materiales suficientes para garantizar un avance adecuado, manteniendo siempre las condiciones de seguridad industrial, señalización preventiva, entrega de elementos de protección personal y cumplimiento del SG-SST.

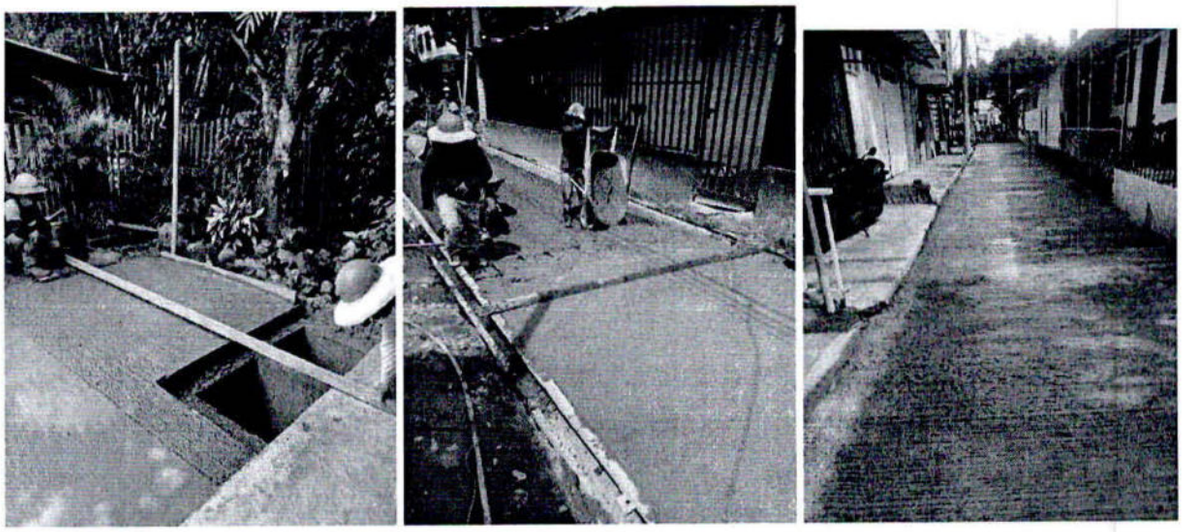


Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 021 de 2025

Descripción – Contrato de Obra No. 017 de 2025 e Interventoría No. CO-016 de 2025. CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3

La obra se encuentra **en ejecución**, desarrollándose conforme a las actividades previstas, lo cual se evidencia en el registro fotográfico anexo como parte del seguimiento realizado. Durante el período objeto de reporte se ejecutaron las siguientes actividades: Se culminó la excavación del túnel minero en la totalidad de su longitud, procediendo posteriormente a la verificación y control de niveles con el fin de dar inicio al proceso de instalación del tubería de dieciocho pulgadas (18"). De igual manera, se finalizaron las tres (3) ventanas de ventilación proyectadas cada treinta (30) metros a lo largo del túnel, alcanzando una longitud total intervenida de setenta y cinco (75) metros. Adicionalmente, se adelantaron las actividades de excavación de pilotes y fundida de elementos estructurales en concreto correspondientes a la estructura del viaducto. Paralelamente, se ejecutaron excavaciones para la construcción de recámaras de alcantarillado con sus respectivas cámaras de caída. También se desarrolló la construcción de trinchos destinados a la disposición y almacenamiento temporal del material producto de la excavación, garantizando su manejo técnico adecuado. Finalmente, se efectuó el acarreo y transporte de la totalidad del material excavado hasta el sitio de obra, cumpliendo con las condiciones operativas establecidas. Productos o resultados del período: Como resultado de las actividades ejecutadas, se logró la culminación total de la excavación del túnel minero, así como la finalización de la estructura en concreto reforzado para la instalación del viaducto. Igualmente, se avanzó en la ejecución de excavaciones para recámaras de alcantarillado, construcción de cámaras de caída y conformación de trinchos para el almacenamiento del material de excavación.

Logros por resultados del período: En atención a los avances alcanzados durante el período, se logró la eliminación de vertimientos contaminados directos hacia cuerpos de agua y suelos, contribuyendo a la protección de los ecosistemas locales en las áreas de influencia del proyecto y mitigando riesgos ambientales asociados a la intervención.

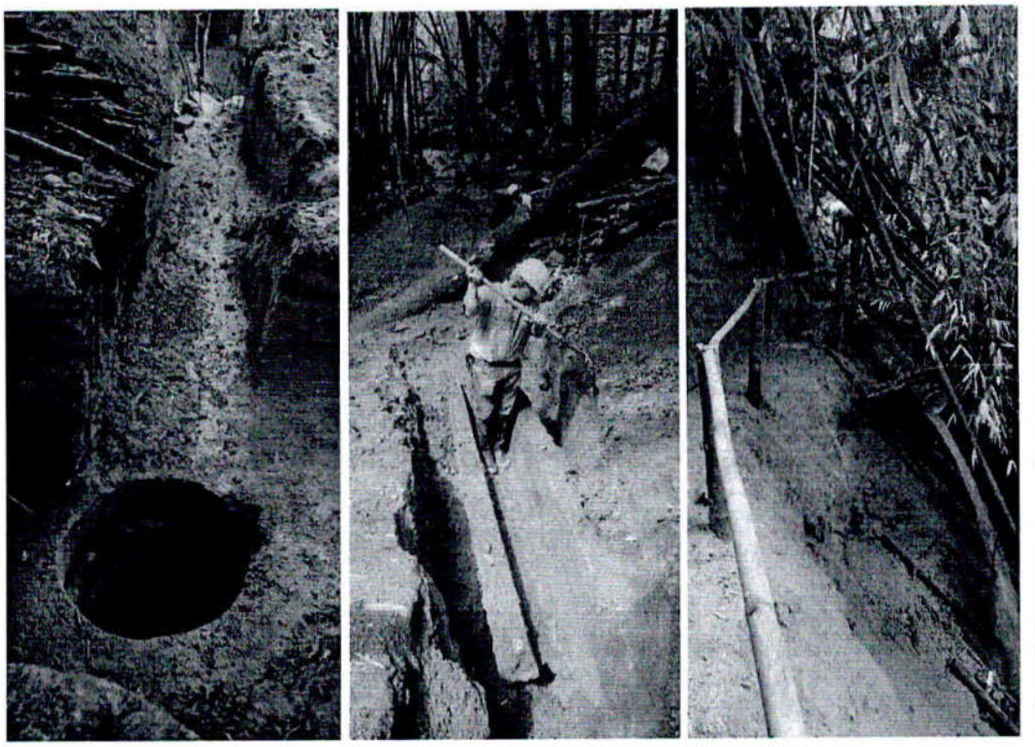

Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 017 de 2025

8. EVIDENCIA DEL PROGRESO CONTRACTUAL DEL CONVENIO

Con el fin de ejercer un control efectivo sobre el porcentaje de avance de las obras, se adopta una metodología de seguimiento que consiste en la elaboración de un resumen individual por cada proyecto ejecutado en el marco del Convenio Interadministrativo, identificado para el Municipio de Armenia con el No. 2025-002 y para Empresas Públicas de Armenia (EPA E.S.P.) con el No. 2025-001. Esta metodología responde al número de obras e interventorías actualmente en ejecución y permite establecer una relación directa entre el avance físico de cada obra y su respectiva interventoría. De esta manera, se facilita el control detallado del progreso de los proyectos, la verificación de las actividades ejecutadas y la cuantificación precisa de los porcentajes de ejecución alcanzados a la fecha del informe.

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

OBRA	OBJETO	ESTADO	% AVANCE DE OBRA
1	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
2	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
3	"REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA"	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
4	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)	EN EJECUCION	64%
5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES	EN EJECUCION	64%
6	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	EN EJECUCION	96%
7	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	EN EJECUCION	96.00%
9	"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA".	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
10	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
11	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
12	REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
13	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y9	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
14	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	EN EJECUCION	47%
15	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR	EN EJECUCION	47%
16	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%

OBRA	OBJETO	ESTADO	% AVANCE DE OBRA
17	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"	TERMINADO - Acta de liquidación en trámite	100%
18	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	EN EJECUCION	38%
19	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	EN EJECUCION	38%
20	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	EN EJECUCION	72%
21	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA"	EN EJECUCION	72%
22	REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	EN EJECUCION	27%
23	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	EN EJECUCION	27%
24	REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA	Adjudicado, en proceso de suscripción de acta de inicio	
25	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	EN EJECUCION	79%
26	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO"	EN EJECUCION	79%
27	CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	EN EJECUCION	30%
28	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	EN EJECUCION	30%
29	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	Adjudicado, en proceso de suscripción de acta de inicio	
30	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	Adjudicado, en proceso de suscripción de acta de inicio	
31	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	EN EJECUCION	10%
32	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION	EN EJECUCION	10%

OBRA	OBJETO	ESTADO	% AVANCE DE OBRA
	PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3		
33	ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA	EN EJECUCION	94%
34	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA"	EN EJECUCION	94%
35	CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001	EN EJECUCION	62%
36	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001"	EN EJECUCION	62%
37	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA	EN EJECUCION	76%
38	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA"	EN EJECUCION	75%
39	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II	Adjudicado, en proceso de suscripción de acta de inicio	
40	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II"	Adjudicado, en proceso de suscripción de acta de inicio	
41	CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA	EN EJECUCION	30%
42	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA"	EN EJECUCION	30%
43	CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	EN EJECUCION	70%
44	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	EN EJECUCION	70%
45	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	EN EJECUCION	12%
46	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	EN EJECUCION	12%
47	OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS	EN EJECUCION	69%

9. ESTADO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS CON APORTE EN ESPECIE

A continuación, se presenta la tabla de seguimiento de proyectos de infraestructura de alcantarillado, la cual detalla las intervenciones programadas para mejorar el sistema de saneamiento básico en diversos sectores. La tabla específica para cada proyecto su valor total de ejecución, los metros lineales (ML) de tubería a intervenir, la inversión destinada a estudios y diseños, como se muestra en la siguiente tabla con aporte en especie:

PROYECTO	ML	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	PORCENTAJE ESPECIE	INFORME
REPOSICION PARCIA ALCANTARILLADO CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A	140	$ 13,582,100.00	0.02%	2
CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	485	$ 47,052,275.00	0.08%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	497	$ 48,216,455.00	0.08%	
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14	250	$ 24,253,750.00	0.04%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA	625	$ 60,634,375.00	0.10%	3
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJÓN HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO	136	$ 13,194,040.00	0.02%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES	651	$ 63,156,765.00	0.11%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	96	$ 9,313,440.00	0.02%	5
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y9	166	$ 16,104,490.00	0.03%	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO	439	$ 42,589,585.00	0.07%	
ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA	519	$ 50,350,785.00	0.09%	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	336	$ 32,597,040.00	0.06%	
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	300	$ 29,104,500.00	0.05%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	3240	$ 314,328,600.00	0.54%	

REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	632	$ 61,313,480.00	0.11%	6
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	614	$ 59,567,210.00	0.10%	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA	333	$ 32,305,995.00	0.06%	
CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA	652	$ 63,253,780.00	0.11%	
CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001	190	$ 18,432,850.00	0.03%	
CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	170	$ 16,492,550.00	0.03%	
OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS	322	$ 31,238,830.00	0.05%	
CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	355	$ 34,440,325.00	0.06%	
REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II	962	$ 93,328,430.00	0.16%	7
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	626	$ 60,731,390.00	0.10%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	800	$ 77,612,000.00	0.13%	
REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA	1200	$ 116,418,000.00	0.20%	
REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	418	$ 40,552,270.00	0.07%	
TOTAL DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES	**15154**	**$ 1,470,165,310.00**	**2.54%**	

A continuación, se presenta el consolidado de la información correspondiente a los oficios mediante los cuales se realizó el seguimiento a los avances en la ejecución del aporte en especie.

APORTE EN ESPECIE

AVANCE EN ESPECIE GPT 484 - 22 DE AGOSTO 2025	0.23%
AVANCE EN ESPECIE GPT 485 - 22 DE AGOSTO 2025	0.24%
AVANCE EN ESPECIE GPT 639 - 20 DE OCTUBRE 2025	0.85%
AVANCE EN ESPECIE GPT 689 - 7 DE NOVIEMBRE 2025	0.55%
AVANCE EN ESPECIE GPT 750 - 2 DE DICIEMBRE 2025	0.67%
TOTAL DE APORTE EN ESPECIE ENTREGADOS	2.54%
PRÓXIMAS ENTREGAS DE DISEÑO	0.00%
TOTAL, APORTE EN ESPECIE CONVENIO	2.54%

Es importante precisar que, en el caso de los contratos de obra, actualmente se encuentran en la etapa de recopilación, revisión y consolidación de documentos e informes técnicos, administrativos y financieros, con el propósito de elaborar las respectivas actas parciales del contrato. De manera similar, algunas de las obras vinculadas al convenio también se hallan en este proceso, lo que permitirá contar con los soportes necesarios para adelantar su liquidación en debida forma, garantizando así transparencia, orden y cumplimiento de los requisitos contractuales. De igual manera se relaciona el siguiente cuadro donde se evidencia el avance en la etapa precontractual y contractual de los proyectos que hacen parte de la ejecución del convenio.

Complemento de la tabla llamada PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA del punto número 8 del presente informe de desembolso.

CUADRO RESUMEN DEL CONVENIO



Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 8**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

Obra	Objeto	Tiempo (Meses)	VALOR ADJUDICADO	CONTRATISTA	OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	5	$ 2,593,905,333.00	Richard Harll Medina Chaves	O-013-2025	TOTAL $ 2,593,905,333.00 ALCANTARILLADO BARRIO VILLA LILIANA $ 2,131,660,618.00 ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA $ 462,244,715.00 (5 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025)	18/09/2025	31/12/2025
2	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	6	$ 284,372,422.98	Juan Sebastián Restrepo Vega	CO-003-2025	Subgerencia Tecnica ll: VALOR TOTAL $ 284,372,422.98 ALCANTARILLADO $ 233,423,892 ACUEDUCTO $ 50,948,531 6 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025	18/09/2025	31/12/2025
3	"REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA"	1.5	$ 429,681,324.20	CARLOS RESTREPO MONTOYA	O-006-2025	Prorroga: 15 dias Longitud instalada (red principal) -Calle 11A: 131,67 m de tubería de 12" -San Francisco: 26,80 m de tubería de 18"	4/08/2025	18/09/2025
4	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)	3	$ 1,770,863,557.69	Oscar Arley Gonzalez Buitrago	O-009-2025	Dos componentes Alcantarillado= $1.408.177.707,14 Acueducto= $362.685.850,55 PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 2 meses	4/11/2025	30/03/2026
5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES	4	$ 194,984,681.56	Consorcio Laureles R.L kevin Angarita Echeverry	CO-008-2025	Dos componentes Alcantarillado= $155.012.821,84 Acueducto= $39.971.859,72 PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 2 meses	4/11/2025	30/03/2026

Obra	Objeto	Tiempo (Meses)	VALOR ADJUDICADO	CONTRATISTA	OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
6	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	4	$ 1,915,476,065.39	Ernesto Hernandez Rivera	O-004-2025	PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 30 dias Valor adicional requerido en trámite (recursos EPA): $ 213.461.225,98	1/09/2025	2/03/2026
7	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	5	$ 209,137,163.41	Carlos Alberto Soto Calderón	CO-001-2025	PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 30 dias	1/09/2025	15/01/2026
8	"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA".	3	$ 1,136,000,050.84	HECTOR MARIO SOTO BETANCOURTH	O-007-2025	5/11/2025 PRORROGA DE OBRA 20 DÍAS	6/08/2025	25/11/2025
9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	4	$ 125,235,339.98	JUAN SEBASTIAN RESTREPO VEGA	CO-002-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	6/08/2025	5/12/2025
10	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	2	$ 552,607,071.18	OBRA ANCAD INGENIERIA SAS Rep. Legal Carlos Mario Cruz P	O-005-2025	Prorroga: 15 dias- Valor adicional requerido en trámite (recursos EPA): $ 34.151.652,37-Durante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 23/09/2025-13/10/2025 SE RADICO AMPLIACION -(12/11/2025) Reinicio 1: 27/11/2025 Fecha de terminación tras reinicio: 30/11/2025 Prorroga: 8 dias Fecha de terminación con prorroga: 8/12/2025	12/08/2025	8/12/2025

Obra	Objeto	Tiempo (Meses)	VALOR ADJUDICADO	CONTRATISTA	OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
11	REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	2.5	$ 647,060,915.00	JULIAN MAURICIO URIBE LONDOÑO	O-008-2025	Finaliza en los tiempos establecidos - PRORROGA DE OBRA 20 DÍAS	9/09/2025	14/12/2025
12	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y 9	1	$ 307,323,487.81	OBRAS Y PROYECTOS SAS-REPRESENTANTE LEGAL: ING LUZ JENNY BETANCOURT TORRES	O-020-2025	Articulado 12K Prórroga 1: de 30 dias Prórroga 2: de 12 dias	20/10/2025	31/12/2025
13	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	8	$ 11,018,281,366.00	Consorcio SB 25R.L Fernando Arturo Angel Pelaez	O-012-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	15/10/2025	14/06/2026
14	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR	9	$ 1,213,719,744.00	Consorcio Simón Bolívar R.L Jhon Jairo Sandoval Galindo	CO-009-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	15/10/2025	14/07/2026
15	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO	4	$ 1,382,941,067.85	Consorcio Construirte ING R/L Jhoany Alexander Tobon Muñoz	O-023-2025	4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025	1/10/2025	31/12/2025
16	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"	5	$ 152,012,663.00	Andres Mauricio Chacón Ángel	CO-005-2025	5 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025	1/10/2025	31/12/2025
17	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA	4	$ 1,826,930,496.76	Consorcio Alcantarillado La Clarita R.L José Orlando Suárez Londoño	O-028-2025	4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1.5 un mes y medio	24/11/2025	15/03/2026
18	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA	5	$ 198,857,493.27	Diego Adolfo Robles Bolaños	CO-006-2025	5 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1.5 un mes y medio	24/11/2025	15/03/2026

Obra	Objeto	Tiempo (Meses)	VALOR ADJUDICADO	CONTRATISTA	OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
	"REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA							
19	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	3	$ 1,128,776,809.98	Gustavo Adolfo Gutierrez Ramirez	O-022-2025	90 dias sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 15 dias 31/12/2025-15/01/2026 PRORROGA 2: 30 dias 16/12/2025-14/02/2026	29/10/2025	14/02/2026
20	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA"	4	$ 121,568,976.46	Diego Adolfo Robles Bolaños	CO-010-2025	91 dias sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 15 dias 31/12/2025-15/01/2026 PRORROGA 2: 30 dias 16/12/2025-14/02/2026	29/10/2025	14/02/2026
21	REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	3	$ 1,082,428,467.75	Álvaro Antonio Hurtado Osorio	O-024-2025	3 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1 mes	27/11/2025	28/02/2026
22	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E	4	$ 119,126,361.90	Wilmar Humberto López Vélez	CO-011-2025	4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1 mes	24/10/2025	28/02/2026
23	REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA	3	$ 721,974,052.74	VICTOR ALFONSO VALENCIA MARQUEZ	O-006-2026	Contrato de convenio a ajecutar en 2026		
24	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	5	$ 1,758,013,587.71	Consorcio Nariño R.L Luis Alfonso Tejada Valencia	O-021-2025	6 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 2 meses	14/10/2025	31/03/2026
25	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL	6	$ 191,013,326.00	José Moisés Beltrán Hernández	CO-004-2025	7 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 2 meses	14/10/2025	31/03/2026

Obra	Objeto	Tiempo (Meses)	VALOR ADJUDICADO	CONTRATISTA	OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
	ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO"							
26	CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	6	$ 4,801,374,831.00	INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA	O-018-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	6/11/2025	5/05/2026
27	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	7	$ 528,590,884.00	JUAN JOSE RESTREPO ROMERO	CO-012-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	6/11/2025	5/06/2026
28	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	3	$ 1,003,627,288.72	JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO	O-004-2026	Contrato de convenio a ajecutar en 2026		
29	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I	4	$ 109,025,940.00	JUAN CARLOS GOMEZ IBAÑEZ	CO-017-2025	Contrato de convenio a ajecutar en 2026		
30	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	6	$ 3,169,305,744.00	MARCO JULIO SUEZCUN LOZANO	O-040-2025	ETAPA PRELIMINAR	26/12/2025	25/06/2026
31	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3	7	$ 348,741,601.00	JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE	CO-018-2025	ETAPA PRELIMINAR	26/12/2025	25/07/2026

Obra	Objeto	Tiempo (Meses)	VALOR ADJUDICADO	CONTRATISTA	OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
32	ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	6	$ 3,057,299,865.15	COSNTRUCCIONES HURTADO S.A.S OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ Representante legal	O-015-2025	Finaliza en los tiempos establecidos Valor adicional requerido en trámite (recursos EPA): $ 201.458.833,79	8/10/2025	7/04/2026
33	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA"	7	$ 331,013,240.00	Plinio Mendoza Jaramillo	CO-007-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	8/10/2025	7/05/2026
34	CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001	4	$ 1,117,110,954.72	CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO	O-025-2025	(4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 2 MESES Y 12 DIAS	13/11/2025	12/03/2026
35	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001"	4	$ 126,179,078.58	CONSORCIO LL	CO-015-2025	(4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 2 MESES Y 12 DIAS	13/11/2025	12/03/2026
36	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	3	$ 879,794,397.76	ROBERT ALFARO GARCÍA	O-027-2025	(3 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 19 dias	19/11/2025	19/02/2026
37	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE ARMENIA	3	$ 96,573,223.77	JAIME ALBERTO ANGEL LONDOÑO	CO-014-2025	(3 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 19 dias	19/11/2025	19/02/2026
38	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II	4	$ 1,497,379,083.59	GERMAN GARCIA RODRIGUEZ	O-029-2025	Contrato de convenio a ajecutar en 2026		

Obra	Objeto	Tiempo (Meses)	VALOR ADJUDICADO	CONTRATISTA	OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
39	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II"	5	$ 162,782,072.75	JULIAN HOYOS CARDENAS	CO-002-2026	Contrato de convenio a ajecutar en 2026		
40	CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	5	$ 2,256,786,866.64	JAIRO LONDOÑO GUATIVA	O-026-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	14/11/2025	13/04/2026
41	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA"	6	$ 245,423,576.58	JULIAN HOYOS CARDENAS	CO-013-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	14/11/2025	13/05/2026
42	CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	5	$ 2,214,445,514.00	MARCO JULIO SUESCUN LOZANO	O-017-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	5/11/2025	4/04/2026
43	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	6	$ 242,550,556.51	JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ	CO-016-2025	Finaliza en los tiempos establecidos	5/11/2025	4/05/2026
44	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	5	$ 3,247,759,976.95	Construcciones y obras de ingenieria SAS	O-033-2025	ETAPA PRELIMINAR	22/12/2025	21/05/2026
45	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES	6	$ 285,968,599.89	EMERSON LEANDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ	CO-019-2025	ETAPA PRELIMINAR	22/12/2025	21/06/2026
46	OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	2.5	$ 611,065,448.20	AGUSTO TELLEZ AYALA	O-031-2025	2 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 15 dias	26/11/2025	14/02/2026

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 8**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

Obra	Objeto	Tiempo (Meses)	VALOR ADJUDICADO	CONTRATISTA	OBRA	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
						PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 15 dias		

CUADRO RESUMEN DEL CONVENIO

Relación de actas parciales del convenio

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
1	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	100.0%	$ 240,282,098.44	ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP	$ 742,967,530.45	SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 141,328,030.45	ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP	$ 1,055,917,273.54	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)	PENDIENTE	ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP	$ 332,707,314.27	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)
2	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	84.5%	$ 81,460,544.01	SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025)- ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP (ACTA PARCIAL 1)-$ 26,345,041.54	$ 115,751,804.17	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)acta $ 131,237,873.21(ACUEDUCTO $ 15,486,069.04 BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP)								
3	"REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA	100.00%	$ 253,922,404.81	SE ENVÍA DESEMBOLSO 1 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (25 DE OCTUBRE - 2025)									$ 175,756,219.50	SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 8**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
	CIUDAD DE ARMENIA"													
4	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO)	41.31%	$ 581,703,509.74	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)-EPA ESP (ACTA PARCIAL 1) ACUEDUCTO - $35,887,030.81										
5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES			COMBINADO										
6	REPOSICION * PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA	81.57%	$ 842,589,008.96	SE ENVÍA DESEMBOLSO 2 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE OCTUBRE 2025)	$ 719,822,411.29	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)								
7	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA	60.00%	$ 125,482,298.05	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)										

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 8**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
	NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA													
8	"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA".	100.000%	$ 409,784,892.20	SE ENVÍA DESEMBOLSO 1 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (25 DE OCTUBRE - 2025)	$ 592,754,669.38	SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025)							$ 133,458,476.20	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)
9	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA	100.000%	$ 45,172,387.13	SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 65,347,800.42	SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025)							$ 14,715,152.43	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)
10	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	100.0%	$ 487,443,417.56	SE ENVÍA DESEMBOLSO 2 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE OCTUBRE 2025)									$ 65,112,792.73	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)
11	REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	100.00%	$ 209,324,060.52	**EPA ESP - TRAMITADO Y PAGADO ACTA PARCIAL**	$ 375,294,727.50	**EPA ESP - TRAMITADO ACTA PARCIAL**							$ 62,442,126.98	**EPA ESP - TRAMITADO ACTA PARCIAL**
12	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA	100.00%	$ 99,836,743.59	SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA									$ 205,442,028.06	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
	FACHADA MZ 8 Y 9			ESTRUCTURA (2 DE NOVIEMBRE 2025)										ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)
13	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR	40.44%	$ 4,455,957,511.00	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)										
14	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR	40.00%	$ 485,487,897.60	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)										
15	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO	100.00%	$ 410,808,909.86	SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 654,060,532.13	SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025)							$ 318,071,625.86	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)
16	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"	75.00%	$ 45,603,798.90	SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 68,405,698.35	SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025)							$ -	
17	REPOSICIÓN PARCIAL	32.69%	$ 597,238,230.55	SE ENVÍA DESEMBOLS										

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
	ALCANTARILLADO LA CLARITA			O 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)										
18	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA													
19	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA	**55.89%**	$ 510,536,539.75	SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (2 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 120,306,659.86	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)								
20	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA"	**55.88%**	$ 54,706,039.41	SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (2 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 13,226,704.64	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)								
21	REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E													
22	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,													

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 8**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
	AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E													
23	REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA													
24	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO	71.12%	$ 966,931,624.68	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)	**$ 264,817,533.46**	**SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026)**								
25	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO"	71.12%	$ 103,367,518.59	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)	**$ 34,690,294.61**	**SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026)**								
26	CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN	19.30%	$ 926,889,889.49	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)										
27	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,	14.29%	$ 75,512,983.43	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA										

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
	AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN			ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)										
28	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I													
29	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I													
30	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3													
31	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO													

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 8**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
	GUADUALES DE LA VILLA FASE 3													
32	ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	**73.62%**	$ 357,244,550.58	SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 1,893,647,940.41	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)								
33	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA"	**47.22%**	$ 38,678,795.47	SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025)	$ 117,633,012.63	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)								
34	CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001	**40.53%**	$ 452,719,080.74	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)										
35	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001"	**37.47%**	$ 47,278,481.37	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)										

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
36	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	39.97%	$ 351,654,583.31	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)										
37	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE ARMENIA	33.19%	$ 32,056,383.38	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)										
38	REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II													
39	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II"													
40	CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO	18.48%	$ 417,079,840.17	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)										

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 8**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
41	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA"	**16.67%**	$ 40,903,929.43	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)										
42	CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3	**26.39%**	$ 584,422,689.77	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	**$ 941,437,670.51**	**SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026)**								
43	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3"	**17.91%**	$ 43,449,630.14	SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025)	**$ 90,420,493.73**	**SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026)**								
44	REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES													
45	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLAD													

Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos	**INFORME DE DESEMBOLSO NO. 8**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

Obra	Objeto	FINANCIERO	ACTA PARCIAL 1	TRAMITE	ACTA PARCIAL 2	TRAMITE	3	TRAMITE	4	TRAMITE	5	TRAMITE	ACTA FINAL	TRAMITE
	O COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES													
46	OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	32.19%	$ 196,697,750.00	SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025)										

TABLA DE VALOR DEL CONVENIO

RESUMEN VALORES CONVENIO			
TIPO DE APORTE	**ENTIDAD**	**% del aporte**	**VALOR**
APORTE EN DINERO	MUNICIPIO DE ARMENIA	94.37%	$ 54,757,865,057.00
APORTE EN DINERO	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	3.04%	$ 1,762,210,725.00
APORTE EN ESPECIE	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	2.53%	$ 1,470,165,310.00
ADICIÓN No 1	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	0.06%	$ 34,151,652.37
VALOR TOTAL CONVENIO			**$ 57,990,241,092.00**
VALOR TOTAL CONVENIO CON ADICIÓN			**$ 58,024,392,744.37**

TABLA DE APORTE EN DINERO DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (EPA ESP)

Esta tabla describe el tipo de aporte en dinero al convenio por parte de EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (EPA ESP) donde se refleja el valor de las 3 actas de pago:

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	APORTE EN DINERO	Contratos de Obra N°008
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	$ 209,324,060.52	No. 008 de 2025 (Acta parcial 1)
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	$ 375,294,727.50	No. 008 de 2025 (Acta parcial 2)
REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO	$ 62,442,126.98	No. 008 de 2025 (Acta parcial 3, FINAL) - TERMINADO - Acta de liquidación en trámite
TOTAL, APORTE EN DINERO	**$ 647,060,915.00**	

10. TABLA DE PRESUPUESTO CON DESEMBOLSO DEL CONVENIO

Esta acta se encuentra programada para su suscripción a mitad del mes de febrero de 2025, con el fin de efectuar el pago parcial correspondiente de las obras ejecutadas, conforme a lo señalado en la tabla del convenio suscrito con Empresas Públicas de Armenia – EPA, página 15.

TIPO DE APORTE	PAGO % (VALOR MUNICIPIO DE ARMENIA CONVENIO/ NUMERO DE DESEMBOLSO)	PAGO % (VALOR TOTAL CONVENIO/ NUMERO DE DESEMBOLSO)	VALOR DESEMBOLSO	Saldo aporte municipio (Valor pendiente para pagar)	PAGO % ACUMULADO CONVENIO
DESEMBOLSO 1	1.21%	1.14%	$ 663,707,297.01	$ 54,094,157,759.99	1.145%
DESEMBOLSO 2	2.43%	2.29%	$ 1,330,032,426.52	$ 52,764,125,333.47	3.438%
DESEMBOLSO 3	2.59%	2.45%	$ 1,420,308,845.84	$ 51,343,816,487.63	5.887%
DESEMBOLSO 4 (CON ADICION)	2.67%	2.52%	$ 1,462,029,244.29	$ 49,881,787,243.34	8.407%
DESEMBOLSO 5	1.94%	1.83%	$ 1,061,002,668.80	$ 48,820,784,574.54	10.236%
DESEMBOLSO 6	18.37%	17.33%	$ 10,057,492,974.77	$ 38,763,291,599.77	27.569%
DESEMBOLSO 7	10.11%	9.54%	$ 5,535,145,617.21	$ 33,228,145,982.56	37.108%
DESEMBOLSO # 7 FUE EL ULTIMO DEL AÑO 2025 A CONTINUACIÓN SE PONDRÁN EL DEL AÑO 2026					
DESEMBOLSO 8	2.43%	2.29%	$ 1,331,365,992.31	$ 31,896,779,990.25	39.403%
TOTAL DE DESEMBOLSOS			$ 22,861,085,066.75		
SALDO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			$ 35,163,307,677.62		

MONIKANDREA RODRÍGUEZ GALLEGO.
Subgerente Técnica
Empresas Públicas de Armenia E.S.P
Supervisor del Convenio

Proyectó: Kevin Alexis Gómez Ituyan / Ingeniero Civil - Contratista - Subgerencia Técnica
Anexos:

CERTIFICADO DE CUENTA

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ARMENIA, QUINDÍO, 25/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA** con NIT **8900004399** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560136669992887

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
